

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 22 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 20 de junio de 2024

HORA: 07:30 am a 8:40 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Angélica Tatiana López H.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sara Juliana Delgado	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Yira Bolaños Enríquez	Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E)	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-26014

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		X	
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia	X		
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Laura Muñoz	Profesional FDL de Bosa	Alcaldía Local de Bosa	X		
Jamesson Jesús Sosa Rodríguez	Profesional FDL de Kennedy	Alcaldía Local de Kennedy	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (21 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión N°. 22 de 2024.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión veintidós (22) del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Bosa y Kennedy, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de Bosa – Laura Muñoz:

Se informa que actualmente se está adelantando un contrato de espacio público en el cual se está llevando a cabo tramite con el Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura – IDPC, al respecto se debe indicar que se presentan atrasos por la emisión de permisos a cargo de la mencionada Entidad.

Por lo cual, se solicita a través de este comité un apoyo para gestionar estos permisos, y avanzar con la ejecución de los andenes que se encuentran en zonas de interés cultural.

Respuesta IDU – Liliana Torres Moreno: Se informa que el IDPC no hace parte de estas mesas de trabajo interinstitucional, pero que desde IDU se puede remitir contacto para que se pueda realizar una comunicación mucho más efectiva

Por otro lado, la profesional Laura Muñoz continua su intervención indicando:

Desde el contrato 397 de 2020, relacionado con la interventoría para conservación de infraestructura vial, se viene gestionando cierre del permiso de ocupación de cauce que fue emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente, del cual ya se cuenta con concepto por seguimiento, y acto administrativo con valor de pago por evaluación ambiental, no obstante, a la fecha no se ha podido liquidar ya que no se conoce la Entidad financiera y cuenta en la que se realiza el recaudo (hace falta el recibo de pago).

El número del expediente es SDA 05-2023-3026, Resolución 00892 y radicado 2024EE13560.

Respuesta SDA – Sandra Palacios: Se informa que el recibo de pago podrá ser reclamado en la sede de la Secretaría Distrital de Ambiente ubicada en la Calle 57 con Avenida Caracas.

Finalmente, desde la Alcaldía Local de Bosa se informa que se tiene un contrato de malla vial en ejecución, con un frente abierto en cercanía al colegio Gran Colombiano, sobre el cual se han presentado varios inconvenientes con las empresas de servicios públicos. Actualmente, se presenta fuga de la tubería de 12” de agua potable, esta mañana se informó por parte de los contratistas de EAAB que realizarían la inspección, pero no se ha encontrado el lugar de fuga, afectando la ejecución del tramo.

- **Caso 117 (nuevo):** Para VANTI, en el frente de trabajo que colinda con el Colegio Gran Colombiano localizado aproximadamente en la carrera 79B con calle 73A Sur, se observó tubería galvanizada de 12”, por lo cual se ha solicitado realizar apiques para que la ESP verifique el estado de la red y con sus recomendaciones se puedan evitar daños sobre la tubería. No obstante, no se ha recibido respuesta. Así las cosas, a través del comité se solicita apoyo a esta ESP para que puedan prestar apoyo y coordinación sobre las actividades que se desarrollan en este sector de la ciudad.

3.2 Alcaldía de Kennedy – Jamesson Jesús Sosa Rodríguez:

- Caso 118 (nuevo):** Para IDU, se informa que el FDL-Kennedy ha firmado convenio interadministrativo con el IDU (Convenio 1459), actualmente los contratos derivados se están manejando desde dicha Entidad, por parte del Ingeniero Oscar Hoyos. Se precisa que es un convenio donde se va a mejorar los paseos comerciales de la fase uno y dos de la localidad de Kennedy, con una inversión por parte del FDL de aproximadamente 8mil millones de pesos y del IDU de 9mil millones de pesos. En cuanto a los estudio y diseños, se solicita conocer su estado, y cuál es el motivo de que no cuente con aprobación hasta el momento, teniendo en cuenta que ya se subsanaron por parte del IDU hacia la EAAB. El 22 de marzo de 2024 se realizó una mesa de trabajo en la cual la EAAB ESP presentó nuevas observaciones a la versión 5 del producto y anunció la emisión del concepto por escrito para la semana siguiente (del 25 al 29 de marzo), sin embargo, el IDU aún no ha recibido dicha comunicación a la fecha, y por otro lado el 17 de abril de 2024 mediante el comunicado con radicado IDU 202423600532661, el IDU reiteró a la EAAB a la necesidad de contar con el concepto de la revisión del producto.

Respuesta IDU – Jaime Augusto Bermúdez: El IDU verificará el tema con el Ingeniero Francisco de la EAAB, respecto a las no objeciones de los diseños.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (21 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 13 de junio de 2024, correspondiente a la sesión número 21 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma se reciben observaciones por parte de Secretaría Distrital de Movilidad, las cuales son atendidas y ajustadas en documento.

También se menciona, que el **acta 19** se encuentra publicada en la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación, mientras que el **acta 20** está en proceso de publicación por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDP. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
3	01/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
4	08/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
5	15/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
6	22/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
7	29/02/2024	X	X	X	X	3-2024-11328	21/03/2024	Publicado en página web.
8	07/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
9	14/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
10	21/03/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
11	04/04/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
12	11/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
13	18/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
14	25/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16391	8/5/2024	Publicado en página web.
15	02/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18159	27/5/2024	Publicado en página web.
16	09/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18601	06/06/2024	Publicado en página web.
17	16/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
18	23/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
19	30/05/2024	X	X	X	X	3-2024-20615	20/6/2024	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
20	06/06/2024	X	X	X	En trámite	Proceso SIPA 2378931	Pendiente	En proceso de publicación.
21	13/06/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En proceso de firma.

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la ingeniera Bertha Liliana hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 IDU – William Fernando Chávez:

- **Caso 119 (nuevo):** Para Claro, se solicita instalar tapas faltantes sobre el sector de la Av. Caracas No. 5-12 y Av. Caracas No. 5-58, barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe.

Respuesta ENEL – Mauricio Arenas: Se informa que, realizadas las visitas correspondientes, las cámaras pertenecen a empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se realiza seguimiento sobre los casos que se han expuesto en el Comité:

- **Caso 95:** No se cuenta con información adicional.
- **Caso 107 y 108:** Con referencia a los casos 81 y 82, el ingeniero Sergio Alejandro Díaz del Área de Conservación informó que el 13 de junio realizaron los recorridos con VANTI y UAERMV. Con la UAERMV se dejó el compromiso que serían reparadas las afectaciones y que iniciarían el día lunes y terminarían el día miércoles. Para el caso de VANTI, se levantó acta de inspección y quedó el compromiso que en un lapso de 15 días hábiles estarían culminando los arreglos de las zonas que habían sido afectadas.
- **Caso 115:** La EAAB a través del Ing. Wilson Porras informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público.
- **Caso 120 (nuevo):** Se informa afectación sobre la Calle 80 N°. 69H-20, que de acuerdo con reporte recibido se ubica infraestructura de la ESP – Enel Colombia SA ESP, por lo cual, se solicita recuperación de calzada y realizar acciones pertinentes.

Intervención EAAB – Zona 1 – Mauricio Mahecha: No se cuenta con información de CCTV aún, la EAAB ha estado realizando actividades sobre la calle 153 con Avenida La Sirena, por las dificultades de un contrato en este sector. No obstante, se reiterará el seguimiento al área de alcantarillado.

Finalmente, la Ingeniera Onisalba realiza seguimiento sobre los casos expuestos por la Ing. Angélica Tatiana López, quien no pudo asistir a la presente sesión:

- **Caso 39:** Se solicita información al respecto de la carrera 4.
- **Caso 87:** Se reporta atendido por EAAB-Zona 4, pero no cuenta con registro fotográfico de la recuperación.
- **Caso 106:** Se reporta espacio público recuperado, ya cuenta con registro fotográfico.
- **Caso 121 (nuevo):** Para EAAB-Zona 2, se solicita reparación de ciclorruta en el parque El Virrey, toda vez que se presenta hundimiento.

Intervención EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar con las actividades programadas en este sector.

Para el sector que se informa ya fue reparado, y que el registro fotográfico no ha sido reportado a la instancia, se espera que el inspector asignado remita la información para enviar al chat del comité.

Respecto del caso 121, se indica que ya había sido recuperado pero que nuevamente se presentó hundimiento, ayer se programó contratista para que realizará la intervención correspondiente, no obstante, no se ha recibido información de que hayan finalizado actividades.

A su vez, es importante indicar que al estar en cabeza de un contratista deberá dar garantía sobre el trabajo ejecutado, y tendrá que realizar acciones pertinentes con las condiciones técnicas requerida, de igual manera se verificará si nuevamente existe daño sobre la red.

Intervención IDU – Jaime Augusto Bermúdez: Se reitera el compromiso de la EAAB con el caso 121, ya que el Ingeniero Luis Francisco Castiblanco informó que el área sería atendida entre el jueves y viernes, por lo cual, una vez se cuente con registro fotográfico de la recuperación, se solicita enviarla como soporte.

5.3 Claro – Nicolás Andrade Duque:

- **Caso 116:** Se informa que no se ha podido establecer comunicación con el Ingeniero Gino.

Respecto de la construcción de las cámaras contiguas a redes de ENEL en un parque, donde se requiere licencia, con la Ingeniera Liliana Torres se investigó al respecto, encontrando que desde IDU se elevó petición al IDRD en diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Respuesta IDU – Liliana Torres: Respecto del traslado de la solicitud al IDRD por parte de la DTAI (Dirección Técnica de Administración de Infraestructura) del IDU, se encuentra que hubo respuesta del IDRD. Por lo cual, se aclarará con dicha dependencia, y se informará en dado caso para que se retome desde la petición actual o si se genera una nueva.

Respuesta EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.

5.4 UAERMV – Humberto Ramírez:

- **Caso 64:** Se realizó visita al sitio para la planeación de intervención, encontrando que si es posible que haya daño por redes y no por cargas, por lo cual, se solicita visita conjunta con EAAB-Zona 2.

NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:

El día 13 de junio de 2024, la ingeniera Nubia Riaño de EAAB informa vía correo electrónico que el **caso 102 fue atendido**, se adjunta comunicación donde se informa cierre de caso.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
3	<p>Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.</p>	IDU	Normal	<p>Álvaro Reinoso en sesión 3 informa: En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en cuales obras y que daños se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para darle respuesta</p> <p>Carmen Rocío López en sesión 3 indica: Se hace la aclaración respecto al tema del oficio sobre los daños expuestos en el comité pasado, refiriéndose que la observación no era únicamente para el IDU sino a nivel general para todas las entidades que realizan obras en el espacio público, tener especial cuidado con las redes de no dañarlas ni dejarlas expuestas a daños.</p>
4	<p>Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector</p>	EAAB – Red Matriz	Alta	<p>IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.</p>
5	<p>Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedo sin reparar. Se solicita pronta actuación.</p>	IDU	Alta	<p>Acta 04-2024: EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Así mismo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.</p>
6	<p>Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.</p>	IDU	Normal	<p>Acta 04-2024: EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez.</p> <p>Acta 5-2024: Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.</p>

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quien se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Alta	Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	Normal	ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.
23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.	IDU	Normal	Intervención IDU – Angélica López en acta 06: Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.
25	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
26	<p>Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.</p>	IDU	Alta	<p>Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07: Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como desvío la misma Avenida y que en ese sentido los huecos, posiblemente se han generado por esos desvíos sin que sean exactamente intervenciones como tal para las obras que se adelantan.</p>
27	<p>Para ENEL, se reporta por parte del concejal Edison Julián Forero que en la Calle 13 con Avenida Boyacá, bajando el puente, sentido occidente-oriente, se encuentra socavación red empresa de servicios públicos, la EAAB red matriz indicó que la no pertenece a la EAAB, se observa cámara abandonada con ductos para canalización.</p>	ENEL COLOMBIA	Alta	<p>Sesión 09 - ENEL – Mauricio Arenas: En relación con el caso 27 se efectuó levantamiento, efectivamente se encuentran dos cámaras, una es de ENEL, le hace falta la tapa y se espera que hoy se esté reponiendo. Así mismo, se evidencia hueco que se formó en el área por la remoción del terreno, se solicita hacer visita conjunta con IDU, para programar las acciones que se deban tomar.</p>
28	<p>Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.</p>	MOVISTAR	Normal	Pendiente
29	<p>Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.</p>	EAAB - Zona 1	Normal	Pendiente
32	<p>Se indica que respecto del contrato 263 de 2023, que tiene que ver con alumbrado público, ya se envió inventario a la UAESP, donde se generó la identificación de puntos donde posiblemente se requieran luminarias por expansión para que esta Entidad pueda efectuar los recorridos y validaciones correspondientes, y se verifique si hay necesidad de instalar nuevas luminarias, considerando que el alcance del contrato corresponde a infraestructura vial, pero no a espacio público peatonal.</p>	UAESP	Normal	<p>En sesión 17, Dra. Yira Bolaños informa que se realizó recorrido de verificación del alumbrado público en la zona, arrojando que se está dando cumplimiento al reglamento técnico. No obstante, si existe afectación del arbolado urbano, por lo cual se identificó que en varios puntos es necesario coordinar con la Secretaría Distrital de Ambiente para autorizar la poda con el operador de aseo Promoambiental. Finalmente, se indica que estaba pendiente por parte de la Alcaldía de Chapinero informar la finalización de las obras, lo descrito en aras de verificar si es necesario hacer algún tipo de modernización. Se requiere informar finalización de obras por parte de la Alcaldía de Chapinero.</p>

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
				<p>Del IDU – William Fernando Chávez: comparte información de contacto de la Ingeniera Karen Bejarano de la Secretaría Distrital de Ambiente, para que se puedan culminar las actividades que dan cierre al caso 32.</p> <p>Observación FDL - 23 de mayo: Se recibe documento denominado 1-2024-28094 radicado No.:20244000105061 - Respuesta a solicitud de comité operativo de obras de infraestructura de servicios públicos del distrito capital – acta No. 09 de 2024; donde indican que, no se requiere luminarias por expansión en los tramos requeridos por el FDLCH para su evaluación.</p>
36	<p>En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa “renovación del sistema”, por lo cual se solicita informar estado de la reserva.</p> <p>Observación FDL - 26 de mayo: Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio público costado norte.</p>	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente
39	<p>Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.</p>	EAAB - Zona 2	Normal	<p>Acta 19, Wilson Porras informa que se revisó el tema con el equipo de coordinación interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportan al área correspondiente en acueducto o alcantarillado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades. Así las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en campo no se ubican de esa manera, sobre la carrera 4 hay 3 nomenclaturas diferentes.</p> <p>Por lo anterior, el caso de la calle 55 como tal no existe, es un cruce de vía entre calle 54 a calle 54B, entonces, haciendo el recorrido con el equipo de alcantarillado, se volvió a generar una evaluación y valoración de los puntos, y efectivamente en la calle 59 como se reportó la semana pasada hay que efectuar obras en pozo por fallas en la infraestructura. Finalmente, con esta revalidación, se observan hundimientos en el sector, pero no se relacionan solamente con servicios públicos, sino por las características del suelo y temas de arborización que generan daños sobre la calzada.</p> <p>Acta 20, Wilson Porras indica que: Para el sector de la carrera 4 frente al número 54 a 46, es un hundimiento se tiene programada revisión con CCTV, porque efectivamente se encuentra alineado con red de alcantarillado. El siguiente punto, localizado frente al número 58-23, ya no se encuentra daño sobre estructura de pavimento, por tanto, ya se encuentra recuperado, se está revisando internamente quien pudo haberlo intervenido. En la calle 59, se reitera lo indicado anteriormente frente a algunas anomalías en la red, en lo relacionado a tubería que se conecta a cámara de inspección.</p>

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
				<p>Para la carrera 4 con calle 56, ya se encuentra recuperada la carpeta asfáltica, al igual que con calle 58.</p> <p>Acta 22, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar con las actividades programadas en este sector. Se remite el 24/06/2024 registro fotográfico de sectores sobre carrera 4 que ya tuvieron recuperación de espacio público.</p>
43	<p>Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.</p>	ENEL COLOMBIA	Normal	<p>Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días.</p> <p>Observación FDL - 26 de mayo: Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.</p>
45	<p>Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comunicó que por el cambio de gobierno no se estarían expidiendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.</p>	SDA	Normal	<p>Observación FDL - 26 de mayo: Se tramitó en el mes de abril un oficio a la SDA, con el fin de ultimar detalles.</p> <p>Ya se surtieron los temas técnicos y se está atento a la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.</p>
47	<p>Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.</p>	ENEL COLOMBIA	Normal	<p>En sesión 21, se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODENSA, donde se requiere instalación del barraje necesario para la energización del parque en el cual ya se encuentran terminadas las obras requeridas y solicitan a ENEL la instalación para poder liquidar el contrato ya que este no es posible sin que el parque tenga la iluminación verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta.</p> <p>Intervención ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Respecto a la energización del parque, indica que ENEL fue a hacer la revisión de la obra encontrando que las cámaras tienen las tapas soldadas por lo que no fue posible la inspección de la ductería, ni realizar las respectivas validaciones que la compañía debe hacer, se solicitó al área encargada si es posible desoldar para hacer la revisión y realizar la energización lo más pronto posible. Indica que la energización se realiza de una subestación localizada en un conjunto residencial pero que en los documentos aportados no llegó la carta de autorización para obtener el ingreso al conjunto para poder hacer la revisión y la energización cuando corresponda.</p>
48	<p>Del 336 de 2023, también se requiere certificado de “paz y salvo” por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.</p>	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	ENEL COLOMBIA	Normal	En sesión 21 , se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, en donde se había identificado que el problema era un tema con el medidor. Respuesta ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.
50	Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de malla vial, uno de los tramos de este contrato corresponde a la oreja de San Benito, el CIV 6001440, en este corredor se encuentra un poste de media tensión hacia el acceso a la Avenida Boyacá, se ha venido solicitando traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.	ENEL COLOMBIA	Alta	En sesión 21 , se reitera el estado del caso 50 referente al traslado de un poste ubicado en la oreja de San Benito. Indica que hubo demora en la realización del pago pero que ya se efectuó. Respuesta ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Indica que recientemente recibieron el pago y que los tiempos de ejecución de la obra son 45 días normalmente pero que ya se está recomendando para que se realice lo más pronto posible.
53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	Alta	En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección.
54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	Normal	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.
56	Para ENEL, se solicita retiro y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente
58	Para Zona 4 EAAB, en la calle 30B Sur con carrera 9C Este - Barrio Ramajal, la UMV intervino esta vía, la profundidad máxima de excavación fueron 23 cm. Se están presentado filtraciones en la red de alcantarillado de la EAAB, a la fecha fueron funcionarios a hacer la inspección y manifestaron que el Ingeniero Vega debe autorizar el CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAAB de su valiosa y acostumbrada colaboración ante la situación que se presenta.	EAAB - Zona 4	Normal	En sesión 14 se informa que se ha avanzado con visita por parte de la EAAB – Zona 4, y se espera reunión para llegar a conclusiones respecto de la intervención. Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: El ingeniero Santiago Vitar informa que en la inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a instalar manga para remediar el problema de redes en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.
69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales.	Alcaldía Kennedy	Normal	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
	Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.			
77	<p>Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.</p>	Alcaldía Suba	Normal	<p>En sesión 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, el IDU informa que: "(...) la EAAB mediante oficio 3133002- S-2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba informando:</p> <p>"...El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección reportada en el asunto del oficio: Calle 167 con carrera 50. En dicha verificación se evidenciaron redes de alcantarillado en correcto funcionamiento hidráulico. No se observan represamientos...</p> <p>...Adicionalmente, se aplicó prueba de trazado color verde al hundimiento el cual marco negativo en el pozo sanitario para filtración de aguas residuales. No obstante, la prueba marco positivo alrededor del tubo de descarga debido a fallas en la compactación de la vía, no relacionadas con afectaciones la red de alcantarillado...</p> <p>...Por lo anterior se procedió a consultar el Sistema de Información Geográfica del IDU – SIGIDU, en el cual se encontró que el sector de la Calle 167 con Carrera 5 fue intervenido por el Fondo Local de Desarrollo de la Alcaldía Local de Suba, cuyo contrato cuenta con póliza de garantía vigente..."</p> <p>Por lo anterior, agradecemos que pueda ser informado al Fondo de Desarrollo Local de Suba, para que se proceda con la ejecución de las labores pertinentes."</p> <p>En sesión 19 IDU indica, se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.</p>
78	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	EAAB – Red Matriz	Alta	Caso reportado desde 2023. Nubia Riaño informa en sesión 14: Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos.
79	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.	EAAB - Zona 3	Normal	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
83	<p>Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.</p>	IDU	Normal	Pendiente
86	<p>Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio "El Paraíso", que por nomenclatura se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al parque nacional), se llevaron a cabo obras por parte del FOPAE en conjunto con IDU.</p> <p>Lo anterior, en aras de mitigar algunos problemas de escorrentía que se habían en el sector, y que estaban afectando la Avenida Circunvalar. Ahora bien, actualmente se presenta un fenómeno de remoción en masa que está afectando todo el costado oriental de la Avenida Circunvalar, hace poco se presentó colapso sobre pozo de la red sanitaria, que tiene captación de esta área, las redes se encuentran en PVC de alta densidad y tienen alta resistencia, empero es preocupante la situación que se registra.</p> <p>Actualmente, se observa un proceso de remoción en masa que afecta la infraestructura construida sobre el costado oriental, ya que se presentan cargas laterales que afectan su estabilidad y correcto funcionamiento. Por lo anterior, se hace un llamado al IDU para que se proyecten obras de mitigación sobre este corredor vial, que permita la correcta prestación de servicios públicos y garantice el estado de movilidad del sector.</p>	IDU	Alta	<p>En sesión 16, IDU – Jaime Bermúdez: indica que la intervención sobre la Avenida Circunvalar se realizó en el año 2011, fue un contrato que gestionó el IDU con recursos de Colombia Humanitaria (nación), las ejecutó la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del IDU con el acompañamiento del FOPAE, en el cual se pretendía atender un fenómeno de inestabilidad.</p> <p>El contrato se ejecutó en el año 2011 y culminó su termino de garantías aproximadamente en el año 2018, considerando el contexto mencionado, se debe señalar que desafortunadamente esta obra no se encuentra contemplada en el Plan de Desarrollo. Por lo cual, se tendrá que elevar la consulta para tomar acción de manera conjunta e intervenir este sector.</p>
87	<p>Para EAAB – Zona 4, corresponde a derecho de petición que fue presentado por parte de un operador de SITP, se requiere verificación de tramo vial Avenida Primero de Mayo con carrera 71F en el cual se presume existencia de socavación por daño en red.</p>	EAAB - Zona 4	Alta	<p>En sesión 18, el IDU indica que no se reporta avance al respecto.</p> <p>En sesión 18. EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López informa que el caso 87 lo está atendiendo el área operativa, mediante mantenimiento.</p> <p>En sesión 22: Se reporta atendido por EAAB-Zona 4, pero no cuenta con registro fotográfico de la recuperación.</p>
88	<p>Se solicita al IDU respuesta a requerimiento enviado vía correo electrónico sobre trámite de PMT de la Industria Copel, quien como cliente de VANTI requirió prestación de servicio mediante derecho de petición debido a que se ha hecho solicitud de PMT, pero ha tenido negado por respuesta de IDU. En varias ocasiones se ha requerido comunicación con ingenieras de IDU para sostener mesa de trabajo, pero no ha sido posible.</p>	IDU	Normal	Pendiente
89	<p>Para ENEL, se solicita aprobación de punto de conexión radicado mediante consecutivo 1500476372 del 10 de abril. Se precisa que se obtuvo factibilidad, pero que se espera aprobación de diseño para continuar con el trámite de aprobación integral del proyecto ante el IDPC.</p>	ENEL COLOMBIA	Normal	<p>Observación FDL - 26 de mayo: Aún no se ha obtenido concepto de aprobación del diseño de luminarias.</p>

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
90	Para SDA, relacionado con un requerimiento de manejo silvicultural, durante el mes de abril se radicó mediante consecutivo 2024ER43111 atendiendo las observaciones efectuadas por la Secretaría, pero a la fecha no se tiene respuesta.	SDA	Normal	Observación FDL - 26 de mayo: Se realizó visita silvicultural el día 28 de mayo de 2024, sin embargo, se envió mediante radicado No. 2024ER114112, solicitud de remitir el concepto técnico de la visita, debido a que es un requisito indispensable para la obtención de la aprobación de intervención por parte del IDPC. No se solicita la resolución como tal, solo el concepto de la visita realizada por el Ing. Alejandro Sánchez.
91	Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
92	Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	Normal	Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García: Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.
94	Para IDU, se solicita mesa de trabajo, desde la Alcaldía Local se trabaja en formular un proyecto de puentes peatonales y se ha solicitado la reserva de esta infraestructura (radicado IDU DTINI 202423500582981), pero solo se dio respuesta afirmativa para un puente, lo que impide continuar con el proyecto. Se solicita realizar una mesa de trabajo para verificar la posibilidad de realizar reserva.	IDU	Normal	Sesión 18 - Intervención IDU – Ing. Jaime Bermúdez: Se solicita aclarar si la respuesta a la solicitud de reserva fue emitida de forma incompleta por el IDU, o si se indicó que no se puede indicar la reserva por alguna condición particular. Respuesta de Mónica Chipatecua: Se informa que la reserva se solicitó para cuatro puentes, pero solo se reservó uno, para los tres restantes se comunicó que el IDU realizó mantenimiento en el mes de octubre, empero en el mes de diciembre se recibió por parte del IDU un diagnóstico respecto de dicha infraestructura para continuar con la formulación del proyecto. A su vez, en las visitas técnicas efectuadas se observa que los puentes no han sido objeto de mantenimiento. Observación FDL - 28 de mayo: No se ha atendido la solicitud de la mesa de trabajo ante el IDU, es de carácter urgente ya que es para continuar con el proceso de formulación.
95	Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	Normal	En acta 19, IDU señala que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.
97	Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.	MOVISTAR	Alta	En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña: Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
98	Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Normal	Pendiente
100	En el comité anterior al que asistió el FDL de Usaquén se solicitó a ENEL retirar reserva de dos segmentos viales, el primero con CIV 1004519 y el segundo 1007204, ENEL Colombia mediante radicado IDU 20225262079722 efectuó el desistimiento de reserva a estos segmentos viales de malla vial y espacio público, sin embargo, en el SIGIDU no se ha reflejado dicha información, se solicita por favor retirar reservas con base en la comunicación emitida por ESP.	IDU	Normal	Pendiente
101	Para EAAB-Zona 3, se recibe derecho de petición N°. 000013183802 relacionado con afectación de cámara ETB. Se realizó visita a la carrera 47 # 22-83 para identificar un daño ocasionado por un contratista de la EAAB a la cámara de la Empresa, dejándola en riesgo de accidente para los peatones. En visita del viernes 24 de mayo el personal contratista negó su identificación y el número del contrato, luego en segunda vez la visita del 27/05/2024, se observó que personal del contrato EAAB el contrato 1-01-33300-1534-2022 está realizando trabajos en la zona, motivo por el cual se solicita la intervención de la EAAB para requerir al contratista la recuperación inmediata de la cámara.	EAAB - Zona 3	Normal	Sesión 20 - Intervención EAAB-Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez: Realizada la consulta efectivamente corresponde a un contratista de la EAAB, por lo cual en el transcurso de la mañana se informará la programación pertinente para realizar la recuperación del espacio público y reconstrucción de la cámara.
103	Para IDU, en el barrio La Gloria, segmento vial con CIV 4005511 se encuentra reservado por el contrato IDU de conservación 1746 de 2021, no obstante, se declaró incumplimiento y no se ha podido ejecutar este segmento vial. Al respecto es preocupante el estado del segmento vial, el cual se encuentra sumamente afectado por las rutas del SITP y alimentadores que transitan de manera constante, generando repetidas quejas por parte de la comunidad. Por lo cual, se aprovecha este espacio para verificar el encargado del sector puntualmente, y si se puede facilitar un contacto para coordinar de una u otra manera, la intervención a través de acciones de movilidad, sin que se comprometa jurídicamente el proceso que adelanta el IDU.	IDU	Alta	Sesión 20 - Intervención IDU – Jaime Augusto Bermúdez Díaz: Se solicita el número del contrato IDU, ya que al llevar un proceso de caducidad se tienen unos términos legales que es importante analizar, por lo cual, se propone efectuar una mesa de trabajo para identificar dichas condiciones, en aras de garantizar la correcta y segura movilidad en el sector del barrio La Gloria. Se agenda Mesa de trabajo agendada para el martes 11 de junio a las 7:00 am de manera virtual.
104	Para ENEL, se realizó solicitud respecto de un CIV ubicado en el barrio Los Laches, en la KR 5 entre CL 7 y CL 9, en la cual se requirió realizar acciones pertinentes sobre poste que se encuentra inclinado, esto teniendo en cuenta visita realizada por IDIGER en la cual se efectuó diagnóstico técnico donde se hicieron algunas recomendaciones al respecto del riesgo que este genera.	ENEL COLOMBIA	Alta	Sesión 20 - Intervención ENEL – Mauricio Arenas: Se solicita remitir la petición radicada a ENEL vía correo electrónico.
105	Para VANTI, en el barrio Los Laches, en la KR 5 entre CL 7 y CL 9, VANTI realizó desconexión del servicio a cinco predios, entonces mediante oficio (que está en proceso de firma) se está solicitando la reconexión dado que el contratista ya realizó las obras correspondientes, entre las cuales se construyó un muro de contención.	VANTI GAS NATURAL	Normal	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
107	<p>Para UAERMV, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre la AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.</p>	UMV	Normal	<p>Acta 21, De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quién obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCIT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quién es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Respecto de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizará recorrido.</p> <p>Acta 22: Con referencia a los casos 81 y 82, el ingeniero Sergio Alejandro Díaz del Área de Conservación informó que el 13 de junio realizaron los recorridos con VANTI y UAERMV. Con la UAERMV se dejó el compromiso que serían reparadas las afectaciones y que iniciarían el día lunes y terminarían el día miércoles.</p> <p>Para el caso de VANTI, se levantó acta de inspección y quedó el compromiso que en un lapso de 15 días hábiles estarían culminando los arreglos de las zonas que habían sido afectadas.</p>
108	<p>Para VANTI, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre la AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.</p>	VANTI GAS NATURAL	Normal	<p>Acta 21, De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quién obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCIT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quién es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Respecto de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizará recorrido.</p> <p>Acta 22: Con referencia a los casos 81 y 82, el ingeniero Sergio Alejandro Díaz del Área de Conservación informó que el 13 de junio realizaron los recorridos con VANTI y UAERMV. Con la UAERMV se dejó el compromiso que serían reparadas las afectaciones y que iniciarían el día lunes y terminarían el día miércoles.</p> <p>Para el caso de VANTI, se levantó acta de inspección y quedó el compromiso que en un lapso de 15 días hábiles estarían culminando los arreglos de las zonas que habían sido afectadas.</p> <p>as.</p>
109	<p>Para ENEL, se solicita respuesta de la petición remitida respecto del contrato 1-0125400-1090 de 2021 de ENEL, teniendo en cuenta que aún no se ha emitido pronunciamiento, el radicado de la comunicación es 611211756.</p>	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
110	Para Claro, se remitió correo electrónico con petición el día 23 de abril de 2024.	CLARO	Normal	Acta 21, Claro – Nicolás Andrade Duque informa que la solicitud fue recibida como un PQR por prestación de un servicio (tipo call center), no obstante, se indicó vía correo electrónico que para el requerimiento relacionado con un certificado de "paz y salvo" para obra, se requiere radicación formal mediante oficio en las instalaciones de Claro. Por lo cual, la comunicación podrá ser recibida en el Centro Comercial Plaza Claro y deberá contener los puntos exactos que fueron intervenidos para efectuar la debida verificación en terreno.
111	Para Movistar, se solicita respuesta de la petición con radicado 20240419105915900 del 24 de abril de 2024.	MOVISTAR	Normal	Pendiente
112	Para IDU, presenta situación pendiente relacionada con la construcción del cable aéreo San Cristóbal del contrato IDU 1167 de 2023, para su ejecución se tuvieron que demoler en cada estación 2 manzanas, las estaciones objeto de consulta son "La Victoria" y "Altamira", donde se demolieron predios, pero el IDU no ha generado cierre de las cuentas contrato, de las mismas se está contabilizando consumo. Por lo anterior, se solicita al IDU pronunciamiento, y que como se ha requerido realice los cierres de las cuentas.	IDU	Normal	Durante el día 06 de junio de 2024, el Ingeniero Álvaro Reinoso remite correo electrónico a la Dirección Técnica de Predios informando la situación presentada sobre el sector, para realizar la debida suspensión del servicio.
113	Para ENEL, se solicita mesa de trabajo para tratar el tema referente a un contrato de malla vial donde se hace necesario el traslado de unos postes, aun no se ha hecho una radicación formal porque consideran importante que, en una primera mesa de trabajo, junto con los profesionales del consorcio, se revisen los estudios y diseños en donde se hace la sugerencia y recomendación de evaluar la cantidad de traslados de postes en cada uno de los segmentos viales. De esa manera se haría la solicitud ante cada ESP.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
114	Para EAAB-Red Matriz, se solicita visita técnica de la EAAB en la Avenida Ciudad de Villavicencio con calle 65 sur (se requiere verificar dirección) teniendo en cuenta que se presentan empozamientos posiblemente por causa de las redes, y este corredor vial fue intervenido hace poco mediante contrato de conservación IDU.	EAAB – Red Matriz	Normal	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
115	<p>Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.</p>	EAAB - Zona 2	Normal	<p>Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público.</p>
116	<p>Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.</p>	EAAB – Red Matriz	Normal	<p>En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.</p>
117	<p>Para VANTI, en el frente de trabajo que colinda con el Colegio Gran Colombiano localizado aproximadamente en la carrera 79B con calle 73A Sur, se observó tubería galvanizada de 12", por lo cual se ha solicitado realizar apiques para que la ESP verifique el estado de la red y con sus recomendaciones se puedan evitar daños sobre la tubería. No obstante, no se ha recibido respuesta. Así las cosas, a través del comité se solicita apoyo a esta ESP para que puedan prestar apoyo y coordinación sobre las actividades que se desarrollan en este sector de la ciudad.</p>	VANTI GAS NATURAL	Normal	Pendiente
118	<p>Para IDU, se informa que el FDL-Kennedy ha firmado convenio interadministrativo con el IDU (Convenio 1459), actualmente los contratos derivados se están manejando desde dicha Entidad, por parte del Ingeniero Oscar Hoyos. Se precisa que es un convenio donde se va a mejorar los paseos comerciales de la fase uno y dos de la localidad de Kennedy, con una inversión por parte del FDL de aproximadamente 8mil millones de pesos y del IDU de 9mil millones de pesos. En cuanto a los estudio y diseños, se solicita conocer su estado, y cuál es el motivo de que no cuente con aprobación hasta el momento, teniendo en cuenta que ya se subsanaron por parte del IDU hacia la EAAB.</p> <p>El 22 de marzo de 2024 se realizó una mesa de trabajo en la cual la EAAB ESP presentó nuevas observaciones a la versión 5 del producto y anunció la emisión del concepto por escrito para la semana siguiente (del 25 al 29 de marzo), sin embargo, el IDU aún no ha recibo dicha comunicación a la fecha, y por otro lado el 17 de abril de 2024 mediante el comunicado con radicado IDU 202423600532661, el IDU reiteró a la EAAB a la necesidad de contar con el concepto de la revisión del producto.</p>	IDU	Normal	<p>Acta 22 - IDU – Jaime Augusto Bermúdez: El IDU verificará el tema con el Ingeniero Francisco de la EAAB, respecto a las no objeciones de los diseños.</p>
119	<p>Para Claro, se solicita instalar tapas faltantes sobre el sector de la Av. Caracas No. 5-12 y Av. Caracas No. 5-58, barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe.</p>	CLARO	Alta	<p>Acta 22 - ENEL – Mauricio Arenas: Se informa que, realizadas las visitas correspondientes, las cámaras pertenecen a empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. El 24/06/2024, ETB verificó mediante visita y se informa que no son parte de su infraestructura.</p>

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
120	Se informa afectación sobre la Calle 80 N°. 69H-20, que de acuerdo con reporte recibido se ubica infraestructura de la ESP – Enel Colombia SA ESP, por lo cual, se solicita recuperación de calzada y realizar acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente
121	Para EAAB-Zona 2, se solicita reparación de ciclorruta en el parque El Virrey, toda vez que se presenta hundimiento por posible daño en redes. Ya había sido intervenido este sector por la EAAB.	EAAB - Zona 2	Alta	Acta 22 - EAAB - Javier Porras: Se indica que ya había sido recuperado pero que nuevamente se presentó hundimiento, ayer se programó contratista para que realizará la intervención correspondiente, no obstante, no se ha recibido información de que hayan finalizado actividades. A su vez, es importante indicar que al estar en cabeza de un contratista deberá dar garantía sobre el trabajo ejecutado, y tendrá que realizar acciones pertinentes con las condiciones técnicas requerida, de igual manera se verificará si nuevamente existe daño sobre la red.

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
-Casos presentados	121	100,00%
-Casos resueltos al corte	58	47,93%
-Casos pendientes al corte	63	52,07%

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver dos (02) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 102 y 106, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se lograron resolver dos (02) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 102 y 106, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.</p>	
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente ENEL, IDU, EAAB.</p>	

8 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 27 de junio de 2024
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 27 de junio de 2024

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 27 de junio de 2024

9 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número veintidós (22) del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 27-junio de 2024 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,



JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
PRESIDENTE



PAOLA ANDRÉA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP.

Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.

William Fernando Chávez – IDU.

Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 22 de 2024.


2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 22 de 2024.

3. Soporte_cierre_caso_102.


Subserie 2131-2.14

Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO


Número de casos registrados por mes

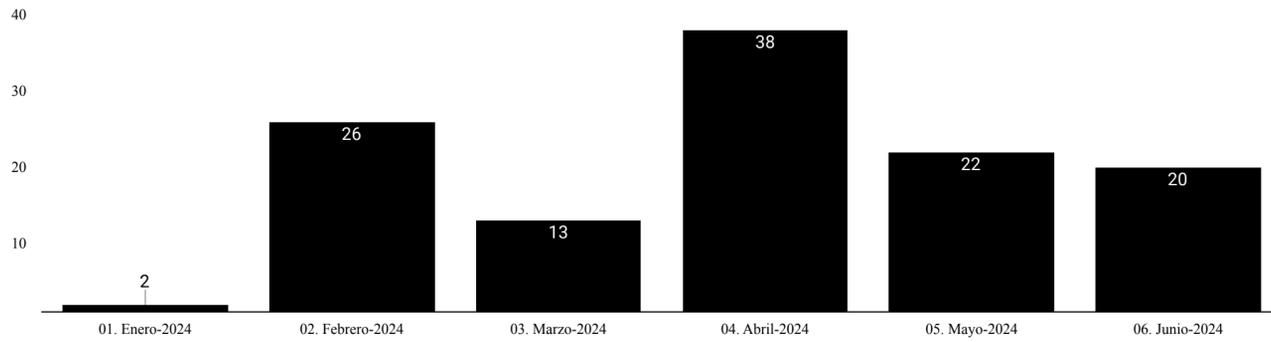

Número de casos resueltos por mes

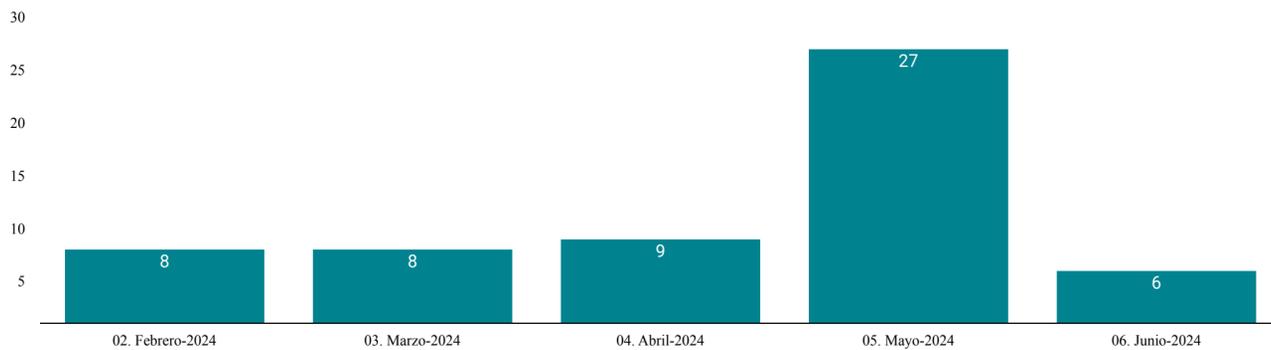

Número de casos pendientes por mes

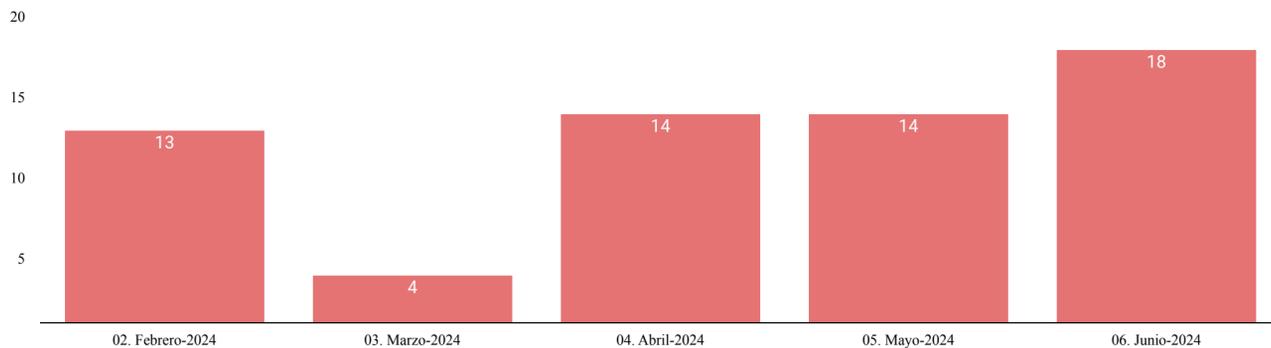

Recuento de casos

Nº. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2...	Para ENEL, se solicita que se revis...	ENEL COLOMBIA	Alta	ATENDIDO
2	01. Enero-2...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
3	02. Febrero-...	Se informa sobre las afectaciones ...	IDU	Normal	PENDIENTE
4	02. Febrero-...	Para la EAAB – Red Matriz, se ex...	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-...	Para la EAAB, en la CL 28 con K...	IDU	Alta	PENDIENTE
6	02. Febrero-...	Para el IDU, solicita reunión para t...	IDU	Normal	PENDIENTE
7	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, En Carrera ...	EAAB - Zona 5	Normal	ATENDIDO
8	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
9	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
10	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo...	EAAB - Zona 4	Normal	ATENDIDO
11	02. Febrero-...	Para ENEL, en la calle 13 por Carr...	ENEL COLOMBIA	Normal	PENDIENTE
12	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
13	02. Febrero-...	Para Alcaldía de Puente Aranda, se...	Alcaldía Puente Aranda	Normal	ATENDIDO
14	02. Febrero-...	Se solicita realizar revisión con un...	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
15	02. Febrero-...	Para ETB, en la calle 47 con carrer...	ETB	Alta	ATENDIDO
16	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero...	EAAB - Zona 3	Normal	ATENDIDO

Casos registrados

121



Nº. Casos Resueltos

58



Nº. Casos Pendientes

63




Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Porcentaje de avance

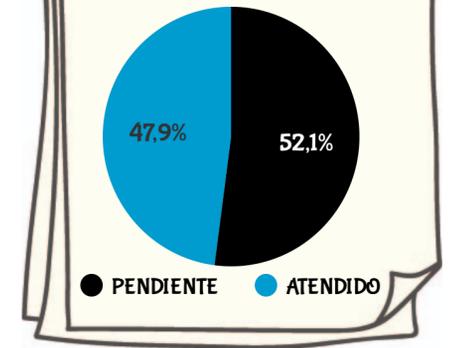

TOP – Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	24
2. IDU	13
3. EAAB - Zona 2	12
Total	120


TOP – Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	8
2. EAAB - Zona 2	8
3. EAAB - Zona 4	7
Total	57


TOP – Entidades con casos pendientes

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	16
2. IDU	13
3. EAAB - Red Matriz	6
Total	63

Número de casos registrados por mes

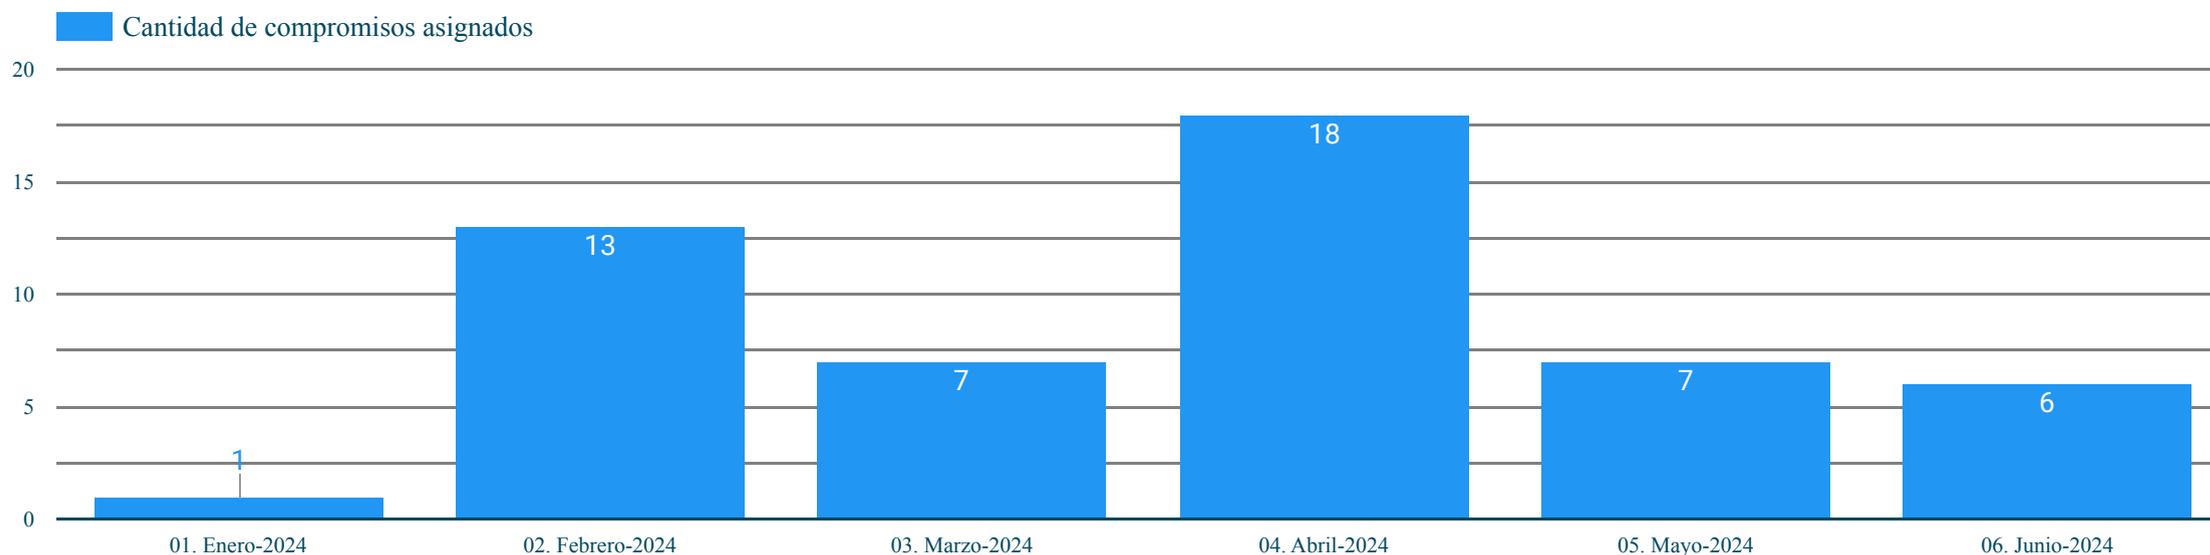

Número de casos por zona o área pendientes

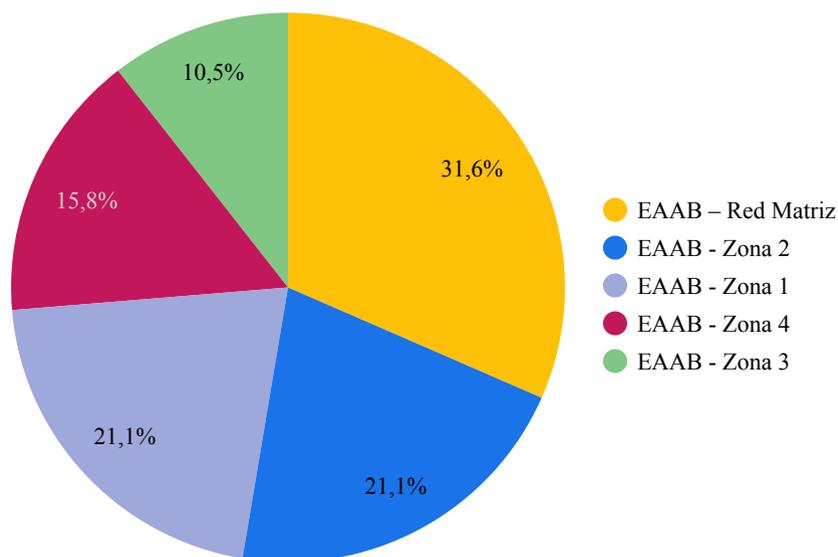

ESTADO DEL...	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.
ATENDIDO	18	Para EAAB - Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?
ATENDIDO	51	Para EAAB-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están ejecutando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se reitera invitación al Ingeniero Jorge Barriga a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de vaciado de concreto.
ATENDIDO	12	Para EAAB - Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video via chat donde se evidencia via local deteriorada nosiblemente por problema de redes se solicita a la ESP verificar v que se



Casos: Enel Colombia SA ESP


COMPROMISOS ASIGNADOS

24

COMPROMISOS ATENDIDOS

8


Número de casos registrados por mes

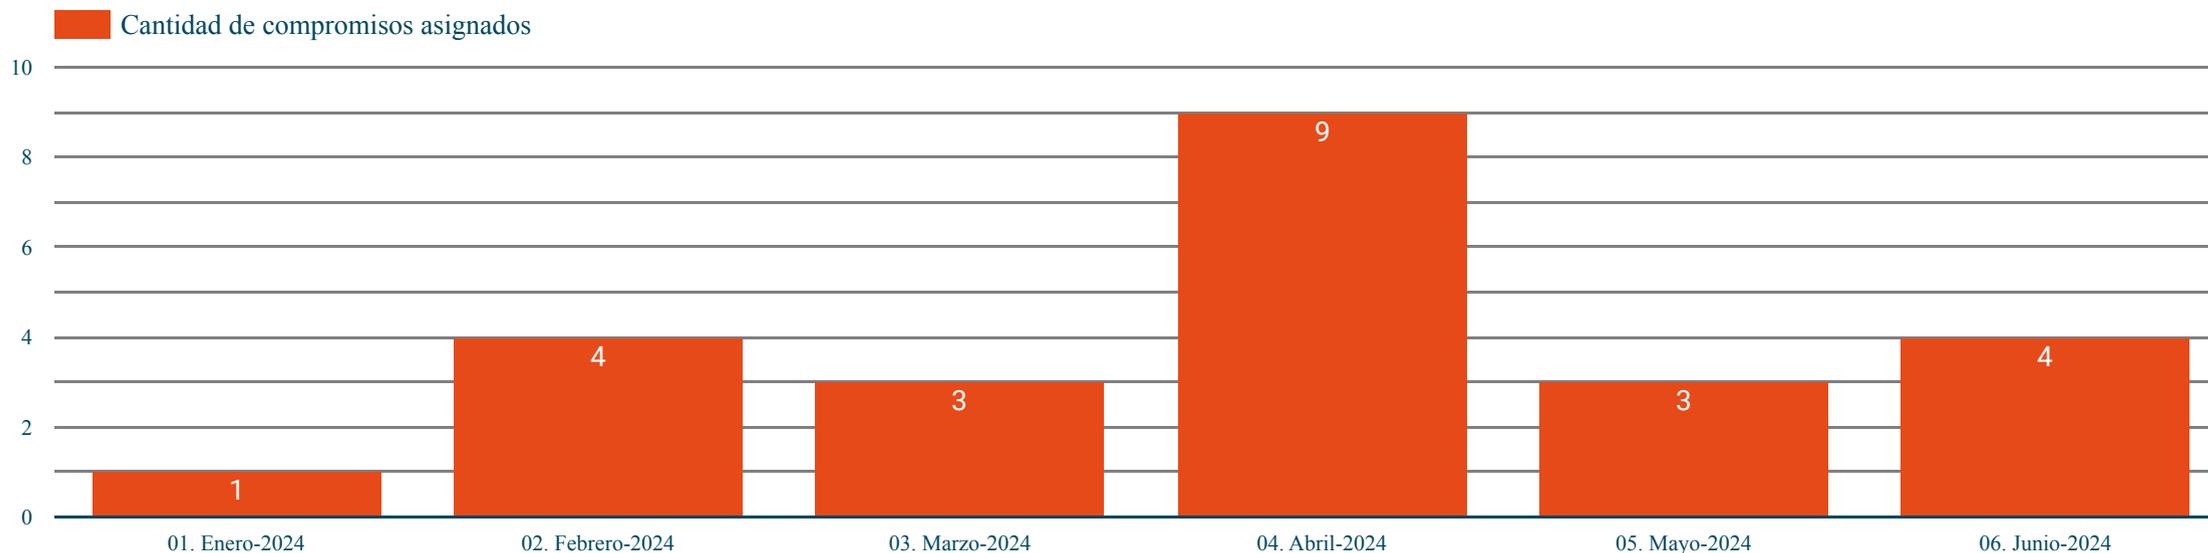

ESTADO DEL CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	34	El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado “diseño local”, se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continua o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicita indicar a IDU levantamiento de la reserva.
ATENDIDO	99	Para ENEL Colombia, mediante radicado 611181811 del 23 de mayo, se solicitó gestión respecto de la comunicación que se recibió para traslado de infraestructura (postes y caja) que pertenece a los activos de esta empresa, que se encuentran ubicados sobre la calzada con movilidad restringida del sector Mariscal Sucre (CIV 2001977 y 2001969). Si bien inicialmente se recibió respuesta donde se indicó que debía radicar la documentación de acuerdo con procedimiento para asumir los costos del traslado de este poste (radicado N°. 000731057 del 05 de marzo de 2024, bajo oficio 0000816096), se requiere visita técnica con delegado asignado por ESP a este contrato de obra, ya que se requiere puntualizar temas de campo para continuar con procedimiento mencionado. Lo anterior, a pesar de las condiciones actuales de la infraestructura propia de la empresa que no cumple con la normativa.
ATENDIDO	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de “paz y salvo” para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.
ATENDIDO	74	Para ENEL, se reporta faltante de tapa en la calle 147 al occidente de la carrera 9 en calzada norte.



Número de casos registrados por mes

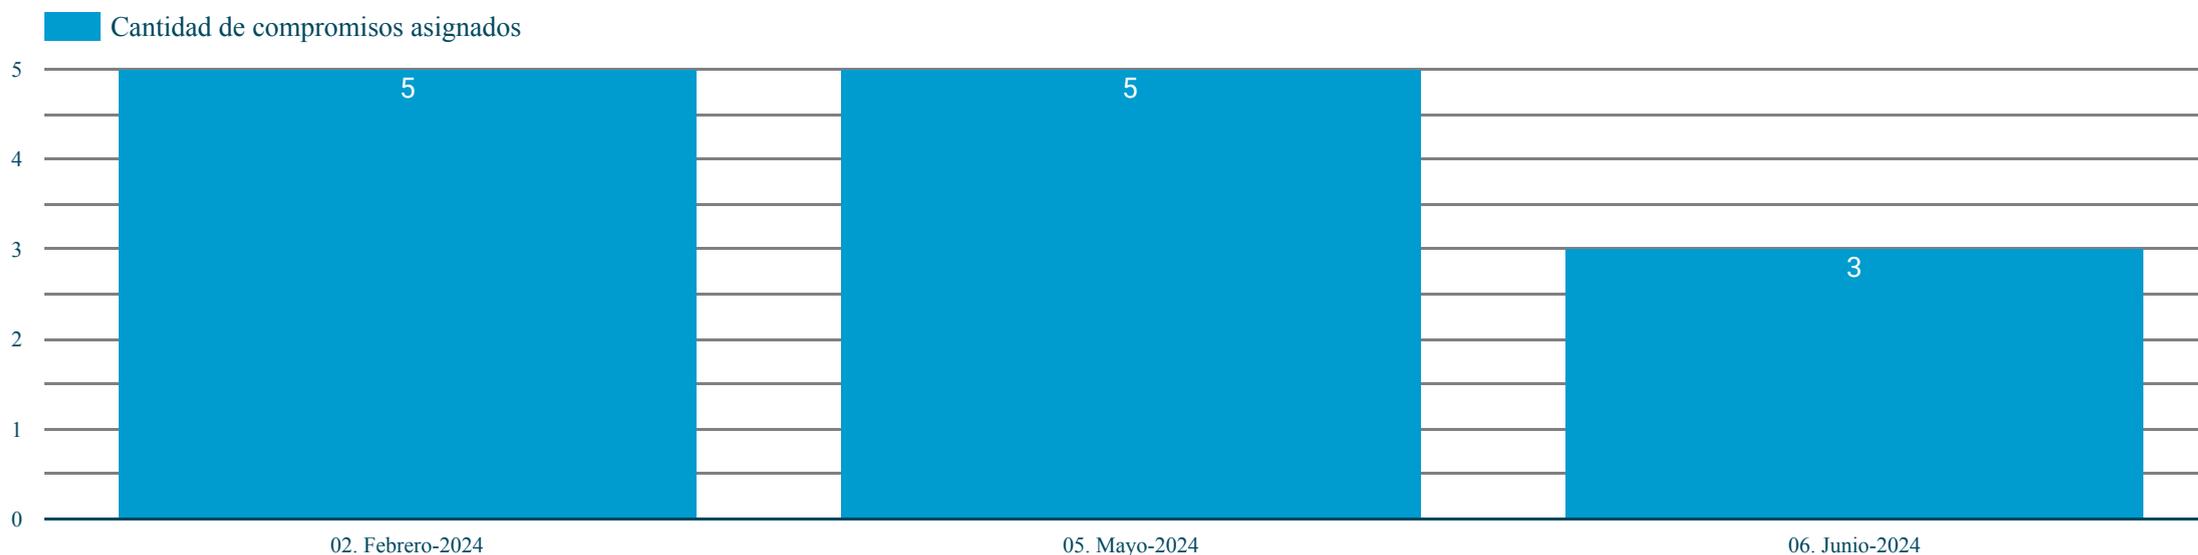

ESTADO DEL CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD
PENDIENTE	6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.
PENDIENTE	26	Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.
PENDIENTE	83	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.
PENDIENTE	86	Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio "El Paraíso", que por nomenclatura se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al parque nacional), se llevaron a cabo obras por parte del FOPAE en conjunto con IDU.

Lo anterior, en aras de mitigar algunos problemas de congestión que se habían en el sector y que estaban afectando la Avenida Circunvalar

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	18	Para EAAB - Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodriguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la arena 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?	UMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodriguez	ATENDIDO	08 - Marzo 07 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=8tTaDhnp7m0y476loYb3EgRl-CdHdCtDwmPw1Q7eNjEBV8	Atendido por Ingeniero Francisco Rodriguez	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	19	Para EAAB-Zona 1, en la Carrera 58 entre Calle 127 y Calle 127d se realizaron intervenciones por emergencias, en la cual se presentó afectación de redes de ENEL, quién actualmente está pendiente por atender reparación, no obstante, apenas se realice dicha actividad, se solicita a EAAB realizar la recuperación del espacio público.	IDU	06 - Febrero 22 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Alta	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=EtZqR3DdHlYVZC850i0wa2b8DwTwdDLUTQCVw7e=HRKPy	Respuesta ENEL - Mauricio Arenas en sesión 09: Se informa que el contrato llegó el lunes al medio día a ENEL, fue revisado por el área jurídica y hoy se remiten comentarios al respecto a la EAAB, no obstante, se informa que ayer se mantuvo comunicación con el Gerente de Servicio al Cliente y con Mauricio Reina del IDU, y hay un compromiso de pago y de cumplimiento de la obligación, entonces hoy se dio la orden de iniciar las obras, entonces ya se encuentran trabajando. En sesión 10 informa: Con respecto a la calle 127, las obras empezaron desde la semana pasada, las obras deberían estar terminando el 22 o 23 de marzo, no.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	20	Para UNE-Tigo, se reportó en la Avenida Ciudad de Cali entre Avenida Calle 26 y Avenida La Esperanza, caja de ESP que se encontraba en mal estado. Por lo cual, se hizo requerimiento de manera íntima.	IDU	06 - Febrero 22 de 2024	TIGO	Delegado	ATENDIDO	06 - Febrero 22 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=ELkSH79wHndTSLc8BDDBCOQaGzFGKNAmmhRAl_A7e=HRVtB	Alvaro Reinoso informa: Ellos atendieron la solicitud, esta situación se encuentra superada.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quien se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	ENEL COLOMBIA	06 - Febrero 22 de 2024	EAAB - Red Matriz	Nubia Riaño	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Alta	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=EtZqR3DdHlYVZC850i0wa2b8DwTwdDLUTQCVw7e=HRKPy	Intervención IDU - Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telfex (actualmente Claro) de características 27B, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una exposición tipo cáscamo con ductería y se instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está constituida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	CLARO	06 - Febrero 22 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=EtZqR3DdHlYVZC850i0wa2b8DwTwdDLUTQCVw7e=HRKPy	ENEL - Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita aceptar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retro de los mismos ya que se observa problemas por accipio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume está subyaciado.	EAAB - Zona 2	06 - Febrero 22 de 2024	IDU	Angélica Taliana López Figueroa	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Intervención IDU - Angélica López en acta 06: Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	24	Para EAAB-Red matriz, se solicita adecuada recuperación de pavimento sobre la Avenida Boyacá con Calle 72, ya que se pueden presentar accidentes.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	EAAB - Red Matriz	Nubia Riaño	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=EtZqR3DdHlYVZC850i0wa2b8DwTwdDLUTQCVw7e=HRKPy	se indica que el 28 de febrero se remitió registro fotográfico de la recuperación del pavimento de este sector, por lo cual, se reporta en la mesa de trabajo como parte de las acciones de coordinación con las empresas de servicio público.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	25	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	26	Para IDU, el peñolista de RCN Ricardo Hano hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	IDU	Onisaba Segura	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Intervención EAAB-Zona 2 - Wilson Porras en sesión 07: Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU-Onisaba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como destino.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	27	Para ENEL, se reporta por parte del concejal Edison Julián Forero que en la Calle 13 con Avenida Boyacá, bajando el puente, sentido occidente-oriental, se encuentra socavación red empresa de servicios públicos, la EAAB red matriz indicó que la no pertenece a la EAAB, se observa cámara abandonada con ductos para canalización.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Sesión 09 - ENEL - Mauricio Arenas: En relación con el caso 27 se efectuó levantamiento, efectivamente se encuentran dos cámaras, una es de ENEL, la hace falta la tapa y se espera que hoy se esté reportado. Así mismo, se evidencia hueco que se formó en el área por la remoción del terreno, se solicita hacer visita conjunta con IDU, para programar las acciones que se deban tomar.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N. 100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros está la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se levantan las campañas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.	EAAB - Zona 5	07 - Febrero 29 de 2024	MOVISTAR	Jorgilio Augusto Peña	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Pendiente	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	29	Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 - 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.	IDU	08 - Marzo 07 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Pendiente	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	30	Para EAAB-Zona 4, se presenta en la calle 30B Sur entre carrera 9C Este y carrera 11 Este, CIV 4004491, hace dos días hubo una lluvia muy fuerte y es posible que un colector se tapara, la UAERMV está adelantando actividades en el sector, pero por la cantidad de lluvia que ha caído, ha sido imposible. Por lo tanto, se solicita la presencia de la EAAB para que se preste su ayuda con la limpieza de las redes, y se verifique si existe algún daño para que la UAERMV pueda seguir interviniendo.	UMV	08 - Marzo 07 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	09 - Marzo 14 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Atendido por el Ingeniero Juan Carlos Lopez - Zona 4 - EAAB	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	31	Para ENEL, respecto del contrato FDLCB 263 de 2023, el contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la mitad de la calzada, en el sector Mariscal Sucre, teniendo en cuenta que el límite de la intervención corresponde a los CIV 2001977 y 2001980, los cuales fueron comunicados mediante radicado 138 de 2024 (consecutivo de la interventoría OFC-COP-263-021-138-2024), por lo cual se requiere comunicación y colaboración de ENEL.	Alcaldía Chapinero	09 - Marzo 14 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Ya se envió respuesta por parte de ENEL, se espera respuesta y gestión por parte del contratista del fondo de desarrollo local. Se generó la oferta para traslado de postes, una vez se realice el pago se programa la maniobra.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	32	Se indica que respecto del contrato 263 de 2023, que tiene que ver con alumbrado público, ya se envió inventario a la UAESP, donde se generó la identificación de puntos donde posiblemente se requieran luminarias por expansión para que esta Entidad pueda efectuar los reconocidos y validaciones correspondientes, y se verifica si hay necesidad de instalar nuevas luminarias, considerando que el alcance del contrato corresponde a infraestructura vial, pero no a espacio público peatonal.	Alcaldía Chapinero	09 - Marzo 14 de 2024	UAESP	Yira Bolaños	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Observación FDLCB-23 de mayo de 2024: PENDIENTE RESPUESTA OFC-COP-263-021-260-2024, radicado 61181811 del 23/05/2024 - Solicitud de verificación en campo TRASLADO DE POSTE - ACTIVO QUE PERTENECE A ENEL - COMENSA LIBICAPOL EN LA CALZADA CON MOVILIDAD. En sesión 17, Dra Yira Bolaños informa que se realizó recorrido de verificación del alumbrado público en la zona, arrojando que se está dando cumplimiento al reglamento técnico. No obstante, si existe afectación del arbolado urbano, por lo cual se identificó que en varios puntos se necesita coordinar con la Secretaría Distrital de Ambiente para autorizar la posa con el generador de uso Promocional. Finalmente, se indica que estaba pendiente por parte de la Alcaldía de Chapinero informar la finalización de las obras, lo descrito en aras de verificar si es necesario hacer algún tipo de modernización. Se reanuda informar.	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	33	Para ETB, el contrato FDLCB 142 de 2018 se encuentra en proceso de liquidación, teniendo dentro de su ruta crítica el certificado de "paz y salvo" de esta ESP, para el caso de ETB, se realizó un informe de validación de daños por un valor aproximado de 800 millones de pesos, donde menciona algunas obstrucciones. Algunas obstrucciones fueron atribuidas al contrato 142, sin embargo, la interventoría presentó un informe con soporte y justificación de como estaban las redes existentes al momento de iniciar la intervención, y cuales fueron los lineamientos de los profesionales de ETB. La información se radició y socializó ayer con el Ingeniero Juan Jiménez en la Alcaldía Local, por lo que se solicita que ETB pueda reevaluar prontamente estos costos por concepto de daños. Es importante que esto se gestione prontamente, ya que el contrato pierde competencia para liquidarse en el	Alcaldía Chapinero	09 - Marzo 14 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Alta	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Se informa gestión al respecto, se reunió delegado de ETB e interventoría del contrato de obra, efectuando recorrido sobre segmentos viales intervenidos, se definieron puntos que deben ser reparados. Observación FDLCB-23 de mayo de 2024: Se realizó coordinaciones en campo para los replanteos aprobados por los profesionales delegados por ETB. Continúa el seguimiento de las actividades.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	34	El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL asociado a un programa denominado "diseño local", se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continúa o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicita indicar a IDU levantamiento de la reserva.	Alcaldía Usaquén	09 - Marzo 14 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes.	Alta	https://sdgppccc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?e=Eq_Wxb_185LnlvNWZmW4pkBvLdXzR8vccVqUjB0a9Q7e=UaonSP	Mediante radicado IDU 202225607972 del 28 de noviembre de 2022, se solicitó levantamiento de reserva.	03. Marzo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	35	El CIV 1007204, es una esquina donde se interseca el anterior segmento vir RR 20 con calle 124, respecto del espacio público asociado aparece reserva a cargo de ENEL para desarrollo del proyecto "diseño local", también con reporte del año 2018, se solicita informar estado de la reserva.	Alcaldía Usaquén	09 - Marzo 14 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	4. Promover porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes.	Alta	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2FEmRbNVPb0BaG1TentLCoABn3648Nv5WwAAuGc6e97e=GT33zT	Mediante radicado IDU 202256207972 del 28 de noviembre de 2022, se solicitó levantamiento de reserva.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	36	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva. Observación FDL - 26 de mayo: Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio público costado norte.	Alcaldía Usaquén	09 - Marzo 14 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	4. Promover porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes.	Alta	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	Pendiente	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	37	Se reportó al Chat el día de hoy 14/03/2024 un caso relacionado con hundimiento en calzada que al parecer tiene su origen en filtraciones o fallos en infraestructura de la EAAB; se ubica en la Calle 63 por Carrera 8ª. Para el mismo comedidamente se solicita verificación y acciones que se requieran por parte de zona 2.	IDU	09 - Marzo 14 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2FEmakKca11Wq0aT0P30pR0xW7WJwvS6S05aCQ0nkw7e=Fkwx	Esta solicitud se atendió con trabajos de reparación de 2 conexiones domiciliarias frente al predio de la Calle 63 No. 3-46 solucionando el problema del hundimiento que se presentaba en el sitio. Estos trabajos se realizaron el día 25 de marzo de 2024.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	38	Se reportó a la EAAB - Zona 4, tapa faltante en pozo de alcantarillado en el sector de la Avenida Caracas con calle 81 sur - Barrio La Andrea - Localidad de Usme.	IDU	09 - Marzo 14 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	09 - Marzo 14 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	Ingeniero Juan Carlos López informa que se repuso tapa	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB - Zona 2.	IDU	09 - Marzo 14 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	Acta 18, Wilson Porras informa que se revisó el tema con el equipo de coordinación interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportan al área correspondiente en acueducto o alcantarillado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades. Así las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en campo no se hicieron de esa manera, sobre la carrera 4 las 3 no corresponden a direcciones.	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	40	Para el contrato de consultoría CON 242 de 2022, se solicita certificado de "paz y salvo" de la empresa de servicio público VANTI, se radicó requerimiento mediante radicado 000716047, se pide pronta respuesta.	Alcaldía Santa Fe	10 - Marzo 21 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	En sesión 12 - Mario Insuasty solicita ampliación de la información por parte de la Alcaldía de Santa Fe, ya que no se ha encontrado referencia a radicado 000716047, se solicita información de contacto de funcionario del FDL. En sesión 17, se solicita cierre de caso, teniendo en cuenta que desde el FDL no se remitió información para dar seguimiento y gestión.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	41	En la calle 32 por carrera 17, se reporta daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por infiltraciones o por daños en infraestructura de la EAAB-Zona 3, se solicita realizar verificación y realizar reparación correspondiente.	IDU	10 - Marzo 21 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	Se efectuó verificación en el sitio determinando que no existe daño en la infraestructura de redes de la EAAB. Adicionalmente las puntas donde se presenta deterioro de la vía no coinciden con el alineamiento de las redes de alcantarillado existentes allí.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	42	Se informa que el FDL-Usme tiene en desarrollo el proyecto de construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemana - Sector 1, contrato 693 de 2023, sobre el mismo se va a expedir la correspondiente licencia, por lo cual se tuvo un contrato de consultoría, ahora bien, se está solicitando la disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado. No obstante, en el año 2022 la EAAB informó que para expedir la disponibilidad requería que se contara con la licencia de construcción, por lo cual se requiere que se confirme esta información o si realmente se requiere es la información correspondiente a la fase de construcción.	Alcaldía Usme	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	20 - Junio 06 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	Observación FDL - 26 de mayo: Se tuvo mesa de trabajo con la EAAB Zona 4, donde indicaron que la disponibilidad de cobertura solo aplica al el proyecto contaba con licencia de urbanismo, por lo tanto, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, la EAAB presentó lo requerido para realizar el proceso de disponibilidad.	06. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	43	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemana - Sector 1, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	Alcaldía Usme	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	Sesión 11 - ENEL - Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días. Observación FDL - 26 de mayo: Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	44	Para EAAB - Zona 4, se presenta situación respecto de vías frente al nuevo Hospital de Usme, en lo referente a red de acueducto y su conexión, ya que por ese sector pasa una red que alimenta a casi 3 localidades. Se ha logrado comunicación con el Ingeniero Cesar Núñez para la revisión de la conexión y realizar los acoples, pero se invita a que se realice visita de campo y se cierre la conexión para terminar la intervención de este contrato.	Alcaldía Usme	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	20 - Junio 06 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	Observación FDL - 26 de mayo: Dentro de la ejecución del contrato 591 de 2021, se realizaron las mesas de trabajo pertinentes con la EAAB, por lo cual se adelantaron todas las acciones pertinentes y a la fecha todo el sistema de suministro de agua se encuentra funcionando sin novedad.	06. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	45	Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comunicó que por el cambio de gobierno no se estarían expediendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.	Alcaldía Usme	11 - Abril 4 de 2024	SDA	Karen Bejarano	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	Observación FDL - 26 de mayo: Se tramitó en el mes de abril un oficio a la SDA con el fin de ultimar detalles. Ya se surtieron los temas técnicos y se está atento a la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de "paz y salvo" para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700798.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	ENEL remitió certificación, se encuentra adjunta al acta 11.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminara la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	En sesión 21, se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODENSA, donde se requiere instalación del barraje necesario para la energización del parque en el cual ya se encuentran terminadas las obras requeridas y solicitan a ENEL la instalación para poder liquidar el contrato ya que este no es posible sin que el parque tenga la iluminación verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	48	Del 336 de 2023, también se requiere certificado de "paz y salvo" por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	Intervención ENEL CODENSA - Mauricio Arenas: Respecto a la energización.	Pendiente
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	En sesión 21, se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, en donde se había identificado que el problema era un tema con el medidor.	Respuesta ENEL CODENSA - Mauricio Arenas: Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	50	Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de malla vial, uno de los tramos de este contrato corresponde a la oreja de San Benito, el CIV 6001440, en este cometido se encuentra un poste de media tensión hacia el acceso a la Avenida Boyacá, se ha venido solicitando traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	En sesión 21, se reitera el estado del caso 50 referente al traslado de un poste ubicado en la oreja de San Benito. Indica que hubo demora en la realización del pago pero que ya se efectuó.	Respuesta ENEL CODENSA - Mauricio Arenas: Indica que recientemente recibieron el pago y que los tiempos de ejecución de la obra son 45 días normalmente pero que ya se está recomendando para que se realice lo más pronto posible.
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	51	Para EAAB-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están ejecutando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se reitera invitación al Ingeniero Jorge Barriga a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de vaciado de concreto.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	19 - Mayo 30 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdg.gov.co/my.sharepoint.com/:f?p=personal%2Fpagamez_sdg_gov_c%2Fv9hUghGJFkDDO_Cm_auBdRufPzYITerWnSDIGOBw7e=7rBxY	En reporte realizado por SDG con delegados de Alcaldías Locales se reporta resultado.	05. Mayo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	52	Se solicita a la EAAB-Zona 2, realizar revisión y reparación de daño sobre estructura de pavimento registrado en la calle 33 entre carreras 17 y 18.	IDU	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/EQwCmo8vG0d9wZAU8B1K6GCoPmG7z1F8GM87e=ZTLPE2	EAAB-Zona 2 – Wilson Porras informa en sesión 12: La semana pasada se hizo la reparación de la red que estaba afectada y esta semana se adelantó la recuperación de espacio público, por la dimensión y características tuvo prioridad.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelven el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	ETB	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/Ew44SAFtPjFA_FAP1C9w4BwCvXap5JhJWVMI1Tr87e=85Z0M	En sesión 12 - Zona 2 – EAAB - Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	ETB	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/Ew1K3YtR9200tK8E1s8m1zPN58G6FZ2NpPRnA7e=SEub4J	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se proceda a emitir respuesta de fondo a la ciudadanía.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	55	Para ENEL, se solicita retiro y reposición de tapa de Enel en la Calle 13 con Avenida Boyacá sobre la glorieta costado occidental.	MOVISTAR	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E0hHqneKA1N0d60zT1920e1E8_XvZ7uYhSA30m0V2ADVADe=Cu8E	Atendido, se reporta mediante chat de WhatsApp el 03 de mayo de 2024.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	56	Para ENEL, se solicita retiro y reposición de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	MOVISTAR	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E0hHqneKA1N0d60zT1920e1E8_XvZ7uYhSA30m0V2ADVADe=Cu8E	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	57	Para movistar, se relaciona con un acción de tutela de un edificio denominado "Esperanza" localizado en el barrio El Recuerdo, cerca a Corferias, la dirección es carrera 36 #25B-50, en el que solicitan la instalación de una cámara, por ahí pasa un cable de claro, una vez revisada la visita se evidencia que la infraestructura corresponde a Movistar (la tapa), por lo cual se adjunta documento de tutela y se solicita a un profesional de Movistar realizar la visita para emitir respuesta correspondiente.	CLARO	11 - Abril 4 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E0d43TuWRLQZ02hMQT1P48JWYcSK871H53aYnX_ZVA7e=EDR8d	En sesión 12 Jolgio Peña de Movistar informa que una vez realizada visita técnica, la tapa correspondió a ETB por lo cual se solicita reasignar caso. En sesión 15, Carmen Rocío López comunica que se realizó visita y se observa que, si tiene redes de ETB, no obstante, la caída no cumple con las especificaciones de la ESP, por lo cual, el caso se remitió al área de construcción para que se hagan los correctivos y se proceda a la instalación de la tapa. En sesión 18, ETB - Carmen Rocío solicita cierre, el caso fue atendido. Se presento inconveniente con obras de construcción de soporte. En sesión 14 se informa que se ha avanzado con visita por parte de la EAAB – Zona 4, y se espera reunión para llegar a conclusiones respecto de la intervención.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	58	Para Zona 4 EAAB, en la calle 30B Sur con carrera 9C Este - Barrio Ramajal, la UMV intervino esta vía, la profundidad máxima de excavación fueron 23 cm. Se están presentado filtraciones en la red de alcantarillado de la EAAB, a la fecha fueron funcionarios a hacer la inspección y manifestaron que el Ingeniero Vega debe autorizar el CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAAB de su valiosa y acostumbrada colaboración ante la situación que se presenta.	UMV	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1TU1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: El ingeniero Santiago Vitar informa que en la inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a instalar manga para remediar el problema de redes en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	59	Para EAAB – Zona 5, el 10 de abril se efectuó solicitud vía correo electrónico para verificar disponibilidad de tubería y accesorios, si es posible que la EAAB apoye al FDL con el suministro.	Alcaldía Bosa	12 - Abril 11 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1U1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	Intervención EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: Se informa que se leyó el correo electrónico mencionado, y se verificará la disponibilidad ya que es bastante material, no obstante, se solicita que a medida que se vayan ejecutando los tramos e vaya requiriendo el material, en aras de priorizar. Por lo anterior, se responderá el correo en los términos indicados y para que se tenga una respuesta por parte de la EAAB.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	60	Para ETB, el contrato 508 de 2021 se encuentra en etapa de liquidación y se requiere apoyo para generar certificado de "paz y salvo" de ETB, se recomendó con el Ingeniero Benjamín, pero no se ha obtenido respuesta. El ingeniero Benjamín se comunicó con el personal de la Alcaldía, e indica que se han hecho varias visitas de obra, en uno de los puntos se observó un daño que se atribuye al contratista, el contratista en aras de obtener certificado de "paz y salvo" con prontitud realizará el pago, pero a la fecha no se ha generado recibo por parte de ETB.	Alcaldía Bosa	12 - Abril 11 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1U1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	Se remitió certificado de "paz y salvo" de acuerdo con lo indicado en acta 14.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	61	Para EAAB – Red Matriz, se reporta en la Diagonal 100B Sur con Carrera 4B daño sobre espacio público donde se ubica tapa de válvula, se solicita reparación.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1U1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	Red matriz informó el 25 de abril que la situación había sido atendida.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	62	Para UAERMV, se reporta en frente a predio TV 1A No. 54A-78 escombros sobre vía pública, se solicita retiro.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	UMV	Humberto Ramírez Gómez	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1U1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	UMV informa en sesión 13 que, una vez revisada la base de datos de la UAERMV, no se intervino este sector, y se reitera que la UAERMV nunca deja escombros sobre vía, se solicita reasignar. Se solicita verificar por parte de la EAAB, cuando se realiza visita el mismo jueves (02 de mayo) se informa que no hay escombros en la ubicación indicada, se remite registro fotográfico vía chat.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	63	Para EAAB-Zona 1, se reporta en la KR 45A entre CL 135A y CL 134D daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por redes, se solicita verificar y realizar la recuperación del espacio público.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1U1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	Se informa que el pavimento ya se encuentra recuperado.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	64	Para UAERMV, se reporta hundimiento en la CL 85 entre KR 12 y KR 13, daño sobre estructura de pavimento, fue verificado por EAAB indicando que no corresponde a daños por redes, por lo cual se solicita su recuperación.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	UMV	Humberto Ramírez Gómez	ATENDIDO	13 - Abril 18 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1U1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	UAERMV informa en acta 19: que no se ha podido intervenir, a la fecha la UAERMV se encuentra tramitando PMT para ejecutar labores en el segmento vial. UAERMV informa en acta 20: que no se ha podido intervenir, a la fecha la UAERMV no cuenta con capacidad operativa para atender el requerimiento, por lo tanto, se priorizará una vez se cuenten con recursos para su ejecución. UAERMV aclara en acta 21: Que el mencionado conductor corresponde a malla.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	65	Para EAAB – Zona 3, se solicita del contrato FDLF-COP-379-2023 que tiene por objeto "Realizar las obras de conservación de la malla vial y espacio público asociado en la localidad de Fontibón, Bogotá, D.C. a través del sistema de precios unitarios fijos y a monto ajustable", la respuesta al radicado E-2024-039952 correspondiente a redes sobre la CL 19 con KR 104B.	Alcaldía Fontibón	13 - Abril 18 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1U1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	En sesión 16, Luis Francisco informa que se cuenta con respuesta mediante oficio E-2024-137144, con esta comunicación se emitió respuesta a la Alcaldía Local de Fontibón.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	66	Para EAAB – Zona 2, se solicita respuesta a certificado de "paz y salvo" radicado mediante número E-2024-022936 del 04 de marzo de 2024, que se relaciona con unas siembras de especies arbóreas.	Alcaldía Engativá	13 - Abril 18 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	19 - Mayo 30 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1U1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	En sesión 15 se informa que: El radicado se encuentra en gestión por parte de la División Servicio Acueducto de la Zona 2, efectuando la validación de la ocurrencia o no de daños en el área de influencia del proyecto. Una vez se cuente con esta validación se procederá a la expedición del certificado de "paz y salvo" solicitado. FDL informa que fue ATENDIDO, la ESP mediante radicado 3232002-S-2024-128593 del 30 de abril 2024 presenta "Paz y Salvo" al contratista, el cual remite al FDL mediante número 20246010094992.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	67	Para VANTI, el contrato de obra pública FDL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 01523CRO1015445 del 05 de diciembre de 2023.	Alcaldía Engativá	13 - Abril 18 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1U1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	En sesión 17, VANTI informa que se emitió respuesta al FDL, se anexa soporte a dicha acta.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	68	Para ETB, el contrato de obra pública FDL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024.	Alcaldía Engativá	13 - Abril 18 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_co/E1U1bcvGHAA6R6K5e5AABz0vPA30d0mGvbnZw7e=EEefr	En sesión 18, ETB solicita cierre, toda vez que se requirió información adicional al Ingeniero Iván, representante del contrato y a la fecha no se ha recibido respuesta.	05. Mayo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	103	Para IDU, en el barrio La Gloria, segmento vial con CIV 4005511 se encuentra reservado por el contrato IDU de conservación 1746 de 2021, no obstante, se declaró incumplimiento y no se ha podido ejecutar este segmento vial. Al respecto es preocupante el estado del segmento vial, el cual se encuentra sumamente afectado por las rutas del TTP y alimentadores que transitan de manera constante, generando repetidas quejas por parte de la comunidad. Por lo cual, se aprovecha este espacio para verificar el encargado del sector puntualmente, y si se puede facilitar un contacto para coordinar de una u otra manera, la intervención a través de acciones de movilidad, sin que se comprometa jurídicamente el proceso que adelanta el IDU.	Alcaldía San Cristóbal	20 - Junio 06 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_103?cf=1&web=1&e=Alm#f	Sesión 20 - Intervención IDU – Jaime Augusto Bermúdez Díaz: Se solicita el número del contrato IDU, ya que al llevar un proceso de caducidad se tienen unos términos legales que es importante analizar, por lo cual, se propone elector una mesa de trabajo para identificar dichas condiciones, en aras de garantizar la correcta y segura movilidad en el sector del barrio La Gloria. Se agenda Mesa de trabajo agenda para el martes 11 de junio a las 7:00 am de manera virtual.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	104	Para ENEL, se realizó solicitud respecto de un CIV ubicado en el barrio Los Laches, en la KR 5 entre CL 7 y CL 9, en la cual se requirió realizar acciones pertinentes sobre poste que se encuentra inclinado, esto teniendo en cuenta visita realizada por IDIGER en la cual se efectuó diagnóstico técnico donde se hicieron algunas recomendaciones al respecto del riesgo que este genera.	Alcaldía Santa Fe	20 - Junio 06 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_104?cf=1&web=1&e=PI#f	Sesión 20 - Intervención ENEL – Mauricio Arenas: Se solicita remitir la petición radicada a ENEL Via correo electrónico.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	105	Para VANTI, en el barrio Los Laches, en la KR 5 entre CL 7 y CL 9, VANTI realizó desconexión del servicio a cinco predios, entonces mediante oficio (que está en proceso de firma) se está solicitando la reconexión dado que el contratista ya realizó las obras correspondientes, entre las cuales se construyó un muro de contención.	Alcaldía Santa Fe	20 - Junio 06 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_105?cf=1&web=1&e=PI#f	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	106	Para EAAB – Zona 2, sobre la calle 85 con carrera 15 se solicita recuperación de espacio público.	IDU	20 - Junio 06 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	22 - Junio 20 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_106?cf=1&web=1&e=PI#f	Acta 20, Wilson Porras informa que a primera hora se remitió el reporte realizado ayer en la noche por la Ingeniería Angélica, para que se hiciera la respectiva verificación de campo y se informe si fue intervención de la EAAB para adelantar la recuperación de la infraestructura. En dado caso que corresponda a la EAAB, se priorizará a través del contrato de espacio público, entendiendo que este punto genera bastantes inconvenientes por su afluencia y garantías de movilidad. Acta 22: Se reporta espacio público recuperado, ya cuenta con registro fotográfico.	06. Junio-2024
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	107	Para UAERMV, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre el AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.	IDU	20 - Junio 06 de 2024	UMV	Humberto Ramírez Gómez	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_107?cf=1&web=1&e=J3ZW	Acta 21, De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quien obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quien es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Recuento de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizó.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	108	Para VANTI, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre el AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.	IDU	20 - Junio 06 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_108?cf=1&web=1&e=paod8	Acta 21, De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quien obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quien es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Recuento de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizó.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	109	Para ENEL, se solicita respuesta de la petición remitida respecto del contrato 1-0125400-1090 de 2021 de ENEL, teniendo en cuenta que aún no se ha emitido pronunciamiento, el radicado de la comunicación es 611211756.	EAAB	20 - Junio 06 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_109?cf=1&web=1&e=K3C	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	110	Para Claro, se remitió correo electrónico con petición el día 23 de abril de 2024.	EAAB	20 - Junio 06 de 2024	CLARO	Nicolás Andrade	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_110?cf=1&web=1&e=X3a3	Acta 21, Claro – Nicolás Andrade Duque informa que la solicitud fue recibida como un PQR por prestación de un servicio (tipo call center), no obstante, se indicó vía correo electrónico que para el requerimiento relacionado con un certificado de "paz y salvo" para obra, se requiere radicación formal mediante oficio en las instalaciones de Claro. Por lo cual, la comunicación podrá ser recibida en el Centro Comercial Plaza Claro y deberá contener los puntos exactos que fueron intervenidos para efectuar la debida verificación in terreno.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	111	Para Movistar, se solicita respuesta de la petición con radicado 20240419105915900 del 24 de abril de 2024.	EAAB	20 - Junio 06 de 2024	MOVISTAR	Jorgilio Augusto Peña	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_111?cf=1&web=1&e=6YQ7	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	112	Para IDU, presenta situación pendiente relacionada con la construcción del cable aéreo San Cristóbal del contrato IDU 1167 de 2023, para su ejecución se tuvieron que demoler en cada estación 2 mazarinas, las estaciones objeto de consulta son "La Victoria" y "Altamira", donde se demolieron predios, pero el IDU no ha generado cierre de las cuentas contrato, de las mismas se está contabilizando consumo. Por lo anterior, se solicita al IDU pronunciamiento, y que como se ha requerido realice los cierres de las cuentas.	EAAB - Zona 4	20 - Junio 06 de 2024	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_112?cf=1&web=1&e=18M4	Durante el día 06 de Junio de 2024, el Ingeniero Alvaro Reinoso remite correo electrónico a la Dirección Técnica de Predios informando la situación presentada sobre el sector, para realizar la debida suspensión del servicio.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	113	Para ENEL, se solicita mesa de trabajo para tratar el tema referente a un contrato de malla vial donde se hace necesario el traslado de unos postes, aun no se ha hecho una radicación formal porque consideran importante que en una primera mesa de trabajo, junto con los profesionales del consorcio, se revisen los estudios y diseños en donde se hace la sugerencia y recomendación de evaluar la cantidad de traslados de postes en cada uno de los segmentos viales. De esa manera se haría la solicitud ante cada ESP.	Alcaldía Usmé	21 - Junio 13 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_113?cf=1&web=1&e=7RNdVc	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	114	Para EAAB-Red Matriz, se solicita visita técnica de la EAAB en la Avenida Ciudad de Villavieja con calle 65 sur (se requiere verificar dirección) teniendo en cuenta que se presentan empalmamientos posiblemente por causa de las redes, y este corredor vial fue intervenido hace poco mediante contrato de conservación IDU.	IDU	21 - Junio 13 de 2024	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_0114?cf=1&web=1&e=ESBk	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	115	Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 FK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	IDU	21 - Junio 13 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_0115?cf=1&web=1&e=YVwPa3	Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedeció a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	116	Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en periodo de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	CLARO	21 - Junio 13 de 2024	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_0116?cf=1&web=1&e=9ZvXk	En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envió contacto para que se genere comunicación correspondiente.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	117	Para VANTI, en el frente de trabajo que colinda con el Colegio Gran Colombiano localizado aproximadamente en la carrera 708 con calle 73A Sur, se observó tubería galvanizada de 12", por lo cual se ha solicitado realizar apiques para que la ESP verifique el estado de la red y con sus recomendaciones se puedan evitar daños sobre la tubería. No obstante, no se ha recibido respuesta. Así las cosas, a través del comité se solicita apoyo a esta ESP para que puedan prestar apoyo y coordinación sobre las actividades que se desarrollan en este sector de la ciudad.	Alcaldía Bosa	22 - Junio 20 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_0117?cf=1&web=1&e=9mVg	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	118	Para IDU, se informa que el FDL-Kennedy ha firmado convenio interadministrativo con el IDU (Convenio 1459), actualmente los contratos derivados se están manejando desde dicha Entidad, por parte del Ingeniero Oscar Hoyos. Se precisa que es un convenio donde se va a mejorar los pasajes comerciales de la fase uno y dos de la localidad de Kennedy, con una inversión por parte del FDL de aproximadamente 8mil millones de pesos y del IDU de 9mil millones de pesos. En cuanto a los estudios y diseños, se solicita conocer su estado, y cuál es el motivo de que no cuenta con aprobación hasta el momento, teniendo en cuenta que ya se subsumaron por parte del IDU hacia la EAAB. El 22 de marzo de 2024 se realizó una mesa de trabajo en la cual la EAAB ESP presentó nuevas.	Alcaldía Kennedy	22 - Junio 20 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_0118?cf=1&web=1&e=1DgZk	Acta 22 - IDU – Jaime Augusto Bermúdez: El IDU verificará el tema con el Ingeniero Francisco de la EAAB, respecto a las no objeciones de los diseños.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	119	Para Claro, se solicita instalar tapas faltantes sobre el sector de la Av. Caracas No. 5-12 y Av. Caracas No. 5-58, barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe.	IDU	22 - Junio 20 de 2024	CLARO	Nicolás Andrade	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgpo.gov.co/Documentos/06_%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%20C3%89%20Caso_s_reportados/2024/Caso_0119?cf=1&web=1&e=bdjWHs	Acta 22 - ENEL – Mauricio Arenas: Se informa que, realizadas las visitas correspondientes, las cámaras pertenecen a empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. El 24/06/2024, ETB verificó mediante visita y se informa que no son parte de su infraestructura.	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	120	Se informa afectación sobre la Calle 80 N°. 69H-20, que de acuerdo con reporte recibido se ubica infraestructura de la ESP – Enel Colombia SA ESP, por lo cual, se solicita recuperación de calzada y realizar acciones pertinentes.	IDU	22 - Junio 20 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp_gov_co/Documents/06.%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Reporte_foto%20a%20casos_reportados2024/Caso_01207caf=1&web=1&e=TVo%20	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	121	Para EAAB-Zona 2, se solicita reparación de ciclomota en el parque El Virrey, toda vez que se presenta hundimiento por posible daño en redes. Ya había sido intervenido este sector por la EAAB.	IDU	22 - Junio 20 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp_gov_co/Documents/06.%20COMIT%20C3%89%20OPERATIV%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Reporte_foto%20a%20casos_reportados2024/Caso_01217caf=1&web=1&e=EDG%20	Acta 22 - EAAB - Javier Porras: Se indica que ya había sido recuperado pero que nuevamente se presentó hundimiento, ayer se programó contratista para que realizará la intervención correspondiente, no obstante, no se ha recibido información de que hayan finalizado actividades. A su vez, es importante indicar que al estar en cabeza de un contratista deberá dar garantía sobre el trabajo ejecutado, y tendrá que realizar acciones pertinentes con las condiciones técnicas requeridas, de igual manera se verificará si nuevamente existe daño sobre la red.	

RESPUESTA SOLICITUD COMITÉ N°20: Arreglo del pavimento Transversal 16B Este con Carrera 16B Este (Barrio Moralba - San Cristóbal) por reparación de tubería Red de Matriz 24" EAAB

Nubia Riaño Abril <nriano@acueducto.com.co>

Jue 13/06/2024 8:30

Para: jefferson.ayala@gobiernobogota.gov.co <jefferson.ayala@gobiernobogota.gov.co>;
diego.caballero@gobiernobogota.gov.co <diego.caballero@gobiernobogota.gov.co>
CC: Jose Omar Cardenas Cardenas <jcardenas@acueducto.com.co>; Leidy Johana Morales Cuervo
<lmoraescu@acueducto.com.co>; alvaro.reinoso <alvaro.reinoso@idu.gov.co>; Paola Andrea Gamez Tabimba
<pgamez@sdp.gov.co>; jaimbermudez <jaimbermudez@idu.gov.co>

 1 archivos adjuntos (76 KB)

20245420145501.pdf;

Buenos días.

De acuerdo con lo solicitado sobre "*La rehabilitación de la estructura de pavimento (losas de concreto) de la intersección ubicada en la Transversal 16 C Este con Carrera 16 B Este y Calle 43 Sur, en el barrio Moralba, Localidad de San Cristóbal*", me permito informar lo siguiente:

La recuperación estaba programada con el contrato de obra 1-01-25400-1518-2023, "ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO". La semana anterior se realizó visita al sitio y se reportó ese punto como ejecutado, sin determinar quién lo ejecutó.

Adjunto imagen de visita realizada el día 31 de mayo de 2024, por la interventoría de apoyo a las labores Red Matriz.

Cualquier información adicional sobre este particular, estaremos atentos a brindarla oportunamente.

Cordialmente,

De: Jefferson Arles Ayala Bohorquez <jefferson.ayala@gobiernobogota.gov.co>

Enviado: jueves, 6 de junio de 2024 8:16

Para: Nubia Riaño Abril <nriano@acueducto.com.co>

Cc: Diego Caballero Rojas <diego.caballero@gobiernobogota.gov.co>

Asunto: Arreglo del pavimento Transversal 16B Este con Carrera 16B Este (Barrio Moralba - San Cristobal) por Reparacion de tuberia Red Matriz EAAB

No suele recibir correos electrónicos de jefferson.ayala@gobiernobogota.gov.co. [Por qué esto es importante](#)

Buenos días

Por medio de la presente, acudimos de sus buenos oficios para que se realicen las gestiones pertinentes para la rehabilitación de la estructura de pavimento (losas de concreto) de la intersección ubicada en la Transversal 16 C Este con Carrera 16 B Este y Calle 43 Sur, en el barrio Moralba, Localidad de San Cristóbal.

Lo anterior se debe a que, EAAB realizo la reparación de la tubería de Red Matriz ubicada en la zona, lo cual requirió la intervención de la vía (CIV 4008526 y 4005156) en durante el mes de enero 2024 pero a la fecha, no ha realizado la reparación correspondiente, tal como se evidencia en la comunicación adjunto (Rad. EAAB E-2024-043275)

Quedamos atentos a sus inquietudes
Gracias por su atención



Jefferson Arles Ayala Bohorquez

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

[facebook](#) [twitter](#) [Flickr](#)

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ESTA COMUNICACIÓN PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACIÓN CON DERECHOS reservados del propietario, por lo tanto el uso de las mismas es exclusiva para el destinatario. Si usted recibió este material por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y borre el email y cualquier documento o documentos asociado con el email. Muchas Gracias. THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.
