

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 11 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 31 de marzo de 2022

HORA: 8:30 am a 09:45 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Álvaro Reinoso	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB			X	
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB			X	
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB				X
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB			X	
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB			X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Prieto Álvarez	FDL Chapinero	Chapinero	X		
Jorge Abreo		Chapinero			

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (10 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. Álvaro Reinoso en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número 11 del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

3.1 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

1. Jorge Abreo, Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.

Presenta el siguiente caso:

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO**: Se ha venido realizando las coordinaciones conjuntas para la definición de traslados o activos de las empresas de servicios públicos, por lo que se ha contado con el apoyo de las mismas. Se han presentado las solicitudes respectivas, y se han recibido las respuestas de ETB y VANTI, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA (CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa.

Solicita el ingeniero Pablo Ponce de ENEL COLOMBIA(CODENSA), el envío de la información al correo pablo.poncedeleon@enel.com.

- Para **EAAB – Zona 2**: Se solicita la respuesta de los dos CIV, de la calle 63 con carrera 3; teniendo en cuenta que el estado actual de la red del alcantarillado se encuentra sobre el espacio público; por lo que se tiene una limitación para intervenir estos CIV, y, solo se intervendría el elemento calzada, por lo cual solicita remitir la información cuanto antes.

2. Jaime Prieto – Fondo de Desarrollo de Chapinero

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDR D y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas, para obtener una copia con los sellos o con un documento donde se muestre la aprobación; por lo tanto, también se hace esta solicitud.

El Ing. Álvaro Reinoso menciona que para el caso con ENEL COLOMBIA (CODENSA), es el mismo contacto mencionado en el caso anterior. Así mismo, interviene el Ing. Wilson Porras, de la Zona 2 – EAAB, comenta que este tema debe ser con la Dirección de Apoyo Técnico de la EAAB; por lo que entrega la información de contacto para que se haga la gestión.

Interviene Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG y hace referencia al caso presentado en la semana anterior; **Caso 104** de la Alcaldía de San Cristóbal, en el CIV número 4001972, donde hay una fuga de la EAAB.

El Ing. Álvaro Reinoso menciona que ya se había escalado el tema con Red Matriz de la EAAB y la Ing. Nubia Riaño de esa área, identificó que es una red menor, por lo que se envió el requerimiento a las zonas para continuar con la gestión.

Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, también menciona que se hizo un consolidado de los casos que han sido presentados en el Comité, con el avance, para que se incluya en el seguimiento, para que se revise e informen si hay alguna respuesta a lo solicitado. **Por lo cual, El caso 64, de la Alcaldía de Kennedy, sale del comité, de acuerdo al informe dado y consolidado.**

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (10 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega: Secretaría Distrital de Planeación

Se da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **10** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **24 de marzo** de 2022, sobre la cual la Arq. Carmen Rocío López de ETB, hace una observación sobre el caso 23 presentado en su intervención; no se hacen más observaciones por parte de los asistentes; por lo tanto, queda aprobada la citada acta **10** de 2022.

Se muestra, además, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. **8** de 2022, ya está publicada, para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Sigue recomendando a las entidades presentes, la gestión que se ha hecho hasta ahora, como en los casos solucionados por parte de la EAAB, ENEL COLOMBIA (CODENSA), ETB, donde se ha venido adelantado la gestión para solucionar algunos, pero aun tenemos muchos que están pendientes; hace referencia también a que hay

muchos de los presentados por las alcaldías locales, que deben ser revisados, porque algunos pueden haberseles dado solución, pero no se han reportado, para sacarlos de la lista de pendientes.

Presenta dos casos nuevos, que fueron presentados en el Chat:

- Para **EAAB - Zona 1**: Intervención de domiciliaria en la calle 155 por carrera 8D, se enviaron las fotos al chat, para que se tengan presente; pues hay una intervención bastante grande en el cruce de la calzada, que llega hasta el pozo.
- Para **EAAB- Zona 3**: Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución.

2. Onisalba Segura – Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura

Se remite al acta de la sesión anterior:

- Intervención **EAAB – Zona 2, (anterior Caso 2, nuevo caso 105)** sobre el pozo de la Carrera 7 por Calle 74; en el comité pasado se indicó por parte del Ing. Wilson Porras de la EAAB, que dicho pozo era de la ETB; pero en el transcurso de la semana, la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, se pronunció vía chat del Comité (el 29 de marzo), manifestando que la estructura del pozo es de la EAAB, portando una tapa de la **ETB**; por lo tanto, vuelve a pasar a al EAAB; **y sigue pendiente.**
- Intervención **EAAB – Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. **Continúa pendiente.**
- Para **EAAB Wilson Porras: (Caso 66)** El día de 10 de febrero se colocó en el chat un tema en la calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado, por lo que se solicita se adelanten acciones para mantener una adecuada movilidad en el sitio. Este tema no se ha dicho nada al respecto, es un tema de un plan de manejo de tráfico que se solicitó, por lo que requiere algún dato o pronunciamiento de la zona. **Continúa pendiente.**
- Para **ETB: (Caso 75)** Relacionado con el contrato IDU 1610 de 2019, ya se hicieron los recorridos de verificación de las intervenciones y está pendiente por parte de ETB, de la entrega de los comentarios, el resultado, las observaciones y/o aprobación de esos recorridos. **Este caso fue atendido, por lo tanto, sale del Comité.**
- Para **CODENSA: (Caso 84)** Se ha recomendado esta solicitud en varias oportunidades, es sobre unos postes que presentan desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044, por lo que se deja en Comité para tratarlos en la siguiente sesión. Se envió la información y antecedentes al correo del Ing. Pablo Ponce de CODENSA. **Continúa Pendiente.**

- Para **ETB: (Caso 91)** Donde se solicitó dar respuesta, respecto al paz y salvo del contrato No. 1386 de 2017, que está pendiente la relación de daños y la factura para pago; la supervisión informó que ya se realizó un pago por daños, pero falta verificar si existen otros daños adicionales; se viene trabajando el tema desde el año pasado, se hizo última mesa de trabajo en diciembre de 2021.

Al respecto de este **Caso 91** informa la Arquitecta Carmen Rocío López de la ETB, que se tuvo reunión con el Contratista y existen unas actividades que están pendientes de revisión por parte del IDU; se trata de unas reparaciones de parte del Contratista, por lo que se pregunta sigue en el Comité; a lo que responde la Ing. Onisalba Segura del IDU, que ya se informó a la supervisora y que considera que continúe hasta tanto se finiquite el tema.

La Ing. Onisalba Segura del IDU, señala sobre este caso, que entendía que ya se había hecho el pago de lo relacionado con los daños, y que lo pendiente era una verificación con el área Jurídica; por lo que la Arq. Carmen Rocío aclara que se entendería que el paz y salvo depende de ETB, pero no es cierto, ya que la razón es porque hay pendientes técnicos.

La Ing. Onisalba Segura del IDU, menciona que la supervisora le ha informado sobre reuniones que se hicieron la semana pasada, pero que no sabe qué era lo pendiente, pues se había señalado que el área jurídica estaba revisando sobre posibles daños; entonces pregunta a ETB si se ha informado al contratista que no hay más daños y que en consecuencia, lo único que hay pendiente es lo que le compete a él sobre los dos frentes?; por lo que la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, menciona que para el acta de entrega de activos, debe hacerse la consultas a las áreas internas de la ETB y cuando se informe por estas áreas que no hay daños adicionales y el área jurídica informe que ya canceló todo, entonces se procede a la firma del acta; por lo cual, la Ing. Onisalba Segura del IDU, precisa que **con la aclaración del caso y al ya no haber daños pendientes, según lo informado por Carmen Rocío, queda cerrado el caso y se solicita retirarlo del Comité.**

- Para **EAAB: (Caso 99)** Fue enviado al chat del Comité el día 14 de marzo-22, al cual se le dio alcance el día de ayer 16 de marzo-22, para aportar el registro fotográfico; y se trata de una intervención efectuada por la EAAB en espacio público frente a la Clínica Reina Sofía, para la cual no fue llevada a cabo la respectiva recuperación; por lo que se solicita verificación y las acciones requeridas relacionadas con la recuperación del área intervenida. **Continúa pendiente.**

Interviene sobre este **Caso 99**, el Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB, y menciona que ya se está atendiendo, por lo que se envió el registro fotográfico al chat; ante lo cual, la Ing. Onisalba Segura del IDU, menciona que hasta tanto se tenga el registro de la intervención finalizado, se continúa dejando en el Comité. Recibido el registro fotográfico que evidencia su atención sale del comité.

- Para **GAS NATURAL, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y CLARO: (Caso 100)** Solicitar respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. **Fue atendido por gas**

natural, por lo que continua pendiente con los otros dos aspectos (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y CLARO).

- Para **ETB (Caso 105)**: En la Carrera 7 por Calle 74, (antiguo caso **EAAB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema por parte de la EAAB, dado que ETB aclaró que la estructura es de propiedad de EAAB, sólo que le fue colocada tapa de ETB.
- La Ing. Onisalba Segura del IDU, hace referencia al **Caso 106** presentado por el Ing. Juan Carlos López de la EAAB, sobre el pozo tapado; por lo cual el Ing. Álvaro Reinoso, menciona que ya se entregó la información respectiva sobre el contratista para que se haga la gestión, y se intervenga el pozo.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

1. Humberto Ramírez – Profesional UMV.

Presenta casos nuevos:

- Para **EAAB - Zona 1**: La UMV viene adelantando una intervención en la carrera 53A No. 128B – 29, se presentaba una filtración de agua, por lo cual se destapó y se encontró un tubo sin continuidad; entonces ya se le transmitió al Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB; **y esta mañana se informó que ya se le dio solución, por lo tanto, sale del comité, como Caso 109.**
- Para **EAAB - Zona 5**: Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5.
- Para **EAAB – Zona 1**: Se hizo un parcheo en la carrera 7ª. entre calles 148 y 150, pero en la revisión se identificó un hundimiento, se solicita a la EAAB Zona 1 revise si existe alguna filtración, antes que se acelere más el daño.
- Para **IDU**: En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE # 5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad.

La Ing. Onisalba Segura del IDU, solicita que se le envíe la información al chat del Comité, para remitirlo al área de mantenimiento del IDU.

5.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

Se refiere a los casos del acta:

- Hace referencia al **Caso 23**, de la Alcaldía de Candelaria, por lo que complementa el informe presentado la semana pasada; referido al paz y salvo solicitado y el delegado ha informado sobre lo que pasa en ese contrato: el Contratista en desarrollo de sus obras, afectó infraestructura de la ETB y en el mes de octubre se hicieron recorridos y se le informó al contratista cuales eran los daños que se tenían y se le solicitó la recuperación de los mismos; pero el contratista no adelantó ninguna acción y la ETB solicitó a la Alcaldía que requiriera al contratista para que realizara estas reparaciones, pero tampoco el Contratista atendió; a la fecha de hoy, la ETB instauró una tutela ante esa alcaldía para lograr la reparación de esta infraestructura; por lo tanto, no es posible otorgar el paz y salvo respectivo. Adicionalmente, se tiene pendiente el tema de la infraestructura de **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**, donde no han sido sellados los ductos ni ha sido retirada la infraestructura de la cámara de la ETB.
- Sobre los casos mencionados por el Ing. Pablo Ponce de ENEL COLOMBIA (CODENSA) y que habían reportados; en cuanto al **Caso 17**, donde se dice que se dio respuesta el 5 de agosto el año pasado, no se ubicó el correo; por lo tanto, solicita la información para poder darle de baja del Comité
- El **Caso 18**, que corresponde a la calle 17 con carrera 13; sobre el cual el Ing. Pablo Ponce menciona que se le dió cierre; no queda claro como se le dio del cierre, pues debe realizarse un sondeo en presencia de ENEL COLOMBIA (CODENSA) porque involucra cámaras que debe ser destapadas; por lo tanto, se comunicará con el Ing. Pablo Ponce para solicitar la programación de visitas a estos puntos concretos, para definir la exclusión del Comité.
- El **Caso 27**, se mencionó por parte del Ing. Pablo Ponce, que también se envió correo en agosto pasado, que correspondía a una cámara de ETB sin tapa; que se había colocado una tapa provisional, y que se solicitó la instalación definitiva; y que se instaló, pero al llegar al terreno se encontró tapada con cemento; por lo tanto, estos casos deben revisarse con ENEL COLOMBIA (CODENSA).
- Reitera que sobre la cámara del nuevo **caso 105** (antiguo **2**) presentado por la Ing. Onisalba Segura del IDU; se identificó que se había puesto una tapa de ETB, pero la infraestructura es de la EAAB.
- Se mantienen los casos anteriores que vienen en el acta, para que e revisen y se les de pronta solución.

Presenta casos nuevos:

- Para **IDU - SDP**: Se trata de obras, una en la calle 90 con carrera 16 de Hitos Urbanos, y donde ETB instaló la canalización en el espacio público, en el andén; y esta obra construyó bajo ese espacio, un sótano; por lo que la infraestructura de ETB quedó descolgada, en la parte superior del techo del sótano; y la constructora dice que no asume ningún costo por traslado, porque dice que ETB está invadiendo el espacio público; pero se ve que es el contratista el que invade el espacio público subterráneo; la consulta es, a quien se puede requerir un concepto sobre esta intervención o utilización de esta área?; si este espacio es publico o en que momento se convierte en privado?.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que el espacio público está definido en andenes y vía, y la intervención de ETB está correcta pues se hizo en el andén; por lo que se puede pensar que quien invade el espacio es el constructor, pues al parecer se sale del paramento y eso lo determina la licencia de construcción otorgada; por lo que el requerimiento debe hacerse directamente a la curaduría urbana, para que aclaren como fue la autorización que se les dio y los lineamientos de intervención del sótano, a estas constructoras.

La Arq. Carmen Rocío López de la ETB, menciona otro caso similar que se tiene en la carrera 68D con Calle 19, en la zona industrial, de la Constructora Bolívar, donde se tiene la infraestructura de ETB y ellos hicieron un cerramiento y dicen que estamos en predio privado; por lo que se tienen programadas visitas para revisar estos casos. Igualmente se tiene otra obra en el Hospital de Kennedy con la misma situación, por lo que se quiere tener claridad que hacer en estos casos.

Interviene el Arq. Luis Alberto Quintero de la SDP, y menciona que está de acuerdo con el Ing. Álvaro Reinoso sobre la revisión de la Licencia de Construcción otorgada y la consulta ante la curaduría respectiva; y que igualmente se puede consultar al interior de la SDP, por lo que solicita el envío de la información detallada para hacer la respectiva consulta, e incluso invitarlos aquí al comité para tratar este y otros casos similares de otras empresas.

La Arq. Carmen Rocío López de la ETB, hace referencia a la Ventanilla Única de la Construcción – VUC, liderada por la SDHT, donde se entendía que era el canal para el ingreso de todos los constructores, pero que se ha visto que van a las curadurías y no pasan por la VUC; por lo que el Ing. Álvaro Reinoso, menciona que la VUC es una plataforma creada para facilitar a los constructores, el diligenciamiento de sus trámites de manera virtual; pero que es un canal adicional para hacer su gestión; y tiene la libertad de utilizar cualquiera de los dos canales, por lo que algunos lo utilizan y otros no.

5.4 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Ing. Humberto Madrid – Profesional Zona 1 - EAAB

- Sobre el **Caso 19**, se hizo verificación con alcantarillado y se drenaron las cámaras de ETB y se trataba de acumulación de aguas lluvias; por lo que se propone retirar del Comité. De deja por confirmación por parte de ETB.
- Sobre el caso de la carrera 7ª. entre calles 148 y 150, presentado por el ing. Humberto Ramírez de la UMV, ya se están revisando los pozos para mirar su comportamiento.
- Sobre el caso de la intervención frente a la clínica Reina Sofía, **Caso 99**, ya se está culminando la recuperación en espacio público y se enviará el registro fotográfico una vez finalice, para la exclusión del Comité.

5.5 INTERVENCION DE CLARO.

1. José Ricardo Velasco – Profesional CLARO

- Informa sobre la demolición del puente del sector de Venecia por causa de la obra de Transmilenio en la Kr 68; por lo cual solicita se aclare cómo van a quedar las redes de telemáticos que pasan por esta zona.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, informa que va a requerir al proyecto para que se invite a las reuniones de seguimiento a la empresa Claro para que se informe.

5.6 INTERVENCIÓN DE VANTI S. A. ESP

1. Mario Alejandro Insuasty – Profesional VANTI.

- Respecto al **Caso 100** informa que ya fue atendida la respuesta de asignación de delegado para el contrato 1738/2021, para que sea retirado del acta.
- Solicita claridad sobre el **Caso 87** respecto a trabajos de topografía, el Arq. Luis Alberto Quintero de la SDP, aclara que corresponde a un requerimiento de la Alcaldía de Puente Aranda; por lo cual Mario Alejandro Insuasty de Vanti, informa que se comunicará con la alcaldía.

5.7 INTERVENCION DE SECRETARIA DE MOVILIDAD

1. Martha Helena Silva – Profesional SDM

Presenta un caso nuevo:

- Para **UMV**: Informa sobre la negación de un PMT-COOS para una intervención de la EAAB en la Carrera 64 entre Cl 80 y Dg 79B debido a que el segmento vial aparece reservado por la UMV; por lo cual, se le informa que se debe realizar la coordinación con el Ing. Álvaro Villate al correo alvaro.villate@umv.gov.co.

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (Sesión 10 de 2022) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Debe verificarse por parte de EAAB,

11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez – Zona 3	EAAB	Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
12	Para EAAB - Zona 2: Cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron (presentado por ETB - 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	Pendiente. Se debe verificar por parte de ETB.
14	En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB - 2021)	Delegado Zona 3	EAAB	Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
15	Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). (presentado por ETB - 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	Pendiente. Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.
17	Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente. Debe validarse con ETB
18	Caso de Calle 17 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Debe validarse con ETB
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Informa EAAB que se drenaron por acumulación de aguas lluvias.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB IDU	Pendiente. Se tiene pendiente programar visita. Se intentado contacto telefónico sin resultados
21	En Calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por ETB - 2021)	Delegados – Zona 1	EAAB	Pendiente. Se realizó visita y no se ha pañetado el muro.
22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Esta en revisión por ENEL

	Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB - 2021)			COLOMBIA
23	Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB - 2021)	Delegados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	Pendiente. Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
24	Cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada. (Presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Pendiente si se arregló la cámara.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.
27	Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa - Contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Debe validarse con ETB
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se debe verificar por parte de ETB.
30	Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
31	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por ETB - I sesión 2022)	Delegados	MOVISTAR, CLARO ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB.	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

	(presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022)			
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por UMV – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Pendiente. Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por UMV – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Pendiente.
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	Wilson Porras	EAAB	Pendiente.
43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no ha solicitado delegado. (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
44	Se sigue recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en visitas se ha encontrado infraestructura de	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

	CODENSA. (presentado por ETB – II Sesión 2022)			
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. No se ha obtenido ningún avance.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. El contratista ya pago el movimiento del poste, pero CODENSA nada que hace la maniobra.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente. No se ha tenido respuesta.
53	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	Pendiente. De acuerdo a la solicitud manifestada por la UAESP se radica

	con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por AlcTunjuelito – III Sesión 2022)			nuevamente los proyectos 21-Mar-22.
54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU - EAAB – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	Pendiente. Pendiente de validación final del caso.
56	En la Av. la Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.
58	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por ETB – III Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.
59	Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por AlcaldíaBosa – IV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB	Pendiente. El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales - Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por AlcaldíaBosa – IV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB	Pendiente. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron.	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. La red eléctrica del salón California está pendiente.

	(Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)			
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022)	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	Pendiente.
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB	Pendiente.
64	Inconveniente en la calle 3 con Avenida Boyacá; solicitud comunitaria para la intervención del segmento, y al revisar el SIGIDU, aparece reservado por la EAAB (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB	La EAAB dio respuesta a la solicitud mediante oficio 2541001-S-2022-060367; por lo tanto sale del comité.
66	Calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado. (Presentado por IDU – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente. Se debe verificar y se informará en el siguiente comité.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente.
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.

	Sesión 2022)			
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente. Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).
72	Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas, pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por ETB – IV Sesión 2022)	Delgados	EAAB IDU	Pendiente. Se realizará visita, pendiente el resultado.
73	Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por Alcaldía Engativá – V Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. No hay avance.
75	Aprobación de recorridos del contrato IDU 1610 de 2019, ya se hicieron los recorridos de verificación de las intervenciones y está pendiente por parte de ETB, de la entrega de los comentarios, el resultado, las observaciones y/o aprobación de esos recorridos. (Presentado por IDU – V Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Este caso fue atendido, por lo tanto, sale del comité.
76	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por UMV – V Sesión 2022)	Humberto Madrid	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
77	Filtración de agua potable, en cámara ubicada en la calle 161 entre carrera 14 B y 15, se	Humberto Madrid – Zona 1	EAAB	Pendiente. Pendiente de revisar otras

	requiere con urgencia porque corresponde al plan de choque que se adelanta con la Alcaldía Mayor. (Presentado por ETB – V Sesión 2022)			cámaras de energía.
77 A	El Contrato en liquidación número 241, de malla vial de la Localidad; sobre un CIV, que al parecer hubo una intervención de la EAAB y rompieron parte del carril el cual ya se le había hecho mantenimiento; en la carrera 51 con 71, por lo que indaga sobre el procedimiento a seguir. (Presentado por Alcaldía Barrios Unidos – VI Sesión 2022)	Wilson Porras – Zona 2	EAAB	Pendiente. El contrato 241 de 2020 que intervino ese CIV está próximo a liquidarse y se requieren una oportuna solución
79	Gestión para invitación a UMV para participar en las mesas de trabajo que se hacen en torno a los RCD. (Presentado por UMV – VI Sesión 2022)	Sonia Duarte Urrego	SDP	Pendiente. Se entregó la información de los delegados a invitar.
80	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A - 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por IDU – VI Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Ya está en programación de maniobras.
82	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por GAS NATURAL – VI Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Pendiente.
83	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	José Ricardo Velasco	CLARO	Pendiente. Debe enviarse información solicitada por CLARO.

84	Postes que tienen desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Ya se está en programación y quedaría efectivo en la primera semana de abril.
85	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente.
86	Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana - ERU, para presentar y articular contratos que involucran movimientos de postes. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022)	Delegados	IDU SDP	Pendiente. Se hizo la gestión, pero no aún no se ha tenido respuesta.
87	Caso contrato 2021, se encontraron trabajos de topografía por parte de VANTI, por lo que requiere el contacto para coordinar acciones. (Presentado por Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022)	Mario Insuasty	GAS NATURAL	Pendiente. La información fue remitida al correo electrónico de manera inmediata, sin embargo a la fecha no se cuenta con respuesta ni contacto para coordinar.
88	En la formulación 2022 de malla vial, se solicitó ante el IDU, reservas viales de 25 segmentos y uno de ellos está reservado por la EAAB, por lo cual solicita el contacto para coordinar acciones; el CIV solicitado es 16002443. (Presentado por Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente. El CIV reportado con acueducto, en la misma reunión, aún no tenemos respuesta ni el contacto de Luis Fco. Rodríguez, para hacer seguimiento.
89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022)	Delgado	UAESP	Pendiente.

90	<p>EAAB viene adelantando traslado anticipado de redes para el METRO en la calle 8 entre carrera 27 y 30 con la instalación de la polisombra, genera inseguridad; por lo que se envió un oficio para tratar este tema. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022)</p>	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<p>Pendiente. No se ha obtenido respuesta del radicado EAAB 20226520127811 del 4-Mar-22.</p>
91	<p>Respuesta sobre el contrato No. 1386-2017, que está pendiente de la relación de daños y la factura, la supervisión informó que ya se realizó un pago por daños, pero falta verificar si existen otros daños. (Presentado por IDU – VIII Sesión 2022)</p>	Carmen Rocío López	ETB	<p>Con la aclaración de ETB, se cierra el caso, por lo tanto sale del comité.</p>
92	<p>Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por ETB – VIII Sesión 2022)</p>	Wilson Porras	EAAB – Zona 2	<p>Pendiente.</p>
93	<p>Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022)</p>	Luis Francisco Rodríguez	Para EAAB – Zona 3:	<p>Pendiente.</p>
94	<p>En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022)</p>	Delegado	SDA	<p>Pendiente.</p>
95	<p>Caso obra de red de agua potable en la calle 12B con carrera 2da., en el Chorro de Quevedo, se hizo demolición de calzada y parte del andén, dicha calzada se había arreglado hace unos 8 meses por solicitud comunitaria; se solicita reposición con las mismas especificaciones (concreto MR43, color ocre) (Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022)</p>	Delegado	EAAB	<p>Pendiente.</p>

96	<p>En la calle 9 con carrera 3; está totalmente oscura, no se sabe si las luminarias están dañadas o apagadas. Otro caso, es en la Avenida José Asunción Silva o Avenida Presidencial, de la carrea 2a. a la carrera 4a., está totalmente apagado este sector. Carrera 4ª. entre la calle 12 C a la 12B punto totalmente oscuro y se hizo hace poco una intervención y se están robando los bolardos instalados.</p> <p>(Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022)</p>	Delegados	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	Pendiente.
97	<p>En la Calle 10 con carrera 5 se tienen unas tapas de Codensa, que se reportó a la UAESP en el mes de enero, y hace que los peatones se bajen del andén y corren peligro de accidentes, por lo que se solicita la reposición de esta tapa lo antes posible.</p> <p>(Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022)</p>	Delegados	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
98	<p>Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo.</p> <p>(Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022)</p>	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA
99	<p>Fue enviado al chat del Comité el 14 de marzo-22, y alcance el 16 de marzo-22, con registro fotográfico; se trata de intervención efectuada por EAAB en espacio público frente a la Clínica Reina Sofía, para la cual no fue llevada a cabo la respectiva recuperación; por lo que se solicita verificación y las acciones requeridas relacionadas con la recuperación del área intervenida.</p>	Delegado	EAAB	Pendiente. Esta en proceso la intervención por parte de la EAAB.

	(Presentado por IDU – IX Sesión 2022)			
100	<p>Respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161.</p> <p>(Presentado por IDU – IX Sesión 2022)</p>	Delegados	GAS NATURAL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CLARO	Pendiente. Fue atendido por gas natural; continua pendiente (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y CLARO).
101	<p>En la Calle 31 Sur número 10D – 10, sobre una queja de la comunidad donde se intervino este sector y no se ha recuperado.</p> <p>(Presentado por UMV – IX Sesión 2022)</p>	Delegado	EAAB	Pendiente.
102	<p>En la Calle 17 entre carreras 5ª. Y 7ª.; debe recuperarse la vía; se informa desde la Gerencia de Intervenciones que es de la EAAB, pero no se tiene la certeza, o si es de la ETB; por lo que solicita su revisión; igualmente menciona que estos casos están relacionados en el chat del comité.</p> <p>(Presentado por UMV – IX Sesión 2022)</p>	Delegas	EAAB-ETB	Pendiente. Se encuentra esta en revisión por parte de ETB.
103	<p>Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394.</p> <p>(Presentado por Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022)</p>	Pablo Ponce de León.	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
104	<p>El FDL de San Cristóbal adelanta intervenciones de malla vial, pero en el CIV número 4001972, hay una fuga de la EAAB, en la zona se les informó que no era con la zona, sino con Red Matriz de la EAAB.</p> <p>(Presentado por SDG – X Sesión 2022)</p>	Nubia Riaño	EAAB – Red Matriz	Pendiente.
105	<p>En la Carrera 7 por Calle 74, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda</p>	Carmen Rocío López	ETB	

	con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por IDU – X Sesión 2022)			Pendiente.
106	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022)	Álvaro Reinoso Onisba Segura	IDU	Pendiente. ya se entregó la información respectiva sobre el contratista para que se haga la gestión.
107	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la EAAB , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
108	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
109	La UMV viene adelantando una intervención en la carrera 53A No. 128B – 29, se presentaba una filtración de agua, por lo cual se destapó y se encontró un tubo sin continuidad; Se le transmitió a Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB; ya se le dio solución. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Ya se le dio solución, por lo tanto, sale del comité.

7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver cuatro (4) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **64, 75, 91 y 109**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

<p>Icono</p> <p>Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada</p>	<p>Decisión</p>
	<p>Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se logró resolver cuatro (4) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 64, 75, 91 y 109; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.</p>	
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

8. COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 07-Abr-22
2	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 07-Abr-22

9. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta décima sesión; recomendando a todos continuar con la gestión de revisar los casos pendientes del Comité; ya que se ha visto que algunos se han podido culminar y/o adelantar las actividades requeridas que se tienen, trabajando de manera conjunta entre las entidades participantes en este espacio para darle solución a estos temas de ciudad; ya que la idea es darle prioridad al interior de las empresas para darle pronta solución a todos los temas en curso.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 07 de Abril de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**ALVARO REINOSO GUERRA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra - IDU

Anexo: Presentación UMV – Ing. Humberto Ramírez de UMV



UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL




TEMAS 31 MAR 2022
COMITÉ OPERATIVO

Carrera 53 A No 128B29

¿ ..y el tubo..?

La UMV, adelanta acciones de parcheo bacheo (PABAS) en el sector y se encontró un escape de agua , al destaparlo se encontró un tubo sin continuidad.

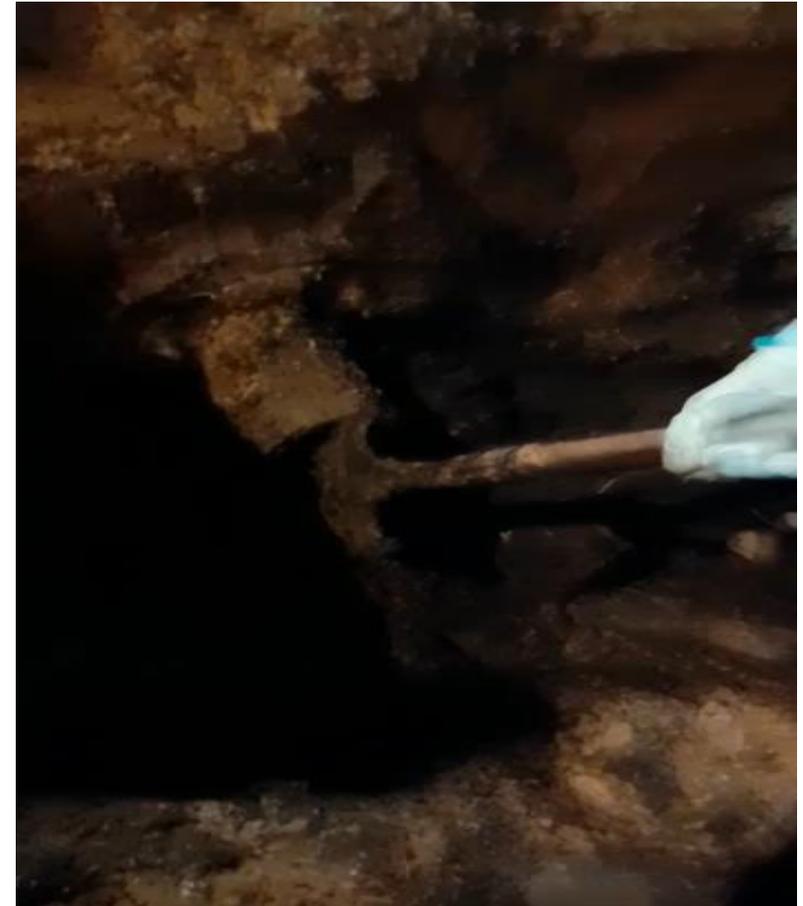



Av. Américas con Carrera 74



tubo superficial





AK 7 entre CL 148 y CL 150 Calzada Occidental Sentido Norte - Sur



“Buenas noches Ingeniero Humberto, que pena molestarte a esta hora, pero te había dejado descansar 🙊. Necesito pedirte un favor, en la AK 7 entre CL 148 y CL 150 Calzada Occidental Sentido Norte - Sur realizamos un parcheo el 04 de marzo. Sin embargo, hoy estuve en el sector, y evidencí que hay un hundimiento (hasta ahora se está formando y todavía no hay hueco) sobre el parche junto a un pozo de inspección. Aparentemente se está reflejando la falla sobre la línea de la tubería. Puede tratarse de un daño en la red de alcantarillado. Por lo anterior, se solicita que la EAAB realice la revisión respectiva. Quedo atenta Ingeniero, porque ya hay una solicitud formal del Concejo de Bogotá. Muchas gracias”





Calle 26 entre Carrera 96 Bis B y Carrera 96 A CIV 9000894 – PK_ID 91018905
localidad de Fontibón



“Evento Sire # 5393760- un favor nos colaboran el mal estado malla vial al parecer por alguna obra AC 26 KR 96 EW. Agradezco su gestión ...”

BACHE PELIGROSO

Una vez realizada la verificación en la base de datos de la Entidad, en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) y el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA); el segmento vial hace parte de la Malla Vial Arterial de la ciudad, a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano- IDU; y se encuentra Priorizado a través del programa Conservación Troncal – Grupo 2 en el marco del Contrato IDU-1719-2021.





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota



UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ
