

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 13 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 20 de abril de 2023

HORA: 08:30 am a 09:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo Triana	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Mauricio Mahecha	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		X	
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL Colombia S.A. (CODENSA)	ENEL Colombia S. A. (CODENSA)		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Insuasty	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		
Lady Salamanca	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	
Romel Mateus	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Camilo Andrés Riaño	Profesional Alcaldía de Tunjuelito	FDL Tunjuelito	X		
David Ernesto Guevara Rincón	Profesional Alcaldía de Usme	FDL Usme	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
6. TOMA DE DECISIONES
7. COMPROMISOS
8. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. Álvaro Reinoso Guerra en su calidad de encargado de la presidencia del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **(13)** del año 2023, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se coordina con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, el orden de intervención de las Alcaldías Locales, se realiza presentación e inicia su participación el delegado de la Alcaldía Local de Tunjuelito:

3.1 Alcaldía de Tunjuelito – Camilo Andrés Riaño Rodríguez:

Caso 192 (Se observa que los casos 53 y 192 se refieren al mismo tema expuesto por la Alcaldía Local de Tunjuelito, por lo cual se cierra el caso 53 y continua activo el caso 192): Solo tenemos requerimientos en este momento para ENEL Colombia SA ESP, vuelvo nuevamente al caso que venimos exponiendo desde junio del año pasado respecto a la aprobación de los diseños de alumbrado público, pues a la fecha continua la negativa por parte de esta empresa.

Se recibió respuesta el día 31 de marzo, donde a pesar de haber mantenido mesas de trabajo con profesionales de ENEL al respecto de la solicitud, se vuelve a recibir concepto negativo, entonces no entendemos las observaciones que están solicitando, en este momento, al Fondo le ha tocado suspender el contrato catorce veces.

Es la suspensión número 14 de un contrato de obra y pues siento que es una situación reiterativa en los demás fondos de desarrollo local, puesto que previas indagaciones se observan que pasa lo mismo.

Intervención IDU – Álvaro Reinoso: entonces sí les han dado respuesta, ¿Lo que pasa es que les han devuelto el proyecto?

Respuesta FDL Tunjuelito – Camilo Riaño: Después de seis meses nos dieron respuesta porque nosotros solicitamos a través del alcalde menor, una mesa de trabajo con el grupo técnico de la ESP.

Actualmente, el diseño está aprobado, se está tramitando un ajuste, se replantea el traslado de cinco (5) luminarias para que este mejor iluminado el sector, se cuenta con factibilidad de todo el proyecto, no entendemos las dificultades que presenta ENEL, tenemos todos los documentos que nos requieren.

Intervención IDU – Álvaro Reinoso: Camilo una pregunta ENEL ya le respondió y les dijo ¿Qué le hacía falta algo? o ¿Qué no estaba acorde con el diseño?

Respuesta FDL Tunjuelito – Camilo Riaño: ENEL indica que se devuelve por tema de documentación, pero está completo el expediente, no es claro en los correos que envía ENEL los documentos que hacen falta.

Intervención IDU – Álvaro Reinoso: Se remite contacto del Ingeniero Pablo Ponce de León y se solicita remitir toda la trazabilidad hasta lo sucedido en el año 2023, para qué gestione como delegado de la instancia, y se pueda escalar en la ESP, así mismo, se solicita enviar copia al IDU.

3.2 Alcaldía de Usme – David Ernesto Guevara Rincón:

Informa que ya no tienen casos para presentar o hacer seguimiento en el Comité. Se solicita cerrar todos los casos presentados en la instancia, ya que se han logrado solucionar gracias a este espacio de coordinación.

Se solicita cierre de los casos: 48, 49, 50, 52, 59, 131, 259 y 261, toda vez que ya se encuentran resueltos.

Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: Ayer se comunicó el ingeniero contratista para tratar algunos temas de la calle 99 con carrera 1, por lo cual se requiere que David este muy pendiente de la supervisión de este contrato. Por otro lado, se solicita apoyo en un tema remitido por correo electrónico al Fondo de Desarrollo Local, respecto de una vía que tuvo una conexión errada.

Respuesta FDL Usme – David Guevara: Se requirió al contratista por medio de pólizas de estabilidad, ese caso entró en seguimiento por parte del fondo, y lo tengo marcado como particular (seguimiento por lo menos mensual) y estamos a la espera del cronograma de ejecución, qué fue lo que le solicitamos en el oficio luego de la visita técnica que se hizo.

Respecto al correo que me comenta, se está procediendo igual con comunicaciones al contratista, hasta el momento no ha dado respuesta, así mismo, estamos pendientes de revisar la hoja de vida del segmento, en aras de ratificar el cambio de red, la profesional de apoyo asignada es Nataly, le voy a requerir que hoy en la tarde le haga un reporte para que le llegue su correo.

4 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

Se informa que el día de hoy no habrá lectura de acta, teniendo en cuenta que el Ingeniero Francisco Calderón fue reasignado en otra área de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo tanto, la delegación pasa a la Ingeniera Paola Andrea Gámez, quién a partir de la fecha vuelve como secretaria técnica y se pondrá al día en las funciones asignadas.

A continuación, se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, UMV, EAAB y ETB:

4.1 IDU – Álvaro Reinoso:

Se solicita realizar revisión de los casos que se tienen en comité para avanzar en la solución y atención de casos presentados en la instancia.

4.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se reiteran los temas pendientes que han sido reportados por parte del IDU.

4.3 UMV – Humberto Ramírez:

Se proyecta presentación realizada por la UMV (la cual se adjunta al acta), y en la cual se exponen los siguientes casos:

- **Caso nuevo:** Evento SIRE 5414763, frente al predio ubicado en la calle 63A #68G-30, barrio Bosque Popular, localidad de Engativá, CIV 10009654 PK ID 1475178, se reporta socavación de 1.00X1.00 metro cuadrado y profundidad de aproximadamente 1.00 metro, es posible que se deba a un daño en la red de la EAAB, lo cual potencia la ocurrencia de accidentes. Se solicita visita de esta ESP, y que se tomen las medidas correspondientes, desde la UMV se reitera apoyo.
- **Casos resueltos:** Por otro lado, se ha realizado revisión de la gestión adelantada, por lo cual se solicita el cierre del caso 68, 313 y 314.

Respecto al caso 313, que es una solicitud de ETB para la reparación de la transversal 19, con calle 44 sur y calle 47 Sur lo informado por la Gerencia de Intervención de la UMV, corresponde a que la vía en comento es arterial y se escapa del alcance que tiene la Entidad.

Finalmente, se agradece a EAAB-Zona 2 - Wilson Porras, por los trabajos desarrollados en el tramo vial de la carrera 96, donde la UMV desarrollaba obras.

4.4 ETB – Carmen Rocío López:

Se reiteran los temas que se encuentran pendientes en el Comité, actualmente no se ha recibido respuesta del caso expuesto la sesión anterior, donde se realiza requerimiento al Ingeniero Luis Francisco de la EAAB, se indica que se ha remitido por correo electrónico soporte, pero no se ha recibido respuesta alguna.

Intervención EAAB - Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez: Me recuerdas ¿Cuál es el caso?, así puedo verificar si le di trámite.

Respuesta ETB – Carmen Rocío López: Caso 417 -Tenemos una filtración en una caja de paso en la Calle 36H Sur N°. 11A-08, se requiere una visita conjunta con la empresa para verificar los daños, se precisa de manera urgente pues corresponde al desagüe de una caja de paso sencilla y sobre la misma se ha presentado derecho de petición.

Intervención EAAB - Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez: Se indica que ya se dio trámite, se va ratificar la información, y se envía correo electrónico nuevamente.

ETB – Carmen Rocío López: Respecto a temas con Secretaría Distrital de Movilidad, tenemos un PMT donde nos informa nuestro contratista que no ha sido aprobado porque está pendiente un visto bueno del IDU.

Intervención IDU – Álvaro Reinoso: Si, esos casos son de la empresa FIBERNET, pues en los últimos meses hemos tenido inconvenientes con esta empresa porque han estado haciendo los reportes fuera de los términos establecidos.

Al parecer los temas de PMT lo están manejando con un subcontratista, y hacen los reportes en destiempo. Voy a revisar y se coordina por medio de llamada telefónica, para indicarles si existe algún inconveniente, o si hay alguna interferencia con otra obra.

4.5 SDG – Jacqueline Friede:

Se realiza solicitud a ENEL, y dejar registrado en la instancia, debido a varios inconvenientes que se han presentado frente a la debida comunicación con el tema de los estudios y diseños, por lo cual, se sugiere delegar una persona o un departamento o alguien para que se atiendan los casos de los fondos de desarrollo local, que como informó Tunjuelito, si se tienen varios requerimientos que no han tenido avance.

Por otro lado, para la Secretaría Distrital de Movilidad, en consejos de gobierno local que se están adelantando con el secretario de gobierno y la alcaldesa se están recogiendo los requerimientos de los fondos y de acuerdo con las solicitudes de la comunidad que asiste a estos eventos, tengo una relación de cinco radicados que están pendientes con la descripción, entonces yo quería comentarle a Martha, si se los envío por correo y ella me puede colaborar con el estado para ayudar a emitir respuesta al subsecretario.

Intervención IDU – Álvaro Reinoso: Para el tema de ENEL, se recomienda que esta gestión se realice directamente desde la Secretaría Distrital de Gobierno, para que abarque todos los fondos de desarrollo local, sin embargo, pues te cuento nuestra experiencia como IDU, nosotros incluso tenemos un convenio con ENEL, pues para los temas de obra y temas de diseño.

En algunos casos también tenemos los mismos inconvenientes por demoras en la aprobación de diseños por diferentes observaciones, sin embargo, hare la consulta directamente con ENEL a ver con qué persona se puede hacer la comunicación para que tú o la secretaria tenga el acercamiento y se les proponga lo que estás planteando.

Intervención SDM – Martha Helena Silva: Si son de PMT, se pueden atender de manera ágil, si son de otra área, se dificulta un poco y el tiempo de respuesta puede variar, por lo cual, se espera correo electrónico para atender requerimiento.

5 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se realiza seguimiento a los compromisos de la vigencia 2023 y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
366	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a realizar intervención de cambio de carpeta en este tramo vial y se requiere evaluar infraestructura de redes húmedas.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
367	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	IDU	PENDIENTE
368	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontró una acometida de agua que está dentro de una cámara de Movistar que se debe renivelar.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
370	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA, SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto Línea Techo Veraguas, adicionalmente se solicita lograr la viabilidad de inicio de actividades de modernización sobre el tramo 2 - Calle 3 entre cra 50 y Av 68 para el primer trimestre de 2023	Entidades participantes en el Comité	SDP emitió respuesta con radicado SDP N°. 2-2023-18434
372	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
373	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
374	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carreras 7 y 9 se realizó visita e inspección y se evidenció que corresponden a acometidas domiciliarias de la empresa de acueducto, se hace el llamado a la zona 1 de la Empresa de Acueducto para que por favor revise, se deja trazabilidad del caso en chat de grupo de trabajo y registro fotográfico	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
375	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
376	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se está presentando un despliegue de la red en tres puntos: Avenida 68 con Calle 26, Calle 26 con carrera 69 y el tercer punto CI 26 cerca a la Av Boyacá	IDU	PENDIENTE
378	Solicitud de priorización al FDL de Usme sobre una intervención en la Calle 99 Sur No. 1A- 61, se remitió solicitud mediante correo electrónico	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE, Acta 05: SDG indica que el correo fue remitido al fondo de desarrollo local sin embargo no se ha dado respuesta

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
379	Requerimiento de respuesta a la Zona 1 EAAB del radicado 3133002 -S-2022-317611 por concepto de instalación de tubería en acero de 14 pulgadas en la Carrera 62 entre Calle 169 B y Calle 167	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
380	Solicitud de trazabilidad en el comité respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A. En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Álvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	IDU	PENDIENTE
381	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRD dan respuesta, lo que ha generado problemáticas para atender el proyecto de fibra óptica para la ciudad, solicita priorizar el caso	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
383	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial Cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Este y 1 Bis C, realizo obras dejando las cámaras de la ETB tapadas, solicita información para ver si por medio del IDU se puede contactar con ellos para que realice los correctivos sobre la infraestructura, queríamos saber si estas constructoras adelantan algún trámite ante el IDU para el recibido sobre el espacio público. Se deja reporte fotográfico por el chat del grupo.	SDP	PENDIENTE
384	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	PENDIENTE, Acta 05: el Ing. Luis Francisco indicó haber realizado el traslado de la solicitud
385	Solicitud de respuesta por parte de la EAAB respecto a los requerimientos E-2022-008905, E-2022-012772 del año pasado y uno realizado en enero de este año, indagando sobre unos tramos viales que están reservados por el consorcio Alcantarillado de Occidente, al momento no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
386	Solicitud para Enel, referente a un poste con riesgo de caída y obstrucción de acceso al predio de la Calle 25B No. 74 50	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
387	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
388	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Álvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
389	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
390	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
391	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
392	solicitud a la EAAB respecto a daños en proximidad al pozo de inspección, posibles daños en la red de alcantarillado. Se solicita evaluación por parte de la EAAB en la Carrera 52 C desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 41 A Sur.		PENDIENTE
393	Carrera 96 por Avenida Calle 63 hasta la Calle 66 A, en este corredor vial la UMV tiene proyectado iniciar obras en un proyecto piloto el día 15 de marzo, se solicita a través de este comité el apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado para lo que tiene que ver con el desarrollo de esta obra.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
394	Filtración de Cámaras en la Carrera 13 A No. 101 - 09 Edificio Oikos, se recibió una tutela por parte del dueño del predio ETB procedió a impermeabilizar la cámara luego de realizar visita conjunta con la empresa de Acueducto, sin embargo, persiste la filtración en el sótano del edificio. El ingeniero Jhon del acueducto programo visita en el edificio. Se deja trazabilidad del caso en el comité	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
395	Caso de una cámara localizada en la Carrera 23D No. 60A - 10 Sur que está sin tapa, una señora tuvo un accidente en dicha cámara	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
396	requerimiento respecto a una consultoría del 2018 sobre dos salones comunales, indica que en 4 años no se ha obtenido resultado alguno, sin embargo menciona que de la consultoría de ambos salones comunales el que se encuentra ubicado en la Carrera 35A con Calle 9 Sur detrás de la Iglesia de Santa Matilde requiere apoyo referente a un contacto para agilizar el trámite de disponibilidad de servicios públicos con Acueducto, Vanti y Enel Colombia (Codensa), indica que con Vanti ya se tuvo la primera audiencia sin embargo la idea es volver a solicitarla.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
397	Tienen 2 CIVs, en compañía del Ingeniero Francisco Rodríguez hemos venido trabajando nos encontramos terminando el primero del cual está pendiente solamente asfalto, había un compromiso de renovar la red de acueducto que se encuentra en asbesto cemento, antes de iniciar los trabajos la situación reportada había sido otra el compromiso con el acueducto era hacer el trabajo nosotros con el contratista realizar las zanjas y el acueducto hacer su trabajo, para eso en particular son el CIV 10002609 Y 16002550 poder tener una fecha definida con el Acueducto porque estamos en este momento frenados dependemos de esa tarea	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
398	otro caso es el del CIV 16002083 vamos a iniciar su intervención, es un callejón cerrado en pavimento flexible pretendemos hacerlo en pavimento rígido, pero por esa misma proyección que tenemos necesitamos la definición del acueducto si allá se van a cambiar o no las redes para poder definir tiempos de trabajo en conjunto. Dirección a intervenir Carrera 51 entre Calles 37 Sur y Calle 28 Sur	EAAB - Zona 4	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
399	solicita una mesa de trabajo para un tema a nivel distrital sobre una intervención en la ladera del rio Fucha, ya se solicitó mediante oficio, se hicieron unas propuestas de diseño para mitigar la habitabilidad de calle en ese lugar, se solicita concepto y reunión para solucionar eso.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
400	En la noche del 6 de marzo de 2023 se hizo un recorrido con la UAESP para el tema de las expansiones que necesitamos en un parque porque es un punto crítico de venta de estupefacientes y de habitabilidad de calle, en este momento se está generando un sendero con la comunidad a partir de la iniciativa juntos cuidamos Bogotá, pero necesitamos las expansiones de esa luminaria, la UAESP nos indicó que cuando termináramos el sendero hiciéramos otro recorrido para solicitarle a Enel el tema de la expansión, nos gustaría darle celeridad a ese tema porque es un punto crítico de la localidad y la comunidad lo ha perdido mucho	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
401	se remitió al chat de trabajo un caso por la Avenida Calle 3 por Carrera 56 para la cual no se observó señalización alguna, fue enviado para verificación a quien está haciendo esa intervención con el objetivo de que se recupere el espacio.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
403	nos encontramos haciendo una revisión en el proyecto Demarcación Cartográfica de la zona de reserva para el desarrollo de los proyectos "Nodo de equipamiento Altamira" y Nodo de equipamiento La Gloria, nosotros hacemos una revisión urbanística de la estructura funcional y del cuidado para poder generar este tipo de reservas, en temas de servicios públicos lo que aparece reportado por Enel es que hay una red de media tensión es aérea cuando se hace la verificación de visores, pregunta para Enel es si existe una impresión geográfica para esta área o si la red fue trasladada y no fue reportada, solicita confirmación a Pablo Ponce.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
404	solicitud al acueducto zona 5 sobre un caso reportado en marruecos Calle 50 A Sur No. 7 – 64, requiere que atienda visita en este sector.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
406	solicitud para las empresas ENEL Colombia, Vanti, ETB y Acueducto, están por iniciar dos proyectos un parque de bolsillo en la Calle 7 con Carrera 3 y uno de espacio público en la Calle 12C entre 1A y Carrera 3 desde la Calle 12B hasta la Calle 12D, requerimos acompañamiento de las empresas con el objetivo de generar un diagnóstico de redes para que el contratista las tenga en cuenta, la semana pasa se enviaron las solicitudes, pero no se ha obtenido respuesta, pregunta que si por medio de este comité se puede generar la cita.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
407	Caso Nuevo: Requerimiento para Enel Colombia, estamos en ejecución de un proyecto de mantenimiento de andenes Calle12B entre Carrera 2 y Carrera 3 hay una caja de una tapa de Codensa que está en pésimo estado, quisiera saber cómo hacemos el requerimiento para tener esa tapa en buen estado.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
408	presenta requerimiento para la zona 1 de acueducto con el ing. Mauricio Mahecha, donde un ciudadano reporta una queja indicando que hace más de dos meses la empresa de acueducto rompió e hizo una zanja frente al predio de la Carrera 46 No. 138 – 53 y no se ha recuperado, para que por favor zona 1 investigue a que contrato pertenece.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
409	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	SDM	PENDIENTE
410	En la Carrera 62 con Calle 62 hasta la Calle 64 en el barrio Santa Rosa Sur hay cuatro segmentos viales que no cuentan con alcantarillado pluvial, se solicita apoyo a la EAAB, la comunidad manifiesta que en ocasiones se ha generado inundación en sus predios.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
411	El año pasado se presentaron unas solicitudes de factibilidad a ENEL para el servicio en Betania y San Juan. Se hicieron visitas técnicas y nos informaron que para Betania se tenían que hacer unas adecuaciones eléctricas que ya se están estudiando dentro de una formulación. Sin embargo, quedó pendiente el tema de San Juan, indica que de esas visitas no recibió acta, adicionalmente desconoce si la información fue recibida por ingenieros y arquitectos que ya no están en el fondo, es decir que se perdió la trazabilidad del caso, pregunta si es posible que de parte de ENEL que le remitan las actas de esas visitas técnicas.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
412	El FDL de Chapinero el marco del Decreto Distrital 168 del 2021 ha solicitado la asistencia técnica tanto a empresas de Servicios Públicos como entidades distritales, sin embargo algunas de estas entidades no nos han dado respuesta, es muy importante contar con los delegados de cada entidad para poder llevar a cabo las mesas de trabajo de asistencia técnica teniendo en cuenta que en los estudios y diseños que existen en el banco del FDL de Chapinero se prevé la subterranización, traslado y protección de redes de servicios públicos perteneciente a los activos de cada empresa. Se han adelantado algunas mesas de trabajo con algunas entidades distritales, sin embargo en este momento estamos a la espera de los delegados de la Secretaría Distrital de Planeación por parte de la Secretaría Jurídica, IDU, Claro, ENEL Colombia, IDPC, Movistar, Promo ambiental, Catastro, Une EPM, Grupo Energía Transición, DADEP, Requerimiento N. 2 Al IDU y Secretaría Distrital de Hábitat. En el mismo correo donde se envió la invitación a la convocatoria se va a enviar estos oficios con los acuses de recibido por parte de cada una de estas empresas y entidades, con el objetivo de contar con la asistencia tecina y respuesta oportuna a los procesos de formulación del FDL de Chapinero.	IDU	PENDIENTE
413	El contrato 159 de 2022 etapa preliminar, necesitamos iniciar unos trámites: Acueducto, ENEL Colombia y IDPC, por parte del IDPC estamos en trámite, al Acueducto se solicita visita para revisar el tema de CCTV de las redes.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
414	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	SDM	PENDIENTE

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
415	Solicitud al Ing. Pablo Ponce para que por favor nos ayude a evaluar el cobro de energía de la planta la esmeralda, la sede de producción, nos llegó un cobro por 235 millones de pesos, estamos un poco ilíquidos, de acuerdo con una revisión que hizo uno de los contratistas de ENEL para evaluar el cobro se dio cuenta que en algún momento el consumo de energía había bajado y establece que como es una sede industrial entonces nosotros producimos todos los días las mismas cantidades y no es así , hay meses donde no tenemos la mezcla de agregados y donde la producción baja, ya le escribí al Ing. Pablo Ponce no me ha contestado voy a reiterar a ver cómo nos puede ayudar para ver a quien le respondemos el requerimiento y si nos dan plazo para pagar eso.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
416	Corresponde a la filtración de aguas residuales entre la transversal 19 y calle 46 sur donde se ubica la central de ETB San Carlos, hay una filtración de aguas residuales que está llegando a la red de ETB y está ingresando al predio San Carlos y está generando malos olores adicionalmente está afectando al colegio Bernardo Jaramillo, no sabemos si hay un tubo roto conexión errada o alguna que está ocasionando esta problemática.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
417	Para EAAB – Zona 3, tenemos una filtración en una caja de paso en la Calle 36H Sur N°. 11A-08, se requiere una visita conjunta con la empresa para verificar los daños, se precisa de manera urgente pues corresponde al desagüe de una caja de paso sencilla y sobre la misma se ha presentado derecho de petición.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE Acta 13: Se indica que se remitió respuesta por correo, se informa reenvío de información el 20 de abril.
418	En la calle 127 con 13A, la semana pasada se informó al delegado de EAAB - Zona 1, sobre una filtración de agua, allí enviaron personal, pero dijeron que no era del alcance de ellos. Sin embargo, ETB está preparando la cámara y arreglando todo lo que le corresponde, no obstante, la filtración continúa. Por lo cual, se le requiere a la EAAB que revise la filtración y solucione este inconveniente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE

5.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
- Casos presentados	365	100,00%	53	100,00%
- Casos resueltos al corte	210	57,53%	6	11,32%
- Casos pendientes al corte	155	42,47%	47	88,68%

6 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

6.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios

Públicos del Distrito Capital, se logró resolver doce (12) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 48, 49, 50, 52, 53, 59, 131, 259, 261, 313 y 314, así mismo se presentan avances en otros casos a cargo de IDU, ETB, EAAB y VANTI, por tanto, se espera verificación final para realizar cierre.

Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

6.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se logró resolver doce (12) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 48, 49, 50, 52, 53, 59, 131, 259, 261, 313 y 314; así mismo, se presentan avances en otros casos, sobre los que se espera efectuar verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.</p>	
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

7 COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 27-abril de 2023
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Data Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 27-abril de 2023
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (virtual o presencial).	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 27-abril de 2023

8 CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye la sesión número trece del Comité para la vigencia 2023, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 27 de abril de 2023 a las 8:30 am, de manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLADO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE**



**PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA**

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP.
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
Aprobó: William Orlando Luzardo Triana - IDU.

Anexo: 1. Presentación UMV – 20 de abril de 2023.
2. Tablero de control – COISP – Corte del Acta 13 de 2023.



UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



TEMAS 20 ABRIL 2023
COMITÉ OPERATIVO





EVENTO SIRE 5414763 CALLE 63 A 68G30 BARRIO BOSQUE
POPULAR LOC ENGATIVA CIV 10009654 PK ID 1475178



SOCAVACIÓN 1.0 X1. M2 PROF 1. M
DAÑO EN RED DE LA EAAB
PELIGRO DE ACCIDENTE.





SOLICITUD CIERRE DE CASOS

- CASO 68.** Queja presentada por la Sra. Doris Edith Martinez. Obras en la ciclorruta Alameda el Porvenir
- CASO 313.** Solicitud reparación Transversal 19 entre Calles 44 y 47 Sur . Vía arterial la UMV no tiene competencia para la atención del caso.
- CASO 314.** Intervenciones en el Barrio 20 de Julio por parte de Vanti.





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial




@UMVbogota



UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ

Número de casos registrados por mes

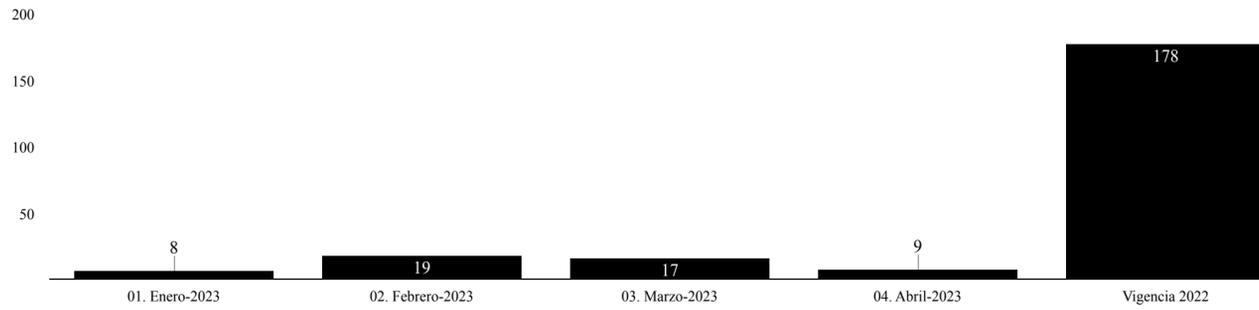

Nº. de casos registrados

231




Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable

MES REPORTE DE CASO

Número de casos resueltos por mes

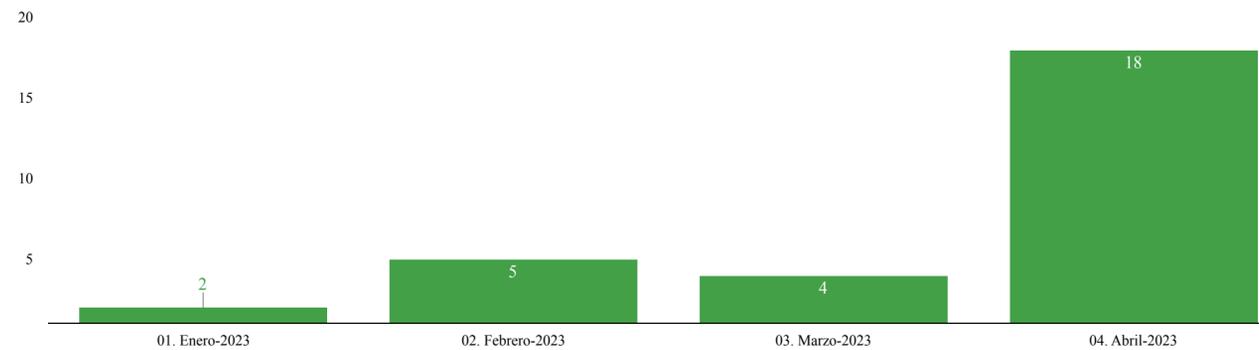


Nº. de casos resueltos


29



Porcentaje de avance

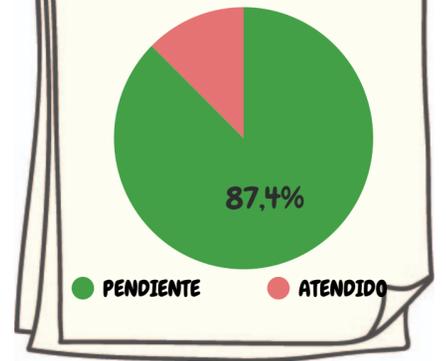

Número de casos pendientes por mes

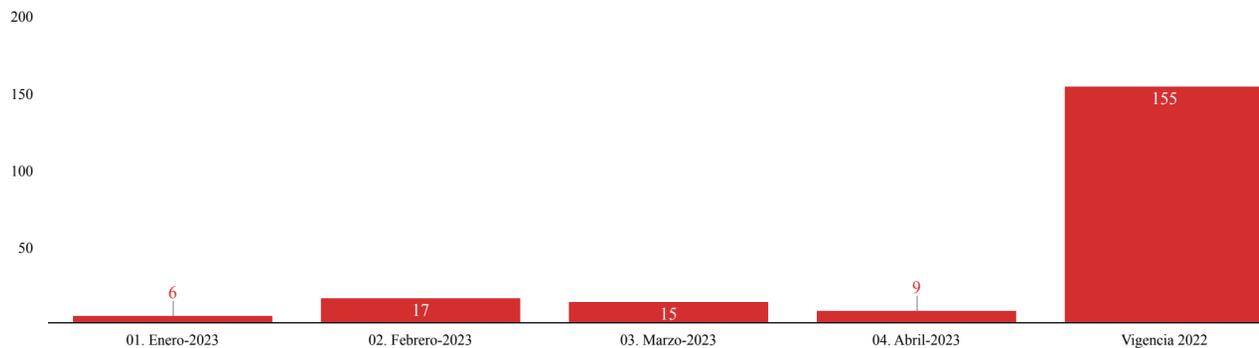

Nº. de casos pendientes

202



TOP - Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	45
2. EAAB - Zona 2	26
3. IDU	23
Total	231


TOP - Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	8
2. EAAB - Zona 2	3
3. UMV	3
Total	29


Recuento de casos

Nº. SESIÓN DE ...	Nº. DE CA...	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO
02 - Enero 26 de 2023	368	MOVISTAR	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr...	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	367	MOVISTAR	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres...	IDU	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	366	UMV	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A - CIV 1005620, ya que se va a rea...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	369	IDU	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu...	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de ...	373	EAAB - Zona 4	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio car...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	372	SDG	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	371	Alcaldía San Cristóbal	Para Enel Colombia, la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022...	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de ...	370	ENEL COLOMBIA	Se solicita coordinación con entidades como Acuecuto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto...	Entidades participantes en el Co...	PENDIENTE
04 - Febrero 09 de 2...	374	UMV	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	376	MOVISTAR	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos:...	IDU	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	375	UMV	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	377	Alcaldía Kennedy	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully ...	IDU	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	385	Alcaldía Engativá	Solicitud de respuesta por parte de la EAAB respecto a los requerimientos E-2022-008905, E-2022-012772 del año pasado y ...	EAAB	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	384	ETB	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	380	VANTI GAS NATURAL	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón ...	IDU	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	383	ETB	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Est...	SDP	PENDIENTE

Número de casos registrados por mes

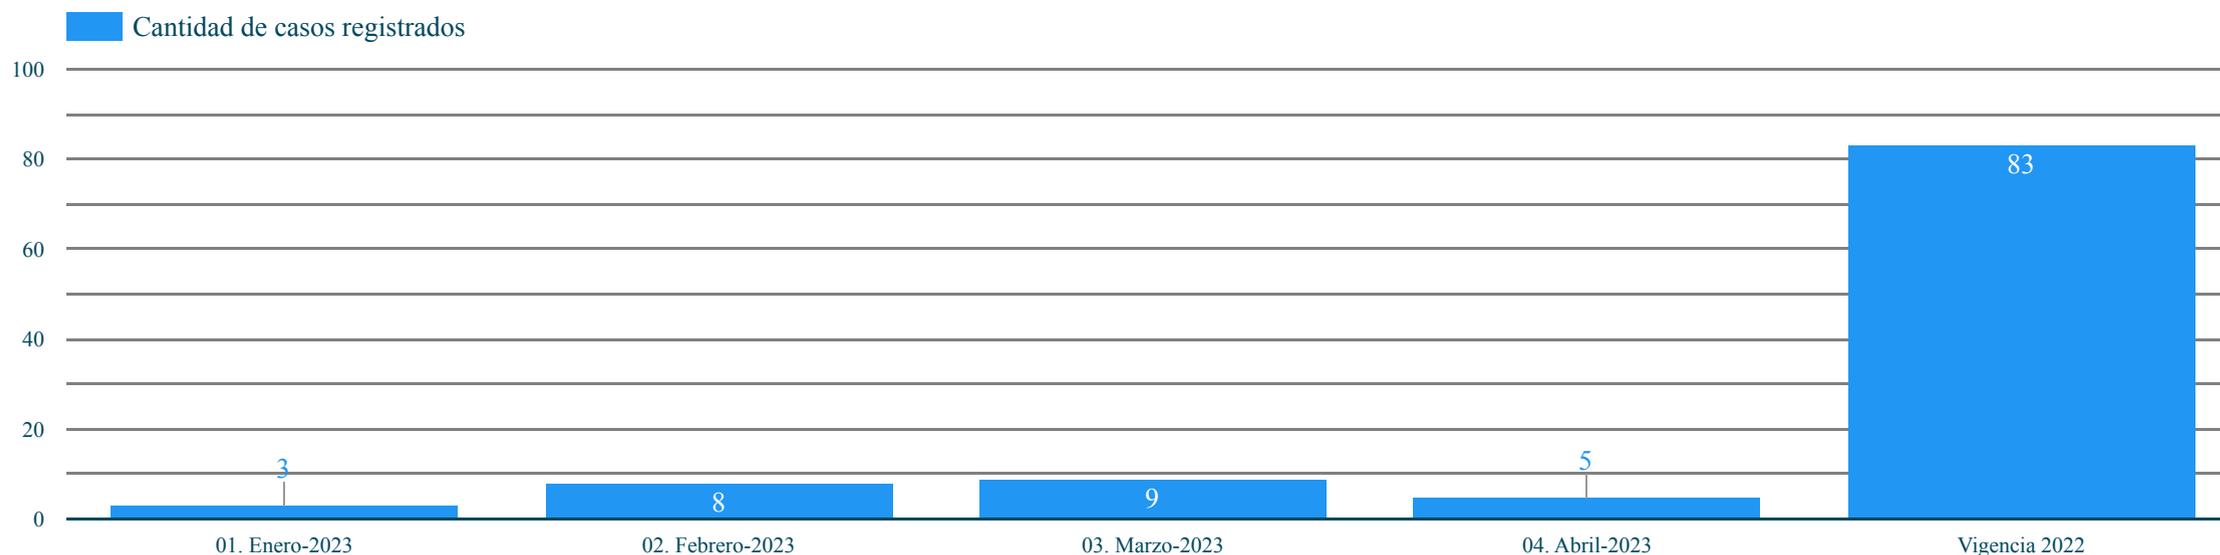


Número de casos por zona o área pendientes

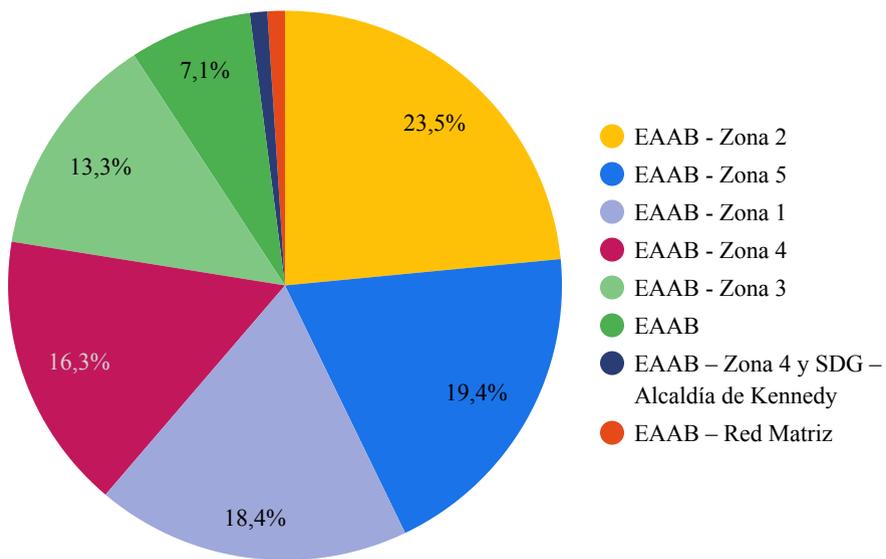


Nº. DE CASO...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EABB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	PENDIENTE
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	PENDIENTE
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU - II Sesión 2022)	PENDIENTE

Número de casos registrados por mes

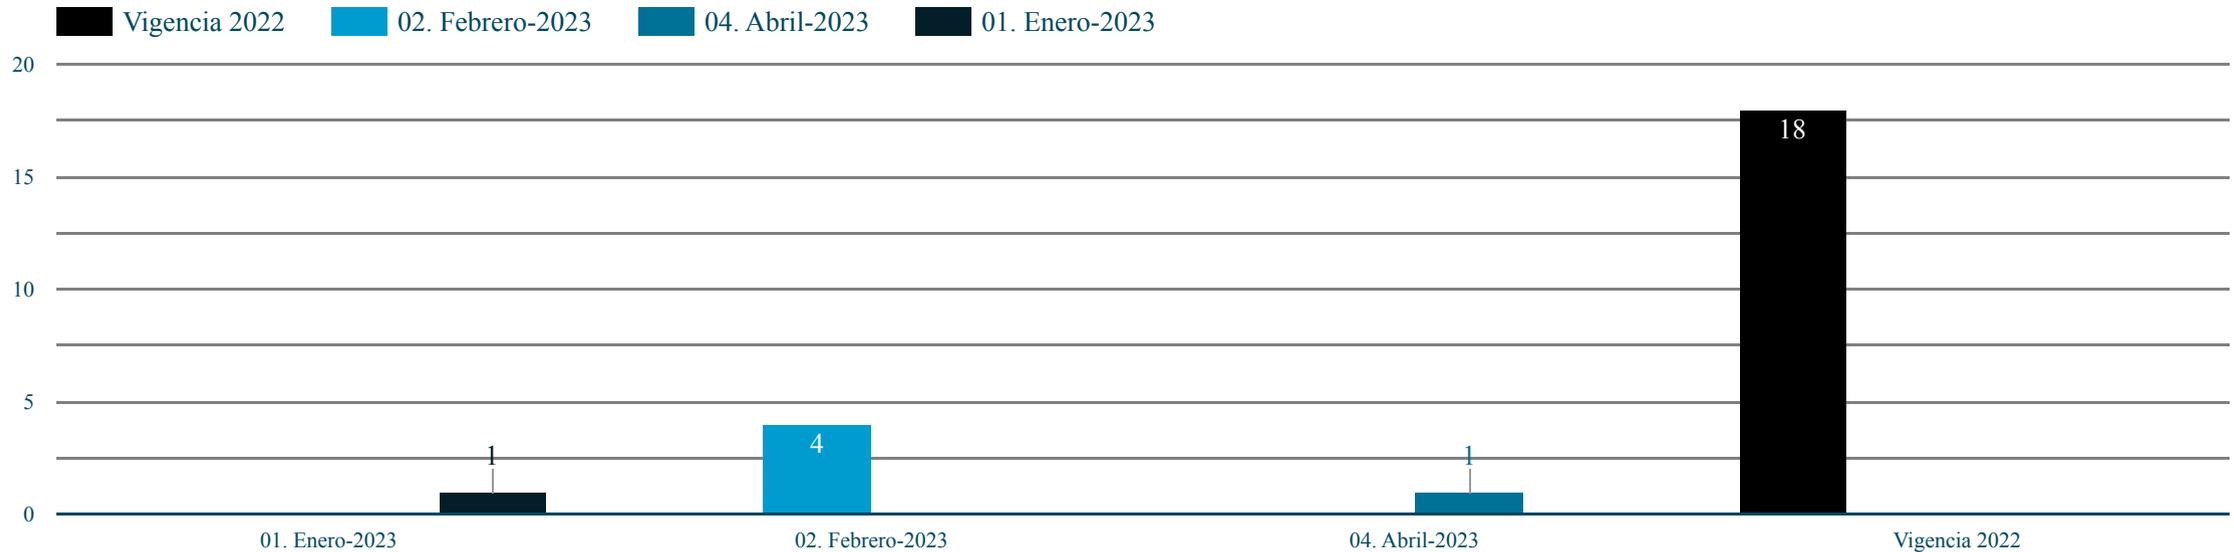

Número de casos pendientes por responsable

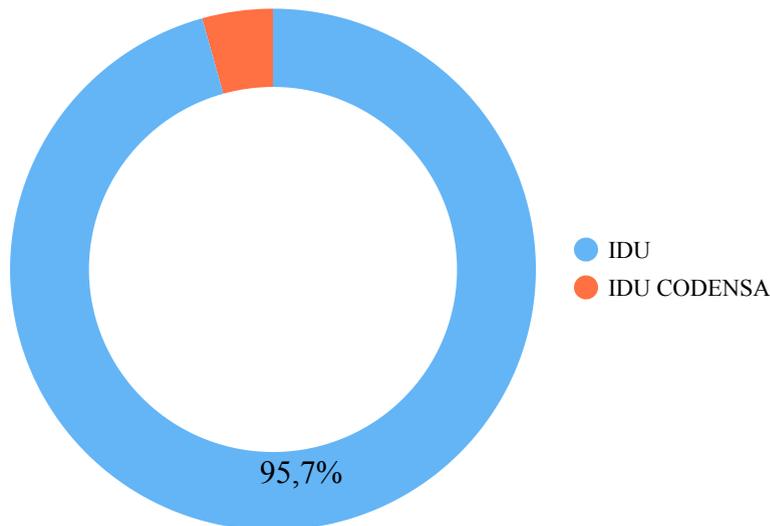

MES REP...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, CI26 con KR 69 y el tercer punto CI 26 cerca a la Av Boyaca	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va	PENDIENTE



Casos: Unidad de Mantenimiento Vial - UMV

N°. de casos registrados

4


N°. de casos resueltos

3

Número de casos registrados por mes




Pendientes por Entidad que presentó el caso




MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para la UMV, para las intervenciones en el barrio "20 de julio", se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tuno – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	ATENDIDO


Número de casos registrados por mes

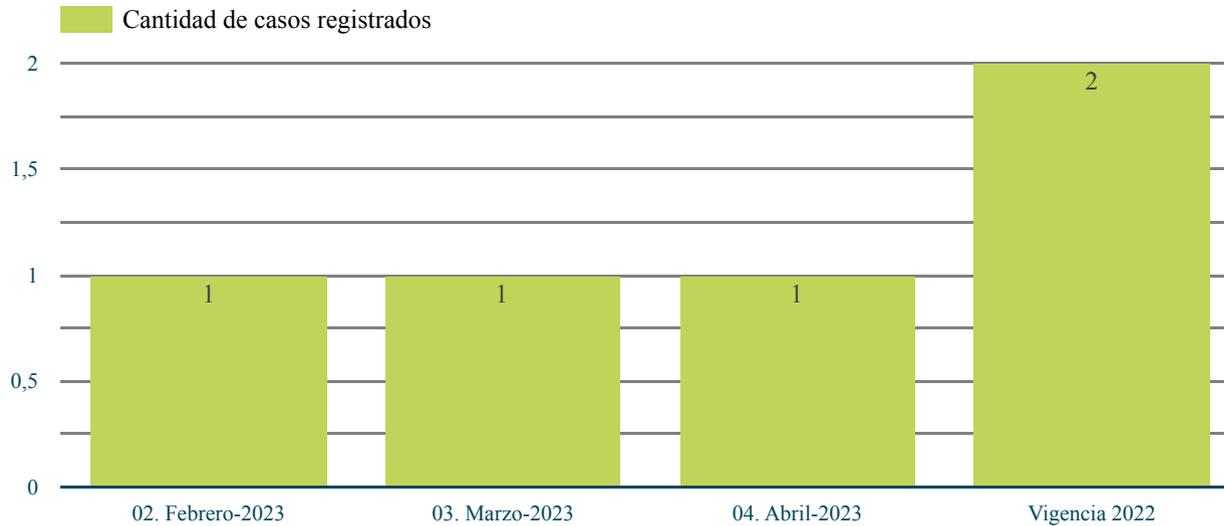

Pendientes por Entidad que presentó el caso

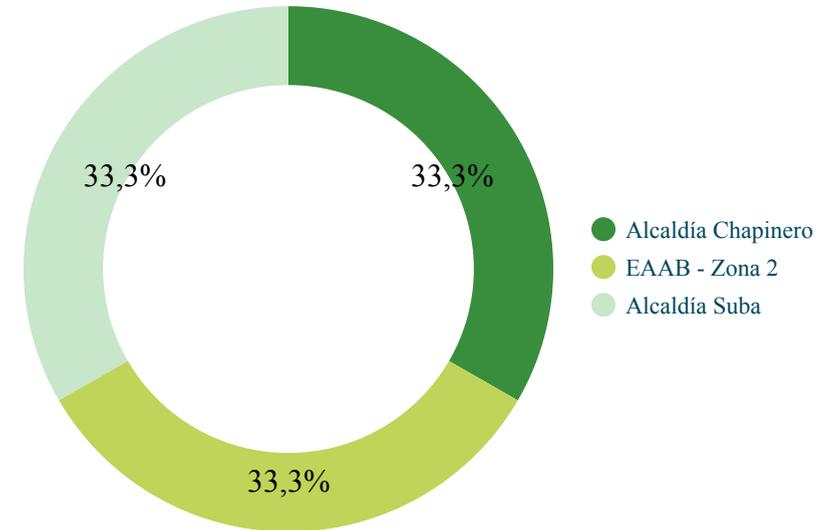

MES REPORTE DE CASO	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	PENDIENTE
03. Marzo-2023	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	PENDIENTE
04. Abril-2023	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para SDM, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir aprobación de los diseños de señalización para el contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para SDM, frente al contrato N°. 398 de 2017 se tiene aprobación de los diseños, ya se cuenta con implementación de la señalización, se requiere recibo por parte de la Entidad, para generar certificado de “paz y salvo” en esta vigencia, y así desembolsar recursos de la liquidación.	ATENDIDO



Casos: ENEL Colombia ESP


N°. de casos registrados

46


N°. de casos resueltos

8

Número de casos registrados por mes

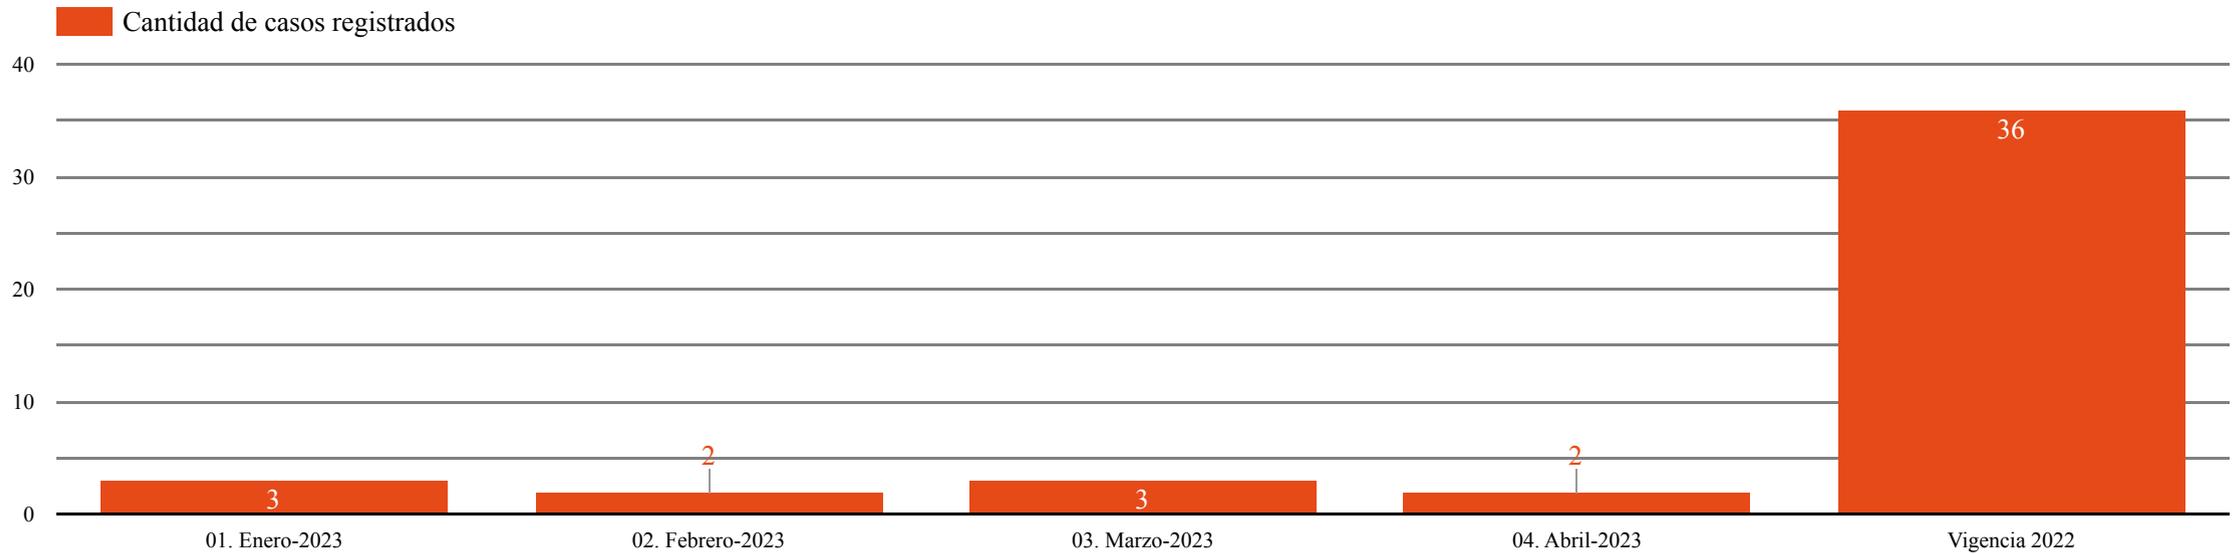


Número de casos pendientes por responsable

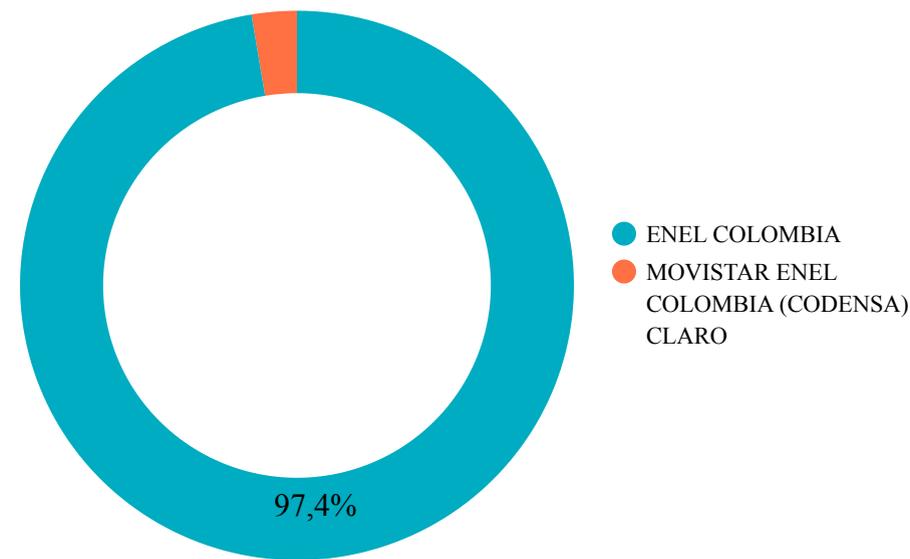


MES REPORT...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	PENDIENTE
01. Enero-2023	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	PENDIENTE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa	PENDIENTE



Número de casos registrados por mes

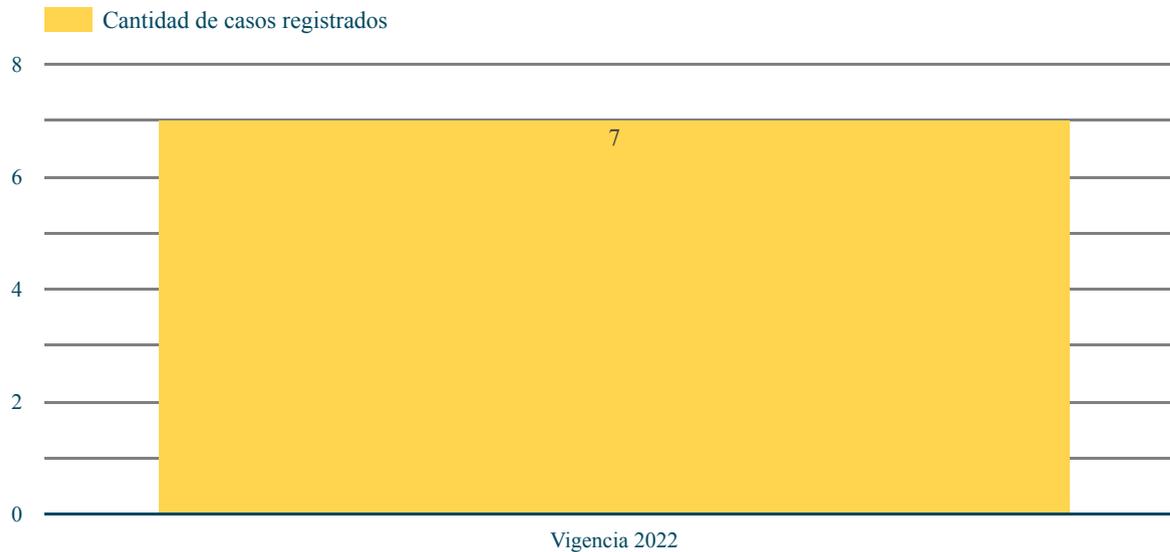

Pendientes por Entidad que presentó el caso

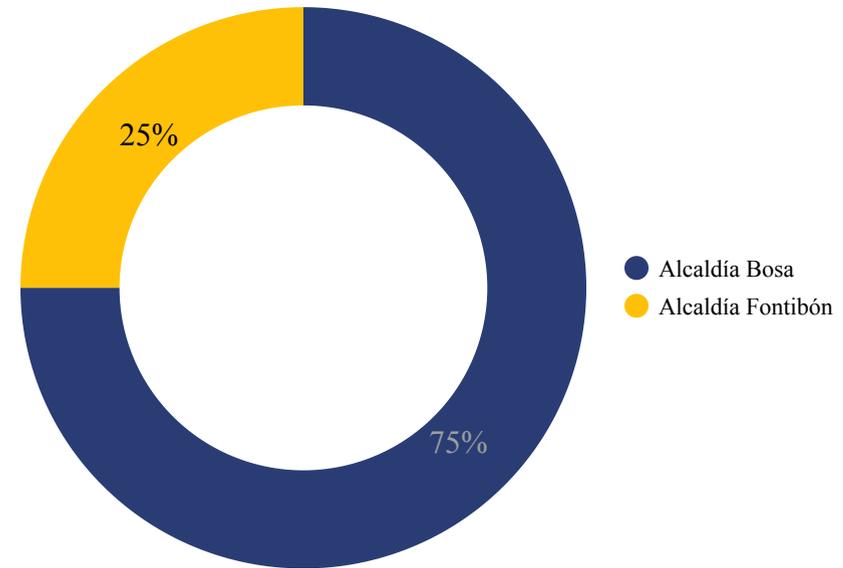

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de "paz y salvo" de VANTI para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. Se ha mantenido comunicación con la profesional Liliana Beltrán, sin embargo, no se ha generado factura para realizar pago respectivo.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para Vanti Gas Natural, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir certificado de "paz y salvo" del contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021, no se ha emitido factura para efectuar pagos por daños.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para VANTI, Se trata en general de solicitud de respuesta a varios temas pendientes hace algún tiempo y que a continuación se sintetizan: -Contrato 1683 de 2020 relacionado con paz y salvo, enviado vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán -Contrato 1698 de 2020 Acta de Competencia de pago en revisión por el Ing. Héctor Hernández, entregada por Ing. Dary Cogua. -Contrato 1692 de 2020, expedición de factura por daños, enviada vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán -Contrato 1691 de 2020, respuesta a solicitud de contratista sobre exclusión de vías reportadas por Vanti con daño en las mismas con objeto del contrato IDU citado -Contrato 1695 de 2020, respuesta a solicitud interventoría sobre estado del certificado de "paz y salvo" requerido -Contrato 352 de 2020 Troncal 68 Transmilenio, Acta de Definición de Tramos Funcionales, en revisión por parte de la Ing. Ángela Guío enviada en el pasado mes de septiembre.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para VANTI se solicita recuernerar vía donde se realizó intervención Parque minero Industrial "El Mochuelo" KM 3 Vía Pasquilla	ATENDIDO



Casos:

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB


Nº. de casos registrados

5


Nº. de casos resueltos

1

Número de casos registrados por mes

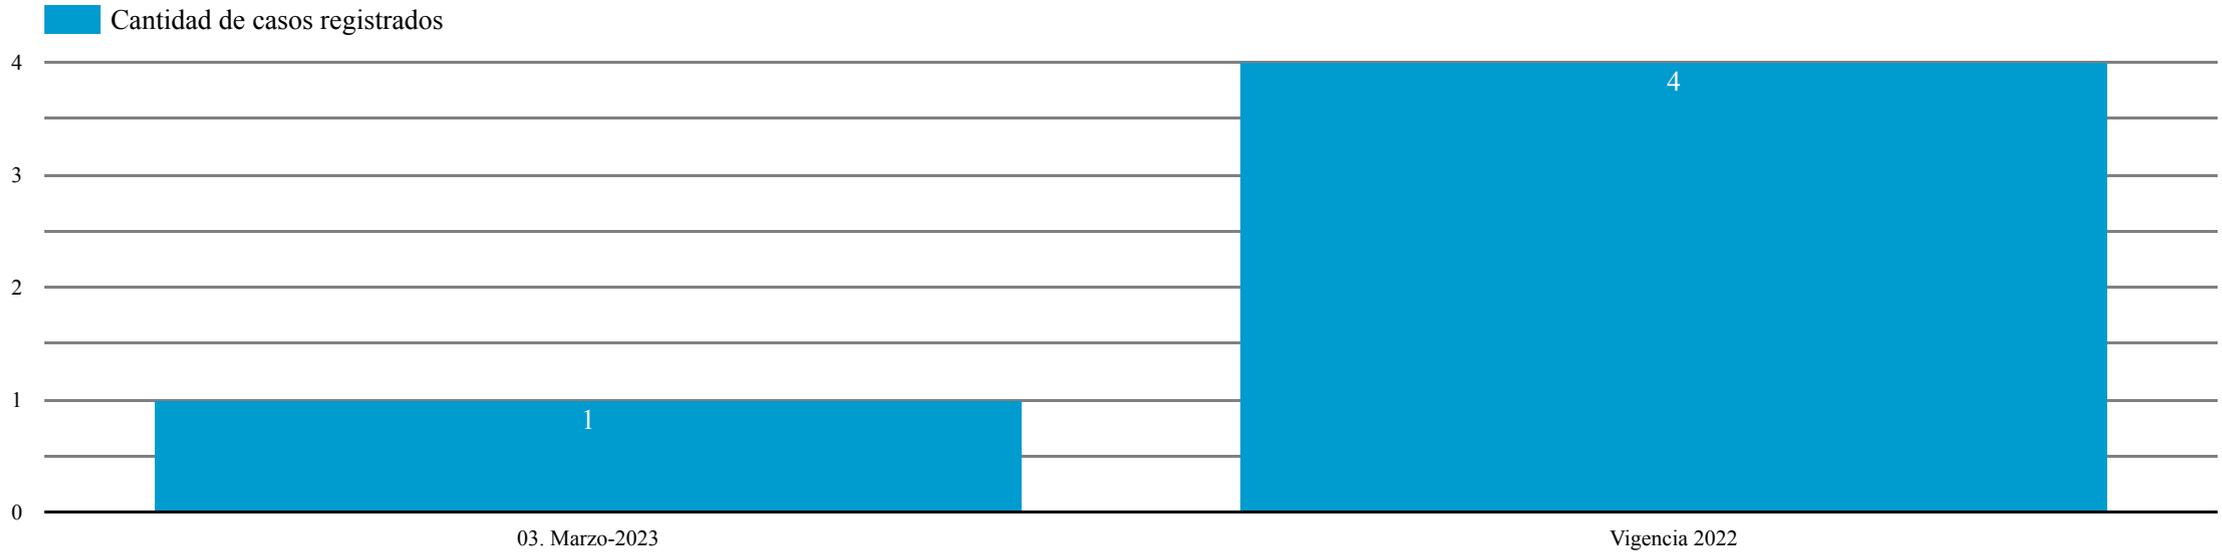

Pendientes por Entidad que presentó el caso

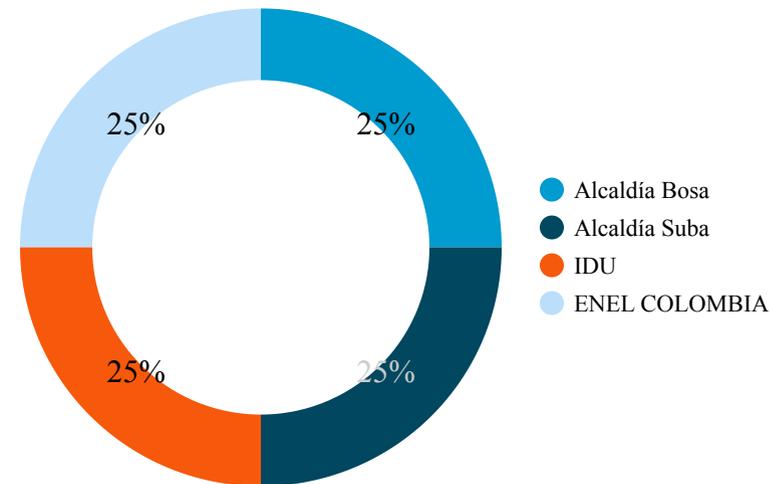


MES REPORT...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
03. Marzo-2023	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para ETB, se requiere validación de los diseños del contrato FDL-Bosa N°. 254 de 2018, remitidos mediante radicado 010940.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para ETB, sobre el tramo CL 156C entre KR 96 y KR 97A se presentan varios postes de infraestructura de ETB sobre los ejes de vía, se requirió la visita correspondiente, y se efectuó reunión de campo, llegando a una cotización al respecto del traslado por 34 millones de pesos. Posteriormente, se realizó visita con Contraloría en este mismo sector, donde se indicó al Fondo de Desarrollo Local que: "no era competencia de la Alcaldía hacer el traslado de los postes y, por tanto, corresponde a la empresa encargada el moverlos", así las cosas, se remitió oficio a ETB para que no se generará costo y se informó el proceso de auditoría en el que se encuentra la Contraloría.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para ETB, se reporta cámara de ETB que presenta hundimiento en la KR 3 – Frente a ICETEX.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y	PENDIENTE


1 - 5 / 5



Número de casos registrados por mes

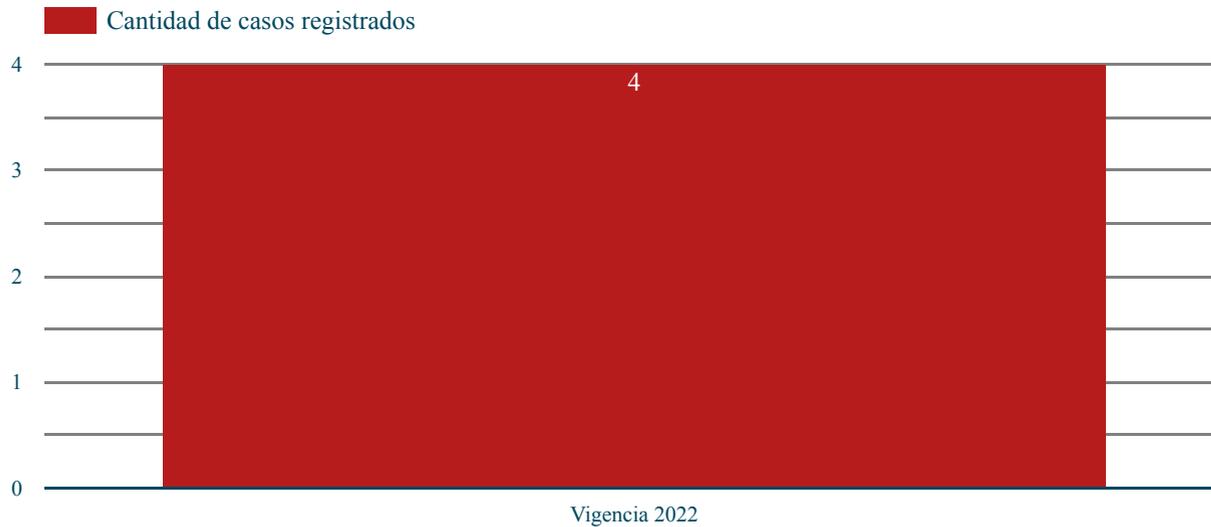

Pendientes por Entidad que presentó el caso

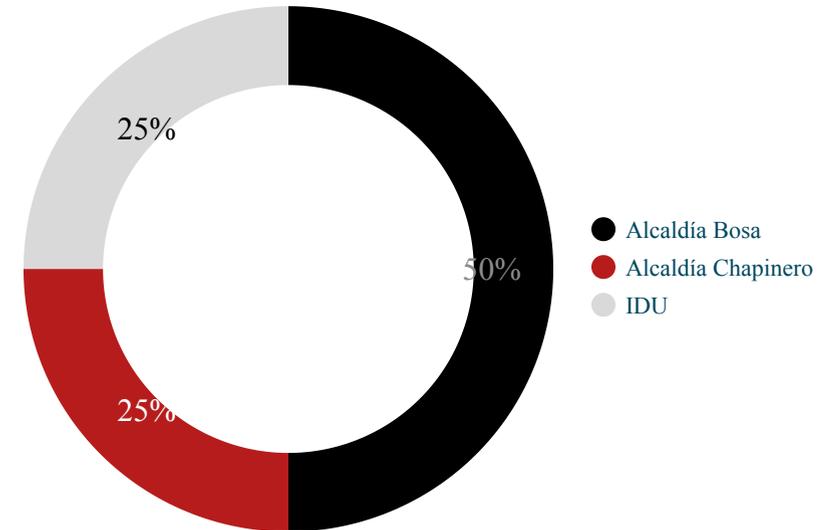

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	PENDIENTE
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	PENDIENTE


ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA

MES REPORTE DE CASO


¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?

ESTADO DEL CASO


Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales

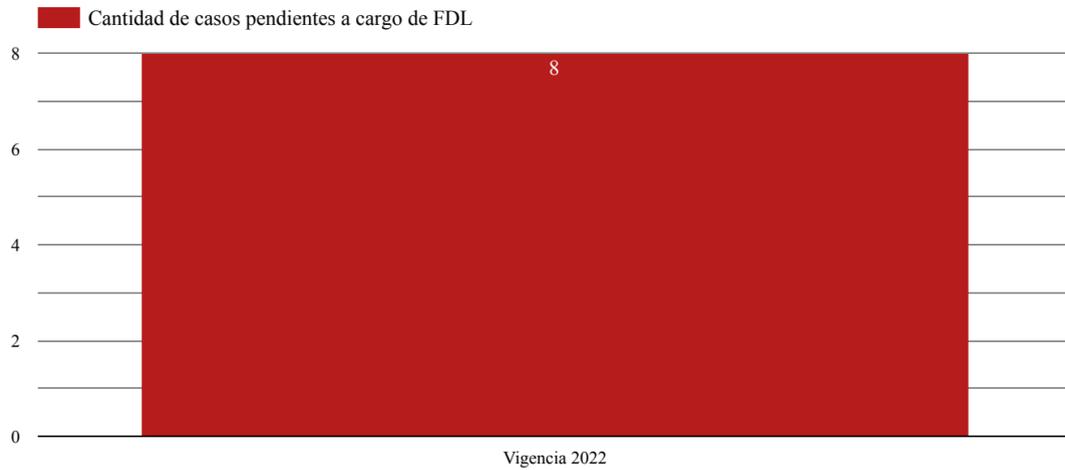

Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales

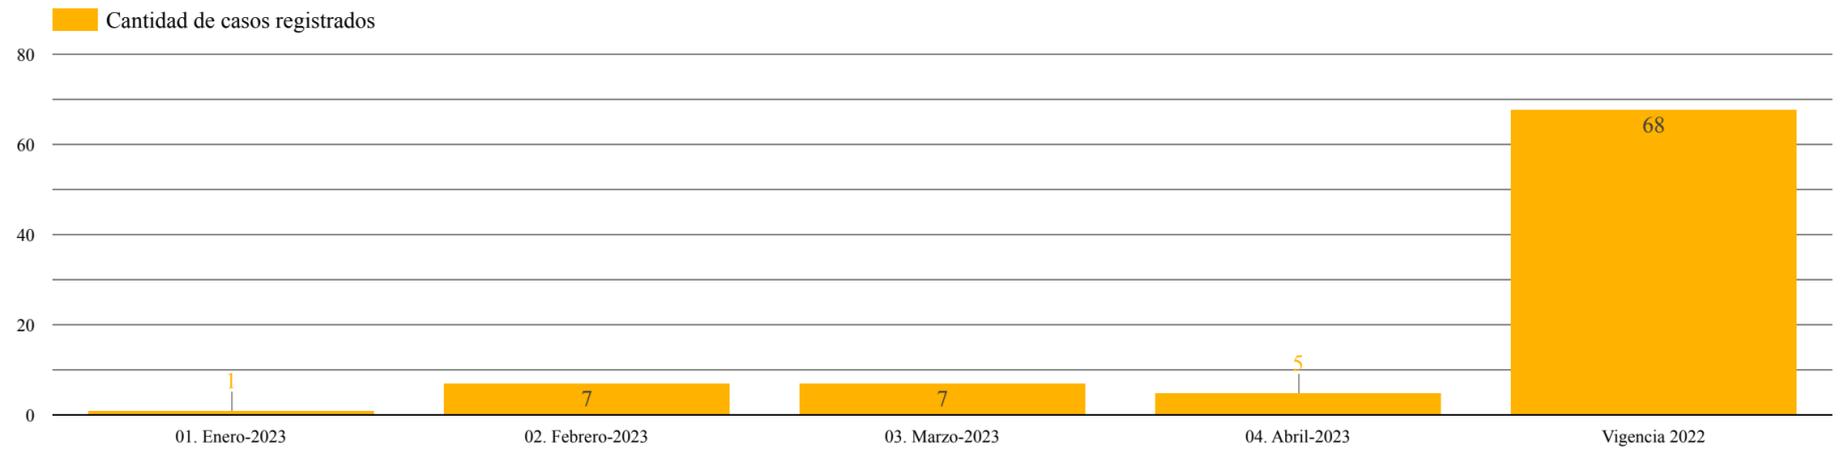

Casos presentados por Alcaldía local

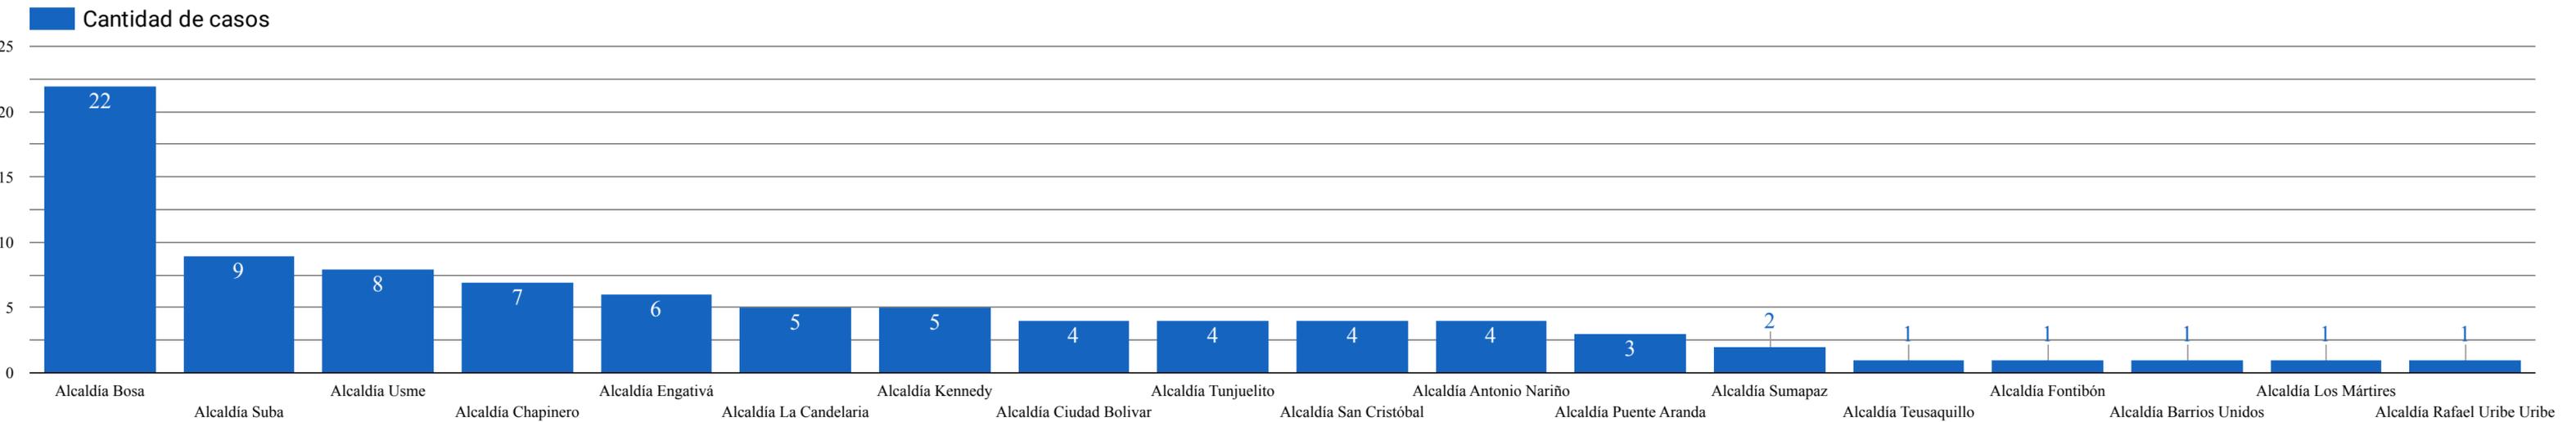

Registro de los casos

MES REPO...	SOLICITUD	ENTIDAD ...	ESTADO DE...
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado meses de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	PENDIENTE
02. Febrero-2023	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	IDU	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual. El ingeniero Álvaro Rojas indica que va a gestionar para que agilice el proceso de	IDU	PENDIENTE



Nº. de casos resueltos
16

Nº. de casos registrados
88

Nº. de casos pendientes
72
