

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 15 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 05 de mayo de 2022

HORA: 8:30 am a 09:40 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI		X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM			X	
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP
Sonia Duarte Urrego	Profesional DVTSP	

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB		X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	X			
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
José Mauricio Plazas Higuera	FDL Engativá	Alcaldía de Engativá	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (14 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. William Orlando Luzardo en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **15** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

3.1 ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

1. Mauricio Plazas - Fondo de Desarrollo Local de Engativá.

Presenta temas nuevos:

- Para **EAAB**: Menciona que durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la inspección, pero a la fecha la EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio de las pólizas por estabilidad de la obra. Por lo cual, se solicita por intermedio de este espacio dicho informe.
- El Ing. Álvaro Reinoso del IDU pregunta si se ha tenido algún contacto con la EAAB; Por lo que responde el delegado de la Alcaldía Local, que sí, con el Ing. José Eduardo González de la EAAB; por lo cual, el Ing. Reinoso menciona que el delegado es el Ing. Wilson Porras, por lo que deja en el chat, su correo de contacto.

Interviene Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, e informa que de la Alcaldía Local de Fontibón no asistió, aunque fueron invitados.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (14 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **14** del Comité de

Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **28 de abril de 2022**, ante la cual, la Ing. Onisalba Segura aportó observaciones de redacción y el Ing. Mario Insuasty, hizo referencia al caso 87, que salió el Comité; por lo demás, no se presentaron observaciones adicionales por los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **14** de 2022.

También se muestra, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. **12 de 2022**, ya está publicada, dando cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Presenta un tema nuevo:

- Para **EAAB-Zona 3**: Esta semana se reportó que la Clínica la Paz se encuentra sin servicio de acueducto; aparentemente lo que se pudo averiguar, es que el fin de semana pasado hubo un daño en una tubería, no se sabe si fue por obras de la constructora Marval o por las obras de la Avenida Guayacanes; por lo que solicita a la EAAB, averiguar sobre el caso y menciona además que este tema lo tiene a cargo Giovanni Cabrera.

Interviene el Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 de la EAAB, y menciona que averiguará sobre el tema e informará al respecto.

2. Onisalba Segura – Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura

Se refiere a los casos del acta anterior:

- Intervención **EAAB – Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. **Sigue sin resolver.**
- Para **CODENSA: (Caso 84)** Se ha recomendado esta solicitud en varias oportunidades, es sobre unos postes que presentan desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044, por lo que se deja en Comité para tratarlos en la siguiente sesión. Se envió la información y antecedentes al correo del Ing. Pablo Ponce de CODENSA. **Sigue**

pendiente, porque fue atendido parcialmente, pues se trata de dos postes, se atendió uno, pero continúa pendiente el otro.

- Para **GAS NATURAL, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y CLARO: (Caso 100)** Solicitar respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. Este caso ya fue atendido por **Gas Natural y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES; continua pendiente la atención por parte de CLARO; por lo cual se recomienda la respuesta al Ing. José Ricardo Velasco de CLARO, con respecto a la información del delegado para el contrato 1738 de 2021.**
- Para **EAAB (Caso 105):** En la Carrera 7 por Calle 72-71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente. Sobre este caso hace 15 días, el Ingeniero Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, aclaró que había hecho la inspección de la cámara, señalando además que efectivamente habían hecho algo estricto, pero que no corresponde a la EAAB, luego de lo cual, fue enviado al correo de los participantes del comité, y el Ing. Pablo Ponce informó que ya lo había enviado al área operativa de ENEL COLOMBIA (CODENSA); entonces continua pendiente este caso y agradece que las otras empresas verifiquen para saber quién es el competente y hagan la gestión para el arreglo de la estructura que tiene daño. **Continua pendiente.**

Presenta dos casos nuevos:

- Para **ETB:** Caso que fue enviado al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, el pasado 29 de abril, en el cual se recomienda dar la respuesta a la comunicación enviada por el contratista del contrato 1718 de 2021, relacionada con un daño en un frente de la Autopista Norte objeto de este contrato; por lo cual, se está solicitando la visita del delegado de ETB, para ver que se hace con la estructura que al parecer en algo se afectó; también allí se envió el dato del delegado, el Ing. Benjamín Ochoa Bohórquez, quién estaba siendo reemplazado por la Ing. Astrid Suarez Gámez, por las vacaciones del primer ingeniero.
- Para **TODAS LAS EMPRESAS:** Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante; sobre esto, ya se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que este caso ya se había presentado hace más de un mes y que es una caja cuadrada en asfalto, que queda en una esquina; ENEL COLOMBIA (CODENSA) ya revisó y verificó que no es de ellos; interviene también el Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB menciona que no es de ellos; por lo tanto, debe revisarse por parte de las demás empresas de quién es, dicha estructura y se pueda solucionar la tapa.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Nubia Riaño – Profesional Red Matriz EAAB

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Se requiere coordinar una visita, sobre un daño en la red de la EAAB en Tocancipá, para programar el movimiento de unos postes de ENEL COLOMBIA (CODENSA), y poder así, intervenir la EAAB.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, entrega el teléfono de contacto del Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), para tratar este tema.

5.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

Presenta el balance de los casos anteriores:

- Hace referencia al **Caso 15**, relacionado con una filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72; por lo cual **ya se verificó y se evidenció que fue atendido por la EAAB, por lo tanto, sale del comité.**
- Hace referencia al **Caso 24**, relacionado con una filtración de agua potable y afectación de cámara, en la calle 92 por carrera 13B donde se encontraba en ejecución el contrato EAAB 970; por lo cual **ya se verificó y se evidenció que fue atendido por la ENEL COLOMBIA (CODENSA), por lo tanto, sale del comité.**
- Hace referencia al **Caso 43**, sobre el contrato **IDU** número 215 de 2020, donde se estaban haciendo obras en la carrera 9 con calle 112, el reporte recibido fue que existían redes expuestas; pero se verificó y ya no están expuestas; sin embargo, se requiere hacer una verificación sobre el alcance y el estado actual de la infraestructura; y revisada la información, no se cuenta con delegado; por lo que pregunta al Ing. Álvaro reinoso del IDU, si sabe sobre este contrato que sea del IDU; por lo cual el Ingeniero Reinoso, averiguará al respecto.
- Con relación al **Caso 20**, tema de la Central San José localizada en la Avenida Boyacá, número 11 - 77; se tiene avance de limpieza a algunos pozos, pero continua la inundación en el sótano, por lo que se reitera la atención por parte de la EAAB, que tiene bastante prioridad para la ETB.

Interviene el Ing. Javier Patiño de la **EAAB**, se menciona que se ha venido atendiendo el caso, pero al parecer es un problema interno; por lo que solicita revisarlo con una persona encargada de la ETB y los operadores de la EAAB; por lo cual la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, da lectura al reporte de la mencionada central, sobre algunos daños en la tubería que fueron reportados a la **EAAB**. Por lo cual El Ing. Patiño de la EAAB, solicita dicha información para revisarlo y programar su intervención.

- Sobre el **Caso 137**, sobre la atención de unas emergencias presentadas en las centrales de Bachué y de Salitre, por lo cual se pidió el apoyo a la **EAAB** para que

hiciera limpieza en los colectores; **se informa que este caso ya fue atendido por parte de la EAAB; por lo tanto, sale del Comité.**

- Así mismo, menciona que los demás casos continúan sin respuesta; y, que ya se reintegró el compañero que estaba en vacaciones para hacer la programación de la reunión y verificación de casos con **ENEL COLOMIBA (CODENSA)**, cuyo avance se informará en el siguiente comité.

5.4 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez Gómez – Profesional UMV.

Presenta un caso nuevo:

- Para **EAAB – Zona 2**: Caso presentado el día de ayer en la carrera 7 por calles 64 y 65, Sentido Sur norte, donde se está haciendo un mantenimiento en la carrera 7, y se presenta un pozo con inundación; por lo cual, se solicita al Ing. Wilson Porras de la EAAB, solución.

El Ing. Wilson Porras, menciona que respecto a este caso se envió la información al área de mantenimiento de alcantarillado, donde hicieron un cambio de cargue hace unos días, pero al parecer hay un problema de represamiento: por lo cual estará informando al respecto.

5.5 INTERVENCIÓN DE LA VANTI GAS NATURAL

1. Mario Insuasty – Profesional VANTI.

Presenta un caso nuevo:

- Para **IDU**: Se tienen unas PQR sobre acometidas que se requieren ejecutar, pero no las dejan intervenir porque el contrato no ha sido entregado al IDU, es el contrato 1639 de 2019; por lo cual solicita la colaboración para conocer el procedimiento para poder ejecutar dichas acometidas

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que este es el contrato que se ejecuta en Fontibón, que ya está terminado y en etapa de recibo por parte de la interventoría, y esa es la razón por la cual no ha podido ser autorizada la intervención; sin embargo, se adelantará la gestión ante el área respectiva. Por lo anterior se acuerda enviar la información del caso en cuestión.

5.6 Intervención Secretaría Distrital de planeación - SDP

1. Sonia Duarte Urrego – Profesional Especializado SDP.

- Dando continuidad a lo tratado en la sesión anterior del Comité en relación con el **Caso 118**, sobre una consulta de la ETB sobre intervenciones urbanas en la ciudad; la Ing. Sonia Duarte de la SDP, hace una presentación con el análisis del segundo caso relacionado con obras adelantadas por la Constructora Hitos Urbanos; en la carrera 16 entre calles 90 y 91, en el sector del Chicó.

Se muestra entonces, por una parte, los planos que definen tanto el espacio público como el privado, con la configuración inicial del sector, catalogado como “antiguo y consolidado”; así mismo, se presenta el plano específico de la manzana comercial con las vías adyacentes vehiculares: Por otra parte, se muestra en la actualidad los predios con la delimitación del espacio público y las vías que tienen RUPI (Registro Único de Patrimonio Inmobiliario), que hacen parte del inventario del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP; también se muestra sobre este predio, la delimitación de Plan Parcial de Renovación Urbana – PPRU llamado “Plaza Chicó”, y donde se han tenido procesos de licenciamiento urbanístico en este sector.

Dicho Plan Parcial fue negado mediante la Resolución número 1445 del 08 de septiembre de 2021; al respecto hubo una comunicación de la ETB, la cual se compartirá igual como en el caso anterior que fue tratado en la anterior sesión 14 del Comité.

Se hace mención a los proyectos anteriores del año 2.000, que modificaron el espacio público circundante; como son los proyectos denominados “Paseo Urbano de la Carrera 15” y “Parqueadero subterráneo de la Carrera 15”, los cuales tuvieron unas Licencias de Intervención de Espacio Público en el año 2.000; y, tuvo una Licencia de Construcción la número LC-001-0156 del 2.000, de la Curaduría Urbana número 1; que definía una obra nueva y un edificio de estacionamientos públicos y se identificó que en ello hubo un contrato de concesión del “Parqueadero Calle 90 S. A.”, el número 385 de 1.999; hasta donde se tuvo información, dicho contrato venció en 2020; por lo cual se debería conocer el estado de dicho contrato; concluyendo que a través de dichos instrumentos se desarrollaron esas obras subterráneas.

En el caso actual, con respecto a las obras que se adelantan por la Constructora Hitos Urbanos, se han desarrollado a través de licenciamientos predio a predio; por lo que se requeriría conocer el instrumento por el cual se licenció la obra y el tema del control urbanístico se haría por parte de la Curaduría; por lo que se menciona que, con la información disponible se llegó al análisis presentado y que se observa, en conclusión, que si hubo un cambio en la conformación del espacio público circundante; pues antes se tenían vías vehiculares alrededor de dicha manzana y hoy la connotación de la vía de la “Carrera 16”, es una vía peatonal con circulación vehicular restringida; por lo que se hizo un cambio en la conformación del espacio público, no obstante sigue siendo espacio público.

Interviene la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, agradeciendo la presentación e información entregada; y menciona que la inquietud que se tiene es que, observando el RUPI, se trata de una zona de espacio público, y que la infraestructura está construida sobre ese espacio público; pero se ve que la obra de Hitos Urbanos, la construyeron contra la pared de dicho parqueadero en el sótano; entonces, ¿el alcance de la licencia puede indicar el uso de ese espacio, de ese terreno?; por lo cual se responde por parte de la Ing. Sonia Darte de SDP; que evidentemente la licencia como elemento por naturaleza dador de derechos tanto de edificabilidad como de uso, determina las condiciones particulares de todas esas áreas que son objeto del licenciamiento; entonces en este caso, lo que haya dicho la licencia de construcción es lo que corresponde al alcance que tiene el constructor; por eso es que hasta aquí llega nuestro aporte como SDP, porque en el tema de

Curadurías, el Curador es autónomo; por lo cual debería consultarse en específico el contenido y alcance del licenciamiento respectivo.

La Arq. Carmen Rocío López de la ETB, menciona que se recibió una comunicación del DADEP donde se remite copia de la certificación de Bienes de Patrimonio Inmobiliario Distrital, donde se indican los números de RUPI, 488-7 y 488-8; donde se describe que el predio es un bien de uso público y que hace parte de la propiedad del Distrito Capital; por lo que se pregunta que si esa licencia de construcción de Hitos Urbano, ¿puede involucrar ese espacio público o solamente la propiedad privada del predio para la construcción?; La Ing. Sonia Duarte de la SDP, menciona que el plano urbanístico de la licencia aprobada es el que define como es la intervención del promotor sobre ese espacio; por lo tanto, se plantea que se debe consultar toda la información planimétrica del proyecto; pues la curaduría no lo ha enviado a la SDP; ya que no tienen la obligatoriedad de remitir los planos urbanísticos oportunamente; por lo cual, no se encontró en la SDP; pues al haber una licencia debe haber un plano aprobado y con dicho plano se identifica el ámbito de intervención y la definición clara del proyecto en sus áreas públicas y privadas.

Interviene el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, y concluye que entonces el paso a seguir es hacer el requerimiento a la curaduría para que remita copia de la licencia de construcción con el plano urbanístico, para verificar si realmente se le dio permiso al constructor de ocupar parte del espacio público subterráneo o no. Por lo cual la Ing. Sonia Duarte de la SDP, menciona que efectivamente así es; y recuerda que todas estas actuaciones tienen lugar a reclamaciones; por lo que se debe tener es la precisión, de hasta donde el licenciamiento urbanístico definió las áreas públicas y privadas, como primera instancia y como segunda, a nivel de la posible reclamación por parte de la ETB, que evidentemente se debe hacer alusión al tema de las redes como un componente fundamental de la prestación del servicio. Por lo anterior, la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, menciona que se hará la solicitud ante la Curaduría sobre la copia de la Licencia, utilizando la información encontrada en la valla y se continuará con la búsqueda de la información sobre este tema y se tendrá en cuenta también, la respuesta del DADEP sobre el espacio público.

Finalmente, se agradece a la SDP por la información y análisis presentado en relación a la consulta realizada por la ETB; **y sobre este Caso 118, se acuerda que fue resuelto y, por lo tanto, sale del comité.**

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 14 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio	Delegados	EAAB	Pendiente. Debe verificarse por parte de EAAB,

	público. (presentado por IDU – 2021)			
11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez – Zona 3	EAAB	Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
14	En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Delegado Zona 3	EAAB	Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
15	Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). (presentado por ETB – 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	Fue atendido y solucionado el caso por la EAAB, por lo cual sale del Comité.
17	Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente. Debe validarse con ETB
18	Caso de Calle 17 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Debe validarse con ETB
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Informa EAAB que se drenaron por acumulación de aguas lluvias.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB IDU	Pendiente. Se tiene pendiente programar visita. Se intentado contacto telefónico sin resultados
21	En Calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por ETB – 2021)	Delegados – Zona 1	EAAB	Pendiente. Se realizó visita y no se ha pañetado el muro.
22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Esta en revisión por ENEL COLOMBIA

23	Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB – 2021)	Delegados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	Pendiente. Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
24	Cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada. (Presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB	Fue atendido y solucionado el caso por la EAAB, por lo cual sale del Comité.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.
27	Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa – Contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Debe validarse con ETB
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se debe verificar por parte de ETB.
31	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por ETB - I sesión 2022)	Delegados	MOVISTAR, CLARO ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022)	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el	Delegados	EAAB	Pendiente. Debe enviarse registro

	apoyo a la EAAB. (presentado por UMV – II Sesión 2022)			fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por UMV – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Pendiente.
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	Wilson Porras	EAAB	Pendiente.
43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no ha solicitado delegado. (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
44	Se sigue recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en visitas se ha encontrado infraestructura de CODENSA. (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente. No se ha tenido respuesta.
53	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por AlcTunjuelito – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	Pendiente. Se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de dicho parque.

54	<p>Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU – EAAB – III Sesión 2022)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	Pendiente. Pendiente de validación final del caso.
56	<p>En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)</p>	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.
58	<p>En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por ETB – III Sesión 2022)</p>	Delegado	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.
59	<p>Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por AlcaldíaBosa – IV Sesión 2022)</p>	Javier Patiño	EAAB	Pendiente. El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta
60	<p>En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por AlcaldíaBosa – IV Sesión 2022)</p>	Javier Patiño	EAAB	Pendiente. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.
61	<p>Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por AlcaldíaKennedy – IV Sesión 2022)</p>	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. La red eléctrica del salón California está pendiente.

62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022)	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	Pendiente.
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB	Pendiente.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente.
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente. Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).
72	Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas, pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por ETB – IV Sesión 2022)	Delgados	EAAB IDU	Pendiente. Se realizará visita, pendiente el resultado.

73	<p>Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por Alcaldía Engativá – V Sesión 2022)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. No hay avance.
76	<p>Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por UMV – V Sesión 2022)</p>	Humberto Madrid	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
77	<p>Filtración de agua potable, en cámara ubicada en la calle 161 entre carrera 14 B y 15, se requiere con urgencia porque corresponde al plan de choque que se adelanta con la Alcaldía Mayor. (Presentado por ETB – V Sesión 2022)</p>	Humberto Madrid – Zona 1	EAAB	Pendiente. Pendiente de revisar otras cámaras de energía.
79	<p>Gestión para invitación a UMV para participar en las mesas de trabajo que se hacen en torno a los RCD. (Presentado por UMV – VI Sesión 2022)</p>	Sonia Duarte Urrego	SDP	Pendiente. Se entregó la información de los delegados a invitar.
80	<p>Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por IDU – VI Sesión 2022)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Ya está en programación de maniobras.
82	<p>Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por GAS NATURAL – VI Sesión 2022)</p>	Delegados	EAAB	Pendiente.

83	<p>Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopunto del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)</p>	José Ricardo Velasco	CLARO	<p>Pendiente. Debe enviarse información solicitada por CLARO.</p>
84	<p>Postes que tienen desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)</p>	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<p>Pendiente. Ya se está en programación y quedaría efectivo en la primera semana de abril.</p>
85	<p>Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022)</p>	Delegado	EAAB	<p>Pendiente.</p>
86	<p>Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana – ERU, para presentar y articular contratos que involucren movimientos de postes. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022)</p>	Delegados	IDU SDP	<p>Pendiente. Se hizo la gestión, pero no aún no se ha tenido respuesta.</p>
88	<p>En la formulación 2022 de malla vial, se solicitó ante el IDU, reservas viales de 25 segmentos y uno de ellos está reservado por la EAAB, por lo cual solicita el contacto para coordinar acciones; el CIV solicitado es 16002443. (Presentado por Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022)</p>	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<p>Pendiente. El CIV reportado con acueducto, en la misma reunión, aún no tenemos respuesta ni el contacto de Luis Fco. Rodríguez, para hacer seguimiento.</p>

89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño - VIII Sesión 2022)	Delegado	UAESP	Pendiente.
90	EAAB viene adelantando traslado anticipado de redes para el METRO en la calle 8 entre carrera 27 y 30 con la instalación de la polisombra, genera inseguridad; por lo que se envió un oficio para tratar este tema. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño - VIII Sesión 2022)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente. No se ha obtenido respuesta del radicado EAAB 20226520127811 del 4-Mar-22.
92	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por ETB - VIII Sesión 2022)	Wilson Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
93	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe - IX Sesión 2022)	Luis Francisco Rodríguez	Para EAAB – Zona 3:	Pendiente.
94	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe - IX Sesión 2022)	Delegado	SDA	Pendiente.
95	Caso obra de red de agua potable en la calle 12B con carrera 2da., en el Chorro de Quevedo, se hizo demolición de calzada y parte del andén, dicha calzada se había arreglado hace unos 8 meses por solicitud comunitaria; se solicita reposición con las mismas especificaciones (concreto MR43, color ocre) (Presentado por Alcaldía La Candelaria - IX Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente.

98	<p>Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por Alcaldía La Candelaria - IX Sesión 2022)</p>	Carmen Rocío López	ETB	<p>Pendiente. Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA</p>
100	<p>Respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. (Presentado por IDU - IX Sesión 2022)</p>	Delegados	GAS NATURAL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CLARO	<p>Pendiente. Se dio respuesta por parte de Vanti.</p>
101	<p>En la Calle 31 Sur número 10D – 10, sobre una queja de la comunidad donde se intervino este sector y no se ha recuperado. (Presentado por UMV - IX Sesión 2022)</p>	Delegado	EAAB	<p>Pendiente.</p>
102	<p>En la Calle 17 entre carreras 5ª. Y 7ª.; debe recuperarse la vía; se informa desde la Gerencia de Intervenciones que es de la EAAB, pero no se tiene la certeza, o si es de la ETB; por lo que solicita su revisión; igualmente menciona que estos casos están relacionados en el chat del comité. (Presentado por UMV - IX Sesión 2022)</p>	Delegas	EAAB-ETB	<p>Pendiente. Se encuentra esta en revisión por parte de ETB.</p>
103	<p>Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por Alcaldía Sumapaz - X Sesión 2022)</p>	Pablo Ponce de León.	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	<p>Pendiente.</p>

104	El FDL de San Cristóbal adelanta intervenciones de malla vial, pero en el CIV número 4001972, hay una fuga de la EAAB, en la zona se les informó que no era con la zona, sino con Red Matriz de la EAAB. (Presentado por SDG – X Sesión 2022)	Nubia Riaño	EAAB – Red Matriz	Pendiente.
105	En la Carrera 7 por Calle 72-71, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por IDU – X Sesión 2022)	Wilson Porras	EAAB	Pendiente. Las otras empresas deben verificar para saber quién es el competente en el caso.
106	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022)	Álvaro Reinoso OnisIba Segura	IDU	Pendiente.
107	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la EAAB , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
108	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
110	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta	Delegados	MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO	Pendiente.

	la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)			
113	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	Delegados	EAAB ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
114	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por IDU – XI Sesión 2022)	Luis Fernando Rodríguez	EAAB – Zona 3	
115	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
116	Se hizo un parcheo en la carrera 7ª. Entre calles 148 y 150, pero en la revisión se identificó un hundimiento, se solicita a la EAAB Zona 1 revise si existe alguna filtración, antes que se acelere más el daño. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. Se adelanto la revisión de la tubería; está pendiente la recuperación de la vía.
117	En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE #	Onisalba Segura	IDU	Pendeinte,

	5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022)			
118	Se trata de obras, una en la calle 90 con carrera 16 de Hitos Urbanos, y donde ETB instaló la canalización en el espacio público, en el andén; y esta obra construyó bajo ese espacio, un sótano; por lo que la infraestructura de ETB quedó descolgada, en la parte superior del techo del sótano; y la constructora dice que no asume ningún costo por traslado, porque dice que ETB está invadiendo el espacio público; pero se ve que es el contratista el que invade el espacio público subterráneo; la consulta es a quien se puede requerir un concepto sobre esta intervención o utilización de esta área; si este espacio es público o en qué momento se convierte en privado. (Presentado por ETB – XI Sesión 2022)	Delegados	IDU SDP	Fueron atendidas las consultas por parte del IDU y la SDP, por lo cual sale del Comité.
119	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por IDU – XII Sesión 2022)	Delegados	Entidades Participantes en el Comité	Pendiente. El IDU enviará oficio solicitando la delegación.
120	Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por Alcaldía SanCristóbal – XII Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
121	Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDRD, pero se requiere articular con la EAAB y la SDA , para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por Alcaldía SanCristóbal – XII Sesión 2022)	Delegados	EAAB SDA:	Pendiente. Debe articularse con red troncal EAAB.

122	<p>Dentro de una obra de mitigación, se identificó que existe un contador de gas en unas escaleras que invaden el espacio público y toca el traslado del contador a la vivienda; ya que sin ese traslado no se pueden demoler las escaleras.</p> <p>(Presentado por Alcaldía San Cristóbal - XII Sesión 2022)</p>	Mario Insuasty	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
123	<p>Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación más directo.</p> <p>(Presentado por Alcaldía San Cristóbal - XII Sesión 2022)</p>	Delegados	EAAB SDA	Pendiente.
124	<p>Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría.</p> <p>(Presentado por Alcaldía San Cristóbal - XII Sesión 2022)</p>	Juan Carlos López	EAAB	Pendiente.
125	<p>Caso en la transversal 21 entre calles 96 y 97, donde la UMV dentro de sus actividades diarias está haciendo una actividad de PABAS (Parcheo-Bacheo), y se presentó allí, un daño en la red de agua potable y la EAAB, fue e hizo una intervención, pero quedó expuesta; por lo que solicita a la</p>	Humberto Madrid	EAAB	Pendiente. La gestión está en proceso.

	EAAB, que acciones se pueden hacer al respecto. (Presentado por UMV – XII Sesión 2022)			
126	El contrato de obra 224 de 2020, está en proceso de liquidación, el barrio la belleza, por lo cual solicitaron el paz y salvo de VANTI GAS NATURAL , pero no ha sido posible que respondan. (Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022)	Mario Insuasty	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
128	Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas. (Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022)	Alvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
129	Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo acho entro de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
131	Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada. (Presentado por AlcaldíaUsme – XIII Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
132	Para: Caso en la calle 134 por avenida 19, al parecer hubo un daño en la infraestructura de la EAAB; su situación es preocupante, por lo que el día	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. Se envió el caso a la división de alcantarillado.

	<p>martes se habló con el Ing. Humberto Madrid, y se acordó hablar con la división de alcantarillado (Presentado por UMV – XIII Sesión 2022)</p>			
133	<p>Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
134	<p>Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
135	<p>La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	<p>del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022)</p>			
136	<p>Se relaciona con unos daños ocasionados por un contratista de EAAB, donde tampoco solicito delegado ni acompañamiento, sobre el contrato 1-013410009162019; se le envió comunicación a la zona 4 de EAAB, pero no se ha requerido respuesta, por lo que se solicita dicha respuesta para contactar al contratista y hacer el cobro de los daños ocasionado. (Presentado por ETB – XIII Sesión 2022)</p>	Juan Carlos López	EAAB- Zona 4	Pendiente.
137	<p>En el chat del Comité y por correo electrónico, se informó sobre unas emergencias que se están presentando en las centrales de Bachué y de Salitre, por lo cual se pidió el apoyo a la EAAB para que hiciera limpieza en los colectores, pero no se obtuvo respuesta, por lo que solicita que en estas emergencias se de alguna respuesta, si se puede atender o no; aunqu se sabe que tenemos</p>	Delegados	EAAB	Fue atendido y solucionado el caso por la EAAB, por lo cual sale del Comité.

	emergencias por el invierno, pero no se obtuvo respuesta. (Presentado por ETB – XIII Sesión 2022)			
141	Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto. (Presentado por AlcaldíaBosa – XIV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
142	Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo. (Presentado por AlcaldíaBosa – XIV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. Se radicará la solicitud de manera formal.
143	Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado. (Presentado por AlcaldíaBosa – XIV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5:	Pendiente. Radicados números 1001904837 y el 1001905014

7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver **cuatro (4)** de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **15, 24, 118, y 137**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

<p>Icono</p> <p>Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada</p>	<p>Decisión</p>
	<p>Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se logró resolver cuatro (4) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 15, 24, 118 y 137; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.</p>	
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

8. COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 12-mayo-22
2	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 12-mayo-22

9. CONCLUSIONES

El Arq. Luis Alberto Quintero Vega de la SDP, en su calidad de Secretario concluye esta decimoquinta sesión del Comité, solicitando a todos los participantes, el continuar haciendo el seguimiento a los casos en curso, con el fin de avanzar en su solución, tal como se ha venido haciendo con algunos reportados y registrados como atendidos, lo cual se ha logrado con el concurso de las entidades que hacen parte de este espacio de articulación interinstitucional.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 12 de mayo de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU
Aprobó: William Orlando Luzardo - IDU

Anexo: 1. Presentación caso UMV – Humberto Ramírez de UMV
2. Presentación SDP caso 2 ETB – Ing. Sonia Duarte de SDP




UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



TEMAS 5 MAY 2022
COMITÉ OPERATIVO

AK 7 por Calles 64 y 65 Sentido Sur Norte

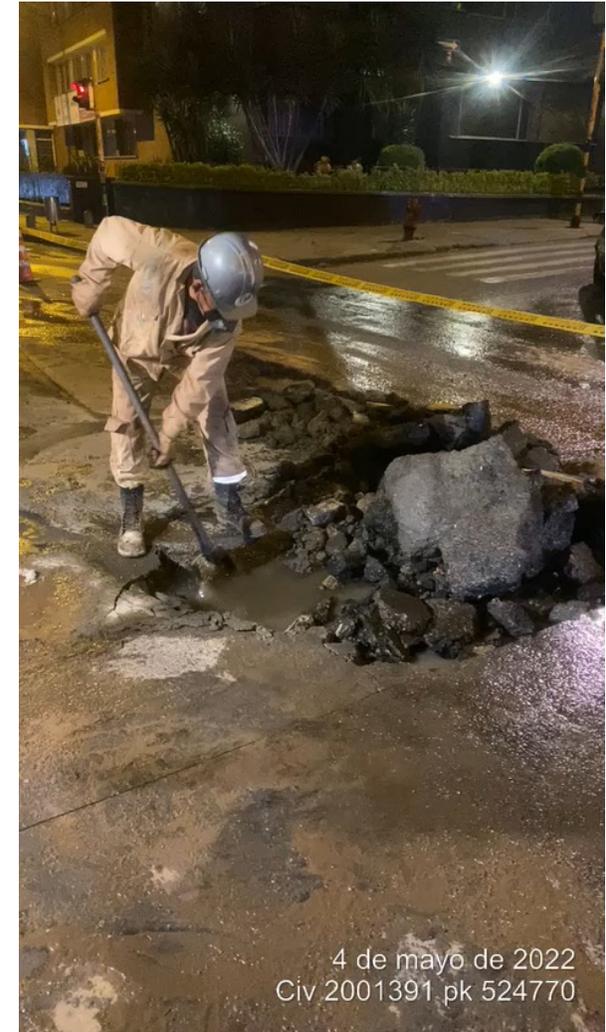



@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota




UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



Casos Infraestructura ETB_COISP 2022

Dirección	Instrumento de Planeación y/o Proyecto	Concepto ETB	Acto Administrativo y/o Licencia	Link acceso a documentos del Plan
Carrera 16 entre Calle 90 y 91	PPRU Plaza Chicó <u>NEGADO</u>	Comunicación ECGC – EO10410-2018	Resolución 1445 del 8 de septiembre de 2021 <i>“Por la cual se decide sobre la viabilidad de la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana Plaza Chicó”</i>	http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-renovacion-urbana/planes/plan-parcial-de-renovacion-urbana-plaza-chico
Carrera 16 entre Calle 90 y 91	“Paseo urbano de la Carrera 15” y “Parqueadero subterráneo de la Carrera 15”		Resolución No. 123 del 27 de marzo de 2000, licencia de intervención y ocupación del espacio público Licencia de construcción No. LC 001 – 0156 del 28 de abril de 2000, que ampara la construcción, en la modalidad de Obra Nueva, de un (1) edificio subterráneo de Estacionamientos Públicos en el espacio público ubicado entre las Calles 90 y 92 y las carreras 15 y 16 Urbanización “El Chico” Contrato de Concesión No. 385 de 1999 con la sociedad Concesión Parqueadero Calle 90 S. A., por el término de 20 años, los cuales vencen el 26 de septiembre de 2020	A través de estas actuaciones se modificaron algunas condiciones urbanísticas definidas en el Plano No. 205/2-1 y se cambió la funcionalidad de algunas vías adyacentes al proyecto, siendo en la actualidad vías peatonales con circulación “vehicular restringida”.

Antecedentes Normativos: Plano 205/2-1 “Urbanización El Chicó – Plano de Amojonamiento” y plano 205/4-3 “Urbanización El Chicó – Manzana Comercial”

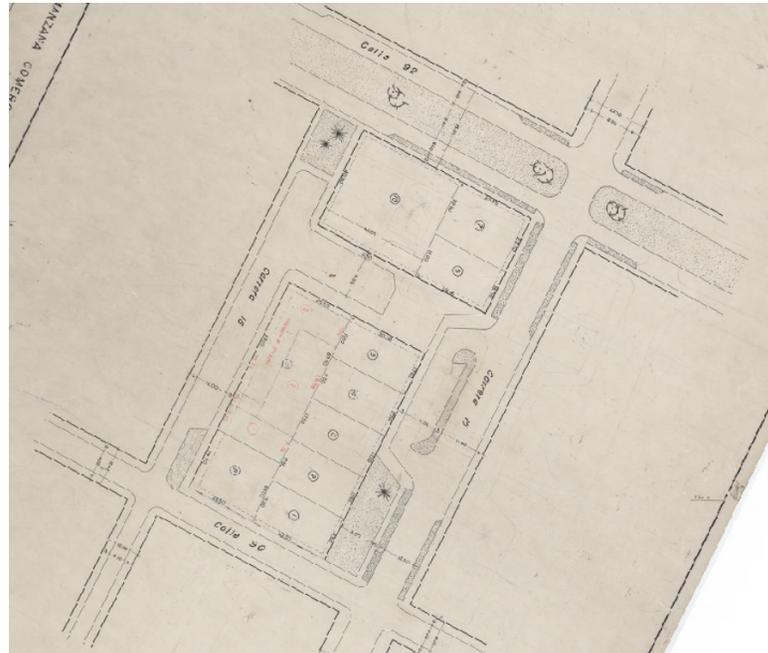

Espacio Público



Licencias de Construcción

