

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 35 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 28 de septiembre de 2023

HORA: 08:30 am a 9:40 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Rodríguez	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Juan Sebastián Acevedo Iriarte	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50435
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-57564
Martha Cecilia Bayona G.	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-57564
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)	X		
Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-41750
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Lorena Alejandra Jiménez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Abril	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Nubia Margoth Vallejo Molina	Profesional FDL de Engativá	Alcaldía Local de Engativá	X		
Rafael Andrés Enciso Vargas	Profesional FDL de Engativá	Alcaldía Local de Engativá	X		
Christian Enciso Suarez	Profesional FDL de Engativá	Alcaldía Local de Engativá	X		
Alejandra Berdugo	Profesional FDL de	Alcaldía Local de Fontibón	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

1. ORDEN DEL DÍA:
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
3. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
4. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (34 DE 2023).
6. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
7. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
8. TOMA DE DECISIONES.
9. COMPROMISOS.
10. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. Álvaro Reinoso Guerra en su calidad de encargado de la presidencia del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión treinta y cinco (35) del año 2023, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se coordina con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, el orden de intervención de las Alcaldías Locales de Engativá y Fontibón, siendo invitadas a esta sesión, se da la palabra a Christian Enciso:



3.1 Christian Enciso – Alcaldía de Engativá:

Se presenta como profesional de apoyo de la Oficina de Infraestructura de la Alcaldía Local de Engativá, señalando que tiene a cargo la supervisión del contrato N°. 402 de 2022 que tiene por objeto “Realizar los estudios y diseños de la malla vial de la localidad de Engativá” con la

priorización de alrededor de 140 segmentos viales, por tanto, presenta dos casos para la instancia:

- **Caso nuevo:** Para VANTI, en el desarrollo de la consultoría del contrato FDL-E N°. 402 de 2022, se requirió un enlace con las empresas de servicios públicos para coordinar las actividades a ejecutar, el radicado con el cual se radicó la solicitud es el N°. 11248071 del 13 de septiembre de 2023, por lo cual se solicita respuesta al respecto.

Respuesta VANTI – Mario Insuasty: Se remite correo electrónico de contacto solicitando comunicación, y se informa que se revisará en el sistema interno de la compañía, para dar orientación frente al estado y respuesta de la comunicación.

- **Caso nuevo:** Para ENEL Colombia SA ESP, en el desarrollo de la consultoría del contrato FDL-E N°. 402 de 2022, se requirió un enlace con las empresas de servicios públicos para coordinar las actividades a ejecutar, el radicado con el cual se radicó la solicitud es el N°. 000612718 del 13 de septiembre de 2023, por lo cual se solicita respuesta al respecto.

Respuesta IDU-Álvaro Reinoso: Se envía información de contacto del Ingeniero Mauricio Arenas, quién es el profesional delegado por ENEL Colombia SA ESP, quién no pudo asistir a esta sesión, se recopilan datos expuestos y queda en acta para su correspondiente atención.

Intervención SDG-Jacqueline Friede: Se recomienda a los Fondos de Desarrollo Local, que cuando se hagan requerimientos de respuestas a las empresas de servicios públicos se referencie los números de radicado en dichas entidades, para evitar problemas de seguimiento y control de la información.

3.2 Rafael Enciso – Alcaldía de Engativá:

Se señala que también tiene un caso para presentar en el Comité:

- **Caso nuevo:** Para EAAB – Zona 2, se solicita para el contrato de obra FDL-E N°. 396 de 2022 correspondiente a ejecución de parques, certificación de “paz y salvo” de la EAAB, toda vez que se encuentra en etapa de liquidación desde el 17 de abril. Los radicados de la solicitud son E-2023-038775 y E-2023-1053973.

Respuesta EAAB – Wilson Porras: Se informa que se revisará al interior de la EAAB con la persona encargada de Alcaldías Locales.

3.3 Alejandra Berdugo – Alcaldía de Fontibón:

Se presenta como profesional del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, y señala que tiene un requerimiento:

- **Caso nuevo:** Para EAAB – Zona 3, la Alcaldía de Fontibón tiene en desarrollo un contrato de consultoría de estudios y diseños, el cual presenta cruce con un contrato de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, tras varias mesas de trabajo se llegó a la conclusión que, el consultor del FDL tenía que esperar los estudios y diseños definitivos de la red hidráulica y de alcantarillado. Dichos estudios se

proyectaron que terminarían en el mes de junio, no obstante, no se ha recibido respuesta de fondo por parte de la EAAB, quienes respondieron en una ocasión la solicitud de información con un enlace Web que no contenía la información solicitada. Por tanto, se requirió nuevamente a la EAAB a través de la interventoría para que se remita la información de diseño definitivo de la red, a la fecha el contrato del FDL tiene una suspensión de 45 días esperando la respuesta de la EAAB.

El contrato de la EAAB es el número 1-00-30-33-14182022 que tiene por objeto “estudios y diseños detallados para la construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Villa Andrea y sectores asociados de la zona tres de la EAAB”.

La última solicitud radicada por el Fondo de Desarrollo Local tiene radicado con consecutivo EAAB E-2023-088838.

4 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (34 DE 2023).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 21 de septiembre de 2023, correspondiente a la sesión número **34** del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, no se reciben observaciones, correcciones y/o ajustes al respecto.

También se menciona, que las **actas 28, 29, 30, 31, 32 y 33** se encuentran en proceso de publicación en la Oficina Asesora de Comunicaciones. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes en el último trimestre:

Nº. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación
24	06/07/2023	X	X	X	X	3-2023-27364	11/08/2023
25	13/07/2023	X	X	X	X	3-2023-27107	11/08/2023
26	27/07/2023	X	X	X	X	3-2023-29109	24/08/2023
27	03/08/2023	X	X	X	X	3-2023-29109	24/08/2023
28	10/08/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-33573	Pendiente
29	17/08/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-33573	Pendiente

N°. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación
30	24/08/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-33573	Pendiente
31	31/08/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-33573	Pendiente
32	07/09/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-33573	Pendiente
33	14/09/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-33573	Pendiente
34	21/09/2023	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, EAAB, ETB, Claro.

5.1 IDU – William Rodríguez:

Se realiza saludo a los delegados de entidades y empresas de servicios públicos, se informa que no tiene requerimientos a presentar en la instancia.

5.2 IDU – Álvaro Reinoso:

Solicita realizar seguimiento a los casos que se tienen asignados por Empresas de Servicio Público y Entidades, actualmente se han generado herramientas que facilitan efectuar rastreo y control de los casos, como la matriz de seguimiento y el tablero de control, los cuales se encuentran en línea, se actualizan de manera semanal y son dinámicos, lo que hace posible verificar los avances que se registran, así mismo, se informa que se incorporaron tableros específicos por empresa y entidad para que se pueda revisar la información de manera rápida.

En adición, se comunica:

- **Caso 494:** Se reporta que EAAB-Zona 2 ya atendió el compromiso, y actualmente ya realizó recuperación del espacio público.

Por otro lado, se informa que el próximo 5 de octubre de 2023 se efectuará reunión de manera presencial.

5.3 IDU – Onisalva Segura:

Se reiteran los casos que se tienen pendientes, especialmente el caso 432 de la cámara de la calle 147.

Respuesta ENEL – Mauricio Arenas: Se comunica que no se ha podido avanzar con la intervención, ya que no se han podido conseguir 100 maletines de iguales características, ayer en el comité de infraestructura de la Alcaldía, el equipo de movilidad solicitó revisar el PMT y modificarlo para que sea viable la intervención.

Se hace referencia a los Reportes de Daños entregados por la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura DTAI del IDU, resultado de los recorridos efectuados por la citada dependencia a las obras ejecutadas y que están bajo póliza de estabilidad; reportes de daños, que han sido socializados en dos oportunidades a través del comité, y que por tratarse de listados de daños o afectaciones encontradas, no se hará seguimiento a cada caso como tal, sino que se dará por entendido que las ESP notificadas tomaron atenta nota y adelantaron las verificaciones y gestiones pertinentes, y que en el evento en que los daños no sean de su competencia, informarán al respecto para darlo a conocer a la DTAI del IDU.

5.4 UAERMV – Humberto Ramírez:

- **Caso 456:** Se solicita contacto de correo electrónico de Benjamín Ochoa para continuar gestión del caso expuesto, ya que no se ha podido establecer comunicación vía telefónica.

Respuesta ETB – Carmen Rocío López: Se remite correo del Ingeniero Benjamín Ochoa: benjochb@etb.com.co

- **Caso nuevo:** Para EAAB – Zona 2, se solicita visita en la carrera 25 entre calle 67 y 68, para que la UAERMV pueda iniciar obras.

Respuesta EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Ayer en la tarde se habló con el área operativa de Acueducto, se destinó un equipo exclusivamente para ir hoy al sitio trabajar en el tema requerido por UAERMV, estos días por capacidad operativa no se había podido efectuar la visita.

Así mismo se esperaba apoyo con proceso de geofonía para detectar daños, parece que de donde esta emanando el agua no está el daño, por lo cual se debe realizar excavación y hacer una búsqueda manual para encontrar el origen de la fuga. Por lo tanto, se informa que el jefe de la división de acueducto destinó un equipo para el día de hoy. **(Resuelto)**

5.5 EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:

El Ingeniero Wilson agradece la gestión de la Ingeniera Martha Helena de la Secretaría Distrital de Movilidad, quién apoyo el martes con el trámite y gestión de un PMT para la intervención de la calle 73 con carrera 15, para finalizar un contrato IDU que estaba inconcluso y requería atención prioritaria.

Por otro lado, se informa que durante la semana se hizo un análisis de los casos y compromisos pendientes por parte de la zona, encontrando que muchas de las solicitudes ya se encuentran atendidas, pero no fueron descargadas de la base de datos.

Se reportan atendidos los siguientes casos: 129, 182, 191, 248, 249, 264, 287, 304, 357, 368, 413, 419.

Respuesta IDU-Álvaro Reinoso: Se agradece la gestión realizada y se informa que se actualizará base de datos.

5.6 EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:

- **Caso 514:** Se informa que se recibió un requerimiento para la carrera 20 entre calle 62 sur y 63 sur, sobre este segmento la UAERMV realizó intervención y hubo presencia de algunos funcionarios de la división de alcantarillado. En visita técnica se definió que no era posible apoyar a la Unidad de Mantenimiento Vial, ya que no se cuenta con recursos para atender el segmento, a su vez, el tramo tiene problemas por conexiones erradas a causa de manejo de la misma comunidad.

Intervención UAERMV – Humberto Ramírez: Se solicita copia de la respuesta que se emita al señor Fabian Espitia Reyes, respecto a la intervención del tramo vial.

- Se solicita a IDU agendar nuevamente reunión virtual con EAAB para la próxima semana, toda vez que se requiere revisar el tema de Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público con el Ingeniero José Santiago Bitar Arango, ya que se tienen dificultades con los contratos de obra de acueducto y alcantarillado.

5.7 ETB – Carmen Rocío López:

Se reiteran los casos presentados en el comité, así mismo se informa:

- **Caso 360:** Se informa atendido, en enero de este año se trasladaron los postes.
- **Caso nuevo:** Para la Alcaldía de Suba, respecto del contrato 541 de 2021, se señala que frente al predio calle 155 N°. 99A-42 se requiere traslado de poste, el contratista indicó que asumía los costos, no obstante, se solicita coordinar con apoyo a la supervisión del contrato.

5.8 SDM – Martha Helena Silva:

- **Caso nuevo:** Para Tigo, se reporta hueco en una cámara en la Av. Carrera 15 por Av. Calle 116, costado noroccidental. El contratista del IDU de los andenes de la AC 116 puso un maletín encima, pero lo van a quitar en estos días, por lo cual se requiere que se coloquen la respectiva tapa para evitar riesgo de siniestralidad.

5.9 Claro– Nohora Victoria Gómez:

Se reporta cierre de los siguientes casos:

- **Caso 83:** Se informa para 1) Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos: Estos trabajos ya se vienen ejecutando desde el pasado mes de Abril /23. Ya se están adelantando trabajos para culminar la Fase 3. 2) Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes: estos trabajos se han venido ejecutando de acuerdo con la entrega de infraestructura por parte de ENEL. Se ha intervenido dos pequeños tramos desde el mes de junio. Actualmente se encuentra en estado suspendido.
- **Caso 475:** Corresponde al Contrato 396-2022. Este certificado de “paz y salvo” fue

radicado al consorcio el pasado 18 de julio de 2023 mediante correo electrónico: (cdi.engativa@gobiernobogota.gov.co) y adicionalmente en la página de radicaciones del IDU a través de consecutivo 202352601462992.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
366	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a realizar intervención de cambio de carpeta en este tramo vial y se requiere evaluar infraestructura de redes húmedas.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
367	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	IDU	PENDIENTE
370	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA, SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto Línea Techo Veraguas, adicionalmente se solicita lograr la viabilidad de inicio de actividades de modernización sobre el tramo 2 - Calle 3 entre cra 50 y Av 68 para el primer trimestre de 2023	Entidades participantes en el Comité	SDP emitió respuesta con radicado SDP N°. 2-2023-18434
372	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
373	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
374	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carreras 7 y 9 se realizó visita e inspección y se evidenció que corresponden a acometidas domiciliarias de la empresa de acueducto, se hace el llamado a la zona 1 de la Empresa de Acueducto para que por favor revise, se deja trazabilidad del caso en chat de grupo de trabajo y registro fotográfico	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
375	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
376	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se está presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con CL 26, CL 26 con KR 69 y el tercer punto CI 26 cerca a la Av Boyacá	IDU	PENDIENTE
378	Solicitud de priorización al FDL de Usme sobre una intervención en la Calle 99 Sur No. 1A- 61, se remitió solicitud mediante correo electrónico	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE, Acta 05: SDG indica que el correo fue remitido al fondo de desarrollo local sin embargo no se ha dado respuesta

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
379	Requerimiento de respuesta a la Zona 1 EAAB del radicado 3133002 -S-2022-317611 por concepto de instalación de tubería en acero de 14 pulgadas en la Carrera 62 entre Calle 169 B y Calle 167	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
380	Solicitud de trazabilidad en el comité respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A. En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Álvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	IDU	PENDIENTE
381	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRDR dan respuesta, lo que ha generado problemáticas para atender el proyecto de fibra óptica para la ciudad, solicita priorizar el caso	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
387	Requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
388	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Álvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
391	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
392	Solicitud a la EAAB respecto a daños en proximidad al pozo de inspección, posibles daños en la red de alcantarillado. Se solicita evaluación por parte de la EAAB en la Carrera 52 C desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 41 A Sur.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
395	Caso de una cámara localizada en la Carrera 23D No. 60A - 10 Sur que está sin tapa, una señora tuvo un accidente en dicha cámara	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
396	Requerimiento respecto a una consultoría del 2018 sobre dos salones comunales, indica que en 4 años no se ha obtenido resultado alguno, sin embargo menciona que de la consultoría de ambos salones comunales el que se encuentra ubicado en la Carrera 35A con Calle 9 Sur detrás de la Iglesia de Santa Matilde requiere apoyo referente a un contacto para agilizar el trámite de disponibilidad de servicios públicos con Acueducto, Vanti y Enel Colombia (Codensa), indica que con Vanti ya se tuvo la primera audiencia sin embargo la idea es volver a solicitarla.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
398	Otro caso es el del CIV 16002083 vamos a iniciar su intervención, es un callejón cerrado en pavimento flexible pretendemos hacerlo en pavimento rígido, pero por esa misma proyección que tenemos necesitamos la definición del acueducto si allá se van a cambiar o no las redes para poder definir tiempos de trabajo en conjunto. Dirección a intervenir Carrera 51 entre Calles 37 Sur y Calle 28 Sur	EAAB - Zona 4	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
400	En la noche del 6 de marzo de 2023 se hizo un recorrido con la UAESP para el tema de las expansiones que necesitamos en un parque porque es un punto crítico de venta de estupefacientes y de habitabilidad de calle, en este momento se está generando un sendero con la comunidad a partir de la iniciativa juntos cuidamos Bogotá, pero necesitamos las expansiones de esa luminaria, la UAESP nos indicó que cuando termináramos el sendero hiciéramos otro recorrido para solicitarle a Enel el tema de la expansión, nos gustaría darle celeridad a ese tema porque es un punto crítico de la localidad y la comunidad lo ha pedido mucho	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE Acta 14-2023: Se efectuó recorrido el 6 de marzo, se está gestionando a través del comité de expansiones.
401	Se remitió al chat de trabajo un caso por la Avenida Calle 3 por Carrera 56 para la cual no se observó señalización alguna, fue enviado para verificación a quien está haciendo esa inervación con el objetivo de que se recupere el espacio.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
404	Solicitud al acueducto zona 5 sobre un caso reportado en marruecos Calle 50 A Sur No. 7 – 64, requiere que atienda visita en este sector.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
406	Solicitud para las empresas ENEL Colombia, Vanti, ETB y Acueducto, están por iniciar dos proyectos un parque de bolsillo en la Calle 7 con Carrera 3 y uno de espacio público en la Calle 12C entre 1A y Carrera 3 desde la Calle 12B hasta la Calle 12D, requerimos acompañamiento de las empresas con el objetivo de generar un diagnóstico de redes para que el contratista las tenga en cuenta, la semana pasa se enviaron las solicitudes, pero no se ha obtenido respuesta, pregunta que si por medio de este comité se puede generar la cita.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
408	Presenta requerimiento para la zona 1 de acueducto con el ing. Mauricio Mahecha, donde un ciudadano reporta una queja indicando que hace más de dos meses la empresa de acueducto rompió e hizo una zanja frente al predio de la Carrera 46 No. 138 – 53 y no se ha recuperado, para que por favor zona 1 investigue a que contrato pertenece.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
410	En la Carrera 62 con Calle 62 hasta la Calle 64 en el barrio Santa Rosa Sur hay cuatro segmentos viales que no cuentan con alcantarillado pluvial, se solicita apoyo a la EAAB, la comunidad manifiesta que en ocasiones se ha generado inundación en sus predios.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
411	El año pasado se presentaron unas solicitudes de factibilidad a ENEL para el servicio en Betania y San Juan. Se hicieron visitas técnicas y nos informaron que para Betania se tenían que hacer unas adecuaciones eléctricas que ya se están estudiando dentro de una formulación. Sin embargo, quedó pendiente el tema de San Juan, indica que de esas visitas no recibió acta, adicionalmente desconoce si la información fue recibida por ingenieros y arquitectos que ya no están en el fondo, es decir que se perdió la trazabilidad del caso, pregunta si es posible que de parte de ENEL que le remitan las actas de esas visitas técnicas.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
412	<p>El FDL de Chapinero el marco del Decreto Distrital 168 del 2021 ha solicitado la asistencia técnica tanto a empresas de Servicios Públicos como entidades distritales, sin embargo algunas de estas entidades no nos han dado respuesta, es muy importante contar con los delegados de cada entidad para poder llevar a cabo las mesas de trabajo de asistencia técnica teniendo en cuenta que en los estudios y diseños que existen en el banco del FDL de Chapinero se prevé la subterranización, traslado y protección de redes de servicios públicos perteneciente a los activos de cada empresa. Se han adelantado algunas mesas de trabajo con algunas entidades distritales, sin embargo en este momento estamos a la espera de los delegados de la Secretaría Distrital de Planeación por parte de la Secretaria Jurídica, IDU, Claro , ENEL Colombia, IDPC , Movistar, Promo ambiental, Catastro, Une EPM, Grupo Energía Transición, DADEP, Requerimiento N. 2 Al IDU y Secretaría Distrital de Hábitat. En el mismo correo donde se envió la invitación a la convocatoria se va a enviar estos oficios con los acuses de recibido por parte de cada una de estas empresas y entidades, con el objetivo de contar con la asistencia técnica y respuesta oportuna a los procesos de formulación del FDL de Chapinero.</p>	IDU	PENDIENTE
415	<p>Solicitud al Ing. Pablo Ponce para que por favor nos ayude a evaluar el cobro de energía de la planta la esmeralda, la sede de producción, nos llegó un cobro por 235 millones de pesos, estamos un poco ilíquidos, de acuerdo con una revisión que hizo uno de los contratistas de ENEL para evaluar el cobro se dio cuenta que en algún momento el consumo de energía había bajado y establece que como es una sede industrial entonces nosotros producimos todos los días las mismas cantidades y no es así , hay meses donde no tenemos la mezcla de agregados y donde la producción baja, ya le escribí al Ing. Pablo Ponce no me ha contestado voy a reiterar a ver cómo nos puede ayudar para ver a quien le respondemos el requerimiento y si nos dan plazo para pagar eso.</p>	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
416	<p>Corresponde a la filtración de aguas residuales entre la transversal 19 y calle 46 sur donde se ubica la central de ETB San Carlos, hay una filtración de aguas residuales que está llegando a la red de ETB y está ingresando al predio San Carlos y está generando malos olores adicionalmente está afectando al colegio Bernardo Jaramillo, no sabemos si hay un tubo roto conexión errada o alguna que está ocasionando esta problemática.</p>	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
417	<p>Para EAAB – Zona 3, tenemos una filtración en una caja de paso en la Calle 36H Sur N°. 11A-08, se requiere una visita conjunta con la empresa para verificar los daños, se precisa de manera urgente pues corresponde al desagüe de una caja de paso sencilla y sobre la misma se ha presentado derecho de petición.</p>	EAAB - Zona 4	<p>PENDIENTE Acta 13: Se indica que se remitió respuesta por correo, se informa reenvío de información el 20 de abril.</p>
418	<p>En la calle 127 con 13A, la semana pasada se informó al delegado de EAAB - Zona 1, sobre una filtración de agua, allí enviaron personal, pero dijeron que no era del alcance de ellos. Sin embargo, ETB está preparando la cámara y arreglando todo lo que le corresponde, no obstante, la filtración continúa. Por lo cual, se le requiere a la EAAB que revise la filtración y solucione este inconveniente.</p>	EAAB - Zona 1	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
421	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	ETB	Acta 32: ETB indica que no encuentran información asociada a dicho contrato, van a elevar una comunicación al FDL de Kennedy para informarle que no se obtuvo ninguna información sobre el caso.
423	Para EAAB – Zona 1, se solicita realizar visita y medidas tendientes a reparar socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente – occidente.	EAAB - Zona 1	Reiterado por IDU en el Comité N°. 18: Para EAAB – Zona 1, se reporta hueco en la calle 134 entre carrera 19 y carrera 19A - CIV 1003972 PK 510728. Indican que hay una importante socavación de aproximadamente un metro de profundidad, que se observa una tubería al parecer de alcantarillado. Reiterado por IDU en el Comité N°. 23: Para EAAB – Zona 1, EAAB INFORMA: Respecto a los requerimientos presentados por el IDU – Onisalba Segura de Arbeláez, se debe precisar que la recuperación del espacio público en zona 1 se realiza a través de un contrato de obra, por lo cual la información se remitió al contratista para que se efectuará las labores correspondientes y así presentar los soportes de atención a los casos.
426	Se solicita acta de coordinación al Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB - Zona 3, se ha requerido de manera reiterativa desde enero, toda vez que se está solicitando por una acción de tutela y a la fecha no se ha tenido respuesta al respecto.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE Acta 15-2023 - IDU – Álvaro Reinoso: Se envió directamente al director de acueducto Carlos Rivera y él se lo remitió al ingeniero Juan Rafael Osorio de la Zona 3. De igual manera, ayer se reiteró, porque de VANTI se recibió nuevamente requerimiento.
428	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	SDA	PENDIENTE
429	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	SDA	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
431	<p>Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una reunión que se llevó a cabo ayer (10-mayo-2023), en el tramo de la carrera 18 B entre calle 145 y 146. Allí la UMV va a intervenir, pero según lo informado por la dirección de la obra (Ing. Rafael Pérez) hay problemas de drenajes, entonces, se solicita a la EAAB evaluar el caso de manera conjunta y llegar a una posible solución.</p> <p>En la reunión estuvo José Casallas y Jairo García de la EAAB, por lo que conocen este caso y se solicita sea comunicado al Ing. Mauricio Mahecha.</p>	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
432	<p>Para ENEL Colombia, se relaciona con una cámara localizada en la calle 147 # 9-60, presencia de hueco que al observar con más detalle se encuentra que la base donde se apoya la tapa en dicha cámara se encuentra dañada generando una diferencia de altura, la cual al pasar un vehículo produce un efecto de rebote y a su vez las vibraciones dañando tanto la estructura de la cámara como la del pavimento adyacente a la misma.</p>	ENEL COLOMBIA	<p>Acta 17: Se reporta correo de operación regional, donde se indica que el caso se encuentra en gestión, para el levantamiento inicial se requiere un permiso no otorgado por emergencia y por tanto está en trámite el PMT correspondiente. ENEL ya realizó la visita, se realizó valoración y plan de trabajo, por ahora se espera tramite de PMT. Se reiterará a Oscar Escobar de la regional, para efectuar seguimiento interno.</p> <p>Acta 23 del 29 de junio de 2023: se informa que SDM va a instalar esta semana unos semáforos provisionales para regularizar el tránsito en este sector, y posteriormente si se aprueba el PMT para realizar la intervención pertinente.</p> <p>Acta 32: ETB solicita avance del caso a lo que ENEL no tiene respuesta al respecto, pero va a reiterar el seguimiento correspondiente.</p>
435	<p>Para IDU, el requerimiento presentado consiste en la obra que requiere adelantar Movistar frente a una de sus oficinas, el día de ayer la interventoría del contrato 1791, respondió que el acta de recibo definitivo no ha sido emitida para el inicio de la garantía, por tanto, no se pueden ejecutar obras adicionales. En adición, se observa que la ejecución se realizó sobre la ciclorruta y se requiere intervenir en un área diferente a este sector.</p>	IDU	<p>Acta 17: Existe una opción a través del acta de coordinación, si se indica por parte del contratista que ya terminaron la obra, esta es una información valiosa, y quizás exista una posibilidad de autorización, así mismo, la situación debe ser resuelta desde el área ejecutora, para advertir formas de avanzaba y coordinar las obras entre las dos entidades tal como se quería siempre hacer.</p> <p>Acta 18: Se tiene visita el día 26 de mayo para verificar en campo con Interventoría, es posible que se efectuó acta de coordinación.</p>
437	<p>Para ETB, sobre la calle 4F se tiene un cámara al parecer de telefonía, no obstante, se encuentra con marcación de EPM, la cual afecta la red pluvial del proyecto. Se solicita apoyo al respecto. Se encuentra cercano al CIV 16001178 – KR 44 entre CL 4F y CL 4F Bis y el contrato del cual hace parte es el 263 de 2022, contratista CONSORCIO INGEMEM 2022.</p>	MOVISTAR	FDL informa en sesión 28 de 2023 que la infraestructura no es propiedad de ETB, una vez revisada visita conjunta.
440	<p>Para EAAB, en la carrera 69B con calle 17 en el costado nororiental se encontraron dos cámaras con cables y canalizaciones afectadas por obras de la EAAB. Se solicita visita para verificar y atender los daños.</p>	EAAB - Zona 3	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
443	Para SDA, frente al contrato FDL RU 281 de 2019, se realizó radicación N°. 2021ER143989, donde se programan y efectúan visitas con funcionario de la SDA, contratista e interventoría. De estos recorridos se solicita generar modificaciones, y nuevamente se radica a la Entidad con número 2022ER173992, no obstante, a la fecha no se ha generado respuesta y desde el Fondo de Desarrollo Local se han remitido diversas comunicaciones sin pronunciamiento por parte de SDA. Este contrato lleva aproximadamente suspendido desde febrero del año pasado porque se requiere respuesta de Secretaría Distrital de Ambiente, para definir lineamientos y precisar la terminación.	SDA	PENDIENTE
444	Para ENEL Colombia SA ESP, se solicita recorrido para expansión de alumbrado público en el parque Sarasota de la localidad de Rafael Uribe, se remitió comunicación de manera previa a través de radicado 20216823134.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
447	Para EAAB, corresponde a un reporte efectuado en el chat grupal el 29 de mayo de 2023, se asocia a un daño en la carrera 16 con calle 138, se efectuó intervención y no fue recuperado el pavimento.	EAAB - Zona 1	Pendiente. Reiterado por IDU en el Comité No. 23
448	Para EAAB – Zona 1, respecto a la Avenida Ciudad de Cali con calle 134, se informa que son obras de redes donde su contratista dejó abandonada la intervención, son alrededor de 80 metros y la EAAB está solicitando que la UAERMV apoye con la terminación de esta obra. Se realizará la visita, pero la posición de apoyar el requerimiento en el momento es casi nula.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
452	Se solicita a ENEL Colombia SA ESP, que por favor deleguen a una persona para llevar a cabo las coordinaciones y los acercamientos a los que haya lugar en cumplimiento del principio de planeación y ley de infraestructura, frente a la etapa de formulación de los proyectos que tiene en curso el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
453	En el desarrollo del contrato 289, se llegó a la etapa de liquidación, y se están tramitando los certificados de “paz y salvo” con la EAAB, el día 16 de mayo de 2023 se remitió comunicación, pero no se ha logrado una coordinación con el líder de zona 1 y 2, el número de radicado es E-2023-047187, se solicita una respuesta oportuna. Se requiere visita de manera efectiva, para lograr liquidar, se han recibido recomendaciones de hacer nuevamente un oficio y radicar una reiteración en la EAAB, especialmente para zona 1, no obstante, se espera coordinar a través de esta instancia.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
454	En el marco de la ejecución del contrato 327 de 2023, se realizó la solicitud de visita técnica en campo a ENEL Colombia SA ESP, y a la fecha no se ha recibido respuesta, por lo cual se solicita un contacto para gestionar los requerimientos del contrato. Adicionalmente se informa que el radicado de la solicitud a ENEL es 000537380 del 23 de mayo de 2023.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
455	Para EAAB-Zona 1, el FDL de Usaqué se encuentra liquidando el contrato N°. 175 de 2022, por lo cual se encuentran en proceso de obtener los certificados de “paz y salvo” por parte de las empresas de servicios públicos, de tal manera, se requiere respuesta por parte de la EAAB-Zona 1, el radicado es E-2023-045253 del 10 de mayo de 2023.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
456	Para ETB, en la carrera 75 con calle 24, la UAERMV está realizando trabajos de rehabilitación, en una actividad se generó daño en red de fibra óptica de ETB que se encontraba superficial, se requiere conocer si la Gerencia de Intervención se comunicó con Benjamín Ochoa para efectuar reparación temporal.	ETB	Acta 34: El Ingeniero Benjamín informa que en este tramo hubo una afectación a la canalización pero que la UAERMV no ha manifestado la intención de realizar la reparación. Se da número de contacto al Ingeniero Humberto Ramírez de la UAERMV para que se ponga en contacto con Benjamín Ochoa y se de claridad respecto a la reparación de la red. Acta 35: UAERMV – Humberto Ramírez solicita contacto de correo electrónico de Benjamín Ochoa para continuar gestión del caso expuesto, ya que no se ha podido establecer comunicación vía telefónica, es remitido por Carmen Rocío López.
457	Para EAAB-Zona 5, se compartió el día de ayer un reporte correspondiente a daño sobre una cámara telefónica de ETB localizada en límite entre Bosa y Soacha, se solicita socializar situación con delegado correspondiente, para que se realice la reparación o se reciba factura con costo de los daños, adicionalmente se señala que al tener expuesto los cables telefónicos, pueden ser objeto de vandalismo y/o generar algún tipo de accidente.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
458	Para EAAB-Zona 5, se reporta segmento vial que salió en las noticias, está ubicado en la CL 26 S Entre KR 73 B BIS Y KR 73 C, se evidenció una socavación aparentemente por daño de redes, se intervino en marzo de 2022 en el Convenio 389 de 2020 entre el Fondo De Desarrollo Local de Kennedy y UMV, no obstante, no se puede adelantar parcheo hasta tanto se realice revisión y reparación de redes.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
459	Para EAAB – Red Matriz, se requiere validación de daños generados por las obras de la manija de Tibitoc, en la Av. Boyacá con Calle 10B, se envió correo electrónico a Fabián Restrepo (contratista de la obra), pero no se ha obtenido ningún tipo de respuesta, por tanto, se requiere escalar con delegado de EAAB.	EAAB – Red Matriz	PENDIENTE
460	Para SDA, se solicita respuesta a requerimiento radicado 2023ER97832 (SDP 2-2023-45032), en aras de obtener concepto actualizado de determinantes ambientales y continuar con el debido trámite del Plan Director Bosques del Mediterráneo.	SDA	PENDIENTE
461	Para EAAB-Zona 5, se solicita respuesta de fondo al requerimiento radicado en la EAAB como E-2023-054108, donde a la fecha se emitió concepto de salida S-2023-143100, señalando que allí se ubica un plan parcial, lo cual es del conocimiento de esta Secretaría, se ha aclarado y reiterado que el plan director hace parte del plan parcial, y, por tanto, se requiere un nuevo concepto. Toda vez que el concepto de viabilidad del plan parcial, ya venció (tenía vigencia de 3 años) y no se puede avanzar con otros instrumentos que hacen parte del plan hasta tanto se actualice concepto por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
462	Para SDA, se realizaron varios requerimientos para cierre de PINES AMBIENTALES: 19817 con radicado 2023ER977455, 19879 con radicado 2023ER97478, 18724 con radicado 2023ER97479, 21178 con radicado 2023ER97480, la solicitud se efectuó hace más de tres meses, lo cual representa un valor de aproximadamente 3000 millones, afectando las obligaciones por pagar, y siendo contratos que están próximos a fenecer, es un tema urgente para el FDL.	SDA	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	Se hizo reunión en la Alcaldía Mayor hace 8 días, invitando a Secretaría Distrital de Ambiente, pero no se muestra ninguna disposición para avanzar.		
464	Se presenta requerimiento para VANTI, respecto al traslado de una red de polietileno de 1" en el sector de Gualoche que se instaló sobre la vía. Se han realizado visitas por parte de VANTI, pero se requiere consolidar el traslado de la red a un costado del andén, generando retrasos en el proceso constructivo.	VANTI GAS NATURAL	Acta 34: VANTI solicita a Jacqueline contactar a FDL-Bosa para que se precise localización del sector Gualoche.
465	Para IDU, Requerimiento respecto al contrato 1311 correspondiente a sumideros, del cual no se ha podido cerrar el recibo de vías por parte del IDU, el contratista ya entregó los documentos radicados de acuerdo con lo conversado. Coordina una visita al IDU con el ing. Álvaro Reinoso ya que para ese contrato se vencen los términos próximamente.	IDU	PENDIENTE
467	Para EAAB-Zona 3, se solicita cambio de rejillas de cárcamo ubicado en la calle 23C entre carrera 118A y 117A, las rejillas existentes fallaron. Se ha radicado solicitud de remplazo, pero no se ha recibido respuesta al respecto.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
468	Para EAAB-Zona 3, se solicita revisión y reparación de pozo de inspección que presenta hundimiento en calzada localizado en la calle 21 entre carrera 91 y carrera 93, también se ha realizado traslado derivado de derechos petición, no obstante, no se ha recibido respuesta.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
469	Para ENEL, se tiene solicitud por parte de contratista S y S ingeniería, que termino contrato el 21 de mayo de 2023 con el FDL de Fontibón, ha solicitado certificación de "paz y salvo" y no ha recibido respuesta.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
471	Para SDA, se solicita apoyo del delegado para realizar cierre de los siguientes pines ambientales, los cuales cursan trámite en la Entidad: COP 314-2021: 2022ER150964, COP 290-2018: 2022ER320627, COP 291-2018: 2022ER295400, COP 317-2021: 2022ER168259.	SDA	PENDIENTE
472	Para SDA, respecto al contrato 391 de 2022, se presentan una serie de observaciones con el permiso de ocupación de cauce (Radicado SDA 2023EP74478 del 30 de marzo de 2023), el cual es requerido para intervenir puentes peatonales y vehiculares que cruzan por cauces de agua. Se precisa una revisión previa, puesto que al contrato le queda solo un mes de ejecución y se solicita información especializada.	SDA	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
473	Para EAAB-Zona 2, se solicita respuesta a requerimiento de "paz y salvo" para parques donde se efectuó mantenimiento por parte del FDL, el radicado de entrada es E-2023-038775 del 25 de abril de 2023.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
474	Para SDA, se solicita respuesta a requerimiento de "cierre del PIN Ambiental N°. 21870" para parques donde se efectuó mantenimiento por parte del FDL, el radicado de entrada es 2023ER129015.	SDA	PENDIENTE
477	Para EAAB-Zona 4, respecto a un daño evidenciado en la calle 55 sur con carrera 17 – CIV 6001412 PK 324192, la UAERMV está realizando intervención en el marco del programa de barrios vitales en la localidad de Tunjuelito, se observó un escape de agua, se solicita atención por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 4	Se reitera el caso en la sesión del 31 de agosto de 2023. Acta 32: EAAB indica que ya se repararon los daños, solicita a la UMV la recuperación del espacio público
478	Para IDU, se solicita el cierre de la licencia de excavación N°. 173 de 2020, así mismo, se requiere informar al delegado de la EAAB si hay alguna observación o respuesta al contratista, se anexa radicado IDU 20235260604902.	IDU	PENDIENTE
479	Para EAAB-Zona 1, se indica que existe una filtración de agua potable sobre cámara de ETB ubicada en la Autopista Norte con Calle 125, se requiere atender con urgencia y que se realice la recuperación respectiva por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
480	Para EAAB-Zona 3, se informa de la subestación de Fontibón que se realizará la intervención prioritaria de un interruptor, y se requiere desenergizar en la PTAR localizada en la calle 27 con carrera 96.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
481	Para la Alcaldía de Engativá, el área operativa de la EAAB encontró unas obras que ejecutó un particular, se observa conexión de una domiciliaria de alcantarillado en la KR 90 Bis N°. 69A-18 de la localidad de Engativá, se presentó afectación del espacio público sobre calzada e intervención no autorizada sobre las redes.	Alcaldía Engativá	PENDIENTE
484	Se presenta tema pendiente con VANTI – Gas Natural, y que se ha venido adelantando con el profesional Mauricio García, se informa que se encontró una red de 4" en acero, instalada posiblemente a través de perforación dirigida, afectando una descarga de domiciliaria de 6" en un predio localizado en la Calle 5B con carrera 73C, aunque ya se tiene conocimiento de la situación a resolver, se solicita quede consignado en el acta y se de seguimiento al caso, ya que se pueden generar situaciones de riesgo a los ciudadanos y daños mayores sobre el sector.	VANTI GAS NATURAL	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
486	Para EAAB – Zona 4, en la calle 55 sur con carrera 17 se reitera solicitud para que la EAAB repare daño en una zona por intervenir de la UMV.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
487	Para EAAB – Zona 2, en la carrera 56 entre calle 5 y calle 5B, se presenta red de alcantarillado con obstrucción, se requiere apoyo sobre este tramo ya que la UMV realizará intervención.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
490	Para EAAB – Zona 3, evento SIRE 5419922, localizado en la calle 5C entre KR 70 y 70C, se presenta daño en calzada por posible daño en redes que genera lavado de finos.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
492	Para la EAAB-Zona 4, se solicita respuesta de los radicados E-2023-062631 y E-2023-076559, correspondiente a solicitud de NO objeción a los diseños cercanos al Canal Río Seco.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
497	Para IDU, solicitud de información para revisar el contrato en donde se realizó la intervención del espacio público en la calle 53 con carrera 25 en el sector de Galerías, en ese punto hay dos predios identificados con nomenclaturas 25-35 y 25-los cuales están presentando problemas de drenaje, ya que al parecer el IDU en su momento afectó las conexiones. Requieren apoyo por parte del IDU para obtener información de los contratos y así mismo de quien ejecutó la obra en su momento.	IDU	Acta 32: IDU informa al ingeniero Wilson Porras de la EAAB que copió el correo que envió el área ejecutora la cual indica que el contrato ya no lo tiene dicha área y se encuentra en póliza desde el mes de abril.
499	Para ENEL, en el sector de Zona rosa en un predio de la AV CRA 15 # 82 30 el cual presenta problemas de drenaje de Aguas residuales en donde al momento de realizar la inspección no se encontró la caja de conexión domiciliaria. En dicha inspección se encontró al parecer una cámara de ENEL la cual también funciona como caja de conexión domiciliaria de alcantarillado. Solicita conocer quién es el responsable de las redes y coordinar una visita para verificar si la caja está siendo utilizada con una doble función ya que está en riesgo la prestación de los servicios públicos.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
501	Para Movistar, se están realizando trabajos en el barrio San Luis en la localidad de Chapinero en donde se van a intervenir unas vías, pero hay infraestructura de Movistar, solicita coordinar una visita técnica para ejecutar la obra de manera efectiva y no afectar las redes de Movistar.	MOVISTAR	PENDIENTE
502	Para IDU, en el predio de la AV carrera 68 # 68B – 61 el cual pertenece al concesionario de Motoriza solicita por medio del contratista hacer la reubicación de una caja que hace parte del sistema de alcantarillado de dicho predio. Indica que en el año 2022 gracias a la verificación de Google Maps, se puede observar que la caja se encontraba ubicada dentro del andén pero que debido a obras de ampliación realizadas por IDU en la calzada oriental para el proyecto Avenida 68, este dejó la caja domiciliaria en la calzada. La caja no está hecha para soportar cargas de tráfico y por lo tanto debe estar ubicada sobre el andén.	IDU	PENDIENTE
506	Para UMV, solicita una reunión con UMV para tratar el reporte de un daño en calle 78C # 17 f - 47 vía al Mochuelo ya que hay un daño en la acometida de EAAB	UMV	PENDIENTE

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
507	Para SDM, solicita aclaración para unos trámites de PMT que están realizando ya que han recibido varias objeciones respecto a los sectores patrimoniales los cuales hacen parte del IDPC.	SDM	PENDIENTE
508	Para ENEL, solicita información respecto a unas cámaras de Enel que no tienen tapas, requiere un correo de contacto para hacer la gestión.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
509	Para VANTI, en el contrato FDL RUU 281 de 2019, que compete a estudios y diseños para la construcción de malla vial, se requieren aprobaciones de los diseños, la única ESP que no se ha pronunciado es VANTI y se solicita su respuesta.	VANTI GAS NATURAL	PENDIENTE
510	Para ENEL Colombia SA ESP, en la Quebrada Yomasa se está presentando una socavación en área cercana a infraestructura de ENEL, y se requiere acercamiento con delegado de la empresa para efectuar visita y realizar las acciones pertinentes, por tanto, se solicita información de un profesional en ENEL para remitir la información correspondiente.	ENEL COLOMBIA	Acta 29: Intervención ENEL Colombia SA ESP – Pablo Ponce de León: Se informa que para el caso de la Quebrada Yomasa, se puede remitir la información al correo electrónico: pablo.poncedeleon@enel.com y de allí se enviará al jefe de zona - Leonardo Garcés, así como a Mauricio Arenas, para que se realice el debido seguimiento y atención.
511	Para EAAB, se está tramitando un certificado de viabilidad y disponibilidad del servicio para un salón comunal que se está construyendo en la localidad, radicado EAAB E-2023-1030279, se solicita respuesta al requerimiento y el contacto de un funcionario que pueda brindar información al respecto.	EAAB - Zona 4	El requerimiento referenciado ya cuenta con respuesta, se emitió el 14 de junio 2023, al señor Giovanni Rosso, el predio se localiza en la calle 42 sur N°. 72J- 25, Se remitirá por correo electrónico y ya están claras las instrucciones para hacer el trámite ante la EAAB.
513	Para ENEL, en el mismo parque Carbonero (TV 79 entre CL 81 y CL 71A Sur) se tiene una solicitud para ENEL respecto al traslado de dos postes que están ubicados en el eje de la vía, se requiere respuesta a la solicitud radicada, para ajustar cronograma.	ENEL COLOMBIA	Acta 34: Respuesta ENEL – Mauricio Arenas: Se solicita el número de radicado para darle seguimiento a la solicitud

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
-Casos presentados	365	100,00%	150	100,00%
-Casos resueltos al corte	267	73,15%	64	42,67%
- Casos pendientes al corte	98	26,85%	86	57,33%

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver dieciocho (18) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 83, 129, 182, 191, 248, 249, 264, 287, 304, 357, 360, 368, 413, 419, 475, 512, 514 y 515.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se logró resolver dieciocho (18) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 83, 129, 182, 191, 248, 249, 264, 287, 304, 357, 360, 368, 413, 419, 475, 512, 514 y 515, así mismo se presentaron avances en los casos de EAAB, ETB y ENEL.</p>	
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

8 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 05-octubre de 2023
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 05-octubre de 2023
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (presencial).	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 05-octubre de 2023

9 CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye la sesión número treinta y cinco (35) del Comité para la vigencia 2023, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 05 de octubre de 2023 a las 8:30 am, de manera presencial en el piso 5 del CAD - Secretaría Distrital de Planeación.**

En constancia se firman,



WILLIAM RODRIGUEZ CASTELLANOS
PRESIDENTE



PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA


Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP.

Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.


Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 35 de 2023.
2. Reporte de atención de casos EAAB-Zona 2.
3. Reporte de atención de casos Claro.

Subserie 2131-2.14


Número de casos registrados por mes

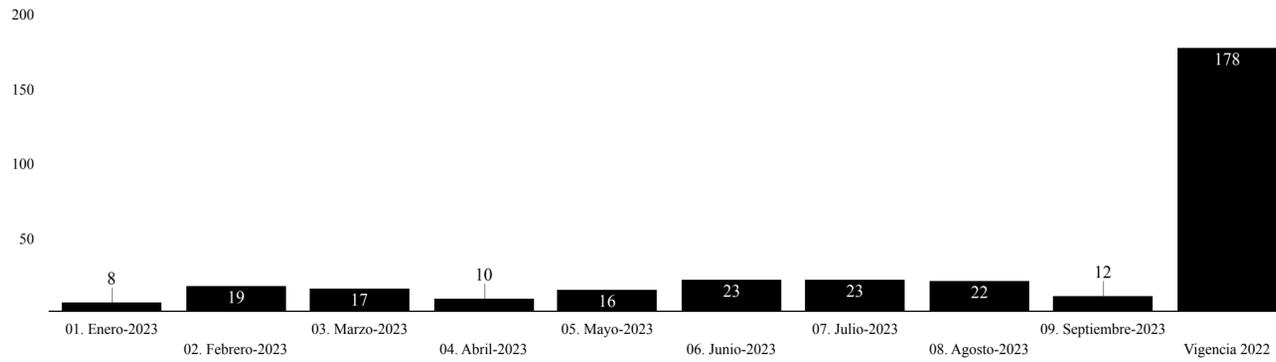

Número de casos resueltos por mes

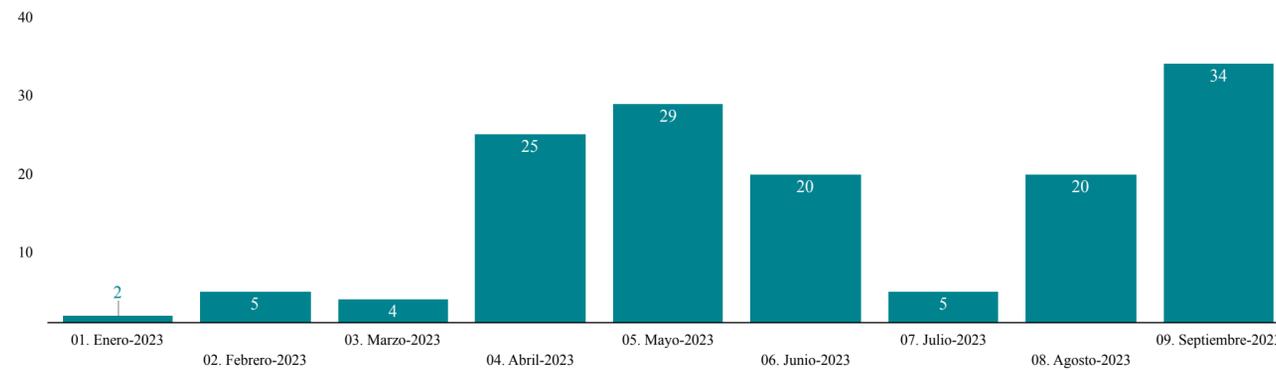

Número de casos pendientes por mes

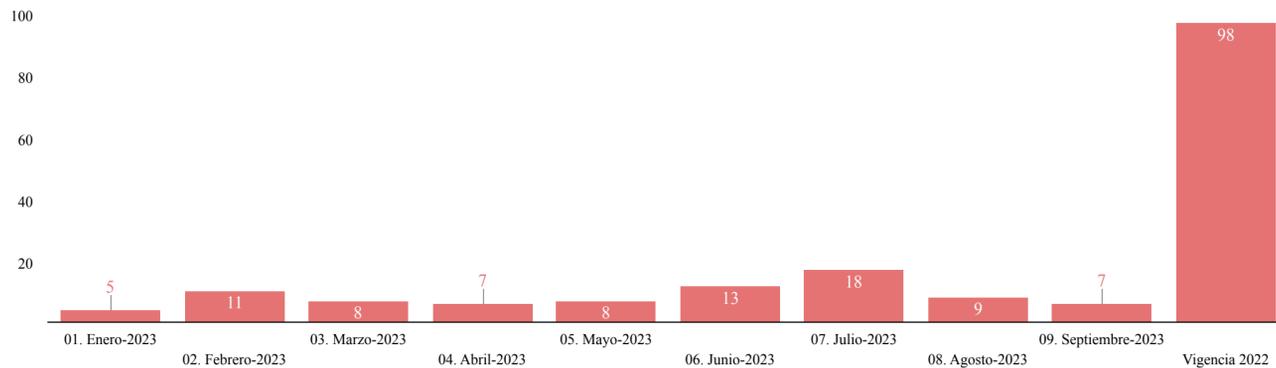

Recuento de casos

Nº. SESIÓN ...	Nº. DE CA...	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO
02 - Enero 26 de 2023	366	UMV	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a rea...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	369	IDU	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu...	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	368	MOVISTAR	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr...	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	367	MOVISTAR	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres...	IDU	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	372	SDG	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	371	Alcaldía San Cristóbal	Para Enel Colombia, la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022...	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de ...	373	EAAB - Zona 4	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio car...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	370	ENEL COLOMBIA	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyect...	Entidades participantes en el Co...	PENDIENTE
04 - Febrero 09 de 2...	374	UMV	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	376	MOVISTAR	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos:...	IDU	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	375	UMV	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	377	Alcaldía Kennedy	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully ...	IDU	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	380	VANTI GAS NATURAL	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón ...	IDU	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	383	ETB	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera I Es...	SDP	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	382	ETB	Se reporta novedad en cámara de ETB con filtración de aguas negras en la Calle 20 No. 13 - 29 se deja registro en video por e...	EAAB - Zona 3	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	384	ETB	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	ATENDIDO

Nº. de casos registrados

328



Nº. de casos resueltos

144



Nº. de casos pendientes

184




Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable

Mes reporte del caso

Tema de la solicitud

Porcentaje de avance

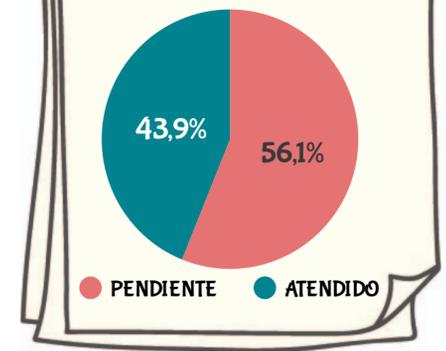

TOP – Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPO...	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	59
2. EAAB - Zona 2	34
3. EAAB - Zona 1	28
Total	328


TOP – Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPO...	SOLICITUD
1. EAAB - Zona 2	27
2. ENEL COLOMBIA	24
3. EAAB - Zona 3	19
Total	144


TOP – Entidades con casos pendientes

ENTIDAD RESPO...	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	35
2. IDU	26
3. EAAB - Zona 1	23
Total	184

Número de casos registrados por mes

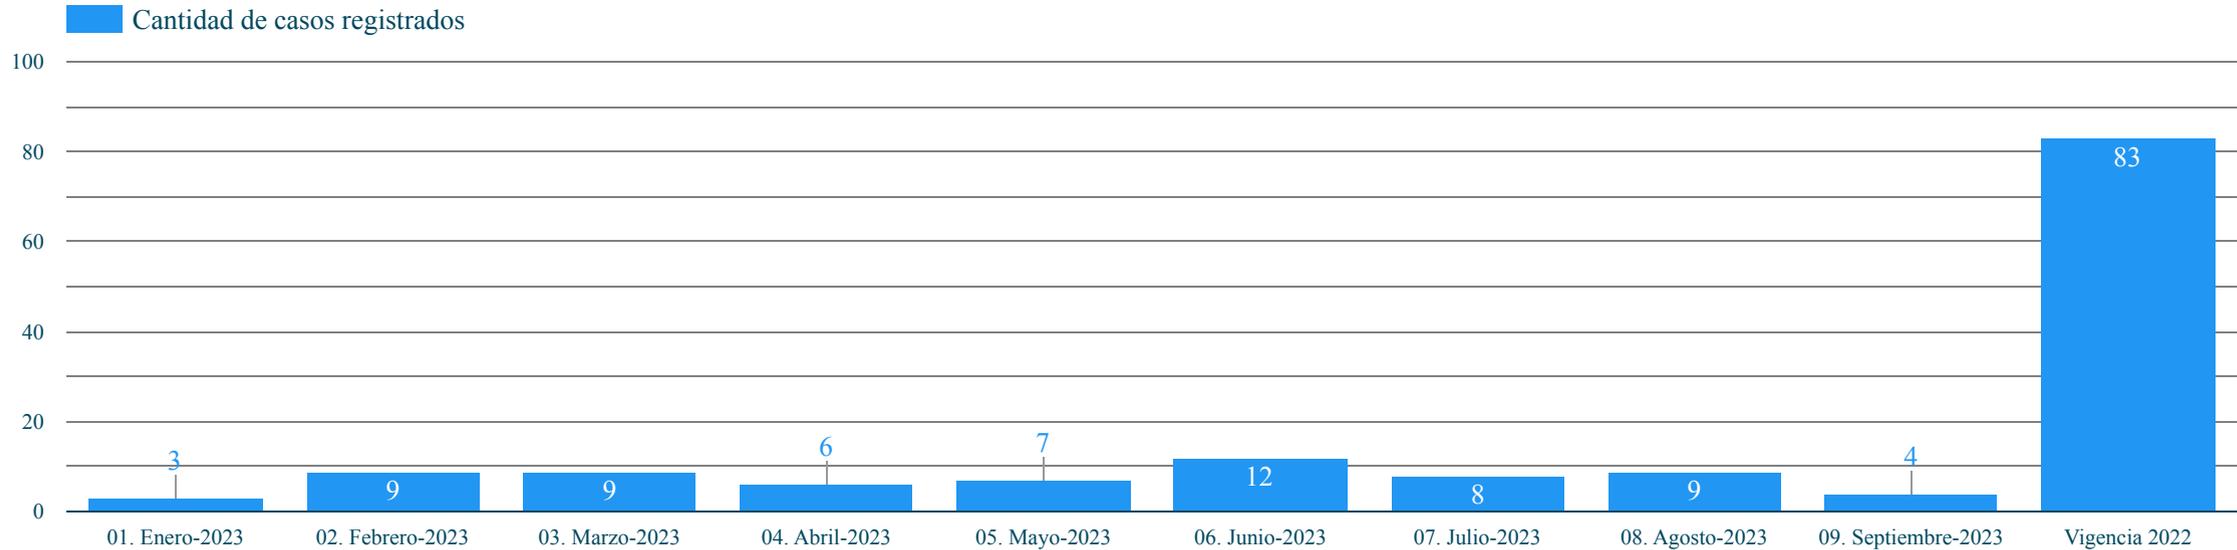


Número de casos por zona o área pendientes

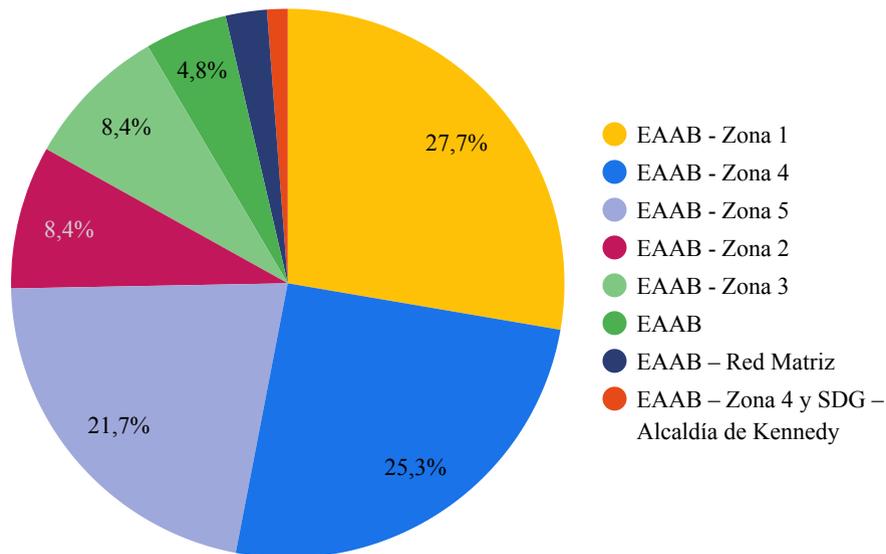


Nº. DE CA...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EAAB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	PENDIENTE
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	ATENDIDO
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU - II Sesión 2022)	ATENDIDO



Número de casos registrados por mes

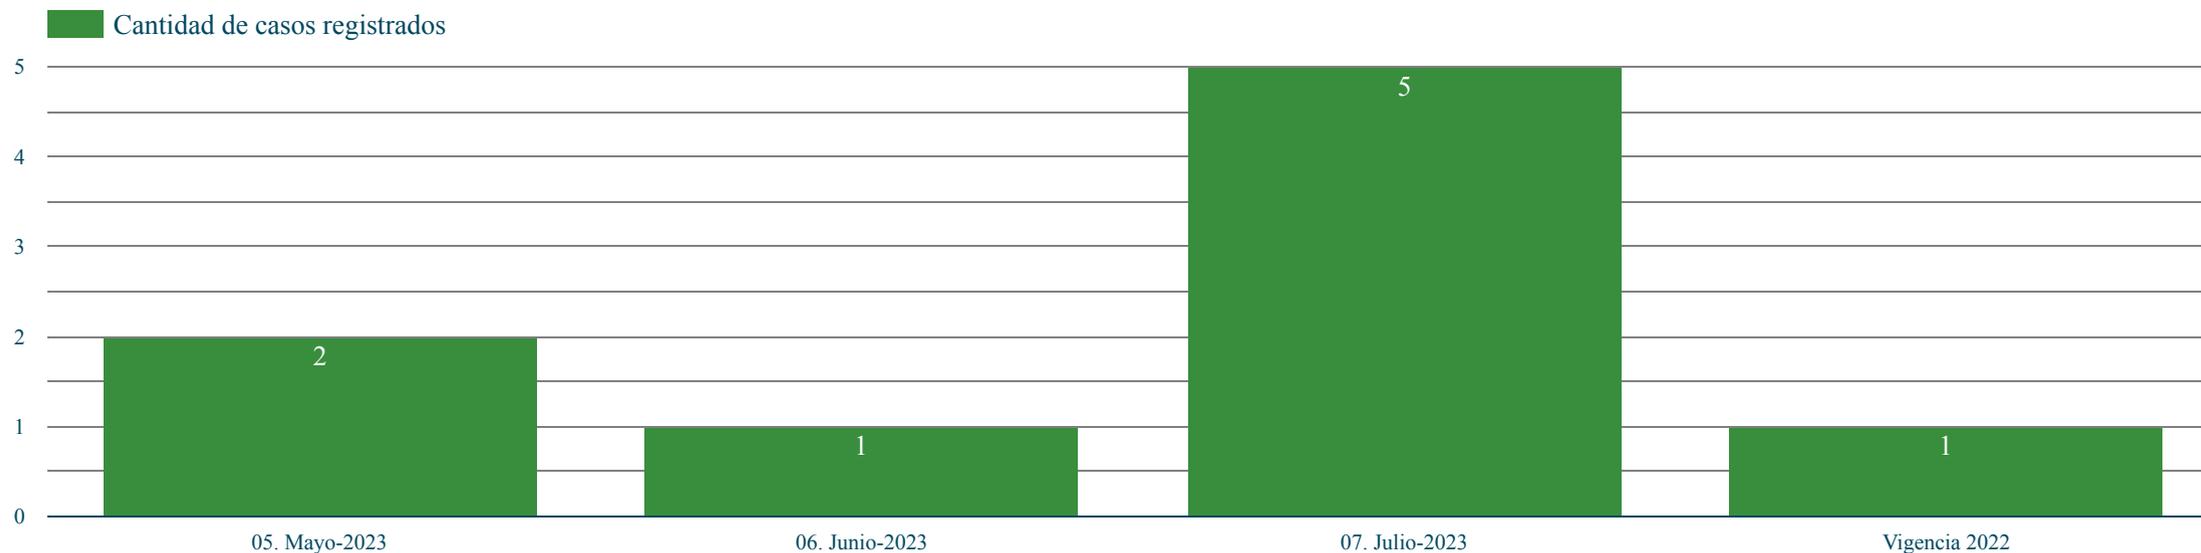


Pendientes por Entidad que presentó el caso

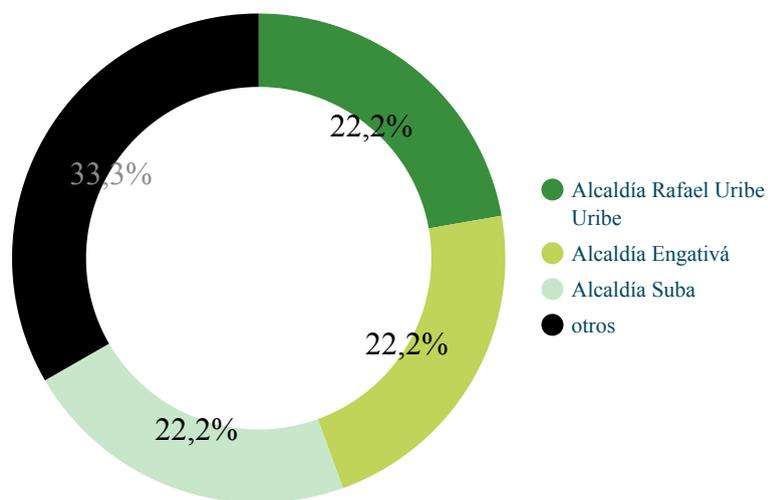


Nº. DE CASO	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
94	En el tema de malla vial, se encuentra PENDIENTE resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcabía Sumapaz – IX Sesión 2022)	PENDIENTE
428	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	PENDIENTE
429	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	PENDIENTE
443	Para SDA, frente al contrato FDL RU 281 de 2019, se realizó radicación N°. 2021ER143989, donde se programan y efectúan visitas con funcionario de la SDA, contratista e interventoría. De estos recorridos se solicita generar modificaciones, y nuevamente se radica a la Entidad con número 2022ER172002, no obstante a la fecha	PENDIENTE

Número de casos registrados por mes

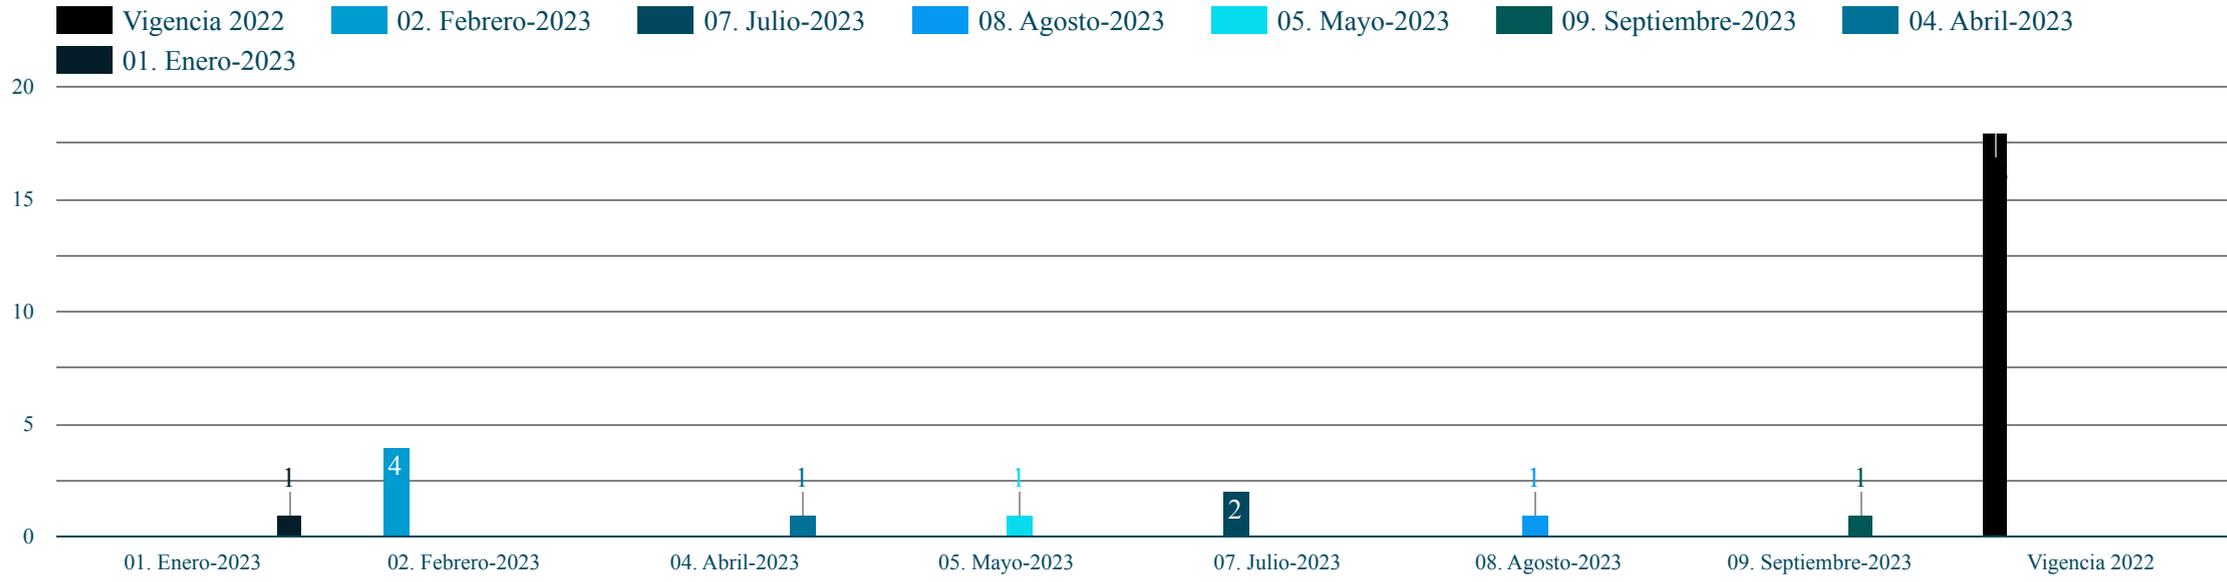

Número de casos pendientes por solicitante

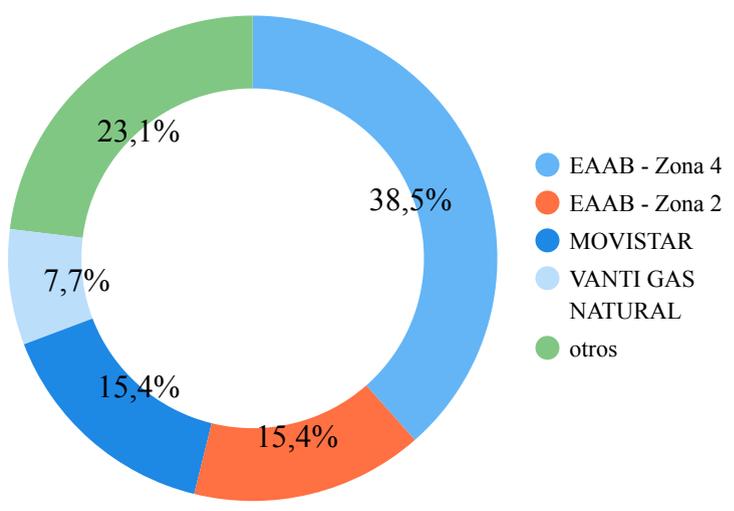

MES R...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presentó un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, CI26 con KR 69 y el tercer punto CI 26 cerca a la Av Boyaca	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va	PENDIENTE



Casos:

Unidad de Mantenimiento Vial - UMV


Nº. de casos registrados

5


Nº. de casos resueltos

4

Número de casos registrados por mes

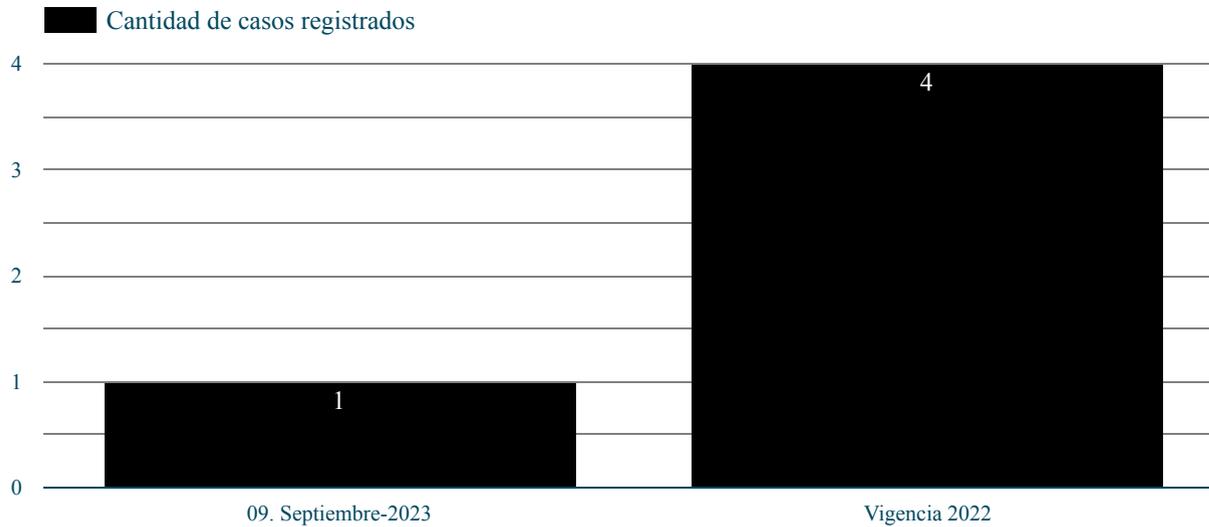


Pendientes por Entidad que presentó el caso

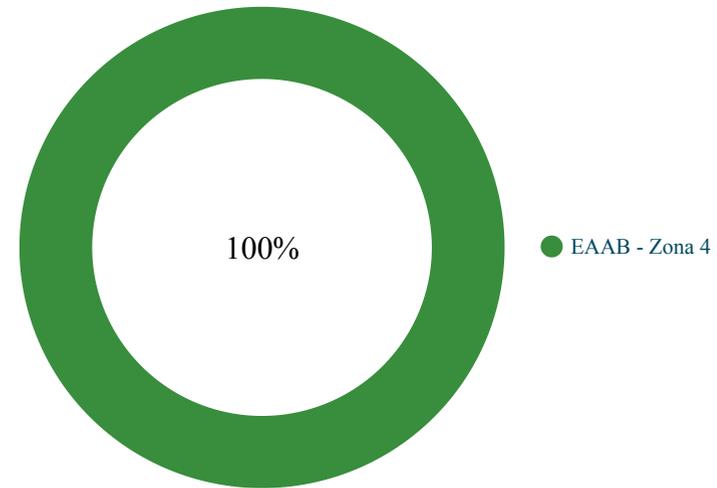


MES REPORTE DE C...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
09. Septiembre-2023	Para UMV, solicita una reunión con UMV para tratar el reporte de un daño en calle 78C # 17 f - 47 vía al Mochuelo ya que hay un daño en la acometida de EAAB	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para la UMV, para las intervenciones en el barrio "20 de julio", se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tuno – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	ATENDIDO


Número de casos registrados por mes

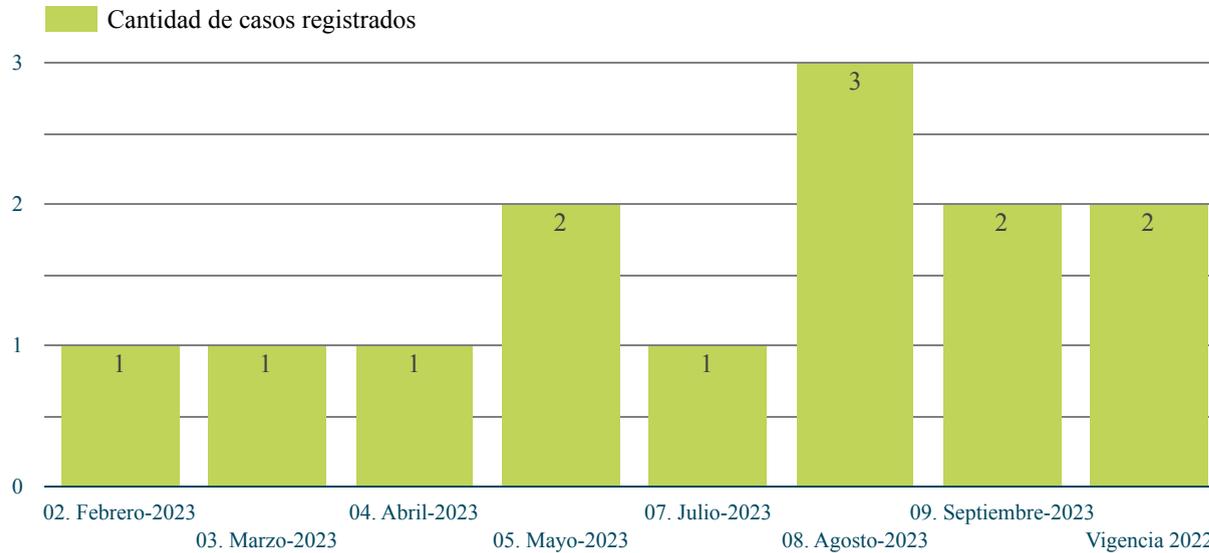

Pendientes por Entidad que presentó el caso

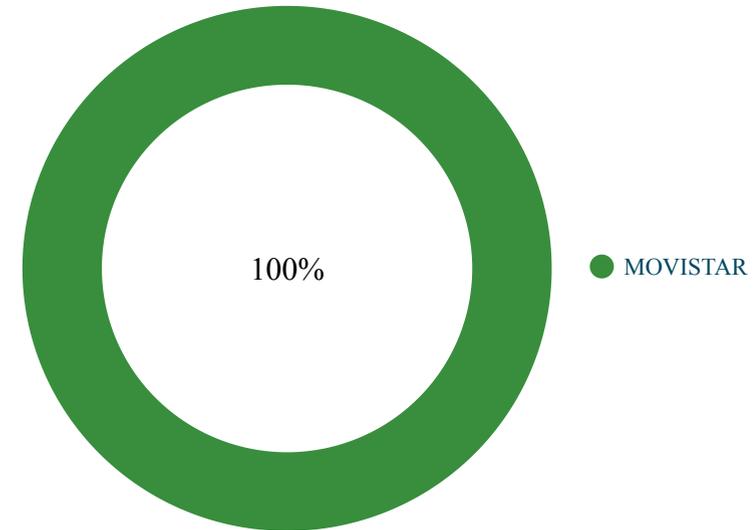

MES REPORTE DE CASO	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	ATENDIDO
03. Marzo-2023	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionados a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	ATENDIDO
04. Abril-2023	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer. Hoy estarán enviando el oficio a SDM, para que se considere la señalización de vías ejecutadas por el FDL.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 765 y en abril 150 para un total de 491 puntos pendientes sobre los cuales no se ha recibido respuesta es importante precisar que no nos	ATENDIDO



Casos: ENEL Colombia ESP


Nº. de casos registrados

60


Nº. de casos resueltos

25

Número de casos registrados por mes

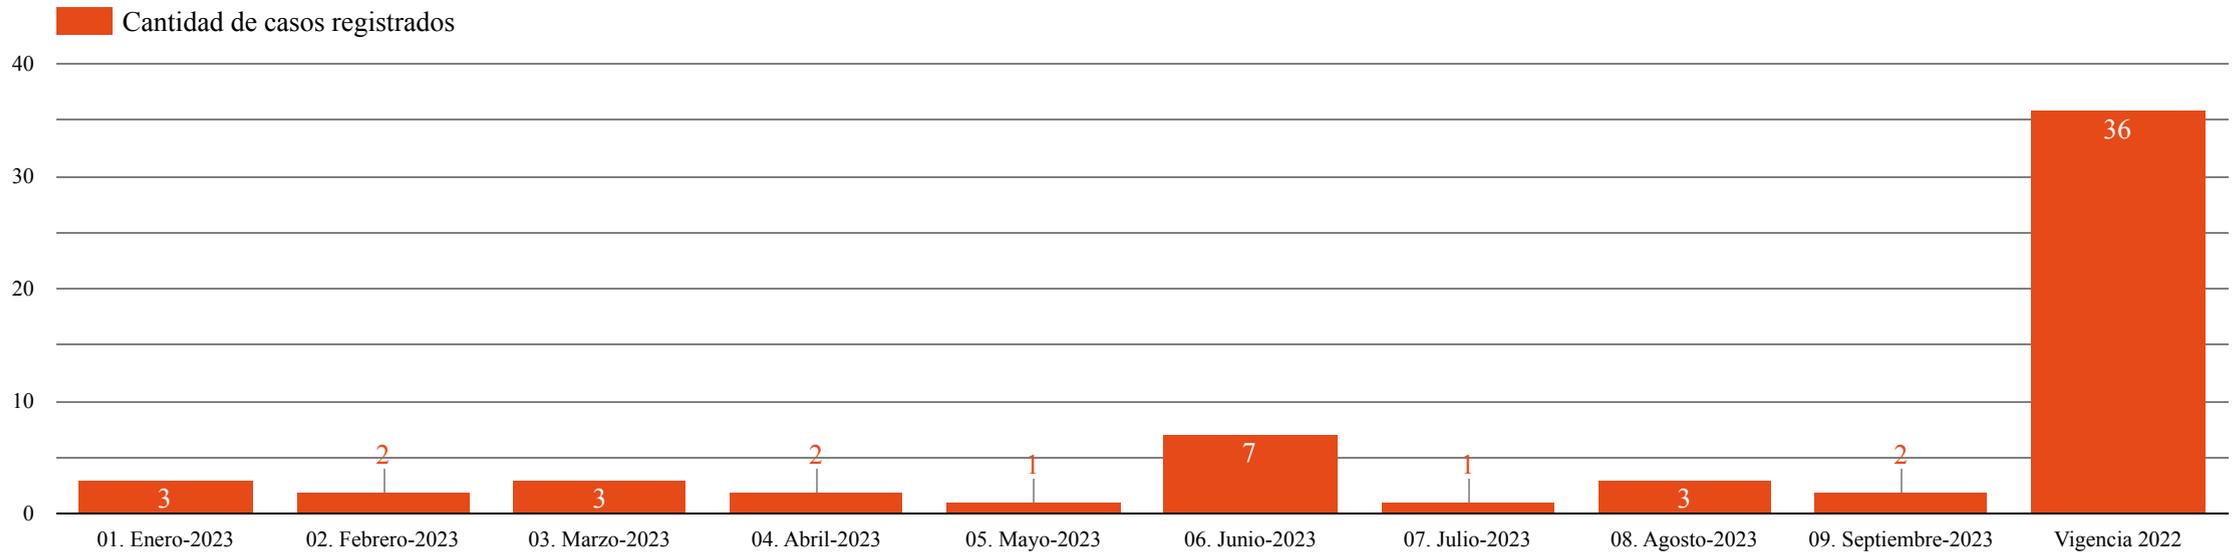


Pendientes por Entidad que presentó el caso

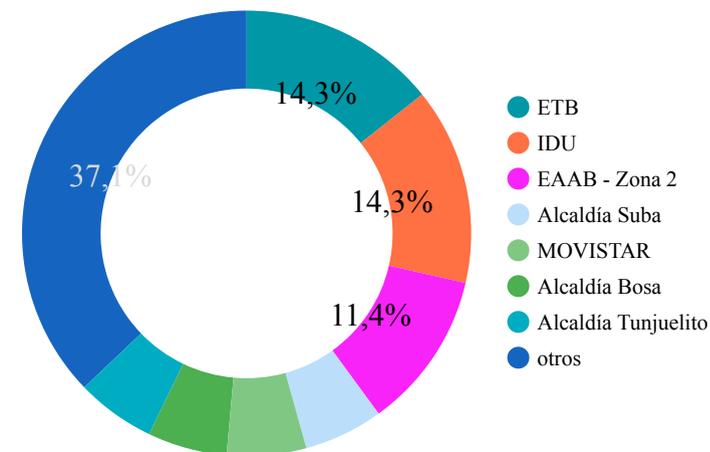


MES REPO...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	PENDIENTE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ATENDIDO
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	PENDIENTE
02. Febrero-2023	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Cadensa	ATENDIDO



Número de casos registrados por mes

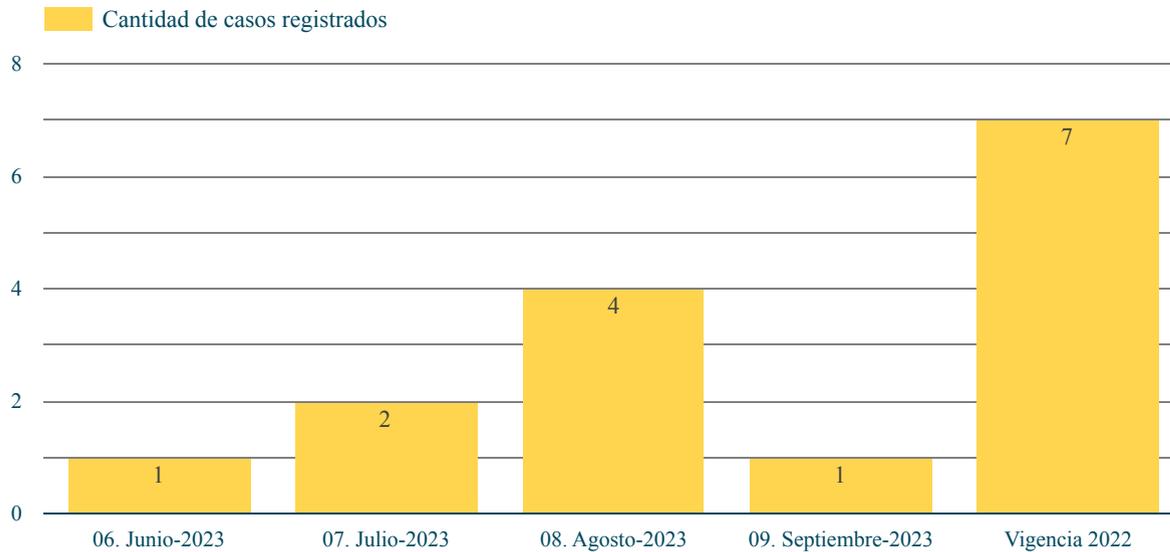

Pendientes por Entidad que presentó el caso

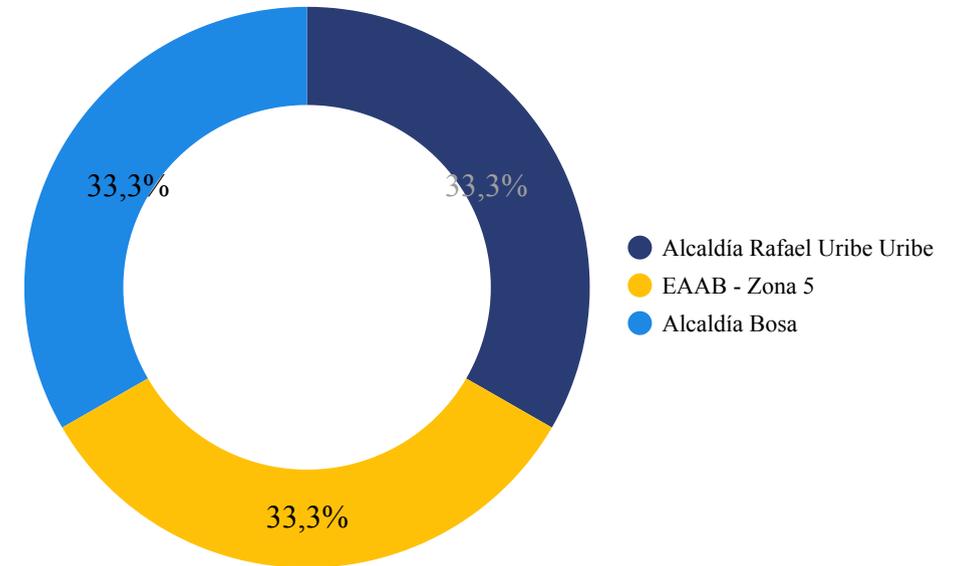

MES REPORTE DE C...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
06. Junio-2023	<p>Para VANTI, con respecto a un CIV en Alameda en la CL 63 Bis Sur entre carrera 74 H y 74F, solicita coordinar una visita de acompañamiento para tratar temas específicos en el punto. La obra fue reportada por medio de un oficio via correo electrónico informando las intervenciones y ubicación al inicio del contrato.</p> <p>Por otro lado, se realiza requerimiento frente a cinco puntos más en donde se van a abrir nuevos frentes de obra y solicita coordinar aspectos con VANTI. Se enviará correo electrónico para programar las visitas respectivas.</p>	ATENDIDO
07. Julio-2023	<p>Para VANTI, se tiene solicitud por parte de contratista S y S ingeniería, que termino contrato el 21 de mayo de 2023 con el FDL de Fontibón, ha solicitado certificación de “paz y salvo” y le han informado que no es posible emitir certificación de “paz y salvo” porque se tiene pendiente el pago de un daño, se ha solicitado factura, pero no se ha emitido respuesta.</p>	ATENDIDO
07. Julio-2023	<p>Se presenta requerimiento para VANTI, respecto al traslado de una red de polietileno de 1” en el sector de Gualoche que se instaló sobre la vía. Se han realizado visitas por parte de VANTI, pero se requiere consolidar el traslado de la red a un costado del andén, generando retrasos en el proceso constructivo.</p>	PENDIENTE
08. Agosto-2023	<p>Se reporta hundimiento en la calle 39 sur con carrera 72J – barrio Carimagua, se solicita que VANTI – Gas Natural indique si la válvula quedó instalada conforme a sus especificaciones técnicas, ya que en ejecución de obra efectuada por la EAAB se encontró red de gas en eje de intervención, así como poste de media tensión de 11400 V, por lo cual se recibió apoyo de ENEL Colombia.</p>	ATENDIDO



Casos:

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB


Nº. de casos registrados

13


Nº. de casos resueltos

9

Número de casos registrados por mes

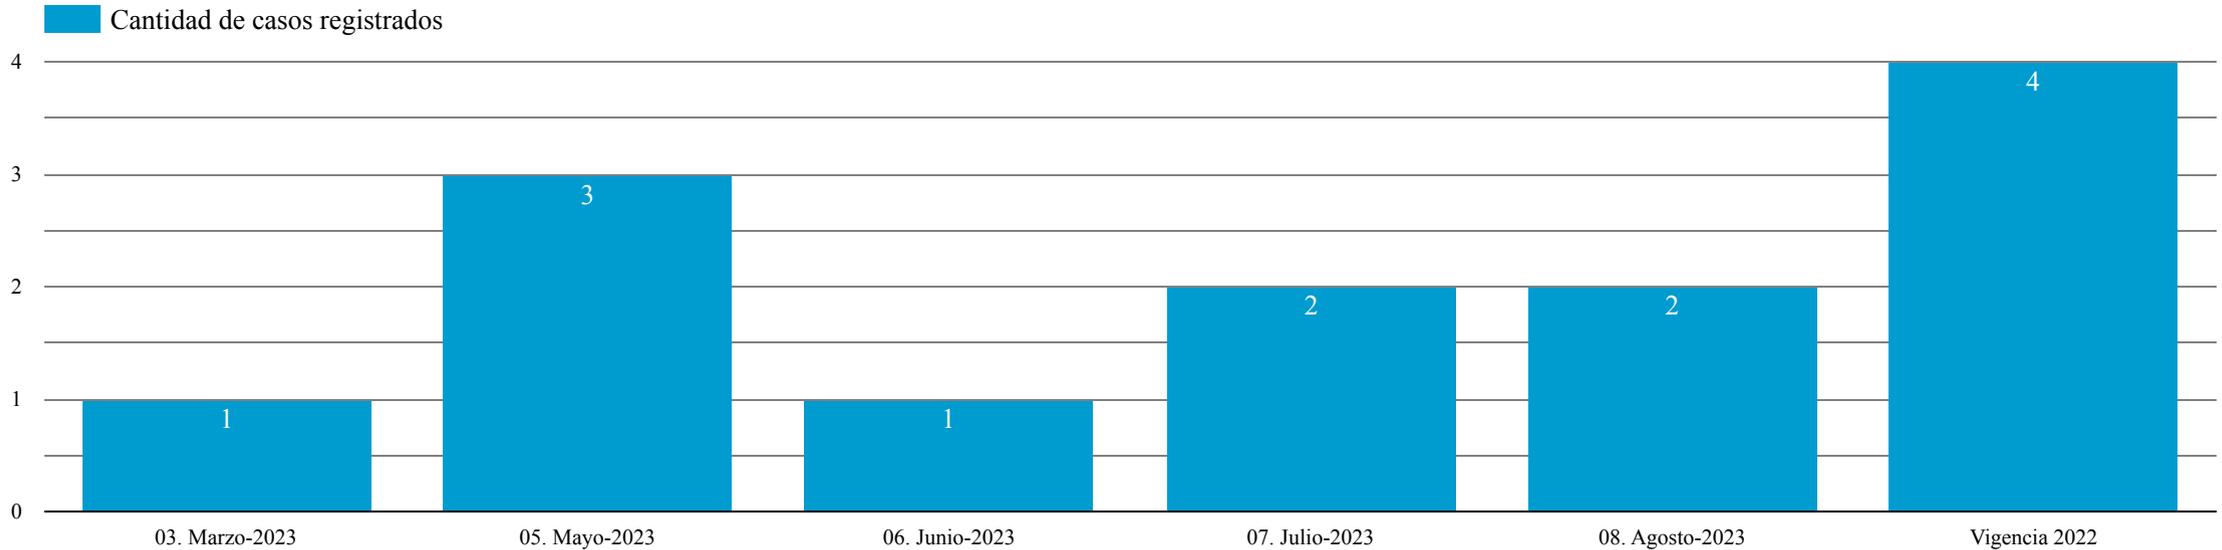


Pendientes por Entidad que presentó el caso

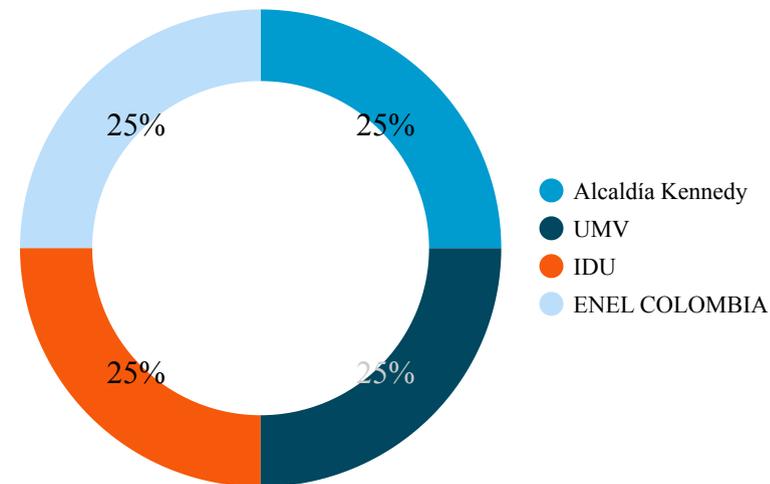

MES REPO...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
03. Marzo-2023	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renovación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal	ATENDIDO



Número de casos registrados por mes

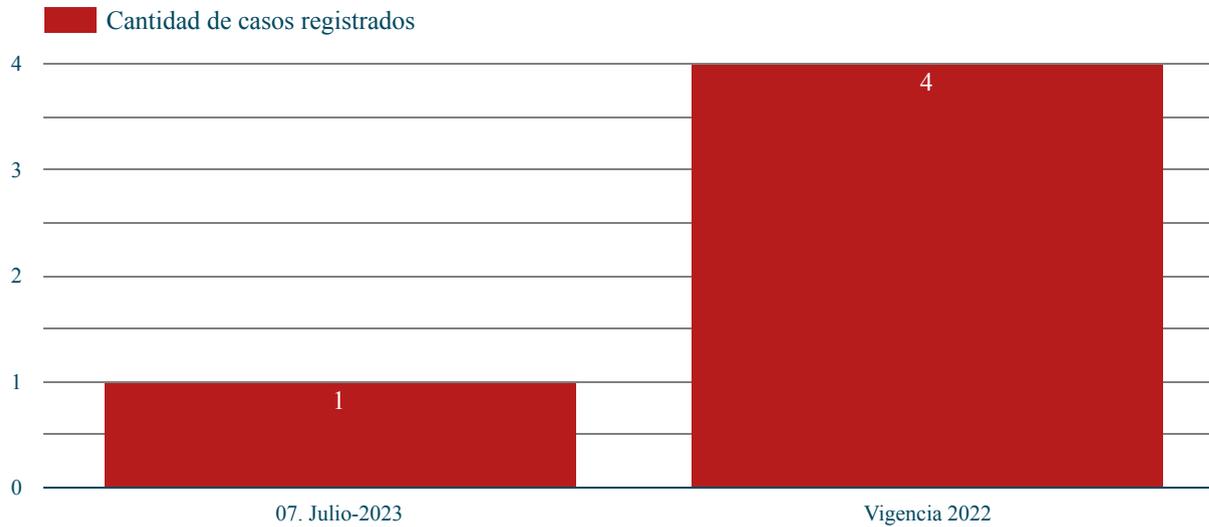


Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

MES REPORTE DE C...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
07. Julio-2023	Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de “paz y salvo” para contrato 396 de 2022 de INCITECO.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; pues se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	ATENDIDO

Número de casos registrados por mes

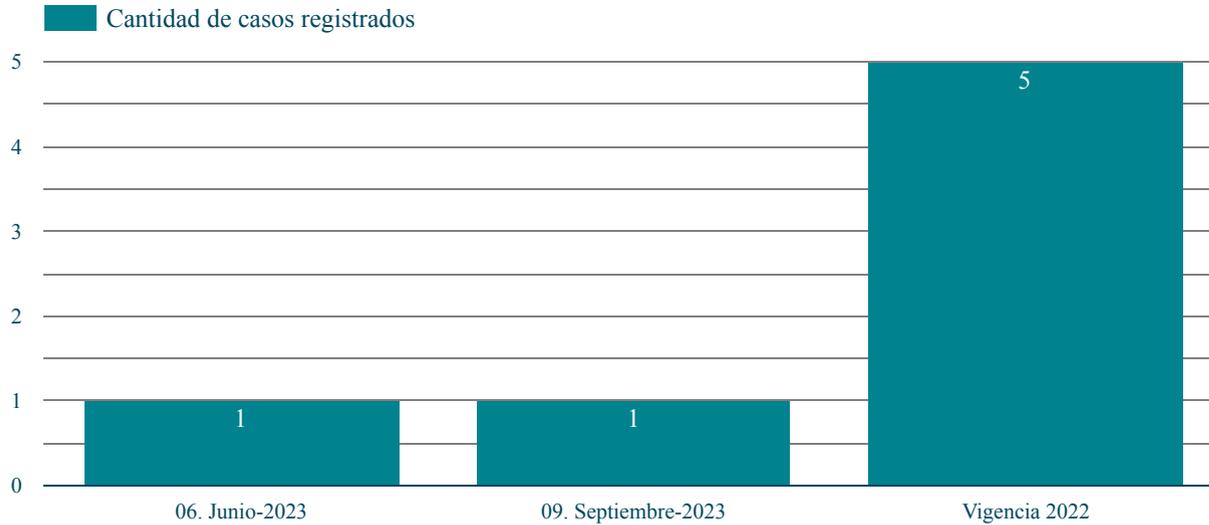

Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

MES REPORTE DE C...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
07. Julio-2023	Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de “paz y salvo” para contrato 396 de 2022 de INCITECO.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	ATENDIDO


ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA

MES REPORTE DE CASO


¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?

ESTADO DEL CASO


Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales

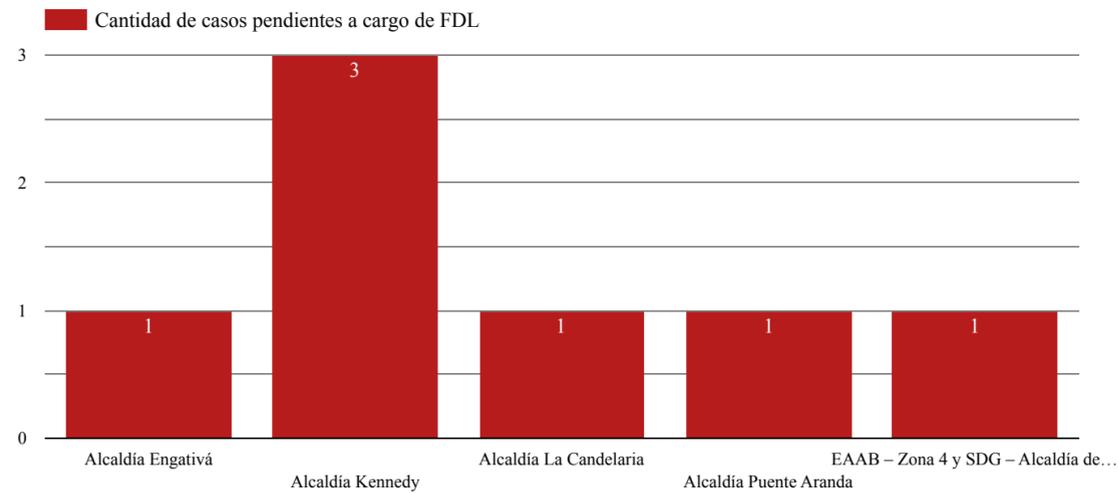

Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales

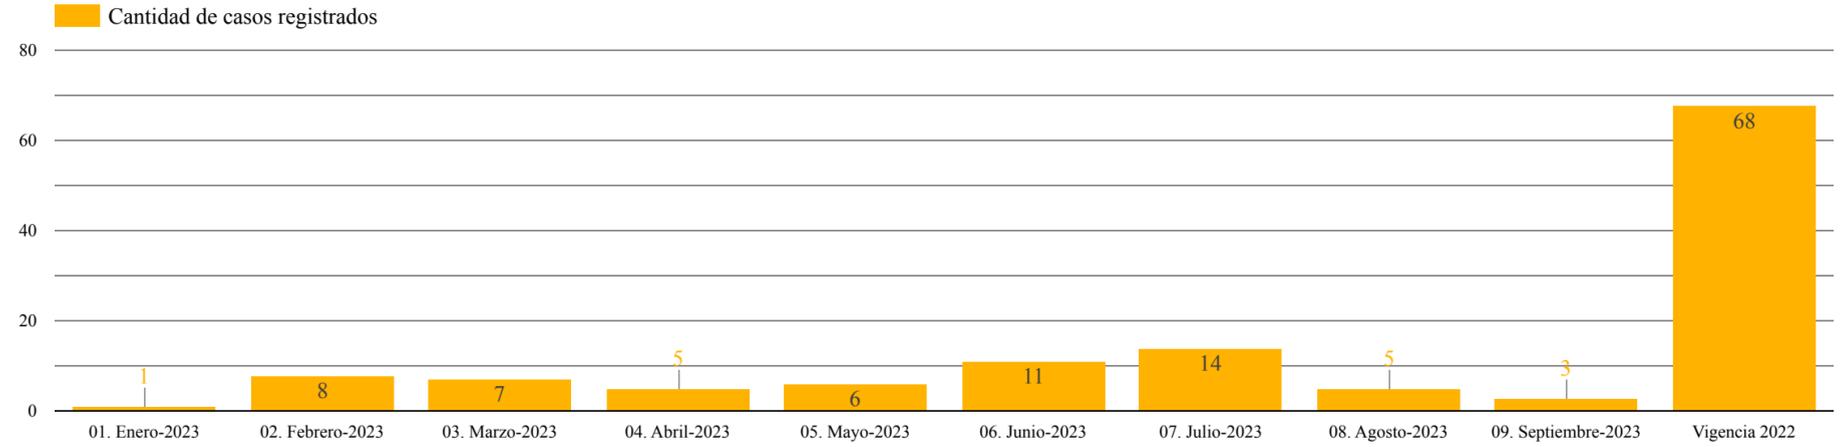

Casos presentados por Alcaldía local

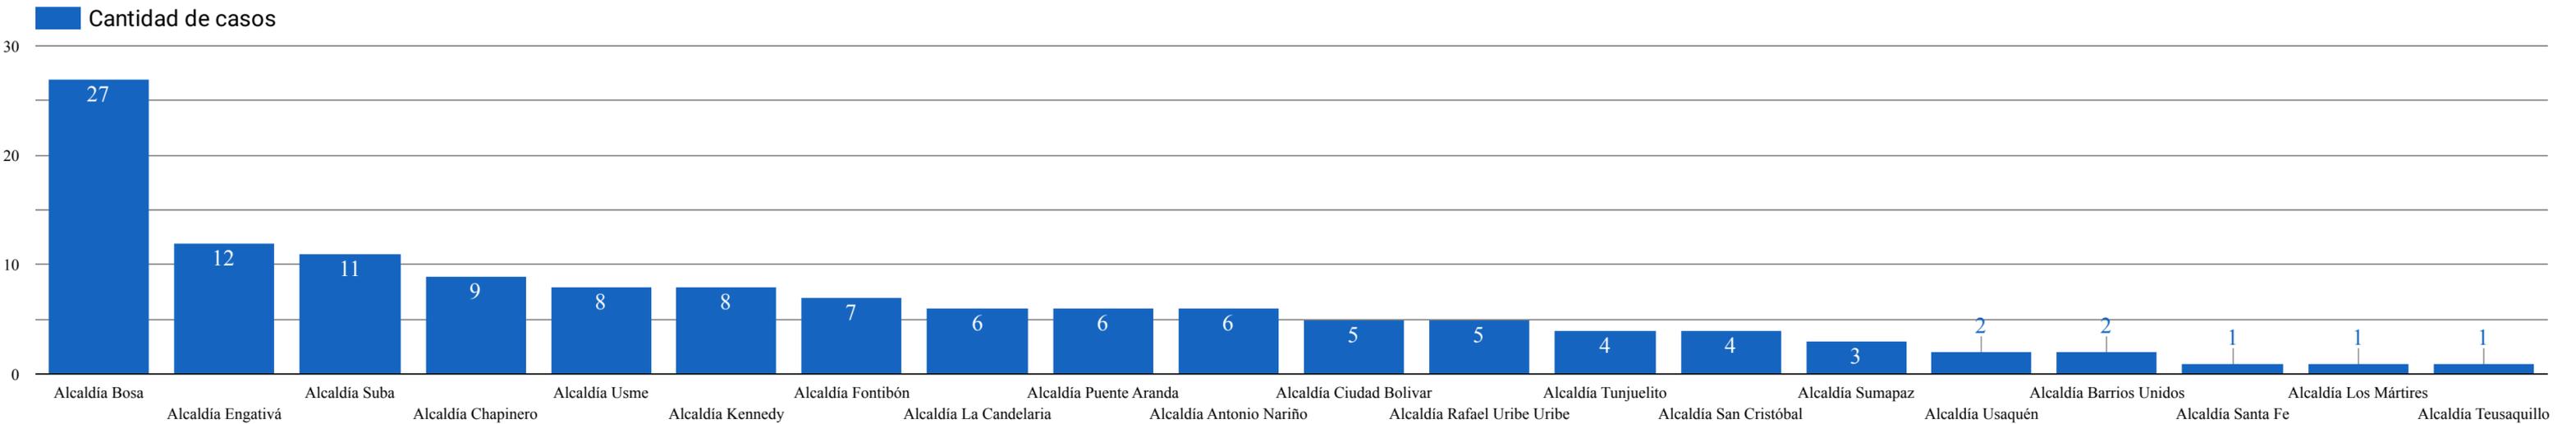

Registro de los casos

MES RE...	SOLICITUD	ENTIDAD ...	ESTADO DE...
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado meses de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Solicitud de respuesta por parte de la EAAB respecto a los requerimientos E-2022-008905, E-2022-012772 del año pasado y uno realizado en enero de este año, indagando sobre unos tramos viales que están reservados por el consorcio Alcantarillado de Occidente, al momento no se ha dado respuesta	EAAB	ATENDIDO



Nº. de casos resueltos
71

Nº. de casos registrados
128

Nº. de casos pendientes
57



BOGOTÁ D.C.

Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

Listado Actualizado de compromisos pendientes Comité Operativo de Obras

1 mensaje

Wilson Javier Porras Ramirez <wporrasr@acueducto.com.co>

29 de septiembre de 2023, 10:13

Para: ALVARO ENRIQUE REINOSO GUERRA <alvaro.reinoso@idu.gov.co>, "pgamez@sdp.gov.co" <pgamez@sdp.gov.co>

Cc: Andres Felipe Tamayo Rios <atamayo@acueducto.com.co>, Jaime Jose Valle Vasquez <jvalle@acueducto.com.co>, Jorge Ivan Chacon Mejia <jjchacon@acueducto.com.co>, Alexander Gomez Molano <agomez@acueducto.com.co>

Ing. Álvaro buenos días,

Acorde con el deber de revisar y atender los compromisos efectuados en el Comité y que se encuentran pendientes de resolver, me permito remitir el cuadro con las observaciones producto de la revisión y validación en campo de los casos revisados y que de acuerdo a lo encontrado en las vistas técnicas y a los antecedentes operativos de los mismos, se consideran ya fueron atendidos y por lo tanto deben ser retirados del listado de pendientes de la Zona 2 de la EAAB.

Algunos de estos pendientes ya habían sido reportados al Comité, otros fueron atendidos por el área operativa pero no fueron reportados oportunamente para informar al Comité y otros no persisten a la fecha, es decir, validado en campo ya no se encuentra la anomalía reportada.

El cuadro se encuentra filtrado con los casos revisados y que consideramos deben ser retirados del listado de pendientes con las correspondientes observaciones efectuadas por la Zona 2 (color verde).

Por lo anterior, quedamos pendientes de las observaciones y/o consideraciones que se generen a partir de esta información.

Cordialmente,



WILSON JAVIER PORRAS RAMÍREZ

Profesional
División Servicio Acueducto Zona 2
wporrasr@acueducto.com.co
Teléfono: 3447726

ESTA COMUNICACIÓN PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACIÓN CON DERECHOS reservados del propietario, por lo tanto el uso de las mismas es exclusiva para el destinatario. Si usted recibió este material por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y borre el email y cualquier documento o documentos asociado con el email. Muchas Gracias. THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.

 REGISTRO CONSOLIDADO CASOS COISP 2023 - EAAB.xlsx

357K



BOGOTÁ D.C.

Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

Acta N°. 39 de 2022 - Octubre 20 de 2022 - COISP

Nohora Victoria Gomez Rodriguez <nohora.gomez@claro.com.co>

3 de octubre de 2023, 10:27

Para: Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>, "alvaro.reinoso@idu.gov.co" <alvaro.reinoso@idu.gov.co>

Buen día, Paola.

Adjunto estado de los 3 casos reportados a CLARO, para que puedan ser cerrados.

Owner Gestion CCOT II
Nohora Victoria Gomez Rodriguez
Celular / Ext: 3138893083
nohora.gomez@claro.com.co

Conmutador: Bogotá: 6017480000 - 6017500300, Cali: 6024880000, Medellín: 6046041000, B/quilla: 6053870000

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comunicación Celular S.A Comcel S.A está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Comunicación Celular S.A Comcel S.A tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause. Consulta nuestra política de desconexión laboral.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail, including, if applicable, the files attached to it, may contain information of a confidential and/or privileged nature, and are sent to the sole and exclusive attention of the person and/or entity to whom it is addressed. Copying, review, use, disclosure and/or distribution of such confidential information without the written authorization of Comunicación Celular S.A Comcel S.A is prohibited. If you are not the intended recipient of this email, please contact the sender by replying to this email and delete the original email including your files, as well as any copy of it. By receiving this email you acknowledge and agree that in case of breach by you and/or your representatives of the above terms, Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. will be entitled to the damages that this causes you. See our work disconnection policy.

[El texto citado está oculto]

**REGISTRO CONSOLIDADO CASOS COISP 2023.xlsx**

267K
