

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 44 de 2023**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 30 de noviembre de 2023**

**HORA: 08:30 am a 9:30 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Rodríguez	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Juan Sebastián Acevedo Iriarte	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50435
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-57564
Martha Cecilia Bayona G.	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-57564
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Entidad no respondió solicitud de delegación.
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	Entidad no respondió solicitud de delegación.

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno		X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 E AAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		X	
Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Oscar Fernando Escobar Alvarado	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-41750
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Abril	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		
Lady Salamanca	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Rosa Gómez	Profesional FDL de Bosa	Alcaldía Local de Bosa	X		
Laura Muñoz	Profesional FDL de Bosa	Alcaldía Local de Bosa	X		

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Juan Vargas	Profesional FDL de Bosa	Alcaldía Local de Bosa	X		
Emma Viviana Bermúdez Garzón	Profesional FDL de Bosa	Alcaldía Local de Bosa	X		
José Tarsicio Quiroga Velásquez	Profesional FDL de Kennedy	Alcaldía Local de Kennedy		X	No asistió

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

### **ORDEN DEL DÍA:**

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (43 DE 2023).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

### **DESARROLLO:**

#### **1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

#### **2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

El Ingeniero Álvaro Reinoso en su calidad de apoyo del presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión cuarenta y cuatro (44) del año 2023, dando la bienvenida a todos los asistentes y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

#### **3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES**

Se programó previamente con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, las Alcaldías Locales citadas para esta sesión, las cuales corresponden a Bosa y Kennedy, siendo los fondos de desarrollo local invitados a esta mesa de trabajo.

##### **3.1 Rosa Gómez – Alcaldía de Bosa:**

Se presenta como profesional del área de infraestructura, y se informa que se tienen las siguientes situaciones pendientes con IDU.

- **Caso nuevo:** Para IDU, se solicita informar el estado del contrato IDU 1746-2021, toda

vez que se presentan varios requerimientos de la comunidad porque no se han iniciado obras, y dónde iniciaron no hay avance, entre ellos se relaciona un segmento frente a la Personería, para lo cual dicha Entidad está solicitando una reunión el día martes 5 de diciembre a las 2:30 pm en la casa de la participación de la Alcaldía Local de Bosa.

**Respuesta IDU – Onisalba Segura:** Se solicita remitir correo electrónico con la citación y un breve contexto de la citación, para que pueda ser agendado por el profesional correspondiente en el IDU.

### **3.2 Juan Vargas – Alcaldía de Bosa:**

Se expone el siguiente caso:

- **Caso nuevo:** Para EAAB – Zona 5, el ejecutor del contrato 651 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual ha solicitado el certificado de “paz y salvo” a la EAAB, generando el respectivo pago por daños facturados hace dos meses, no obstante, no ha recibido respuesta, se informa que el contratista interpuso acción de tutela ante la ESP.

### **3.3 Emma Viviana Bermúdez – Alcaldía de Bosa:**

En adición se presenta la siguiente situación:

- **Caso nuevo:** Para EAAB – Zona 5, se informa que el contrato 340 de malla vial actualmente cursa un proceso de incumplimiento, se tienen tres (3) frentes de obra abiertos, uno denominado “Gran Colombiano” tenía en curso el remplazo de tubería de 12”, el cual en convenio con la EAAB se suministraron los materiales, no obstante, el contratista ya no continuará con la ejecución, por lo cual se genera una problemática al tener infraestructura parcialmente construida, especialmente algunos pozos que no tienen cargue y son un riesgo para la comunidad, adicionalmente, se tiene otro frente “Gualoche”, en el cual se haría remplazo de domiciliarias y construcción de cajas de inspección, pero presenta actividades parciales.  
De acuerdo con lo anterior, se solicita a la EAAB indicar si es posible culminar las actividades para mitigar los riesgos en estos frentes de obra.

**Respuesta EAAB – Zona 5 – Javier Patiño:** Se informa vía chat de Google Meet que no cuenta con micrófono, por lo cual toma atenta nota al caso expuesto.

### **3.4 Álvaro Reinoso – Instituto de Desarrollo Urbano - IDU:**

Solicita intervención del delegado de la Alcaldía de Kennedy, sin respuesta alguna de los asistentes.

## **4 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (43 DE 2023).**

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 23 de noviembre de 2023, correspondiente a la sesión número **43** del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se reciben observaciones, por tanto, procede a trámite de firma en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

También se menciona, que el **acta 41 y 42** se encuentra en proceso de publicación por parte de la Oficina Asesora de Prensa de la Secretaría Distrital de Planeación-SDP, mientras que las **actas 39 y 40** ya se encuentran publicadas en la página Web. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes en los últimos dos meses:

Nº. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Radicado SDP Respuesta Publicación	Fecha de publicación
36	05/10/2023	X	X	X	X	3-2023-37440	No se emite respuesta, cierre en SIPA	03/11/2023
37	12/10/2023	X	X	X	X	3-2023-37440	No se emite respuesta, cierre en SIPA	03/11/2023
38	19/10/2023	X	X	X	X	3-2023-38233	No se emite respuesta, cierre en SIPA	03/11/2023
39	26/10/2023	X	X	X	X	3-2023-39758	No se emite respuesta, cierre en SIPA	17/11/2023
40	2/11/2023	X	X	X	X	3-2023-40039	No se emite respuesta, cierre en SIPA	24/11/2023
41	09/11/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-42073	<b>Pendiente</b>	<b>Pendiente</b>
42	16/11/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-42073	<b>Pendiente</b>	<b>Pendiente</b>

## 5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, EAAB – Zona 4, SDM, Movistar, ENEL.

### 5.1 IDU – Álvaro Reinoso:

Se solicita a las Entidades y Empresas de Servicio Público realizar seguimiento a los casos que se tienen registrados como compromisos, se cuenta con herramientas que facilitan efectuar rastreo y control de los compromisos, como la matriz de seguimiento y el tablero de control, los cuales se encuentran en línea, se actualizan de manera semanal y son dinámicos, lo que hace posible verificar los avances que se generan periódicamente, así mismo, se informa que se incorporaron tableros específicos por empresa y entidad para que se pueda revisar la información de manera rápida. Se adjunta a la presente acta informe del tablero de control, para que sea verificado por cada uno de los delegados.

Así mismo, se informa que la última sesión de 2023 será el jueves 07 de diciembre y que la primera sesión de 2024 se realizará el 18 de enero.

## **5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:**

Se reitera la atención y gestión de los casos 532 (ENEL, Avenida NQS con calle 92) y 535 (EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector).

## **5.3 EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:**

Se reporta que la situación presentada en la carrera 43 con calle 76 sur fue solventada, generando recuperación del espacio público. Correspondía a un escape de red de alcantarillado sanitario.

Por otro lado, se tiene un tema pendiente con VANTI (Gas Natural) respecto a la solicitud de una visita, la cual se programó hace dos (2) semanas, una vez revisado se evidenció que no correspondía a un tema de redes menores sino red matriz.

La persona de red matriz estuvo en sitio, hizo el cierre preventivo, y se informó que la red quedará fuera de servicio, desde ayer se están generando maniobras de cierre para que inicien trabajos desde VANTI.

**Intervención VANTI – Mauricio García:** Ayer hubo presencia de una cuadrilla, pero no se dieron los resultados esperados ya que se cerraron tres o cuatro válvulas y se continua presentaron flujo de agua, se recomienda realizar taponamiento de este tramo. Por lo anterior, se solicita informar cual sería el trámite o procedimiento a seguir.

**Respuesta EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:** Se revisará y analizará el caso con el ingeniero Jorge Barriga, que es el jefe de la división de acueducto de la zona, para coordinar las actividades del fin de semana. Se propone conversar al respecto hacia el mediodía.

## **5.4 SDM – Martha Helena Silva:**

Se indica que en los comités de tránsito de Metro Línea 1 – ML1 y en virtud del apéndice en el cual se evalúan indicadores y se hace seguimiento al mantenimiento de la implementación del PMT de las vías de desvío, se han presentado quejas porque se evidencia que en los senderos peatonales de la calle 72 entre carrera 13 y carrera 17, han llegado empresas de servicio público que hacen cierre total para adelantar intervenciones y/o inspecciones, cambiando las dimensiones de los senderos peatonales libres que deben ser mantenidas por ML1.

Por lo anterior, cuando la interventoría realiza seguimiento, ha encontrado no conformidades, al no garantizar las condiciones establecidas en PMT, ML1 indica que las ESP han estado realizando actividades sin informar previamente, perjudicando su evaluación.

Así las cosas, Metro Línea 1 solicita a las ESP que, si requieren realizar alguna actividad en esta área de influencia a la calle 72, se coordine previamente con ellos, para que se dé cumplimiento a los lineamientos y no se afecte su calificación con la interventoría del proyecto.

## **5.5 Movistar – Luis Enrique Gómez Charria:**

Se realiza consulta a EAAB – Zona 3, ya que se recibió oficio de Juan Rafael Osorio Serna, donde se presenta un proyecto de renovación de redes en el barrio Techo, se quiere realizar coordinación con profesional asignado para armonizar actividades, sin embargo, en documento

no se remite información de contacto, por lo cual se solicita información al respecto de la persona con la cual se puede establecer comunicación.

**Intervención IDU – Álvaro Reinoso:** Hoy no se encuentra en reunión Luis Francisco, por lo cual se remite contacto de delegado de la zona 3, para que se pongan en contacto y se refiera información del proyecto, así como del profesional encargado.

## 5.6 ENEL – Mauricio Arenas:

Se informa para el caso 532: que una vez presentado el PMT, se refiere una restricción patrimonial, no se entiende por qué, el IDU precisa que se debe solicitar permiso escrito al Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura – IDPC.

**Intervención IDU – Álvaro Reinoso:** Como se comentó previamente el nuevo POT ha descrito diferentes zonas de la ciudad como patrimoniales, no solo la Candelaria como se pensaba con el Decreto Distrital 190 de 2004, por lo anterior, el IDU consulta el mapa de zonas de interés cultural y al validar si hacen parte, se debe tramitar con IDPC.

**Intervención SDM – Martha Helena Silva:** En el trámite de PMT se remite para revisión al IDU y al IDPC, como se informó el POT cambió y hay nuevos sitios catalogados como de interés cultural incluyendo un área de 100 metros alrededor denominada como entorno patrimonial, se remite contacto de profesional encargado en IDPC (Lizeth Mendoza) para que se realicen las consultas pertinentes:

<<Subintervención y Protección <subintervencion@idpc.gov.co>  
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural  
Calle 12 B # 2-58 - (1) 3550800 / ext.: 2001>>

Finalmente, Mauricio Arenas reporta el **cierre y atención de los siguientes casos: 19, 22, 452, 454, 508 y 517.**

## 6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
366	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a realizar intervención de cambio de carpeta en este tramo vial y se requiere evaluar infraestructura de redes húmedas.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
367	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	IDU	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
370	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA, SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto Línea Techo Veraguas, adicionalmente se solicita lograr la viabilidad de inicio de actividades de modernización sobre el tramo 2 - Calle 3 entre cra 50 y Av 68 para el primer trimestre de 2023	Entidades participantes en el Comité	SDP emitió respuesta con radicado SDP N°. 2-2023-18434
372	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
373	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
374	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carreras 7 y 9 se realizó visita e inspección y se evidenció que corresponden a acometidas domiciliarias de la empresa de acueducto, se hace el llamado a la zona 1 de la Empresa de Acueducto para que por favor revise, se deja trazabilidad del caso en chat de grupo de trabajo y registro fotográfico	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
375	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
376	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se está presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl. 26, CI26 con KR 69 y el tercer punto CI 26 cerca a la Av Boyacá	IDU	PENDIENTE
378	Solicitud de priorización al FDL de Usme sobre una intervención en la Calle 99 Sur No. 1A- 61, se remitió solicitud mediante correo electrónico	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE, Acta 05: SDG indica que el correo fue remitido al fondo de desarrollo local sin embargo no se ha dado respuesta
379	Requerimiento de respuesta a la Zona 1 EAAB del radicado 3133002 -S-2022-317611 por concepto de instalación de tubería en acero de 14 pulgadas en la Carrera 62 entre Calle 169 B y Calle 167	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
380	Solicitud de trazabilidad en el comité respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A. En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Álvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	IDU	PENDIENTE
381	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRD dan respuesta, lo que ha generado problemáticas para atender el proyecto de fibra óptica para la ciudad, solicita priorizar el caso	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
387	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
388	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Álvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
391	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
392	solicitud a la EAAB respecto a daños en proximidad al pozo de inspección, posibles daños en la red de alcantarillado. Se solicita evaluación por parte de la EAAB en la Carrera 52 C desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 41 A Sur.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
396	requerimiento respecto a una consultoría del 2018 sobre dos salones comunales, indica que en 4 años no se ha obtenido resultado alguno, sin embargo menciona que de la consultoría de ambos salones comunales el que se encuentra ubicado en la Carrera 35A con Calle 9 Sur detrás de la Iglesia de Santa Matilde requiere apoyo referente a un contacto para agilizar el trámite de disponibilidad de servicios públicos con Acueducto, Vanti y Enel Colombia ( Codensa), indica que con Vanti ya se tuvo la primera audiencia sin embargo la idea es volver a solicitarla.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
398	otro caso es el del CIV 16002083 vamos a iniciar su intervención, es un callejón cerrado en pavimento flexible pretendemos hacerlo en pavimento rígido, pero por esa misma proyección que tenemos necesitamos la definición del acueducto si allá se van a cambiar o no las redes para poder definir tiempos de trabajo en conjunto. Dirección a intervenir Carrera 51 entre Calles 37 Sur y Calle 28 Sur	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
400	En la noche del 6 de marzo de 2023 se hizo un recorrido con la UAESP para el tema de las expansiones que necesitamos en un parque porque es un punto crítico de venta de estupefacientes y de habitabilidad de calle, en este momento se está generando un sendero con la comunidad a partir de la iniciativa juntos cuidamos Bogotá, pero necesitamos las expansiones de esa luminaria, la UAESP nos indicó que cuando termináramos el sendero hiciéramos otro recorrido para solicitarle a Enel el tema de la expansión, nos gustaría darle celeridad a ese tema porque es un punto crítico de la localidad y la comunidad lo ha pedido mucho	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE Acta 14-2023: Se efectuó recorrido el 6 de marzo, se está gestionando a través del comité de expansiones.
404	Solicitud al acueducto zona 5 sobre un caso reportado en marruecos Calle 50 A Sur No. 7 – 64, requiere que atienda visita en este sector.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
406	solicitud para las empresas ENEL Colombia, Vanti, ETB y Acueducto, están por iniciar dos proyectos un parque de bolsillo en la Calle 7 con Carrera 3 y uno de espacio público en la Calle 12C entre 1A y Carrera 3 desde la Calle 12B hasta la Calle 12D, requerimos acompañamiento de las empresas con el objetivo de generar un diagnóstico de redes para que el contratista las tenga en cuenta, la semana pasa se enviaron las solicitudes, pero no se ha obtenido respuesta, pregunta que si por medio de este comité se puede generar la cita.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
408	presenta requerimiento para la zona 1 de acueducto con el ing. Mauricio Mahecha, donde un ciudadano reporta una queja indicando que hace más de dos meses la empresa de acueducto rompió e hizo una zanja frente al predio de la Carrera 46 No. 138 – 53 y no se ha recuperado, para que por favor zona 1 investigue a que contrato pertenece.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
410	En la Carrera 62 con Calle 62 hasta la Calle 64 en el barrio Santa Rosa Sur hay cuatro segmentos viales que no cuentan con alcantarillado pluvial, se solicita apoyo a la EAAB, la comunidad manifiesta que en ocasiones se ha generado inundación en sus predios.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
411	El año pasado se presentaron unas solicitudes de factibilidad a ENEL para el servicio en Betania y San Juan. Se hicieron visitas técnicas y nos informaron que para Betania se tenían que hacer unas adecuaciones eléctricas que ya se están estudiando dentro de una formulación. Sin embargo, quedó pendiente el tema de San Juan, indica que de esas visitas no recibió acta, adicionalmente desconoce si la información fue recibida por ingenieros y arquitectos que ya no están en el fondo, es decir que se perdió la trazabilidad del caso, pregunta si es posible que de parte de ENEL que le remitan las actas de esas visitas técnicas.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
412	El FDL de Chapinero el marco del Decreto Distrital 168 del 2021 ha solicitado la asistencia técnica tanto a empresas de Servicios Públicos como entidades distritales, sin embargo algunas de estas entidades no nos han dado respuesta, es muy importante contar con los delegados de cada entidad para poder llevar a cabo las mesas de trabajo de asistencia técnica teniendo en cuenta que en los estudios y diseños que existen en el banco del FDL de Chapinero se prevé la subterranización, traslado y protección de redes de servicios públicos perteneciente a los activos de cada empresa. Se han adelantado algunas mesas de trabajo con algunas entidades distritales, sin embargo en este momento estamos a la espera de los delegados de la Secretaría Distrital de Planeación por parte de la Secretaría Jurídica, IDU, Claro, ENEL Colombia, IDPC, Movistar, Promo ambiental, Catastro, Une EPM, Grupo Energía Transición, DADEP, Requerimiento N. 2 Al IDU y Secretaría Distrital de Hábitat. En el mismo correo donde se envió la invitación a la convocatoria se va a enviar estos oficios con los acuses de recibido por parte de cada una de estas empresas y entidades, con el objetivo de contar con la asistencia técnica y respuesta oportuna a los procesos de formulación del FDL de Chapinero.	IDU	PENDIENTE
415	Solicitud al Ing. Pablo Ponce para que por favor nos ayude a evaluar el cobro de energía de la planta la esmeralda, la sede de producción, nos llegó un cobro por 235 millones de pesos, estamos un poco ilíquidos, de acuerdo con una revisión que hizo uno de los contratistas de ENEL para evaluar el cobro se dio cuenta que en algún momento el consumo de energía había bajado y establece que como es una sede industrial entonces nosotros	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	producimos todos los días las mismas cantidades y no es así , hay meses donde no tenemos la mezcla de agregados y donde la producción baja, ya le escribí al Ing. Pablo Ponce no me ha contestado voy a reiterar a ver cómo nos puede ayudar para ver a quien le respondemos el requerimiento y si nos dan plazo para pagar eso.		
416	Corresponde a la filtración de aguas residuales entre la transversal 19 y calle 46 sur donde se ubica la central de ETB San Carlos, hay una filtración de aguas residuales que está llegando a la red de ETB y está ingresando al predio San Carlos y está generando malos olores adicionalmente está afectando al colegio Bernardo Jaramillo, no sabemos si hay un tubo roto conexión errada o alguna que está ocasionando esta problemática.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE EAAB Zona 4 – Juan Carlos López: Es un caso de la zona 3, se hizo visita con Francisco Rodríguez y se observó una filtración de aguas residuales.
418	En la calle 127 con 13A, la semana pasada se informó al delegado de EAAB - Zona 1, sobre una filtración de agua, allí enviaron personal, pero dijeron que no era del alcance de ellos. Sin embargo, ETB está preparando la cámara y arreglando todo lo que le corresponde, no obstante, la filtración continúa. Por lo cual, se le requiere a la EAAB que revise la filtración y solucione este inconveniente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
421	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	ETB	Acta 32: ETB indica que no encuentran información asociada a dicho contrato, van a elevar una comunicación al FDL de Kennedy para informarle que no se obtuvo ninguna información sobre el caso.
423	Para EAAB – Zona 1, se solicita realizar visita y medidas tendientes a reparar socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente – occidente.	EAAB - Zona 1	Reiterado por IDU en el Comité N°. 18: Para EAAB – Zona 1, se reporta hueco en la calle 134 entre carrera 19 y carrera 19A - CIV 1003972 PK 510728. Indican que hay una importante socavación de aproximadamente un metro de profundidad, que se observa una tubería al parecer de alcantarillado. Reiterado por IDU en el Comité N°. 23: Para EAAB – Zona 1, EAAB INFORMA: Respecto a los requerimientos presentados por el IDU – Onisalba Segura de Arbeláez, se debe precisar que la recuperación del espacio público en zona 1 se realiza a través de un contrato de obra, por lo cual la información se remitió al contratista para que se efectuará las labores correspondientes y así presentar los soportes de atención a los casos.
426	Se solicita acta de coordinación al Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB - Zona 3, se ha requerido de manera reiterativa desde enero, toda vez que se está solicitando por una acción de tutela y a la fecha no se ha tenido respuesta al respecto.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE Acta 15-2023 - IDU – Álvaro Reinoso: Se envió directamente al director de acueducto Carlos Rivera y él se lo remitió al ingeniero Juan Rafael Osorio de la Zona 3. De igual manera, ayer se reiteró, porque de VANTI se recibió nuevamente requerimiento.
428	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	SDA	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
429	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	SDA	PENDIENTE
431	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una reunión que se llevó a cabo ayer (10-mayo-2023), en el tramo de la carrera 18 B entre calle 145 y 146. Allí la UMV va a intervenir, pero según lo informado por la dirección de la obra (Ing. Rafael Pérez) hay problemas de drenajes, entonces, se solicita a la EAAB evaluar el caso de manera conjunta y llegar a una posible solución. En la reunión estuvo José Casallas y Jairo García de la EAAB, por lo que conocen este caso y se solicita sea comunicado al Ing. Mauricio Mahecha.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
435	Para IDU, el requerimiento presentado consiste en la obra que requiere adelantar Movistar frente a una de sus oficinas, el día de ayer la interventoría del contrato 1791, respondió que el acta de recibo definitivo no ha sido emitida para el inicio de la garantía, por tanto, no se pueden ejecutar obras adicionales. En adición, se observa que la ejecución se realizó sobre la ciclorruta y se requiere intervenir en un área diferente a este sector.	IDU	Acta 17: Existe una opción a través del acta de coordinación, si se indica por parte del contratista que ya terminaron la obra, esta es una información valiosa, y quizás exista una posibilidad de autorización, así mismo, la situación debe ser resuelta desde el área ejecutora, para advertir formas de avanzaba y coordinar las obras entre las dos entidades tal como se quería siempre hacer. Acta 18: Se tiene visita el día 26 de mayo para verificar en campo con Interventoría, es posible que se efectúe acta de coordinación.
440	Para EAAB, en la carrera 69B con calle 17 en el costado nororiental se encontraron dos cámaras con cables y canalizaciones afectadas por obras de la EAAB. Se solicita visita para verificar y atender los daños.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
448	Para EAAB – Zona 1, respecto a la Avenida Ciudad de Cali con calle 134, se informa que son obras de redes donde su contratista dejó abandonada la intervención, son alrededor de 80 metros y la EAAB está solicitando que la UAERMV apoye con la terminación de esta obra. Se realizará la visita, pero la posición de apoyar el requerimiento en el momento es casi nula.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
453	En el desarrollo del contrato 289, se llegó a la etapa de liquidación, y se están tramitando los certificados de "paz y salvo" con la EAAB, el día 16 de mayo de 2023 se remitió comunicación, pero no se ha logrado una coordinación con el líder de zona 1 y 2, el número de radicado es E-2023-047187, se solicita una respuesta oportuna. Se requiere visita de manera efectiva, para lograr liquidar, se han recibido recomendaciones de hacer nuevamente un oficio y radicar una reiteración en la EAAB, especialmente para zona 1, no obstante, se espera coordinar a través de esta instancia.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
455	Para EAAB-Zona 1, el FDL de Usaquén se encuentra liquidando el contrato N°. 175 de 2022, por lo cual se encuentran en proceso de obtener los certificados de "paz y salvo" por parte de las empresas de servicios públicos, de tal manera, se requiere respuesta por parte de la EAAB-Zona 1, el radicado es E-2023-045253 del 10 de mayo de 2023.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
456	Para ETB, en la carrera 75 con calle 24, la UAERMV está realizando trabajos de rehabilitación, en una actividad se generó daño en red de fibra óptica de ETB que se encontraba superficial, se requiere conocer si la Gerencia de Intervención se comunicó con Benjamín Ochoa para efectuar reparación temporal.	ETB	Acta 34: El Ingeniero Benjamín informa que en este tramo hubo una afectación a la canalización pero que la UAERMV no ha manifestado la intención de realizar la reparación. Se da número de contacto al Ingeniero Humberto Ramírez de la UAERMV para que se ponga en contacto con Benjamín Ochoa y se de claridad respecto a la reparación de la red. Acta 35: UAERMV – Humberto Ramírez solicita contacto de correo electrónico de Benjamín Ochoa para continuar gestión del caso expuesto, ya que no se ha podido establecer comunicación vía telefónica, es remitido por Carmen Rocío López.
457	Para EAAB-Zona 5, se compartió el día de ayer un reporte correspondiente a daño sobre una cámara telefónica de ETB localizada en límite entre Bosa y Soacha, se solicita socializar situación con delegado correspondiente, para que se realice la reparación o se reciba factura con costo de los daños, adicionalmente se señala que al tener expuesto los cables telefónicos, pueden ser objeto de vandalismo y/o generar algún tipo de accidente.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
458	Para EAAB-Zona 5, se reporta segmento vial que salió en las noticias, está ubicado en la CL 26 S Entre KR 73 B BIS Y KR 73 C, se evidenció una socavación aparentemente por daño de redes, se intervino en marzo de 2022 en el Convenio 389 de 2020 entre el Fondo De Desarrollo Local de Kennedy y UMV, no obstante, no se puede adelantar parcheo hasta tanto se realice revisión y reparación de redes.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
459	Para EAAB – Red Matriz, se requiere validación de daños generados por las obras de la manija de Tibitoc, en la Av. Boyacá con Calle 10B, se envió correo electrónico a Fabián Restrepo (contratista de la obra), pero no se ha obtenido ningún tipo de respuesta, por tanto, se requiere escalar con delegado de EAAB.	EAAB – Red Matriz	PENDIENTE
462	Para SDA, se realizaron varios requerimientos para cierre de PINES AMBIENTALES: 19817 con radicado 2023ER977455, 19879 con radicado 2023ER97478, 18724 con radicado 2023ER97479, 21178 con radicado 2023ER97480, la solicitud se efectuó hace más de tres meses, lo cual representa un valor de aproximadamente 3000 millones, afectando las obligaciones por pagar, y siendo contratos que están próximos a fenecer, es un tema urgente para el FDL. Se hizo reunión en la Alcaldía Mayor hace 8 días, invitando a Secretaría Distrital de Ambiente, pero no se muestra ninguna disposición para avanzar.	SDA	PENDIENTE
464	Se presenta requerimiento para VANTI, respecto al traslado de una red de polietileno de 1" en el sector de Gualoche que se instaló sobre la vía. Se han realizado visitas por parte de VANTI, pero se requiere consolidar el traslado de la red a un costado del andén, generando retrasos en el proceso constructivo.	VANTI GAS NATURAL	Acta 34: VANTI solicita a Jacqueline contactar a FDL-Bosa para que se precise localización del sector Gualoche.
465	Para IDU, Requerimiento respecto al contrato 1311 correspondiente a sumideros, del cual no se ha podido cerrar el recibo de vías por parte del IDU, el contratista ya entregó los documentos radicados de acuerdo con lo conversado. Coordina una visita al IDU con el ing. Álvaro Reinoso ya que para ese contrato se vencen los términos próximamente.	IDU	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
469	Para ENEL, se tiene solicitud por parte de contratista S y S ingeniería, que termino contrato el 21 de mayo de 2023 con el FDL de Fontibón, ha solicitado certificación de "paz y salvo" y no ha recibido respuesta.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
471	Para SDA, se solicita apoyo del delegado para realizar cierre de los siguientes pines ambientales, los cuales cursan trámite en la Entidad: COP 314-2021: 2022ER150964, COP 290-2018: 2022ER320627, COP 291-2018: 2022ER295400, COP 317-2021: 2022ER168259.	SDA	PENDIENTE
472	Para SDA, respecto al contrato 391 de 2022, se presentan una serie de observaciones con el permiso de ocupación de cauce (Radicado SDA 2023EP74478 del 30 de marzo de 2023), el cual es requerido para intervenir puentes peatonales y vehiculares que cruzan por cauces de agua. Se precisa una revisión previa, puesto que al contrato le queda solo un mes de ejecución y se solicita información especializada.	SDA	PENDIENTE
473	Para EAAB-Zona 2, se solicita respuesta a requerimiento de "paz y salvo" para parques donde se efectuó mantenimiento por parte del FDL, el radicado de entrada es E-2023-038775 del 25 de abril de 2023.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
474	Para SDA, se solicita respuesta a requerimiento de "cierre del PIN Ambiental N°. 21870" para parques donde se efectuó mantenimiento por parte del FDL, el radicado de entrada es 2023ER129015.	SDA	PENDIENTE
477	Para EAAB-Zona 4, respecto a un daño evidenciado en la calle 55 sur con carrera 17 – CIV 6001412 PK 324192, la UAERMV está realizando intervención en el marco del programa de barrios vitales en la localidad de Tunjuelito, se observó un escape de agua, se solicita atención por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 4	Se reitera el caso en la sesión del 31 de agosto de 2023 Acta 32: EAAB indica que ya se repararon los daños, solicita a la UMV la recuperación del espacio público
478	Para IDU, se solicita el cierre de la licencia de excavación N°. 173 de 2020, así mismo, se requiere informar al delegado de la EAAB si hay alguna observación o respuesta al contratista, se anexa radicado IDU 20235260604902.	IDU	PENDIENTE
479	Para EAAB-Zona 1, se indica que existe una filtración de agua potable sobre cámara de ETB ubicada en la Autopista Norte con Calle 125, se requiere atender con urgencia y que se realice la recuperación respectiva por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
481	Para la Alcaldía de Engativá, el área operativa de la EAAB encontró unas obras que ejecutó un particular, se observa conexión de una domiciliaria de alcantarillado en la KR 90 Bis N°. 69A-18 de la localidad de Engativá, se presentó afectación del espacio público sobre calzada e intervención no autorizada sobre las redes.	Alcaldía Engativá	PENDIENTE
484	Se presenta tema pendiente con VANTI – Gas Natural, y que se ha venido adelantando con el profesional Mauricio García, se informa que se encontró una red de 4" en acero, instalada posiblemente a través de perforación dirigida, afectando una descarga de domiciliaria de 6" en un predio localizado en la Calle 5B con carrera 73C, aunque ya se tiene conocimiento de la situación a resolver, se solicita quede consignado en el acta y se de seguimiento al caso, ya que se pueden generar	VANTI GAS NATURAL	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	situaciones de riesgo a los ciudadanos y daños mayores sobre el sector.		
486	Para EAAB – Zona 4, en la calle 55 sur con carrera 17 se reitera solicitud para que la EAAB repare daño en una zona por intervenir de la UMV.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
487	Para EAAB – Zona 2, en la carrera 56 entre calle 5 y calle 5B, se presenta red de alcantarillado con obstrucción, se requiere apoyo sobre este tramo ya que la UMV realizará intervención.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
490	Para EAAB – Zona 3, evento SIRE 5419922, localizado en la calle 5C entre KR 70 y 70C, se presenta daño en calzada por posible daño en redes que genera lavado de finos.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
492	Para la EAAB-Zona 4, se solicita respuesta de los radicados E-2023-062631 y E-2023-076559, correspondiente a solicitud de NO objeción a los diseños cercanos al Canal Río Seco.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
499	Para ENEL, en el sector de Zona rosa en un predio de la AV CRA 15 # 82 30 el cual presenta problemas de drenaje de Aguas residuales en donde al momento de realizar la inspección no se encontró la caja de conexión domiciliaria. En dicha inspección se encontró al parecer una cámara de ENEL la cual también funciona como caja de conexión domiciliaria de alcantarillado. Solicita conocer quién es el responsable de las redes y coordinar una visita para verificar si la caja está siendo utilizada con una doble función ya que está en riesgo la prestación de los servicios públicos.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
502	Para IDU, en el predio de la AV carrera 68 # 68B – 61 el cual pertenece al concesionario de Motoriza solicita por medio del contratista hacer la reubicación de una caja que hace parte del sistema de alcantarillado de dicho predio. Indica que en el año 2022 gracias a la verificación de Google Maps, se puede observar que la caja se encontraba ubicada dentro del andén pero que debido a obras de ampliación realizadas por IDU en la calzada oriental para el proyecto Avenida 68, este dejó la caja domiciliaria en la calzada. La caja no está hecha para soportar cargas de tráfico y por lo tanto debe estar ubicada sobre el andén.	IDU	PENDIENTE
506	Para UMV, solicita una reunión con UMV para tratar el reporte de un daño en calle 78C # 17 f - 47 vía al Mochuelo ya que hay un daño en la acometida de EAAB	UMV	PENDIENTE
510	Para ENEL Colombia SA ESP, en la Quebrada Yomasa se está presentando una socavación en área cercana a infraestructura de ENEL, y se requiere acercamiento con delegado de la empresa para efectuar visita y realizar las acciones pertinentes, por tanto, se solicita información de un profesional en ENEL para remitir la información correspondiente.	ENEL COLOMBIA	Acta 29: Intervención ENEL Colombia SA ESP – Pablo Ponce de León: Se informa que para el caso de la Quebrada Yomasa, se puede remitir la información al correo electrónico: pablo.poncedeleon@enel.com y de allí se enviará al jefe de zona -

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Leonardo Garcés, así como a Mauricio Arenas, para que se realice el debido seguimiento y atención.
511	Para EAAB, se está tramitando un certificado de viabilidad y disponibilidad del servicio para un salón comunal que se está construyendo en la localidad, radicado EAAB E-2023-1030279, se solicita respuesta al requerimiento y el contacto de un funcionario que pueda brindar información al respecto.	EAAB - Zona 4	El requerimiento referenciado ya cuenta con respuesta, se emitió el 14 de junio 2023, al señor Giovanni Rosso, el predio se localiza en la calle 42 sur N°. 72J- 25, Se remitirá por correo electrónico y ya están claras las instrucciones para hacer el trámite ante la EAAB.
513	Para ENEL, en el mismo parque Carbonero (TV 79 entre CL 81 y CL 71A Sur) se tiene una solicitud para ENEL respecto al traslado de dos postes que están ubicados en el eje de la vía, se requiere respuesta a la solicitud radicada, para ajustar cronograma.	ENEL COLOMBIA	Acta 34: Respuesta ENEL – Mauricio Arenas: Se solicita el número de radicado para darle seguimiento a la solicitud
516	Para VANTI, en el desarrollo de la consultoría del contrato FDL-E N°. 402 de 2022, se requirió un enlace con las empresas de servicios públicos para coordinar las actividades a ejecutar, el radicado con el cual se radicó la solicitud es el N°. 11248071 del 13 de septiembre de 2023, por lo cual se solicita respuesta al respecto.	VANTI GAS NATURAL	Respuesta VANTI – Mario Insuasty en acta 35: Se remite correo electrónico de contacto solicitando comunicación, y se informa que se revisará en el sistema interno de la compañía, para dar orientación frente al estado y respuesta de la comunicación.
518	Para EAAB – Zona 2, se solicita para el contrato de obra FDL-E N°. 396 de 2022 correspondiente a ejecución de parques, certificación de “paz y salvo” de la EAAB, toda vez que se encuentra en etapa de liquidación desde el 17 de abril. Los radicados de la solicitud son E-2023-038775 y E-2023-1053973.	EAAB - Zona 2	Acta 35 - Respuesta EAAB – Wilson Porras: Se informa que se revisará al interior de la EAAB con la persona encargada de Alcaldías Locales.
520	Para la Alcaldía de Suba, respecto del contrato 541 de 2021, se señala que frente al predio calle 155 N°. 99A-42 se requiere traslado de poste, el contratista indicó que asumía los costos, no obstante, se solicita coordinar con apoyo a la supervisión del contrato.	Alcaldía Suba	Pendiente
521	Para Tigo, se reporta hueco en una cámara en la Av. Carrera 15 por Av. Calle 116, costado noroccidental. El contratista del IDU de los andenes de la AC 116 puso un maletín encima, pero lo van a quitar en estos días, por lo cual se requiere que se coloquen la respectiva tapa para evitar riesgo de siniestralidad.	TIGO	Pendiente
522	Para EAAB – Zona 1, se encuentran adelantando un contrato para el mantenimiento de parques, por lo cual realizaron diversas consultas a la ESP, para el caso de EAAB con el radicado E-2023-060273 del 22 de junio, a la fecha no se ha obtenido respuesta.	EAAB - Zona 1	Pendiente
523	Para ENEL Colombia SA ESP, se está adelantando la ejecución del contrato N°. 460 de 2023, se solicitó a la Ing. Luz Miriam Moreno el acompañamiento en un recorrido para ver unos segmentos viales en donde se presentan redes superficiales y unas cámaras llenas de basura. El contratista le envió correos haciendo el requerimiento, en uno se obtuvo respuesta por parte de ENEL requiriendo el número de los CIV. El correo ya fue contestado con la información requerida, pero a la fecha no se ha podido realizar la visita. Se solicita programar con urgencia el recorrido.	ENEL COLOMBIA	Se informa que el Ing. Oscar Fernando Escobar de ENEL hará el seguimiento correspondiente para direccionar la solicitud.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
526	Para SDA, se solicita dar cierre a los pines ambientales con radicado 2023ER163597 correspondiente al PIN 21093 y al radicado No. 2023ER163585 correspondiente al PIN 21639. Así mismo cierre a los pines 21789 y 22533.	SDA	Se informa que el delegado de SDA toma los datos para dar alcance a la solicitud ya que en el momento no tiene la información. Se le dará respuesta mediante correo electrónico.
527	Para SDG, reporta un inconveniente respecto al Consorcio Bolívar 05 quienes se encuentran realizando obras con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante el contrato N°. 337 de 2019. El ingeniero Nelson Arturo Ortiz ha venido haciendo el proceso desde el principio de año y se le informó cuales eran los pagos que debía hacer por daños y así tramitar el "paz y salvo" pero a la fecha no ha efectuado avances en el trámite.	SDG	Acta 36-2023: Respuesta SDG – Jacqueline Friede: Se remiten los datos de Mario Leandro Castro - Coordinador de infraestructura del Ciudad Bolívar para hacer la solicitud con copia a Jacqueline. mario.castro@gobiernobogota.gov.co - Celular: 3043820280.
531	Para SDA, se solicita apoyo para dar cierre a PIN ambiental, con radicado SDA 2023ER161367 del 17 de julio de 2023 y PIN 22203 del contrato de obra 214-2022.	SDA	Pendiente
532	Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 92, se presenta un desnivel importante respecto a la rasante de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se señala que este tema fue llevado a la Mesa Distrital de Monitoreo, y allí no se obtuvo respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que emita respuesta y realice las gestiones pertinentes para solucionar este caso.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
533	Para EAAB – Zona 1, la UAERMV tiene programada ejecución con material reciclado en la KR 1B con CL 160C en el barrio Bosque de Pino – Localidad de Usaquén, CIV 1002792 PK 137739, por lo que se requiere conocer si se tienen actividades proyectadas sobre este tramo, se invita a otras ESP a revisar sus proyectos sobre este sector.	EAAB - Zona 1	Pendiente
534	Para EAAB – Red Troncal, la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM requiere terminar un sector de la ciudad con actividades de demarcación y señalización, por lo cual se observa que en dicha área, el tramo de la carrera 53 entre calle 56 y Avenida Calle 53 se encuentra reservado en SIGIDU por parte de la EAAB, una vez verificado en campo, se ratifica que las obras terminaron, por lo cual se requiere respuesta al requerimiento de intervención con señalización por parte de SDM – Radicado DIT 202331011464341. Así las cosas, se solicita a la EAAB levantar la reserva y emitir respuesta a SDM respecto del requerimiento anteriormente mencionado, en el cual se determine si las obras se encuentran finalizadas, para proceder con la señalización correspondiente que actualmente se está ejecutando en el sector.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
535	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	EAAB - Zona 5	Pendiente
536	Para ENEL, se solicita emitir respuesta a Ministerio de Defensa, respecto del oficio con radicado SDP 1-2023-80270, donde se requiere reparación locativa de infraestructura de ENEL Colombia SA que actualmente pone en riesgo la seguridad de los peatones en la carrera 54 #26-25 (en inmediaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil).	ENEL COLOMBIA	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
537	Para EAAB – Zona 5, se contactó Javier Berdugo para requerir el traslado de un poste, por lo cual se hizo contacto con jefe de la zona de ENEL, y se ejecutó la maniobra. No obstante, se requiere realizar el respectivo cobro a la EAAB, y no ha sido posible obtener un contacto para gestionar el pago. Actualmente, están culpando a ENEL por un apoyo que fue requerido, ya que estaban arreglando una red. No es claro a quién debe cobrarse, si a EAAB o al contratista de la foto.	EAAB - Zona 5	Pendiente
538	Para EAAB – Zona 3, se construyó cámara de inspección en la carrera 68 con calle 13 (Montevideo), pero se intercepta con una red de acueducto, actualmente se requiere un visto bueno de la EAAB para ponerla en funcionamiento, se solicita coordinación y revisión del caso.	EAAB - Zona 3	Pendiente
541	Para EAAB-Zona 3, se tiene pendiente la liquidación del contrato 145 de 2019, por un certificado de paz y salvo de la EAB, donde el contratista indica que no está obligado a gestionarlo, no obstante, se ha solicitado tramitar requerimiento ante la ESP.	EAAB - Zona 3	Pendiente
543	Para EAAB – Zona 3, en la calle 19 con carrera 8 se localiza una subestación de ENEL, la cual presenta una filtración de aguas negras, por tanto, se solicita a la EAAB realizar visita en el punto y atender con las actividades que sean pertinentes.	EAAB - Zona 3	Pendiente
544	Para ENEL, se tiene un parque en la localidad (Nº. 06061) donde el contratista ya realizó la etapa de cableado, y se requiere la respectiva energización, por lo cual se solicita agilizar el trámite, la factibilidad es 1500332677 y el caso 1500395228.	ENEL Colombia	Pendiente
545	Para ENEL, se solicita del contrato 036 de 2023, la respuesta a la solicitud con radicado 1500385265.	ENEL Colombia	Pendiente

## 6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
-Casos presentados	365	100,00%	180	100,00%
-Casos resueltos al corte	282	77,26%	94	52,22%
-Casos pendientes al corte	83	22,74%	86	47,78%

## 7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver seis (06) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los compromisos número 19, 22, 452, 454, 508 y 517, a su vez, ENEL Colombia y EAAB-Zona 4 informan que se encuentran adelantando gestiones para atender las situaciones pendientes.

## 7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p><b>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b></p>
<p><b>Síntesis:</b> Se lograron resolver seis (06) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los compromisos número 19, 22, 452, 454, 508 y 517, a su vez, ENEL Colombia y EAAB-Zona 4 informan que se encuentran adelantando gestiones para atender las situaciones pendientes.</p>	
	<p><b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b></p>
<p><b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente EAAB.</p>	

## 8 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 07-diciembre de 2023

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 07-diciembre de 2023
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 07-diciembre de 2023

## 9 CONCLUSIONES

El Ingeniero Álvaro Reinoso del IDU, concluye la sesión número cuarenta y cuatro (44) del Comité para la vigencia 2023, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 07-diciembre de 2023 a las 8:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,

  
**WILLIAM RODRIGUEZ CASTELLANOS**  
**PRESIDENTE**

  
**PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA**  
**SECRETARIA**

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba– SDP.


Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.

Aprobó: William Rodríguez Castellanos - IDU.


Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 44 de 2023.  
2. Soporte cierre de casos ENEL Colombia

Subserie 2131-2.14


## Número de casos registrados por mes

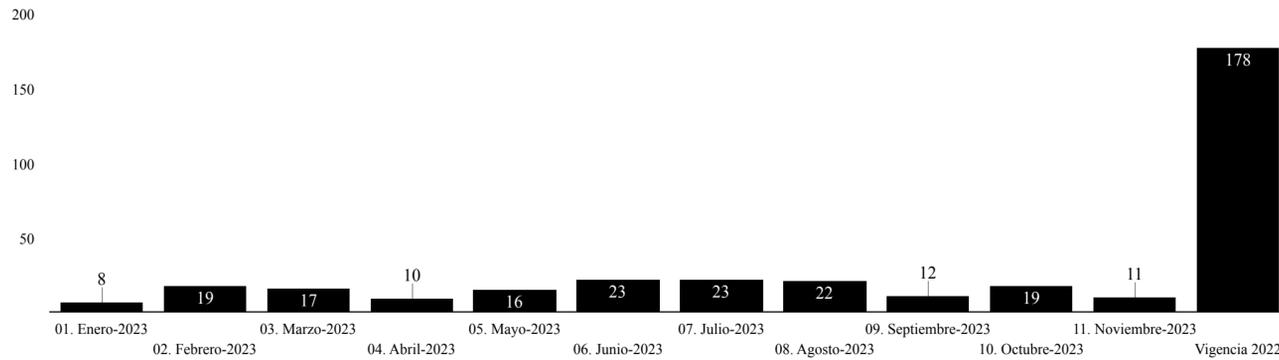

## Número de casos resueltos por mes



## Número de casos pendientes por mes

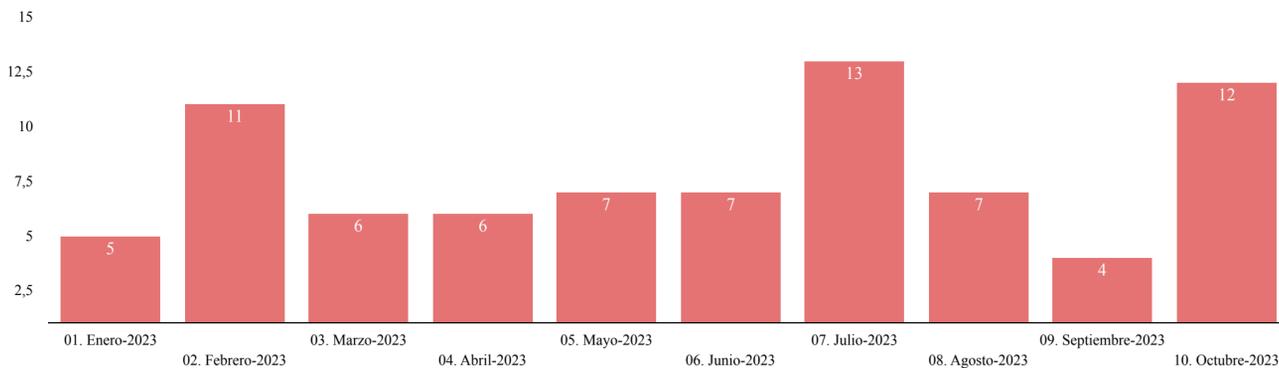

## Recuento de casos

Nº. SESIÓN DE ...	Nº. DE CA...	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO
02 - Enero 26 de 2023	366	UMV	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a rea...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	369	IDU	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu...	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	368	MOVISTAR	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr...	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	367	MOVISTAR	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres...	IDU	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	372	SDG	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	371	Alcaldía San Cristóbal	Para Enel Colombia, la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022...	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de ...	373	EAAB - Zona 4	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio car...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	370	ENEL COLOMBIA	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyect...	Entidades participantes en el Co...	PENDIENTE
04 - Febrero 09 de 2...	374	UMV	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	376	MOVISTAR	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: ...	IDU	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	375	UMV	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	377	Alcaldía Kennedy	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully ...	IDU	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	380	VANTI GAS NATURAL	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón ...	IDU	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	383	ETB	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Es...	SDP	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	382	ETB	Se reporta novedad en cámara de ETB con filtración de aguas negras en la Calle 20 No. 13 - 29 se deja registro en video por e...	EAAB - Zona 3	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	384	ETB	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	ATENDIDO

Nº. de casos registrados

358



Nº. de casos resueltos

189



Nº. de casos pendientes

169




Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable

Mes reporte del caso

Tema de la solicitud

### Porcentaje de avance

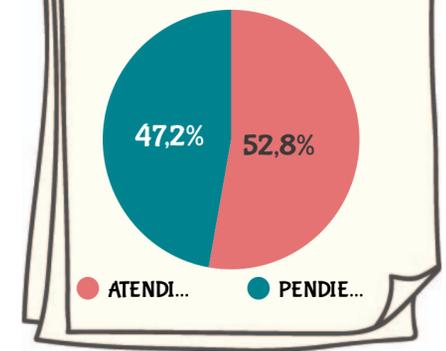

### TOP – Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	66
2. EAAB - Zona 2	35
3. IDU	31
<b>Total</b>	<b>358</b>

1 - 32 / 32

### TOP – Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	38
2. EAAB - Zona 2	27
3. EAAB - Zona 3	23
<b>Total</b>	<b>189</b>


1 - 26 / 26

### TOP – Entidades con casos pendientes


ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	28
2. IDU	25
3. EAAB - Zona 1	24
<b>Total</b>	<b>169</b>

1 - 24 / 24

### Número de casos registrados por mes

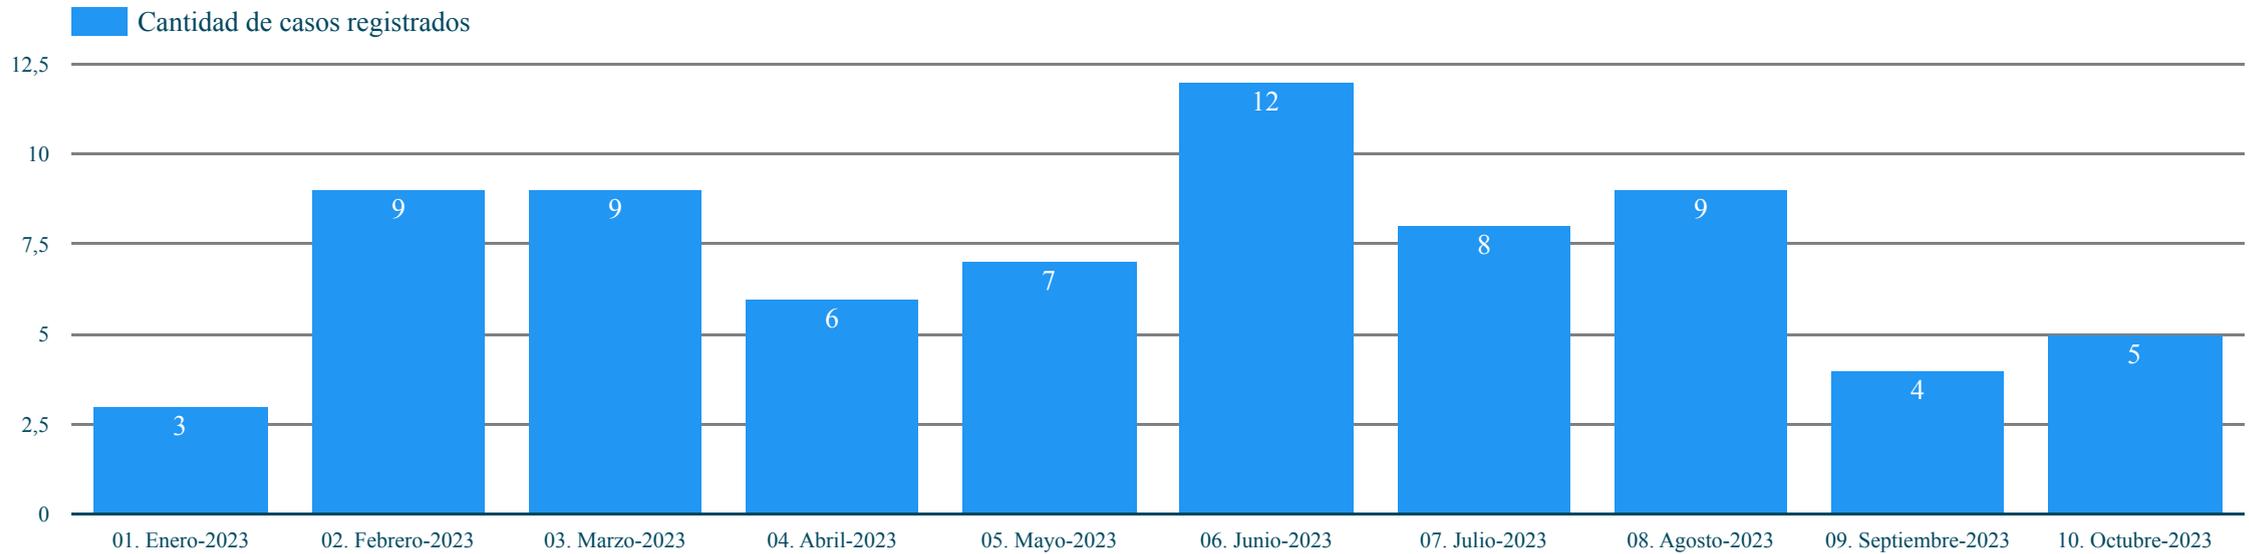


### Número de casos por zona o área pendientes

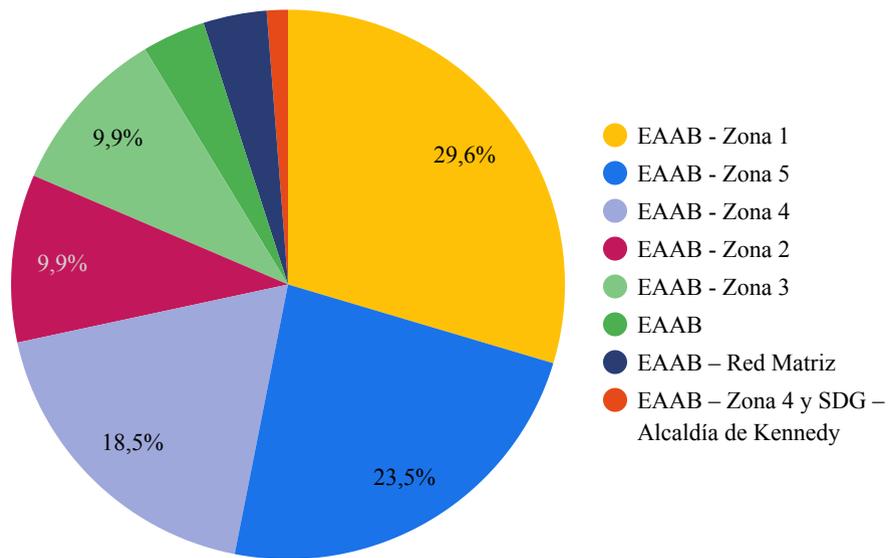


Nº. DE CASO...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EAAB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	PENDIENTE
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	ATENDIDO
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU - II Sesión 2022)	ATENDIDO



### Número de casos registrados por mes

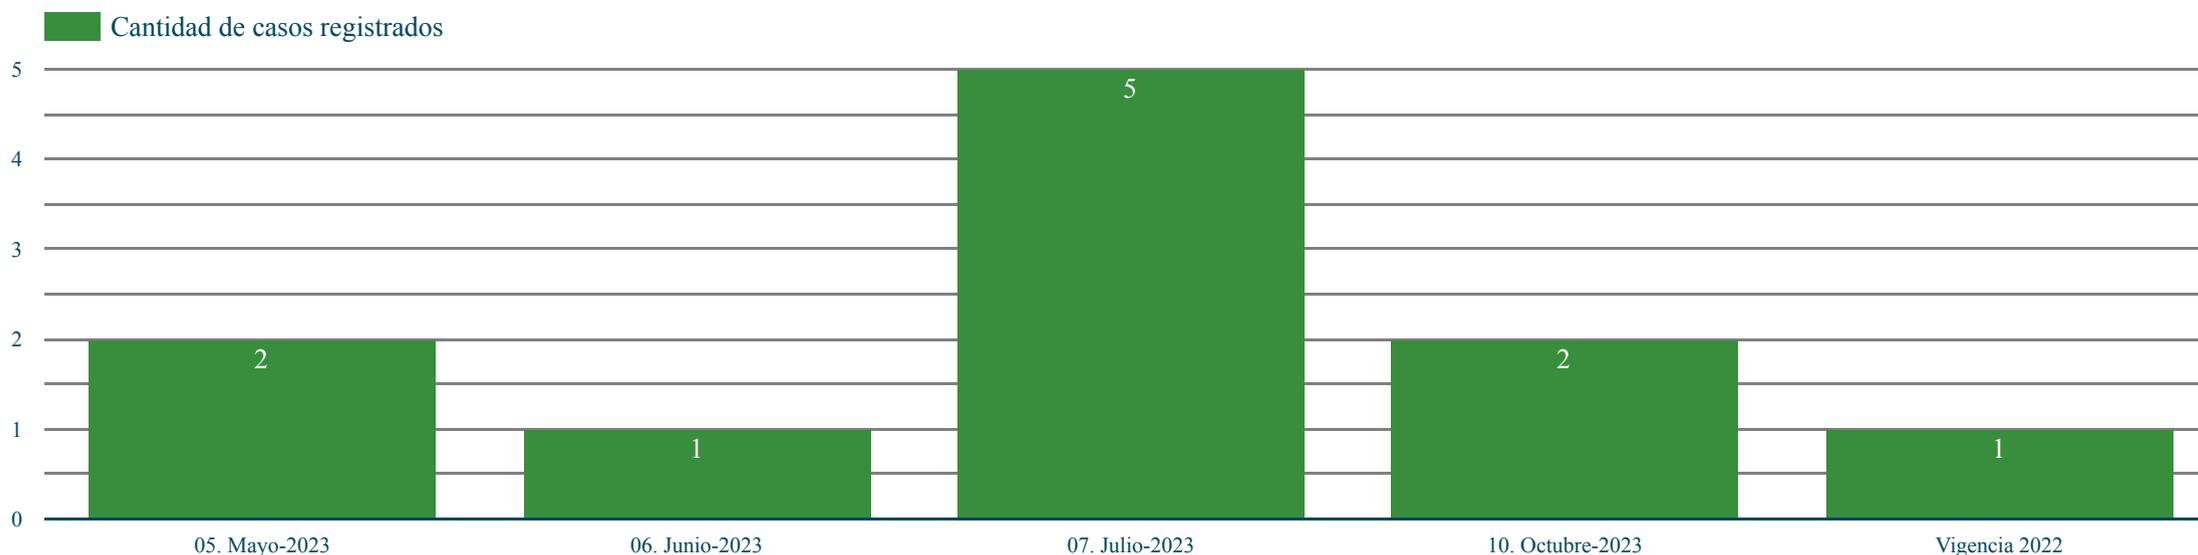


### Pendientes por Entidad que presentó el caso

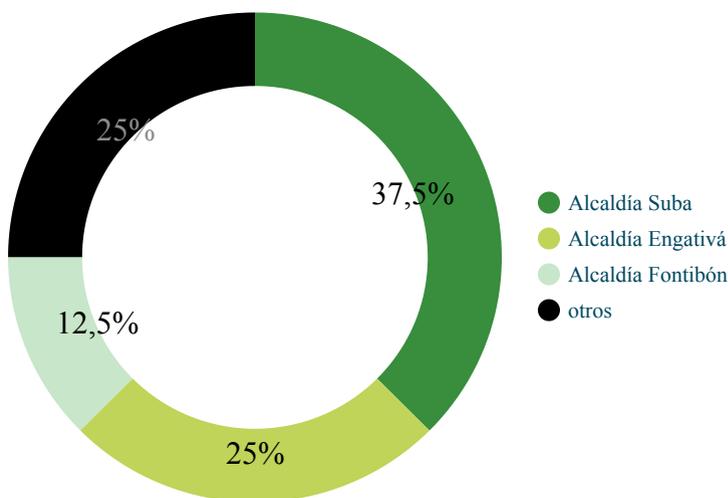


Nº. DE CASO	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
94	En el tema de malla vial, se encuentra PENDIENTE resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – IX Sesión 2022)	ATENDIDO
428	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	PENDIENTE
429	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	PENDIENTE
443	Para SDA, frente al contrato FDL RU 281 de 2019, se realizó radicación N°. 2021ER143989, donde se programan y efectúan visitas con funcionario de la SDA, contratista e interventoría. De estos recorridos se solicita generar modificaciones, y nuevamente se radica a la Entidad con número 2022ER173992. no obstante a la fecha	ATENDIDO

### Número de casos registrados por mes

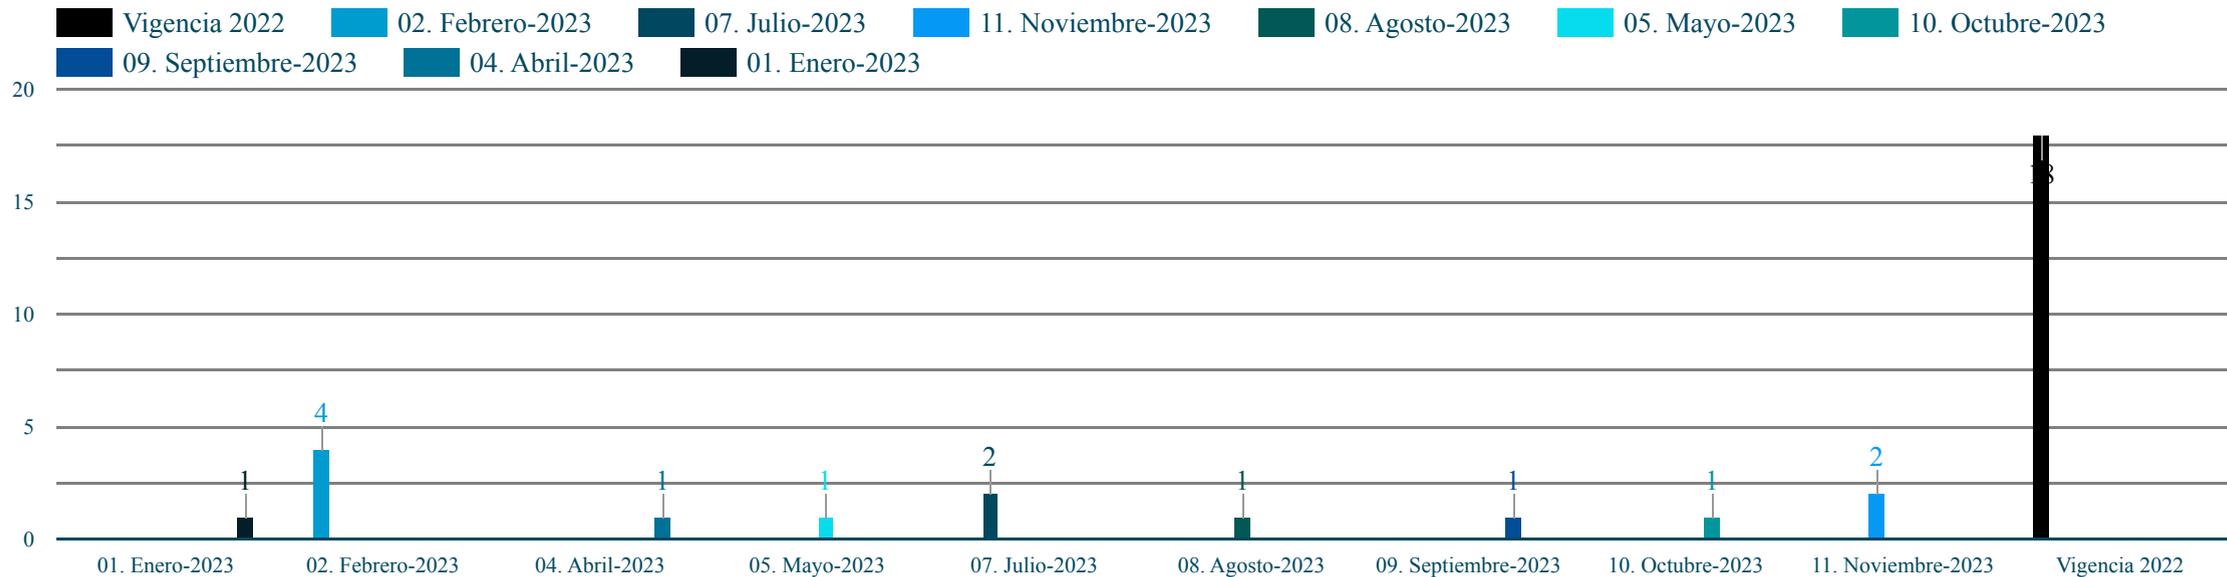

### Número de casos pendientes por solicitante

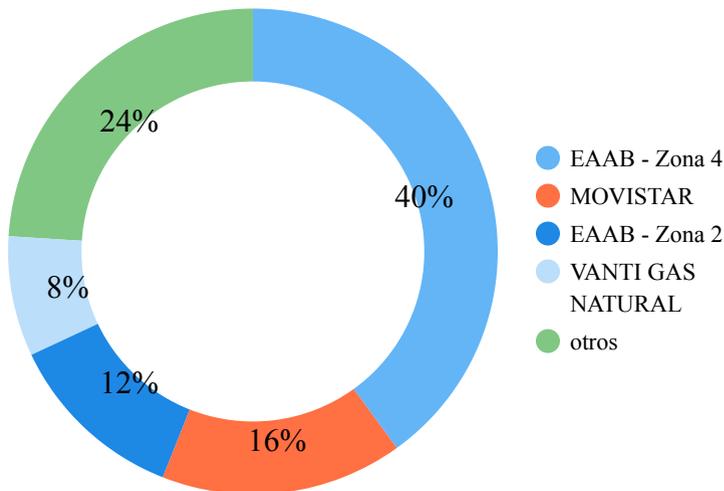

MES REP...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A . En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Alvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, Cl26 con KR 69 y el tercer punto Cl 26 cerca a la Av Boyaca	PENDIENTE



# Casos:

## Unidad de Mantenimiento Vial - UMV


N°. de casos registrados

5


N°. de casos resueltos

4

### Número de casos registrados por mes

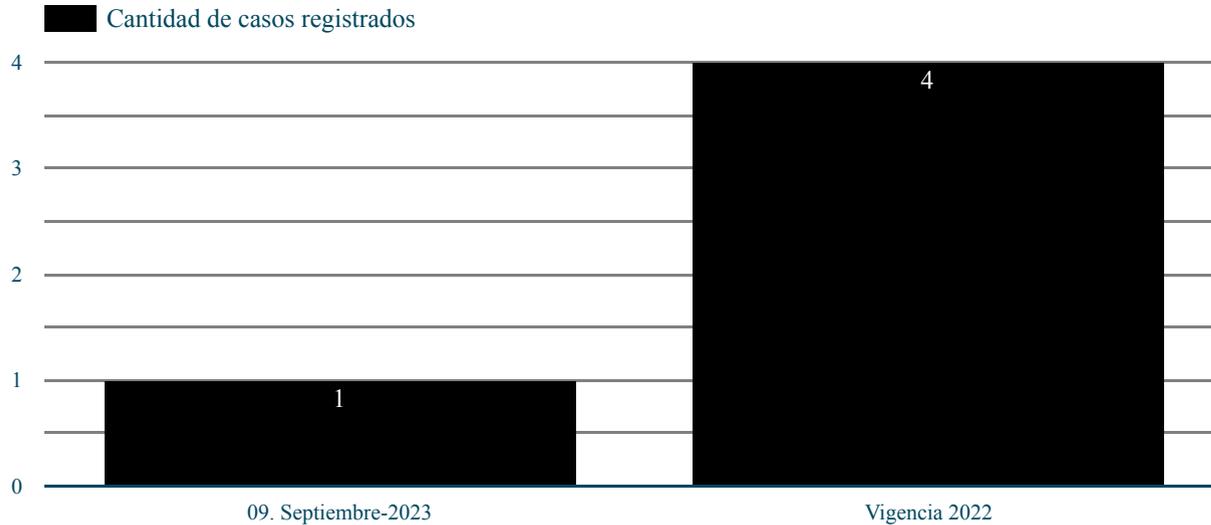

### Pendientes por Entidad que presentó el caso

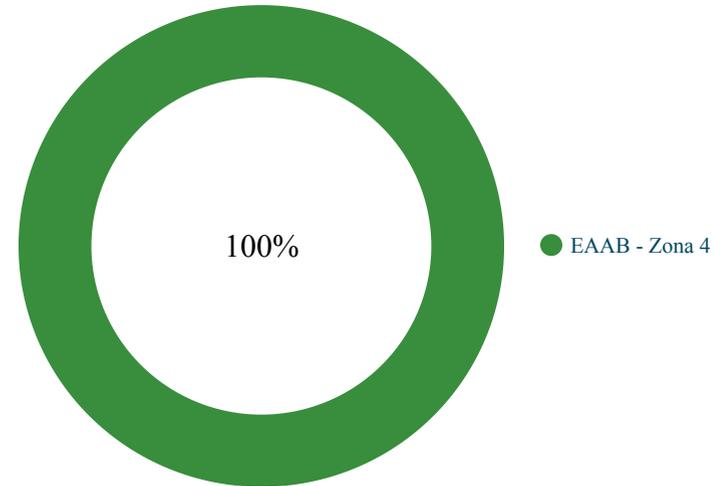

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
09. Septiembre-2023	Para UMV, solicita una reunión con UMV para tratar el reporte de un daño en calle 78C # 17 f - 47 vía al Mochuelo ya que hay un daño en la acometida de EAAB	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para la UMV, para las intervenciones en el barrio "20 de julio", se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tuno – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	ATENDIDO


### Número de casos registrados por mes



### Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

MES REPORTE DE CASO	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	ATENDIDO
03. Marzo-2023	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	ATENDIDO
04. Abril-2023	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 265 y en abril 150, para un total de 491 puntos pendientes, sobre los cuales no se ha recibido respuesta, es importante precisar que no nos han hecho observaciones, entonces queremos saber que ha pasado con la respuesta, ya que se cuenta con aprobación del IDU y pagos.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer.	ATENDIDO



# Casos: ENEL Colombia ESP


N°. de casos registrados

67


N°. de casos resueltos

39

## Número de casos registrados por mes

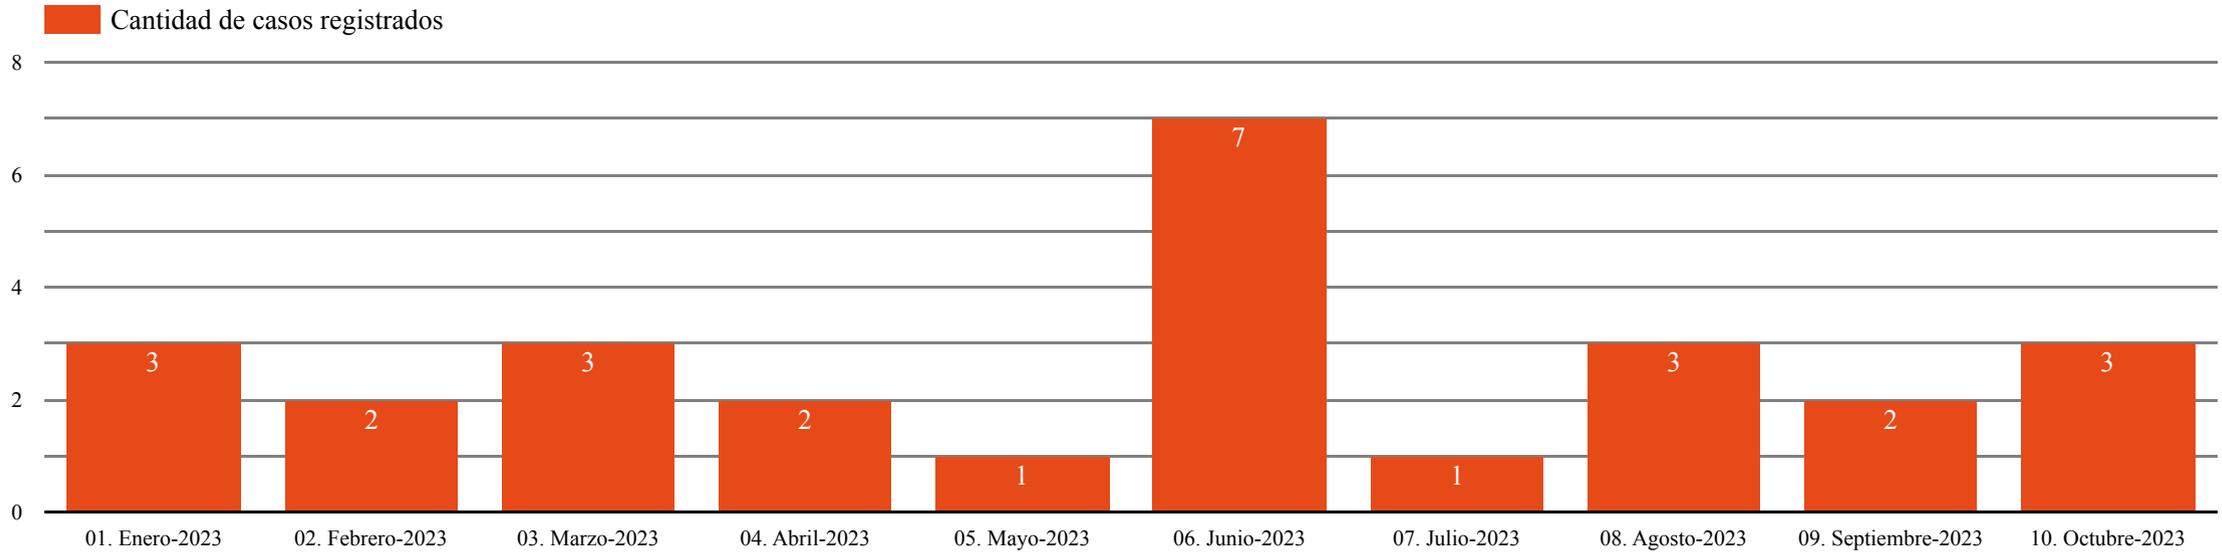


## Pendientes por Entidad que presentó el caso

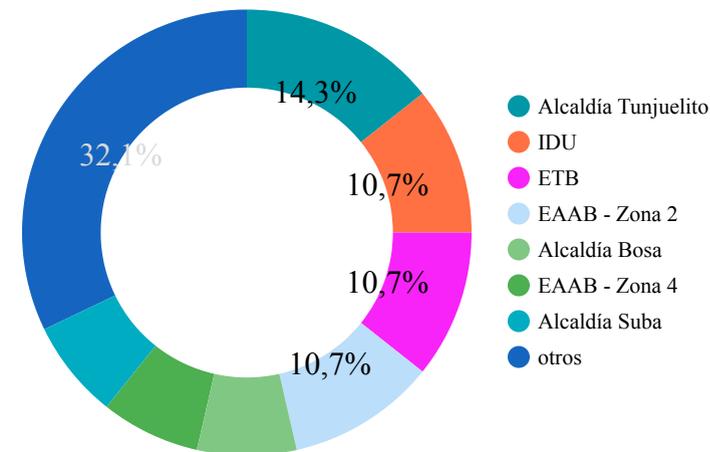


MES REPORT...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	PENDIENTE
01. Enero-2023	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	PENDIENTE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Solicitud para Enel, referente a un poste con riesgo de caída y obstrucción de acceso al predio de la Calle 25B No. 74 50	ATENDIDO



**Número de casos registrados por mes**

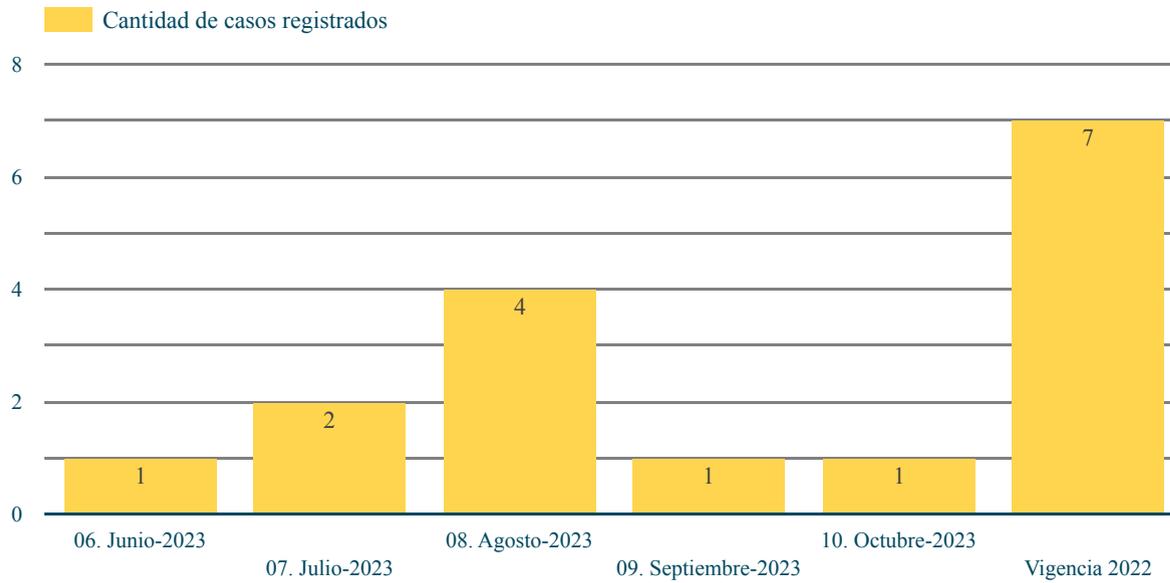

**Pendientes por Entidad que presentó el caso**

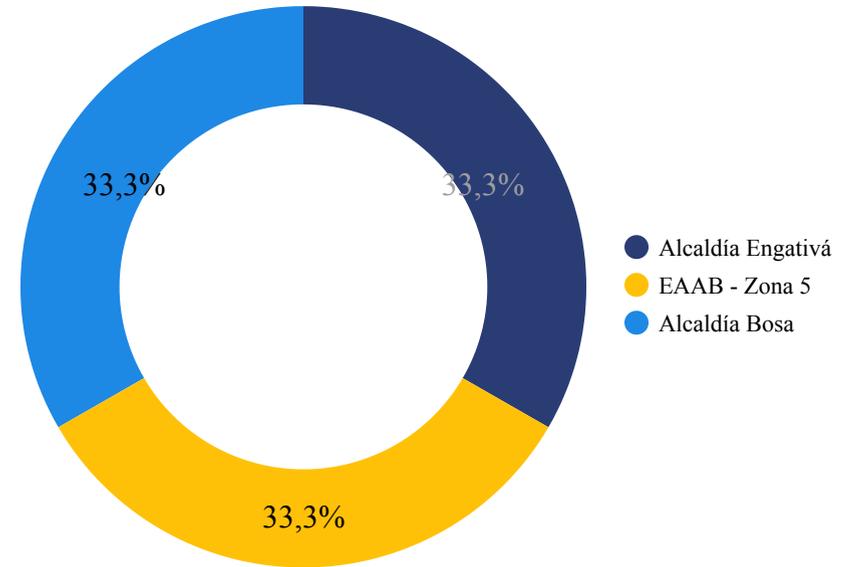

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
06. Junio-2023	<p>Para VANTI, con respecto a un CIV en Alameda en la CL 63 Bis Sur entre carrera 74 H y 74F, solicita coordinar una visita de acompañamiento para tratar temas específicos en el punto. La obra fue reportada por medio de un oficio via correo electrónico informando las intervenciones y ubicación al inicio del contrato.</p> <p>Por otro lado, se realiza requerimiento frente a cinco puntos más en donde se van a abrir nuevos frentes de obra y solicita coordinar aspectos con VANTI. Se enviará correo electrónico para programar las visitas respectivas.</p>	ATENDIDO
07. Julio-2023	<p>Para VANTI, se tiene solicitud por parte de contratista S y S ingeniería, que termino contrato el 21 de mayo de 2023 con el FDL de Fontibón, ha solicitado certificación de “paz y salvo” y le han informado que no es posible emitir certificación de “paz y salvo” porque se tiene pendiente el pago de un daño, se ha solicitado factura, pero no se ha emitido respuesta.</p>	ATENDIDO
07. Julio-2023	<p>Se presenta requerimiento para VANTI, respecto al traslado de una red de polietileno de 1” en el sector de Gualoche que se instaló sobre la vía. Se han realizado visitas por parte de VANTI, pero se requiere consolidar el traslado de la red a un costado del andén, generando retrasos en el proceso constructivo.</p>	PENDIENTE
08. Agosto-2023	<p>Para VANTI, se tiene a cargo la supervisión de un contrato de obra pública, el número 410 de 2022, el cual compete a la construcción de malla vial y espacio público de la localidad, actualmente se tiene en ejecución un tramo en el barrio La Merced, se esta realizando conformación de vía, no obstante se evidenció que aproximadamente diez (10) casas del sector no cuentan con servicio de gas por lo cual se generó comunicado con ESP se efectuó recorrido con funcionario de VANTI pero no se ha tenido</p>	ATENDIDO



# Casos:

## Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB


Nº. de casos registrados

13


Nº. de casos resueltos

10

### Número de casos registrados por mes

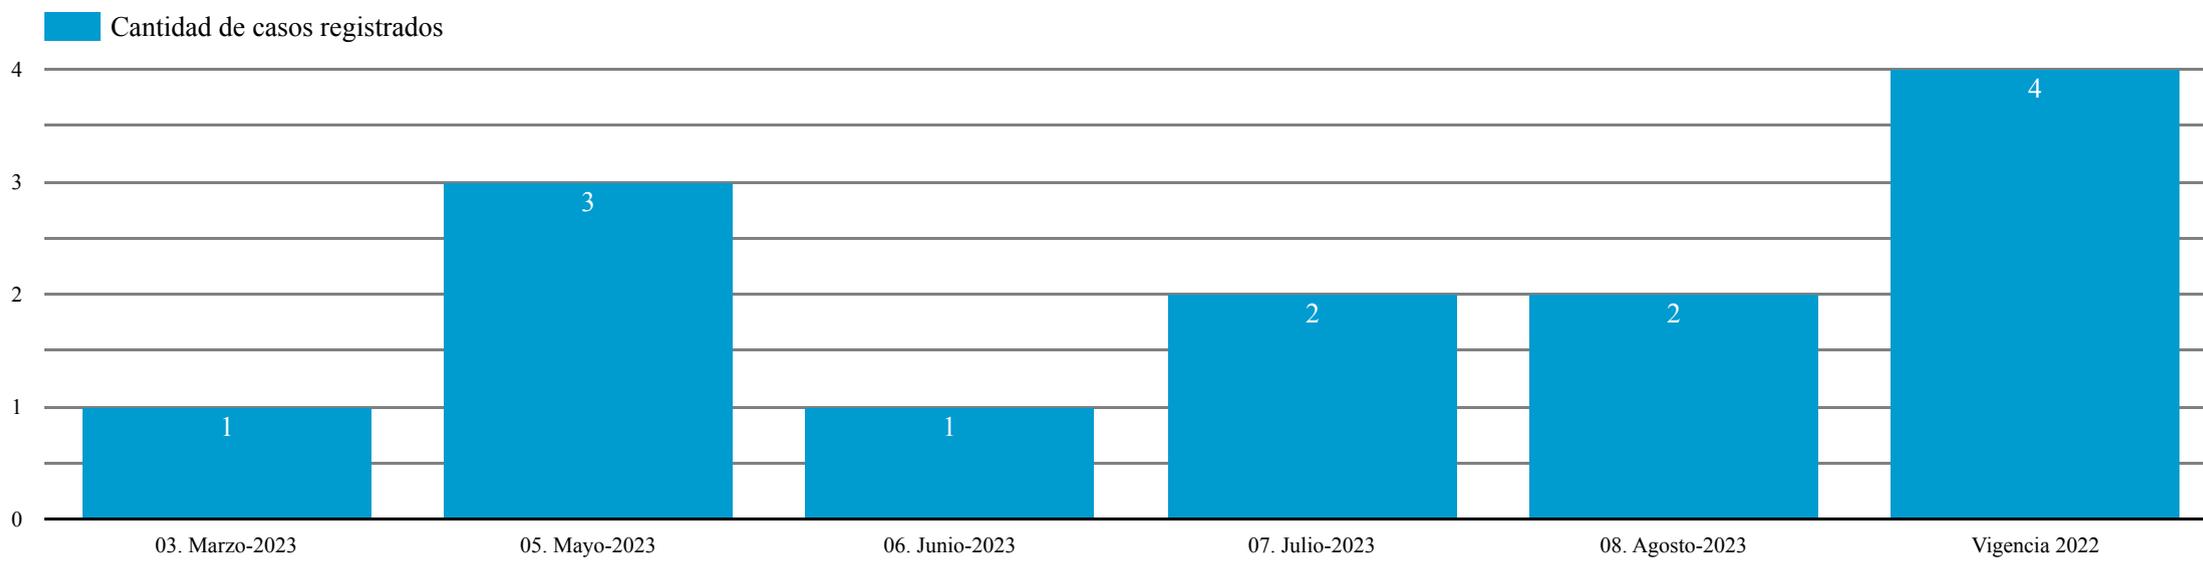


### Pendientes por Entidad que presentó el caso

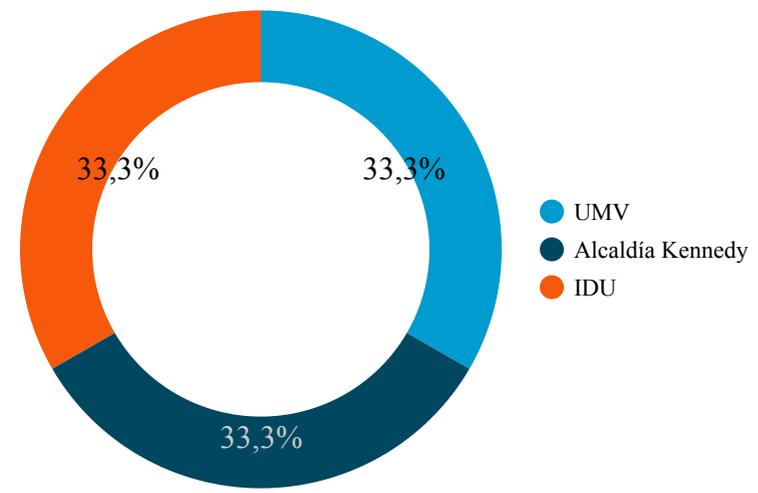

MES REPORT...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
03. Marzo-2023	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renovación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal	ATENDIDO

**Número de casos registrados por mes**

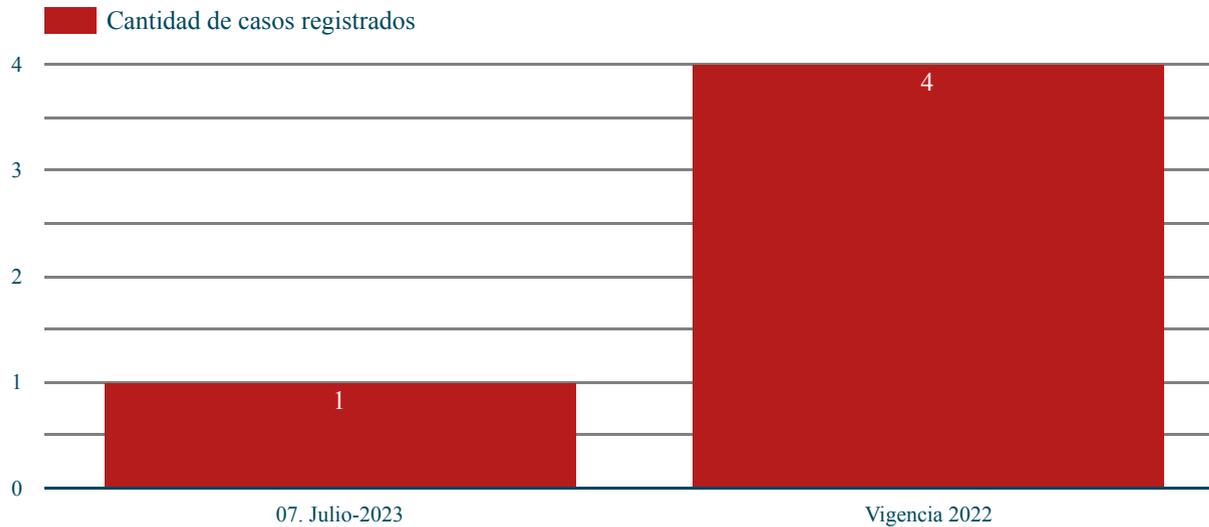


**Pendientes por Entidad que presentó el caso**

No hay datos

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
07. Julio-2023	Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de “paz y salvo” para contrato 396 de 2022 de INCITECO.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; pues se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	ATENDIDO

## Número de casos registrados por mes

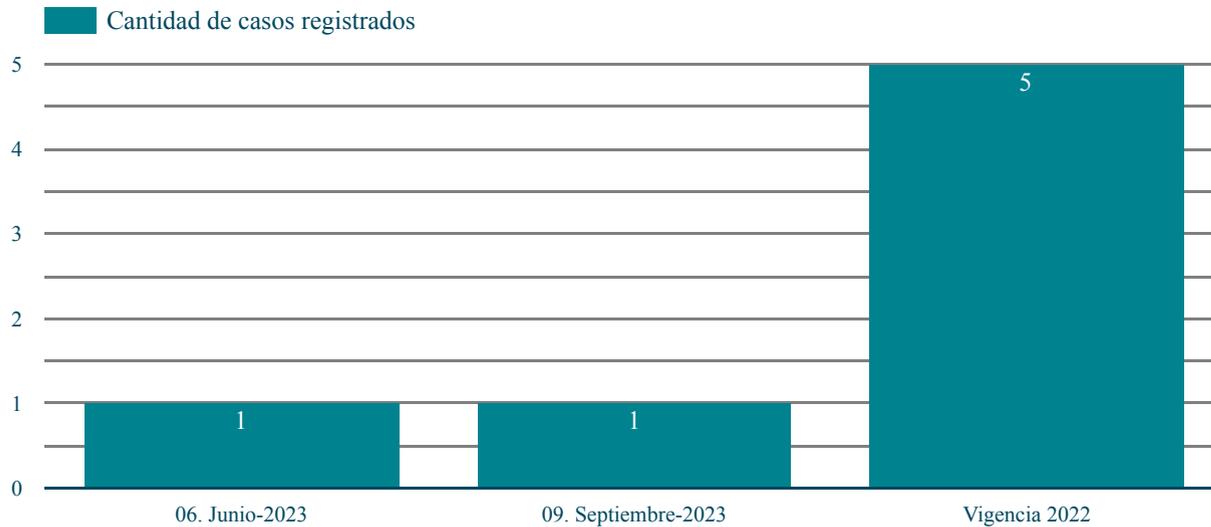

## Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
07. Julio-2023	Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de “paz y salvo” para contrato 396 de 2022 de INCITECO.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; pues se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	ATENDIDO


ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA

MES REPORTE DE CASO


¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?

ESTADO DEL CASO


## Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales

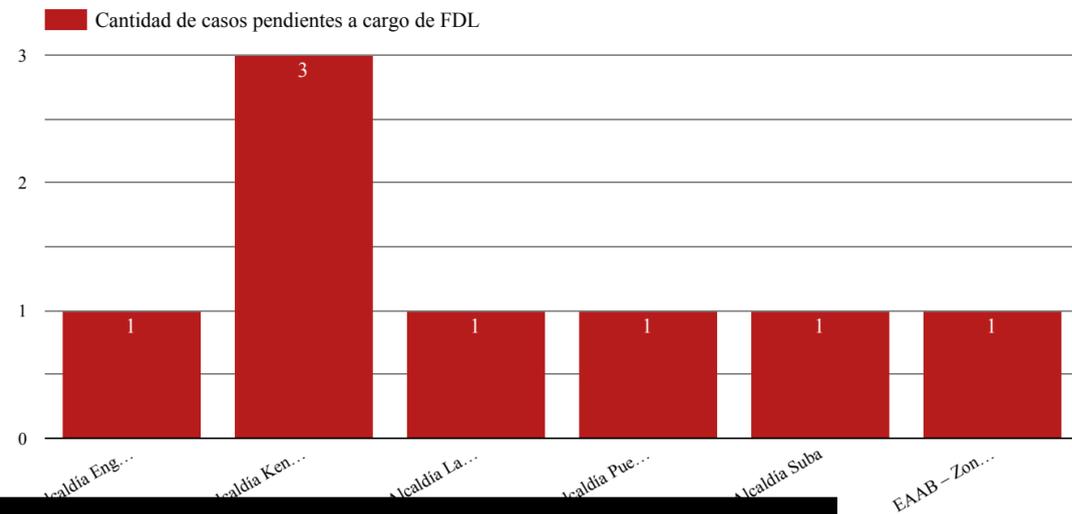

## Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales

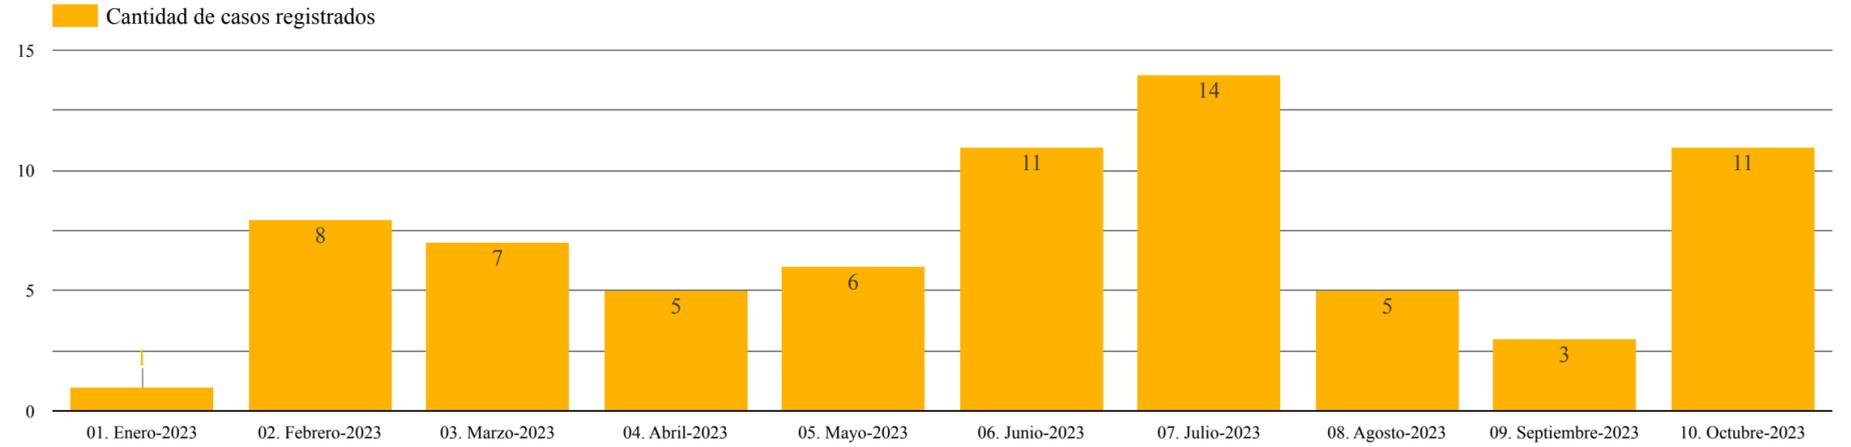

## Casos presentados por Alcaldía local

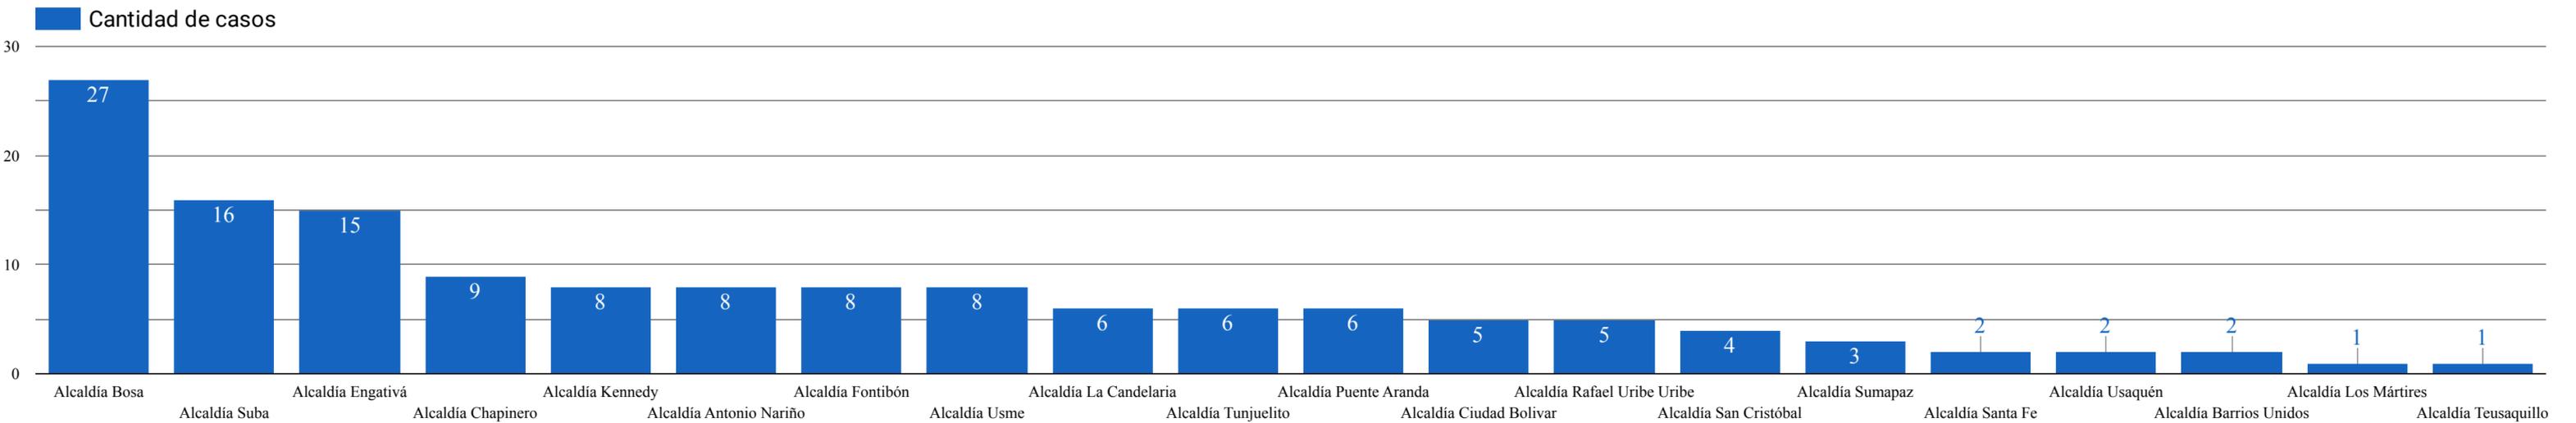

## Registro de los casos

MES REPO...	SOLICITUD	ENTIDAD ...	ESTADO DE...
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	IDU	ATENDIDO
02. Febrero-2023	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta.	IDU	PENDIENTE



Nº. de casos resueltos  
**87**

Nº. de casos registrados  
**142**

Nº. de casos pendientes  
**55**



BOGOTÁ D.C.

Paola Andrea Gamez Tabimba &lt;pgamez@sdp.gov.co&gt;

**BORRADOR - Acta N°. 43 - COISP - 23 de noviembre de 2023**

Alvaro Enrique Reinoso Guerra <alvaro.reinoso@idu.gov.co>  
 Para: Paola Andrea Gamez <pgamez@sdp.gov.co>

4 de diciembre de 2023, 10:59

PTI

**Ing. Alvaro Enrique Reinoso Guerra**

Profesional Universitario

Dirección Técnica Administración de Infraestructura - DTAI

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

Calle 22 N° 6 - 27 - CP: 110311

Teléfono: (57) (1) 3445000 - PBX 3386660

alvaro.reinoso@idu.gov.co



----- Forwarded message -----

De: Arenas Sanchez, Jorge Mauricio, Enel Colombia &lt;jorge.arenas@enel.com&gt;

Date: mié, 29 nov 2023 a las 10:47

Subject: RE: BORRADOR - Acta N°. 43 - COISP - 23 de noviembre de 2023

To: Alvaro Enrique Reinoso Guerra &lt;alvaro.reinoso@idu.gov.co&gt;

Cc: Ponce De Leon Martinez, Pablo Enrique, Enel Colombia &lt;pablo.poncedeleon@enel.com&gt;, Escobar Alvarado, Oscar Fernando, Enel Colombia &lt;oscar.escobar@enel.com&gt;

INTERNAL

Buenos días Alvaro, acorde a lo indicado en el comité envío casos que revisado con el Ing. Pablo Ponce ya fueron atendidos y se dio cierre en su oportunidad; sin embargo, aparecen en el seguimiento, por lo que agradezco su cierre o validación en caso de considerarlo pertinente.

N°. DE CASO	Solicitud	Nota
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (2021)	Acorde al comentario fue coordinado a través del caso 16, que ya no está en la matriz
22	Para ENEL COLOMBIA en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de ENEL COLOMBIA que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara. (2021)	Acorde al comentario fue coordinado a través del caso 16, que ya no está en la matriz
54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste por parte de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU - EAAB - III Sesión 2022)	No se ha realizado ninguna instalación por parte de Enel.
152	Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022.	No hay subterranización ni proyecto de inversión para la zona.
177	En el mes de enero se presentó una solicitud para visita para suministro de energía para todas las infraestructuras de la Alcaldía de Sumapaz, pero no ha sido posible avanzar en el tema; por lo que se busca el apoyo en el diseño de redes eléctricas y sacar la licitación respectiva; se ha estado en contacto con Patricia Garavito; con el número de solicitud, 00113394.	Caso cerrado, favor revisar. Validado con Camila Saavedra
432	Para ENEL Colombia, se relaciona con una cámara localizada en la calle 147 # 9-60, presencia de hueco que al observar con más detalle se encuentra que la base donde se apoya la tapa en dicha cámara se encuentra dañada generando una diferencia de altura, la cual al pasar un vehículo produce un efecto de rebote y a su vez las vibraciones dañando tanto la estructura de la cámara como la del pavimento adyacente a la misma.	Caso cerrado reportado por el Ingeniero Oscar escobar.

452	Se solicita a ENEL Colombia SA ESP, que por favor deleguen a una persona para llevar a cabo las coordinaciones y los acercamientos a los que haya lugar en cumplimiento del principio de planeación y ley de infraestructura, frente a la etapa de formulación de los proyectos que tiene en curso el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.	Visitas gestionadas por el Ing. Pablo Ponce y realizadas a la localidad
454	En el marco de la ejecución del contrato 327 de 2023, se realizó la solicitud de visita técnica en campo a ENEL Colombia SA ESP, y a la fecha no se ha recibido respuesta, por lo cual se solicita un contacto para gestionar los requerimientos del contrato. Adicionalmente se informa que el radicado de la solicitud a ENEL es 000537380 del 23 de mayo de 2023.	Respuesta generada con radicado de salida 0000598599 del 22 de junio de 2023
508	Para ENEL, solicita información respecto a unas cámaras de Enel que no tienen tapas, requiere un correo de contacto para hacer la gestión.	Se dio respuesta con respecto al correo y adicionalmente en el plan de mantenimiento se revisan tapas en toda la ciudad.
517	Para ENEL Colombia SA ESP, en el desarrollo de la consultoría del contrato FDL-E N°. 402 de 2022, se requirió un enlace con las empresas de servicios públicos para coordinar las actividades a ejecutar, el radicado con el cual se radicó la solicitud es el N°. 000612718 del 13 de septiembre de 2023, por lo cual se solicita respuesta al respecto.	Comunicación respondida con el radicado de salida 0000668950

Quedo atento a los comentarios.

Saludos,

#### JORGE MAURICIO ARENAS SÁNCHEZ

Jefe Customer Care

Business to Government – B2G

Gerencia e-Solutions Colombia



#### Enel – Codensa

Carrera 13ª No. 93-66 Piso 6. Bogotá – Colombia

Phone +57 1 6016277

Mobile +57 3164738325

[jorge.arenas@enel.com](mailto:jorge.arenas@enel.com)

[El texto citado está oculto]
