COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 26 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 18 de julio de 2024

HORA: 07:30 am a 8:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	Profesional en período de vacaciones.
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Liliana Chaparro	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sara Juliana Delgado	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Yira Bolaños Enríquez	Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E)	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-26014

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia		X	
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Ricardo André Ruiz Silva	Profesional FDL de Antonio Nariño	Alcaldía Local de Antonio Nariño	X		
Manuel Álvarez	Profesional FDL de Antonio Nariño	Alcaldía Local de Antonio Nariño	X		
Juan Alfredo Torres Prieto	Profesional FDL de Puente Aranda	Alcaldía Local de Puente Aranda	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (25 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión N°. 26 de 2024.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión veintiséis **(26)** del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Puente Aranda y Antonio Nariño, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de Antonio Nariño – Manuel Álvarez:

Se informa que no se tienen temas pendientes para presentar en este espacio de coordinación. Se agradece la invitación a la mesa de trabajo.

3.2 Alcaldía de Puente Aranda – Juan Alfredo Torres Prieto:

- **Caso 142 (nuevo):** Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.

- **Caso 143 (nuevo):** Para EAAB-Zona 3, se solicita apoyo para adecuación de collarín de cobre en el CIV 16004474, del barrio San Francisco. Así mismo, se aclara que el Ingeniero Francisco siempre ha sido muy presto en apoyar y atender a los llamados del Fondo de Desarrollo Local.

Respuesta VANTI – Alexandra Rojas: Se solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se comparte vía chat de Google Meet.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (25 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 11 de julio de 2024, correspondiente a la sesión número 25 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma se presentaron las siguientes observaciones:

- **Dra. Jacqueline Friede:** Que la información de la Alcaldía Local de Chapinero fue enviada en su completitud vía chat de Google Meet, donde se referenciaron los consecutivos de radicación a la Secretaría Distrital de Ambiente, como puede observarse en el registro del caso 141.

- **Ing. Humberto Ramírez**: Respecto de la transcripción efectuada para la sesión 25, se solicita modificar *"contratistas IDU"* por *"algunos contratistas"*, lo cual da claridad al hecho informado por la UAERMV.

También se menciona, que el **acta 23** se encuentra publicada en la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación, mientras que el **acta 24** está en proceso de publicación, y el **informe trimestral II** se encuentra en proceso de revisión y firma en el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
3	01/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
4	08/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
5	15/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
6	22/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
7	29/02/2024	X	X	X	X	3-2024-11328	21/03/2024	Publicado en página web.
8	07/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
9	14/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
10	21/03/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
11	04/04/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
12	11/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
13	18/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
14	25/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16391	8/5/2024	Publicado en página web.
15	02/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18159	27/5/2024	Publicado en página web.
16	09/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18601	06/06/2024	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
17	16/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
18	23/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
19	30/05/2024	X	X	X	X	3-2024-20615	20/6/2024	Publicado en página web.
20	06/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21201	28/6/2024	Publicado en página web.
21	13/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21311	28/6/2024	Publicado en página web.
22	20/06/2024	X	X	X	X	3-2024-22571	10/7/2024	Publicado en página web.
23	27/6/2024	X	X	X	X	3-2024-23136	10/7/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE II	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En proceso de revisión y firma en el IDU.
24	04/07/2024	X	X	X	En trámite	3-2024-24411	Pendiente	En proceso de publicación en la OAC-SDP.

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la ingeniera Bertha Liliana hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 IDU – Jaime Augusto Bermúdez Díaz:

Esta semana se reportan para atención los siguientes casos en el Comité:

- **Caso 144 (nuevo):** Para ENEL, se reporta tapa faltante en la KR 7 con CL 41, se solicita reposición por generar un alto riesgo de accidente para transeúntes y vehículos.

- **Caso 145 (nuevo):** Para EAAB-Zona 3, se solicita atender hundimiento reportado en la AC 3 frente a placa 51A-10.

Así mismo, se reitera la atención y gestión de los siguientes casos.

- **Caso 138:** Para EAAB-Zona 1, se presenta socavación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 12, costado sur, en el área aferente se observa pozo del sistema de alcantarillado, es posible que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, la debida atención de la EAAB.

- **Caso 139:** Para EAAB-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localiza en la calle 22 con carrera 14 (Avenida Caracas), en donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por socavación, se solicita visita de campo de la EAAB para verificar, y para que con el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad vial en el sector.

De lo expuesto, es importante acotar que desde el IDU se ha extendido apoyo para atender estas intervenciones con algunos recursos de los contratos que se tienen en curso (como la reposición de carpeta asfáltica), por lo cual se requiere trabajar de manera articulada, y tener información de la gestión que EAAB adelanta.

Respuesta ENEL – Mauricio Arenas: Respecto del caso de la calle 41, se informa que fue reportado a unidad operativa, y se están realizando las gestiones pertinentes para adelantar reposición de tapa.

5.2 IDU – William Fernando Chávez:

- **Caso 119:** Se solicita información respecto a la reposición de tapas.

*En esta sesión no asistieron los delegados de Claro, por lo tanto, de acuerdo con lo informado vía chat de WhatsApp el 18 de julio, se informó que se realizó reposición de tapa de cámara triple, no obstante, hace falta reponer tapa sobre caja pequeña.

5.3 EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:

- **Caso 121:** Durante la semana pasada se hizo remplazo de material granular, el cual estaba bastante saturado, en este momento se encuentra material compactado y listo para instalación de mezcla asfáltica.

Ya se realizó retiro de material y escombro sobrante, y se espera finalizar la intervención de la ciclovía esta semana.

5.4 IDU – Liliana Torres:

Se presenta un nuevo caso para su atención.

- **Caso 146 (nuevo):** Para EAAB-red matriz, se reporta daño en la carrera 70C (Avenida Ciudad de Villavicencio) con calle 63 sur, se solicita verificar estado de redes.

Respecto del caso 86 se comunica:

- **Caso 86:** Se realizó contacto con la Ingeniera Bella Esmeralda, que es la persona encargada de los contratos de puntos inestables, ella comentó que el 26 de junio se realizó reunión con Alcaldía local, IDU e IDIGER para evaluar proyectos de puntos inestables, donde se encontró de manera común el sector del parque nacional en la Av. Circunvalar, por lo cual se está adelantando plan de acción. Así las cosas, se solicita cierre teniendo en cuenta que se está gestionando proyecto al respecto.

5.5 UAERMV – Humberto Ramírez:

- **Caso 147 (nuevo):** Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.

5.6 SDA – Sara Delgado:

Al respecto del caso 141 se informa:

- **Caso 141:** Se realizó contacto con área de Silvicultura, en la cual se indica que ya se ha remitido respuesta mediante radicados SDA 2024EE140553 del 2024-07-05 y radicado SDA 2024EE113258 del 2024-05-27, así mismo, se remite contacto de profesional de esta dependencia por si existe alguna duda.

5.7 UAESP – Yira Bolaños:

- **Caso 32:** Se comunica que ya fue atendido por la UAESP, del cual se emitió respuesta de fondo respecto a tema de alumbrado público, indicando que no se requiere expansión, pero si existe afectación por individuos arbóreos. Por lo cual, se realiza cierre.

5.8 ENEL – Mauricio Arenas:

Se informa que inicia período de vacaciones la próxima semana, por lo cual estará atendiendo al Comité el Ingeniero Fernando Cruz.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
4	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	EAAB – Red Matriz	**Alta**	**IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6:** Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.
5	Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedo sin reparar. Se solicita pronta actuación.	IDU	**Alta**	**Acta 04-2024:** EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Así mismo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.
6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	IDU	**Normal**	**Acta 04-2024:** EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez. **Acta 5-2024:** Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP	ENEL COLOMBIA	**Normal**	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
	competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.			
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	**Alta**	Pendiente
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	**Alta**	**Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6:** Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	**Normal**	**ENEL – Mauricio Arenas en acta 06:** Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.
23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.	IDU	**Normal**	**Intervención IDU – Angélica López en acta 06:** Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.
25	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	EAAB - Zona 1	**Alta**	**Pendiente**

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
26	Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	**Alta**	**Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07:** Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como desvío la misma Avenida y que en ese sentido los huecos, posiblemente se han generado por esos desvíos sin que sean exactamente intervenciones como tal para las obras que se adelantan.
28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.	MOVISTAR	**Normal**	Pendiente
29	Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.	EAAB - Zona 1	**Normal**	Pendiente
36	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva. **Observación FDL - 26 de mayo:** Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio público costado norte.	EAAB - Zona 1	**Alta**	**Pendiente**
39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.	EAAB - Zona 2	**Normal**	**Acta 22, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:** Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
				con las actividades programadas en este sector. Se remite el 24/06/2024 registro fotográfico de sectores sobre carrera 4 que ya tuvieron recuperación de espacio público.
43	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	ENEL COLOMBIA	**Normal**	**Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas:** Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días. **Observación FDL - 26 de mayo:** Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.
45	Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comunicó que por el cambio de gobierno no se estarían expidiendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.	SDA	**Normal**	**Observación FDL - 26 de mayo:** Se tramitó en el mes de abril un oficio a la SDA, con el fin de ultimar detalles. Ya se surtieron los temas técnicos y se está atento a la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.
47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.	ENEL COLOMBIA	**Normal**	**Intervención ENEL CODENSA – Mauricio Arenas:** Respecto a la energización del parque, indica que ENEL fue a hacer la revisión de la obra encontrando que las cámaras tienen las tapas soldadas por lo que no fue posible la inspección de la ductería, ni realizar las respectivas validaciones que la compañía debe hacer, se solicitó al área encargada si es posible desoldar para hacer la revisión y realizar la energización lo más pronto posible. Indica que la energización se realiza de una subestación localizada en un conjunto residencial pero que en los documentos aportados no llegó la carta de autorización para obtener el ingreso al conjunto para poder hacer la revisión y la energización cuando corresponda.
49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	ENEL COLOMBIA	**Normal**	**En sesión 21,** se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, en donde se había identificado que el problema era un tema con el medidor. **Respuesta ENEL CODENSA – Mauricio Arenas:** Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.
53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	**Alta**	**En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras:** Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. **Wilson Porras informa en sesión 16:** Se

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
				han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. **En sesión 23,** se remitió informe presentado por Arq. Carmen Rocío López a Juan Carlos López.
54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	**Normal**	**Wilson Porras informa en sesión 16:** Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.
56	Para ENEL, se solicita retiro y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	ENEL COLOMBIA	**Alta**	**Pendiente**
69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	**Normal**	**Pendiente**
77	Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. **De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.**	Alcaldía Suba	**Normal**	**En sesión 19 IDU indica**, se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.
78	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	EAAB – Red Matriz	**Alta**	Caso reportado desde 2023. **Nubia Riaño informa en sesión 14:** Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos.
79	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en	EAAB - Zona 3	**Normal**	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
	intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.			
83	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.	IDU	**Normal**	Pendiente
88	Se solicita al IDU respuesta a requerimiento enviado vía correo electrónico sobre trámite de PMT de la Industria Copel, quien como cliente de VANTI requirió prestación de servicio mediante derecho de petición debido a qué se ha hecho solicitud de PMT, pero ha tenido negado por respuesta de IDU. En varias ocasiones se ha requerido comunicación con ingenieras de IDU para sostener mesa de trabajo, pero no ha sido posible.	IDU	Normal	Pendiente
90	Para SDA, relacionado con un requerimiento de manejo silvicultural, durante el mes de abril se radicó mediante consecutivo 2024ER43111 atendiendo las observaciones efectuadas por la Secretaría, pero a la fecha no se tiene respuesta.	SDA	Normal	**Observación FDL - 26 de mayo:** Se realizó visita silvicultural el día 28 de mayo de 2024, sin embargo, se envió mediante radicado No. 2024ER114112, solicitud de remitir el concepto técnico de la visita, debido a que es un requisito indispensable para la obtención de la aprobación de intervención por parte del IDPC. No se solicita la resolución como tal, solo el concepto de la visita realizada por el Ing. Alejandro Sánchez.
91	Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
92	Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	Normal	S**esión 18 Intervención VANTI - Mauricio García:** Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
94	Para IDU, se solicita mesa de trabajo, desde la Alcaldía Local se trabaja en formular un proyecto de puentes peatonales y se ha solicitado la reserva de esta infraestructura (radicado IDU DTINI 202423500582981), pero solo se dio respuesta afirmativa para un puente, lo que impide continuar con el proyecto. Se solicita realizar una mesa de trabajo para verificar la posibilidad de realizar reserva.	IDU	Normal	**Sesión 18 - Intervención IDU – Ing. Jaime Bermúdez:** Se solicita aclarar si la respuesta a la solicitud de reserva fue emitida de forma incompleta por el IDU, o si se indicó que no se puede indicar la reserva por alguna condición particular. **Respuesta de Mónica Chipatecua:** Se informa que la reserva se solicitó para cuatro puentes, pero solo se reservó uno, para los tres restantes se comunicó que el IDU realizó mantenimiento en el mes de octubre, empero en el mes de diciembre se recibió por parte del IDU un diagnóstico respecto de dicha infraestructura para continuar con la formulación del proyecto. A su vez, en las visitas técnicas efectuadas se observa que los puentes no han sido objeto de mantenimiento. **Observación FDL - 28 de mayo:** No se ha atendido la solicitud de la mesa de trabajo ante el IDU, es de carácter urgente ya que es para continuar con el proceso de formulación.
95	Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	Normal	**En acta 19, IDU señala** que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.
97	Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.	MOVISTAR	Alta	**En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña:** Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.
98	Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Normal	Pendiente
100	En el comité anterior al que asistió el FDL de Usaquén se solicitó a ENEL retirar reserva de dos segmentos viales, el primero con CIV 1004519 y el segundo 1007204, ENEL Colombia mediante radicado IDU 20225262079722 efectuó el desistimiento de reserva a estos segmentos viales de malla vial y espacio público, sin embargo, en el SIGIDU no se ha reflejado dicha información, se solicita por favor retirar reservas con base en la comunicación emitida por ESP.	IDU	Normal	Pendiente
101	Para EAAB-Zona 3, se recibe derecho de petición N°. 000013183802 relacionado con afectación de cámara ETB. Se realizó visita a la carrera 47 # 22-83 para identificar un daño ocasionado por un contratista de la EAAB a la cámara de la Empresa, dejándola en riesgo de accidente para los peatones. En visita del viernes 24 de mayo el personal contratista negó su identificación y el número del contrato, luego en segunda vez la visita del 27/05/2024, se observó que personal del contrato EAAB el contrato 1-01-33300-1534-2022 está	EAAB - Zona 3	Normal	**Sesión 20 - Intervención EAAB-Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez:** Realizada la consulta efectivamente corresponde a un contratista de la EAAB, por lo cual en el transcurso de la mañana se informará la programación pertinente para realizar la recuperación del espacio público y reconstrucción de la cámara.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
	realizando trabajos en la zona, motivo por el cual se solicita la intervención de la EAAB para requerir al contratista la recuperación inmediata de la cámara.			
103	Para IDU, en el barrio La Gloria, segmento vial con CIV 4005511 se encuentra reservado por el contrato IDU de conservación 1746 de 2021, no obstante, se declaró incumplimiento y no se ha podido ejecutar este segmento vial. Al respecto es preocupante el estado del segmento vial, el cual se encuentra sumamente afectado por las rutas del SITP y alimentadores que transitan de manera constante, generando repetidas quejas por parte de la comunidad. Por lo cual, se aprovecha este espacio para verificar el encargado del sector puntualmente, y si se puede facilitar un contacto para coordinar de una u otra manera, la intervención a través de acciones de movilidad, sin que se comprometa jurídicamente el proceso que adelanta el IDU.	IDU	Alta	**Sesión 20 - Intervención IDU – Jaime Augusto Bermúdez Díaz:** Se solicita el número del contrato IDU, ya que al llevar un proceso de caducidad se tienen unos términos legales que es importante analizar, por lo cual, se propone efectuar una mesa de trabajo para identificar dichas condiciones, en aras de garantizar la correcta y segura movilidad en el sector del barrio La Gloria. Se agenda Mesa de trabajo agendada para el martes 11 de junio a las 7:00 am de manera virtual.
104	Para ENEL, se realizó solicitud respecto de un CIV ubicado en el barrio Los Laches, en la KR 5 entre CL 7 y CL 9, en la cual se requirió realizar acciones pertinentes sobre poste que se encuentra inclinado, esto teniendo en cuenta visita realizada por IDIGER en la cual se efectuó diagnóstico técnico donde se hicieron algunas recomendaciones al respecto del riesgo que este genera.	ENEL COLOMBIA	Alta	**Sesión 20 - Intervención ENEL – Mauricio Arenas:** Se solicita remitir la petición radicada a ENEL vía correo electrónico.
105	Para VANTI, en el barrio Los Laches, en la KR 5 entre CL 7 y CL 9, VANTI realizó desconexión del servicio a cinco predios, entonces mediante oficio (que está en proceso de firma) se está solicitando la reconexión dado que el contratista ya realizó las obras correspondientes, entre las cuales se construyó un muro de contención.	VANTI GAS NATURAL	Normal	Pendiente
108	Para VANTI, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre la AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.	VANTI GAS NATURAL	Normal	**Acta 21,** De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quién obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCIT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quién es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Respecto de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizará recorrido. **Acta 22:** Con referencia a los casos 81 y 82, el ingeniero Sergio Alejandro Díaz del Área de Conservación informó que el 13 de junio realizaron los recorridos con VANTI y UAERMV. Con la UAERMV se dejó el compromiso que serían reparadas las afectaciones y que iniciarían el día lunes y terminarían el día miércoles. Para el caso de VANTI, se levantó acta de inspección y quedó el compromiso que en un

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
				lapso de 15 días hábiles estarían culminando los arreglos de las zonas que habían sido afectadas.
111	Para Movistar, se solicita respuesta de la petición con radicado 20240419105915900 del 24 de abril de 2024.	MOVISTAR	Normal	Pendiente
112	Para IDU, presenta situación pendiente relacionada con la construcción del cable aéreo San Cristóbal del contrato IDU 1167 de 2023, para su ejecución se tuvieron que demoler en cada estación 2 manzanas, las estaciones objeto de consulta son “La Victoria” y “Altamira”, donde se demolieron predios, pero el IDU no ha generado cierre de las cuentas contrato, de las mismas se está contabilizando consumo. Por lo anterior, se solicita al IDU pronunciamiento, y que como se ha requerido realice los cierres de las cuentas.	IDU	Normal	Durante el día 06 de junio de 2024, el Ingeniero Álvaro Reinoso remite correo electrónico a la Dirección Técnica de Predios informando la situación presentada sobre el sector, para realizar la debida suspensión del servicio. **Acta 23 - EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López**: Se solicita información al IDU respecto de la petición de suspensión de servicio sobre manzanas que fueron adquiridas mediante compra de predios para construcción de proyecto de cable aéreo. **Acta 23 - IDU – Álvaro Reinoso:** Se remitió correo informando el caso el 06 de junio, no obstante, se continuará gestión con profesional Mateo Grajales, a su vez Liliana Torres puede generar un apoyo escalando tema a interior del IDU.
114	Para EAAB-Red Matriz, se solicita visita técnica de la EAAB en la Avenida Ciudad de Villavicencio con calle 65 sur (se requiere verificar dirección) teniendo en cuenta que se presentan empozamientos posiblemente por causa de las redes, y este corredor vial fue intervenido hace poco mediante contrato de conservación IDU.	EAAB – Red Matriz	Normal	Pendiente
115	Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	EAAB - Zona 2	Normal	**Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras** informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público.
116	Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	Normal	**En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño:** Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
117	Para VANTI, en el frente de trabajo que colinda con el Colegio Gran Colombiano localizado aproximadamente en la carrera 79B con calle 73A Sur, se observó tubería galvanizada de 12", por lo cual se ha solicitado realizar apiques para que la ESP verifique el estado de la red y con sus recomendaciones se puedan evitar daños sobre la tubería. No obstante, no se ha recibido respuesta. Así las cosas, a través del comité se solicita apoyo a esta ESP para que puedan prestar apoyo y coordinación sobre las actividades que se desarrollan en este sector de la ciudad.	VANTI GAS NATURAL	Normal	Pendiente
119	Para Claro, se solicita instalar tapas faltantes sobre el sector de la Av. Caracas No. 5-12 y Av. Caracas No. 5-58, barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe.	CLARO	Alta	**Acta 22 - ENEL – Mauricio Arenas:** Se informa que, realizadas las visitas correspondientes, las cámaras pertenecen a empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. El 24/06/2024, ETB verificó mediante visita y se informa que no son parte de su infraestructura. **Acta 23 - IDU - William Fernando Chávez:** Se emitió respuesta parcial al peticionario con base en las visitas realizadas por ENEL y ETB, en las cuales se confirma que no son parte de su infraestructura. A su vez, se remitió copia a las ESP de telecomunicaciones (Claro, Movistar, Tigo) y Secretaría Distrital de Movilidad para que se valide la propiedad de dicha infraestructura. **Acta 24 - Intervención CLARO – Nicolás Andrade Duque:** Ya se validó en campo, y la cámara doble es de Claro, la otra sencilla no se está seguro de a quién corresponde, pero se pondrán todas las tapas en el segmento. Se informa que las mismas se enviaron a construcción, por lo cual se instalaran la próxima semana, al respecto se comunicará de manera oportuna en el Comité.
121	Para EAAB-Zona 2, se solicita reparación de ciclorruta en el parque El Virrey, toda vez que se presenta hundimiento por posible daño en redes. Ya había sido intervenido este sector por la EAAB.	EAAB - Zona 2	Alta	**Acta 23 - EAAB-Zona 2 – Javier Porras:** Se informa que, de acuerdo con lo informado durante la semana para el tema del Virrey no aplica garantía de contrato de obra, esto teniendo en cuenta que hubo una nueva falla sobre la red. Por tanto, hasta que la división de alcantarillado realice la reparación, se puede hacer restitución del espacio público. Así mismo, se espera que durante esta semana se efectúe la reparación de la red, y por tanto se pueda definir cuándo se ejecutaría la recuperación de la ciclorruta. **Acta 25 - EAAB-Zona 2 – Javier Porras:** Se comunica que el contratista tenía programado ejecutarla en el transcurso de esta semana, hasta el momento se espera confirmación de la actividad, para el próximo comité se ampliará información al respecto. **Acta 26 - EAAB-Zona 2 – Javier Porras:** Durante la semana pasada se hizo remplazo de material granular, el cual estaba bastante saturado, en este momento se encuentra material compactado y listo para instalación de mezcla asfáltica.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
122	Para ETB, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024, donde se requiere certificado de “paz y salvo”.	ETB	Normal	Pendiente
123	Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de “paz y salvo”.	VANTI GAS NATURAL	Normal	Pendiente
124	Para ENEL, se solicita reposición de tapas de cajas de inspección, las cuales fueron reportadas a la ESP mediante consecutivo 657851 del 23 de noviembre de 2023	ENEL COLOMBIA	Alta	**Acta 23 - ENEL – Jorge Mauricio Arenas:** Se toma nota del número de radicado y se verificará internamente, ya que la reposición de tapas es un tema de atención urgente por la generación de posibles accidentes. Se remite vía chat información de contacto para comunicarse directamente con profesional del Fondo de Desarrollo Local.
126	Para Secretaría Distrital de Ambiente, se solicitó concepto técnico de silvicultura, en donde se informó por parte del profesional que realizó la visita técnica, que el documento de respuesta ya se encontraba en revisión jurídica, no obstante, a la fecha no se ha obtenido pronunciamiento. Al respecto se solicita colaboración, toda vez que el contrato sobre el cual se realizó la visita técnica ya lleva 1 año suspendido. Se remite vía correo electrónico trazabilidad documental (comunicaciones) entre entidades.	SDA	Normal	Pendiente
127	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una solicitud en la calle 162 entre carrera 54 y 55, donde se evidencia un posible daño de redes, se solicita realizar visita conjunta.	EAAB - Zona 1	Normal	Pendiente
128	Para ETB, se solicita atender caso presentado por Alcaldía Mayor sobre el sector de la carrera 7 entre calles 61 y 62 (costado oriental) donde se observan pozos sin tapa, generando alto riesgo para transeúntes.	ETB	Alta	**Acta 23 - Respuesta ETB – Benjamín Ochoa:** Se informa que respecto al caso 128, si corresponden a cámaras de ETB, se procedió a realizar reporte a la Gerencia de Servicios Masivos para que se efectúe la correspondiente reposición, así mismo se remita registro fotográfico para evidenciar el cumplimiento de la actividad.
129	Para IDU, se han realizado dos solicitudes respecto a las actividades que puede desarrollar el FDL en puentes vehiculares como peatonales que se encuentran sobre cuerpos de agua, esto teniendo en cuenta que, dentro de las metas del plan de desarrollo, se deben atender 500 m² de esta infraestructura. Se agradece la pronta respuesta del IDU (último radicado 20246220016871 del 23 de enero), teniendo en cuenta que en el FDL se cuentan con recursos limitados, y no se tiene personal especializado para emitir dictámenes sobre este tipo de infraestructura.	IDU	Normal	Pendiente
130	Para IDU, se tiene algunas dudas sobre la intervención de segmentos que la comunidad solicita atender, pero que cuentan con reserva por parte de otra entidad, en este caso el SDM, donde	IDU	Normal	**Acta 24 - Intervención IDU – Ing. Jaime Augusto Bermúdez:** El tema de reservas efectivamente se maneja al interior del IDU, por lo cual desde la OCIT se podría gestionar

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
	se programó parqueo en vía, al respecto ¿Hay alguna directriz o lineamiento sobre las actividades que podría llegar a realizar el FDL?, en algún momento SDM indicó al IDU que no se levantarían esas reservas pero que se podrían realizar intervenciones frente a mejoramiento de infraestructura, por lo anterior se solicita conocer si hay alguna orientación en este sentido.			una reunión entre la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación y los delegados de la Alcaldía Local para aclarar las situaciones donde se tengan inquietudes. Por lo anterior, se solicita remitir información de contacto para buscar un espacio y realizar mesa de trabajo.
132	Para IDU, se tienen algunas inquietudes respecto al Decreto 625 de 2023 – "Por medio del cual se reglamenta el artículo 132 del Decreto Distrital 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C." y se dictan otras disposiciones", ya que en su artículo 13 se manifiesta que mediante nuevo acto administrativo se adoptarán los manuales e instructivos que se estimen pertinentes, por lo cual, se requiere este documento para iniciar programación de mantenimiento de andenes en la localidad.	IDU	Normal	Pendiente
134	Para EAAB, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, hay unas cajas en algunos tramos donde se está ejecutando que requieren intervención, por lo cual se solicita acompañamiento técnico de la ESP, al momento se ha intentado realizar contacto con el Ingeniero Mauricio Mahecha sin que se haya logrado gestionar, se han programado visitas sin llegar a realizarse.	EAAB - Zona 1	Normal	Pendiente
135	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	MOVISTAR	Normal	Pendiente
136	Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.	EAAB - Zona 2	Alta	Pendiente
137	Para EAAB-Zona 3, se reporta en la carrera 13A N°. 23-81 socavación en la vía, falla de la carpeta asfáltica y estructura de soporte, debido a posible fallo de colector de aguas residuales, se evidencia perdida de material en dicha estructura.	EAAB - Zona 3	Alta	**UAERMV - Humberto Ramírez - Sesión 25:** Para EAAB-Zona 3, se solicita atención de la carrera 13A con calle 23, se relaciona con requerimiento ciudadano para atender hueco generado sobre calzada, una vez realizada la visita se colige que puede relacionarse con atención de fallo sobre redes de alcantarillado, por lo cual se verificó y al parecer EAAB intervino, no obstante, aún se requiere recuperación de calzada.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
138	Para EAAB-Zona 1, se presenta socavación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 12, costado sur, en el área aferente se observa pozo del sistema de alcantarillado, es posible que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, la debida atención de la EAAB.	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente
139	Para EAAB-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localiza en la calle 22 con carrera 14 (Avenida Caracas), en donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por socavación, se solicita visita de campo de la EAAB para verificar, y para que con el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad vial en el sector.	EAAB - Zona 3	Alta	Pendiente
140	Para EAAB-Zona 1, respecto de la reparación realizada por la EAAB en la calle 134 con carrera 19, se realizó reparación de red sanitaria, no obstante, aún se requiere recuperación de espacio público, se solicita la debida gestión.	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente
142	Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.	VANTI GAS NATURAL	Normal	**Acta 26: Alexandra Rojas** solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.
143	Para EAAB-Zona 3, se solicita apoyo para adecuación de collarín de cobre en el CIV 16004474, del barrio San Francisco. Así mismo, se aclara que el Ingeniero Francisco siempre ha sido muy presto en apoyar y atender a los llamados del Fondo de Desarrollo Local.	EAAB - Zona 3	Normal	Pendiente
144	Para ENEL, se reporta tapa faltante en la KR 7 con CL 41, se solicita reposición por generar un alto riesgo de accidente para transeúntes y vehículos.	ENEL COLOMBIA	Alta	**Respuesta ENEL – Mauricio Arenas en sesión 26:** Respecto del caso de la calle 41, se informa que fue reportado a unidad operativa, y se están realizando las gestiones pertinentes para adelantar reposición de tapa.
145	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender hundimiento reportado en la AC 3 frente a placa 51A-10.	EAAB - Zona 3	Alta	Pendiente
146	Para EAAB-red matriz, se reporta daño en la carrera 70C (Avenida Ciudad de Villavicencio) con calle 63 sur, se solicita verificar estado de redes.	EAAB – Red Matriz	Alta	Pendiente
147	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	EAAB - Zona 3	Alta	Pendiente

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
-Casos presentados	147	**100,00%**
-Casos resueltos al corte	77	**52,38%**
-Casos pendientes al corte	70	**47,62%**

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver tres (03) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 32, 86 y 141, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver tres (03) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 32, 86 y 141, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.	

Icono	Decisión
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente ENEL, IDU, EAAB.	

8 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 25 de julio de 2024
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 25 de julio de 2024
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 25 de julio de 2024

9 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número veintiséis **(26)** del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 25-julio de 2024 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,

JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
PRESIDENTE

PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba– SDP.
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
William Fernando Chávez – IDU.
Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 26 de 2024.
2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 26 de 2024.

Subserie 2131-2.14

Comité Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. - 2024

N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO

Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Número de casos registrados por mes

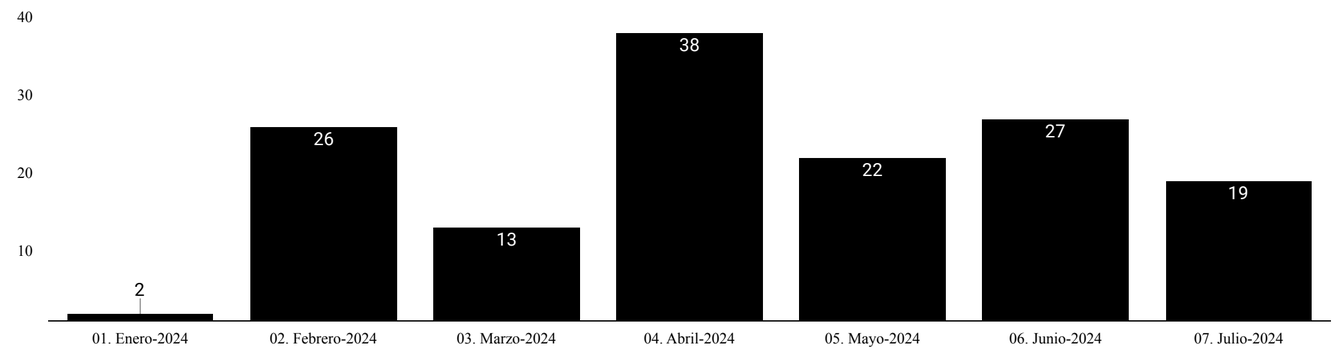

Casos registrados

147

Número de casos resueltos por mes

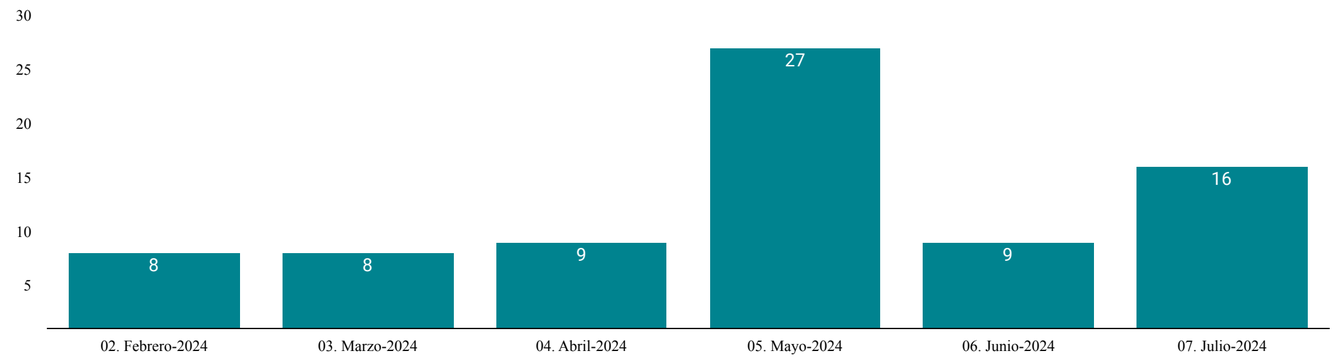

N°. Casos Resueltos

77

Número de casos pendientes por mes

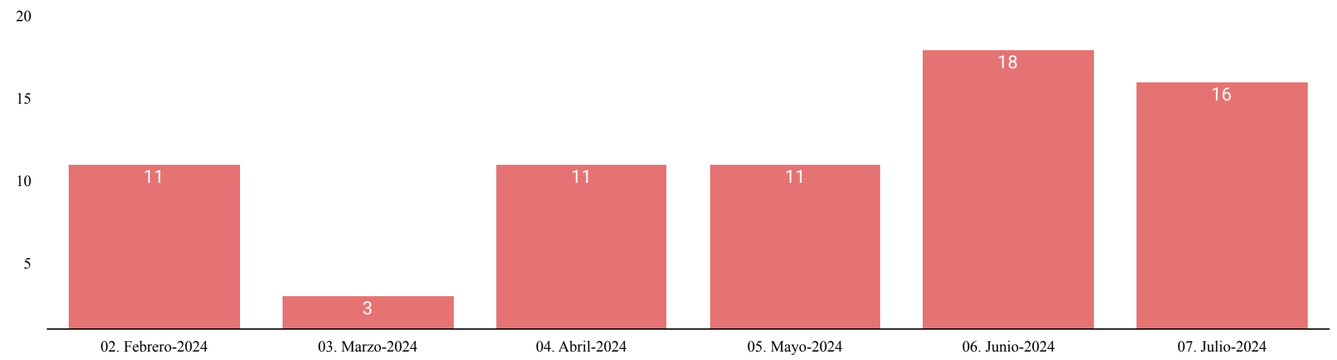

N°. Casos Pendientes

70

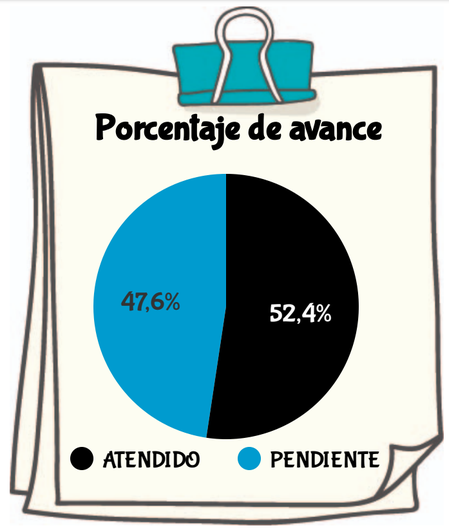

Recuento de casos

N°. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2…	Para ENEL, se solicita que se revis…	ENEL COLOMBIA	Alta	ATENDIDO
2	01. Enero-2…	Para EAAB – Zona 5, respecto de …	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
3	02. Febrero-…	Se informa sobre las afectaciones …	IDU	Normal	ATENDIDO
4	02. Febrero-…	Para la EAAB – Red Matriz, se ex…	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-…	Para la EAAB, en la CL 28 con K…	IDU	Alta	PENDIENTE
6	02. Febrero-…	Para el IDU, solicita reunión para t…	IDU	Normal	PENDIENTE
7	02. Febrero-…	Para EAAB – Zona 5, En Carrera …	EAAB - Zona 5	Normal	ATENDIDO
8	02. Febrero-…	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 …	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
9	02. Febrero-…	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 …	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
10	02. Febrero-…	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo…	EAAB - Zona 4	Normal	ATENDIDO
11	02. Febrero-…	Para ENEL, en la calle 13 por Carr…	ENEL COLOMBIA	Normal	PENDIENTE
12	02. Febrero-…	Para EAAB – Zona 5, respecto de …	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
13	02. Febrero-…	Para Alcaldía de Puente Aranda, se…	Alcaldía Puente Aranda	Normal	ATENDIDO
14	02. Febrero-…	Se solicita realizar revisión con un…	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
15	02. Febrero-…	Para ETB, en la calle 47 con carrer…	ETB	Alta	ATENDIDO
16	02. Febrero-…	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero…	EAAB - Zona 3	Normal	ATENDIDO

1 - 100 / 147

TOP – Entidades más casos asignados

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	28
2.	IDU	17
3.	EAAB - Zona 1	14
	Total	**146**

1 - 20 / 20

TOP – Entidades con casos resueltos

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	17
2.	EAAB - Zona 4	9
3.	EAAB - Zona 2	8
	Total	**76**

1 - 17 / 17

TOP – Entidades con casos pendientes

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	IDU	13
2.	ENEL COLOMBIA	11
3.	EAAB - Zona 1	8
	Total	**70**

1 - 14 / 14

Casos:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB

COMPROMISOS ASIGNADOS
62

COMPROMISOS ATENDIDOS
34

Número de casos registrados por mes

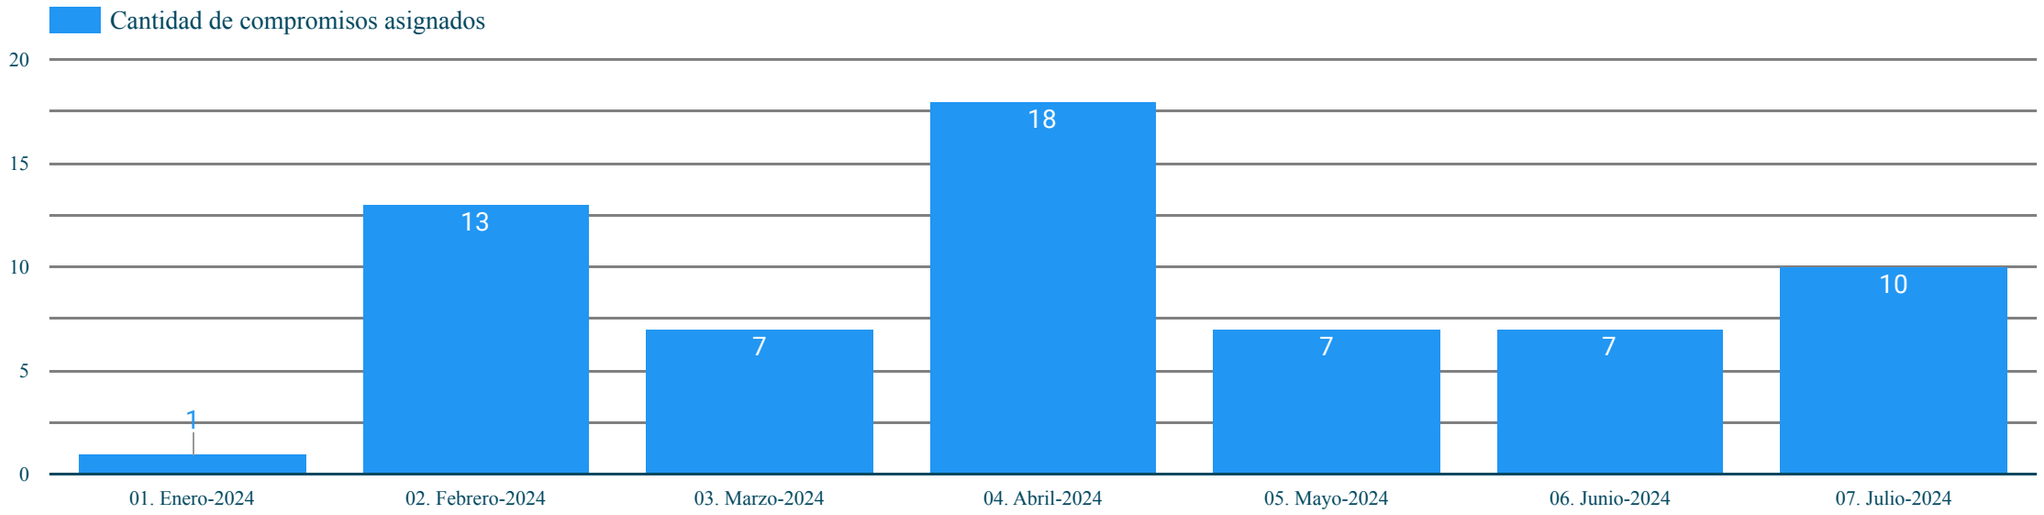

Número de casos por zona o área pendientes

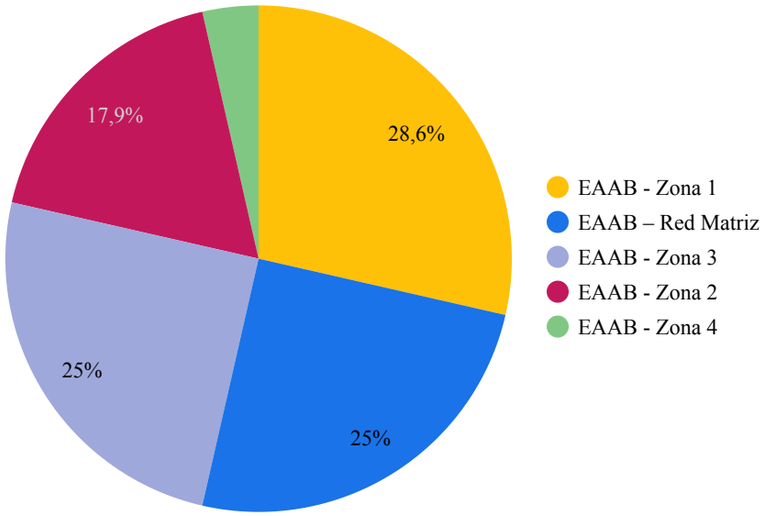

ESTADO DEL...	N°. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.
ATENDIDO	18	Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?
ATENDIDO	106	Para EAAB – Zona 2, sobre la calle 85 con carrera 15 se solicita recuperación de espacio público.
ATENDIDO	58	Para Zona 4 EAAB, en la calle 30B Sur con carrera 9C Este - Barrio Ramajal, la UMV intervino esta vía, la profundidad máxima de excavación fueron 23 cm. Se están presentado filtraciones en la red de alcantarillado de la EAAB, a la fecha fueron funcionarios a hacer la inspección y manifestaron que el Ingeniero Vega debe autorizar el CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la

Casos:
Enel Colombia SA ESP

COMPROMISOS ASIGNADOS
28

COMPROMISOS ATENDIDOS
17

Número de casos registrados por mes

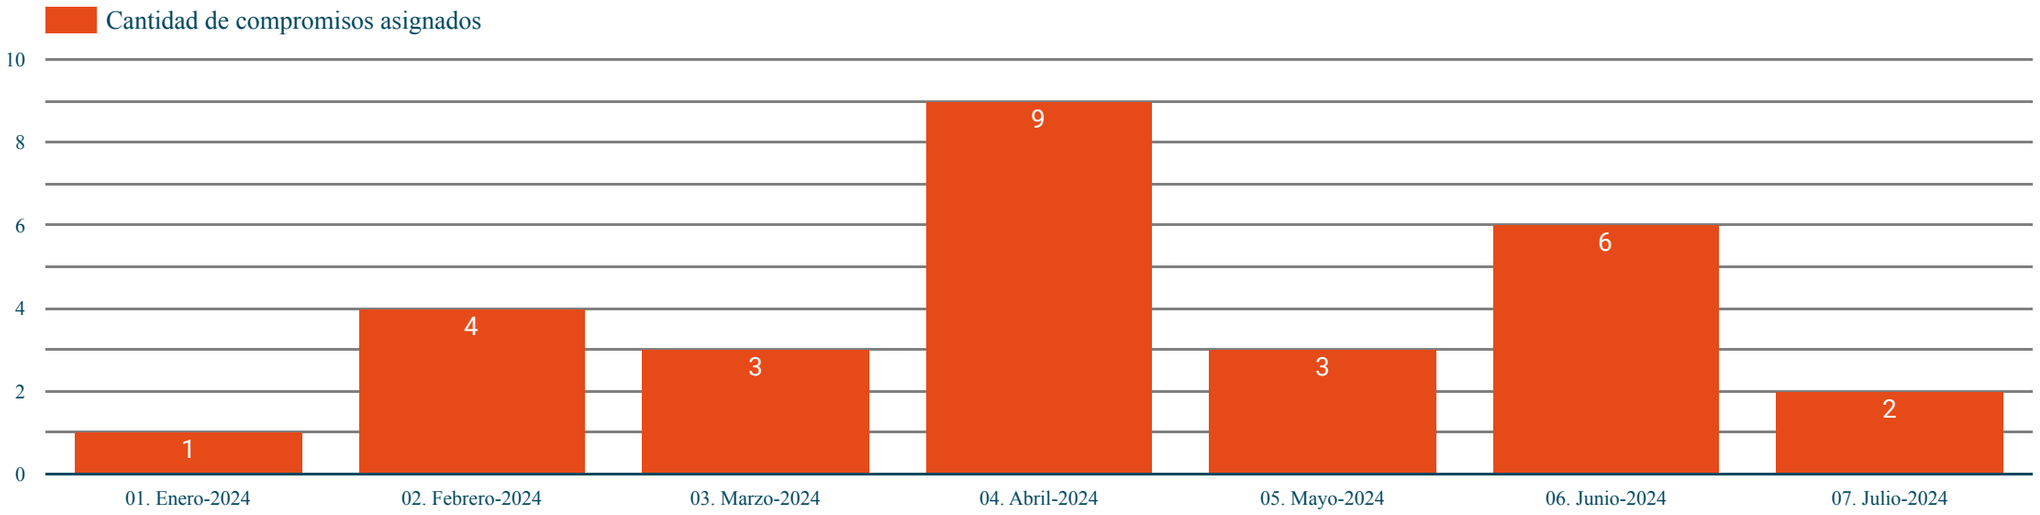

ESTADO DEL CASO ▲	N°. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	109	Para ENEL, se solicita respuesta de la petición remitida respecto del contrato 1-0125400-1090 de 2021 de ENEL, teniendo en cuenta que aún no se ha emitido pronunciamiento, el radicado de la comunicación es 611211756.
ATENDIDO	99	Para ENEL Colombia, mediante radicado 611181811 del 23 de mayo, se solicitó gestión respecto de la comunicación que se recibió para traslado de infraestructura (postes y caja) que pertenece a los activos de esta empresa, que se encuentran ubicados sobre la calzada con movilidad restringida del sector Mariscal Sucre (CIV 2001977 y 2001969). Si bien inicialmente se recibió respuesta donde se indicó que debía radicar la documentación de acuerdo con procedimiento para asumir los costos del traslado de este poste (radicado N°. 000731057 del 05 de marzo de 2024, bajo oficio 0000816096), se requiere visita técnica con delegado asignado por ESP a este contrato de obra, ya que se requiere puntualizar temas de campo para continuar con procedimiento mencionado. Lo anterior, a pesar de las condiciones actuales de la infraestructura propia de la empresa que no cumple con la normativa.
ATENDIDO	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de “paz y salvo” para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.
ATENDIDO	34	El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado “diseño local”, se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continua o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicite indicar a IDU levantamiento de la reserva

Casos:
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

COMPROMISOS ASIGNADOS
17

COMPROMISOS ATENDIDOS
4

Número de casos registrados por mes

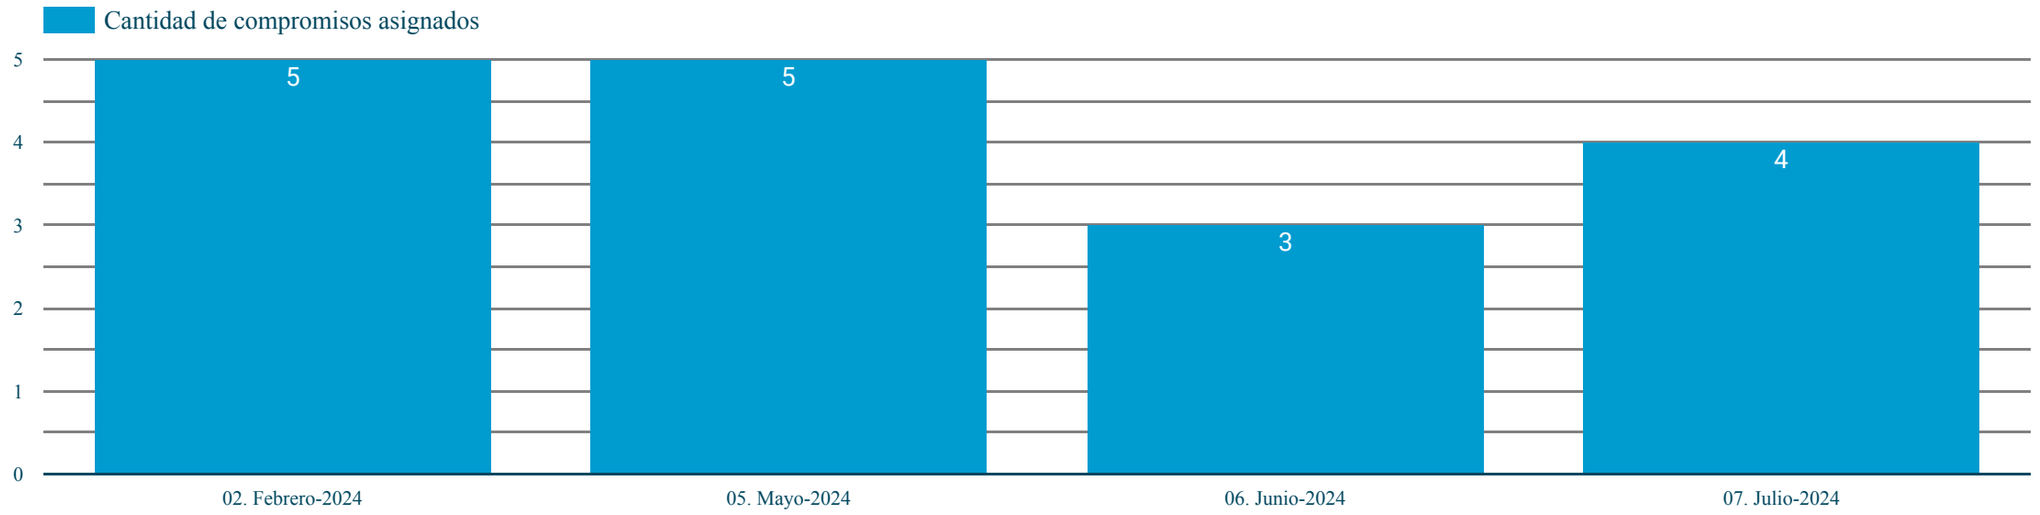

ESTADO DEL CASO ▲	N°. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.
ATENDIDO	118	Para IDU, se informa que el FDL-Kennedy ha firmado convenio interadministrativo con el IDU (Convenio 1459), actualmente los contratos derivados se están manejando desde dicha Entidad, por parte del Ingeniero Oscar Hoyos. Se precisa que es un convenio donde se va a mejorar los paseos comerciales de la fase uno y dos de la localidad de Kennedy, con una inversión por parte del FDL de aproximadamente 8mil millones de pesos y del IDU de 9mil millones de pesos. En cuanto a los estudio y diseños, se solicita conocer su estado, y cuál es el motivo de que no cuente con aprobación hasta el momento, teniendo en cuenta que ya se subsanaron por parte del IDU hacia la EAAB. El 22 de marzo de 2024 se realizó una mesa de trabajo en la cual la EAAB ESP presentó nuevas observaciones a la versión 5 del producto y anunció la emisión del concepto por escrito para la semana siguiente (del 25 al 29 de marzo), sin embargo, el IDU aún no ha recibo dicha comunicación a la fecha, y por otro lado el 17 de abril de 2024 mediante el comunicado con radicado IDU 20242360053266l, el IDU reiteró a la EAAB a la necesidad de contar con el concepto de la revisión del producto.

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	**1**	Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 92, se presenta un desnivel importante respecto a la rasante de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se señala que este tema fue llevado a la Mesa Distrital de Monitoreo, y allí no se obtuvo respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que emita respuesta y realice las gestiones pertinentes para solucionar este caso.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**11 - Abril 4 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EqOeU-JGJblDsK4Sigvb4Z0BD4fIJINqk7aIns0Zthostw?e=juECGF	Pendiente desde 2023 **ENEL - Mauricio Arenas informa en sesión 10:** En lo relacionado a las cámaras de la NQS, se está a la espera todavía que se expida el permiso por parte de secretaría de movilidad, pero igual hasta el momento, el cronograma sigue considerado para darle inicio a las obras, el 27 de marzo de 2024.	**04. Abril-2024**
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	**2**	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	**ATENDIDO**	**08 - Marzo 07 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EjLrzLk6vwpNvmlbN_7CtEMBsEuIRI_ZJU6LBnbcyFadRg?e=bfbltb	**Ingeniero Javier Patiño informa en sesión 08:** Se efectuó inspección de CCTV en el sector, no se encontraron problemas estructurales en redes, por lo cual, se concluye que se encuentran trabajando en condiciones normales. Por lo tanto, se descarta hundimiento producto del sistema de alcantarillado. Por lo cual, se recomienda que se programe una intervención por parte de otra Entidad, como Alcaldía o UAERMV, se dejará video de CCTV a su disposición.	**03. Marzo-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**3**	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.	IDU	Jaime Bermudez	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eiwx9MQQnYVHqB4syZfzs78BSgvAg7AJUuAMS162XOQetg?e=KIqJ87	**Alvaro Reinoso en sesión 3 informa:** En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en cuales obras y que daños se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para darle respuesta **Carmen Rocío López en sesión 3 indica:** Se hace la aclaración respecto al tema del oficio sobre los daños expuestos en el comité pasado, refiriéndose que la observación no era únicamente para el IDU sino a nivel general para todas las entidades que realizan	**07. Julio-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**4**	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz "Silencio – Casablanca" de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EjkqwTnHyf9CvP6OqhAoX6UBd5rkU66v1YhZzPlq81VbZQ?e=0YTesM	**IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6:** Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**5**	Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedo sin reparar. Se solicita pronta actuación.	IDU	Onisalba Segura	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EiGKHLixbktNqsNQsUoXrf8BYvkeJ9y0hzH3Dzzg9JJhUw?e=FsGaIN	**Acta 04-2024:** EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Así mismo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**6**	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	IDU	Álvaro Reinoso	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Es1ar3T7LZZCuGSU1yVuXnQBk1FL45maJvr6Gd5bkiPkSq?e=XzX5zJ	**Acta 04-2024:** EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez. **Acta 5-2024:** Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**7**	Para EAAB – Zona 5, En Carrera 79 (Av Primero de Mayo) por Calle 53 sur CIV 8008450, pozo de la EAAB con daño en el mismo y convertido en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	**ATENDIDO**	**07 - Febrero 29 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ehm4PfKeiBVHkTwyOQDeEHkBqRbQRyi6BvDendUOQOk4aA?e=zKICql	**Acta 6 - 2024 - Respuesta EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: Para el caso 7 de la Avenida Primero de Mayo, se efectuó la verificación en terreno y se observó personal de ETB trabajando, se solicita hacer el respectivo direccionamiento a esta Entidad.**	**02. Febrero-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**8**	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 por Carrera 55D, se observa hueco en pavimento al parecer originado en daños y/o filtraciones que presenta la infraestructura de la ESP; registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**ATENDIDO**	**17 - Mayo 16 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoWShS9yi4NMuDKn_-S-3tYBXxpGP4STysqlQnDU86D5dq?e=BV110e	**EAAB Zona 1 reportó mediante el chat de WhatsApp atención del caso 08, por lo cual se da cierre en sesión 17.**	**05. Mayo-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**9**	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 entre calles 135C y 138 hubo intervención de la EAAB encontrándose pendiente la recuperación de la carpeta asfáltica; registro fotográfico enviado al chat el lunes 5 de febrero.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**ATENDIDO**	**07 - Febrero 29 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Evtf-sWABaJKnoTxqd2bAD0BGHIjBAo8ev9hxUdV4e8-pQ?e=xlebu3	Se informa atendido.	**02. Febrero-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**10**	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	**ATENDIDO**	**07 - Febrero 29 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eqce7NcUbEBHotJylUMQanQB3r94QsRIYMFoFUT5a9ZlbQ?e=qbxfiH	**Pendiente, IDU informa:** Que el ingeniero Juan Carlos López remitió registro fotográfico donde se realizó atención de la situación presentada sobre la vía Poporo Quimbaya. EAAB solicita apoyo a la UAERMV para que se efectúe recuperación de pavimento. **UAERMV - Humberto Ramírez** indica en sesión 6: Se expone cronología y se realiza una serie de comentarios en torno a la situación que se presentó en el sector, actualmente la UAERMV se encuentra efectuando las evaluaciones correspondientes para definir si se realiza la recuperación del pavimento. **UAERMV - Humberto Ramírez indica** en sesión 7: Se informa que la UAERMV apoyo a la EAAB en la Avenida Quimbaya, y gracias a la gestión de la Gerencia de Intervención, se	**02. Febrero-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**11**	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtYedx9pYmhPiLQx557j87MBFvn0M4j9X618tCqWV3KhtA?e=98GYf8	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**12**	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	**ATENDIDO**	**15 - Mayo 02 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ek6p0VA-poVKqOBWYXoYWocB8-VVLzErmld0qqlPhJ8J_Q?e=HDQWwJ	El pasado lunes 4 de marzo, se realizó la inspección de CCTV (Aviso 2001385418) solicitada a través del contrato 1492-2023 solicitado de la Calle 41 Bis Sur desde la transversal 74 C hasta la Transversal 74 Bis A encontrando la tubería de 10" en gres estado Ok sin presencia de infiltración de material, únicamente una domiciliaria intrusiva a los 13 metros del pozo intermedio del tramo indicado en el esquema anexado por el Ing. Ferney. Esto nos concluye que las socavaciones que se ven sobre la vía NO son debidas a la red de alcantarillado. Por otro lado, (aviso 2001284984) la inspección de la Calle 41 B Sur frente al número 74-	**05. Mayo-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**13**	Para Alcaldía de Puente Aranda, se encontró afectación de la infraestructura de ETB en la Avenida Calle 6 entre las carreras 32 y 40, costado norte, se observa en el sector canalizaciones afectadas, hay obras, pero no tienen valla. Se solicita contactar con el fondo de desarrollo local para conocer el número del contrato que generó los daños.	Alcaldía Puente Aranda	Delegado	**ATENDIDO**	**05 - Febrero 15 de 2024**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ej4mJh11_EhAqT9rOWHIGWUBygrut5nixiqN2mkGu_irrQ?e=xUvzGH	**Acta 04-2024:** IDU indica que se remitió situación vía correo electrónico a delegados de la Alcaldía de Puente Aranda de acuerdo con base de datos de la vigencia 2023 **Acta 05-2024:** Se solicita dar cierre, toda vez que no hay delegado en la instancia por parte de SDG y que ETB realizará la gestión directamente con la Alcaldía Local.	**02. Febrero-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**14**	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EuKUTrxYOUVOj3mWt4y3us4Bhv0llq_H7haMYDLhMwQYBw?e=YScRKz	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**15**	Para ETB, en la calle 47 con carrera 7 se reporta faltante de tapa, lo cual puede generar accidentes.	ETB	Carmen Rocío López	**ATENDIDO**	**05 - Febrero 15 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EkJ7bXRizytPq_vZSPFOh7IBqqFXvJPpt84O8x6kGTD_tQ?e=6QrN5b	Se informa atendido, se remitió registro fotográfico vía chat.	**02. Febrero-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**16**	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero Joan Rivera indica que en la Avenida Caracas con Calle 3 Sur, se solicita apoyo de la UAERMV para recuperación del sector intervenido por la ESP. Por lo cual, se solicita a la EAAB lo siguiente: tramitar la liberación de la reserva que tiene el fondo de desarrollo local de Antonio Nariño, y tramitar el PMT.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	**ATENDIDO**	**06 - Febrero 22 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EkJ7bXRizytPq_vZSPFOh7IBqqFXvJPpt84O8x6kGTD_tQ?e=6QrN5b	**UAERMV - Humberto Ramírez** informa que se había recibido solicitud de Joan Rivera de la EAAB, para recuperar espacio público a raíz de una emergencia, la UAERMV solicitó levantamiento de reserva y PMT aprobado, pero verificado en sitio, se observa que el tramo ya fue pavimentado.	**02. Febrero-2024**

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**17**	Para EAAB – Zona 2, en la calle 80 con Avenida Ciudad de Cali, se presentó daño en calzada de Transmilenio, el ingeniero Diego Montero – Gerente del Sistema Maestro solicita apoyo para recuperación de la calzada. Por lo anterior, se solicita a la EAAB: se trámite permiso con Transmilenio, y PMT.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**ATENDIDO**	**15 - Mayo 02 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/ElOMrpzYtmZLjRnhvEuNZFMBDhTKGuX32xwqTCEQNy3E5w?e=uEvAdb	La calzada fue recuperada el lunes 12 de febrero de 2024 a través del contrato de Recuperación de Espacio Público de la Zona 2. Esta información se compartió en el chat del Comité el día 15 de febrero de 2024.	**05. Mayo-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**18**	Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	**ATENDIDO**	**08 - Marzo 07 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eu8TjqDbaypPmq0Y476IlpYBs3EqRL-OqHfQrT0wrrPsYQ?e=NJEBV8	Atendido por Ingeniero Francisco Rodríguez	**03. Marzo-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**19**	Para EAAB-Zona 1, en la Carrera 58 entre Calle 127 y Calle 127d se realizaron intervenciones por emergencias, en la cual se presentó afectación de redes de ENEL, quién actualmente está pendiente por atender reparación, no obstante, apenas se realice dicha actividad, se solicita a EAAB realizar la recuperación del espacio público.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**ATENDIDO**	**18 - Mayo 23 de 2024**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtZjqR3SDlpljYkYZC8550IBwa2ib8OwTwplDtLuUT0CWw?e=HRrKPz	**Respuesta ENEL – Mauricio Arenas en sesión 09:** Se informa que el contrato llegó el lunes al medio día a ENEL, fue revisado por el área jurídica y hoy se remitirán comentarios al respecto a la EAAB, no obstante, se informa que ayer se mantuvo comunicación con el Gerente de Servicio al Cliente y con Mauricio Reina del IDU, y hay un compromiso de pago y de cumplimiento de la obligación, entonces hoy se dio la orden de iniciar las obras, entonces ya se encuentran trabajando. **En sesión 10 informa:** Con respecto a la calle 127, las obras empezaron desde la semana pasada, las obras deberían estar terminando el 22 o 23 de marzo, no obstante, debe tenerse en cuenta el estado del clima, ya que ayer las lluvias generaron algunos retrasos en las actividades programadas.	**05. Mayo-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**20**	Para UNE-Tigo, se reportó en la Avenida Ciudad de Cali entre Avenida Calle 26 y Avenida La Esperanza, caja de ESP que se encontraba en mal estado. Por lo cual, se hizo requerimiento de manera interna.	TIGO	Delegado	**ATENDIDO**	**06 - Febrero 22 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Et-okbH79wtHtndTSLc8BDQBDDQajGzFG4KNJxMmhR4J_A?e=HBVTl8	**Alvaro Reinoso informa:** Ellos atendieron la solicitud, esta situación se encuentra superada.	**02. Febrero-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**21**	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtilVlTFVMNNvWXC8FxO9XEBLxRVjxBTDuLS65HprCt84Q?e=pKAZ9v	**Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6:** Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**22**	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtkA2Ef7z9hHnSh_IMm_vw8B_DQYQHX_JdvAOj4iVw1WuQ?e=eLTA2h	**ENEL – Mauricio Arenas en acta 06:** Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**23**	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado.	IDU	Angélica Tatiana López Higuera	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eq_Wxb_tl85LnVNWZmW4glcByiLdiXzR9bvcVqUiiB0s9Q?e=ULonSP	**Intervención IDU – Angélica López en acta 06:** Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**24**	Para EAAB-Red matriz, se solicita adecuada recuperación de pavimento sobre la Avenida Boyacá con Calle 72, ya que se pueden presentar accidentes.	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	**ATENDIDO**	**07 - Febrero 29 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EqR2hSCM0gtljnLMSz8ziS8Bl9SXrtBZP43crzWMgQZFJg?e=Qnz3Q7	**se indica que el 28 de febrero se remitió registro fotográfico de la recuperación del pavimento de este sector, por lo cual, se reporta en la mesa de trabajo como parte de las acciones de coordinación con las empresas de servicio público.**	**02. Febrero-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**25**	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvwQxDsPw6VLqd0UZ5f0t5UBJmEFaVs4TdC330XAPpO0jQ?e=v5h9wl	**Pendiente**	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**26**	Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	Onisalba Segura	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EukkvJHf-FlFpP_gBYPn-Z8BCbQkQSBqOVsWnPq_qLSFiw?e=PQC1Xk	**Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07:** Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como desvío la misma Avenida y que en ese sentido los huecos, posiblemente se han generado por esos desvíos sin que sean exactamente intervenciones como tal para las obras que se adelantan.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**27**	Para ENEL, se reporta por parte del concejal Edison Julián Forero que en la Calle 13 con Avenida Boyacá, bajando el puente, sentido occidente-oriente, se encuentra socavación red empresa de servicios públicos, la EAAB red matriz indicó que la no pertenece a la EAAB, se observa cámara abandonada con ductos para canalización.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoEe3O2zqmBGqlM1Iglte3sBlRTPO9J8r9ootVFDXxj9XA?e=TuJLez	**Sesión 09 - ENEL – Mauricio Arenas: En relación con el caso 27 se efectuó levantamiento, efectivamente se encuentran dos cámaras, una es de ENEL, le hace falta la tapa y se espera que hoy se esté reponiendo. Así mismo, se evidencia hueco que se formo en el área por la remoción del terreno, se solicita hacer visita conjunta con IDU, para programar las acciones que se deban tomar.**	**07. Julio-2024**
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	**28**	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur [illegible] (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10” a 16”, y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.	MOVISTAR	Jolgilio Augusto Peña	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ejujin5xqiBLpXKWoqMd6rYBBlqRzQjdG8x7rOfby4TreA?e=yFiwcM	Pendiente	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**29**	Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EnwplBfYnq1Noe2STcXAjSsBwWCoqpd8l2m_8TtMJ7KWaQ?e=LjX7va	Pendiente	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**30**	Para EAAB-Zona 4, se presenta en la calle 30B Sur entre carrera 9C Este y carrera 11 Este, CIV 4004491, hace dos días hubo una lluvia muy fuerte y es posible que un colector se tapara, la UAERMV esta adelantando actividades en el sector, pero por la cantidad de lluvia que ha caído, ha sido imposible. Por lo tanto, se solicita la presencia de la EAAB para que se preste su ayuda con la limpieza de las redes, y se verifique si existe algún daño para que la UAERMV pueda seguir interviniendo.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	**ATENDIDO**	**09 - Marzo 14 de 2024**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpmhnBMLTUtAqth_OCf5vq8BBnzu_3Czs5AA8lPHBgqD9w?e=5lnCB1	**Atendido por el Ingeniero Juan Carlos Lopez - Zona 4 - EAAB**	**03. Marzo-2024**
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**31**	Para ENEL, respecto del contrato FDLCH 263 de 2023, el contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la mitad de la calzada, en el sector Mariscal Sucre, teniendo en cuenta que el límite de la intervención corresponde a los CIV 2001977 y 2001969, los cuales fueron comunicados mediante radicado 138 de 2024 (consecutivo de la interventoría OFC-COP-263-02T-138-2024), por lo cual se requiere comunicación y colaboración de ENEL.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**10 - Marzo 21 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ej6UToYHsnZJl5LPWrdverqBpb9_MJr3ZGRqe1hBuwHV5Q?e=Pz4qUt	**Ya se emitió respuesta por parte de ENEL, se espera respuesta y gestión por parte del contratista del fondo de desarrollo local. Se generó la oferta para traslado de postes, una vez se realice el pago se programa la maniobra.** **Observación FDL-23 de mayo de 2024:** PENDIENTE RESPUESTA OFC-COP-263-02T-260-2024, radicado 611181811 del 23/05/2024 - Solicitud de verificacion en campo TRASLADO DE POSTE - ACTIVO QUE PERTENECE A ENEL CODENSA UBICADO EN LA CALZADA CON MOVILIDAD RESTRINGIDA. En espera de respuesta del delegado para la asistencia tecnica; para lo cual, Interventoria requiere mediante correo electronico [illegible]	**03. Marzo-2024**
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**32**	Se indica que respecto del contrato 263 de 2023, que tiene que ver con alumbrado público, ya se envió inventario a la UAESP, donde se generó la identificación de puntos donde posiblemente se requieran luminarias por expansión para que esta Entidad pueda efectuar los recorridos y validaciones correspondientes, y se verifique si hay necesidad de instalar nuevas luminarias, considerando que el alcance del contrato corresponde a infraestructura vial, pero no a espacio público peatonal.	UAESP	Yira Bolaños	**ATENDIDO**	**26 - Julio 18 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvJWC7jbHmNAgxUjxCMrjFYBCceVRsldRBXZ5eIckVQ4Zw?e=OENrNE	**En sesión 17, Dra Yira Bolaños informa** que se realizó recorrido de verificación del alumbrado público en la zona, arrojando que se esta dando cumplimiento al reglamento técnico. No obstante, si existe afectación del arbolado urbano, por lo cual se identificó que en varios puntos es necesario coordinar con la Secretaría Distrital de Ambiente para autorizar la poda con el operador de aseo Promoambiental. Finalmente, se indica que estaba pendiente por parte de la Alcaldía de Chapinero informar la finalización de las obras, lo descrito en aras de verificar si es necesario hacer algún tipo de modernización. Se requiere informar finalización de obras por parte de la Alcaldía de Chapinero. **Del IDU – William Fernando Chávez:** comparte información de contacto de la Ingeniera	**07. Julio-2024**

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**33**	Para ETB, el contrato FDLCH 142 de 2018 se encuentra en proceso de liquidación, teniendo dentro de su ruta crítica el certificado de "paz y salvo" de esta ESP, para el caso de ETB, se realizó un informe de validación de daños por un valor aproximado de 600 millones de pesos, donde menciona algunas obstrucciones. Algunas obstrucciones fueron atribuibles al contrato 142, sin embargo, la interventoría presentó un informe con soportes y justificación de como estaban las redes existentes al momento de iniciar la intervención, y cuales fueron los lineamientos de los profesionales de ETB, la información se radicó y socializó ayer con el Ingeniero Juan Jiménez en la Alcaldía Local, por lo que se solicita que ETB pueda reevaluar prontamente estos costos por concepto de daños.	ETB	Carmen Rocío López	**ATENDIDO**	**10 - Marzo 21 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvaUtYvMdwxNvplaoEKxWk4BKLIVW3nnDfIkyHdEFt_-XQ?e=IgPeeC	**Se informa gestión al respecto, se reunió delegado de ETB e interventoría del contrato de obra, efectuando recorrido sobre segmentos viales intervenidos, se definieron puntos que deben ser reparados.** **Observación FDL-23 de mayo de 2024:** Se realizó coordinaciones en campo para los replanteos aprobados por los profesionales delegados por ETB. Continua el seguimiento de las actividades.	**03. Marzo-2024**
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**34**	El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado "diseño local", se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continua o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicita indicar a IDU levantamiento de la reserva.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**10 - Marzo 21 de 2024**	**4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes.**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvJYd5H2QsRMr8GXs5HdDZQBI5kqYiPccwL0PkJN2Yc-uA?e=8KDoZc	**Mediante radicado IDU 20225262079722 del 28 de noviembre de 2022, se solicitó levantamiento de reserva.**	**03. Marzo-2024**
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**35**	El CIV 1007204, es una esquina donde se intercepta el anterior segmento vial KR 20 con calle 124, respecto del espacio público asociado aparece reserva a cargo de ENEL para desarrollo del proyecto "diseño local", también con reporte del año 2018, se solicita informar estado de la reserva.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**10 - Marzo 21 de 2024**	**4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes.**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmRbNBVPb9xBgl3TsmtLOdABsNm3648NVSwigAAuGiOe9g?e=GTS3bT	**Mediante radicado IDU 20225262079722 del 28 de noviembre de 2022, se solicitó levantamiento de reserva.**	**03. Marzo-2024**
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**36**	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva. **Observación FDL - 26 de mayo:** Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio publico costado norte.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes.**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Evi9hUghKGJFikD9D_Qm_awBpL8xPe-zYlTeeWn5DIGOBw?e=F7rBxY	**Pendiente**	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**37**	Se reportó al Chat el día de hoy 14/03/2024 un caso relacionado con hundimiento en calzada que al parecer tiene su origen en filtraciones o fallos en infraestructura de la EAAB; se ubica en la Calle 63 por Carera 8º. Para el mismo comedidamente se solicita verificación y acciones que se requieran por parte de zona 2.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**ATENDIDO**	**15 - Mayo 02 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtmxkKGe319IjQoTdPcY6poBsQwT7WJvezSeQSgc0I0nkw?e=mFdkwx	**Esta solicitud se atendió con trabajos de reparación de 2 conexiones domiciliarias frente al predio de la Calle 63 No. 9-40 solucionando el problema del hundimiento que se presentaba en el sitio. Estos trabajos se realizaron el día 25 de marzo de 2024.**	**05. Mayo-2024**
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**38**	Se reportó a la EAAB – Zona 4, tapa faltante en pozo de alcantarillado en el sector de la Avenida Caracas con calle 81 sur - Barrio La Andrea – Localidad de Usme.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	**ATENDIDO**	**09 - Marzo 14 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Etk-usclpK9Ku1mYD-iubBkBePPfmHCnryr248ZOYS-_lQ?e=xDYB12	Ingeniero Juan Carlos López informa que se repuso tapa	**03. Marzo-2024**
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**39**	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EkOnikReeiRPlSzzZplFegIB8cXlpeSsYogg6VoCY2jF5Q?e=cU2t2a	**Acta 19, Wilson Porras informa** que se revisó el tema con el equipo de coordinación interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportan al área correspondiente en acueducto o alcantarillado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades Así las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en campo no se ubican de esa manera, sobre la carrera 4 hay 3 nomenclaturas diferentes. Por lo anterior, el caso de la calle 55 como tal no existe, es un cruce de vía entre calle 54 a calle 54B, entonces, haciendo el recorrido con el equipo de alcantarillado, se volvió a	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**40**	Para el contrato de consultoría CON 242 de 2022, se solicita certificado de "paz y salvo" de la empresa de servicio público VANTI, se radicó requerimiento mediante radicado 000716047, se pide pronta respuesta.	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	**ATENDIDO**	**17 - Mayo 16 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvYx0Ehu841OgurAjAf5o90BPdo8vIwii2Mx-nwE0ocuRw?e=b2Jztj	**En sesión 12 - Mario Insuasty** solicita ampliación de la información por parte de la Alcaldía de Santa Fe, ya que no se ha encontrado referencia a radicado 000716047, se solicita información de contacto de funcionario del FDL. **En sesión 17,** se solicita cierre de caso, teniendo en cuenta que desde el FDL no se remitió información para dar seguimiento y gestión.	**05. Mayo-2024**
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	**41**	En la calle 32 por carrera 17, se reporta daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por infiltraciones o por daños en infraestructura de la EAAB-Zona 3, se solicita realizar verificación y realizar reparación correspondiente.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**ATENDIDO**	**15 - Mayo 02 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EksecNFJhV9NnT0Nr_0eQRkBSEx5WDCETyZpfyK1TjHoCA?e=QQtcnt	Se efectuó verificación en el sitio determinando que no existe daño en la infraestructura de redes de la EAAB. Adicionalmente los puntos donde se presenta deterioro de la vía no coinciden con el alineamiento de las redes de alcantarillado existentes allí.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**42**	Se informa que el FDL-Usme tiene en desarrollo el proyecto de construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, contrato 693 de 2023, sobre el mismo se va a expedir la correspondiente licencia, por lo cual se tuvo un contrato de consultoría, ahora bien, se está solicitando la disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado. No obstante, en el año 2022 la EAAB informó que para expedir la disponibilidad requería que se contará con la licencia de construcción, por lo cual se requiere que se confirme esta información o si realmente se requiere es la información correspondiente a la fase de construcción.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	**ATENDIDO**	**20 - Junio 06 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EsUaYGkyu9RHgSnZPRTo56ABt2Ejp-OZJJDZhJfzqLqltg?e=G0oJic	Observación FDL - 26 de mayo: Se tuvo mesa de trabajo con la EAAB Zona 4, donde indicaron que la disponibilidad de cobertura solo aplicaba si el proyecto contaba con licencia de urbanismo, por lo tanto, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, la EAAB presentó lo requerido para realizar el proceso de disponibilidad.	**06. Junio-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**43**	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/En-SbGZieMhCmGxRyxJOZcgBPaJMweALLhR1BbB2PBD0wQ?e=hymSxK	**Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas:** Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días. **Observación FDL - 26 de mayo:** Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**44**	Para EAAB – Zona 4, se presenta situación respecto de vías frente al nuevo Hospital de Usme, en lo referente a red de acueducto y su conexión, ya que por ese sector pasa una red que alimenta a casi 3 localidades. Se ha logrado comunicación con el Ingeniero Cesar Núñez para la revisión de la conexión y realizar los acoples, pero se invita a que se realice visita de campo y se cierre la conexiones para terminar la intervención de este contrato.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	**ATENDIDO**	**20 - Junio 06 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtYOGdYMPyFDi6oVtc_nYFQBvl3sTwzQolBT1D-matsimA?e=eCPnzV	Observación FDL - 26 de mayo: Dentro de la ejecución del contrato 591 de 2021, se realizaron las mesas de trabajo pertinentes con la EAAB, por lo cual se adelantaron todas las acciones pertinentes y a la fecha todo el sistema de suministro de agua se encuentra funcionando sin novedad.	**06. Junio-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**45**	Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comunicó que por el cambio de gobierno no se estarían expidiendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.	SDA	Karen Bejarano	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmCHoOZym_BLpvie-3EDND0Bet5fnjqn2Sfm-qCCnEWPpA?e=ElN4ON	**Observación FDL - 26 de mayo:** Se tramitó en el mes de abril un oficio a la SDA, con el fin de ultimar detalles. Ya se surtieron los temas técnicos y se esta atento a la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**46**	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de "paz y salvo" para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**12 - Abril 11 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ep0OFqDBC9tOpHXl2YKVekUBl_vhJpoJZV3qxZGT2JAGTQ?e=PTcGWW	**ENEL remitió certificación, se encuentra adjunta al acta 11.**	**04. Abril-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**47**	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EuAJ5fzeiMRBqk-9aFZ0QyIBgvC89cDkDtyhy0LO_OWIjg?e=udelJp	**En sesión 21,** se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODENSA, donde se requiere instalación del barraje necesario para la energización del parque en el cual ya se encuentran terminadas las obras requeridas y solicitan a ENEL la instalación para poder liquidar el contrato ya que este no es posible sin que el parque tenga la iluminación verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta. **Intervención ENEL CODENSA – Mauricio Arenas:** Respecto a la energización del parque, indica que ENEL fue a hacer la revisión de la obra encontrando que las cámaras tienen las tapas soldadas por lo que no fue posible la inspección de la ductería, ni realizar	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**48**	Del 336 de 2023, también se requiere certificado de "paz y salvo" por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EsJO2wkjps5ModaNiqskP7sB6PYGJPQ1sIPEcObWcpu2vw?e=MB5Vqw	El correo con la información fue remitido el 14 de junio.	**07. Julio-2024**

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**49**	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EsQfDkEAjAVEgDVZdqFnbhkB49iVYpJlvAHXNkojxxB9VA?e=q6eqfV	**En sesión 21,** se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, en donde se había identificado que el problema era un tema con el medidor. **Respuesta ENEL CODENSA – Mauricio Arenas:** Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**50**	Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de malla vial, uno de los tramos de este contrato corresponde a la oreja de San Benito, el CIV 6001440, en este corredor se encuentra un poste de media tensión hacia el acceso a la Avenida Boyacá, se ha venido solicitando traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Escw2URbr4RNmcGy-F4OQSoBcU2cXe1j8Gq6Z_fm3VItwA?e=Ewkfe8	En sesión 21, se reitera el estado del caso 50 referente al traslado de un poste ubicado en la oreja de San Benito. Indica que hubo demora en la realización del pago pero que ya se efectuó. Respuesta ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Indica que recientemente recibieron el pago y que los tiempos de ejecución de la obra son 45 días normalmente pero que ya se está recomendando para que se realice lo más pronto posible.	**07. Julio-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**51**	Para EAAB-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están ejecutando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se reitera invitación al Ingeniero Jorge Barriga a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de vaciado de concreto.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	**ATENDIDO**	**19 - Mayo 30 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EhyB7AXLJsNNo-iHn6cTd7EBbaXkcxNvdfFZzM_jn-TUKQ?e=rNf79R	En reporte realizado por SDG con delegados de Alcaldías Locales se reporta resuelto.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**52**	Se solicita a la EAAB-Zona 2, realizar revisión y reparación de daño sobre estructura de pavimento registrado en la calle 33 entre carreras 17 y 18.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**ATENDIDO**	**12 - Abril 11 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoquCtmo8v9Got9ekqZ-AU8B1kkiGCoPrmGF7z1F-a5GMq?e=2YL2F2	**EAAB-Zona 2 – Wilson Porras informa en sesión 12:** La semana pasada se hizo la reparación de la red que estaba afectada y esta semana se adelantó la recuperación de espacio público, por la dimensión y características tuvo prioridad.	**04. Abril-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**53**	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Erw44SAFrPJFq_FAPlCsqw4BAwCXqjq5JfhJHWIMnlTn8q?e=85cZpM	**En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras:** Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. **Wilson Porras informa en sesión 16:** Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. **En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq Carmen Rocío López a Juan Carlos López.**	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**54**	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtX1lk3iYuREtp2edUEIl-sBmLjZPtbS6Gl0F2ZNaPRtoA?e=SEub4J	**Wilson Porras informa en sesión 16:** Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**55**	Para ENEL, se solicita retiro y reposición de tapa de Enel en la Calle 13 con Avenida Boyacá sobre la glorieta costado occidental.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**16 - Mayo 09 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EobHqbeKAJNGu6cZTiApSnEB_XvZhUyhSA3OmqYtZA0YAQ?e=bCuhsE	**Atendido, se reporta mediante chat de WhatsApp el 03 de mayo de 2024.**	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**56**	Para ENEL, se solicita retiro y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmRRRXQ_jZpKlYal1dYQ8WMBvq5qMBFca7QyHpdPZXE8fw?e=aB1kHh	**Pendiente**	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**57**	Para movistar, se relaciona con un acción de tutela de un edificio denominado "Esperanza" localizado en el barrio El Recuerdo, cerca a Corferias, la dirección es carrera 36 #25B-50, en el que solicitan la instalación de tapa a una cámara, por ahí pasa un cable de claro, una vez revisada la visita se evidencia que la infraestructura corresponde a Movistar (la tapa), por lo cual se adjunta documento de tutela y se solicita a un profesional de Movistar realizar la visita para emitir respuesta correspondiente.	ETB	Carmen Rocío López	**ATENDIDO**	**18 - Mayo 23 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eq43TuRiWiRLqQZ6haMQTPkBxJWySK8871H53aYrqX_2VA?e=1EDRb8	**En sesión 12 Jolgilio Peña de Movistar** informa que una vez realizada visita técnica, la tapa corresponde a ETB por lo cual se solicita reasignar caso. **En sesión 15, Carmen Rocío López** comunica que se realizó visita y se observa que, si tiene redes de ETB, no obstante, la caja no cumple con las especificaciones de la ESP, por lo cual, el caso se remitió al área de construcción para que se hagan los correctivos y se proceda a la instalación de la tapa. **En sesión 18, ETB - Carmen Rocío** solicita cierre, el caso fue atendido. Se anexa registro fotográfico y correo electrónico de soporte.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**58**	Para Zona 4 EAAB, en la calle 30B Sur con carrera 9C Este - Barrio Ramajal, la UMV intervino esta vía, la profundidad máxima de excavación fueron 23 cm. Se están presentado filtraciones en la red de alcantarillado de la EAAB, a la fecha fueron funcionarios a hacer la inspección y manifestaron que el Ingeniero Vega debe autorizar el CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAAB de su valiosa y acostumbrada colaboración ante la situación que se presenta.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	**ATENDIDO**	**23 - Junio 27 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtTUpcvvGH9Aj6RmKB5aQlABzoKivPA3k0xamGuhrqZlZw?e=EbEefr	**En sesión 14** se informa que se ha avanzado con visita por parte de la EAAB – Zona 4, y se espera reunión para llegar a conclusiones respecto de la intervención. **Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:** El ingeniero Santiago Vitar informa que en la inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a instalar manga para remediar el problema de redes en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.	**06. Junio-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**59**	Para EAAB – Zona 5, el 10 de abril se efectuó solicitud vía correo electrónico para verificar disponibilidad de tubería y accesorios, si es posible que la EAAB apoye al FDL con el suministro.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	**ATENDIDO**	**12 - Abril 11 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EnL8NOqAy-NLiRZ8qWkjPoIBN-_v3sy4p7fpZKoQCtC1pA?e=pbnYJc	**Intervención EAAB – Zona 5 – Javier Patiño*:** Se informa que se leyó el correo electrónico mencionado, y se verificará la disponibilidad ya que es bastante material, no obstante, se solicita que a medida que se vayan ejecutando los tramos e vaya requiriendo el material, en aras de priorizar. Por lo anterior, se responderá el correo en los términos indicados y para que se tenga una respuesta por parte de la EAAB.	**04. Abril-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**60**	Para ETB, el contrato 508 de 2021 se encuentra en etapa de liquidación y se requiere apoyo para generar certificado de "paz y salvo" de ETB, se recomendó con el Ingeniero Benjamín, pero no se ha obtenido respuesta. El ingeniero Benjamín se comunicó con el personal de la Alcaldía, e indica que se han hecho varias visitas de obra, en uno de los puntos se observó un daño que se atribuye al contratista, el contratista en aras de obtener certificado de "paz y salvo" con prontitud realizará el pago, pero a la fecha no se ha generado recibo por parte de ETB.	ETB	Carmen Rocío López	**ATENDIDO**	**14 - Abril 25 de 2024**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EiMolDadLQtlkbx3s_Vu49MBNQzJqa1-CQ43s-0NqtJLmA?e=tSWPyJ	Se remitió certificado de "paz y salvo" de acuerdo con lo indicado en acta 14.	**04. Abril-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**61**	Para EAAB – Red Matriz, se reporta en la Diagonal 100B Sur con Carrera 4B daño sobre espacio público donde se ubica tapa de válvula, se solicita reparación.	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	**ATENDIDO**	**15 - Mayo 02 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Erh3-8EacMpOulL5M5FJPN0BdWeLzDQs-tdJdP4dsM9JZq?e=ThPedc	**Red matriz informó el 25 de abril que la situación había sido atendida.**	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**62**	Para UAERMV, se reporta en frente a predio TV 1A No. 54A-78 escombros sobre vía pública, se solicita retiro.	UMV	Humberto Ramírez Gómez	**ATENDIDO**	**15 - Mayo 02 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/ElkUqpA-crlEsh0LVb94IUwBZtTqpElRoA7hSPqfe2xK1w?e=aTMBtS	**UMV informa en sesión 13 que,** una vez revisada la base de datos de la UAERMV, no se intervino este sector, y se reitera que la UAERMV nunca deja escombros sobre vía, se solicita reasignar. **Se solicita verificar por parte de la EAAB, cuando se realiza visita el mismo jueves (02 de mayo) se informa que no hay escombros en la ubicación indicada, se remite registro fotográfico vía chat.**	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**63**	Para EAAB-Zona 1, se reporta en la KR 45A entre CL 135A y CL 134D daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por redes, se solicita verificar y realizar la recuperación del espacio público.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**ATENDIDO**	**15 - Mayo 02 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EnDYzssbHFBNkadJZUY--D0BHOKqYYnT-meKoC3J6Zx2jQ?e=Qf73Ln	**Se informa que el pavimento ya se encuentra recuperado.**	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**64**	Para UAERMV, se reporta hundimiento en la CL 85 entre KR 12 y KR 13, daño sobre estructura de pavimento, fue verificado por EAAB indicando que no corresponde a daños por redes, por lo cual se solicita su recuperación.	UMV	Humberto Ramírez Gómez	**ATENDIDO**	**13 - Abril 18 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eh3MFrY3ZzdHl1OmPMt84IcBmUW6_aE7qOTPABTXFY68rq?e=fBfRmj	**UAERMV informa en acta 19:** que no se ha podido intervenir, a la fecha la UAERMV se encuentra tramitando PMT para ejecutar labores en el segmento vial. **UAERMV informa en acta 20:** que no se ha podido intervenir, a la fecha la UAERMV no cuenta con capacidad operativa para atender el requerimiento, por lo tanto, se priorizará una vez se cuenten con recursos para su ejecución. **UAERMV aclara en acta 21:** Que el mencionado corredor corresponde a malla vial intermedia, la cual se encuentra a cargo del IDU, por lo tanto, la UAERMV esta realizando [illegible]	**04. Abril-2024**

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**65**	Para EAAB – Zona 3, se solicita del contrato FDLF-COP-379-2023 que tiene por objeto “Realizar las obras de conservación de la malla vial y espacio público asociado en la localidad de Fontibón, Bogotá, D.C. a través del sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable”, la respuesta al radicado E-2024-039952 correspondiente a redes sobre la CL 19 con KR 104B.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	**ATENDIDO**	**16 - Mayo 09 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmCquXOLWk5GIJQ5cdjmzq4B3taW31a329c165jMC4f5WQ?e=SYEaDn	**En sesión 16, Luis Francisco** informa que se cuenta con respuesta mediante oficio E-2024-137144, con esta comunicación se emitió respuesta a la Alcaldía Local de Fontibón.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**66**	Para EAAB – Zona 2, se solicita respuesta a certificado de “paz y salvo” radicado mediante número E-2024-022936 del 04 de marzo de 2024, que se relaciona con unas siembras de especies arbóreas.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**ATENDIDO**	**19 - Mayo 30 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvqqU7_woMRDvwix1TsFdl4BoMZhU6hOl1YcHm-10FGfmA?e=JkJPqk	**En sesión 15 se informa que:** El radicado se encuentra en gestión por parte de la División Servicio Acueducto de la Zona 2, efectuando la validación de la ocurrencia o no de daños en el área de influencia del proyecto. Una vez se cuente con esta validación se procederá a la expedición del certificado de “paz y salvo” solicitado. **FDL informa que fue ATENDIDO**, la ESP mediante radicado 3232002-S-2024-128593 del 30 de abril 2024 presenta "Paz y Salvo" al contratista, el cual remite al FDLE mediante numero 20246010094992.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**67**	Para VANTI, el contrato de obra pública FDL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de “paz y salvo” de las ESP, se requiere respuesta al radicado 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023.	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	**ATENDIDO**	**17 - Mayo 16 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EkT58vdO6-ZNkmiQulVPPxcBY82KsEkpTj_6rQ0NYb-XDQ?e=QasUqy	**En sesión 17,** VANTI informa que se emitió respuesta al FDL, se anexa soporte a dicha acta.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**68**	Para ETB, el contrato de obra pública FDL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de “paz y salvo” de las ESP, se requiere respuesta al radicado 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024.	ETB	Carmen Rocío López	**ATENDIDO**	**18 - Mayo 23 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/ErdPCRv-02ROoQkLRjkkPOcBkXnWPJiIAq38soLN4bn2dq?e=SSZkFj	**En sesión 18,** ETB solicita cierre, toda vez que se requirió información adicional al Ingeniero Iván, representante del contrato y a la fecha no se ha recibido respuesta.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**69**	Para Alcaldía de Kennedy, se esta presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	Delegado	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eo97DW9KUCxDp_BlLwG9734BV0xwBC2L_kiTpfAZW58Jrg?e=o0pT72	**Pendiente**	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**70**	Se indica que la Alcaldía Local de Suba ejecutó contrato de mantenimiento de parques durante el año 2023, en el cual se realizaron una serie de reuniones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, allí se autorizaron algunas intervenciones y decisiones importantes sobre la ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita firma y cierre de las actas levantadas, ya que se han enviado vía correo electrónico a los ingenieros Mauricio Mahecha y Germán López, sin embargo, no se han recibido diligenciadas. Se solicita remitir documentos para que reposen en el expediente del contrato.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**ATENDIDO**	**14 - Abril 25 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Er2wHVxmwLlKssn6WkE8VhoB-tfkLj99jTOYoHwNGqVHeA?e=8VBD03	**Atendido durante comité, se cuenta con registro fotográfico de documento enviado en acta 14.**	**04. Abril-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**71**	Para Jardín Botánico de Bogotá, dentro de los factores ponderables que se le solicitó al contratista que ofreciera dentro de su propuesta económica para la adjudicación del contrato, era realizar la siembra de algunas especies de árboles en cada uno de los parques que atendía a través del contrato de mantenimiento de 2023 (Contrato 484 de 2023), no obstante, no se tiene respuesta de fondo de parte del Jardín Botánico de Bogotá y es requerido para cumplir con el factor de sostenibilidad antes mencionado.	SDA	Karen Bejarano	**ATENDIDO**	**14 - Abril 25 de 2024**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoQ6cZCBNHZPg7Q44t3Z1_0BD49vYQT7fxorU5dd1HRJfg?e=mwrRRY	**Se aclara que como delegada hace parte del área de manejo de RCD y obras, no obstante, se pondrá en contacto con la subdirección de silvicultura de la SDA, para ayudar a gestionar solicitud. JBB no asiste a esta instancia de coordinación.**	**04. Abril-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**72**	Se informa que el FDL está desarrollando un proyecto de rehabilitación de 19 segmentos viales, pero se tiene un inconveniente con 4 de estos tramos, CIV: 12002687, 12002718, 12002673, 12002650. Se requiere una mesa de trabajo con Empresa Metro, ya que se debe aclarar una situación en torno al contrato 363 de 2023, al respecto de los segmentos mencionados se desarrollaron estudios y diseños en lo correspondiente a malla vial intermedia, con ciertas características que permiten la intervención por parte del Fondo. Si el eje vial tuviera alto tráfico, no se ejecutaría. Para este particular, se tiene radicado pertinente a metro, teniendo en cuenta que por los proyectos de Metro	SDM	Martha Helena Silva	**ATENDIDO**	**19 - Mayo 30 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EorDWhBGO9VljHNPGeMvEo0BaTG7gNPgZQbCan-CtLbpgQ?e=cBTr0z	**SDG informa mediante revisión de casos** que se realiza oficio radicado FDLBU No 20246220105331 el 19 de Abril de 2024 a Empresa Metro solicitando información sobre desvios por proyecto Metro en zona de interes, se recibe respuesta el 8 de mayo de 2024 por parte de Empresa Metro, en el que indica que por el momento en estos segmentos no se tiene previsto intervenir como desvios la zona de interes, por lo tanto continua el proceso sobre estos segmenytos de interes para su intervención.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**73**	Para EAAB-Zona 3, se reporta tapa que presenta daño y consecuente riesgo para los transeúntes en la Cra 7 # 17-76.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	**ATENDIDO**	**16 - Mayo 09 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/ElHXhSTLzWFNiFxmgbcDAgABDSlg-4mh-tFwlrje-eG0QA?e=wnNXZ5	**EAAB - Zona 3 - Luis Francisco informa en sesión 16** que ya fue atendido el requerimiento.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**74**	Para ENEL, se reporta faltante de tapa en la calle 147 al occidente de la carrera 9 en calzada norte.	**ENEL COLOMBIA**	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**14 - Abril 25 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Es-085VP2s9DrTviry0BCQUBHJ6BR-Gv2_VGRFOvAMBq3A?e=6Xeq3p	**Se reporta reposición de tapa en la calle 147 con carrera 9. Se solicita cierre del caso expuesto por Onisalba Segura.**	**04. Abril-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**75**	Para EAAB-Zona 1, se reporta intervención realizada en la carrera 9 con calle 141, donde se requiere recuperación de pavimento.	**EAAB - Zona 1**	Mauricio Mahecha	**ATENDIDO**	**17 - Mayo 16 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EkbHZrwT47FLtSGrOw50MrUB9ZUZgz8Ueis8UfD5p-2kXw?e=d2fdLN	**En sesión 14 informa EAAB – Zona 1 – Mauricio Arenas:** Se comunicó vía correo electrónico que la intervención efectivamente fue de la EAAB, y que está pendiente la recuperación de espacio público, la cual se encuentra a cargo de un contratista externo que tenía programada la actividad para el 24 de abril de 2024. **En sesión 17** se informa que, con el reporte realizado por el Ingeniero Mauricio Mahecha, el caso queda cerrado.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**76**	Para EAAB – Zona 5, se reporta socavación en la calle 26 sur con carrera 78B, se solicita verificar y atender situación de emergencia.	**EAAB - Zona 5**	Javier Patiño	**ATENDIDO**	**21 - Junio 13 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EosRnKJJRRpDixdAF-yDtH4BF_TDHtduie2l2tNLJeJNpA?e=iFRNPg	**En sesión 21,** EAAB – Zona 5 – Javier Patiño informa que sobre la calle 26 sur con carrera 78B no se encontraron afectaciones, no obstante, se hizo verificación de tramos aledaños evidenciando que, si hubo intervención de la EAAB, se efectuó recuperación del pavimento el 18 de abril. Por lo anterior, se realiza cierre del caso expuesto.	**06. Junio-2024**
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**77**	Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. **De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.**	Alcaldía Suba	Delegado	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpTZu8zvQ4xCo7kKCvR-XoqB6WiyXqP3qd4qO22T4dryHw?e=pqiieE	En sesion 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, el IDU informa que: “(…) la EAAB mediante oficio 3133002- S-2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba informando: "...El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección reportada en el asunto del oficio: Calle 167 con carrera 50. En dicha verificación se evidenciaron redes de alcantarillado en correcto funcionamiento hidráulico. No se observan represamientos	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**78**	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpsNASE-K5BBlt2GhaS-GGcBRnT-9P9rOWGhqibfPrvXQA?e=8V9AkX	Caso reportado desde 2023. **Nubia Riaño informa en sesión 14:** Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	**79**	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EozWdHSPmNlFramFI8R1TswBvuHvqvSkPhIPA_NbQPPcsA?e=bhEihs	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**80**	Se relaciona con el oficio IDU 202438500549771, correspondiente a derecho de petición que fue trasladado por una tapa faltante en una cámara localizada en la carrera 38 N°. 62-44 sur, una vez realizada la visita se observa que la infraestructura no es de ETB, sino de la EAAB.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	**ATENDIDO**	**16 - Mayo 09 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EndH_j2O_2tGnZCdLTGmbLwBahJSiQnoiXDhVlpkAxP04g?e=9FNWQP	**En acta 16** EAAB Zona 4 informa que, realizada la investigación de la caja de inspección que requiere tapa, se observa que no es propiedad de la EAAB, y no tiene infraestructura de la empresa. Por lo cual, la caja debió ser construida por el usuario, y como tal deberá realizar el debido mantenimiento, se verificará que desde la dependencia de la EAAB que tiene asignada la petición se emita respuesta de fondo.	05. Mayo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**81**	Para UMV, se informó desde el área de conservación que llegó comunicación donde se indica que la UAERMV había realizado instalación de campamento de obra frente y estacionamiento de maquinaría pesada frente al CIV 10001848 – PK 91037369, en la calle 80 entre carrera 103A y carrera 104, lo que sucede es que el segmento esta recién intervenido por el contrato de conservación 1782 de 2021, y se menciona que no se hizo coordinación.	UMV	Humberto Ramírez Gómez	**ATENDIDO**	**16 - Mayo 09 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ekz0x8yKZ7ROk4s6Ojg9VsoBYo_uh7MveknlSHjU3eJ3Nw?e=BQrJ7e	**En acta 16 Humberto Ramirez** afirma que la UAERMV instaló campamento frente al CIV 10001848 – PK 91037369, en la calle 80 entre carrera 103A y carrera 104, sin embargo, se efectuó recuperación del espacio público, la Gerencia de Intervención recuperó el espacio, hubo algunos daños en adoquines, pero fueron remplazados. **En acta 17, Humberto Ramirez** indica que para este sector la UAERMV realizó recuperación de la calzada, por lo cual solo se instalo una carpa sobre el espacio público, se entiende que el área todavía se encuentra con pólizas por parte del IDU, pero no se efectuó ningún tipo de intervención sobre el andén, respecto de los daños observados, los	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**82**	Para VANTI, se recibió información que sobre este mismo corredor (AC 80) entre carrera 103 y carrera 104A, en el costado norte hubo una intervención en el CIV 10001848 – PK 515092, se hizo intervención por emergencia en red de gas natural afectando también zona intervenida por contrato de conservación 1782 de 2021.	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	**ATENDIDO**	**17 - Mayo 16 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EgmmCPoawHdAjLPEWc1FxREB2HA3Ys1QRl17fjzDnGElMA?e=zt2evu	**En acta 17, VANTI – Mario Insuasty:** El caso 82 se gestionó a través del Ingeniero Mauricio del área de mantenimiento, se informa que hubo reposición del espacio público, se remite registro fotográfico. **En acta 19, IDU informa** que se remitió respuesta dada por delegados al área de conservación, a la fecha no se cuenta con pronunciamiento por parte de esta dependencia.	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**83**	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra esta finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.	IDU	Onisalba Segura	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei-5rIBR0r1JsVC-e8Wf8M8Bn7P8uvZ8QSiMb1w3T2mSBQ?e=VSFvPe	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**84**	Para SDA, se solicita cierre de pin ambienta N°. 22190 del contrato de obra 270 de 2022.	SDA	Karen Bejarano	**ATENDIDO**	**16 - Mayo 09 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Esk4GydmxSdKps_sPuWk6LoBOzwz3DzW3idej2vpgFqP9A?e=N285KS	**Karen Bejarano:** Informa que se realizó verificación del pin, encontrando que fue inscrito el 12 de noviembre de 2022, al cual e son aplicables las disposiciones de la Resolución Nacional 1257 de 2021. Por otro lado, se observa que no hay nada de información cargada a este pin, por lo cual la solicitud de cierre no es posible, se deben cargar los certificados de disposición final y aprovechamiento de acuerdo con el anexo 1 de la resolución mencionada previamente. Finalmente, de acuerdo con lo informado respecto de la finalización del contrato en mayo 23 de 2023, se puede advertir de un presunto incumplimiento. Por solicitud del Fondo de Desarrollo Local se remite información vía correo electrónico,	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**85**	Para EAAB – Zona 2, se solicita en la carrera 24 llegando al cruce de la calle 45 (N- S) verificación de redes que pueden estar generando daño sobre estructura de pavimento.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**ATENDIDO**	**18 - Mayo 23 de 2024**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	**Normal**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Elp04X7FYCVHmaQCHM4Xwf8BgknxBxDeHsBwHjRdk8NYWA?e=XZVTZ9	**En sesión 17**, se informó por parte de EAAB-Zona 2 que se encuentra pendiente de programación por parte del área operativa. **En sesión 18, EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras** informó que esta semana se hizo revisión del hundimiento al costado occidental, se verificó la conexión con el sumidero y la red principal de tubería, las cuales se reportan en perfectas condiciones, sin colapso. De acuerdo con lo mencionado, se descarta que el hundimiento que está cerca del sumidero se encuentre asociado a alguna falla de la infraestructura de la red de alcantarillado, exactamente de la conexión con el sumidero o el pozo de inspección. Así las cosas, se considera que los problemas de integridad de la vía se relacionan con la	**05. Mayo-2024**
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**86**	Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio "El Paraíso", que por nomenclatura se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al parque nacional), se llevaron a cabo obras por parte del FOPAE en conjunto con IDU. Lo anterior, en aras de mitigar algunos problemas de escorrentía que se habían en el sector, y que estaban afectando la Avenida Circunvalar. Ahora bien, actualmente se presenta un fenómeno de remoción en masa que está afectando todo el costado oriental de la Avenida Circunvalar, hace poco se presentó colapso sobre	IDU	Jaime Bermudez	**ATENDIDO**	**26 - Julio 18 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EudujtKNSu1OgrEwr1CVuiUBc1TKCOMz_FkP7LnwOmoYvg?e=3uutKs	**En sesión 16, IDU – Jaime Bermúdez:** indica que la intervención sobre la Avenida Circunvalar se realizó en el año 2011, fue un contrato que gestionó el IDU con recursos de Colombia Humanitaria (nación), las ejecutó la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del IDU con el acompañamiento del FOPAE, en el cual se pretendía atender un fenómeno de inestabilidad. El contrato se ejecutó en el año 2011 y culminó su terminó de garantías aproximadamente en el año 2018, considerando el contexto mencionado, se debe señalar que desafortunadamente esta obra no se encuentra contemplada en el Plan de Desarrollo. Por	**07. Julio-2024**
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**87**	Para EAAB – Zona 4, corresponde a derecho de petición que fue presentado por parte de un operador de SITP, se requiere verificación de tramo vial Avenida Primero de Mayo con carrera 71F en el cual se presume existencia de socavación por daño en red.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	**ATENDIDO**	**23 - Junio 27 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	**Alta**	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmLMdLfF2j9Pkg6vH5rj8u8BnwTpgkaEgciiHXsNfXbDIw?e=fcNq2v	**En sesion 18**, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. **En sesión 18. EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López** informa que el caso 87 lo está atendiendo el área operativa, mediante mantenimiento. **En sesión 22:** Se reporta atendido por EAAB-Zona 4, pero no cuenta con registro fotográfico de la recuperación. **En sesión 23:** Se reporta solucionado, se envió oficio con registro fotográfico de atención del caso.	**06. Junio-2024**
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**88**	Se solicita al IDU respuesta a requerimiento enviado vía correo electrónico sobre trámite de PMT de la Industria Copel, quien como cliente de VANTI requirió prestación de servicio mediante derecho de petición debido a qué se ha hecho solicitud de PMT, pero ha tenido negado por respuesta de IDU. En varias ocasiones se ha requerido comunicación con ingenieras de IDU para sostener mesa de trabajo, pero no ha sido posible.	IDU	Álvaro Reinoso	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Euyn2UJgQrxKj1esMsBrgGMBK_kCAHHHiANYvX44q1IzfA?e=E37uZg	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**89**	Para ENEL, se solicita aprobación de punto de conexión radicado mediante consecutivo 1500476372 del 10 de abril. Se precisa que se obtuvo factibilidad, pero que se espera aprobación de diseño para continuar con el trámite de aprobación integral del proyecto ante el IDPC.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoKD3mpGChRDjxh08zW4gDsBUJrknxLxAzTW6NGwgFsIhA?e=EXG9Sr	**Observación FDL - 26 de mayo:** Aún no se ha obtenido concepto de aprobación del diseño de luminarias. **Respuesta ENEL - Sesión 25:** el diseño serie 6 ya quedó aprobado con el radicado 1500491435 del 4 de junio.	07. Julio-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**90**	Para SDA, relacionado con un requerimiento de manejo silvicultural, durante el mes de abril se radicó mediante consecutivo 2024ER43111 atendiendo las observaciones efectuadas por la Secretaría, pero a la fecha no se tiene respuesta.	SDA	Karen Bejarano	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/El2W_P_2daZCqGI4HlNrei8BHtab1-_Rx8bZpuVA-939Vw?e=BXs4tq	**Observación FDL - 26 de mayo:** Se realizó visita silvicultural el día 28 de mayo de 2024, sin embargo, se envió mediante radicado No. 2024ER114112, solicitud de remitir el concepto técnico de la visita, debido a que es un requisito indispensable para la obtención de la aprobación de intervención por parte del IDPC. No se solicita la resolución como tal, solo el concepto de la visita realizada por el Ing. Alejandro Sánchez.	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**91**	Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ej7vzq9tNN9CiYKyBZ7uRgoB84jYN7rMKRZcvbOMRGIBRQ?e=g5NvNS	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**92**	Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	Mauricio García	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EgeOzJw7QPNBgQVBQ-Cj45QBw9yOhfDNgAIijXu26DeoGw?e=hNqHO8	**Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García:** Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**93**	Se encuentra pendiente la aprobación de la segunda fase del proyecto por parte de la UAESP, el cual corresponde a tres parques y los cuales se radicaron desde el mes de septiembre 2023, posteriormente se radicaron las observaciones solicitadas con radicados del PARQUE LA ESTRELLA 20234000224321-PARQUE LA ESMERALDA 20237000603732 – PARQUE EL TESORO 20237000603722. Posterior se reciben radicados nuevos para los siguientes parques, PARQUE LA ESMERALDA 20247000185982 y reiteración para el PARQUE EL TESORO 20247000126.	UAESP	Yira Bolaños	**ATENDIDO**	**18 - Mayo 23 de 2024**	**2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpSahvwxaitKkmV2puLp5c8BBC-_g4YV_z-CEnfnnv6kOQ?e=jA82NP	**Sesión 18 intervención UAESP – Dra. Yira Bolaños:** Se revisan los radicados remitidos y se informa que las comunicaciones ya cuentan con respuesta vía correo electrónico, las cuales fueron enviadas al e-mail: veronica.lesmes.4@gmail.com ; se remitirá la trazabilidad a las direcciones de contacto previamente indicadas para que se realice la trazabilidad por parte del Fondo de Desarrollo Local. **Observación FDL - 28 de mayo:** La respuesta dada por la UAESP no especifica si las correcciones hechas por el contratistas se ajustan al debido trámite, razón por la cual el contratista realizó un nuevo derecho de petición reiterando la solicitud.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**94**	Para IDU, se solicita mesa de trabajo, desde la Alcaldía Local se trabaja en formular un proyecto de puentes peatonales y se ha solicitado la reserva de esta infraestructura (radicado IDU DTINI 202423500582981), pero solo se dio respuesta afirmativa para un puente, lo que impide continuar con el proyecto. Se solicita realizar una mesa de trabajo para verificar la posibilidad de realizar reserva.	IDU	Jaime Bermudez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvAGDdq3i5FLpsyrqkvUaPoBjkjrWJvzTtUtlh4jUfzpGA?e=ZA5wAu	**Sesión 18 - Intervención IDU – Ing. Jaime Bermúdez:** Se solicita aclarar si la respuesta a la solicitud de reserva fue emitida de forma incompleta por el IDU, o si se indicó que no se puede indicar la reserva por alguna condición particular. **Respuesta de Mónica Chipatecua:** Se informa que la reserva se solicitó para cuatro puentes, pero solo se reservó uno, para los tres restantes se comunicó que el IDU realizó mantenimiento en el mes de octubre, empero en el mes de diciembre se recibió por parte del IDU un diagnóstico respecto de dicha infraestructura para continuar con la formulación del proyecto. A su vez, en las visitas técnicas efectuadas se observa que los puentes no	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**95**	Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Er2Rs5JoKa9Biu45D62uPu0B39RkcNaXZbe3f66QmGjf8g?e=k2RtRS	**En acta 19, IDU señala** que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**96**	Para EAAB – Zona 2, se reporta en la Diagonal 73 con carrera 1A, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado. A respecto de este caso, se informa que ya se realizó recuperación de la red, y se encuentra pendiente la recuperación de la calzada.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**ATENDIDO**	**19 - Mayo 30 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoEop6ahaaRNul0b0GpN3AkBIQRyLkBkhuSsBLpek-UPwQ?e=qXeQmB	**En sesión 18, EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras informa** que no se ha podido realizar la recuperación de la calzada, el contratista programó la ejecución para esta semana, pero por cuestiones de movilidad y logísticos no ha sido posible, el objetivo es que se efectúe la recuperación mañana, 24 de mayo. **En sesión 19, IDU informa** que de acuerdo con registro fotográfico remitido por EAAB-Zona 2, se realizó recuperación de calzada. A su vez Wilson Porras precisa que la intervención no fue realizada por la EAAB, el contratista había indicado que efectuaría ejecución de obra viernes y sábado de la semana pasada, no obstante, cuando llegaron al	**05. Mayo-2024**

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**97**	Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.	MOVISTAR	Jolgilio Augusto Peña	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpnJxTp6t8FGv5MCR1iHGnABjjsU2TQWB8tXWRFwYXyAbg?e=GW3L8r	**En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña:** Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**98**	Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EjklvzlRFeZMuv8Lfaq3BSoByKtBO2wObHq1NDGrPBt5tQ?e=qXlZt6	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**99**	Para ENEL Colombia, mediante radicado 611181811 del 23 de mayo, se solicitó gestión respecto de la comunicación que se recibió para traslado de infraestructura (postes y caja) que pertenece a los activos de esta empresa, que se encuentran ubicados sobre la calzada con movilidad restringida del sector Mariscal Sucre (CIV 2001977 y 2001969). Si bien inicialmente se recibió respuesta donde se indicó que debía radicar la documentación de acuerdo con procedimiento para asumir los costos del traslado de este poste (radicado N°. 000731057 del 05 de marzo de 2024, bajo oficio 0000816096), se requiere visita técnica con delegado asignado por ESP a este contrato de obra, ya que se requiere puntualizar temas de campo para continuar con procedimiento mencionado. Lo anterior, a pesar de las condiciones actuales de la infraestructura propia de la empresa que no cumple con la	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**20 - Junio 06 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/ErxzMTc079VOtLoad9TSUxgBqY_CWBKPgKELFCv3RCCp9A?e=FpmDFB	**Sesión 20 - Mauricio Arenas informa** que se solicita cierre teniendo en cuenta que se han adelantado las visitas pertinentes con delegados de la Alcaldía de Chapinero.	**06. Junio-2024**
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**100**	En el comité anterior al que asistió el FDL de Usaquén se solicitó a ENEL retirar reserva de dos segmentos viales, el primero con CIV 1004519 y el segundo 1007204, ENEL Colombia mediante radicado IDU 20225262079722 efectuó el desistimiento de reserva a estos segmentos viales de malla vial y espacio público, sin embargo, en el SIGIDU no se ha reflejado dicha información, se solicita por favor retirar reservas con base en la comunicación emitida por ESP.	IDU	Jaime Bermudez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei-uwimGGLBGh6kYuwjkU-sB5Rx5SvdH2TeUpH3Ud8ROrQ?e=Z1u9Wk	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	**101**	Para EAAB-Zona 3, se recibe derecho de petición N°. 000013183802 relacionado con afectación de cámara ETB. Se realizó visita a la carrera 47 # 22-83 para identificar un daño ocasionado por un contratista de la EAAB a la cámara de la Empresa, dejándola en riesgo de accidente para los peatones. En visita del viernes 24 de mayo el personal contratista negó su identificación y el número del contrato, luego en segunda vez la visita del 27/05/2024, se observó que personal del contrato EAAB el contrato 1-01-33300-1534-2022 está realizando trabajos en la zona, motivo por el cual se solicita la intervención de la EAAB para requerir al contratista la recuperación inmediata de la cámara.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtqHl8m5ReBCm825ox7IkHoBzxlLg99IGpzrRTt8nrqqKq?e=DahQjq	**Sesión 20 - Intervención EAAB-Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez:** Realizada la consulta efectivamente corresponde a un contratista de la EAAB, por lo cual en el transcurso de la mañana se informará la programación pertinente para realizar la recuperación del espacio público y reconstrucción de la cámara.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**102**	Para EAAB-Red matriz, el área de infraestructura tiene un tema relacionado con la red matriz de acueducto en el barrio Moralba, Altos de Sucre y Altos de Virrey (TV 16 entre KR 16B Este y CL 43 Sur), durante el mes de enero se generó una intervención por parte de la ESP, se hizo una adecuación de la red, no obstante no se efectuó la recuperación de la calzada, actualmente se encuentra con material granular, por lo tanto, se solicita recuperar el espacio para garantizar las condiciones de movilidad del sector.	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	**ATENDIDO**	**22 - Junio 20 de 2024**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_102?csf=1&web=1&e=jR1rii	Se informa cierre vía correo electrónico, se adjunta como evidencia y en acta 22.	**06. Junio-2024**
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**103**	Para IDU, en el barrio La Gloria, segmento vial con CIV 4005511 se encuentra reservado por el contrato IDU de conservación 1746 de 2021, no obstante, se declaró incumplimiento y no se ha podido ejecutar este segmento vial. Al respecto es preocupante el estado del segmento vial, el cual se encuentra sumamente afectado por las rutas del SITP y alimentadores que transitan de manera constante, generando repetidas quejas por parte de la comunidad. Por lo cual, se aprovecha este espacio para verificar el encargado del sector puntualmente, y si se puede facilitar un contacto para coordinar de una u otra manera, la intervención a través de acciones de movilidad, sin que se comprometa jurídicamente el proceso que adelanta el IDU.	IDU	Jaime Bermudez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_103?csf=1&web=1&e=A6xmaf	**Sesión 20 - Intervención IDU – Jaime Augusto Bermúdez Díaz:** Se solicita el número del contrato IDU, ya que al llevar un proceso de caducidad se tienen unos términos legales que es importante analizar, por lo cual, se propone efectuar una mesa de trabajo para identificar dichas condiciones, en aras de garantizar la correcta y segura movilidad en el sector del barrio La Gloria. Se agenda Mesa de trabajo agendada para el martes 11 de junio a las 7:00 am de manera virtual.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**104**	Para ENEL, se realizó solicitud respecto de un CIV ubicado en el barrio Los Laches, en la KR 5 entre CL 7 y CL 9, en la cual se requirió realizar acciones pertinentes sobre poste que se encuentra inclinado, esto teniendo en cuenta visita realizada por IDIGER en la cual se efectuó diagnóstico técnico donde se hicieron algunas recomendaciones al respecto del riesgo que este genera.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_104?csf=1&web=1&e=jPHje4	**Sesión 20 - Intervención ENEL – Mauricio Arenas:** Se solicita remitir la petición radicada a ENEL vía correo electrónico.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**105**	Para VANTI, en el barrio Los Laches, en la KR 5 entre CL 7 y CL 9, VANTI realizó desconexión del servicio a cinco predios, entonces mediante oficio (que está en proceso de firma) se está solicitando la reconexión dado que el contratista ya realizó las obras correspondientes, entre las cuales se construyó un muro de contención.	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_105?csf=1&web=1&e=RteaIA	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**106**	Para EAAB – Zona 2, sobre la calle 85 con carrera 15 se solicita recuperación de espacio público.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**ATENDIDO**	**22 - Junio 20 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_106?csf=1&web=1&e=eHKrjb	**Acta 20, WIlson Porras informa que** a primera hora se remitió el reporte realizado ayer en la noche por la Ingeniera Angélica, para que se hiciera la respectiva verificación de campo y se informe si fue intervención de la EAAB para adelantar la recuperación de la infraestructura. En dado caso que corresponda a la EAAB, se priorizará a través del contrato de espacio público, entendiendo que este punto genera bastantes inconvenientes por su afluencia y garantías de movilidad. **Acta 22:** Se reporta espacio público recuperado, ya cuenta con registro fotográfico.	**06. Junio-2024**
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**107**	Para UAERMV, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre la AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.	UMV	Humberto Ramírez Gómez	**ATENDIDO**	**23 - Junio 27 de 2024**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_107?csf=1&web=1&e=J32Wro	**Acta 21,** De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quién obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCIT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quién es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Respecto de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizará recorrido. **Acta 22:** Con referencia a los casos 81 y 82, el ingeniero Sergio Alejandro Díaz del Área de Conservación informó que el 13 de junio realizaron los recorridos con VANTI y UAERMV.	**06. Junio-2024**
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**108**	Para VANTI, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre la AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_108?csf=1&web=1&e=peqBo6	**Acta 21,** De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quién obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCIT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quién es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Respecto de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizará recorrido. **Acta 22:** Con referencia a los casos 81 y 82, el ingeniero Sergio Alejandro Díaz del Área de Conservación informó que el 13 de junio realizaron los recorridos con VANTI y UAERMV.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**109**	Para ENEL, se solicita respuesta de la petición remitida respecto del contrato 1-0125400-1090 de 2021 de ENEL, teniendo en cuenta que aún no se ha emitido pronunciamiento, el radicado de la comunicación es 611211756.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_109?csf=1&web=1&e=9oCCRf	Se dio respuesta al cliente el 9 de julio de 2024 con radicado de salida 000947476.	**07. Julio-2024**
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**110**	Para Claro, se remitió correo electrónico con petición el día 23 de abril de 2024.	CLARO	Nicolás Andrade	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_110?csf=1&web=1&e=Xya30P	**Acta 21, Claro – Nicolás Andrade Duque** informa que la solicitud fue recibida como un PQR por prestación de un servicio (tipo call center), no obstante, se indicó vía correo electrónico que para el requerimiento relacionado con un certificado de "paz y salvo" para obra, se requiere radicación formal mediante oficio en las instalaciones de Claro. Por lo cual, la comunicación podrá ser recibida en el Centro Comercial Plaza Claro y deberá contener los puntos exactos que fueron intervenidos para efectuar la debida verificación en terreno. **Acta 25, Claro – Nicolás Andrade Duque señala:** Ya se informó proceso para radicación de certificados de "paz y salvo", una vez se radique se dará respuesta de fondo al requerimiento.	**07. Julio-2024**
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**111**	Para Movistar, se solicita respuesta de la petición con radicado 20240419105915900 del 24 de abril de 2024.	MOVISTAR	Jolgilio Augusto Peña	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_111?csf=1&web=1&e=6yQ7iT	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**112**	Para IDU, presenta situación pendiente relacionada con la construcción del cable aéreo San Cristóbal del contrato IDU 1167 de 2023, para su ejecución se tuvieron que demoler en cada estación 2 manzanas, las estaciones objeto de consulta son "La Victoria" y "Altamira", donde se demolieron predios, pero el IDU no ha generado cierre de las cuentas contrato, de las mismas se está contabilizando consumo. Por lo anterior, se solicita al IDU pronunciamiento, y que como se ha requerido realice los cierres de las cuentas.	IDU	Álvaro Reinoso	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_112?csf=1&web=1&e=1fMjHd	Durante el día 06 de junio de 2024, el Ingeniero Alvaro Reinoso remite correo electrónico a la Dirección Técnica de Predios informando la situación presentada sobre el sector, para realizar la debida suspensión del servicio. **Acta 23 - EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López**: Se solicita información al IDU respecto de la petición de suspensión de servicio sobre manzanas que fueron adquiridas mediante compra de predios para construcción de proyecto de cable aéreo. **Acta 23 - IDU – Álvaro Reinoso:** Se remitió correo informando el caso el 06 de junio, no obstante, se continuará gestión con profesional Mateo Grajales, a su vez Liliana Torres puede generar un apoyo escalando tema a interior del IDU.	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**113**	Para ENEL, se solicita mesa de trabajo para tratar el tema referente a un contrato de malla vial donde se hace necesario el traslado de unos postes, aun no se ha hecho una radicación formal porque consideran importante que en una primera mesa de trabajo, junto con los profesionales del consorcio, se revisen los estudios y diseños en donde se hace la sugerencia y recomendación de evaluar la cantidad de traslados de postes en cada uno de los segmentos viales. De esa manera se haría la solicitud ante cada ESP.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0113?csf=1&web=1&e=xE59yk	**Acta 25 - ENEL informa:** Se han realizado 2 mesas de trabajo y hoy se programó visita técnica.	**07. Julio-2024**
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**114**	Para EAAB-Red Matriz, se solicita visita técnica de la EAAB en la Avenida Ciudad de Villavicencio con calle 65 sur (se requiere verificar dirección) teniendo en cuenta que se presentan empozamientos posiblemente por causa de las redes, y este corredor vial fue intervenido hace poco mediante contrato de conservación IDU.	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0114?csf=1&web=1&e=xE59yk	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**115**	Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 52074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0115?csf=1&web=1&e=YWwPg3	**Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras** informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**116**	Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0116?csf=1&web=1&e=mgZvfk	**En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño:** Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**117**	Para VANTI, en el frente de trabajo que colinda con el Colegio Gran Colombiano localizado aproximadamente en la carrera 79B con calle 73A Sur, se observó tubería galvanizada de 12", por lo cual se ha solicitado realizar apiques para que la ESP verifique el estado de la red y con sus recomendaciones se puedan evitar daños sobre la tubería. No obstante, no se ha recibido respuesta. Así las cosas, a través del comité se solicita apoyo a esta ESP para que puedan prestar apoyo y coordinación sobre las actividades que se desarrollan en este sector de la ciudad.	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0117?csf=1&web=1&e=49mVtG	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**118**	Para IDU, se informa que el FDL-Kennedy ha firmado convenio interadministrativo con el IDU (Convenio 1459), actualmente los contratos derivados se están manejando desde dicha Entidad, por parte del Ingeniero Oscar Hoyos. Se precisa que es un convenio donde se va a mejorar los paseos comerciales de la fase uno y dos de la localidad de Kennedy, con una inversión por parte del FDL de aproximadamente 8mil millones de pesos y del IDU de 9mil millones de pesos. En cuanto a los estudio y diseños, se solicita conocer su estado, y cuál es el motivo de que no cuente con aprobación hasta el momento, teniendo en cuenta que ya se subsanaron por parte del IDU hacia la EAAB. El 22 de marzo de 2024 se realizó una mesa de trabajo en la cual la EAAB ESP presentó nuevas	IDU	Jaime Bermudez	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0118?csf=1&web=1&e=mTDQZ6	Acta 22 - IDU – Jaime Augusto Bermúdez: El IDU verificará el tema con el Ingeniero Francisco de la EAAB, respecto a las no objeciones de los diseños. Acta 24 - IDU – Liliana Torres: Este caso fue presentado por el FDL de Kennedy, del mismo se informa que desde el IDU se está a la espera de una respuesta por parte de la EAAB frente a la no objeción de los diseños, ayer se había indicado que se tendría un pronunciamiento, no obstante, no se cuenta con comunicación formal a la fecha, se está atento desde IDU para dar cierre al caso. Acta 25 – IDU – Liliana Torres: El IDU ya recibió el pronunciamiento por parte de la EAAB,	**07. Julio-2024**
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**119**	Para Claro, se solicita instalar tapas faltantes sobre el sector de la Av. Caracas No. 5-12 y Av. Caracas No. 5-58, barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe.	CLARO	Nicolás Andrade	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0119?csf=1&web=1&e=bddWHs	**Acta 22 - ENEL – Mauricio Arenas:** Se informa que, realizadas las visitas correspondientes, las cámaras pertenecen a empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. El 24/06/2024, ETB verificó mediante visita y se informa que no son parte de su infraestructura. **Acta 23 - IDU - William Fernando Chavez:** Se emitió respuesta parcial al peticionario con base en las visitas realizadas por ENEL y ETB, en las cuales se confirma que no son parte de su infraestructura. A su vez, se remitió copia a las ESP de telecomunicaciones (Claro, Movistar, Tigo) y	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**120**	Se informa afectación sobre la Calle 80 N°. 69H-20, que de acuerdo con reporte recibido se ubica infraestructura de la ESP – Enel Colombia SA ESP, por lo cual, se solicita recuperación de calzada y realizar acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**24 - Julio 04 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0120?csf=1&web=1&e=TVo9kd	Se da cierre a los casos 120 y 125, los cuales fueron reportados vía chat como atendidos, de los mismos se allegó registro fotográfico correspondiente.	**07. Julio-2024**
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**121**	Para EAAB-Zona 2, se solicita reparación de ciclorruta en el parque El Virrey, toda vez que se presenta hundimiento por posible daño en redes. Ya había sido intervenido este sector por la EAAB.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0121?csf=1&web=1&e=fDGuZT	**Acta 22 - EAAB – Javier Porras:** Se indica que ya había sido recuperado pero que nuevamente se presentó hundimiento, ayer se programó contratista para que realizará la intervención correspondiente, no obstante, no se ha recibido información de que hayan finalizado actividades. A su vez, es importante indicar que al estar en cabeza de un contratista deberá dar garantía sobre el trabajo ejecutado, y tendrá que realizar acciones pertinentes con las condiciones técnicas requerida, de igual manera se verificará si nuevamente existe daño sobre la red. **Acta 23 - EAAB-Zona 2 – Javier Porras:** Se informa que, de acuerdo con lo informado	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**122**	Para ETB, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024, donde se requiere certificado de "paz y salvo".	ETB	Carmen Rocío López	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0122?csf=1&web=1&e=RCaHOh	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**123**	Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de "paz y salvo".	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0123?csf=1&web=1&e=qNi4B5	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**124**	Para ENEL, se solicita reposición de tapas de cajas de inspección, las cuales fueron reportadas a la ESP mediante consecutivo 657851 del 23 de noviembre de 2023	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0124?csf=1&web=1&e=qSNL8F	**Acta 23 - ENEL – Jorge Mauricio Arenas:** Se toma nota del número de radicado y se verificará internamente, ya que la reposición de tapas es un tema de atención urgente por la generación de posibles accidentes. Se remite vía chat información de contacto para comunicarse directamente con profesional del Fondo de Desarrollo Local.	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**125**	Para ENEL, se solicita respuesta respecto a consulta de un contrato de la vigencia 2022, el cual radicó ante la ESP mediante consecutivo 609189320.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**24 - Julio 04 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0125?csf=1&web=1&e=Kb8v5	Se da cierre a los casos 120 y 125, los cuales fueron reportados vía chat como atendidos, de los mismos se allegó registro fotográfico correspondiente.	**07. Julio-2024**
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**126**	Para Secretaría Distrital de Ambiente, se solicitó concepto técnico de silvicultura, en donde se informó por parte del profesional que realizó la visita técnica, que el documento de respuesta ya se encontraba en revisión jurídica, no obstante, a la fecha no se ha obtenido pronunciamiento. Al respecto se solicita colaboración, toda vez que el contrato sobre el cual se realizó la visita técnica ya lleva 1 año suspendido. Se remite vía correo electrónico trazabilidad documental (comunicaciones) entre entidades.	SDA	Sara Juliana Delgado	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0126?csf=1&web=1&e=sNpkyV	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**127**	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una solicitud en la calle 162 entre carrera 54 y 55, donde se evidencia un posible daño de redes, se solicita realizar visita conjunta.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0127?csf=1&web=1&e=rT2t4f	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	**128**	Para ETB, se solicita atender caso presentado por Alcaldía Mayor sobre el sector de la carrera 7 entre calles 61 y 62 (costado oriental) donde se observan pozos sin tapa, generando alto riesgo para transeúntes.	ETB	Carmen Rocío López	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0128?csf=1&web=1&e=90VNZD	**Acta 23 - Respuesta ETB – Benjamín Ochoa:** Se informa que respecto al caso 128, si corresponden a cámaras de ETB, se procedió a realizar reporte a la Gerencia de Servicios Masivos para que se efectúe la correspondiente reposición, así mismo se remita registro fotográfico para evidenciar el cumplimiento de la actividad.	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**129**	Para IDU, se han realizado dos solicitudes respecto a las actividades que puede desarrollar el FDL en puentes vehiculares como peatonales que se encuentran sobre cuerpos de agua, esto teniendo en cuenta que, dentro de las metas del plan de desarrollo, se deben atender 500 m² de esta infraestructura. Se agradece la pronta respuesta del IDU (último radicado 20246220016871 del 23 de enero), teniendo en cuenta que en el FDL se cuentan con recursos limitados, y no se tiene personal especializado para emitir dictámenes sobre este tipo de infraestructura.	IDU	Jaime Bermudez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0129?csf=1&web=1&e=xAkabR	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**130**	Para IDU, se tiene algunas dudas sobre la intervención de segmentos que la comunidad solicita atender, pero que cuentan con reserva por parte de otra entidad, en este caso el SDM, donde se programó parqueo en vía, al respecto ¿Hay alguna directriz o lineamiento sobre las actividades que podría llegar a realizar el FDL?, en algún momento SDM indicó al IDU que no se levantarían esas reservas pero que se podrían realizar intervenciones frente a mejoramiento de infraestructura, por lo anterior se solicita conocer si hay alguna orientación en este sentido.	IDU	Jaime Bermudez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0130?csf=1&web=1&e=7u4OhS	**Acta 24 - Intervención IDU – Ing. Jaime Augusto Bermúdez:** El tema de reservas efectivamente se maneja al interior del IDU, por lo cual desde la OCIT se podría gestionar una reunión entre la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación y los delegados de la Alcaldía Local para aclarar las situaciones donde se tengan inquietudes. Por lo anterior, se solicita remitir información de contacto para buscar un espacio y realizar mesa de trabajo.	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**131**	Para IDU, se informa que labora como apoyo técnico para la supervisión de contratos de malla vial, por lo cual se radicó solicitud el día 20 de junio mediante radicado 20246220161691, solicitando actualización de la plataforma SIGIDU sobre unos segmentos viales, de los cuales se cuenta con oficio de reserva, pero no aparecen reflejados en la plataforma (radicado 20235057945). Los tramos viales referenciados son: 12000287 del cual se asignó reserva con respuesta IDU en el año 2022. Así mismo, la actualización del estado de los CIV 12001476, 12001648, teniendo en cuenta que solo tiene reserva por parte de SDM, y se trabajará de manera conjunta, por lo cual debería ser una reserva compartida, a fin de iniciar la intervención de estos tramos	IDU	Jaime Bermudez	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0131?csf=1&web=1&e=dNHss	**Acta 24 - Intervención IDU – Bertha Liliana Torres Moreno:** Se solicita remitir los oficios mencionados, a fin de verificar de manera interna con la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación a cargo de la Dra. Sully Magalis Rojas Bayona. Se recomienda señalar los números de radicado de ingreso al IDU, y no los consecutivos del FDL, por lo cual se sugiere a la Ingeniera Sonia verificar dicha información. **Acta 25 - Intervención IDU – Bertha Liliana Torres Moreno:** Se programó la reunión con el FDL y la SDM para empezar a trabajar el tema de parqueo en vía cuando se tienen reservas.	**07. Julio-2024**
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**132**	Para IDU, se tienen algunas inquietudes respecto al Decreto 625 de 2023 – "Por medio del cual se reglamenta el artículo 132 del Decreto Distrital 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C." y se dictan otras disposiciones", ya que en su artículo 13 se manifiesta que mediante nuevo acto administrativo se adoptarán los manuales e instructivos que se estimen pertinentes, por lo cual, se requiere este documento para iniciar programación de mantenimiento de andenes en la localidad.	IDU	Jaime Bermudez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0132?csf=1&web=1&e=4W4JWK	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**133**	Para ENEL, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se tiene referencia de un poste con alta inclinación en el barrio Salitre. La comunidad, el contratista y la interventoría han solicitado varias visitas técnicas, sin embargo, la respuesta de ENEL es que no existe riesgo, ya que la infraestructura se encuentra dentro de los parámetros.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**ATENDIDO**	**25 - Julio 11 de 2024**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0133?csf=1&web=1&e=3GfY22	**Acta 24 - Respuesta ENEL – Jorge Mauricio Arenas:** Se solicita número de radicado para verificar respuesta emitida, y corroborar concepto técnico con soporte fotográfico, puesto que esta infraestructura recibe o permite mantener unos grados de inclinación sin generar afectación para las personas o entorno. **Respuesta FDL Suba – Alejandro Ramirez:** Los radicados con los que se cuenta son 0008645448, 0007202051 y 0008767417. **Acta 25:** Al cliente se le da respuesta a los radicados en el siguiente sentido: Con el fin de validar su solicitud, se realizó visita técnica en el lugar encontrando mediante orden	**07. Julio-2024**
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**134**	Para EAAB, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, hay unas cajas en algunos tramos donde se esta ejecutando que requieren intervención, por lo cual se solicita acompañamiento técnico de la ESP, al momento se ha intentado realizar contacto con el Ingeniero Mauricio Mahecha sin que se haya logrado gestionar, se han programado visitas sin llegar a realizarse.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0134?csf=1&web=1&e=EhRzY1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**135**	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	MOVISTAR	Jolgilio Augusto Peña	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0135?csf=1&web=1&e=NEdv1z	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**136**	Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar , pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaria visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0136?csf=1&web=1&e=j254uQ	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**137**	Para EAAB-Zona 3, se reporta en la carrera 13A N°. 23-81 socavación en la vía, falla de la carpeta asfáltica y estructura de soporte, debido a posible fallo de colector de aguas residuales, se evidencia perdida de material en dicha estructura.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodriguez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0137?csf=1&web=1&e=hVgYcw	**UAERMV - Humberto Ramírez - Sesión 25:** Para EAAB-Zona 3, se solicita atención de la carrera 13A con calle 23, se relaciona con requerimiento ciudadano para atender hueco generado sobre calzada, una vez realizada la visita se colige que puede relacionarse con atención de fallo sobre redes de alcantarillado, por lo cual se verificó y al parecer EAAB intervino, no obstante, aún se requiere recuperación de calzada.	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**138**	Para EAAB-Zona 1, se presenta socavación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 12, costado sur, en el área aferente se observa pozo del sistema de alcantarillado, es posible que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, la debida atención de la EAAB.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0138?csf=1&web=1&e=WueSkf	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**139**	Para EAAB-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localiza en la calle 22 con carrera 14 (Avenida Caracas), en donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por socavación, se solicita visita de campo de la EAAB para verificar, y para que con el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad vial en el sector.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodriguez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0139?csf=1&web=1&e=gVvqk9	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**140**	Para EAAB-Zona 1, respecto de la reparación realizada por la EAAB en la calle 134 con carrera 19, se realizó reparación de red sanitaria, no obstante, aún se requiere recuperación de espacio público, se solicita la debida gestión.	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0140?csf=1&web=1&e=8XcaaX	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**141**	Se recibe solicitud de la Alcaldía de Chapinero, respecto de requerimiento que se efectuó a Secretaría Distrital de Ambiente para la aprobación de permisos silviculturales, los cuales tienen radicados 2024ER66489 del 26 de marzo y 2024ER102985 del 14 de mayo de 2024 (Bogotá te escucha No. 2601262024), y no se cuenta con pronunciamiento de esta Entidad.	SDA	Sara Juliana Delgado	**ATENDIDO**	**26 - Julio 18 de 2024**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0141?csf=1&web=1&e=nOpyr0	**Sesión 26 - SDA informa:** en atención al Caso 141 por el cual se recibe solicitud de la Alcaldía de Chapinero respecto a pronunciamiento de una solicitud que se efectuó a Secretaría Distrital de Ambiente para la aprobación de permisos silviculturales, con radicados SDA 2024ER66489 del 26 de marzo y 2024ER102985 del 14 de mayo de 2024 se informa que se dio respuesta mediante radicados SDA 2024EE140553 del 2024-07-05 y radicado SDA No. 2024EE113258 2024-05-27 correspondientemente.	**07. Julio-2024**
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**142**	Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0142?csf=1&web=1&e=TgoX0O	**Acta 26: Alexandra Rojas** solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**143**	Para EAAB-Zona 3, se solicita apoyo para adecuación de collarín de cobre en el CIV 16004474, del barrio San Francisco. Así mismo, se aclara que el Ingeniero Francisco siempre ha sido muy presto en apoyar y atender a los llamados del Fondo de Desarrollo Local.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodriguez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.**	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0143?csf=1&web=1&e=PsrAAd	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**144**	Para ENEL, se reporta tapa faltante en la KR 7 con CL 41, se solicita reposición por generar un alto riesgo de accidente para transeúntes y vehículos.	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0144?csf=1&web=1&e=4ABsMv	**Respuesta ENEL – Mauricio Arenas en sesión 26:** Respecto del caso de la calle 41, se informa que fue reportado a unidad operativa, y se están realizando las gestiones pertinentes para adelantar reposición de tapa.	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**145**	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender hundimiento reportado en la AC 3 frente a placa 51A-10.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdqgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0145?csf=1&web=1&e=7lk8ZY	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**146**	Para EAAB-red matriz, se reporta daño en la carrera 70C (Avenida Ciudad de Villavicencio) con calle 63 sur, se solicita verificar estado de redes.	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdqgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0146?csf=1&web=1&e=HXI2nV	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	**147**	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".**	Alta	https://sdqgovco-my.sharepoint.com/f/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%C3%A1fico_casos_reportados/2024/Caso_0147?csf=1&web=1&e=ydUI9W	Pendiente	
