

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 07 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 29 de febrero de 2024

HORA: 08:00 am a 09:10 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Rodríguez	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Angélica Tatiana López H.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Juan Sebastián Acevedo Iriarte	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-05390
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-05390
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02859

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno		X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		X	
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Oscar Fernando Escobar Alvarado	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-41750
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Luis Enrique Abril	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		
Lady Salamanca	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
N/A	N/A	N/A			N/A

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. GESTIÓN PARA VINCULAR ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (06 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

Se abre la séptima **(07)** sesión del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes y se presenta la propuesta del orden del día, para la actual vigencia se impulsa la coordinación en los proyectos que vienen en curso y a ejecutarse en 2024.

La agenda del día es aprobada por los asistentes. Así mismo, se señala que para esta sesión se tiene invitada a la Alcaldía de Barrios Unidos, ya que se hizo requerimiento al comité referente a la coordinación con las empresas de servicios públicos para los contratos de obra que tienen en ejecución. No obstante, se da la palabra a delegado de esta Entidad y no hay respuesta.

3 GESTIÓN PARA VINCULAR ALCALDÍAS LOCALES

Nuevamente, Secretaría Distrital de Planeación informa que no se ha recibido respuesta por parte de Secretaría Distrital de Gobierno para asistir a las mesas de trabajo citadas en el marco de la instancia de coordinación.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (06 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 22 de febrero de 2024, correspondiente a la sesión número **06** del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma se recibe observación por parte del Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3, solicitando que se registre su asistencia a la sesión anterior, por lo cual se genera ajuste.

También se menciona, que el **plan de trabajo 2024**, así como **las actas número 1 y 2** se encuentran publicadas en el micrositio destinado por Secretaría Distrital de Planeación, mientras que **las actas N°. 3, 4 y 5** fueron enviadas para firma por parte del presidente de la instancia al IDU, por lo cual se espera recibir los documentos para continuar publicación en la Página Web de la Secretaría Distrital de Planeación. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes en el último mes:

N°. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024
3	01/02/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente
4	08/02/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente
5	15/02/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

A continuación, el Ingeniero William hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, UAERMV, SDM y ETB:

5.1 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se hace referencia a los siguientes casos:

- **Caso 7:** Se informa que fue atendido por ETB.
- **Caso 9:** Se informa que fue atendido por EAAB-Zona 1.
- **Caso nuevo:** Para EAAB-Red matriz, se solicita adecuada recuperación de pavimento sobre la Avenida Boyacá con Calle 72, ya que se pueden presentar accidentes.

Imagen N°. 1. Reporte de WhatsApp remitido por IDU – febrero 23 de 2024.



Así mismo, se indica que el 28 de febrero se remitió registro fotográfico de la recuperación del pavimento de este sector, por lo cual, se reporta en la mesa de trabajo como parte de las acciones de coordinación con las empresas de servicio público.

Imagen N°. 2. Reporte de WhatsApp remitido por EAAB-Zona 2 e IDU – febrero 27 y 28 de 2024.



- **Caso nuevo:** Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.
- **Caso nuevo:** Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.

Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras: Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB.

5.2 IDU – Angélica Tatiana López Higuera:

- **Caso nuevo:** Para ENEL, se reporta por parte del concejal Edison Julián Forero que en la Calle 13 con Avenida Boyacá, bajando el puente, sentido occidente-oriente, se encuentra socavación red empresa de servicios públicos, la EAAB red matriz indicó que la no pertenece a la EAAB, se observa cámara abandonada con ductos para canalización.

Imagen N°. 3. Reporte de WhatsApp remitido por IDU – febrero 28 de 2024.



- **Caso 19:** La EAAB-Zona 1 informó que se encuentran revisando el presupuesto emitido por ENEL, se encuentra en trámite en la aseguradora de EAAB y pues se está a la espera de la revisión y posterior aprobación para continuar con los trabajos.

5.3 SDM – Martha Helena Silva:

Se informa que desde la Oficina de Seguridad Vial se ha evidenciado un aumento y reiteración de quejas, especialmente de los “moteros”, respecto a la deficiencia o mala implementación de los Planes de Manejo de Tránsito – PMT en las obras.

Imagen N°. 4. Reporte presentado por SDM en sesión 07 de 2024.



La situación remitida por la Oficina de Seguridad Vial presenta un aumento de la siniestralidad vial focalizado en los motociclistas, por lo cual a través de esta sesión se reitera a las empresas de servicios públicos, UAERMV, Fondos de Desarrollo Local e IDU, la obligación de dar cumplimiento a la normatividad en lo correspondiente a la señalización de obras.

Uno de los casos que fueron enviados a este comité, teniendo en cuenta que corresponde a una obra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (localizada en la Av. Caracas con calle 75 sur en sentido Sur-Norte), ya que efectuada la revisión correspondía a una obra del acueducto que NO contaba con PMT, ellos hicieron la obra sin PMT, no colocaron señalización y se presentó un siniestro el 09 de febrero de 2024. En este accidente, se generó un herido que es el acompañante del motociclista y el conductor de la moto falleció. Este es un llamado a tomar conciencia a implementar la señalización adecuada, ya que esta puede costar vidas.

Entonces, mediante el comité se hace el llamado a todas las empresas en especial a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a tomar las medidas que corresponden y minimizar el impacto que generan las obras, y entender que a razón de ello se hace exigible el cumplimiento de los Planes de Manejo de Tránsito, ya que garantizan la condición de seguridad vial a todos los actores.

Finalmente, a la EAAB se remitió oficio por parte de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito una invitación a presentar PMT y se advirtió de todas las condiciones de inseguridad vial que estaba generando al ejecutar obra sin la señalización adecuada.

Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: Se tiene mucha razón en lo que expone la Ingeniera Martha, se asistió hace un par de semanas al Concejo de Bogotá respecto del caso presentado donde el motociclista falleció y la pasajera estaba en malas condiciones de salud, por lo cual como ESP debemos acatar todas las disposiciones de la SDM. Ahora bien, también es importante reconocer el vandalismo en la ciudad, lo cual hace muy complicada la situación. En este momento EAAB-Zona 4 tiene obras en los barrios La Belleza y Juan Rey – Localidad de San Cristóbal, los robos de los elementos de señalización son diarios.

El contratista enviaba fotos de señalización a las 5 pm, y a las 5 am ya se habían robado la mitad de los elementos, el vandalismo es muy complejo y precisamente lo que se presenta es que no hay nadie, por lo cual, también se debe analizar la imprudencia de algunos motociclistas.

Respuesta SDM – Martha Helena Silva: Es cierto que existe pérdida de señalización, pero es responsabilidad del contratista mantener esa señalización completa todo el tiempo, respecto al tema de la cultura, SDM viene realizando sensibilización a través de campañas que se enfocan directamente al cumplimiento de las normas, y es de recordar que los motociclistas también tienen procesos sancionatorios. Ahora bien, lo importante es que la seguridad vial es un compromiso de todos.

5.4 UAERMV – Humberto Ramírez:

- **Caso 10:** Se informa que la UAERMV apoyo a la EAAB en la Avenida Poporo Quimbaya, y gracias a la gestión de la Gerencia de Intervención, se logró pavimentar la vía. Por lo cual, el caso se reporta resuelto.

5.5 ETB – Carmen Rocío López:

Se reitera lo informado por la Ingeniera Onisalba, correspondiente al caso 7, que se encuentra resuelto.

Por otro lado, se agradece al Ingeniero Javier Patiño, quién amablemente colaboró el viernes en la coordinación de acciones sobre intervenciones de las ESP. Al respecto, se genera la siguiente consulta: El viernes se presentó una afectación de la EAAB sobre un contrato del IDU, gracias a la comunicación con Javier Patiño, se pudo entrar a reparar la red, por lo cual quisiera saber ¿Cuál es el procedimiento por seguir si se presenta alguna situación en horario nocturno?

Respuesta EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: En la EAAB todas las zonas que están ejecutando obras dependen de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, siendo las áreas con mayor cantidad de frentes, no obstante, no se descartan las obras de Red Matriz y Troncal, para el caso de Red Matriz en el Comité se encuentra la compañera Nubia Riaño.

Para el caso que comentas se contactó al Ingeniero Gino González, quien se encuentra asignado como supervisor de esa obra, y ahí fue donde se dio la posibilidad de coordinar, teniendo en cuenta que se deben contar con los permisos y autorizaciones para ingreso de personal.

5.6 EAAB – Zona 5 – Javier Patiño:

- **Caso nuevo:** Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10” a 16”, y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros.

Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB

cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se presentan los siguientes casos que están en seguimiento:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
1	Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 92, se presenta un desnivel importante respecto a la rasante de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se señala que este tema fue llevado a la Mesa Distrital de Monitoreo, y allí no se obtuvo respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que emita respuesta y realice las gestiones pertinentes para solucionar este caso.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente desde 2023 ENEL - Mauricio Arenas informa en sesión 06: Se indica que ENEL radicó nuevamente solicitud de aprobación para PMT sobre la zona requerida, no obstante, la propuesta fue rechazada por SDM, con la recomendación de que no se presentará como PMT de emergencia, se solicitará para semana santa, teniendo en cuenta que es una época con menor flujo vehicular y se genera un menor impacto en la movilidad. Por lo anterior, ENEL preparará la documentación y se programará intervención en semana santa siguiendo las recomendaciones emitidas por SDM.
2	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	EAAB - Zona 5	Alta	Pendiente desde 2023
3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.	IDU	Normal	Alvaro Reinoso en sesión 3 informa: En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en cuales obras y que daños se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para darle respuesta Carmen Rocío López en sesión 3 indica: Se hace la aclaración respecto al tema del oficio sobre los daños expuestos en el comité pasado, refiriéndose que la observación no era únicamente para el IDU sino a nivel general para todas las entidades que realizan obras en el espacio público, tener especial cuidado con las redes de no dañarlas ni dejarlas expuestas a daños.
4	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz "Silencio – Casablanca" de la Empresa de Acueducto y	EAAB – Red Matriz	Alta	IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
	Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector			solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.
5	Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedó sin reparar. Se solicita pronta actuación.	IDU	Alta	Acta 04-2024: EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Así mismo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.
6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	IDU	Normal	Acta 04-2024: EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez. Acta 5-2024: Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.
8	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 por Carrera 55D, se observa hueco en pavimento al parecer originado en daños y/o filtraciones que presenta la infraestructura de la ESP; registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	EAAB - Zona 1	Normal	Pendiente
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comendidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
12	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	EAAB - Zona 5	Alta	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
17	Para EAAB – Zona 2, en la calle 80 con Avenida Ciudad de Cali, se presentó daño en calzada de Transmilenio, el ingeniero Diego Montero – Gerente del Sistema Maestro solicita apoyo para recuperación de la calzada. Por lo anterior, se solicita a la EAAB: se trámite permiso con Transmilenio, y PMT.	EAAB - Zona 2	Normal	Pendiente
18	Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?	EAAB - Zona 3	Normal	Pendiente
19	Para EAAB-Zona 1, en la Carrera 58 entre Calle 127 y Calle 127d se realizaron intervenciones por emergencias, en la cual se presentó afectación de redes de ENEL, quién actualmente está pendiente por atender reparación, no obstante, apenas se realice dicha actividad, se solicita a EAAB realizar la recuperación del espacio público.	EAAB - Zona 1	Alta	Respuesta ENEL – Mauricio Arenas en sesión 06: Se informa que el 31 de enero se efectuó visita conjunta con la EAAB, para este sector se han realizado una serie de acuerdos, al respecto se verificará el estado de avance que tiene ENEL y se indicará en Chat de WhatsApp. Sesión 07: La EAAB-Zona 1 informó que se encuentran revisando el presupuesto emitido por ENEL, se encuentra en trámite en la aseguradora de EAAB y pues se está a la espera de la revisión y posterior aprobación para continuar con los trabajos.
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Alta	Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas?	ENEL COLOMBIA	Normal	ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
	Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.			
23	<p>Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado.</p> <p>A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.</p>	IDU	Normal	Intervención IDU – Angélica López en acta 06: Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.
25	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente
26	Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	Alta	Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07: Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB.
27	Para ENEL, se reporta por parte del concejal Edison Julián Forero que en la Calle 13 con Avenida Boyacá, bajando el puente, sentido occidente-oriente, se encuentra socavación red empresa de servicios públicos, la EAAB red matriz indicó que la no pertenece a la EAAB, se observa cámara abandonada con ductos para canalización.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.	MOVISTAR	Normal	Pendiente

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
- Casos presentados	28	100,00%
- Casos resueltos al corte	8	28,57%
- Casos pendientes al corte	20	71,43%

6.2 TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

6.2.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se registraron cuatro (4) casos resueltos y cinco (5) casos que fueron presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los compromisos número 24 al 28, así mismo, se reportó avances en el caso 19.

6.2.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados en la vigencia 2022 y 2023 que aún se encuentren pendientes, y serán registrados con una marcación especial en la base de datos para registro 2024, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se registraron cuatro (4) casos resueltos y cinco (5) casos que fueron presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los compromisos número 24 al 28, así mismo, se reportó avances en el caso 19.</p>	
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

9. COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer nuevo registro en base de datos 2024.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 07-marzo de 2024

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Data Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 07-marzo de 2024
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (virtual o presencial).	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 07-marzo de 2024

10. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta séptima sesión del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes de las vigencias anteriores, para depurar la información de las bases de datos y efectuar un seguimiento detallado de los casos pendientes durante el presente año.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 07-marzo de 2024 a las 8:00 am, de manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,


WILLIAM RODRÍGUEZ CASTELLANOS
PRESIDENTE



PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez T. – SDP.
 Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
 Aprobó: William Rodríguez Castellanos- IDU.

Anexo: 1-Informe de seguimiento – Corte Acta 07.

Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO

Número de casos registrados por mes

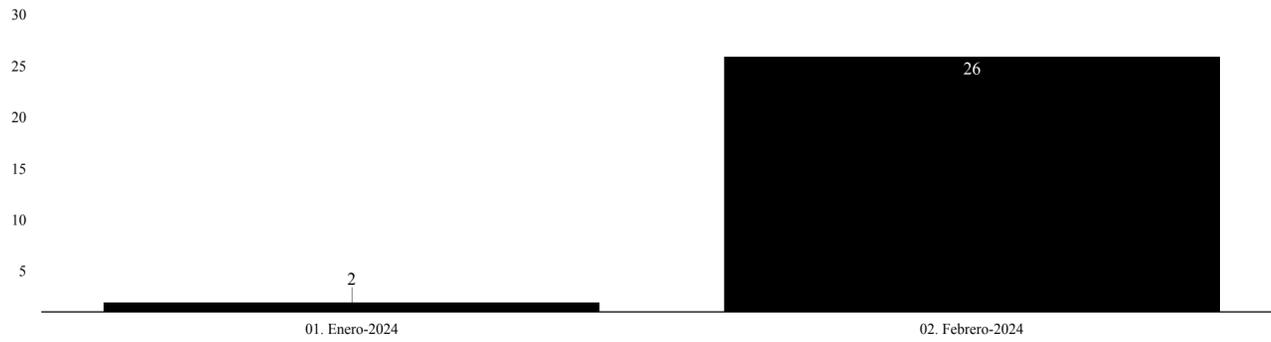

Casos registrados

28




Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Número de casos resueltos por mes

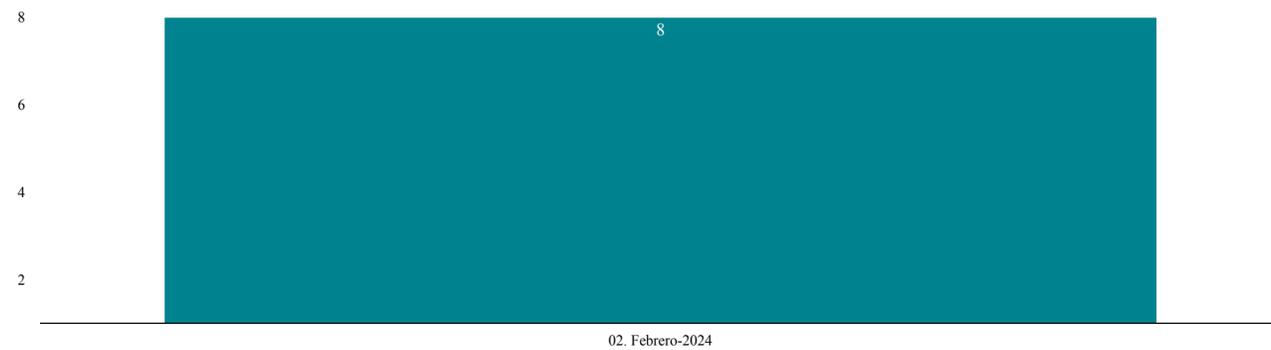


Nº. casos resueltos


8



Porcentaje de avance

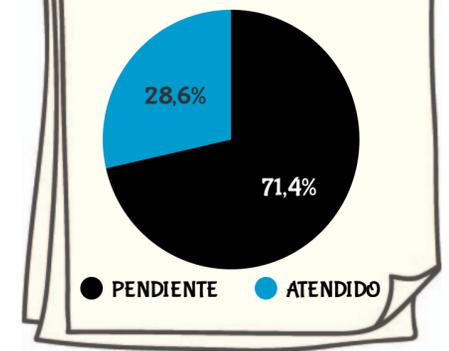

Número de casos pendientes por mes

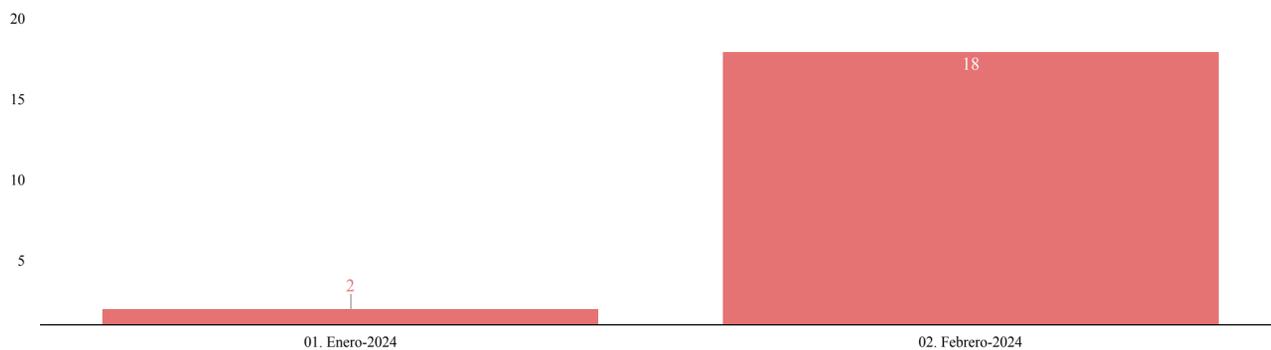

Casos pendientes

20



TOP – Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. IDU	5
2. ENEL COLOMBIA	5
3. EAAB - Zona 1	4
Total	27

TOP – Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. EAAB - Zona 4	1
2. ETB	1
3. EAAB - Zona 3	1
Total	8


Recuento de casos

Nº. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2...	Para ENEL, se solicita que se revis...	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
2	01. Enero-2...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	PENDIENTE
3	02. Febrero-...	Se informa sobre las afectaciones ...	IDU	Normal	PENDIENTE
4	02. Febrero-...	Para la EAAB – Red Matriz, se ex...	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-...	Para la EAAB, en la CL 28 con K...	IDU	Alta	PENDIENTE
6	02. Febrero-...	Para el IDU, solicita reunión para t...	IDU	Normal	PENDIENTE
7	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, En Carrera ...	EAAB - Zona 5	Normal	ATENDIDO
8	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 ...	EAAB - Zona 1	Normal	PENDIENTE
9	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
10	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo...	EAAB - Zona 4	Normal	ATENDIDO
11	02. Febrero-...	Para ENEL, en la calle 13 por Carr...	ENEL COLOMBIA	Normal	PENDIENTE
12	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	PENDIENTE
13	02. Febrero-...	Para Alcaldía de Puente Aranda, se...	Alcaldía Puente Aranda	Normal	ATENDIDO
14	02. Febrero-...	Se solicita realizar revisión con un...	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
15	02. Febrero-...	Para ETB, en la calle 47 con carrer...	ETB	Alta	ATENDIDO
16	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero...	EAAB - Zona 3	Normal	ATENDIDO


TOP – Entidades con casos pendientes

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. IDU	5
2. ENEL COLOMBIA	5
3. EAAB - Zona 1	3
Total	19

Número de casos registrados por mes

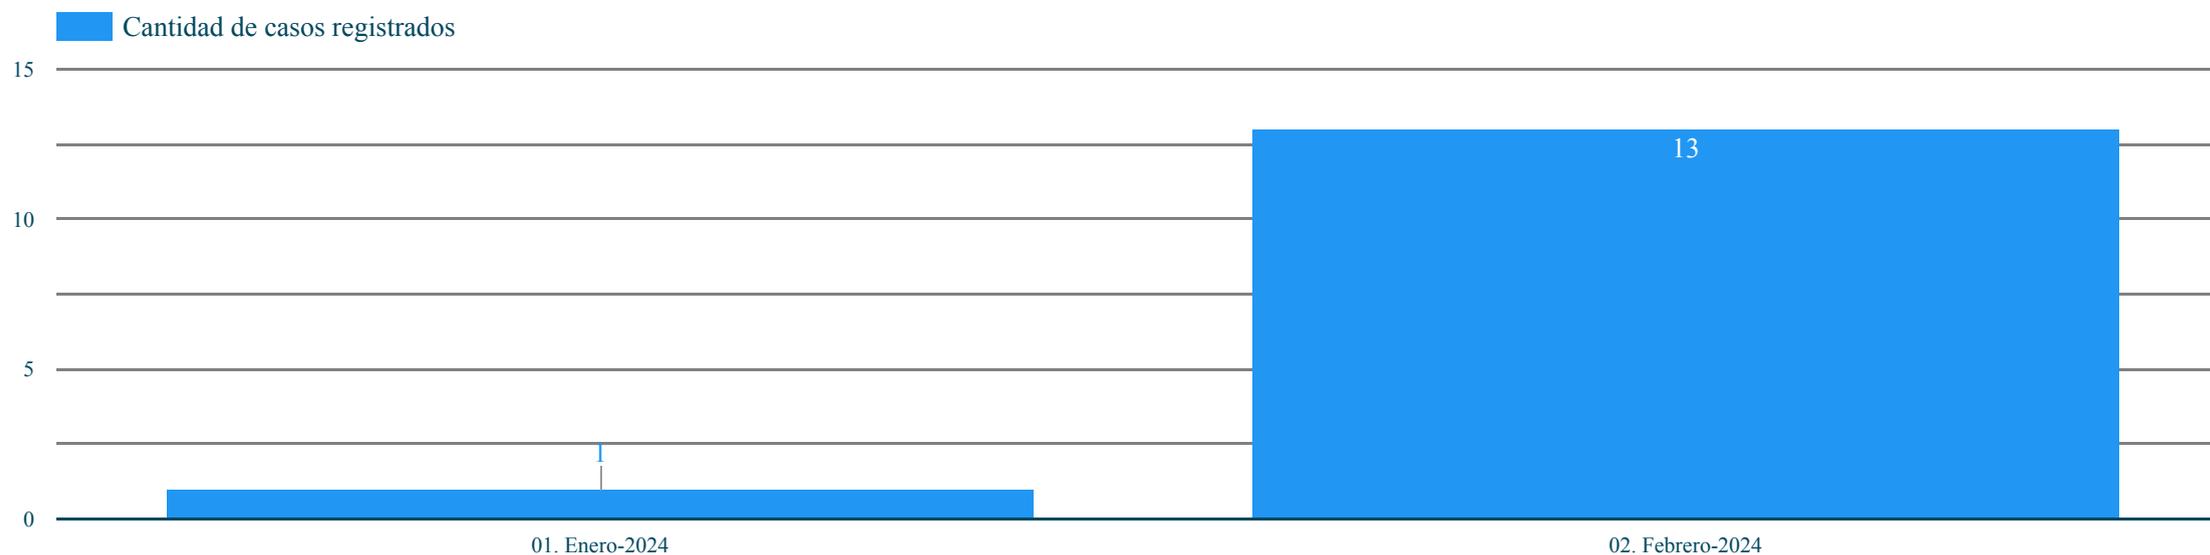

Número de casos por zona o área pendientes

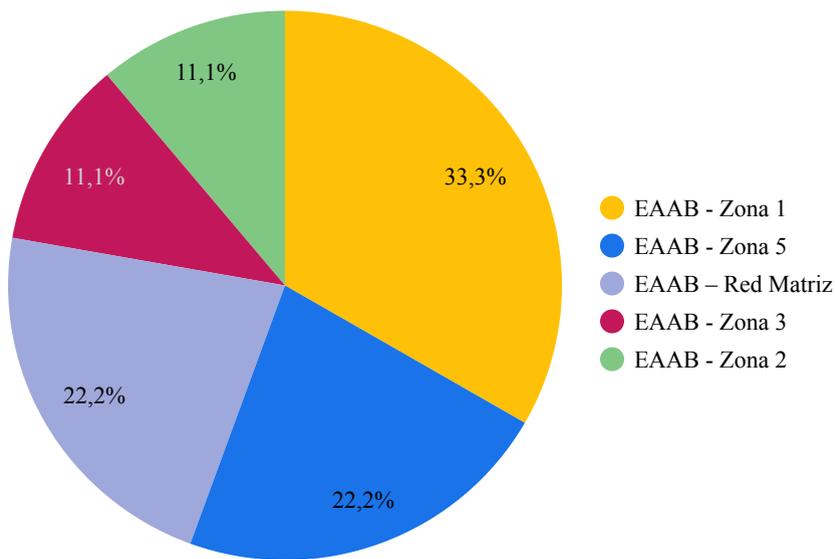

ESTADO DEL...	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	7	Para EAAB – Zona 5, En Carrera 79 (Av Primero de Mayo) por Calle 53 sur CIV 8008450, pozo de la EAAB con daño en el mismo y convertido en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.
ATENDIDO	9	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 entre calles 135C y 138 hubo intervención de la EAAB encontrándose pendiente la recuperación de la carpeta asfáltica; registro fotográfico enviado al chat el lunes 5 de febrero.
ATENDIDO	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.
ATENDIDO	24	Para EAAB-Red matriz, se solicita adecuada recuperación de pavimento sobre la Avenida Boyacá con Calle 72, ya que se pueden presentar accidentes.
ATENDIDO	16	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero Joan Rivera indica que en la Avenída Caracas
