


102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7719 Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá

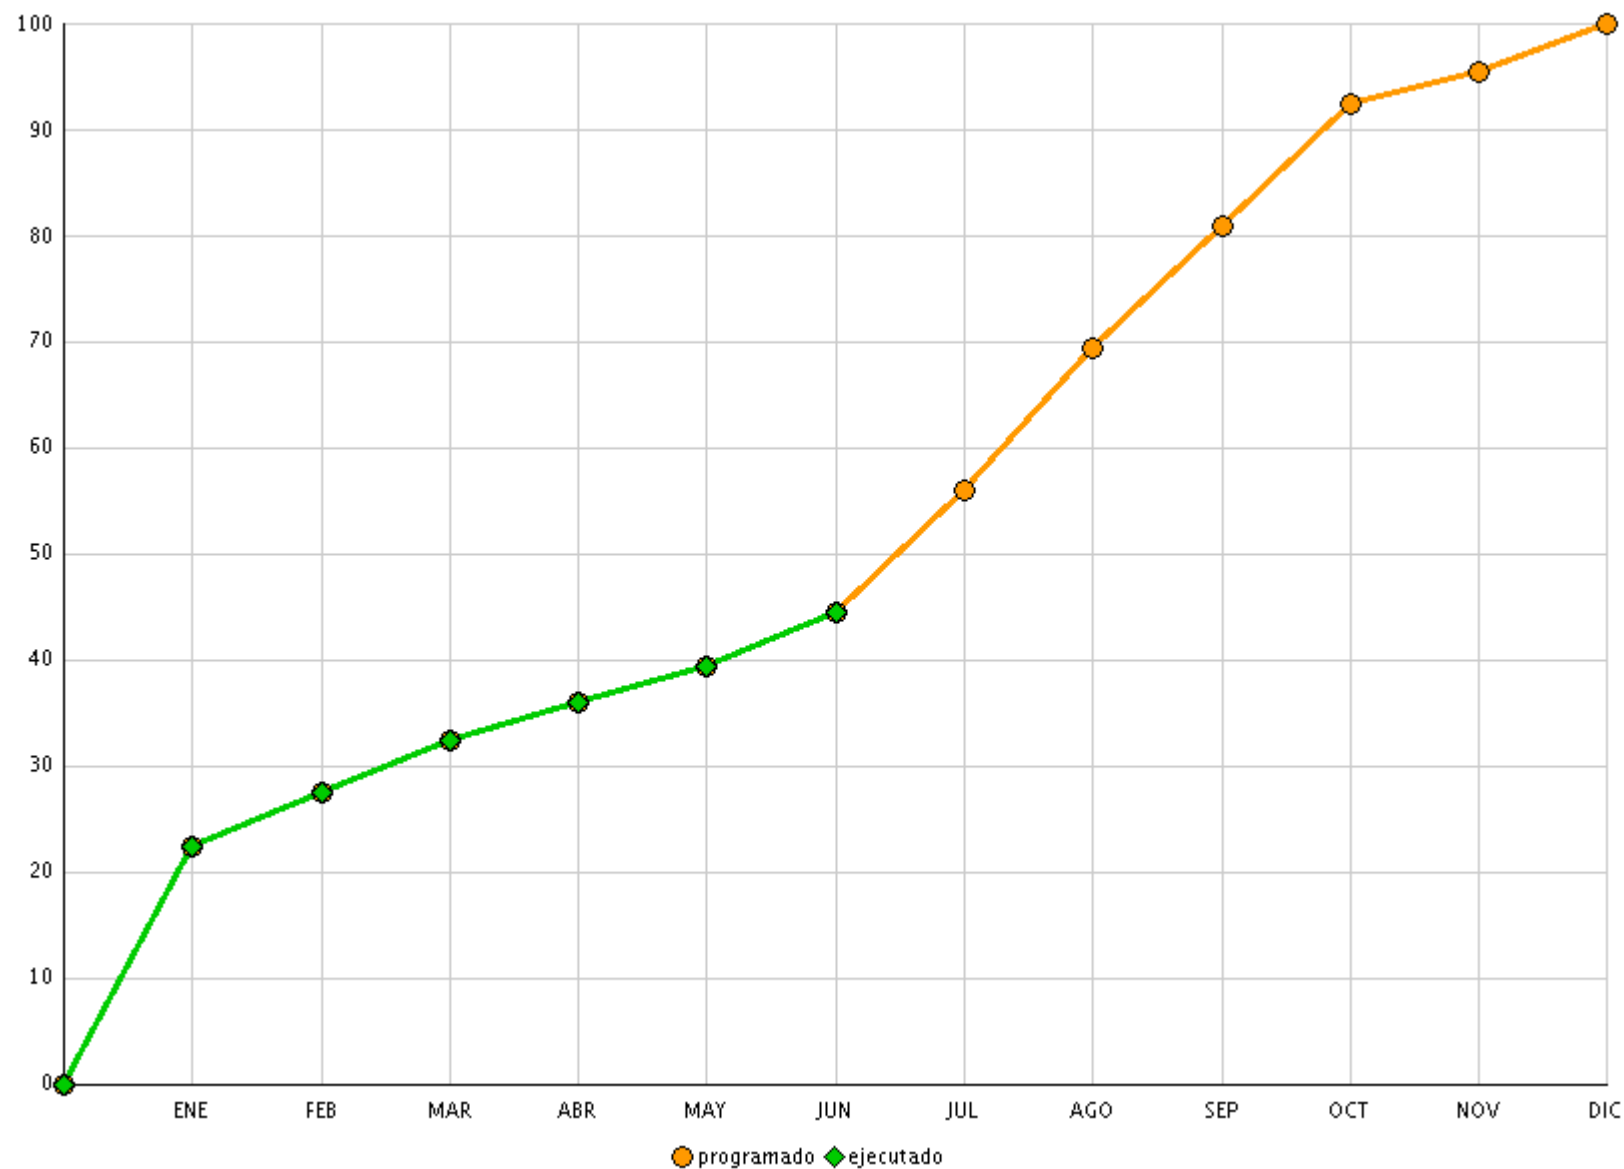


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	22.50	27.50	32.50	36.00	39.50	44.50	56.00	69.50	81.00	92.50	95.50	100.00
Ejecutado	22.50	27.50	32.50	36.00	39.50	44.50						

102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7732 Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá

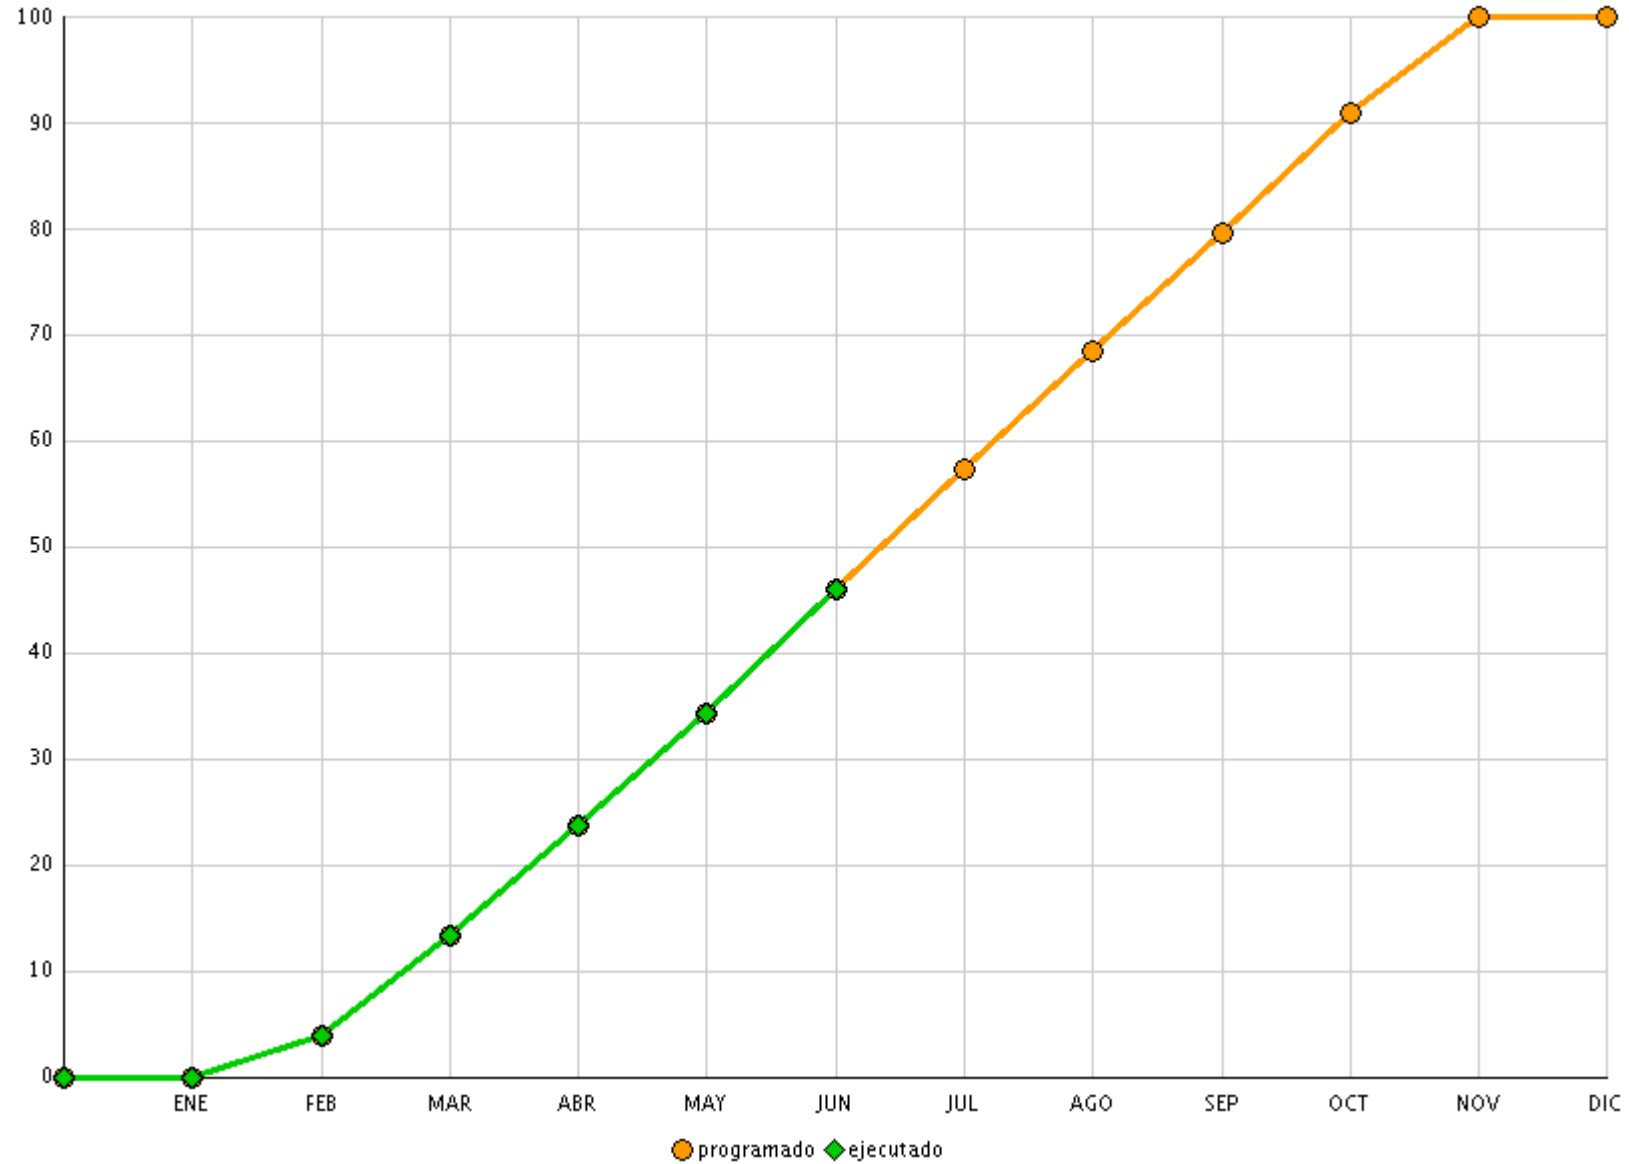


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.00	13.40	23.70	34.30	46.10	57.30	68.50	79.70	90.90	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	4.00	13.40	23.70	34.30	46.10						

102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7742 Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá

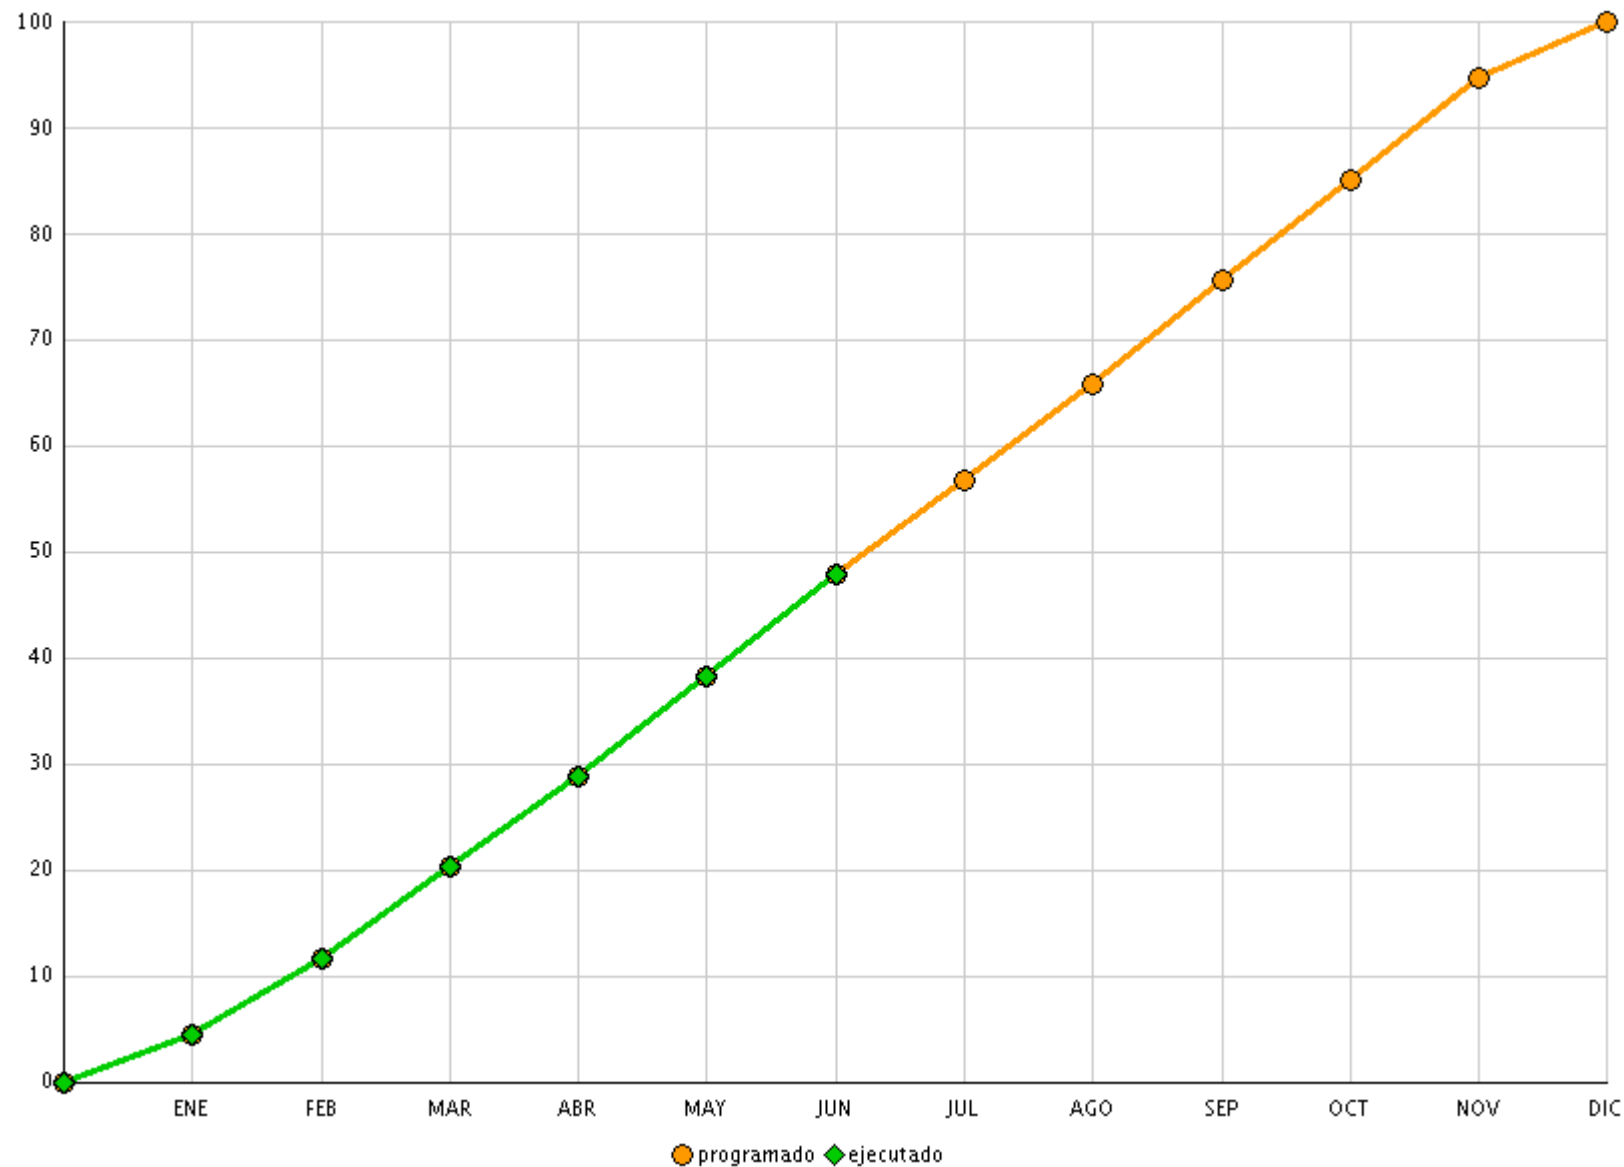


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.54	11.61	20.30	28.84	38.25	48.00	56.82	65.89	75.71	85.03	94.72	100.00
Ejecutado	4.54	11.61	20.30	28.84	38.25	48.00						

102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7751 Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá

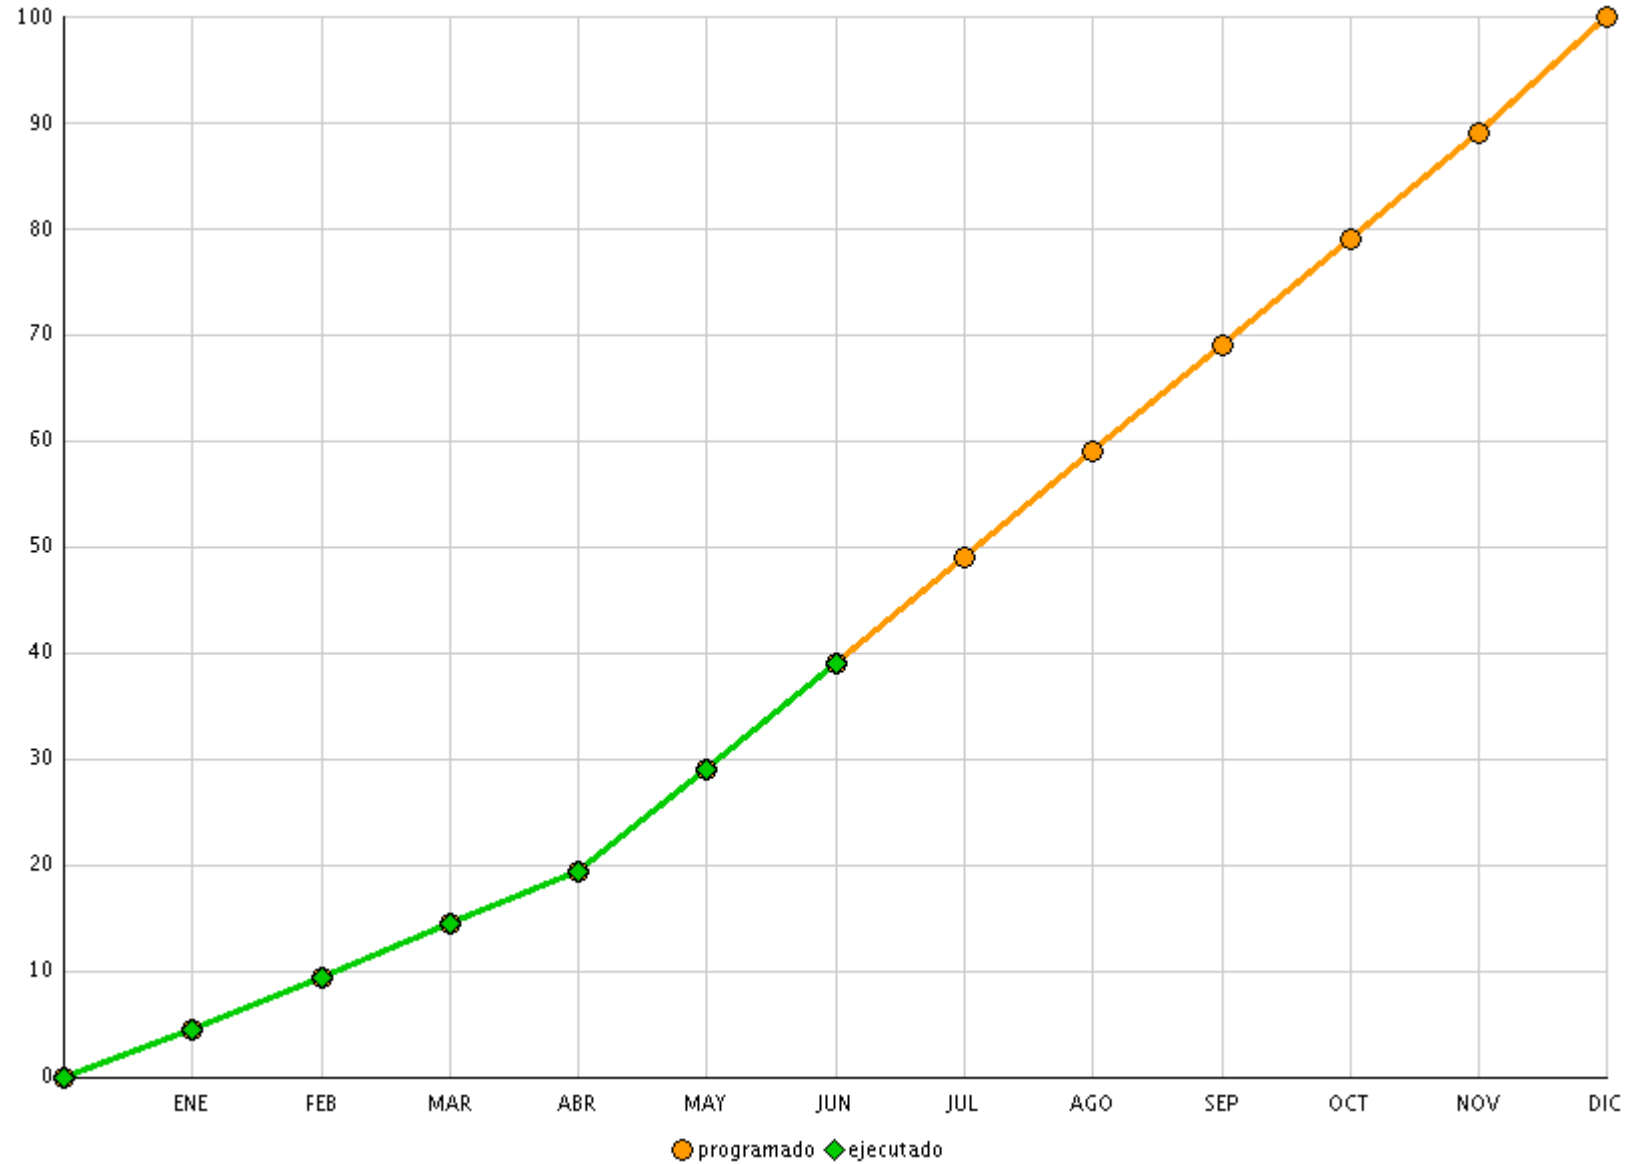

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.50	9.50	14.50	19.50	29.00	39.00	49.00	59.00	69.00	79.00	89.00	100.00
Ejecutado	4.50	9.50	14.50	19.50	29.00	39.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
102 Personeria Distrital
7719 31 Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES	20.00	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		15.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	55.00	11.00	
2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	20.00	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		15.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	55.00	11.00	
3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN	30.00	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		0.00		100.00	40.00	12.00	
4. EJECUCIÓN	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	10.50	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		44.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

102 Personeria Distrital

7732 20 Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	SEGUIMIENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PUBLICA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	11.00	11.00	12.00	12.00	6.00	6.00	14.00		14.00		14.00		14.00		7.00		0.00		100.00	37.00	11.10
2.	ATENCIÓN DE LAS PERSONAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E INTERÉS PUBLICO	40.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	20.00
3.	MEJORAR LA CREDIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL COMPROMISO CIUDADANO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										46.10

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

102 Personería Distrital

7742 25 Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DEBERES	5.00	3.00	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00		20.00		20.00		20.00		6.00		100.00	19.00	0.95
2. SENSIBILIZACIÓN A LAS PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, DEBERES Y OFERTA INSTITUCIONAL	13.00	1.00	1.00	3.00	3.00	11.00	11.00	14.00	14.00	11.00	11.00	15.00	15.00	8.00		8.00		8.00		8.00		7.00		6.00		100.00	55.00	7.15
3. ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	18.00	6.00	6.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	9.00
4. ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	18.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	11.00	11.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		5.00		100.00	55.00	9.90
5. ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		100.00	44.00	7.92
6. INTERVENCIÓN DENTRO DEL EJERCICIO DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA PREVENIR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y/O RESTABLECIMIENTO DE LOS MISMOS	18.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		4.00		100.00	51.00	9.18
7. SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	10.00	3.00	3.00	7.00	7.00	11.00	11.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	13.00		8.00		13.00		8.00		13.00		6.00		100.00	39.00	3.90

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 48.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

102 Personeria Distrital

7751 18 Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022


AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. SUSTANCIACIÓN LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS	90.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	36.00	
2. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	3.00	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		39.00	

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

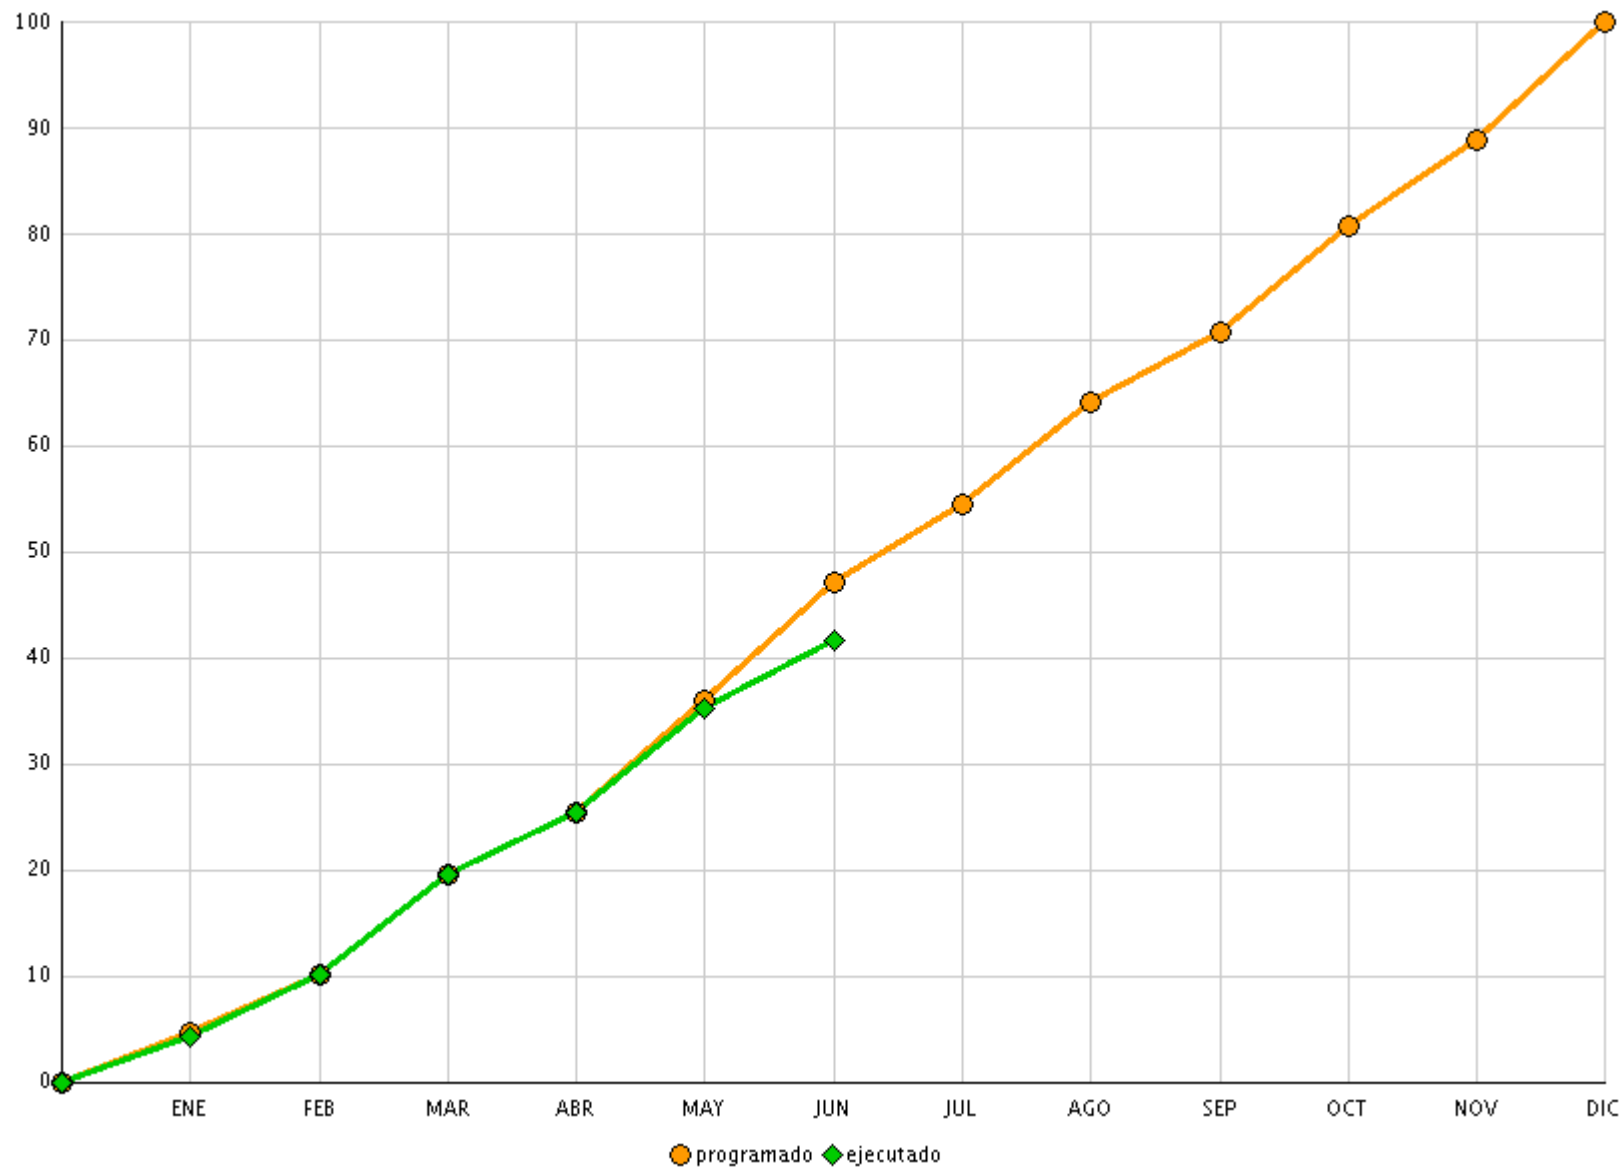


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.70	10.10	19.63	25.42	36.09	47.11	54.55	64.14	70.77	80.74	88.91	100.00
Ejecutado	4.35	10.10	19.63	25.42	35.19	41.74						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7868 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

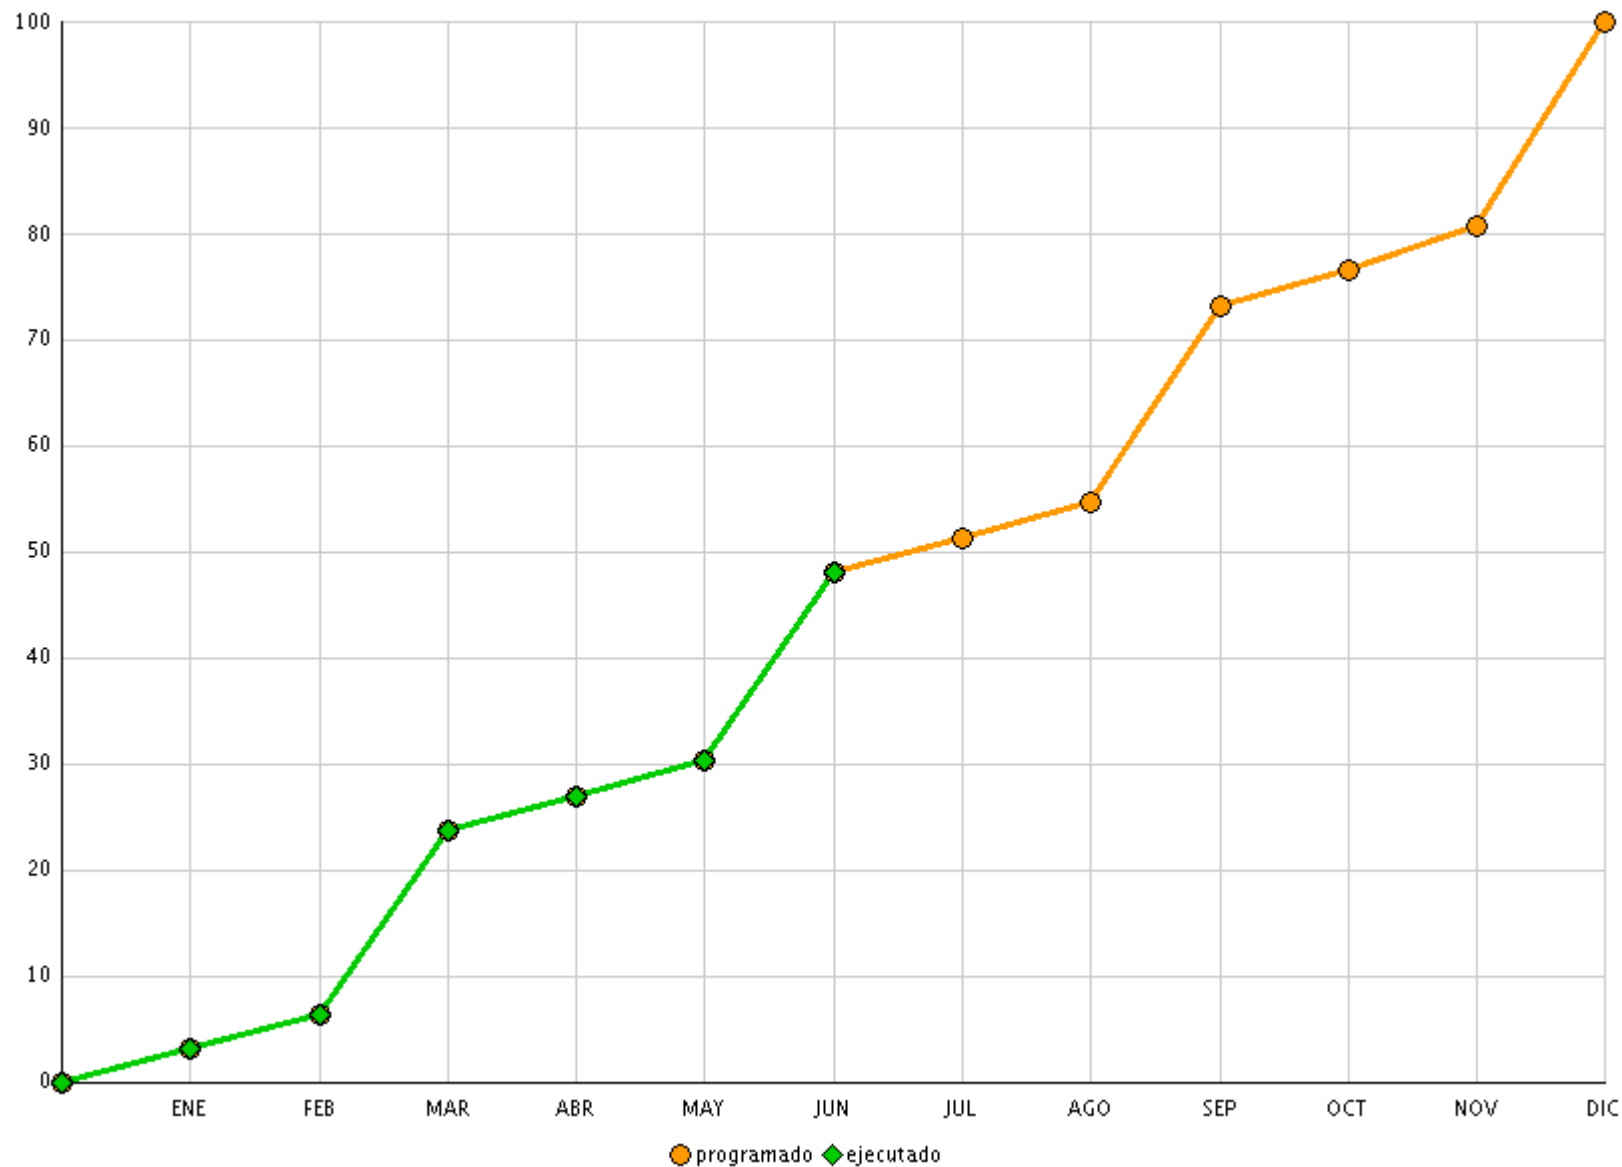


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.14	6.40	23.76	27.04	30.32	48.02	51.36	54.70	73.29	76.63	80.69	100.00
Ejecutado	3.14	6.40	23.76	27.04	30.32	48.02						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

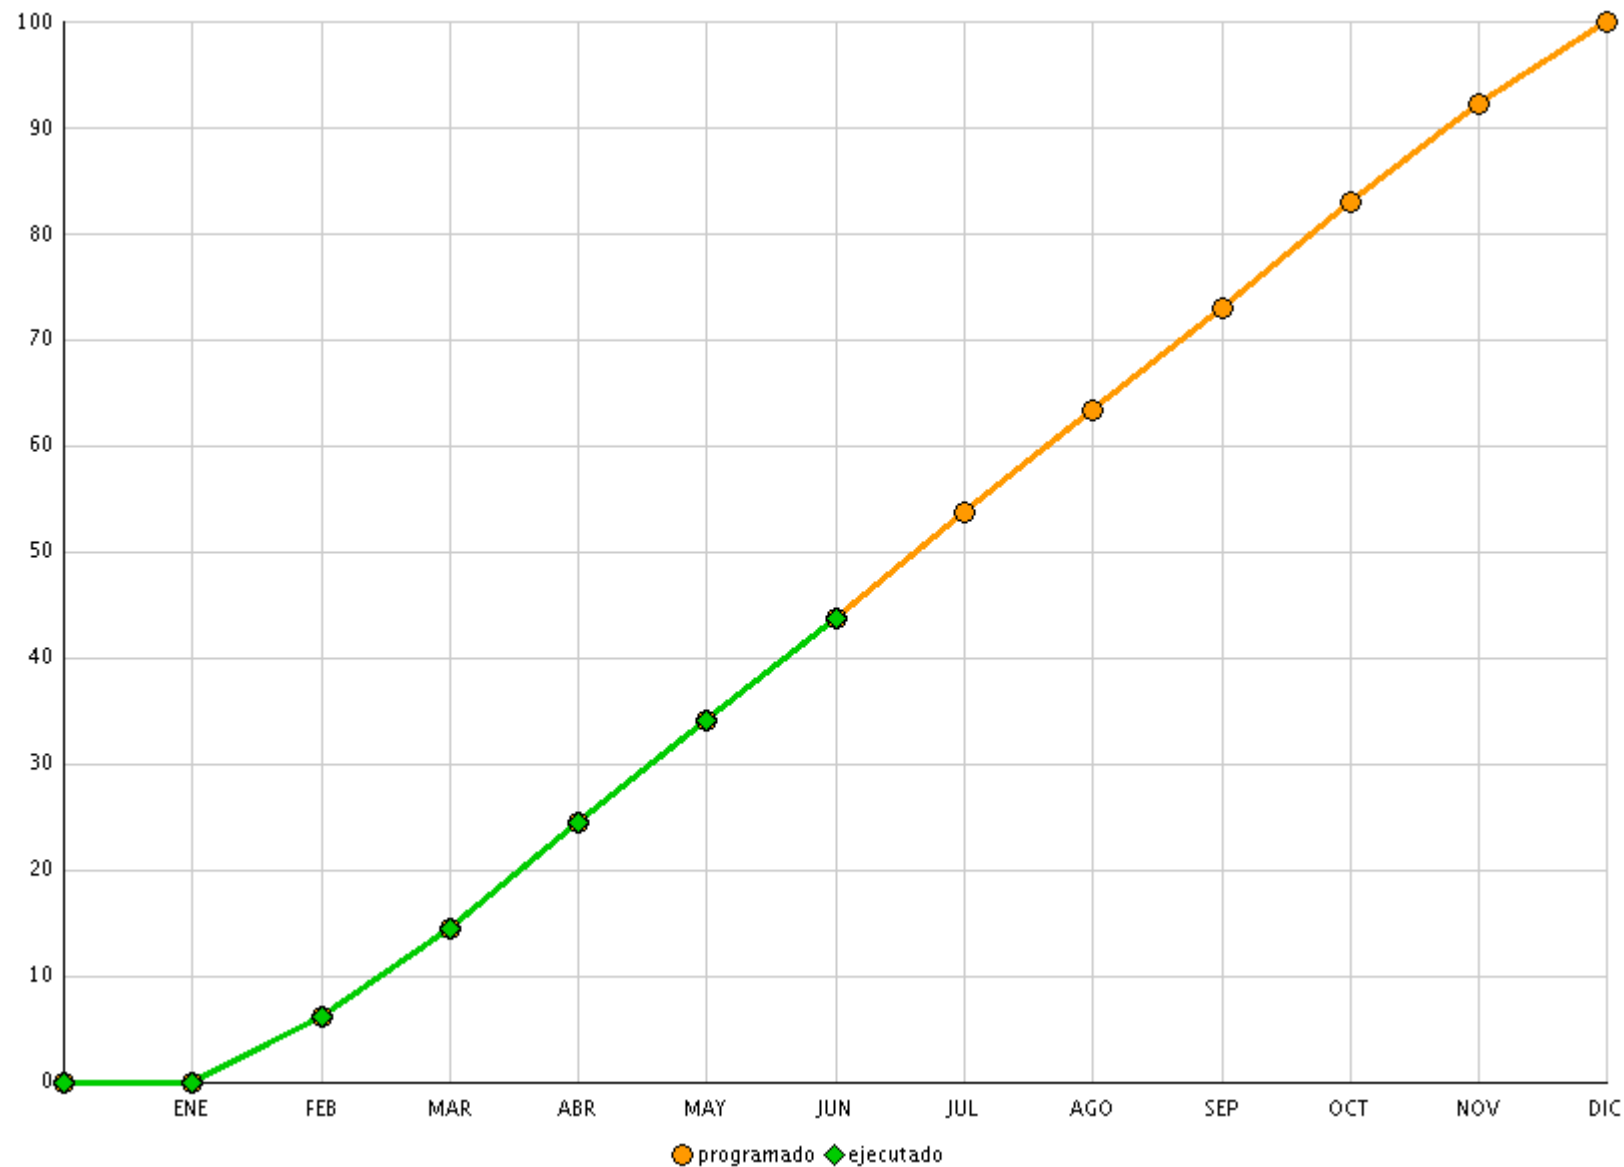


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	6.25	14.60	24.60	34.20	43.80	53.80	63.40	73.00	83.00	92.25	100.00
Ejecutado	0.00	6.25	14.60	24.60	34.20	43.80						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.

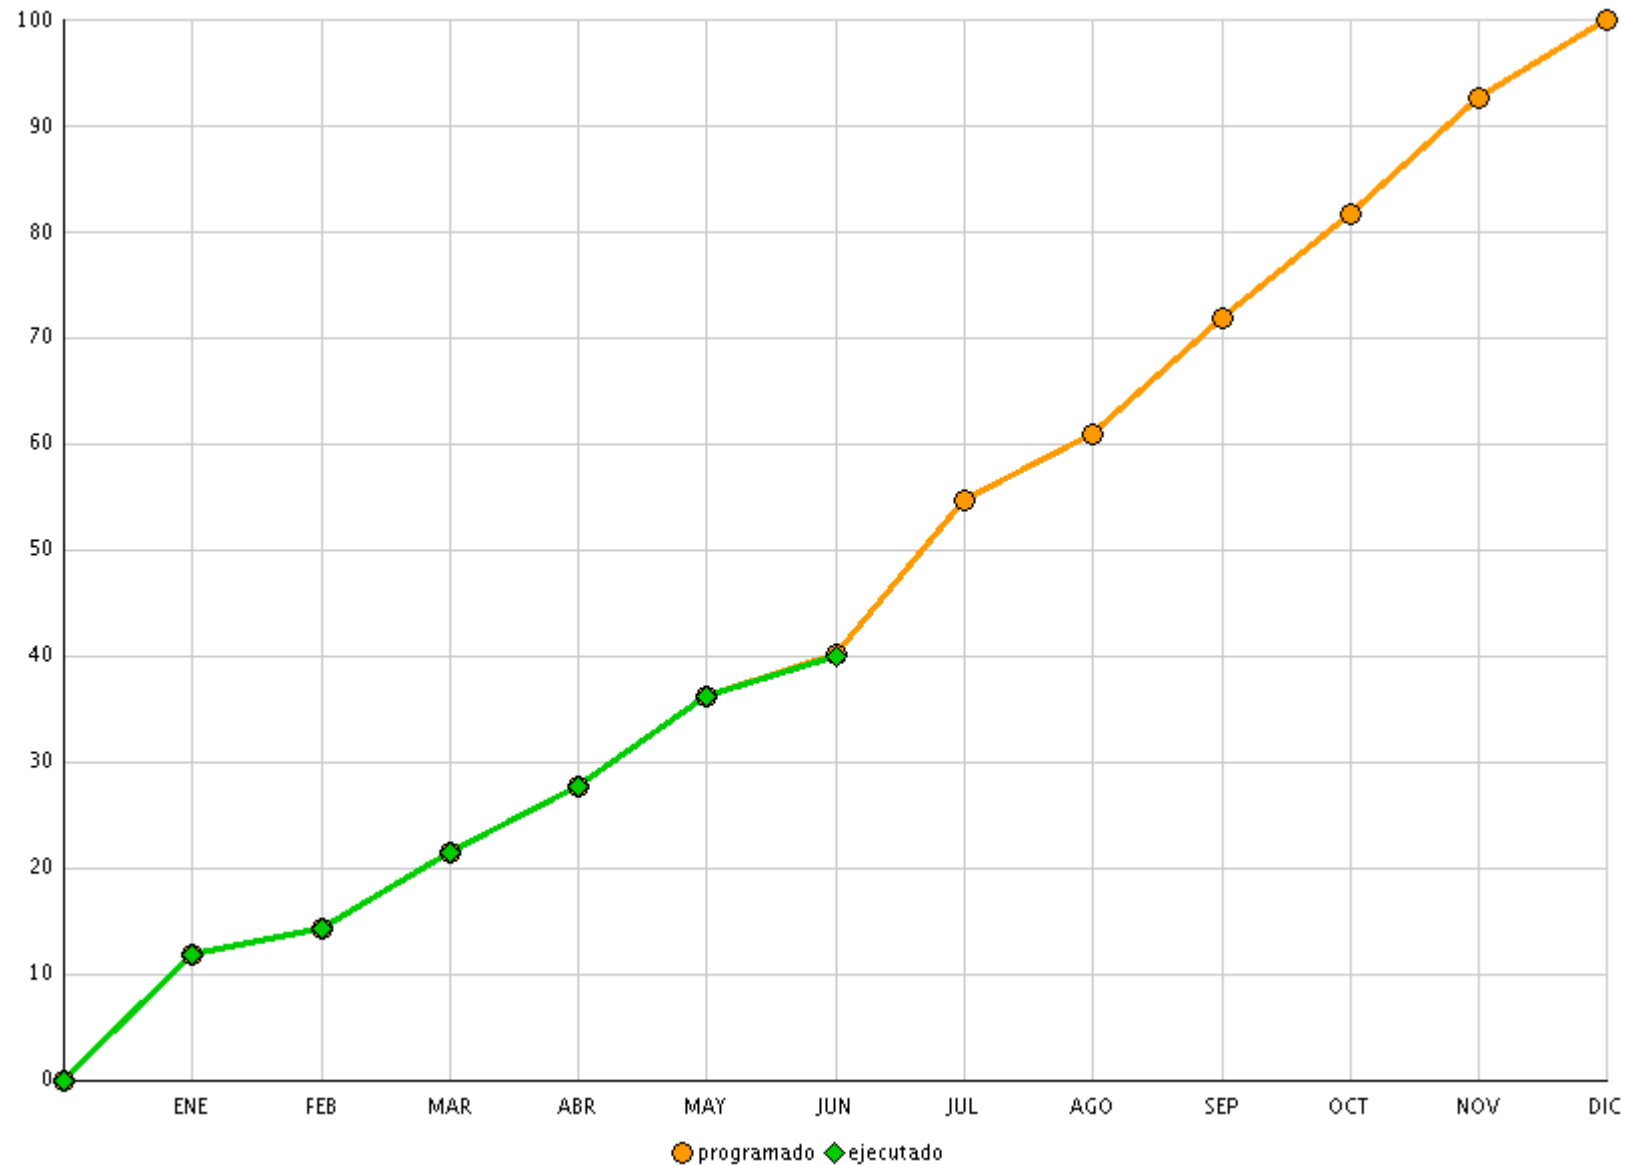


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	11.84	14.42	21.57	27.69	36.27	40.28	54.69	60.99	71.85	81.70	92.56	100.00
Ejecutado	11.84	14.42	21.57	27.69	36.27	39.99						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

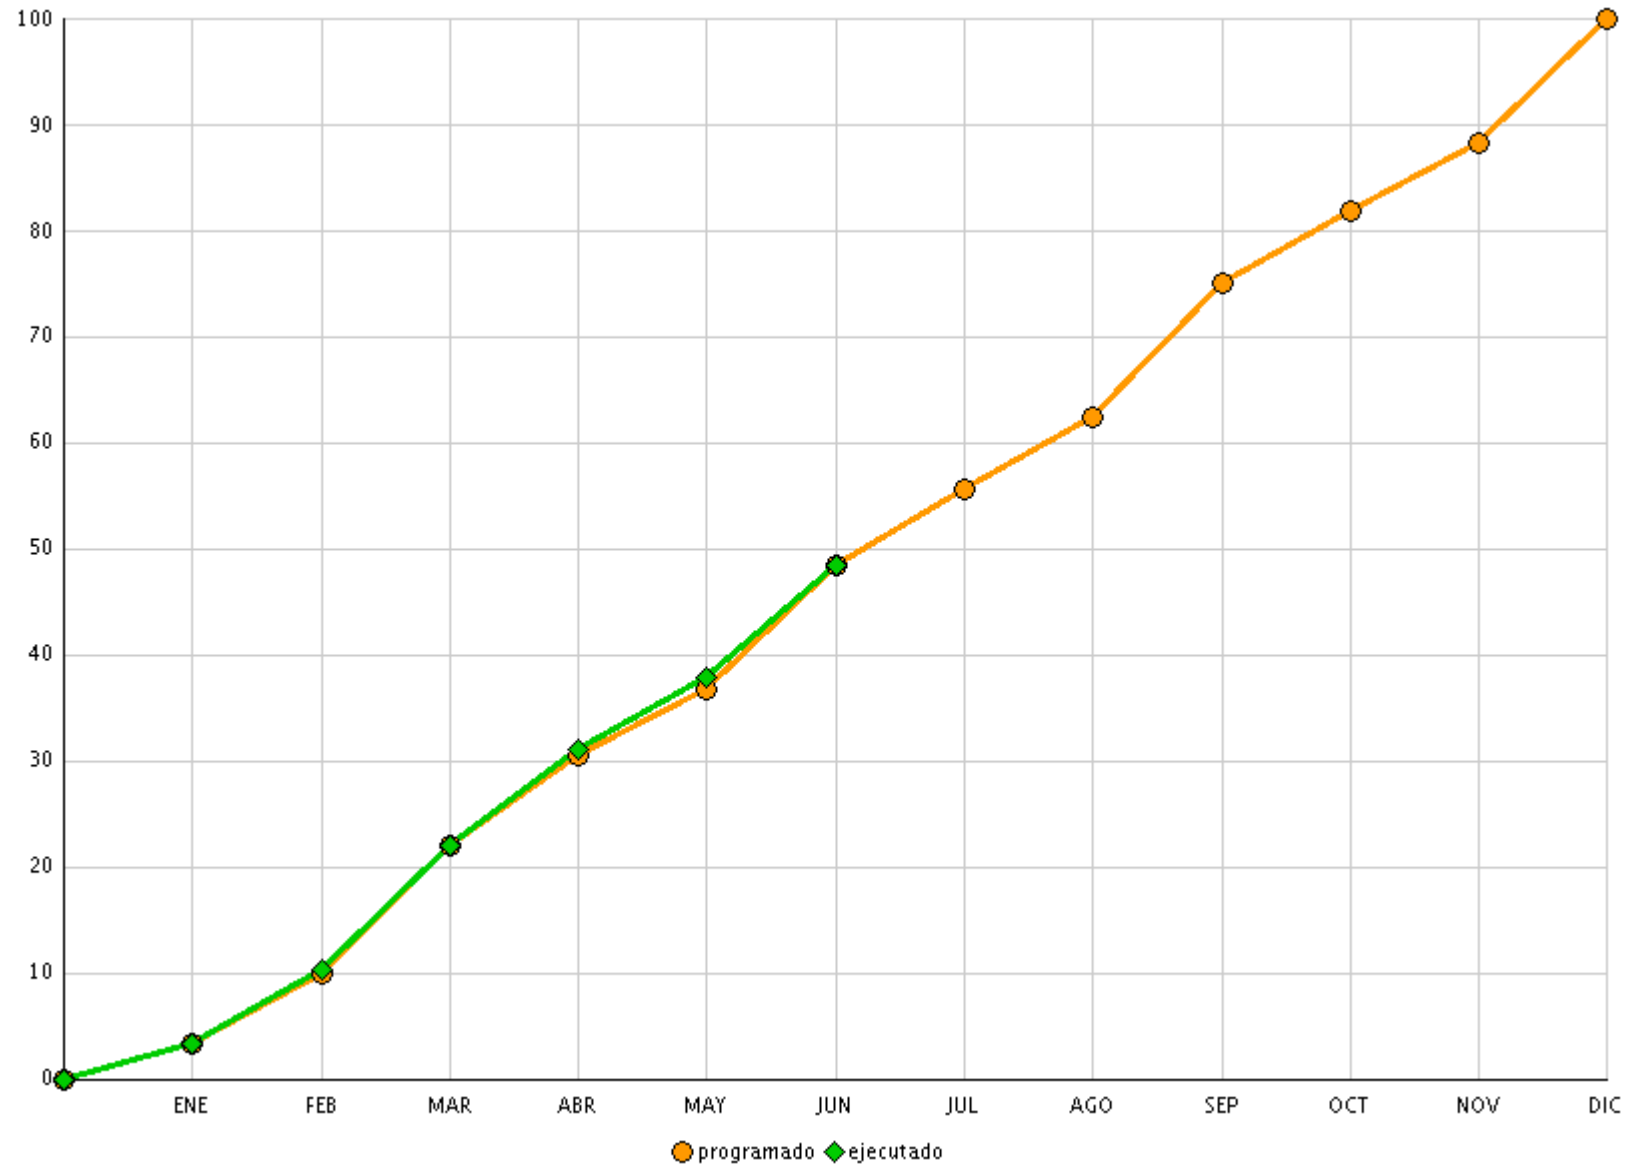


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.36	9.91	22.03	30.62	36.77	48.47	55.75	62.50	75.08	81.93	88.39	100.00
Ejecutado	3.45	10.37	22.12	31.10	37.87	48.41						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7872 Transformación digital y gestión TIC

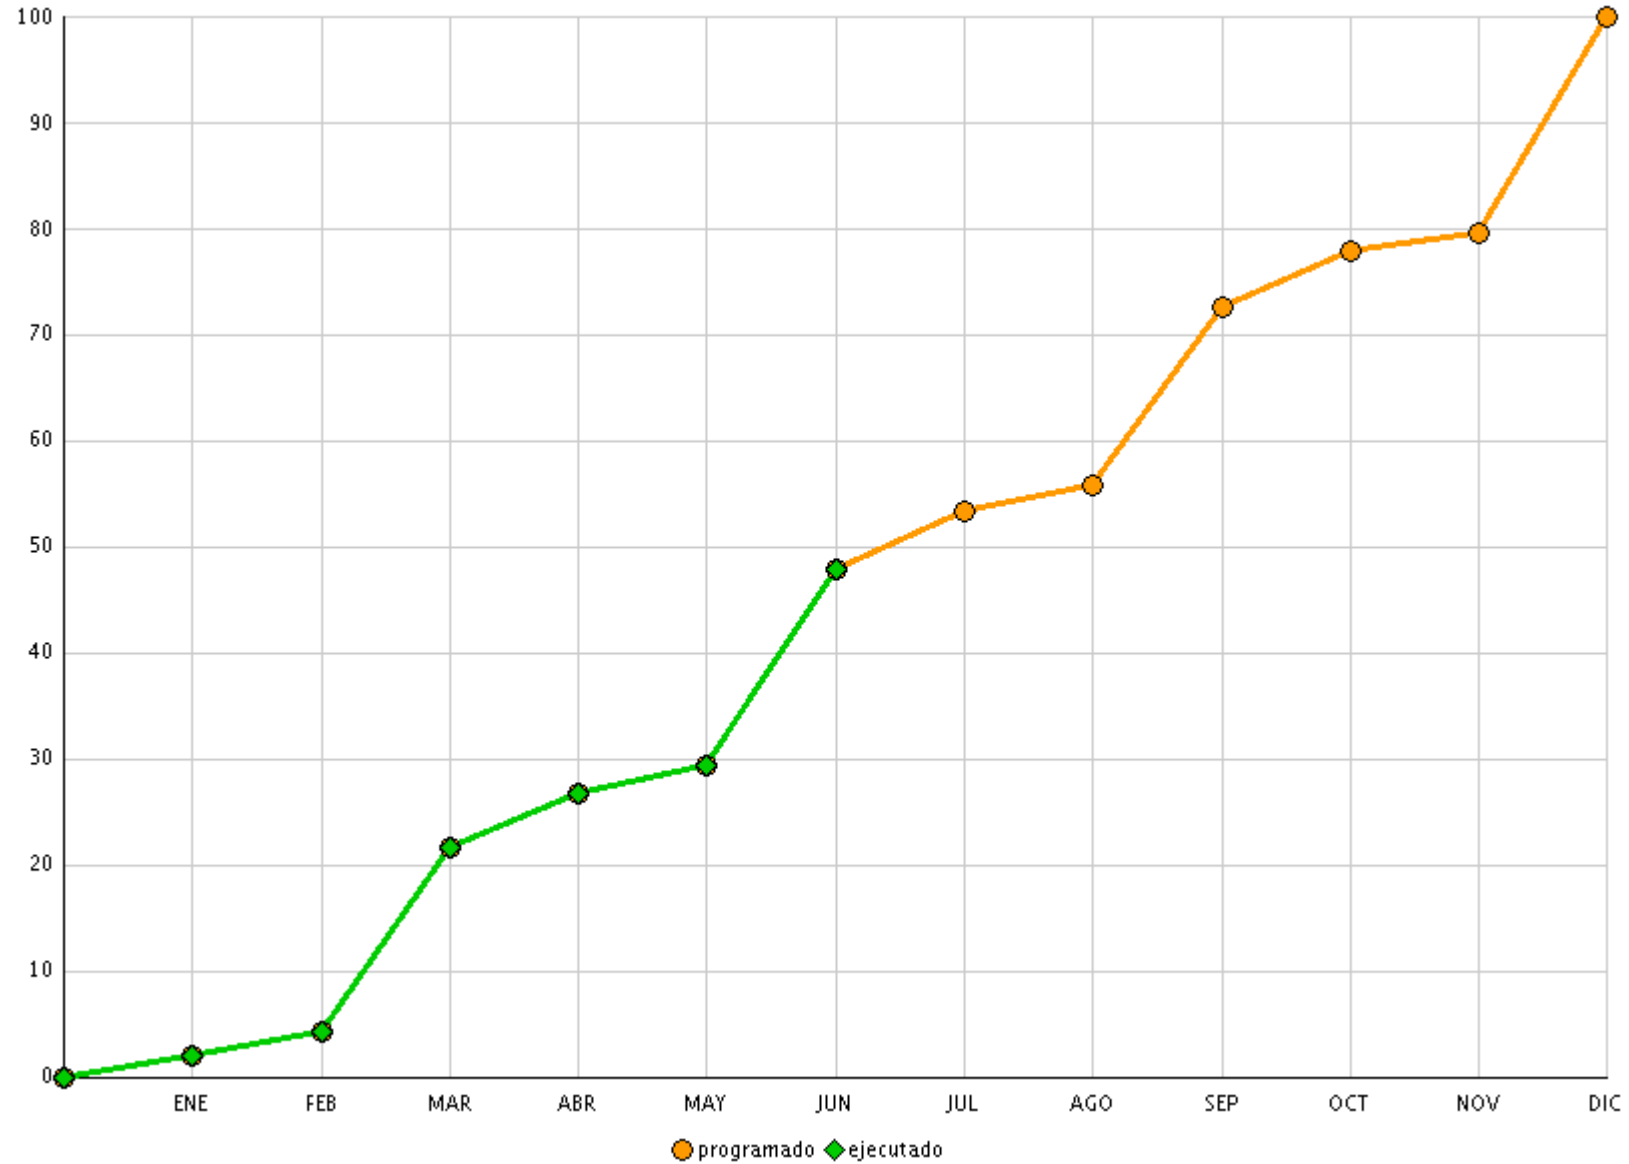


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.15	4.33	21.70	26.79	29.44	47.99	53.47	55.85	72.70	77.87	79.69	100.00
Ejecutado	2.15	4.33	21.70	26.79	29.44	47.99						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General

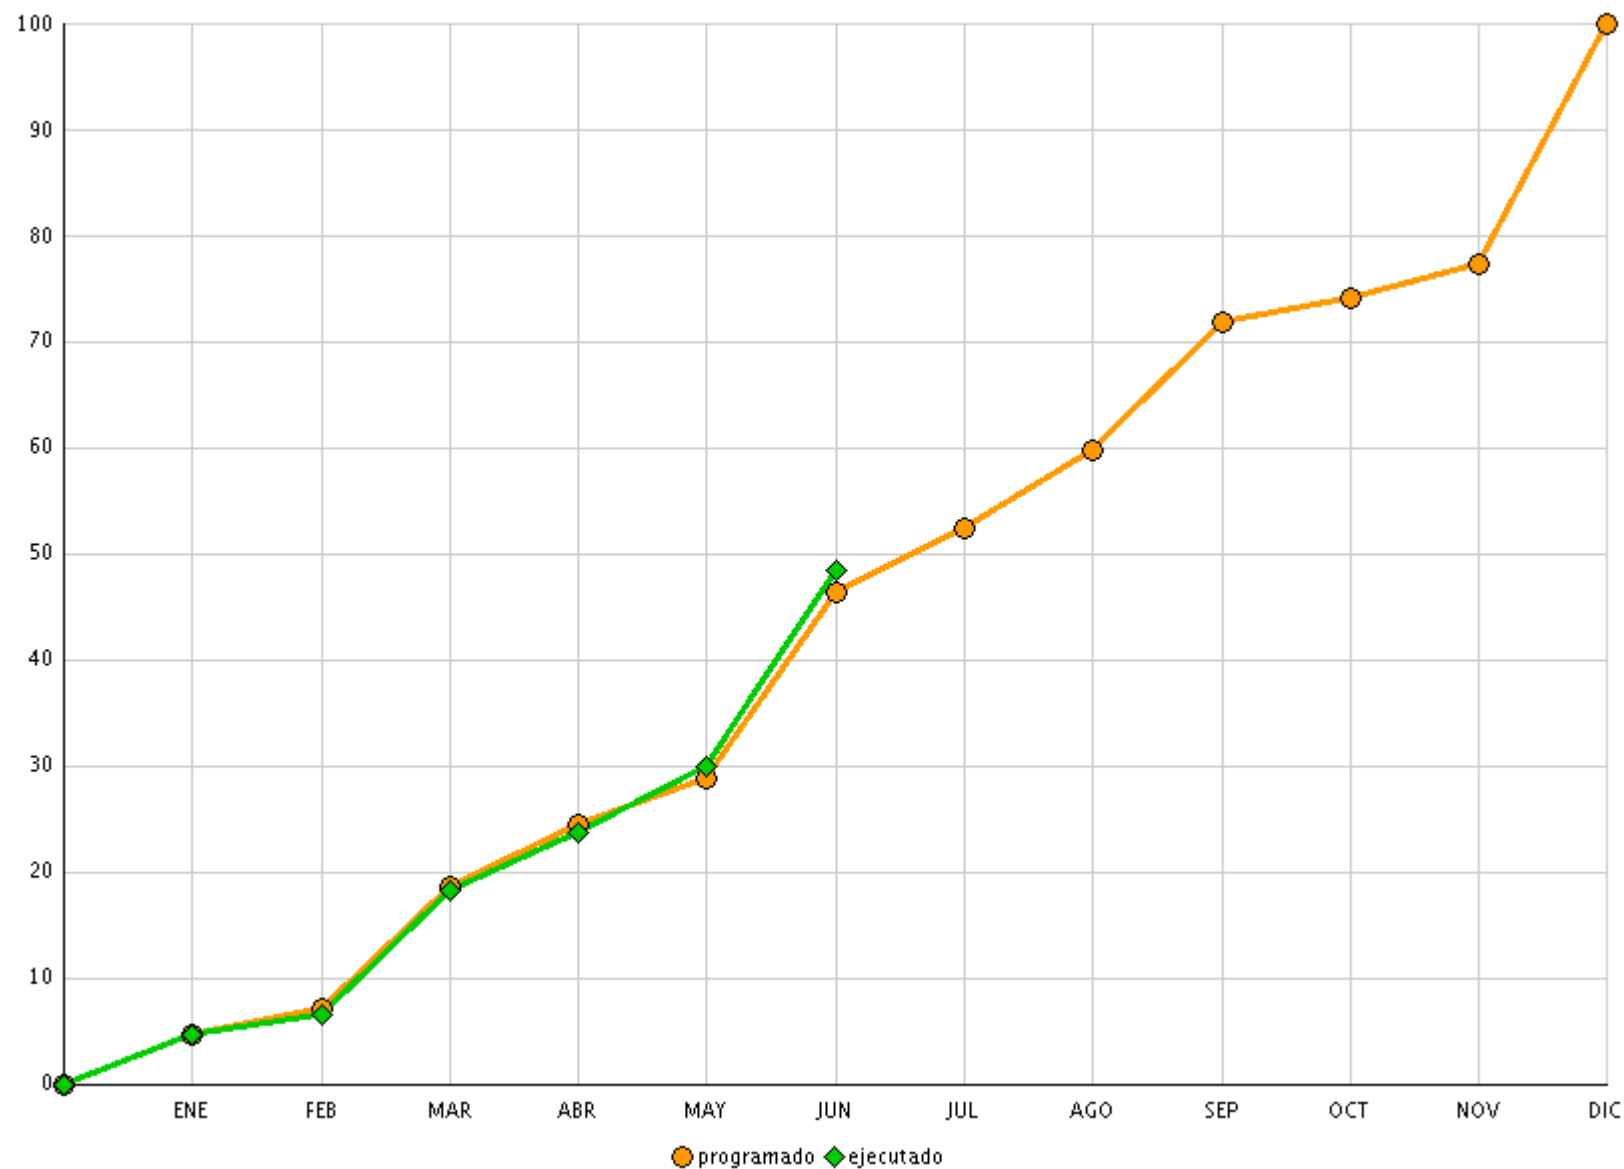

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.79	7.16	18.65	24.47	28.93	46.45	52.54	59.83	71.85	74.17	77.42	100.00
Ejecutado	4.79	6.66	18.23	23.71	29.95	48.52						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaría General

7867 16 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA OFICIALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES QUE COMPONEN EL MODELO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA.	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	33.00		0.00		6.00		6.00		0.00		33.00		100.00	22.00	0.66
2.	ESTRUCTURAR EL MODELO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DISTRITAL.	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	33.00	25.00	0.00		6.00		0.00		6.00		33.00		0.00		100.00	47.00	1.88
3.	DISEÑAR Y DESARROLLAR LOS TEMAS ESTRATÉGICOS Y COYUNTURALES DE LA CIUDAD Y SU GOBIERNO.	42.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	6.00	6.00		11.00		6.00		11.00		6.00		11.00		100.00	44.00	18.48
4.	ADMINISTRAR Y EMPRENDER ACCIONES EN LAS PLATAFORMAS Y MEDIOS VIRTUALES DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA, ACERCANDO A LA CIUDADANIA A LA GESTIÓN DEL DISTRITO.	11.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	5.06
5.	DIVULGAR LOS TEMAS ESTRATÉGICOS Y COYUNTURALES DE LA CIUDAD Y SU GOBIERNO A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	34.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	6.00	6.00		11.00		6.00		11.00		6.00		11.00		100.00	44.00	14.96
6.	REALIZAR MEDICIÓN DE OPINIÓN RELACIONADA CON LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	5.00	7.00	0.00	7.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	7.00	0.00	18.00		0.00		18.00		0.00		18.00		7.00		100.00	14.00	0.70
7.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN Y REALIDADES DE LOS TERRITORIOS EN BOGOTÁ-REGIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							41.74			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7868 13 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. HACER SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
2. FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN DISTRITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
3. REALIZAR LOS DISEÑOS REQUERIDOS DE LA RED DISTRITAL DE ARCHIVOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE ARCHIVOS PÚBLICOS ABIERTOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	40.00	1.60
4. GENERAR ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE RELACIONAMIENTO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
5. DESARROLLAR INSTRUMENTOS PARA FORMALIZAR LAS RELACIONES CON ACTORES INTERNACIONALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
6. IMPLEMENTAR UN PLAN DE RELACIONAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL DISTRITO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
7. REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
8. DESARROLLAR UN ECOSISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
9. FORMULAR Y ACTUALIZAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS, ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN EL DISTRITO CAPITAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.50
10. IMPLEMENTAR EL MODELO DE ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA QUE PERMITA APOYAR A LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ARCHIVOS EN EL DISTRITO CAPITAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
11. DESARROLLAR ACCIONES DE PARTICIPACIÓN EN REDES DE CIUDAD, CAMPAÑAS Y PLATAFORMAS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
12. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE CIUDAD A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN BOGOTÁ Y EN EL EXTERIOR.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
13. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50
14. REALIZAR UN PROGRAMA DE TELETRABAJO SOBRE LA PLANTA LABORAL EN ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
15. EJECUTAR ACCIONES PARA LA NEGOCIACIÓN, DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN SINDICAL EN EL DISTRITO CAPITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
16. REALIZAR LAS ACCIONES GENERALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, ASUNTOS Y TEMAS ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	36.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	17.28
17. REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		70.00		100.00	20.00	0.40
18. REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE	2.00																									100.00	50.00	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaria General

7868 13 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA Y SU SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00				
19. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DATOS EN TRANSPARENCIA PARA ARTICULAR LAS INICIATIVAS DE LAS ENTIDADES DISTRITALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
20. DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A LA TECNIFICACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA IMPRENTA DISTRITAL	4.00	6.25	6.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.75	7.75	7.75	7.75	8.25	8.25	9.25		9.25		9.25		9.25		9.25		9.25		100.00	44.50	1.78
21. POSICIONAR A LA IMPRENTA DISTRITAL COMO UN ALIADO ESTRATÉGICO, PARA VISIBILIZAR LA GESTIÓN, DESEMPEÑO Y TRANSPARENCIA PÚBLICA	1.00	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.46
22. REALIZAR PROCESOS DE CARACTERIZACIÓN, PROCESAMIENTO, ACCESO Y PUESTA AL SERVICIO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DISTRITO CAPITAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.00
23. DESARROLLAR INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA MEMORIA HISTÓRICA DE BOGOTÁ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		45.00		0.00		0.00		5.00		100.00	50.00	1.50
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		48.02		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaría General

7869 14 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. DESARROLLAR EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO CON ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00		
2. SOCIALIZAR EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO PARA SU POSICIONAMIENTO Y APROPIACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	10.00		0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00		
3. REALIZAR ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS Y MONITOREO DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO.	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	6.00	6.00	10.00	10.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00		6.00		6.00		10.00		10.00		15.00		100.00	43.00	4.30		
4. HACER MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO A LA PLATAFORMA VIRTUAL DE GOBIERNO ABIERTO.	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	12.50		
5. REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO DE BOGOTÁ.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		0.00		100.00	45.00	4.50		
6. DESARROLLAR PROCESOS DE CUALIFICACIÓN Y PEDAGOGÍA CIUDADANA PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN PILARES DE GOBIERNO ABIERTO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00		
7. IMPLEMENTAR TRES (3) AGENDAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CIUDADANA A PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	4.50		
8. IMPLEMENTAR UN PLAN DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA CIUDADANÍA DIGITAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		43.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaría General

7870 13 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GENERAR E IMPLEMENTAR UN MODELO INTEGRAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU RELACIÓN CON EL SISTEMA	14.30	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	6.86
2.	REALIZAR MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y LA EFECTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS ENTIDADES DISTRITALES.	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		16.00		16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.	CUMPLIR AL 100% EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA.	14.20	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	50.00	7.10
4.	FORTALECER LA ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES DISTRITALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL EJERCICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	14.30	20.00	20.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00		0.00		16.00		0.00		16.00		0.00		100.00	52.00	7.44
5.	MEDIR EL NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA E IVC EN LAS ENTIDADES DISTRITALES.	14.30	20.00	20.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00		0.00		16.00		0.00		16.00		0.00		100.00	52.00	7.44
6.	FACILITAR LA ATENCIÓN CON CALIDAD A LA CIUDADANÍA EN LA RED CADE CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PREFERENCIAL.	14.30	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	38.00	5.43
7.	FORTALECER E IMPLEMENTAR EN LOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES EN LA RED CADE, ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA ACORDE A SUS CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES Y PARTICULARES.	14.30	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	5.72

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 39.99

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaria General
7871 14 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1.	GENERAR ACCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CMPR EN LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE BOGOTÁ.				4.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		14.00		0.00		14.00		0.00		14.00		100.00	28.00	1.12	
2.	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CMPR				3.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	10.00	12.50		12.50		12.50		0.00		12.50		12.50		100.00	35.00	1.05	
3.	REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CIUDADANAS DE MEMORIA, PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN, EN EL CMPR.				4.00	0.00	0.00	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40		9.40		9.40		9.40		9.40		6.00		100.00	47.00	1.88		
4.	PROMOVER VISITAS GUIADAS AL CMPR E INTERCAMBIOS CON ACTORES EDUCATIVOS, SOCIALES, INSTITUCIONALES Y CIUDADANOS.				4.00	0.00	0.00	0.00	12.50	25.00	12.50	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.34	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00	
5.	ASESORAR Y DIVULGAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MEMORIA.				3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	7.60	7.60	11.50	11.50	7.60	7.60	11.50	11.50	11.50		11.50		11.50		11.50		7.70		4.10		100.00	42.20	1.27	
6.	GENERAR ACCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MEMORIA, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN.				3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	9.70	9.70	9.70	9.70	13.00	13.00	9.70	9.70	9.70		9.70		9.70		9.70		9.70		3.40		100.00	48.10	1.44	
7.	IDENTIFICAR, APOYAR Y CONSTRUIR PROCESOS TERRITORIALES DE MEMORIA EN LA CIUDAD, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL.				2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	14.00	7.00	7.00	15.00	15.00	7.00	7.00	15.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		100.00	50.00	1.00	
8.	DESARROLLAR EL CICLO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL , BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONPES D.C., PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE VÍCTIMAS, MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.				7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.50	
9.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE PAZ, RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN.				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	1.00	
10.	GENERAR PROCESOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO				2.00	7.00	3.50	7.00	7.00	11.00	11.00	7.00	10.50	7.00	7.00	11.00	11.00	7.00		7.00		11.00		7.00		7.00		11.00		100.00	50.00	1.00	
11.	IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LAS MEDIDAS Y ACCIONES DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL DISTRITO CAPITAL.				3.00	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00		16.70		0.00		16.70		0.00		16.50		100.00	50.10	1.50	
12.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA RUTA DE REPARACIÓN INDIVIDUAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.				3.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.49
13.	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA.				4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
14.	ARTICULAR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ENTIDADES, EN EL MARCO DE LOS CENTROS LOCALES DE ATENCIÓN.				2.00	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	16.50	16.50	5.60	5.60	5.60	5.60	16.50		5.60		5.60		16.60		5.60		5.60		100.00	44.50	0.89	
15.	EFECTUAR ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LA CONVIVENCIA Y A LA RECONCILIACIÓN.				2.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.00	
16.	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y				3.00																									100.00	46.70	1.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaria General

7871 14 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS EN EL DISTRITO.		6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	13.20	13.20	6.70	6.70	6.70	6.70	13.20		6.70		6.70		13.30		6.70		6.70				
17. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL DISTRITO.	5.00	8.30	8.30	8.30	5.50	8.30	11.10	8.30	8.30	8.30	10.41	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	51.91	2.60
18. FORMULAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE VÍCTIMAS, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	2.00	0.00	8.30	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	8.33	25.00	8.37	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
19. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	0.00		0.00		28.50		14.30		14.30		14.30		100.00	28.60	0.57
20. ASESORAR Y DIFUNDIR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE VÍCTIMAS, PAZ, RECONCILIACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS.	2.00	9.10	9.10	6.10	6.10	6.10	6.10	14.90	14.90	6.10	6.10	6.10	6.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		6.10		100.00	48.40	0.97
21. GESTIONAR ALIANZAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA HACER DE BOGOTÁ UN TERRITORIO DE RECONCILIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANT	2.00	0.00	0.00	10.50	10.50	10.30	10.30	6.90	6.90	6.90	10.30	13.80	10.40	6.90		6.90		10.30		6.90		6.90		13.70		100.00	48.40	0.97
22. EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL, LOS COMITÉS LOCALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y SUS ESPACIOS RESPECTIVOS.	2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	8.63	20.60	17.77	0.00	3.60	7.80		9.50		20.60		0.00		0.00		27.00		100.00	35.00	0.70
23. APOYAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN.	6.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	2.99
24. FORTALECER ESPACIOS DE CAPACITACIÓN Y PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA, LAS VÍCTIMAS Y SUS ORGANIZACIONES FORMALES Y NO FORMALES.	2.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.00
25. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ.	4.00	3.30	3.30	6.70	6.70	13.30	13.30	6.70	6.70	6.70	6.70	13.30	13.30	6.70		3.30		10.00		6.70		10.00		13.30		100.00	50.00	2.00
26. LIDERAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE APOYO A LOS PROCESOS DE DESMOVILIZACIÓN, DESVINCULACIÓN REINCORPORACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN LA CIUDAD REGIÓN.	3.00	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	11.20	11.20	5.60	5.60	11.20	11.20	5.60		11.00		11.00		11.00		5.60		11.00		100.00	44.80	1.34
27. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LAS ACCIONES DE INTEGRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL.	2.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.00
28. LIDERAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA RUTA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 5 DE VÍCTIMAS DEL ACUERDO DE PAZ EN EL DISTRITO, EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00		10.00		5.00		5.00		10.00		15.00		100.00	50.00	2.00
29. GESTIONAR LA REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ.	2.00	16.50	16.50	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00	0.00	16.70		0.00		16.70		0.00		16.70		0.00		100.00	49.90	1.00
30. EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES DE LA NACIÓN, DEL DISTRITO Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROPÓSITO DE BOGOTÁ EPICENTR	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.50
31. FORMULAR DE MANERA PARTICIPATIVA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	4.80
32. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00		25.00		8.30		25.00		8.40		25.00		100.00	8.30	0.08

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaria General

7871 14 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
33. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		100.00	36.30	0.36
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								48.41

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7872 18 Transformación digital y gestión TIC

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DE DISEÑO DE SERVICIOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL PRIORIZADOS POR LA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL DE TIC	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.50
2.	ACOMPANAMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.50
3.	IMPLEMENTAR EL CICLO DE FORMULACIÓN PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE BOGOTÁ TERRITORIO INTELIGENTE; BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONPES	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	7.00
4.	ACOMPANAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS AGENDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
5.	HACER SEGUIMIENTO A LAS AGENDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
6.	DISEÑAR EL CENTRO DE RECURSOS DE TI COMPARTIDO.	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	7.00
7.	DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		30.00		100.00	30.00	2.10
8.	MONITOREAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		30.00		100.00	30.00	2.10
9.	ACTUALIZAR LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	3.00	6.00	6.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		10.00		9.00		8.00		7.00		6.00		100.00	50.00	1.50
10.	GESTIONAR Y MANTENER EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	14.00	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		6.00		6.00		100.00	55.00	6.05
11.	ACTUALIZAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SECRETARIA GENERAL¿	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00		8.00		8.00		7.00		6.00		4.00		100.00	54.00	3.24
12.	OPTIMIZAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DE DATOS DE LA SECRETARIA GENERAL	5.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		7.00		100.00	50.00	2.50
13.	FORTALECER LA GOBERNALIDAD DE TI EN LA SECRETARIA GENERAL	3.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		6.00		100.00	50.00	1.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.99

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7873 15 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR CINCO (5) TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	0.00		0.00		23.75		0.00		0.00		23.75		100.00	52.50	3.68
2. ORGANIZAR Y TRANSFERIR LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y MANTENER DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	18.73	0.00		0.00		23.75		0.00		0.00		23.75		100.00	47.48	3.32
3. IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN.	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	14.25	0.00		0.00		23.75		0.00		0.00		23.75		100.00	43.00	3.01
4. FORTALECER LA GESTIÓN CORPORATIVA, JURÍDICA Y LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CONFORME CON LAS NECESIDADES DE LA OPERACIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
5. ADELANTAR LAS OBRAS Y/O INSTALACIONES QUE SE REQUIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	8.00	8.00	2.00	12.00	0.00	0.00		32.00		0.00		0.00		0.00		36.00		100.00	16.00	1.12
6. FORMULAR Y EJECUTAR EL CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES.	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	80.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		65.00		100.00	85.00	8.50
7. ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA GENERAL.	3.00	7.60	7.60	8.40	8.40	0.50	0.50	10.10	10.10	13.50	13.50	9.00	9.00	2.60		13.10		11.30		5.70		14.10		4.10		100.00	49.10	1.47
8. ADQUIRIR LOS INSUMOS PARA EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES PROGRAMADOS EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL.	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	65.00	0.00	0.00	60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	3.75
9. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y LAS ACCIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	7.00	10.00	10.00	7.50	7.50	7.50	7.50	10.00	10.00	7.50	7.50	7.50	7.50	10.00		7.50		7.50		10.00		7.50		7.50		100.00	50.00	3.50
10. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD.	7.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
11. FORTALECER EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO.	7.00	12.00	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.00	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.00		10.00		5.00		5.00		12.00		12.00		100.00	44.00	3.08
12. LIDERAR LA FORMULACIÓN, MONITOREO Y REPORTE DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,Y DE PARTICIPACIÓN	7.00	11.00	11.00	5.67	5.67	11.00	11.00	5.67	5.67	11.00	11.00	5.67	5.67	11.00		5.67		11.00		5.66		11.00		5.66		100.00	50.01	3.50
13. PROCESAR, GENERAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.33		0.00		0.00		0.00		33.34		100.00	33.33	2.33
14. FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		20.00		100.00	50.00	3.50
15. ADQUIRIR LOS BIENES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES PROGRAMADOS EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	70.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	15.00	0.45
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								48.52

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7552 Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá

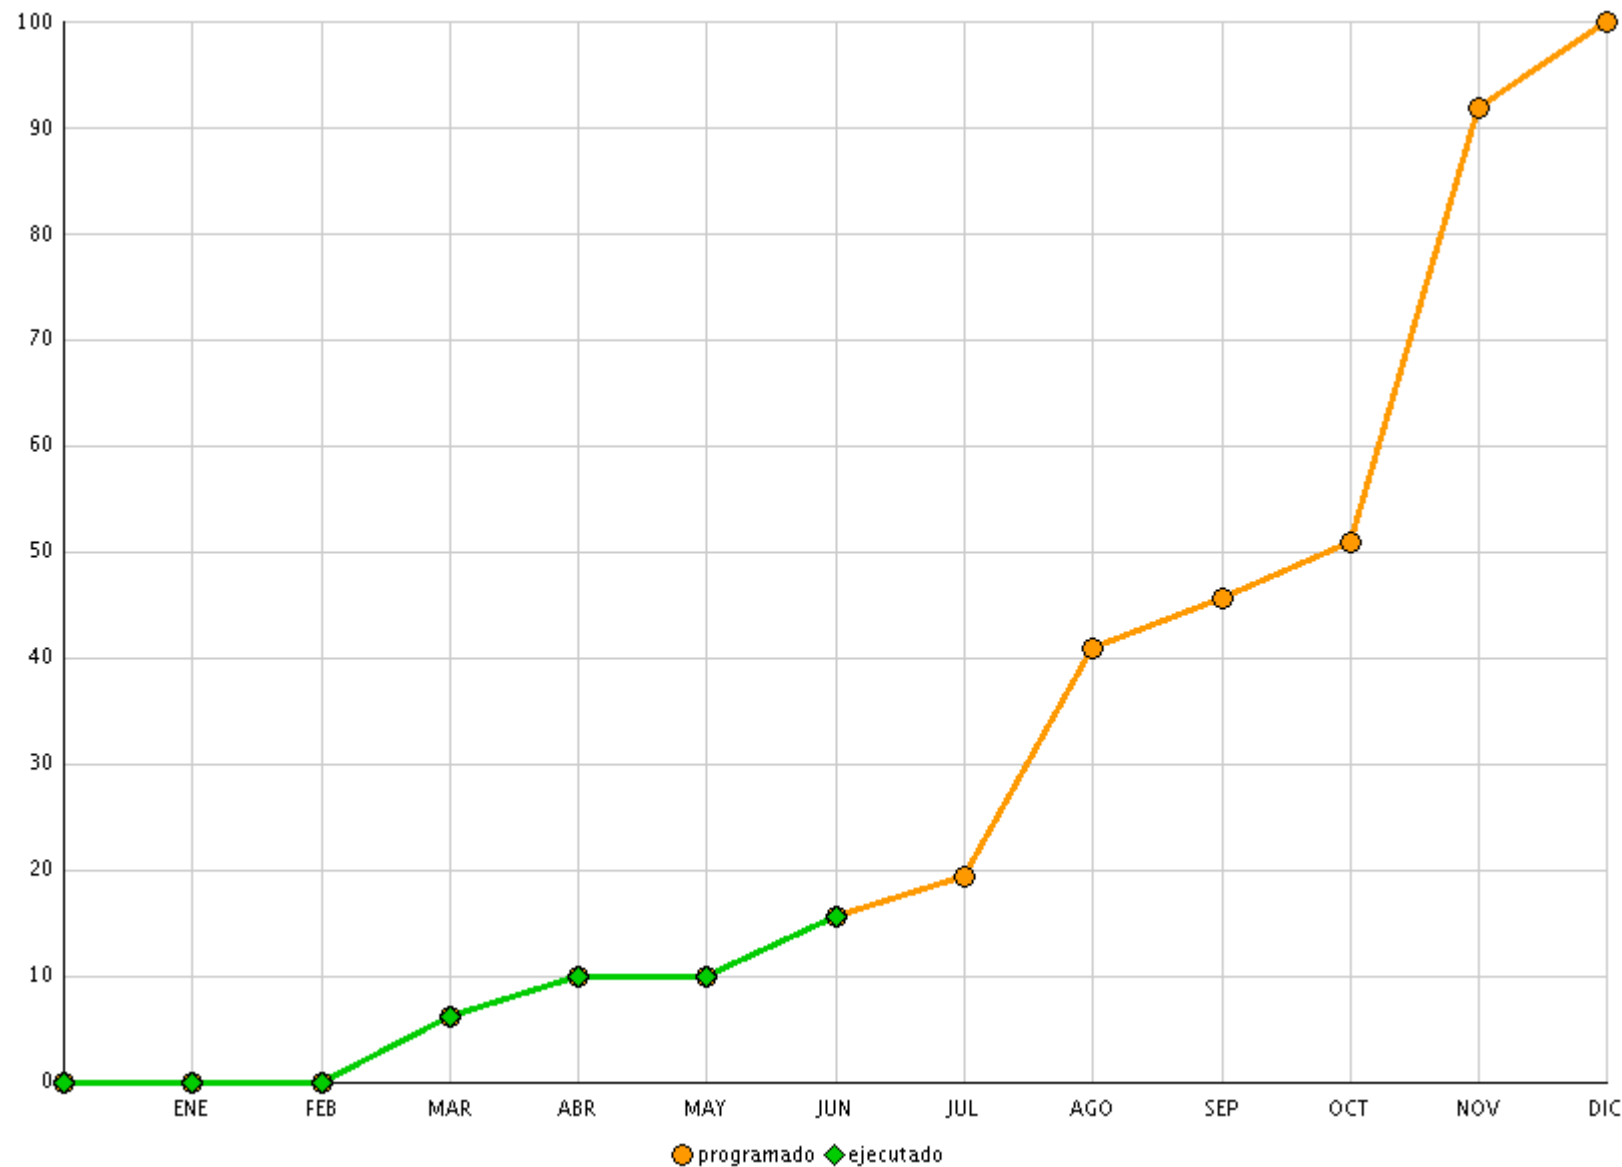


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	6.20	9.95	9.95	15.65	19.45	40.85	45.60	51.00	91.90	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.20	9.95	9.95	15.65						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI. 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022 a 30/06/2022

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7554 Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá

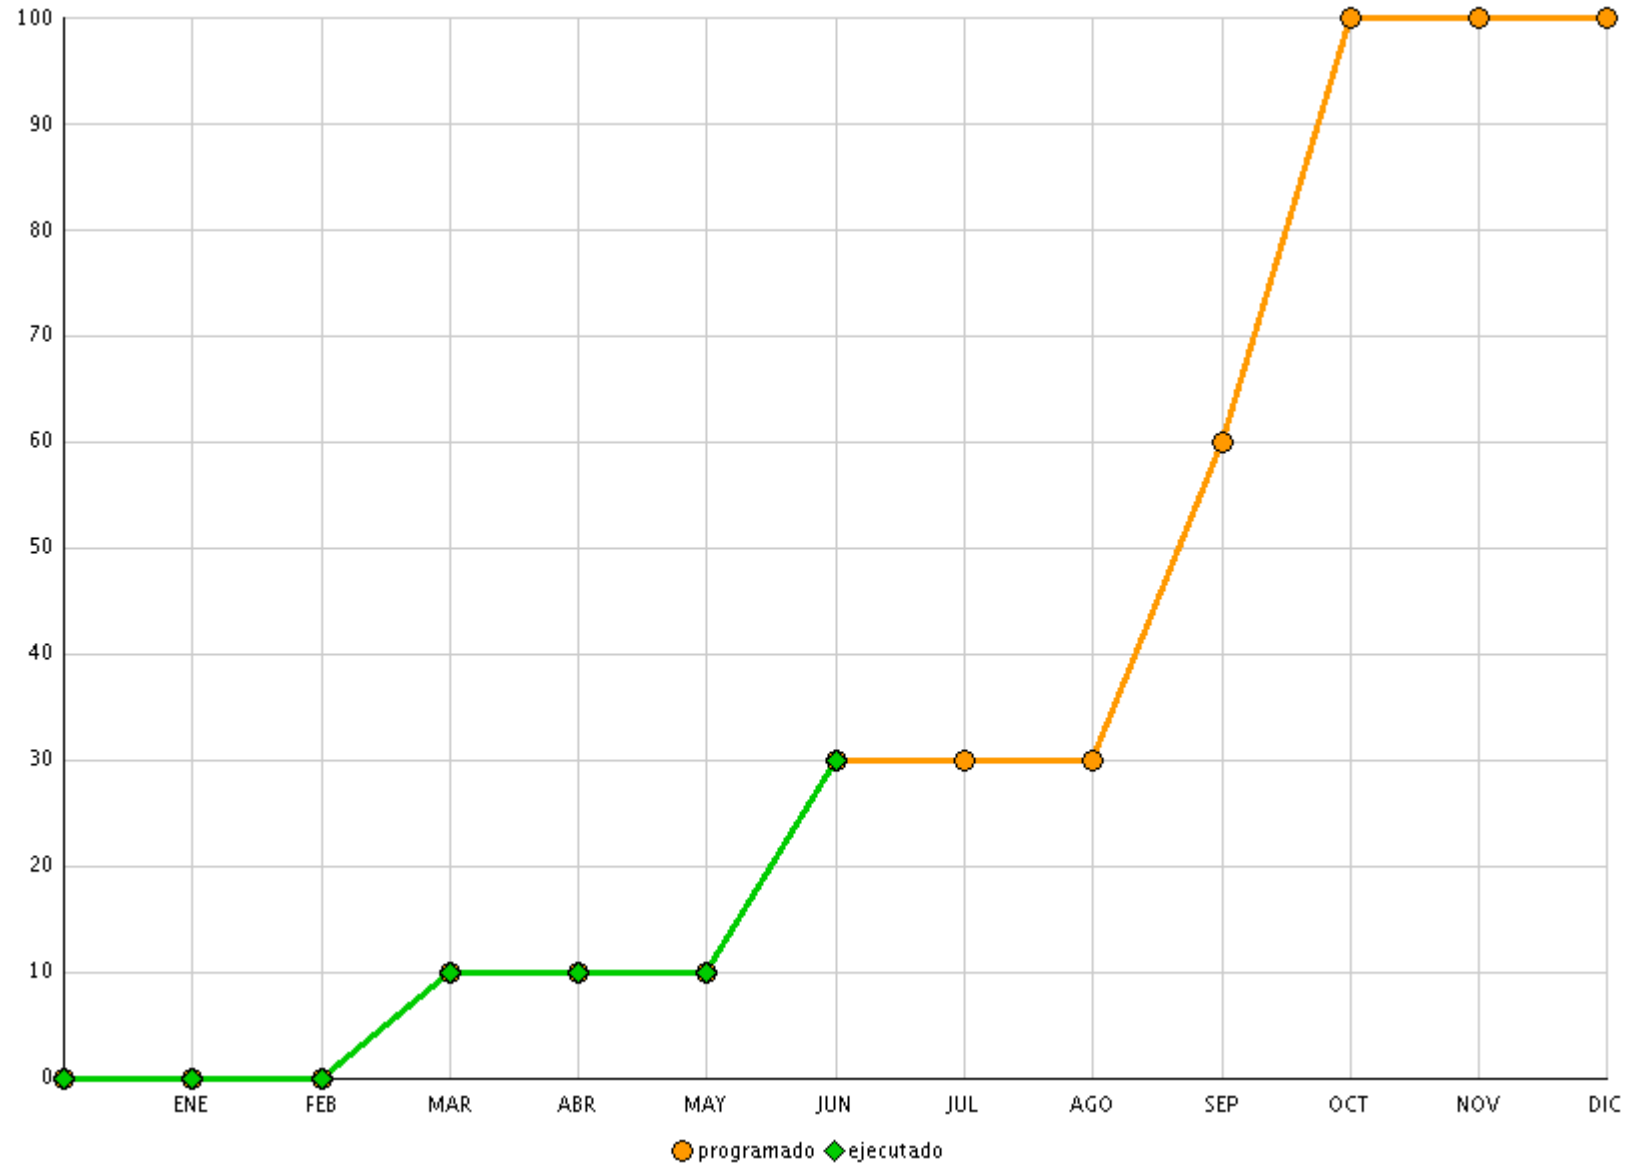


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	60.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00						

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7561 Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá

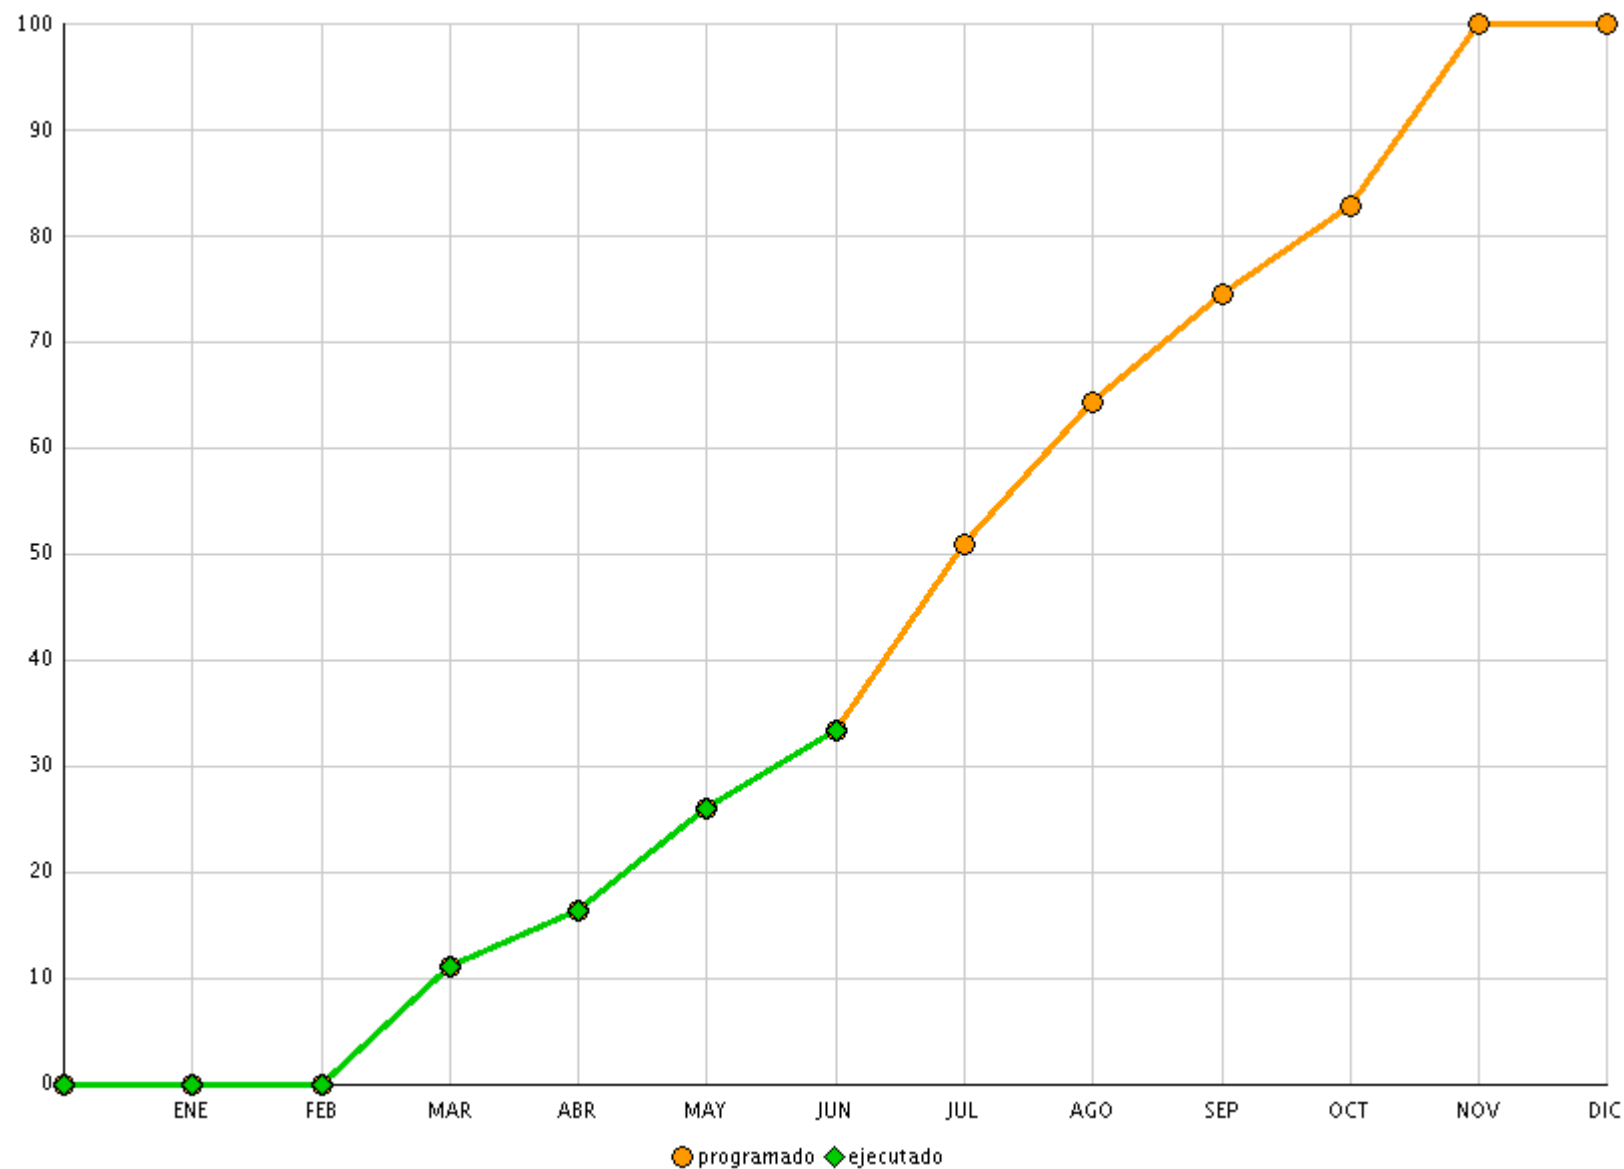


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	11.05	16.40	25.95	33.30	50.95	64.40	74.45	82.90	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	11.05	16.40	25.95	33.30						

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7591 Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá

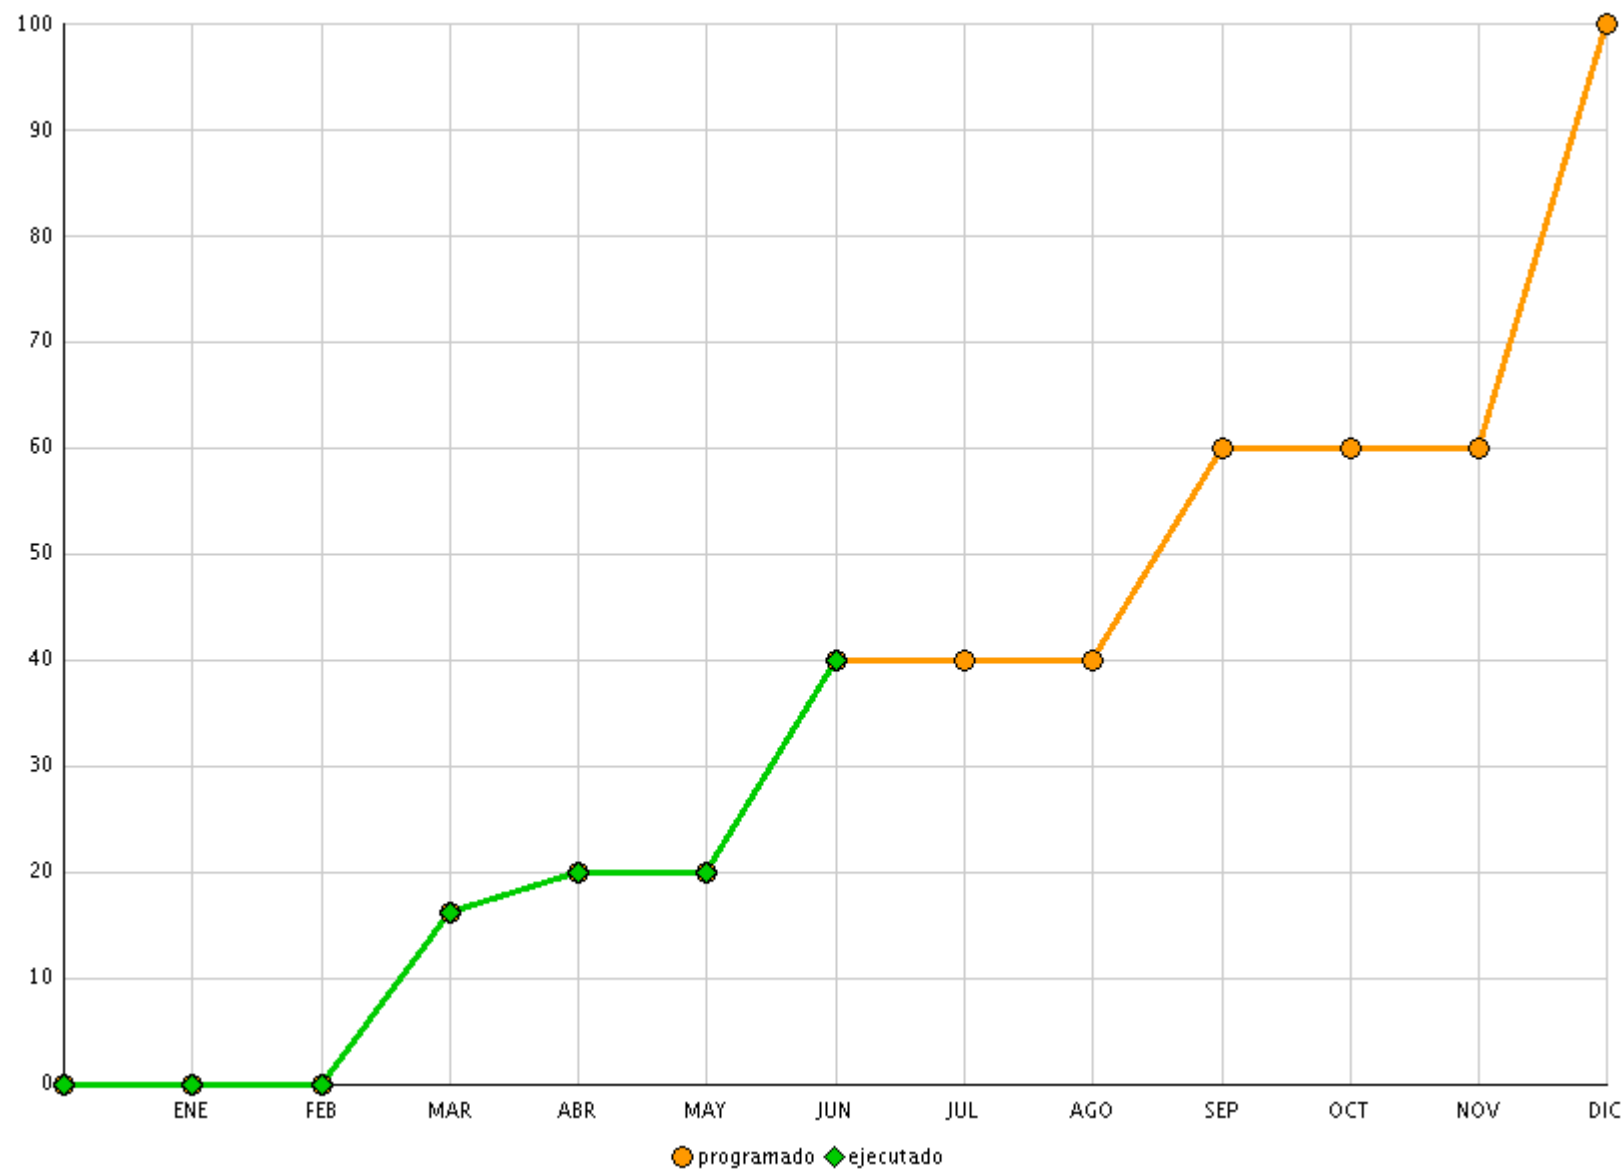


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	16.20	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	60.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	16.20	20.00	20.00	40.00						

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7605 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá

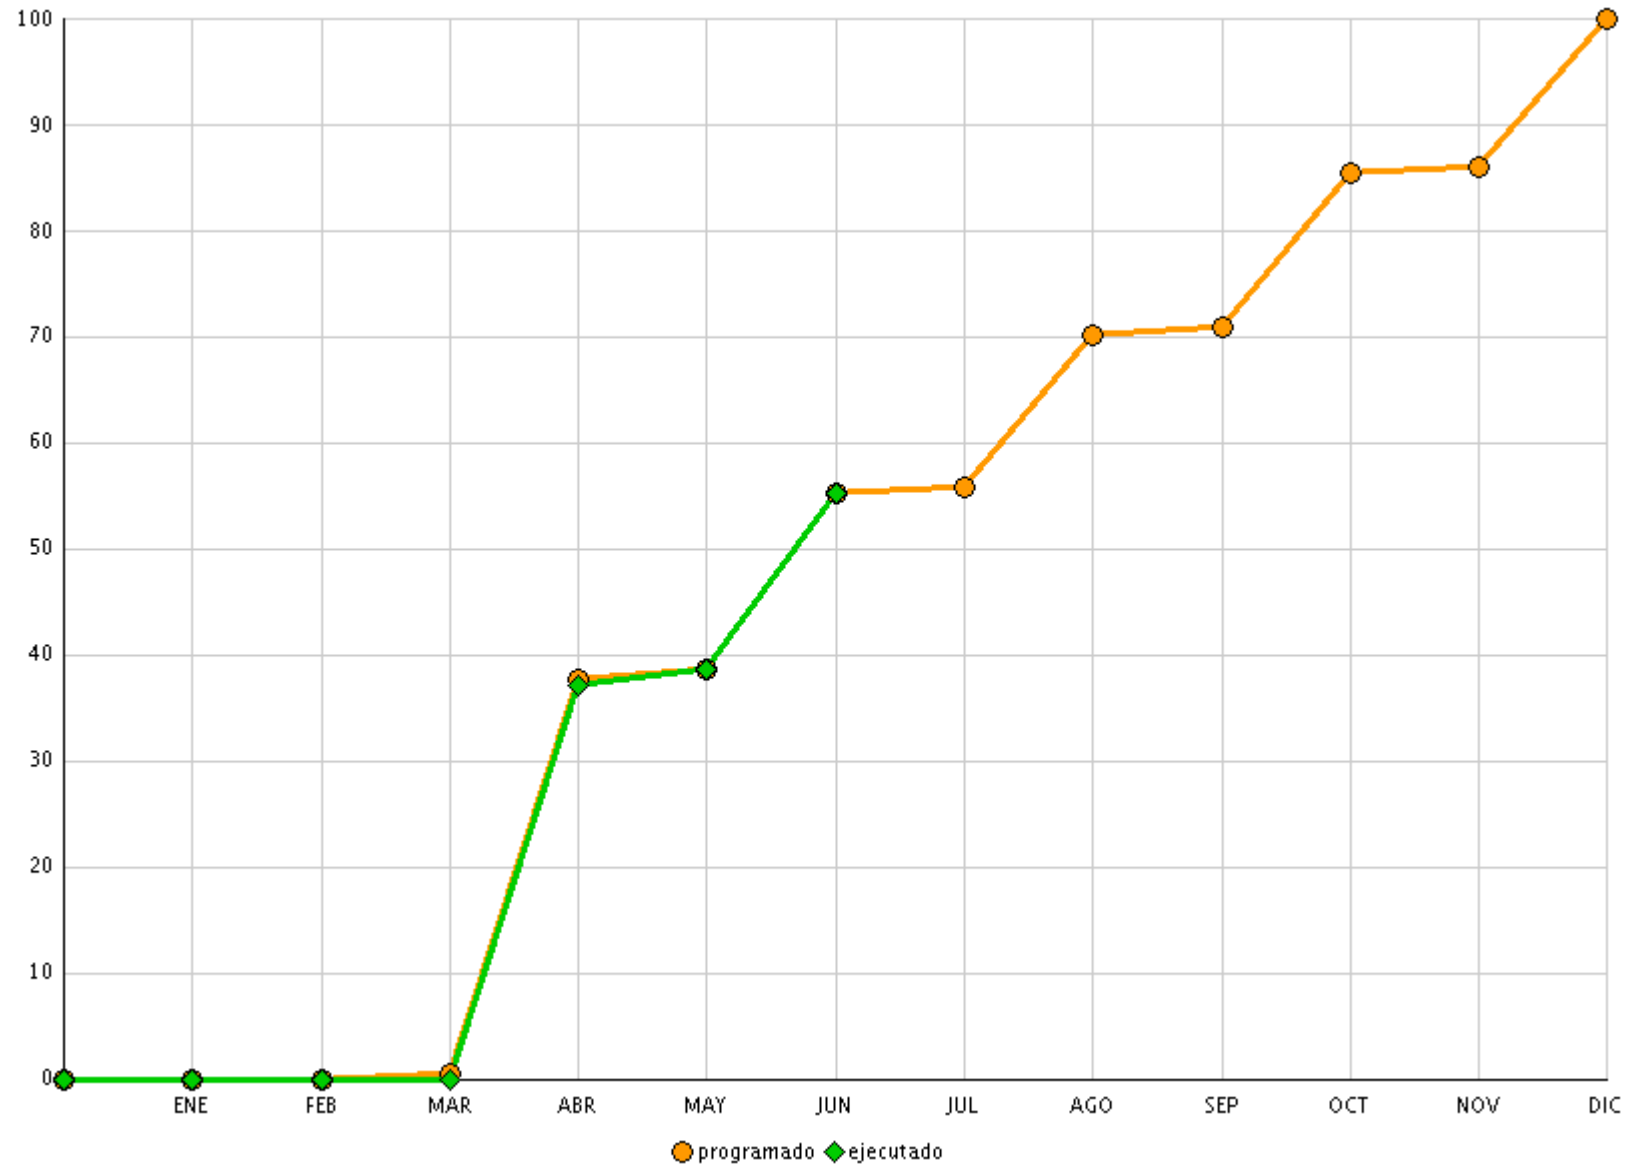

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.60	37.80	38.76	55.29	55.77	70.20	70.98	85.41	86.05	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	37.20	38.76	55.29						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7552 22 Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ADOPTAR LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00		0.00		35.00		20.00		0.00		100.00	15.00	0.60
2.	ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ADOPTAR LA ESTRATEGIA PARA PROMOVER UNA CULTURA DE DENUNCIA EN CASOS DE CORRUPCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SERVIDORES PÚBLICOS	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		30.00		100.00	50.00	9.50	
3.	REALIZAR LA REVISIÓN AL BOTÓN DE TRANSPARENCIA EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA 2022.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
4.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES DISTRITALES	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
5.	ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		35.00		0.00		30.00		0.00		100.00	35.00	3.15
6.	AYUDAR A LA GESTIÓN DE CREACIÓN DEL 60% DE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	10.00	0.80	
7.	ADELANTAR LAS GESTIONES QUE INVOLUCREN PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA E INTEGRIDAD POR PARTE DE LAS ENTIDADES	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		20.00		100.00	20.00	1.60	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									15.65		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7554 21 Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR UNA REVISION A LA PRIMERA EVALUACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE DIVULGACION DE LA INFORMACION A LAS EMRPEAS PUBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		40.00		0.00		0.00		100.00	30.00	1.80
2.	REALIZAR UNA REVISION A LA PRIMERA EVALUACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LA INFORMACION PUBLICA A LOS GRUPOS DE INTERES DE LAS EMPRESAS DEL DISTRITO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		40.00		0.00		0.00		100.00	30.00	2.40
3.	LLEVAR A CABO 6 ACOMPAÑAMIENTOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ISO 37001 Y DAR SOPORTE A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEL PROYECTO EN GESTIÓN ANTISOBORNO.	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		40.00		0.00		0.00		100.00	30.00	8.70
4.	LLEVAR A CABO 6 ACOMPAÑAMIENTOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		40.00		0.00		0.00		100.00	30.00	8.70
5.	LLEVAR A CABO 6 ACOMPAÑAMIENTOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE INTEGRIDAD Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		40.00		0.00		0.00		100.00	30.00	3.60
6.	LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA EN TALENTO HUMANO EN 6 DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRIT	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		40.00		0.00		0.00		100.00	30.00	4.80
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										30.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7561 21 Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR 27 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	15.00		11.00		15.00		11.00		12.00		0.00		100.00	36.00	16.20
2.	REALIZAR AVANCE EN EL DISEÑO DE 1 HERRAMIENTA DIGITAL QUE PERMITA ACERCAR AL CIUDADANO Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA INNOVACIÓN PÚBLICA.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	5.50
3.	REALIZAR 6 ACTIVIDADES DE CO-CREACIÓN EN RETOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO.	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		100.00	10.00	1.90
4.	INFORME DE METODOLOGÍA, MEJORAS Y MESAS DE AYUDA DE LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	25.00	3.00
5.	REALIZAR 1 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O POLÍTICAS PÚBLICAS EN SU COMPONENTE DE INNOVACIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.70
6.	REALIZAR 2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A CIUDADANOS Y ESTUDIANTES EN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE INNOVADOR.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
7.	REALIZAR 4 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES DEL DISTRITO EN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE INNOVADOR.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							33.30			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7591 22 Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 1 PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA DE LOS SERVIDORES Y COLABORADORES DEL DISTRITO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	40.00	6.80
2.	BRINDAR ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS ENTIDADES Y LOCALIDADES, RECOLECTAR INSUMOS PARA LA REFORMULACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION INCIDENTE, FOR	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	40.00	7.20
3.	REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA, LA CUALIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PARA EL CONTROL SOCIAL	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	40.00	18.40
4.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS.	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	40.00	7.60
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									40.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7605 24 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	CREAR SEGUNDA VERSIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DEL CONTROL PREVENTIVO DISTRITAL QUE GENERE ALERTAS CON LOS DATOS RECOPIRADOS	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		100.00	55.00	51.15
2.	REALIZAR 1 EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA HERRAMIENTA CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS, ALCALDÍAS LOCALES Y CIUDADANÍA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70.00	70.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	2.70	
3.	REALIZAR 15 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA Y BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS POR LAS ENTIDADES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	12.00	12.00	12.00		12.00		12.00		12.00		16.00		0.00		100.00	36.00	1.44
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									55.29		

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7787 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

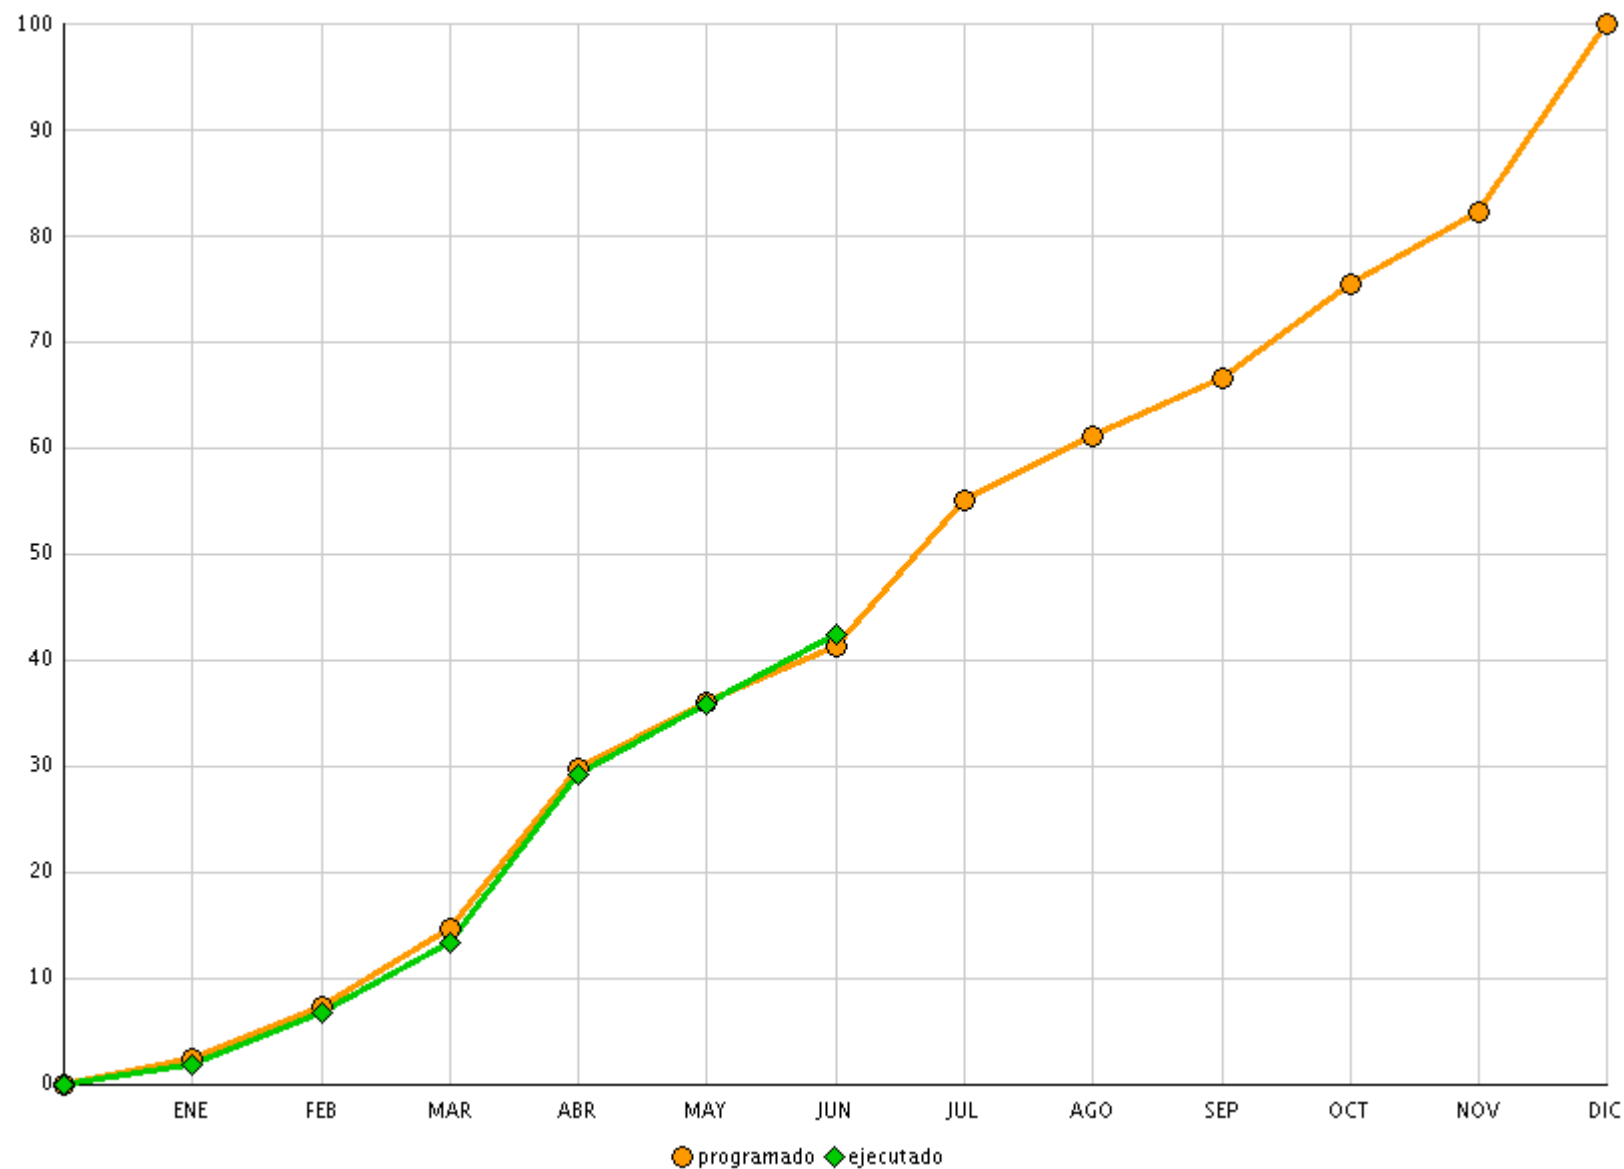


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.45	7.34	14.71	29.78	36.05	41.27	55.07	61.05	66.62	75.54	82.28	100.00
Ejecutado	1.86	6.76	13.42	29.33	35.84	42.40						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7793 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

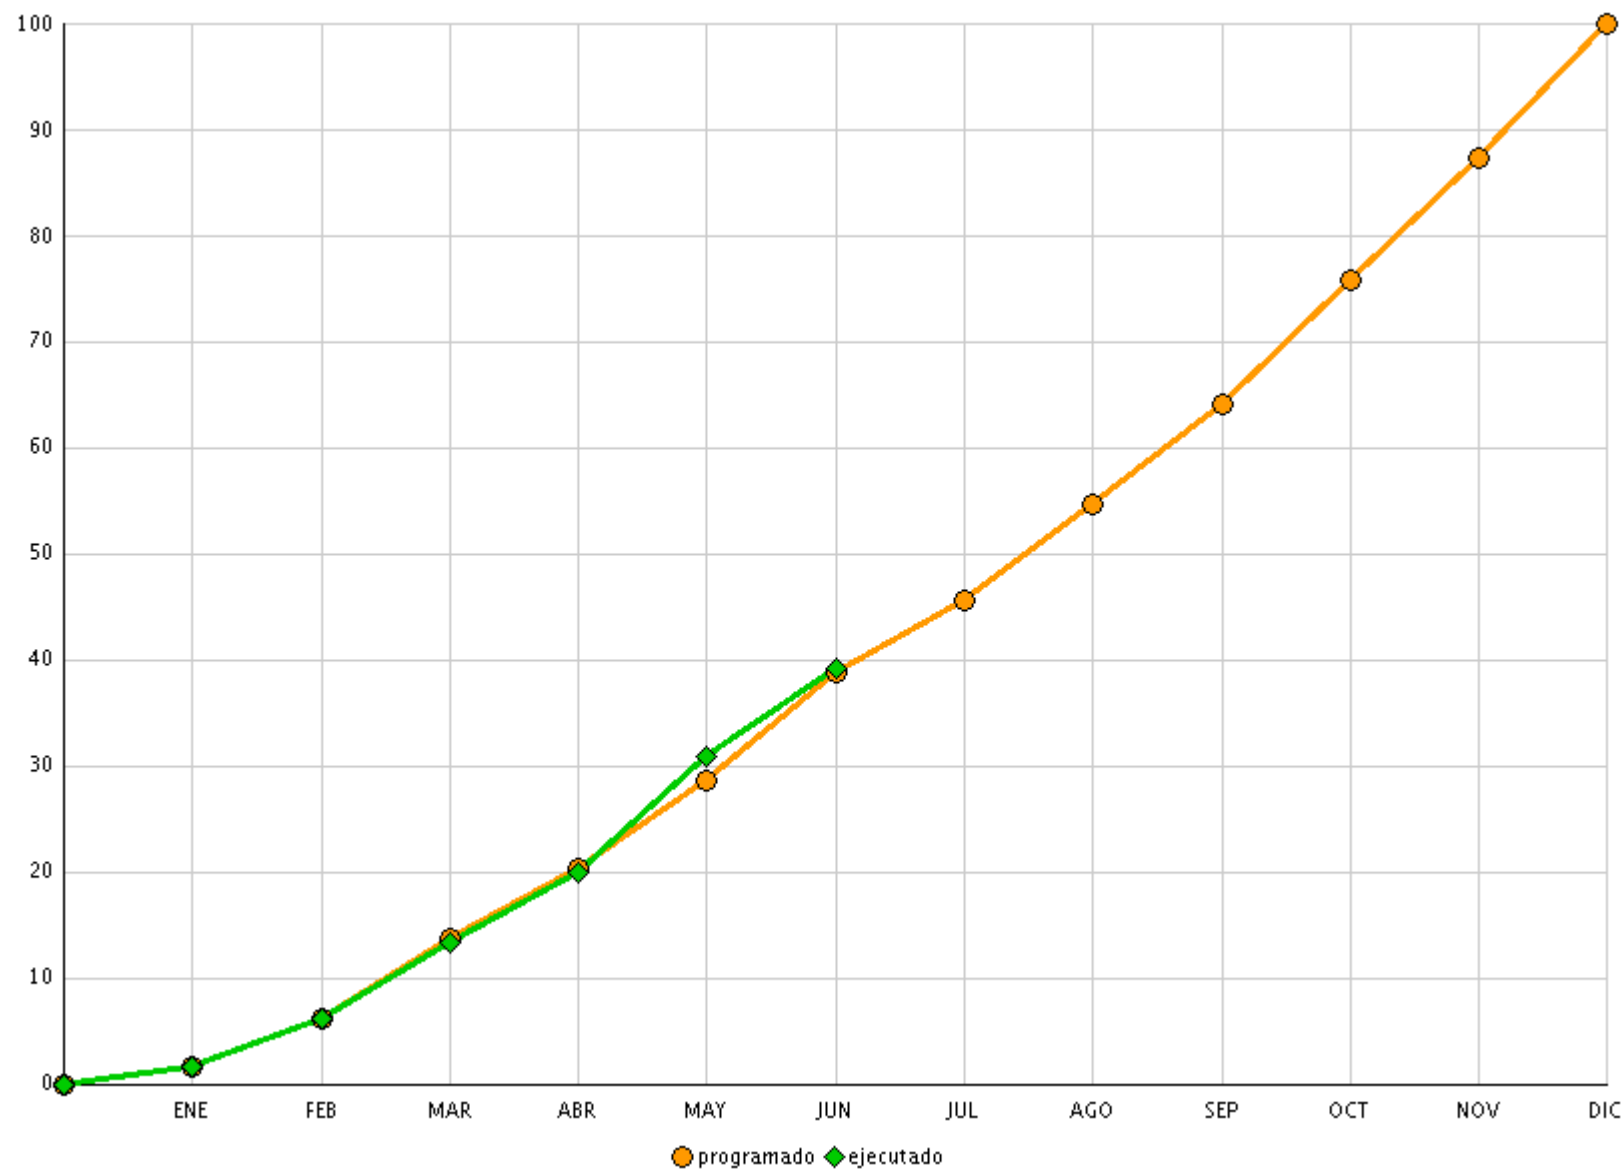


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.60	6.24	13.76	20.40	28.68	38.92	45.72	54.76	64.20	75.88	87.32	100.00
Ejecutado	1.60	6.24	13.36	20.00	30.88	39.15						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7795 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

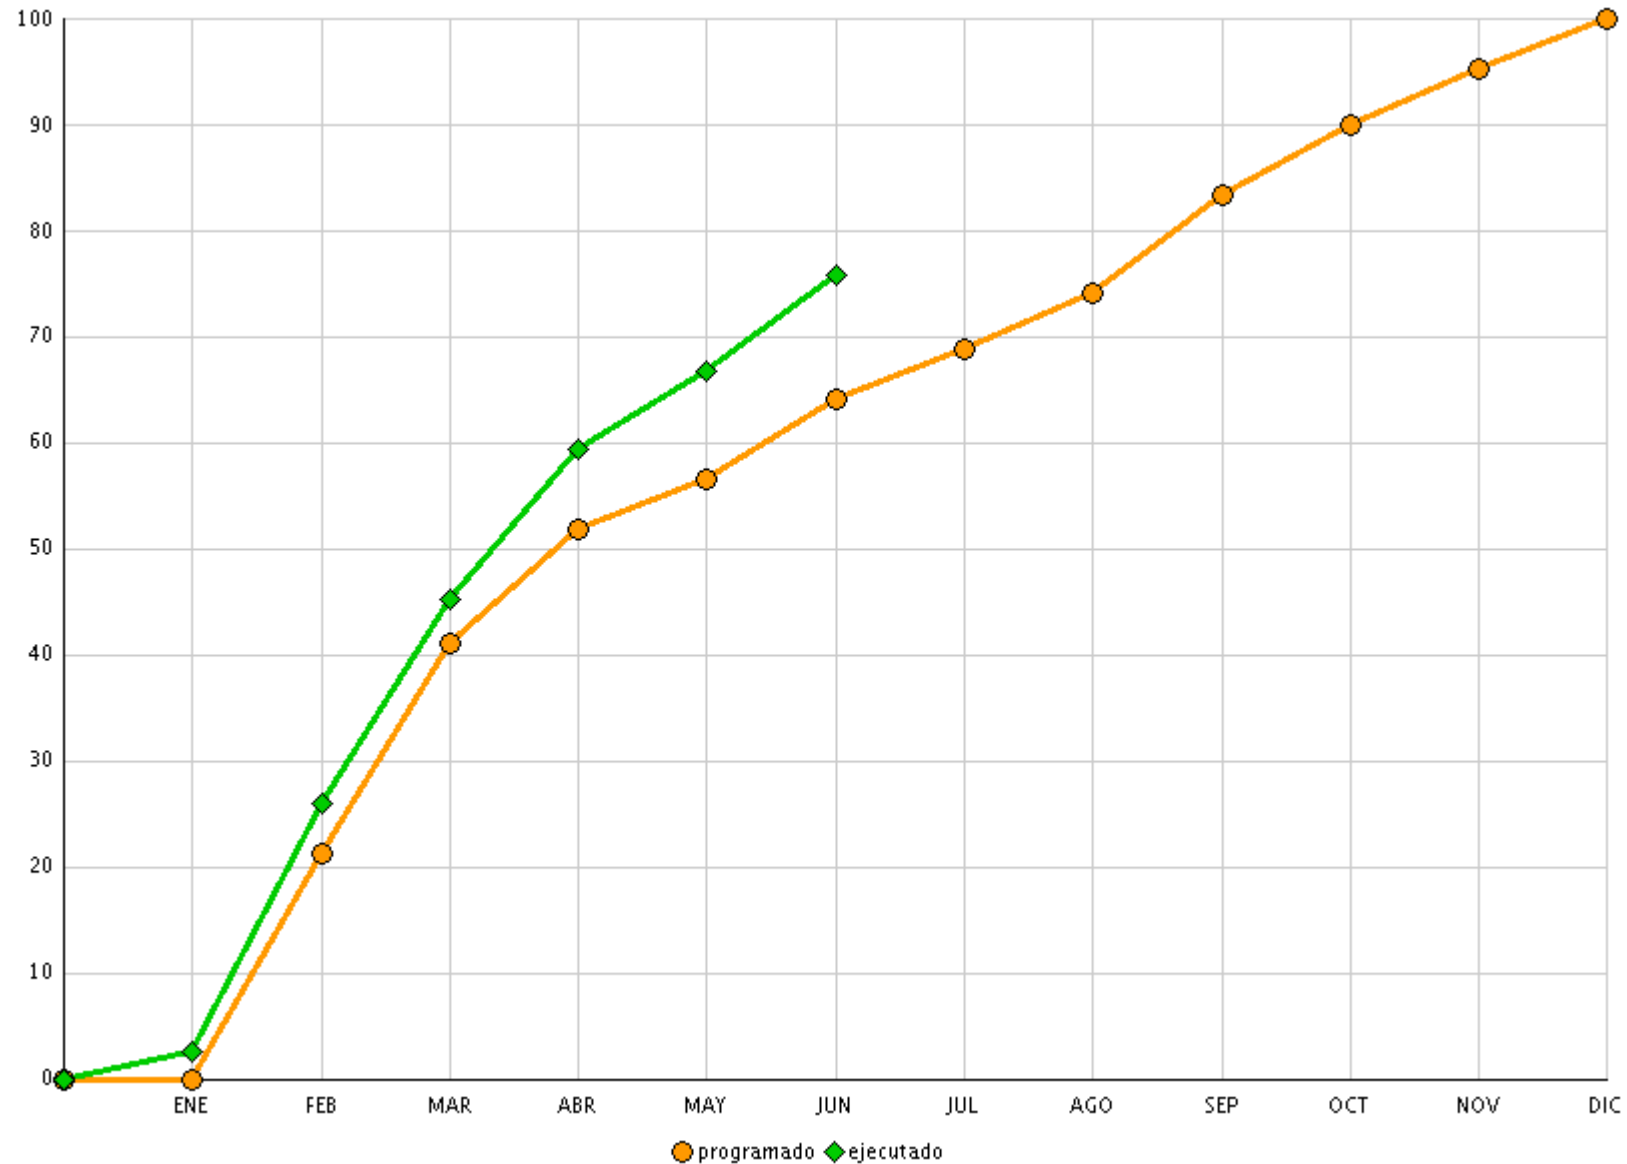


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	21.28	41.21	51.94	56.57	64.08	68.92	74.12	83.41	89.97	95.28	100.00
Ejecutado	2.70	25.99	45.24	59.39	66.86	75.93						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7799 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

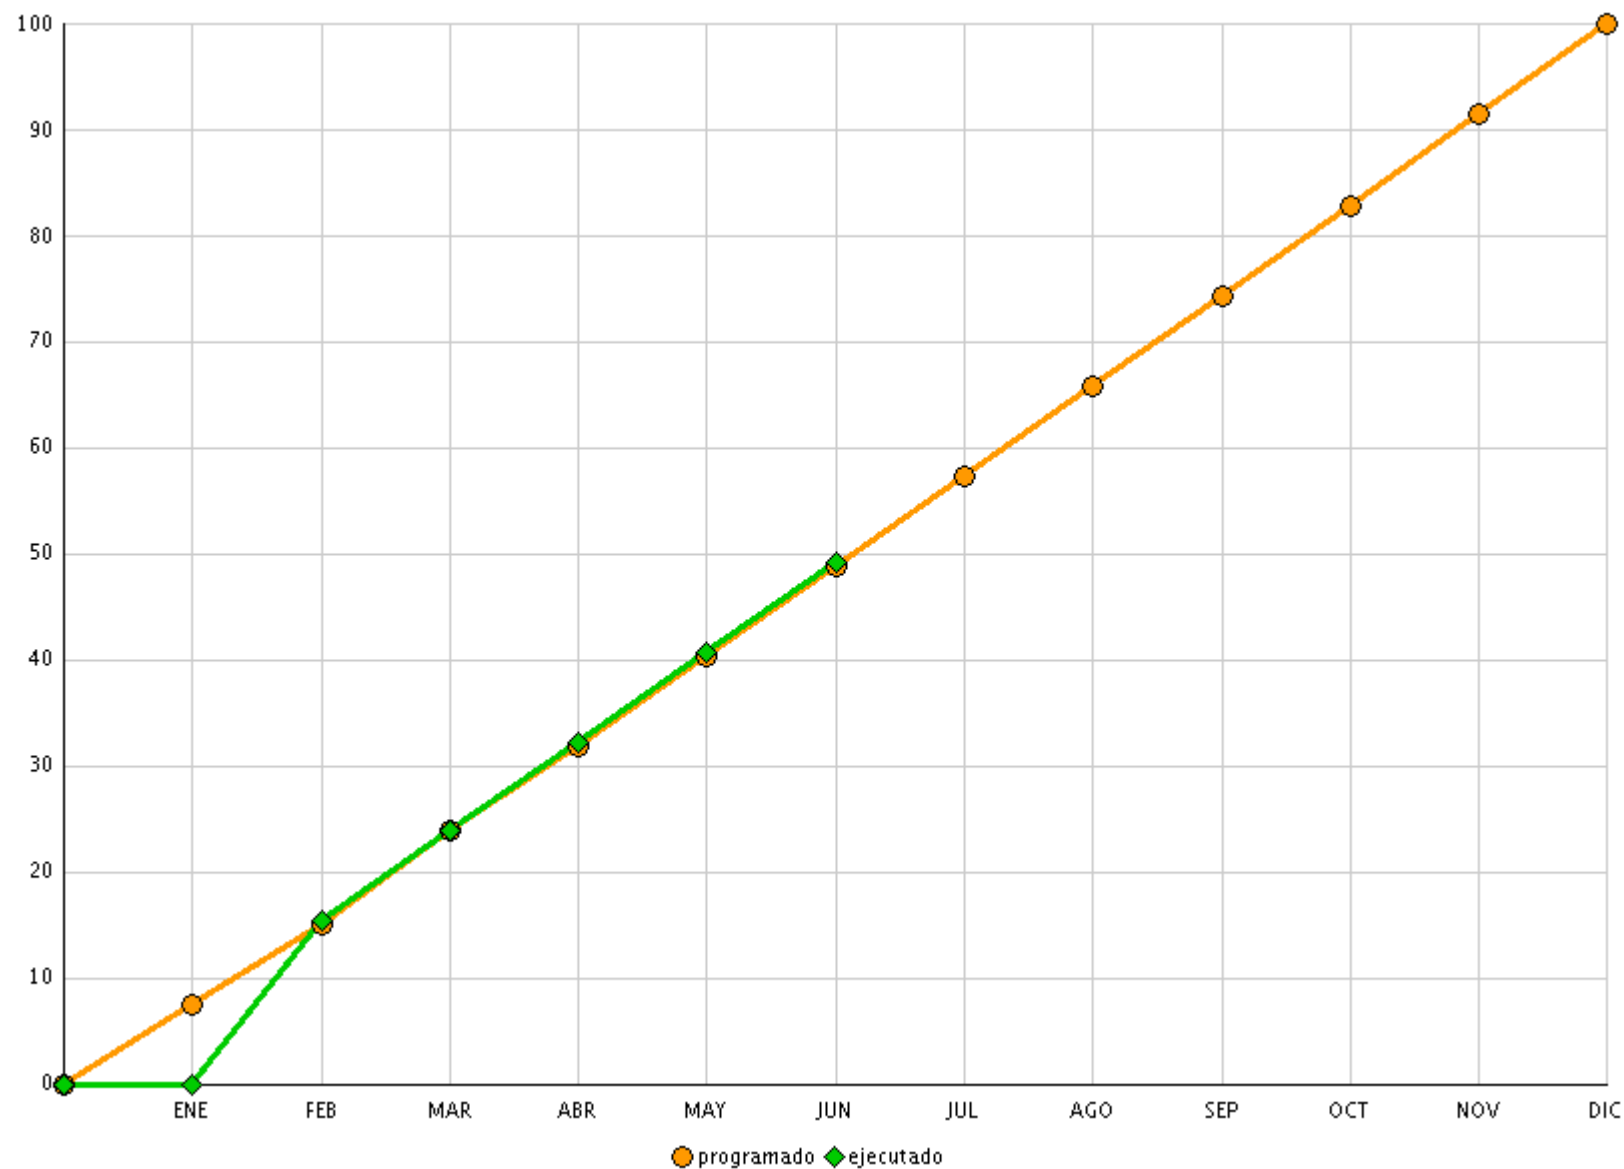


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.54	15.08	23.89	31.96	40.43	48.89	57.36	65.82	74.37	82.91	91.46	100.00
Ejecutado	0.00	15.47	23.87	32.30	40.74	49.20						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7800 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

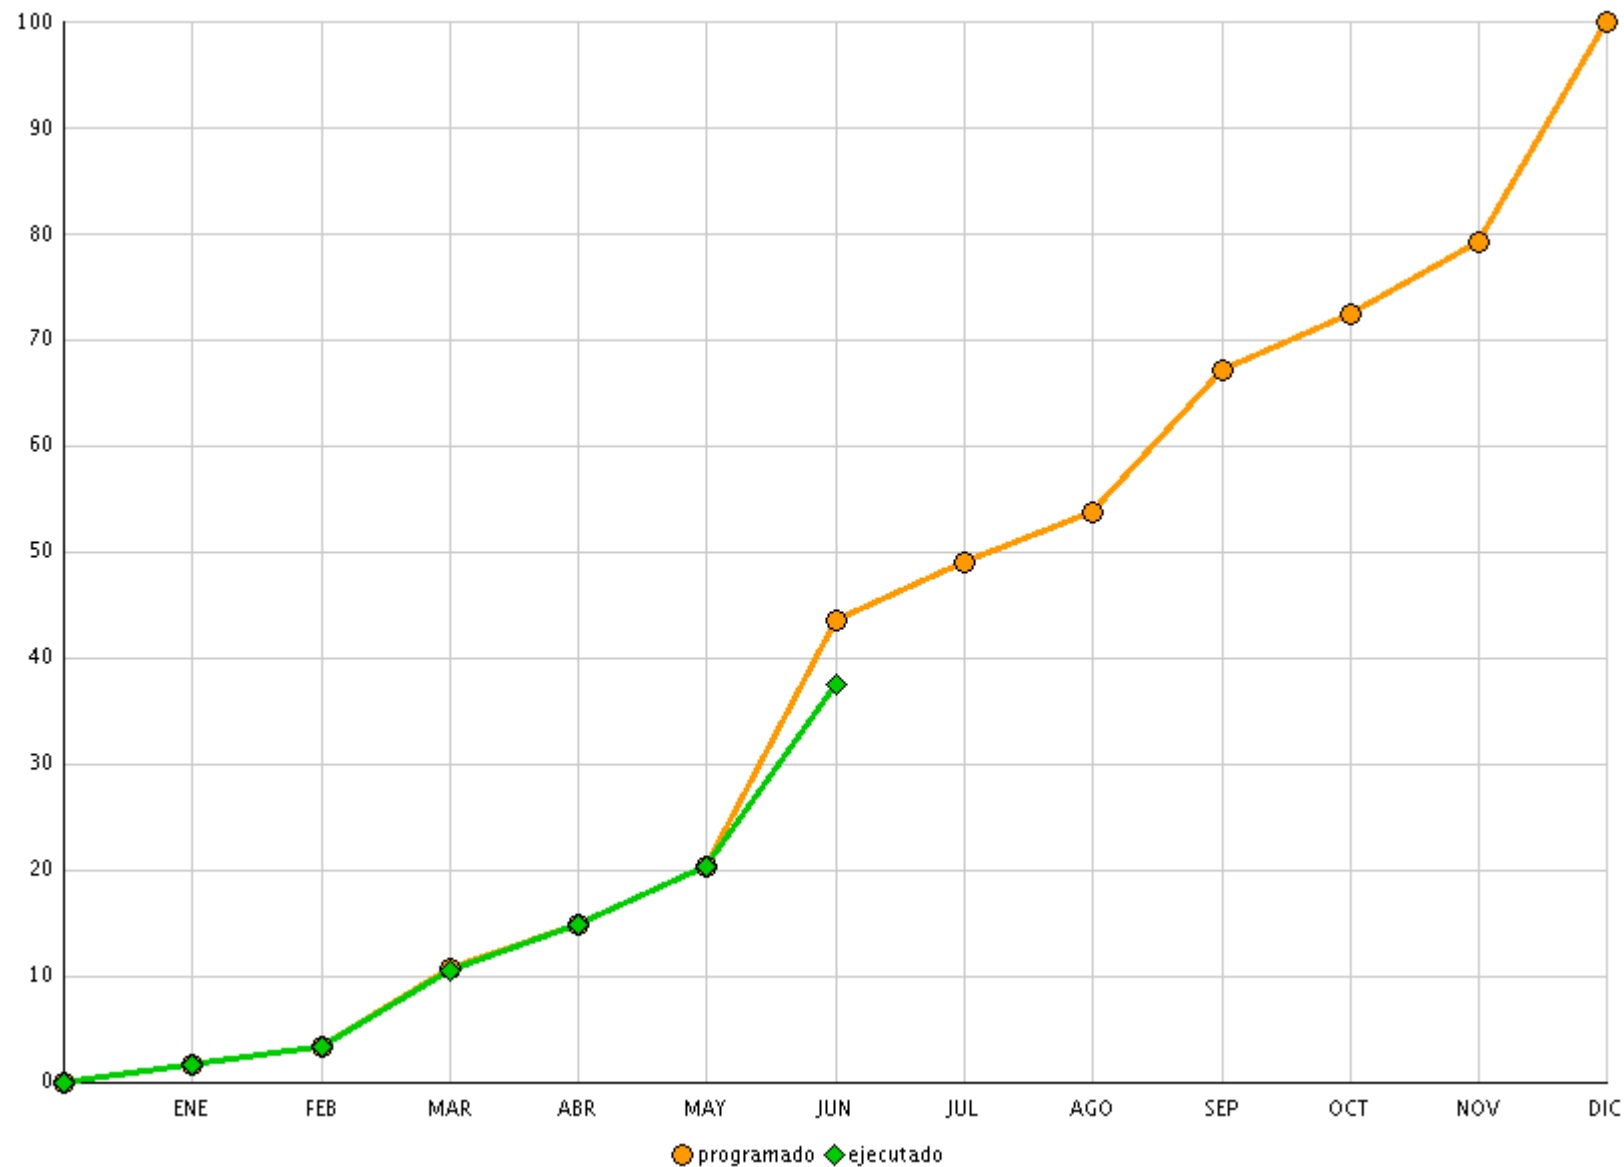


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.66	3.32	10.72	14.96	20.46	43.52	49.04	53.74	67.21	72.55	79.21	100.00
Ejecutado	1.66	3.32	10.52	14.86	20.46	37.52						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7801 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

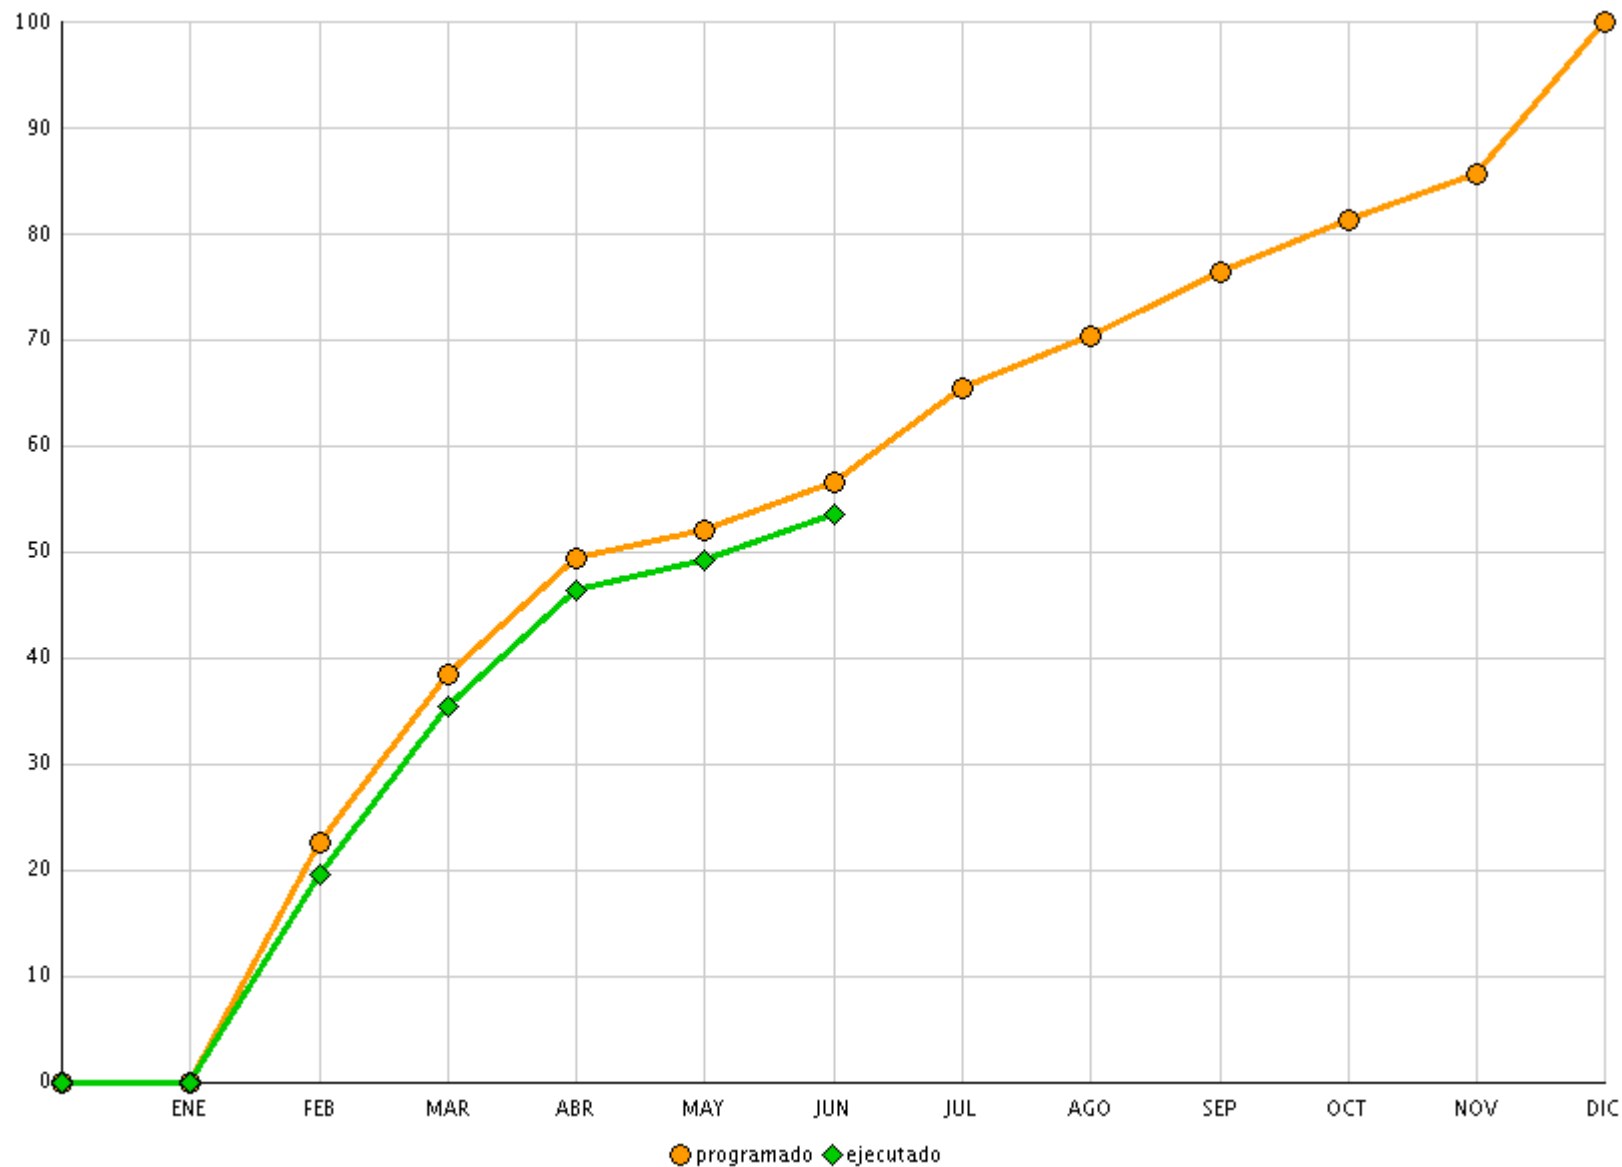


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	22.55	38.54	49.42	52.16	56.65	65.44	70.37	76.36	81.25	85.75	100.00
Ejecutado	0.00	19.55	35.54	46.42	49.16	53.65						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7803 Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

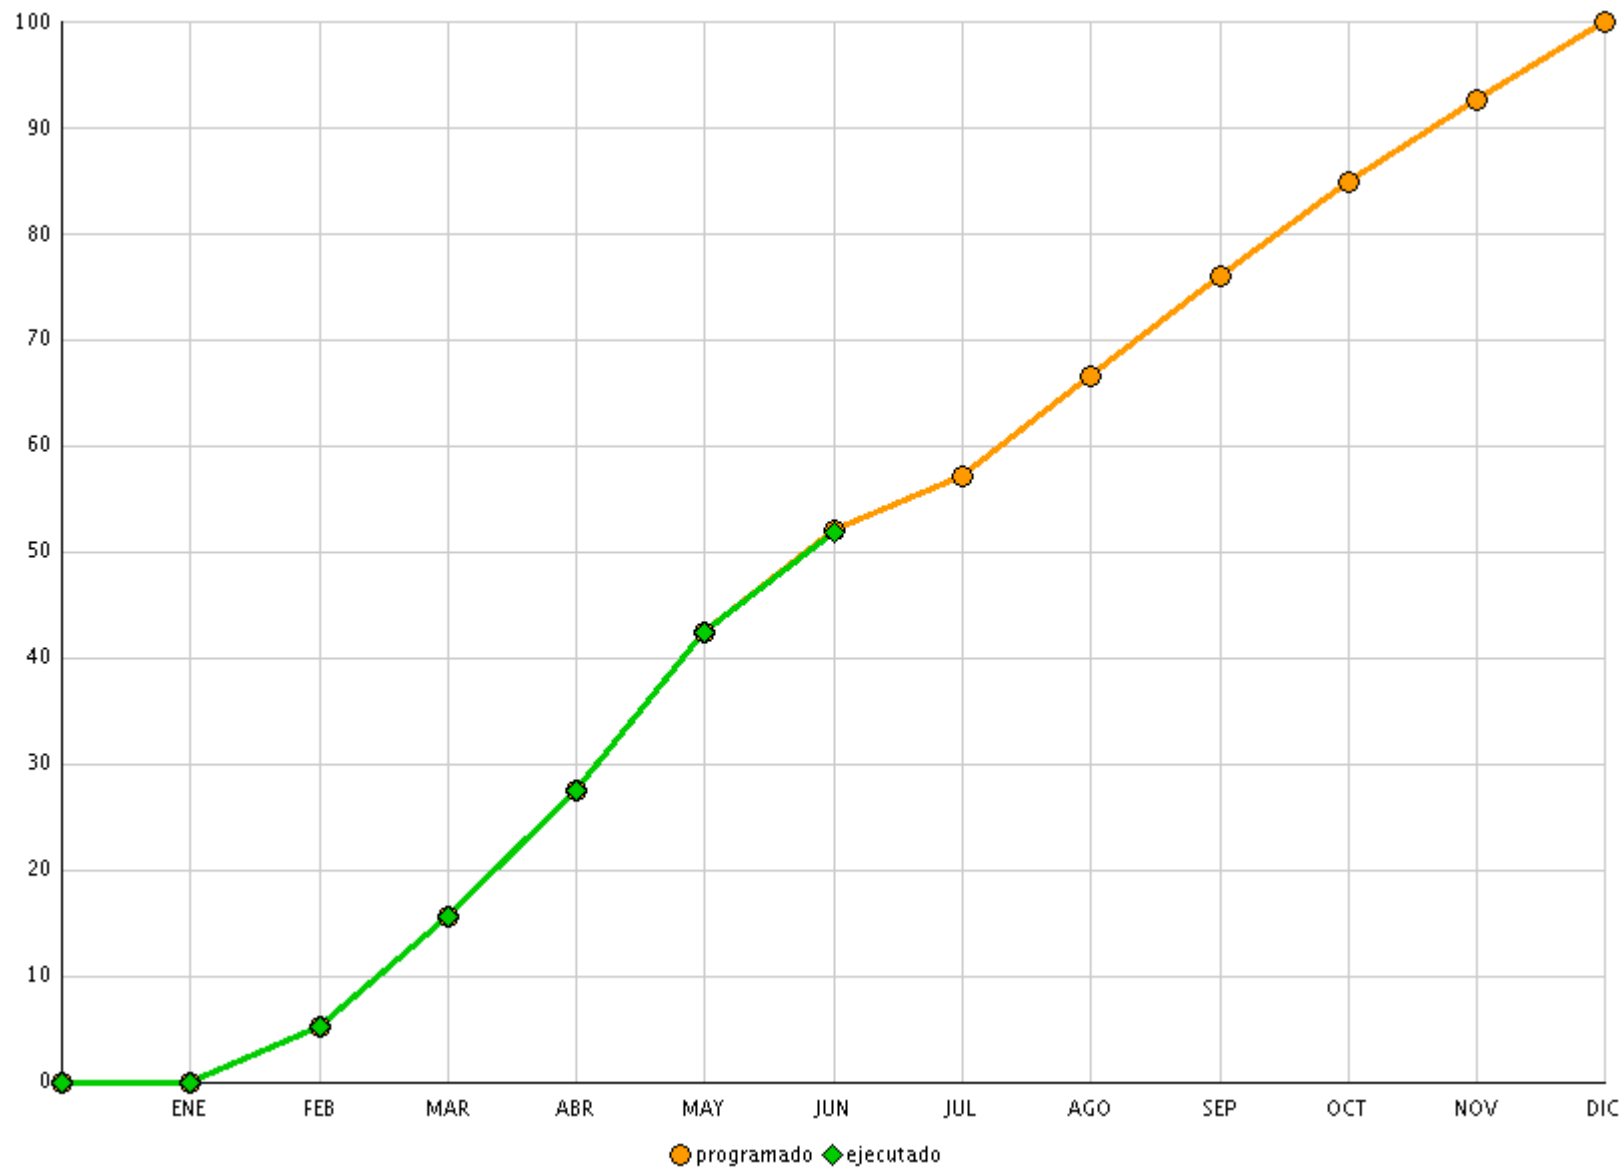

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.20	15.68	27.56	42.49	51.98	57.12	66.67	76.12	84.82	92.71	100.00
Ejecutado	0.00	5.20	15.68	27.56	42.49	51.89						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7787 26 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	DAR CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN APOBADO A TRAVÉS DEL DOCUMENTO CONPES 12, CON RESPECTO A LAS ACCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EN EL PERIODO 2020-2024.	0.00																												
1.1	REALIZAR EL 100% DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PP	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.75
1.2	BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL 100% DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE LIBERTAD DE RELIGIÓN, CULTO Y CONCIENCIA Y LOS COMITÉS LOCALES (INCLUYE ACTAS, INFORMES, Y DEMÁS)	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		10.00		9.00		9.00		100.00	45.00	1.35	
1.3	ELABORAR 4 INFORMES DE GESTIÓN SEMESTRAL DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PIRPAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.75
1.4	REALIZAR 4 DOCUMENTOS BALANCE DE LAS GESTIÓN Y DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
2.	LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO CUENTA CON UN COMPONENTE DE PREVECIÓN Y PROTECCIÓN PARA 3 GRUPOS POBLACIONALES ESPECÍFICOS.	0.00																												
2.1	DISEÑAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN COLECTIVA PARA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00	
2.2	IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN COLECTIVA PARA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
2.3	DISEÑAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS (DISTRITALES) A POBLACIONES DIFERENCIALES.	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	50.00	20.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00	
2.4	IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS (DISTRITALES) A POBLACIONES DIFERENCIALES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	20.00	0.40	
2.5	DISEÑAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN DEFINIDAS POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00	
2.6	ELABORAR 2 INFORMES DE GESTIÓN A LOS COMITÉS E INSTANCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA TRATA)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00	
3.	BRINDAR ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL 100% DE LÍDERES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN LGBTI, Y VÍCTIMAS DE TRATA	0.00																												
3.1	ATENCIÓN DEL 100% DE LÍDERES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN	3.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.49	
3.2	ATENCIÓN DEL 100% DE POBLACIÓN LGBTI QUE DEMANDEN	3.00																									100.00	49.80	1.49	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7787 26 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD		8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70				
3.3	ATENCIÓN DEL 100% DE VICTIMAS DE TRATA QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	3.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	58.10	1.74
3.4	ATENCIÓN DEL 100% DE DE PERSONAS DESMOBILIZADAS DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN	2.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.00
3.5	ATENCIÓN DEL 100% DE PERSONAS VÍCTIMAS DE ABUSO DE AUTORIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN	2.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.00
4.	FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA	0.00																											
4.1	REALIZAR EL 100% DE INFORMES DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.38
4.2	APOYAR A LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DESDE LOS EAD EN 7 PROCESOS DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO (2 EVENTOS (FERIAS Y/O CONVERSATORIOS) Y APOYO EN 5 CONMEMORACIONES)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	29.00	14.00	43.00	0.00		14.00		14.00		0.00		30.00		0.00		100.00	86.00	1.72
4.3	IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN EN LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA - EAD, PARA GRUPOS ÉTNICOS ENTRE LO LOCAL Y EL DISTRITO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.66
5.	IMPLEMENTACIÓN DE CUATRO PLANES INTEGRALES DE ACCIONES AFIRMATIVAS (PIAA)	0.00																											
5.1	REPORTAR 15 INFORMES (MATRICES) DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS 783 ACCIONES CONCERTADAS CON LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	33.00	0.66
5.2	REALIZAR EL 100% DE LAS CONVOCATORIAS A LAS INSTANCIAS DE CONCERTACION Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS REGLAMENTADAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5.3	ELABORAR 2 INFORMES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN (CONSEJOS CONSULTIVOS, ESPACIOS DE CONCERTACIÓN)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5.4	ELABORAR 3 INFORMES EJECUTIVOS DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONCERTADAS CON LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	33.00	0.66
6.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2020-2024 DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS	0.00																											
6.1	REALIZAR 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
6.2	ACOMPañAR EL DESARROLLO DEL 100% DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL (INCLUYE ACTAS DE COMITÉ, SEGUIMIENTO, ETC)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
6.3	ADELENTAR 4 INFORMES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMITES LOCALES DE DERECHOS HUMANOS DESDE EL ROL DE SECRETARIA TECNICA DE ESTAS INSTANCIAS (INCLUYE CONVOCATORIA, ACTAS DE COMITÉ, SEGUIMIENTO ETC)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
6.4	ELABORAR 4 INFORMES LOCALES DE GESTION TERRITORIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
6.5	IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PRODUCTOS PROGRAMADOS	2.00																									100.00	25.00	0.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7787 26 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
PARA 2021 DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00				
6.6 EJECUTAR EL 100% DE PROCESOS EDUCATIVOS EN DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, LA DEFENSA, EXIGIBILIDAD Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	12.00	27.00	27.00	43.00	43.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
7. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON ENFOQUES DE GÉNERO, DE DERECHOS, DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	0.00																											
7.1 DESARROLLAR EL 100% DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA VIGENCIA 2022 DE LA FASE DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	50.00	50.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
7.2 REALIZAR 2 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
7.3 ACOMPAÑAR EL 100% DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
8. ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA	0.00																											
8.1 ELABORAR EL 100% DOCUMENTOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INVESTIGACIÓN CON EL CABILDO INDÍGENA DE BOSA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		40.00		0.00		100.00	40.00	0.80
8.2 ELABORAR 3 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD MUISCA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.66
8.3 ELABORAR 3 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONSULTA PREVIA DEL PUEBLO MUISCA DE BOSA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.99
8.4 REALIZAR EL 100% DEL ACOMPAÑAMIENTO A LAS MESAS TÉCNICAS Y ESPACIOS CON LAS ENTIDADES DEL DISTRITO Y CON LA COMUNIDAD INDÍGENA MUISCA DE BOSA	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.50
9. ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA PARA DISMINUIR EL RACISMO LA XENOFOBIA Y LA MARGINACIÓN SOCIAL	0.00																											
9.1 DISEÑAR 1 ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	2.10
9.2 IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANIA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		10.00		20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
10. DOCUMENTOS DE PLANEACIÒN 4 POLÌTICAS PÚBLICAS	0.00																											
10.1 ELABORACIÓN DEL 100% DE DOCUMENTOS DE DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATEGICOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.20
10.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2022, EN EL MARCO DE LA FASE DE FORMULACIÓN, PARA LA REFORMULACIÓN DE LAS 4 POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. REFORMULAR UNA POLÌTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD	0.00																											
11.1 IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD PROGRAMADAS PARA 2022	4.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	3.60
11.2 BRINDAR EL APOYO TÉCNICO AL 100% DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD, COMITÉ TÉCNICO Y SUBCOMISIÓN PARA LA INCLUSION LABORAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.38		100.00	49.92	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7787 26 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
11.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 100% DE LOS PRODUCTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11.4 ACOMPAÑAR EL 100% DEL PROCESO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES LOCALES Y DISTRITALES DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		42.40		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7793 28 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. OBSERVATORIO DE CONFLICTIVIDAD IMPLEMENTADO / OBSERVATORIO DIÁLOGO SOCIAL	0.00																											
1.1 REALIZAR DOS (2) CARACTERIZACIONES DE ACTORES SOCIALES QUE INCIDAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE CONFLICTIVIDAD EN LA CIUDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		20.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.00
1.2 ELABORAR 100% DE LOS INFORMES EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD, CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA DESDE EL OBSERVATORIO	4.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.00	1.80
1.3 ELABORAR DOS (2) DOCUMENTOS DE RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN RELACIONADOS CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.00
1.4 GENERAR DOS (2) ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLATAFORMA (APLICATIVO POLISCOPIO) DEL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CONFLICTIVIDADES SOCIALES EN BOGOTÁ	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.00
2. PROGRAMA DE DIÁLOGO SOCIAL	0.00																											
2.1 ACOMPAÑAR EL 100% DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES QUE REQUIERAN APOYO, SEGÚN LA NECESIDAD, IDENTIFICADAS MEDIANTE MONITOREO E INFORMADOS PARA GARANTIZAR EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONVIVENCIA	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	48.00	1.92
2.2 ACOMPAÑAR EL 100% DE MESAS DE DIÁLOGO PROGRAMADAS A PARTIR DE LA SOLICITUD DE LAS Y LOS ACTORES SOCIALES Y/O INSTITUCIONES	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	49.00	1.96
2.3 ACOMPAÑAR EL 100% DE ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y/U OTRAS ENTIDADES DISTRITALES EN ACTIVIDADES QUE PUEDAN TENSIONAR LA CONVIVENCIA, PARA FOMENTAR EL DIÁLOGO SOCIAL	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	7.90	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	48.90	1.96
2.4 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE CUALIFICACIÓN DIRIGIDO A LOS ENLACES DE LAS ALCALDÍAS LOCALES ENFOCADO A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS CONFLICTIVIDADES LATENTES Y MANIFIESTAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.99	11.00		12.00		11.00		11.00		11.00		11.00		100.00	32.99	1.32
2.5 ELABORAR UN (1) DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO CON RELACIÓN A LAS CONFLICTIVIDADES EN LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.6 REALIZAR DOS (2) CONCURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y EL DIÁLOGO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. PROGRAMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES IMPLEMENTADO	0.00																											
3.1 AJUSTAR EL DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES PARA EL AÑO 2022, A PARTIR DE LAS ACCIONES DE MEJORA SURGIDAS DE LA	4.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7793 28 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
EXPERIENCIA 2021																												
3.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INICIATIVAS JUVENILES 2022	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	20.00	0.80
4. INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES FINANCIADAS E IMPLEMENTADAS	0.00																											
4.1 ACOMPAÑAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE 90 INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. ESTRATEGIA PARA EL DESAROLLO DE PACS IMPLEMENTADA	0.00																											
5.1 DILIGENCIAR DOS (2) MATRICES DE REVISIÓN PROPUESTA DE PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	2.80
5.2 REALIZAR DOS (2) SEGUIMIENTOS A LOS PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2021	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00		15.00		15.00		0.00		0.00		15.00		100.00	55.00	2.20
5.3 DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE DOS (2) PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA EN LA VIGENCIA 2022	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		40.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA ACORDADOS	0.00																											
6.1 FIRMAR DOS PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA PRIORIZADOS POR LA ADMINSTRACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	50.00	2.00
6.2 REALIZAR UN (1) SEGUIMIENTO A LOS PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2022	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
7. PROGRAMA DE BARRISMO SOCIAL IMPLEMENTADO	0.00																											
7.1 ACOMPAÑAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE FÚTBOL PROFESIONAL DESARROLLADAS EN LOS ESTADIOS: EL CAMPIN Y TECHO	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	49.00	1.96
7.2 REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DESDE EL PROGRAMA, PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA EN EL FÚTBOL	4.00	0.00	0.00	12.00	12.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.88	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	47.88	1.92
7.3 REALIZAR EL 100% DE ACOMPAÑAMIENTOS A LAS MESAS Y/O CONSEJOS LOCALES DE BARRAS ACTIVAS EN EL DISTRITO	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	49.00	1.96
7.4 REALIZAR 76 ESPACIOS DE DIÁLOGOS LOCALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BARRISMO SOCIAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.00	13.00	13.00	13.00	12.00	13.00	12.00		13.00		13.00		13.00		12.00		0.00		100.00	44.00	1.76
8. ESTRATEGIA PARA LA ELECCIÓN, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DISTRITAL DE JUVENTUD QUE PROMUEVA NUEVAS CIUDADANÍAS Y LIDERAZGOS ACTIVOS IMPLEMENTADA	0.00																											
8.1 FORMULAR Y EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ALCALDÍAS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
8.2 APOYAR EL 100% DE LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DISTRITAL DE JUVENTUD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
8.3 ELABORAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA CONSEJEROS LOCALES DE JUVENTUD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA 2022	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		30.00		25.00		10.00		0.00		0.00		100.00	25.00	1.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 39.15

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7795 22 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUACIONES DE POLICÍA FALLADAS EN PRIMERA INSTANCIA	0.00																											
1.1	NÚMERO DE ACTUACIONES DE POLICÍA FALLADAS DE FONDO EN PRIMERA INSTANCIA	10.00	0.00	27.00	0.00	33.00	16.00	32.00	0.00	44.00	0.00	28.00	28.00	44.00	0.00		0.00		28.00		0.00		0.00		28.00		100.00	208.00	20.80
2.	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS TERMINADAS Y/O ARCHIVADAS Y/O INACTIVAS	0.00																											
2.1	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS TERMINADAS	7.00	0.00	0.00	8.00	7.00	6.00	11.00	10.00	6.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00		11.00		12.00		8.00		7.00		7.00		100.00	46.00	3.22
2.2	ACTUALIZACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE DESCONGESTIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	7.00	0.00	0.00	30.00	30.00	50.00	50.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.00
3.	ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA	0.00																											
3.1	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "BOGOTÁ EL ESCENARIO DE NUESTRAS VIDAS" PARA LA VIGENCIA 2022	7.00	0.00	0.00	20.00	20.00	50.00	50.00	30.00	25.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.00
3.2	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA "BOGOTÁ EL ESCENARIO DE NUESTRAS VIDAS" DE ACUERDO CON EL PLAN ESTABLECIDO PARA LA VIGENCIA 2022	6.00	0.00	0.00	7.00	7.00	15.00	15.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		15.00		0.00		100.00	49.00	2.94
4.	ESTRATEGIA DE DESCONGESTIÓN DE LAS ACTUACIONES DE POLICÍA	0.00																											
4.1	FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA TEMPORAL DE DESCONGESTIÓN	3.50	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.61
4.2	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE DESCONGESTIÓN DE ACTUACIONES DE POLICÍA	3.50	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.61
5.	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS	0.00																											
5.1	ELABORAR DOCUMENTO DE EJE DE JUSTICIA POLICIVA EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA	3.50	0.00	0.00	20.00	0.00	50.00	30.00	30.00	30.00		0.00		0.00												100.00	60.00	2.10	
5.2	IMPLEMENTAR EL EJE DE JUSTICIA POLICIVA EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA	3.50	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.61
6.	ESTRATEGIA DE DESCONGESTIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ALCALDÍAS LOCALES	0.00																											
6.1	IMPLEMENTAR EL COMPONENTE DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ALCALDÍAS LOCALES	3.50	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.75
6.2	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE DESCONGESTIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	3.50	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.58
7.	DOCUMENTOS METODOLÓGICOS DEL EJERCICIO POLICIVO	0.00																											
7.1	PLAN DE TRABAJO 2022 PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL EJERCICIO POLICIVO	3.50	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.50
7.2	DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL EJERCICIO POLICIVO	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		15.00		10.00		15.00		10.00		0.00		100.00	40.00	1.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7795 22 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
8. ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILACIA Y CONTROL EN EL M ARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO	0.00																												
8.1 ESTABLECER PARA EL 2022 EL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	3.50	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.50	
8.2 IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	3.50	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.61	
9. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA	0.00																												
9.1 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO ACTUALIZADO	3.50	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.50	
9.2 PLAN DE IMPLEMTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "BOGOTÁ EL ESCENARIO DE NUESTRAS VIDAS" PARA LA VIGENCIA 2022	3.50	0.00	0.00	20.00	20.00	50.00	50.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.50	
9.3 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA "BOGOTÁ EL ESCENARIO DE NUESTRAS VIDAS" DE ACUERDO CON EL PLAN ESTABLECIDO PARA LA VIGENCIA 2022	3.50	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		0.00		100.00	45.00	1.58	
10. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PROPUESTAS EN LOS DOCUMENTOS METODOLÓGICOS DEL EJERCICIO POLICIVO	0.00																												
10.1 PLAN DE TRABAJO 2022 PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL EJERCICIO POLICIVO	3.50	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.50	
10.2 DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL EJERCICIO POLICIVO	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		15.00		10.00		15.00		10.00		0.00		100.00	40.00	1.40	
10.3 TABLERO DE CONTROL PARA LA TOMA DE DECISIONES	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		45.00		45.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
11. ESPACIOS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA	0.00																												
11.1 DOCUMENTO DE ESTRATEGIA DE ESPACIOS DE PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA PARA IMPEDIR EL ESCALAMIENTO DE CONFLICTOS	3.50	0.00	0.00	30.00	15.00	50.00	15.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	1.23	
11.2 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS DE PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA PARA IMPEDIR EL ESCALAMIENTO DE CONFLICTOS	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11.00	0.00	13.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		11.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								75.93	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7799 17 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYO A PROCESOS ELECTORALES QUE CONVOQUE LA AUTORIDAD ELECTORAL	0.00																											
1.1	DOCUMENTO CON EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO PARA APOYAR LAS ELECCIONES TÍPICAS Y ATÍPICAS QUE CONVOQUE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	5.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.50
2.	AGENDAS PARTICIPATIVAS CONCERTADAS CON EL COMITÉ DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL - CIT	0.00																											
2.1	DOCUMENTO SOBRE EL AVANCE DE LAS TRES AGENDAS PARTICIPATIVAS CONCERTADAS CON LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, COMO ENTIDAD VOCERA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL CIT	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	12.00	9.70	9.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	41.70	2.09
3.	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO DE ASUNTOS POLÍTICOS	0.00																											
3.1	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTO TÉCNICO SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES Y COMISIONES DEL CONCEJO	5.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.50
3.2	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS QUE CONTENGAN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO DE ASUNTOS POLÍTICOS	5.00	8.00	0.00	8.00	17.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.50	8.00	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		100.00	49.50	2.48
4.	PROCESO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y LOS ACTORES POLÍTICOS	0.00																											
4.1	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS MESAS DE COORDINACIÓN DE LOS COMITES DE ENLACE ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EL CONCEJO DE BOGOTÁ	5.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.50
4.2	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	5.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.50
4.3	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LAS MESAS DE TRABAJO DE CONFLICTIVIDADES CITADAS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ	5.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.50
4.4	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE CONTROL POLÍTICO EJERCIDO POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y LOS DERECHOS DE PETICIÓN	5.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.50
4.5	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS CIVILES DE LAS 20 JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DE LA CIUDAD	5.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.50
5.	MESAS DE COORDINACIÓN DE ENLACES DE LA ADMISTRACIÓN DISTRITAL CON EL CONCEJO DE BOGOTÁ A NIVEL DISTRITAL	0.00																											
5.1	INFORME MENSUAL SOBRE LAS MESAS DE COORDINACIÓN DE	3.00																									100.00	49.99	1.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7799 17 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
COMITÉ DE ENLACE ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EL CONCEJO DE BOGOTÁ		8.33	0.00	8.33	17.00	8.33	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34				
6. POSICIONES FRENTE A PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBE EL CONCGRESO DE LA REPÚBLICA QUE TENGAN IMPACTO EN EL DISTRITO CAPITAL	0.00																											
6.1 DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INCIATIVAS NORMATIVAS PROMOVIDAS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.00
6.2 DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INICIATIVAS NORMATIVAS PROMOVIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.00
6.3 DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS NORMATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE SEAN PRIORIZADAS POR EL DISTRITO CAPITAL Y QUE TENGAN INJERENCIA EN BOGOTÁ	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.00
7. ACOMPAÑAR A LAS ELECCIONES TÍPICAS Y ATÍPICAS EN BOGOTÁ QUE SEAN CONVOCADAS POR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00																											
7.1 INFORME SOBRE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO PARA APOYAR LAS ELECCIONES TÍPICAS Y ATÍPICAS QUE CONVOQUE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.00
8. ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MESAS DE CONFLICTIVIDADES QUE CITEN LOS CONCEJALES Y CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA	0.00																											
8.1 INFORME SOBRE LA ASISTENCIA MENSUAL Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS POR LAS CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.00
9. NIVEL DE RESPUESTAS A PROPOSICIONES, DEBATES DE CONTROL POLÍTICO Y SOLICITUDES DE DERECHOS DE PETICIÓN DE LAS CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR	0.00																											
9.1 INFORME SOBRE LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL A LAS PROPOSICIONES Y DEBATES DE CONTROL POLÍTICO SOLICITADOS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.00
9.2 INFORME SOBRE LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL A LAS PROPOSICIONES Y DEBATES DE CONTROL POLÍTICO SOLICITADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.00
9.3 INFORME SOBRE LA RESPUESTA OPORTUNA A DERECHOS DE PETICIÓN SOLICITADOS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.00
10. NIVEL DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LAS 20 JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	0.00																											
10.1 INFORME MENSUAL SOBRE LAS SOLICITUDES DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES RESUELTAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.00
11. ACOMPAÑAMIENTO A ESPACIOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CIUDAD REGIÓN	0.00																											
11.1 DOCUMENTO DE AVANCE SOBRE LOS ESPACIOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL CONCERTADOS CON LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CIUDAD REGIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.91	21.00	1.09	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	51.00	2.04
12. DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE CONTENGAN EL SEGUIMIENTO	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7799 17 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
MENSUAL A LAS SESIONES Y COMISIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ																																	
12.1 DOCUMENTO TÉCNICO MENSUAL RELACIONADO EN EL INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO 7799 DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS	4.00	8.33	0.00	8.33	17.00	8.33	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.99	2.00					
13. DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS RETOS Y NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE AL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE ACTORES POLÍTICOS	0.00																																
13.1 AVANCES EN LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE TENDENCIAS Y RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE AL COMPORTAMIENTO DE ACTORES POLÍTICOS	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	41.90	1.68					
14. DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y/O CUANTITATIVO DE LAS DINÁMICAS POLÍTICAS Y LAS MULTIPLES COYUNTURAS QUE ENFRENTA LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EN SU PERIODO DE MANDATO	0.00																																
14.1 REALIZAR 4 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y/O CUANTITATIVO DE LAS DINAMICAS POLÍTICAS Y LAS MULTIPLES COYUNTURAS QUE ENFRENTA LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EN SU PERIODO	4.00	8.30	0.00	8.30	17.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.90	2.00					
Total ponderación vertical		100.00																												TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.20	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7800 25 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR GOBIERNO	0.00																											
1.1	ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO EN EL EDIFICIO BICENTENARIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.00
1.2	DESARROLAR UNA METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RETOS DE INNOVACIÓN DE LA SDG	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.00
1.3	REALIZAR UN REPORTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO INTELIGENTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.4	REALIZAR UN REPORTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO INTELIGENTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.5	SEGUIMIENTO ESTADO DE LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE LA SGI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
2.	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DEL SECTOR GOBIERNO	0.00																											
2.1	INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO (ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SOPORTE) DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
3.	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE LAS DIMENSIONES Y POLÍTICAS DEL MIPG EN EL SECTOR GOBIERNO	0.00																											
3.1	ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ENTIDAD	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.00
3.2	ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD, BAJO LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN(MIPG)(GESTIÓN DE RIESGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.00
3.3	ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	1.32
3.4	REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE A LAS METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	33.00	0.66
3.5	REPORTE DE AVANCE DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD Y LOS PLANES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 612 DE 2018 (A EXCEPCIÓN DE PAAC Y DEL PAA)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.66
3.6	REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE A LAS METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	33.00	0.66
3.7	REPORTE CUATRIMESTRAL DE MONITOREO DE GESTIÓN DE RIESGOS	2.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	1.32
3.8	ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE	2.00																									100.00	49.98	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7800 25 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN			8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34				
3.9	ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ANALÍTICA INSTITUCIONAL	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00
4.	PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES	0.00																											
4.1	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES 2022	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
4.2	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS INTERNAS Y EXTERNAS EN EL MARCO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 2022	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
4.3	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS (AGENCIA DE MEDIOIS)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.66
5.	ESTRATEGIA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	0.00																											
5.1	SEGUIMIENTO A LA DESCONGESTIÓN DE PETICIONES VENCIDAD DE PERIODOS ANTERIORES, REGISTRADAS EN EL BOGOTA TE ESCUCHA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	0.80
5.2	SEGUIMIENTO A LA IDONEIDAD DE ESPACIOS DE LOS MODULOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL A LA CIUDADANÍA EN ALCALDÍAS LOCALES Y NIVEL CENTRAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.66
5.3	SEGUIMIENTO AL BANCO DE DOCUMENTOS EXTRAVIADOS INGRESADOS AL APLICATIVO Y ENTREGADOS A SUS TITULARES O ENTIDADES EMISORAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	0.80
5.4	VERIFICAR Y ACTUALIZAR CON LAS ÁREAS RESPONSABLES FUNCIONALES, EL CONTENIDO DE LOS TRÁMITES Y OPAS OFERTADOS POR LA ENTIDAS EN EL SITIO WEB	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	1.00
5.5	SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES 100% VIRTUALIZADOS DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA, PROPIEDAD HORIZONTAL Y VENTANILLA VIRTUAL DE RADICACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30		0.00		0.00		33.40		0.00		0.00		100.00	33.00	0.66
6.	ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA INTEGRIDAD ORIENTADAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	0.00																											
6.1	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIONES PEDAGÓGICAS DE GOBIERNO ABIERTO DIRIGIDA A LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
6.2	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE CONTROL SOCIAL EN LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6.3	REALIZAR DOS REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
6.4	REALIZAR 20 AUDITORIAS ALEATORIAS AL PROCESOS DE ISNPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES LOCALES DE POLICIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
6.5	REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN A LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE SIMULE E IDENTIFIQUE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
6.6	REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PARA USO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA SIMULA E IDENTIFICA POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6.7	REALIZAR DOS SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL ÚNICO DE DENUNCIA SOBRE HECHOS DE CORRUPCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7800 25 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
6.8	REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN A LA BATERIA DE INDICADORES SOBRE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
6.9	REALIZAR CUATRO REPORTES ACERCA DE ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CONTRACTUALES DE LAS ALCALDIAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
6.10	REALIZAR UN BALANCE DEL AVANCE EN DESCONGESTIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA, PLANTEANDO ACCIONES DE MEJORA CORRESPONDIENTES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
7.	CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	0.00																											
7.1	REPORTE DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE: CONECTIVIDAD, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO, LICENCIAMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
8.	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.00																											
8.1	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A ACTUALIZAR	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
8.2	8 SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERVENIDOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00		13.00		12.00		12.00		12.00		12.00		100.00	26.00	0.52
9.	SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	0.00																											
9.1	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
9.2	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67		16.67		16.67		16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
9.3	1 SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67		16.67		16.67		16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
10.	PLAN DE ARQUITECTURA EMPRESARIA EN TI ELABORADO Y DESARROLLADO	0.00																											
10.1	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
11.	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFROMACIÓN ACTUALIZADO	0.00																											
11.1	DOCUMENTO PETI ACTUALIZADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
12.	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO TI - BCP	0.00																											
12.1	ENTREGAR DOCUMENTO PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (TI) - BCP	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		100.00	20.00	0.40
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								37.52		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7801 25 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN TRANSPARENTE, INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO LOCAL	0.00																											
1.1 ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO EN EL 2022, PARA IMPLEMENTAR EL MODELO LOCAL DE GESTIÓN	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
1.2 IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO LOCAL DE GESTIÓN	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN LOCAL QUE PERMITA MEJORAR LA GESTIÓN EN LA PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ALCALDÍAS , INFORMANDO A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS BIENES Y SERV	0.00																											
2.1 ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES PARA LA VIGENCIA 2022	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
2.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES ESTABLECIDA PARA EL 2022	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.90
2.3 REALIZAR UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CORRESPONDAN A LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCAL CON LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		0.00		100.00	30.00	0.60
3. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LAS ALCALDÍAS LOCALES	0.00																											
3.1 ESTABLECER UN PLAN OPERATIVO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 1418 DE 2021	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
3.2 ELABORAR UN DOCUMENTO QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA INTERNA TIPO DE LAS ALCALDÍAS LOCALES Y SU ARTICULACIÓN CON EL GABINETE LOCAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
3.3 ESTRUCTURAL EL 100% DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA, PLANTA DE EMPLEOS Y MANUAL DE FUNCIONES DE LAS ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
3.4 ELABORAR UN DOCUMENTO CONTENTIVO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA INCIDENCIA DE LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD LOCAL ELABORADOS	0.00																											
4.1 ELABORAR PARA EL 2022 EL PLAN DE TRABAJO PARA ELABORAR LOS 2 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA GERENCIA	3.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
4.2 IMPLEMENTAR EL 100% DEL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 2 DOCUMENTOS DE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7801 25 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
INVESTIGACIÓN PARA EL 2022																												
4.3 ELABORAR 2 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GOBERNANZA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. OBSERVATORIO DE GESTIÓN LOCAL	0.00																											
5.1 ESTABLECER PARA EL 2022 EL PLAN DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO DE GESTIÓN LOCAL Y EL CENTRO DE GOBIERNO LOCAL	2.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
5.2 IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PLAN DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO DE GESTIÓN LOCAL Y EL CENTRO DE GOBIERNO LOCAL PARA LA VIGENCIA 2022	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
5.3 ELABORAR 4 INFOGRAFÍAS SOBRE LA GESTIÓN LOCAL Y/O LAS APUESTAS ESTRATÉGICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
5.4 ELABORAR 2 INFORMES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO LOCAL Y DE SUS TRES EJES: PÁGINA, OBSERVATORIO DE GESTIÓN LOCAL Y ESCUELA DE GOBIERNO LOCAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6. PLANES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ALCALDÍAS LOCALES PAR ALA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL	0.00																											
6.1 ACTUALIZAR UN DOCUMENTO DE PLAN ESTRATÉGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 2021-2024	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
6.2 FORMULAR UN PLAN DE ACCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL - PAATI PARA LA VIGENCIA 2022	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
6.3 IMPLEMENTAR EL 100% DEL PLAN DE ACCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 2022 PARA LAS ALCALDÍAS LOCALES	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		12.00		3.00		100.00	45.00	1.35
7. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO IMPLEMENTADAS EN LAS ALCALDÍAS LOCALES, EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN	0.00																											
7.1 FORMULAR UN DOCUMENTO DE ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO, TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LAS ALCALDÍAS LOCALES	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
7.2 IMPLEMENTAR EN UN 100% LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES ESTABLECIDA PARA EL 2022	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.38
7.3 ELABORAR UN DOCUMENTO DE RETROALIMENTACIÓN DE LA ETRAEGIA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ALCALDÍAS LOCALES EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		10.00		30.00		60.00		100.00	0.00	0.00
8. ESTRATEGIAS PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL EN EL TERRITORIO DEISEÑADAS Y EJECUTADAS	0.00																											
8.1 ESTABLECER PARA EL 2022 LA ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL EN EL TERRITORIO - PLAN DE TRABAJO 2022	3.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
8.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL EN EL TERRITORIO	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
8.3 ELABORAR 3 INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL Y LA DIFUSIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO LOCAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.99
9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN LOCAL IMPLEMENTADOS	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7801 25 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
9.1 FORMULAR 4 PLANES DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES SIPSE - LOCAL EN LAS 20 LOCALIDADES	3.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50			
9.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE LOS 4 PLANES DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES SIPSE - LOCAL EN LAS 20 LOCALIDADES	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.38			
9.3 ELABORAR 4 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MEJORA EN LOS 20 FDL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIPSE LOCAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.50			
10. DOCUMENTO DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS LOCALES	0.00																														
10.1 ESTRUCTURAR UN PLAN OPERATIVO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 1418 DE 2021	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00			
10.2 ELABORAR UN DOCUMENTO DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS LOCALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00			
11. DIAGNÓSTICOS REALIZADOS SOBRE LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN LOCAL	0.00																														
11.1 FORMULAR UN PLAN DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICAR EL SISTEMA SIPSE Y SU INTERACCIÓN CON OTROS APLICATIVOS DE LA SECRETARÍA Y DISTRITALES FORMULADO	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00			
11.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICAR EL SISTEMA SIPSE Y SU INTERACCIÓN CON OTROS APLICATIVOS DE LA SECRETARÍA Y DISTRITALES	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35			
11.3 ELABORAR UN INFORME CONSOLIDADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLOS Y FASE II DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		50.00		20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
12. PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN EN INCIDENCIA LOCAL	0.00																														
12.1 ESTABLECER PARA EL 2022 EL PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN EN INCIDENCIA LOCAL	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
12.2 IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EN INCIDENCIA LOCAL	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.50			
13. PERSONAS BENEFICIADAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN EN INCIDENCIA LOCAL	0.00																														
13.1 PERSONAS PARTICIPANTES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE INCIDENCIA LOCAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00			
14. ÍNDICE DE GESTIÓN PÚBLICA LOCAL	0.00																														
14.1 INCREMENTAR EN UN 2% EL ÍNDICE DE GESTIÓN LOCAL EN LA VIGENCIA 2022 VS. 2021, DE ACUERDO A LA LÍNEA BASE DE LA VIGENCIA 2020	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		53.65	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7803 23 Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2022		
Año	Banco	Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL IMPLEMENTADO	0.00																											
1.1 IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA WEB Y/O MICROSITIO DEL LABORATORIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
1.2 ELABORAR CAJA DE HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS EN INNOVACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
1.3 DESARROLLAR EL 100% DE LA PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		9.00		100.00	26.00	2.08
1.4 PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA COHORTE DE ENTRENAMIENTO A AGENTES DE INNOVACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		9.00		100.00	26.00	2.08
2. ESTRATEGIA DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN DIGITAL	0.00																											
2.1 IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE CONSULTAS CIUDADANAS - 2022	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		18.00		18.00		18.00		9.00		10.00		100.00	18.00	1.62
2.2 REALIZAR EL 100% DE LA EVALUACIÓN DE CAUSAS CIUDADANAS 2021	9.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	99.00	8.91
2.3 REALIZAR EL 100% DE LA EVALUACIÓN DE LA FASE 2-2021 DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	9.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	9.00
2.4 DESARROLLAR 100% DE LA FASE 2-2022 DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.5 IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	1.65
2.6 DESARROLLAR EL 100% DEL EJERCICIO DE CAUSAS CIUDADANAS - 2022	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00		17.00		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	51.00	2.55
3. DOCUMENTO DE REFORMIULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE	0.00																											
3.1 ELABORAR UN DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y DE FACTORES ESTRATÉGICOS	8.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
3.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA FASE DE FORMULACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.3 ELABORAR UN DOCUMENTO DE PLAN DE ACCIÓN Y UN DOCUMENTO PRELIMINAR DE ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 51.89

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

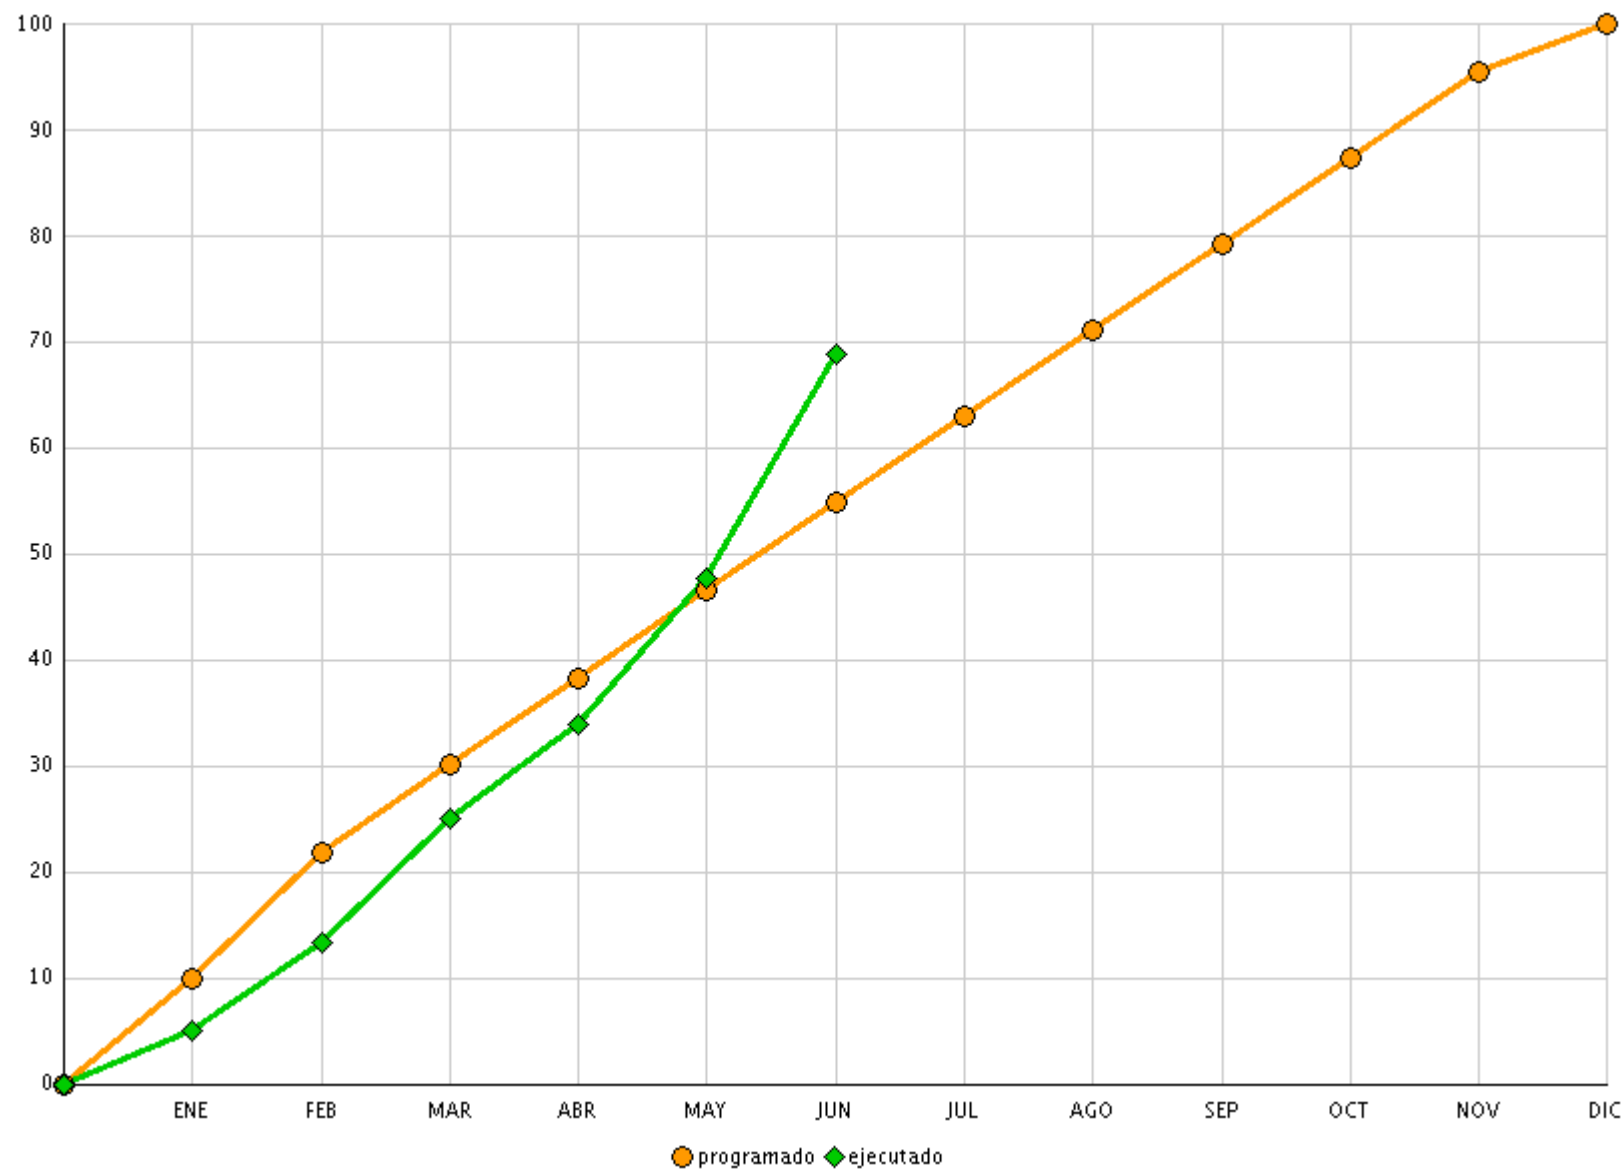


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	10.02	21.86	30.11	38.36	46.61	54.86	63.10	71.20	79.30	87.40	95.50	100.00
Ejecutado	5.03	13.41	25.04	33.91	47.73	68.95						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá

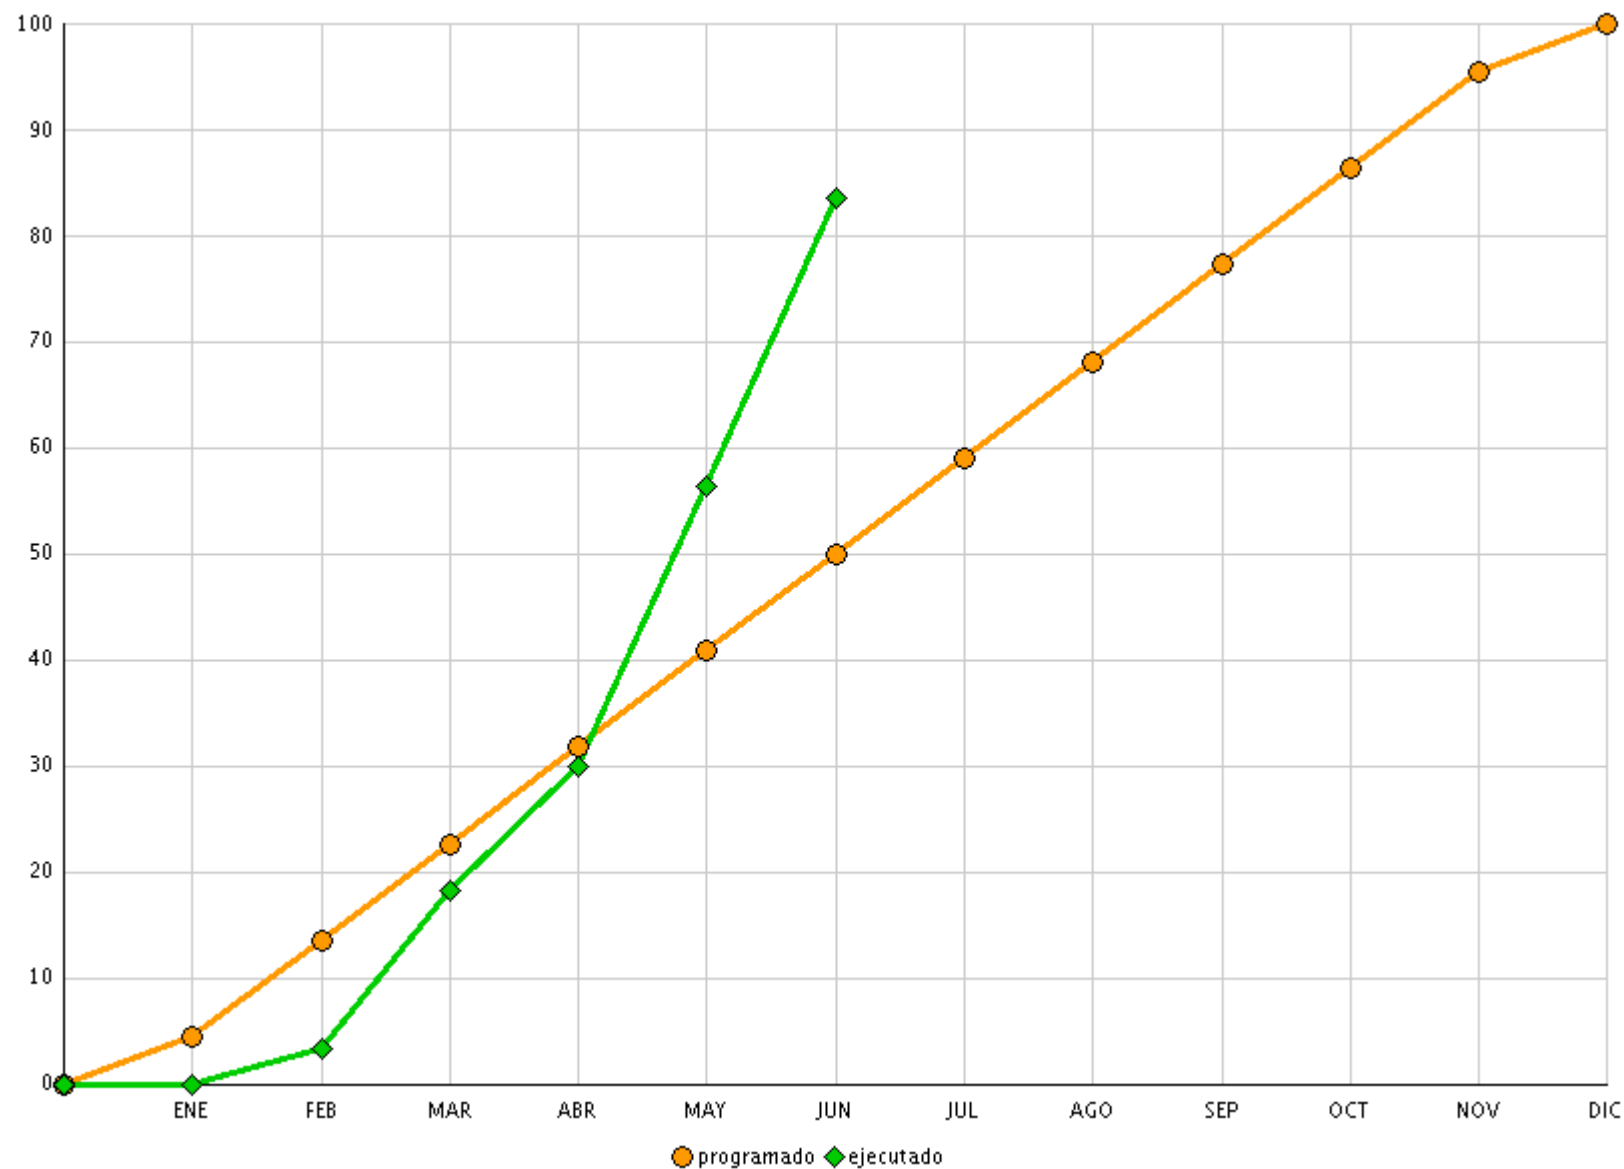


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.50	13.60	22.70	31.80	40.90	50.00	59.10	68.20	77.30	86.40	95.50	100.00
Ejecutado	0.00	3.40	18.20	30.00	56.40	83.50						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

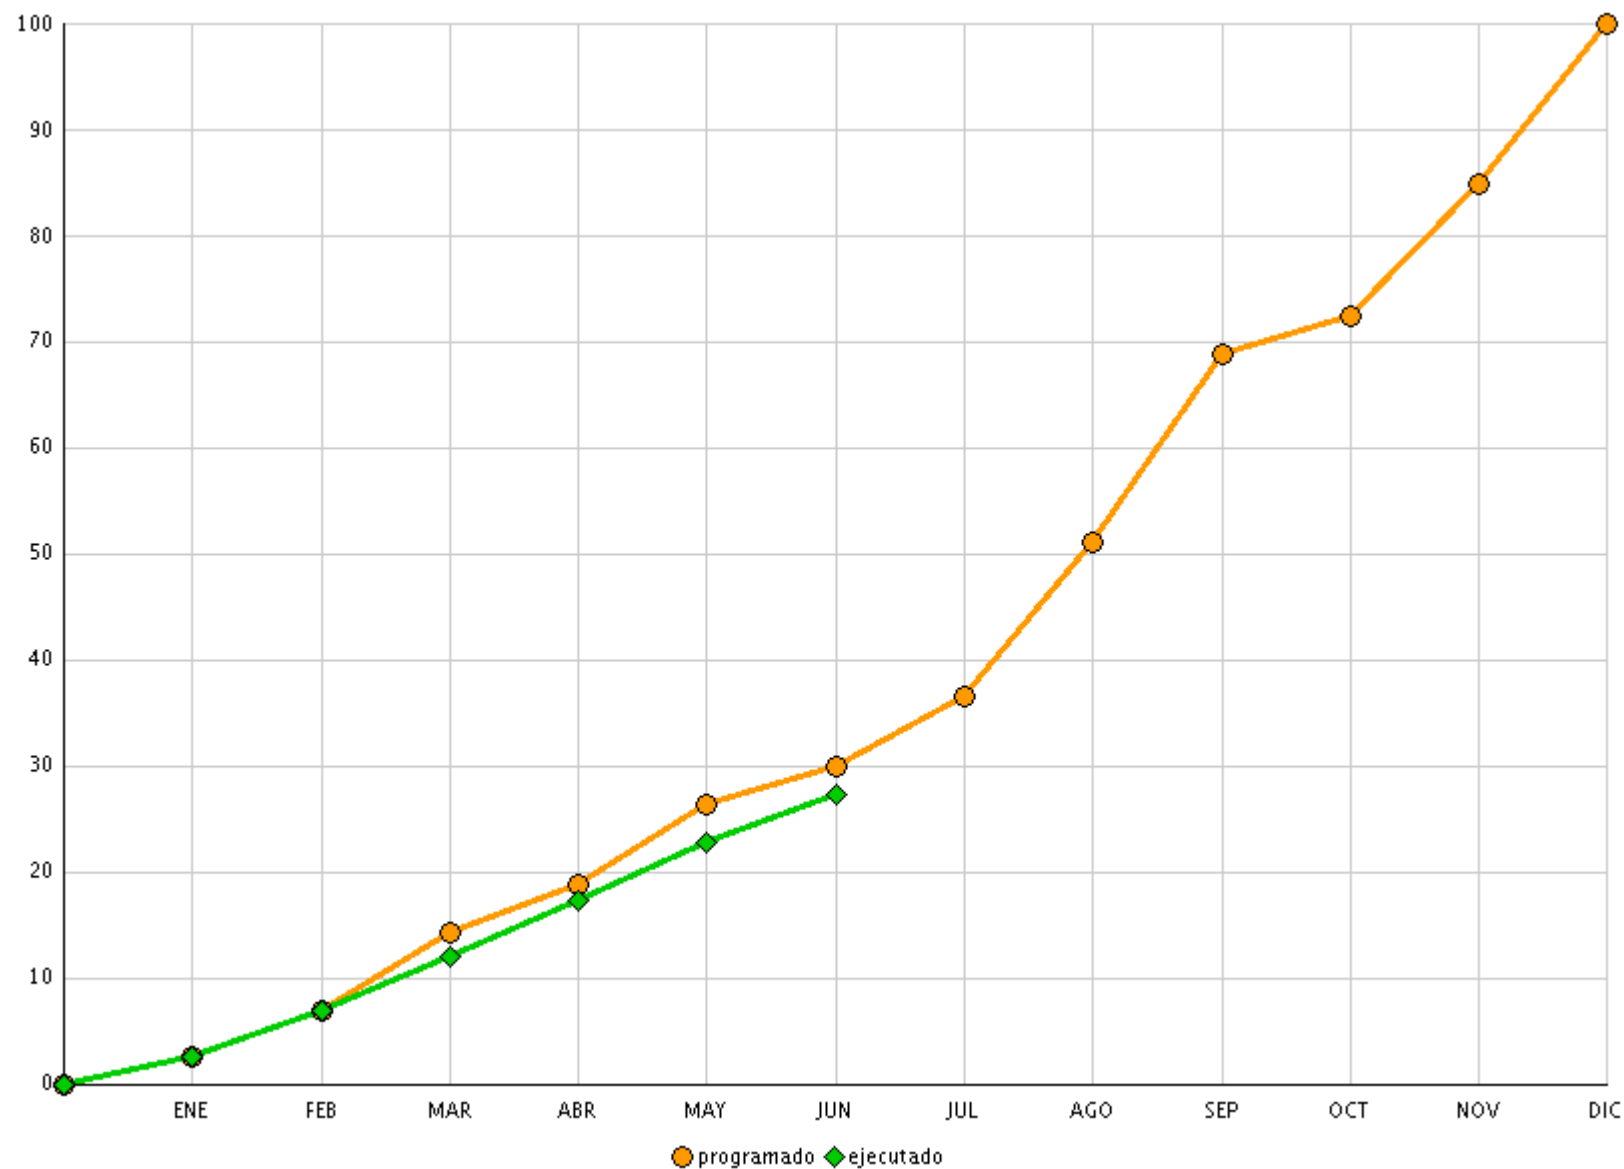


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.60	7.00	14.40	18.80	26.40	30.00	36.60	51.20	68.80	72.40	85.00	100.00
Ejecutado	2.60	7.00	12.00	17.40	22.80	27.40						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá

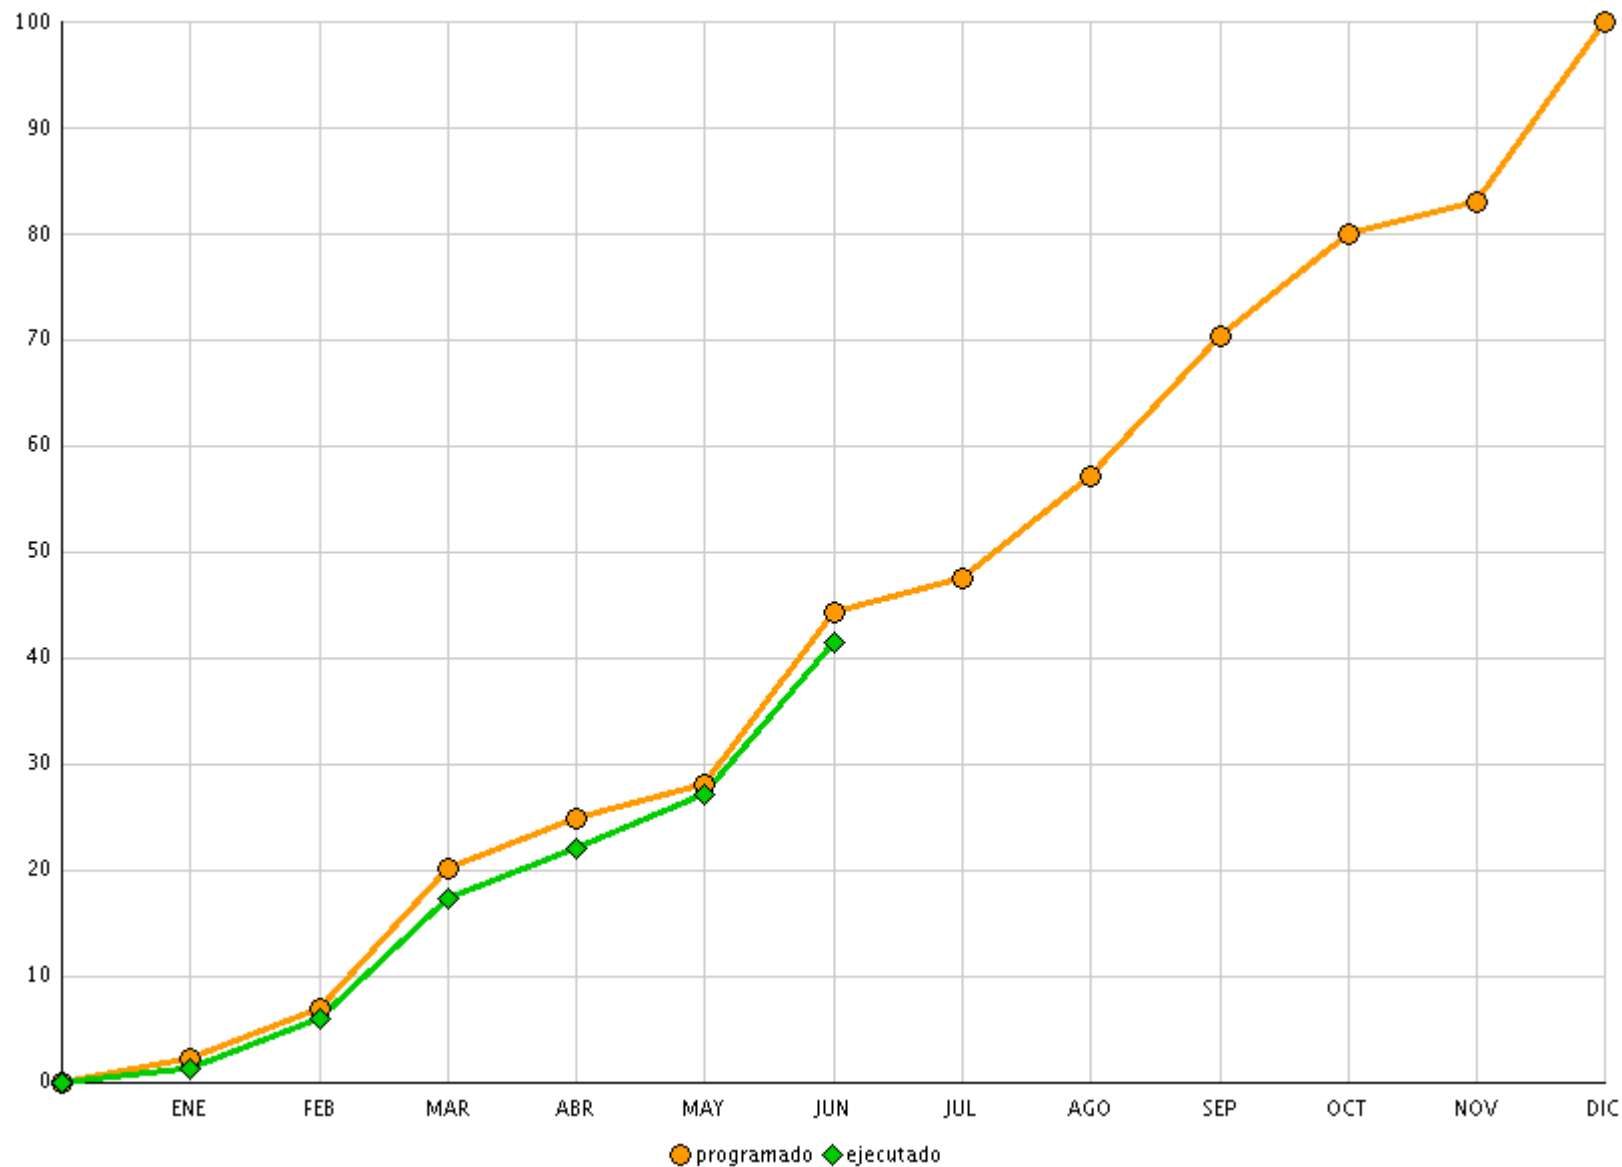


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.23	6.92	20.14	24.83	28.06	44.41	47.54	57.20	70.33	80.00	83.03	100.00
Ejecutado	1.33	6.02	17.34	22.03	27.16	41.43						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá

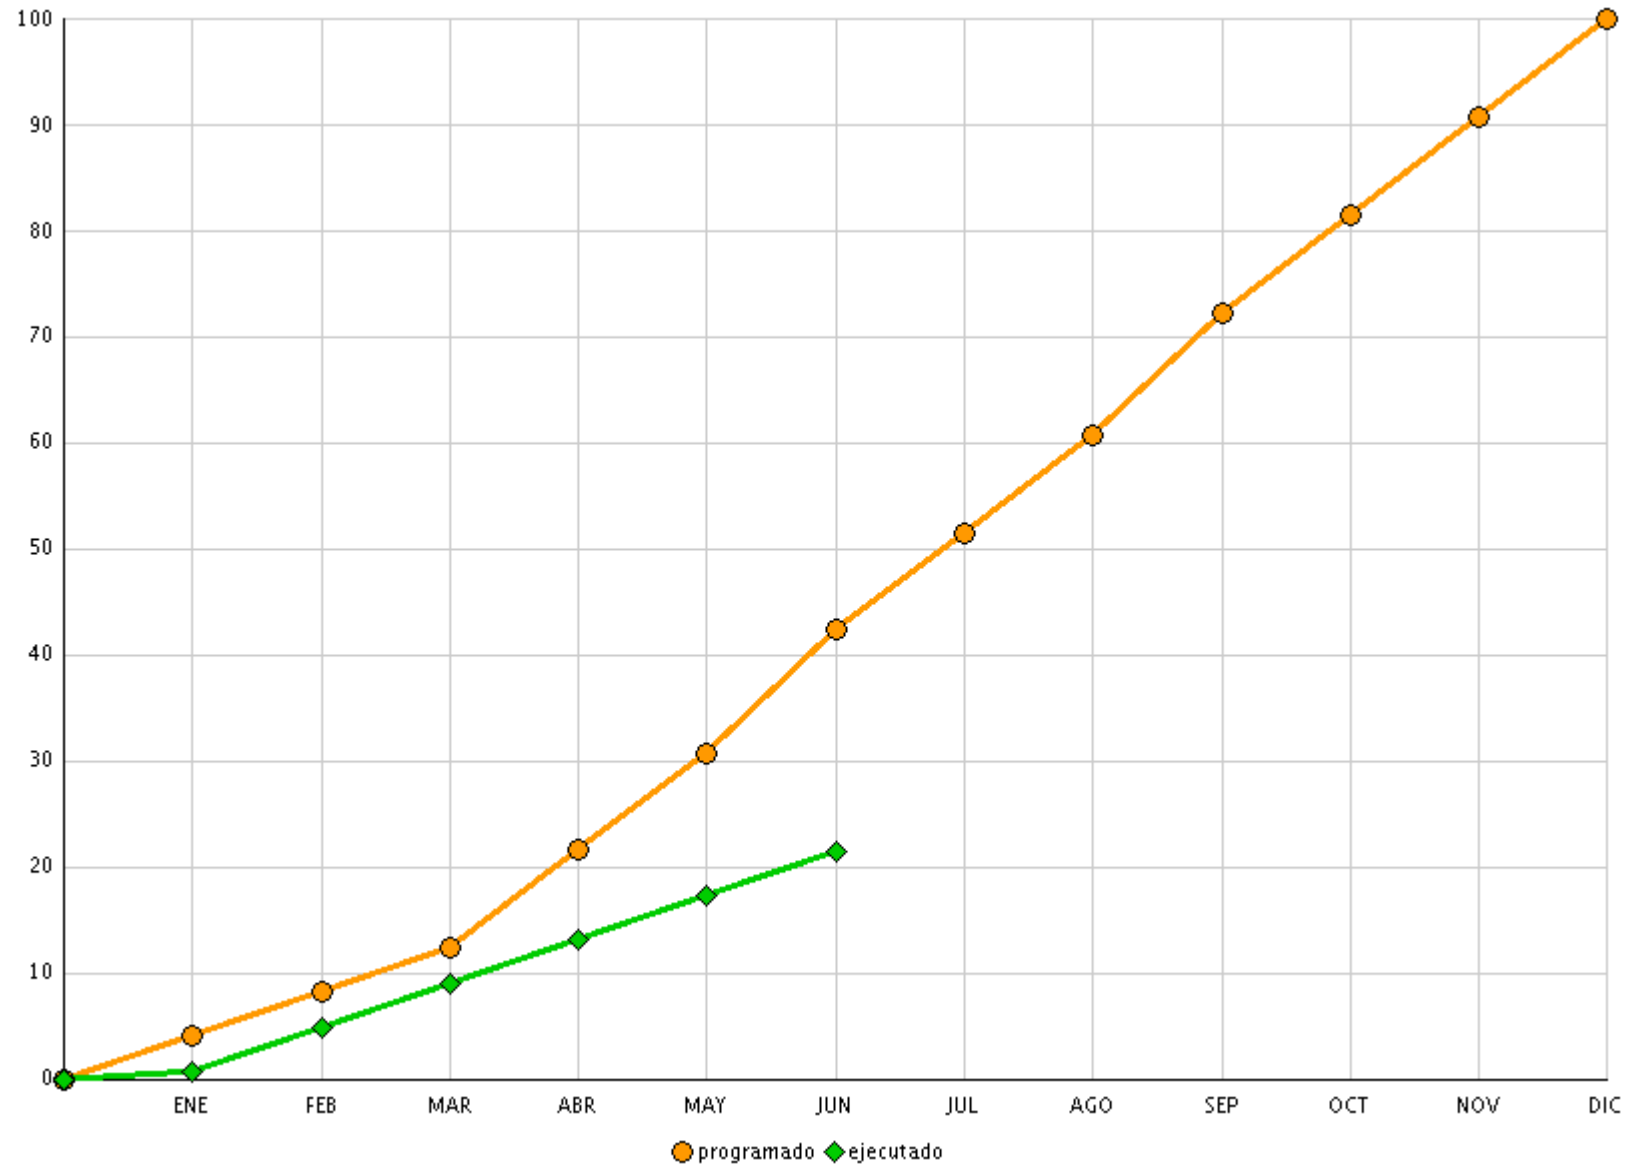


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.15	8.30	12.45	21.60	30.75	42.40	51.55	60.70	72.35	81.50	90.75	100.00
Ejecutado	0.83	4.98	9.13	13.28	17.43	21.58						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

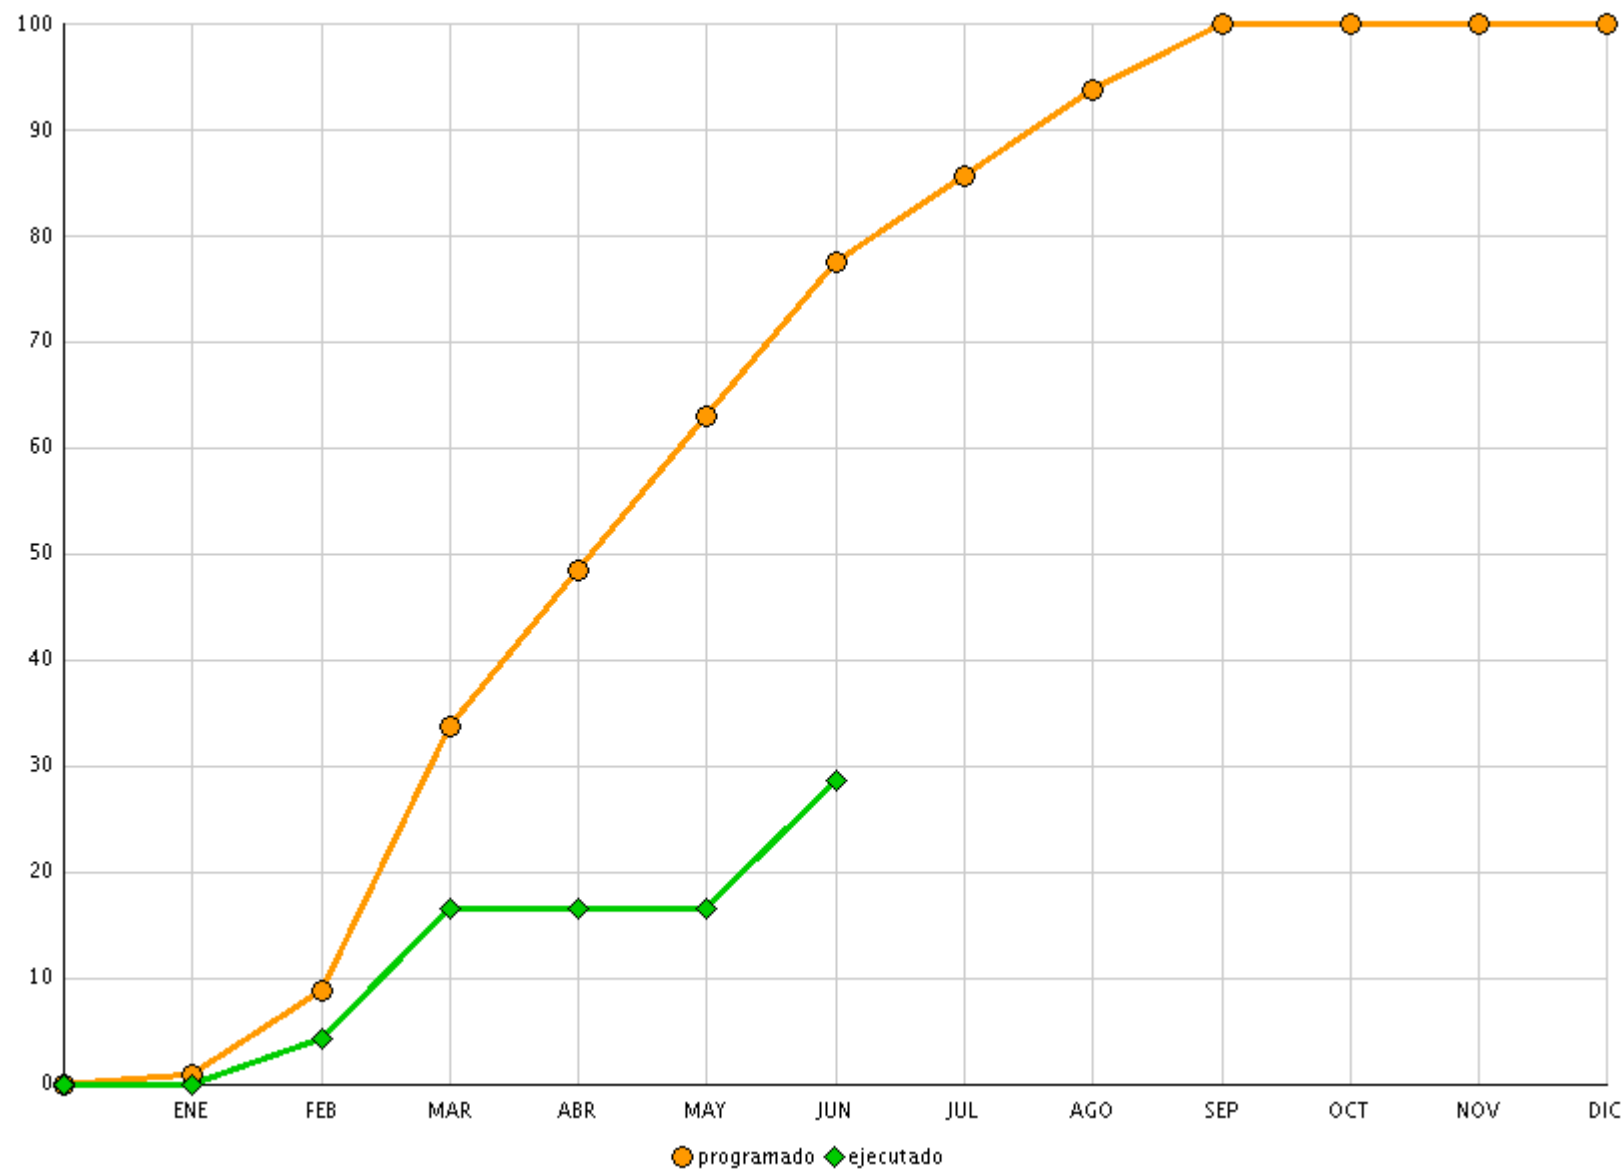


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.99	8.82	33.73	48.42	63.01	77.60	85.67	93.75	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	4.36	16.58	16.58	16.58	28.61						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá

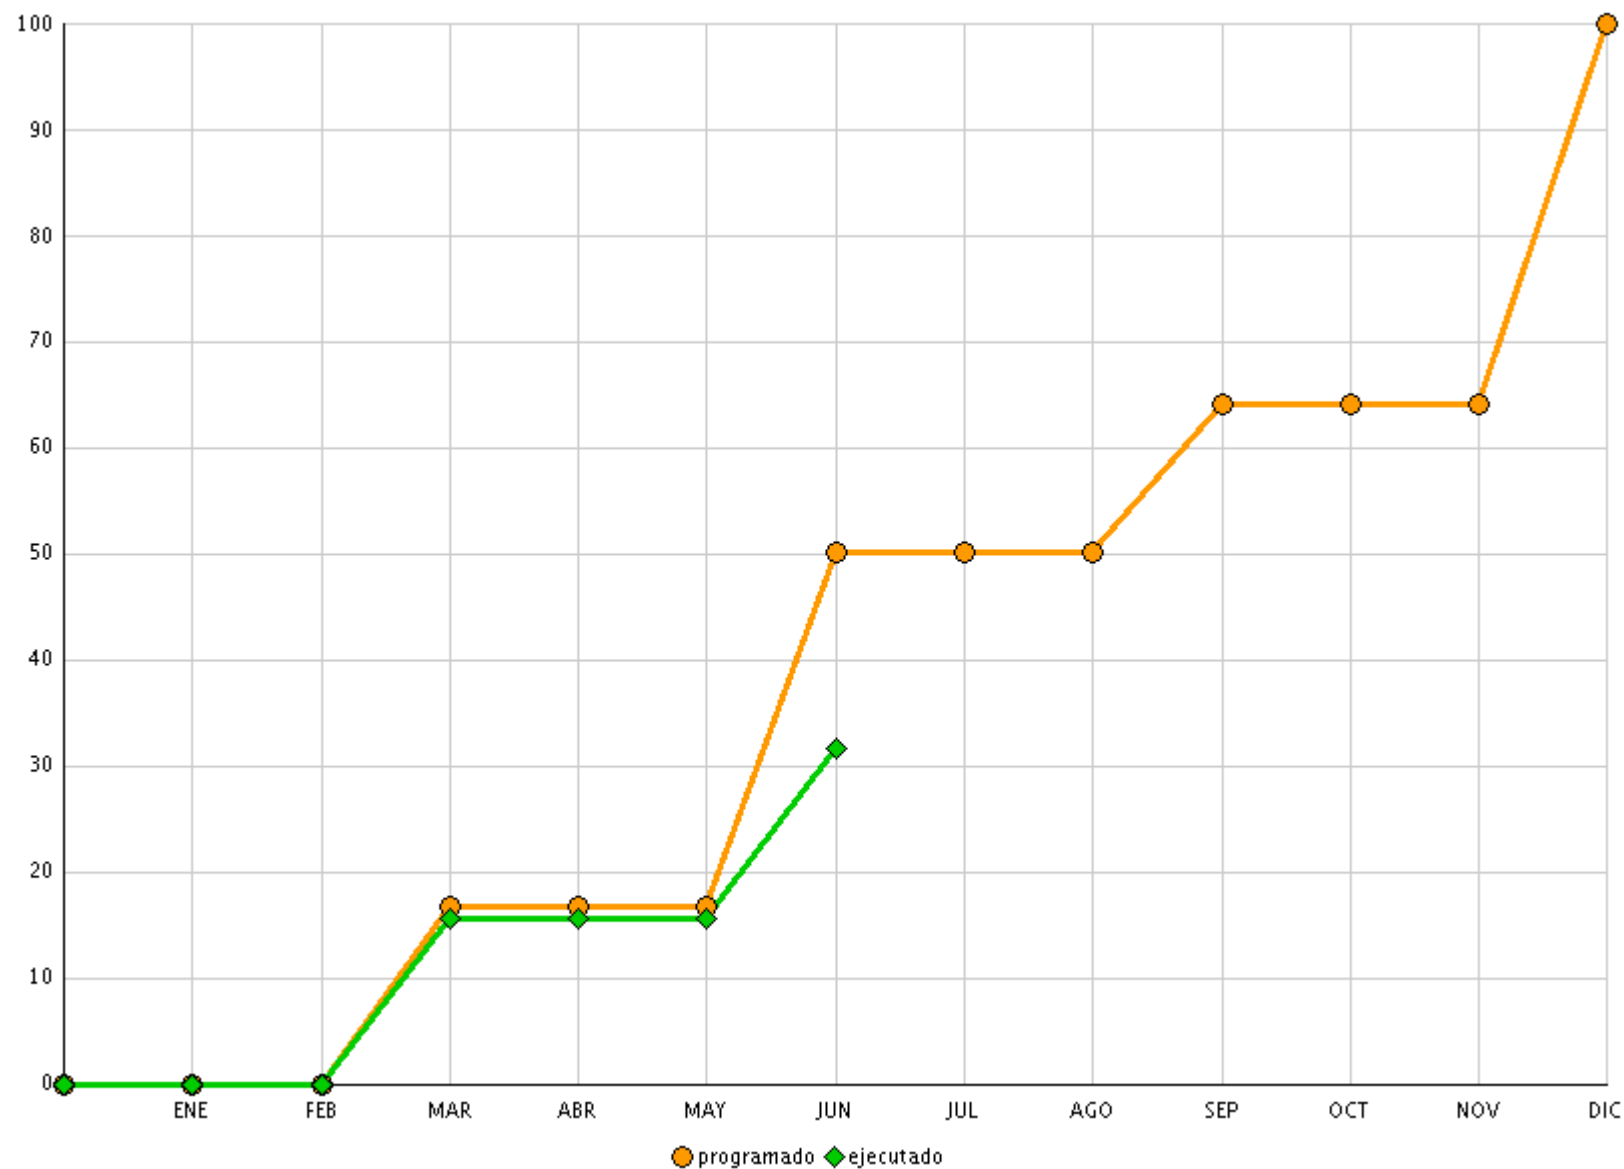


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	16.75	16.75	16.75	50.15	50.15	50.15	64.15	64.15	64.15	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	15.61	15.61	15.61	31.76						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

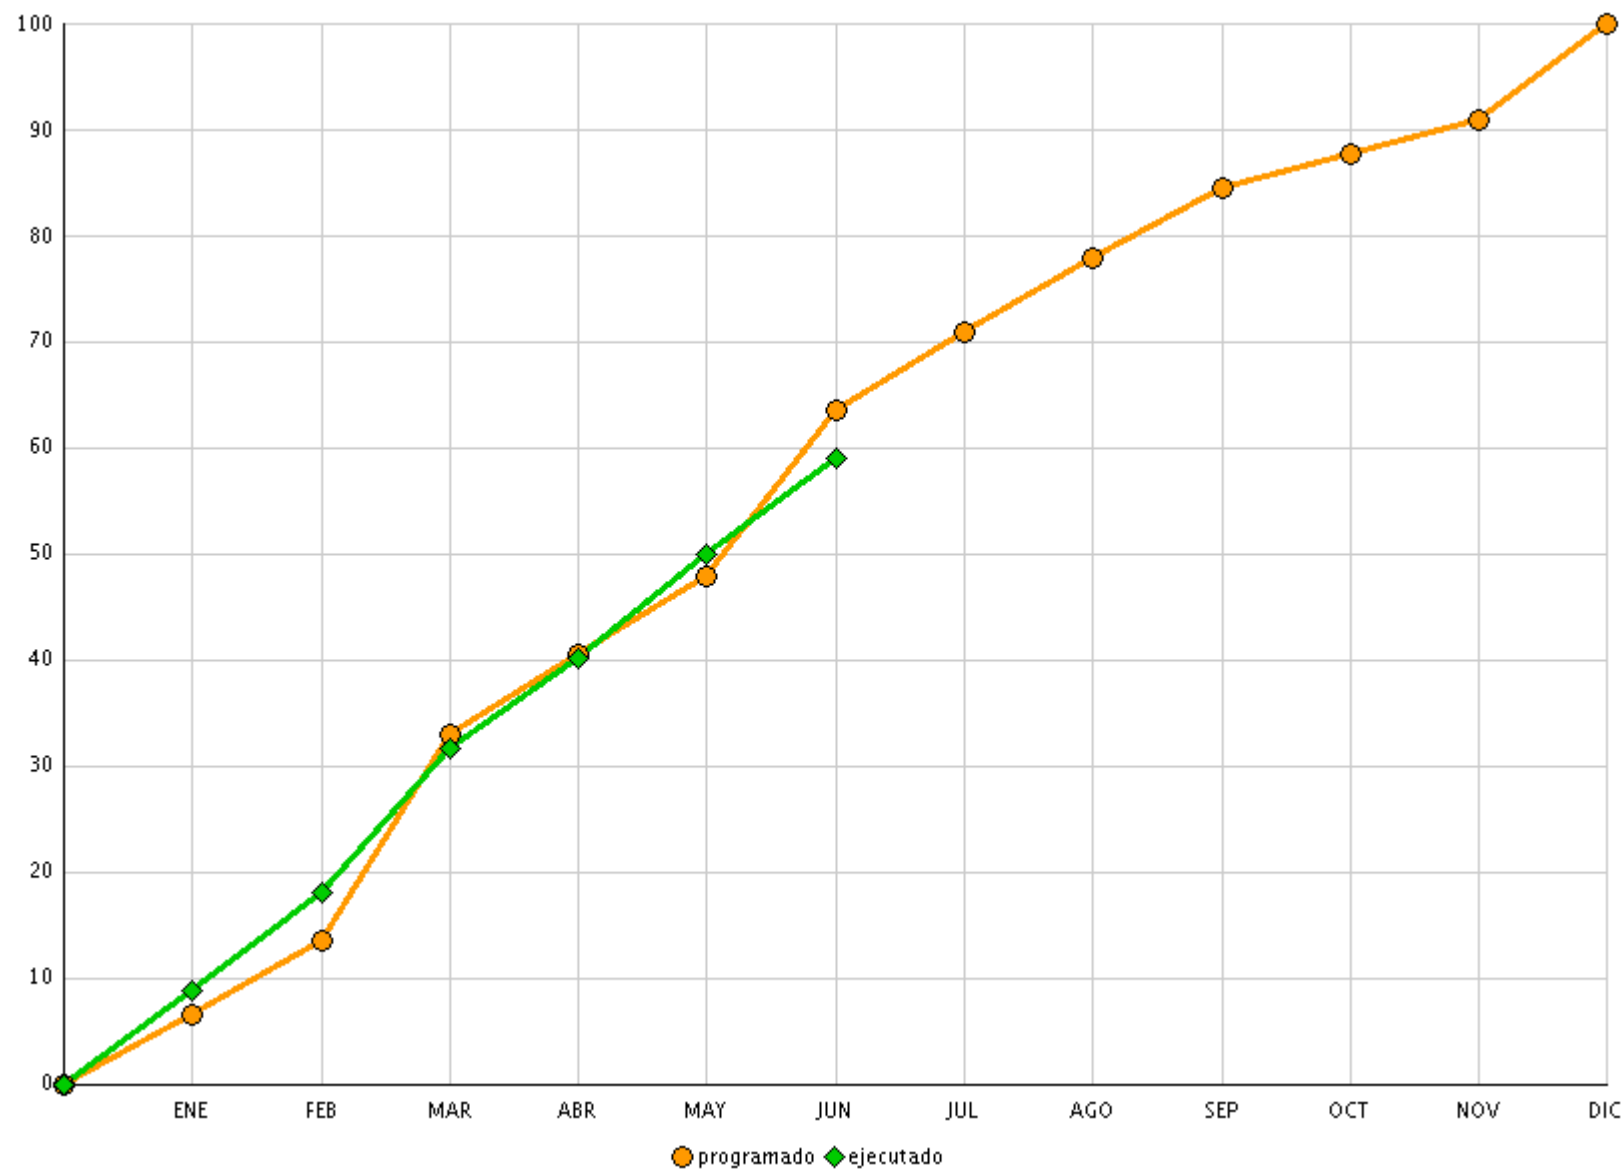


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.52	13.61	32.95	40.47	47.98	63.58	70.89	77.95	84.60	87.76	90.92	100.00
Ejecutado	8.79	18.15	31.66	40.22	50.08	58.98						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

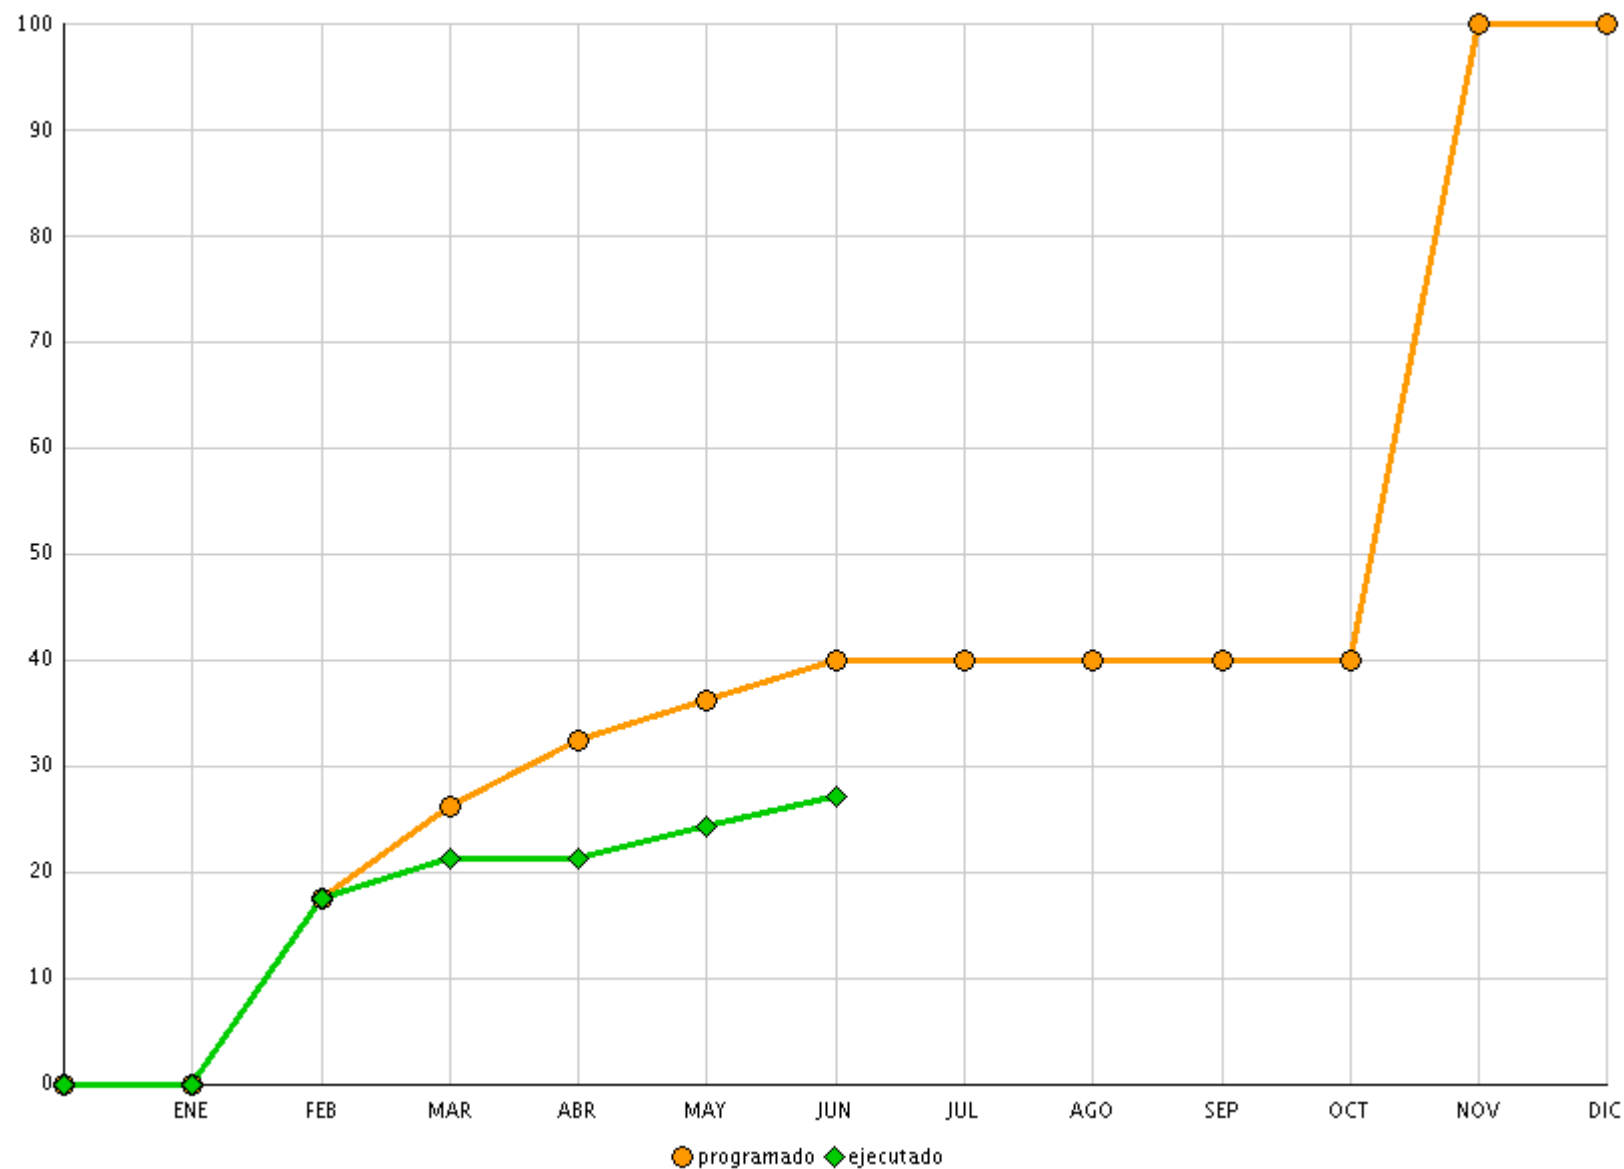

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	17.50	26.25	32.50	36.25	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	17.50	21.25	21.25	24.25	27.25						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaria Distrital de Hacienda
7580 18 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 1.871 CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	0.00																											
1.1	RESERVA REALIZAR CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	9.00	60.00	54.00	40.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	9.00
1.2	REALIZAR CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	89.00	5.00	0.00	9.00	4.50	9.00	12.80	9.00	9.70	9.00	15.40	9.00	23.70	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	66.10	58.83
2.	DESARROLLAR 6 CAMPAÑAS DE LUCHA Y CONTROL DE LA EVASIÓN	0.00																											
2.1	RESERVA DESARROLLAR CAMPAÑAS DE LUCHA Y CONTROL A LA EVASIÓN	1.00	12.00	12.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.50	15.00	3.80	14.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	62.30	0.62
2.2	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE LUCHA Y CONTROL A LA EVASIÓN	1.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	0.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							68.95			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7584 15 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADELANTAR DILIGENCIAS PARA FORMALIZAR 50.000 UNIDADES PRODUCTIVAS, FACILITANDO LA FINANCIACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL Y LAS TASAS DE INTERES DE MICROCREDITOS Y LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE PROCESAMIE	0.00																											
1.1	ADELANTAR DILIGENCIAS PARA FORMALIZAR UNIDADES PRODUCTIVAS, FACILITANDO LA FINANCIACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL Y LAS TASAS DE INTERES DE MICROCREDITOS Y LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTO	*****	4.50	0.00	9.10	3.40	9.10	14.80	9.10	11.80	9.10	26.40	9.10	27.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		4.50		100.00	83.50	83.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										83.50

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance																															
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad																															
1. IMPLEMENTAR 2 HERRAMIENTAS PARA LA APROPIACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y EL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO.	0.00																																																										
1.1 RESERVAS - MEDIR Y VALORAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	20.00	50.00	20.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	3.60																															
1.2 RESERVAS - MPLEMENTAR LA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.	4.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	25.00	15.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	3.80																															
1.3 VIGENCIA - MEDIR Y VALORAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		30.00		0.00		0.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00																															
1.4 VIGENCIA - IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		70.00		0.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00																															
2. AVANZAR 7,5 PUNTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA*	0.00																																																										
2.1 VIGENCIA - DEFINIR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL MIPG.	40.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	20.00																															
Total ponderación vertical		100.00																												TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												27.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaria Distrital de Hacienda

7613 14 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 2.9 EVALUACIONES DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO	0.00																											
1.1	VIGENCIA: 1.1: REALIZAR DOS (2) EVALUACIONES DEL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		100.00	5.00	0.83
1.2	VIGENCIA: 1.2: DEFINIR E IMPLEMENTAR UN CICLO PRESUPUESTAL ORIENTADO A RESULTADO	16.60	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	7.97
1.3	RESERVA: 1.1: REALIZAR 0.9 EVALUACIONES DEL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO	16.80	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	60.00	10.08
2.	DEFINIR E IMPLEMENTAR 0.59 ESQUEMA DE SEGUIMIENTO AL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES DISTRITALES Y FDL EN EL CANAL DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL IMG	0.00																											
2.1	VIGENCIA: 2.1: EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS CON LOS TERCEROS EN EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
2.2	VIGENCIA: 2.2: REALIZAR LOS INFORMES DE DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LA OFERTA SECTORIAL DEL CANAL DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
2.3	VIGENCIA: 2.3: CONSOLIDAR UNA BASE DE DATOS QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE PAGOS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE LA ESTRATEGIA DE IMG DE LAS DISTINTAS FUENTES DE RECURSOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	1.25
2.4	VIGENCIA: 2.4: GESTIONAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DEL GRUPO DE VALOR DE LA ESTRATEGIA DE IMG	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	14.00
2.5	RESERVA: 2.3: CONSOLIDAR UNA BASE DE DATOS QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE PAGOS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE LA ESTRATEGIA DE IMG DE LAS DISTINTAS FUENTES DE RECURSOS	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	38.00	0.00	0.00	18.00		0.00		18.00		0.00		17.00		0.00		100.00	38.00	3.80
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										41.43

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaria Distrital de Hacienda
7616 18 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	APOYAR EL 100% DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO	0.00																												
1.1	REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO EN EN CADA UNA DE SUS FASES	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.50		8.50		100.00	49.80	4.98	
2.	CONSTRUIR UN NUEVO EDIFICIO PARA EL CONCEJO DE BOGOTÁ	0.00																												
2.1	REALIZAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO PARA SU DOTACIÓN DEL MOBILIARIO Y ADECUACIÓN TECNOLÓGICA	40.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.50		8.50		100.00	41.50	16.60	
3.	REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	0.00																												
3.1	REUBICAR LA RED DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS, DE LA RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DEL EDIFICIO DE 6 PISOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3.2	CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CUANTIFICACIÓN DEL COSTO PARA OBRAS DE READECUACIÓN ESTRUCTURAL Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL ACTUAL EDIFICIO DEL CONCEJO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		21.58		

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

PLAN DE DESARROLLO:	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	: 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

[illegible]

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 28.61

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaría Distrital de Hacienda

7647 17 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC													
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
TOTAL						\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	AUMENTAR 100 POR CIENTO LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD ELECTRICA Y CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO CUMPLIENDO CON REQUERIMIENTOS TECNICOS	0.00																												
1.1	RESERVA: IMPLEMENTAR MEJORAS ELÉCTRICAS Y CAMBIOS DE COMPONENTES DE LAS SUBESTACIONES QUE NO ESTÉN CUMPLIENDO LAS NORMAS RETIE Y NFPA	55.00		0.00		0.00	30.00	28.00		0.00		0.00	58.00	28.00					5.00						7.00		100.00	56.00	30.80	
2.	REALIZAR 100 POR CIENTO DE LAS ADECUACIONES DE PISOS Y MEJORAR LAS ÁREAS COMUNES DEL CAD	0.00																												
2.1	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LAS TORRES A Y B DEL CAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.20		0.00		0.00	30.00	15.06					65.00								100.00	19.26	0.96	
2.2	SUMINISTRAR E INSTALAR ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ÁREAS Y ESPACIOS FISICOS DE LA SDH	40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					20.00						80.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		31.76	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaría Distrital de Hacienda

7661 25 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR EL 100 POR CIENTO EL ERP Y CORE TRIBUTARIO SEGÚN CONTRATO VIGENTE	0.00																											
1.1 VIGENCIA - FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN CORE ERP Y LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN	20.73	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	20.00	0.00	5.00	0.00	10.00	30.00	5.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		20.00		100.00	60.00	12.44
1.2 VIGENCIA - ADQUIRIR EL DERECHO A USO DE UNA SOLUCIÓN PARA CAPACITACIÓN EN SAP PARA FUNCIONARIOS TÉCNICOS DE SOPORTE	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	70.00	10.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	20.00	0.31
1.3 RESERVA - FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN CORE ERP Y LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN	1.96	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	10.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	1.37
1.4 RESERVA - REALIZAR LAS LABORES DE INTERVENTORÍA A LOS MÓDULOS Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES A LA ADICIÓN DEL CONTRATO BASE DE IMPLEMENTACIÓN FINAL	3.60	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40.00		100.00	60.00	2.16
1.5 VIGENCIA - REALIZAR LAS LABORES DE INTERVENTORÍA A LOS MÓDULOS Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES A LA ADICIÓN DEL CONTRATO BASE DE IMPLEMENTACIÓN FINAL	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR 100 POR CIENTO DE LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA	0.00																											
2.1 VIGENCIA - REALIZAR LA COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN Y MEJORAS DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
2.2 RESERVA - REALIZAR LA COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN Y MEJORAS DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	0.05	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.05
3. OPERAR 100 POR CIENTO DE LA PLATAFORMA COMO SERVICIO	0.00																											
3.1 VIGENCIA - REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	11.61
3.2 RESERVA - REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	6.77	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.77
4. IMPLEMENTAR Y OPERAR 100 POR CIENTO DEL SERVICIO DE SOPORTE NIVEL 2	0.00																											
4.1 VIGENCIA - OPERAR EL SOPORTE DE NIVEL 2 DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00		19.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	57.00	11.67
4.2 RESERVA - OPERAR EL SOPORTE DE NIVEL 2 DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	11.42	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.42
5. IMPLEMENTAR 100 POR CIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ALINEADOS A LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO	0.00																											
5.1 VIGENCIA - ADELANTAR PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES IDENTIFICADAS	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.78

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 58.98

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaria Distrital de Hacienda

7669 18 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaria Distrital de Hacienda Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROVEER 84 POR CIENTO BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERACIÓN	0.00																											
1.1	VIGENCIA - REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES ACORDADAS CON LAS ÁREAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	20.00	25.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	9.75
1.2	RESERVA - REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES ACORDADAS CON LAS ÁREAS	5.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.50
2.	REPONER, ACTUALIZAR O MEJORAR 82,9 POR CIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	0.00																											
2.1	VIGENCIA - REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PARA LA REPOSICIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2	RESERVA - REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PARA LA REPOSICIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	20.00	0.00	0.00	75.00	75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		27.25	

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7599 Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.

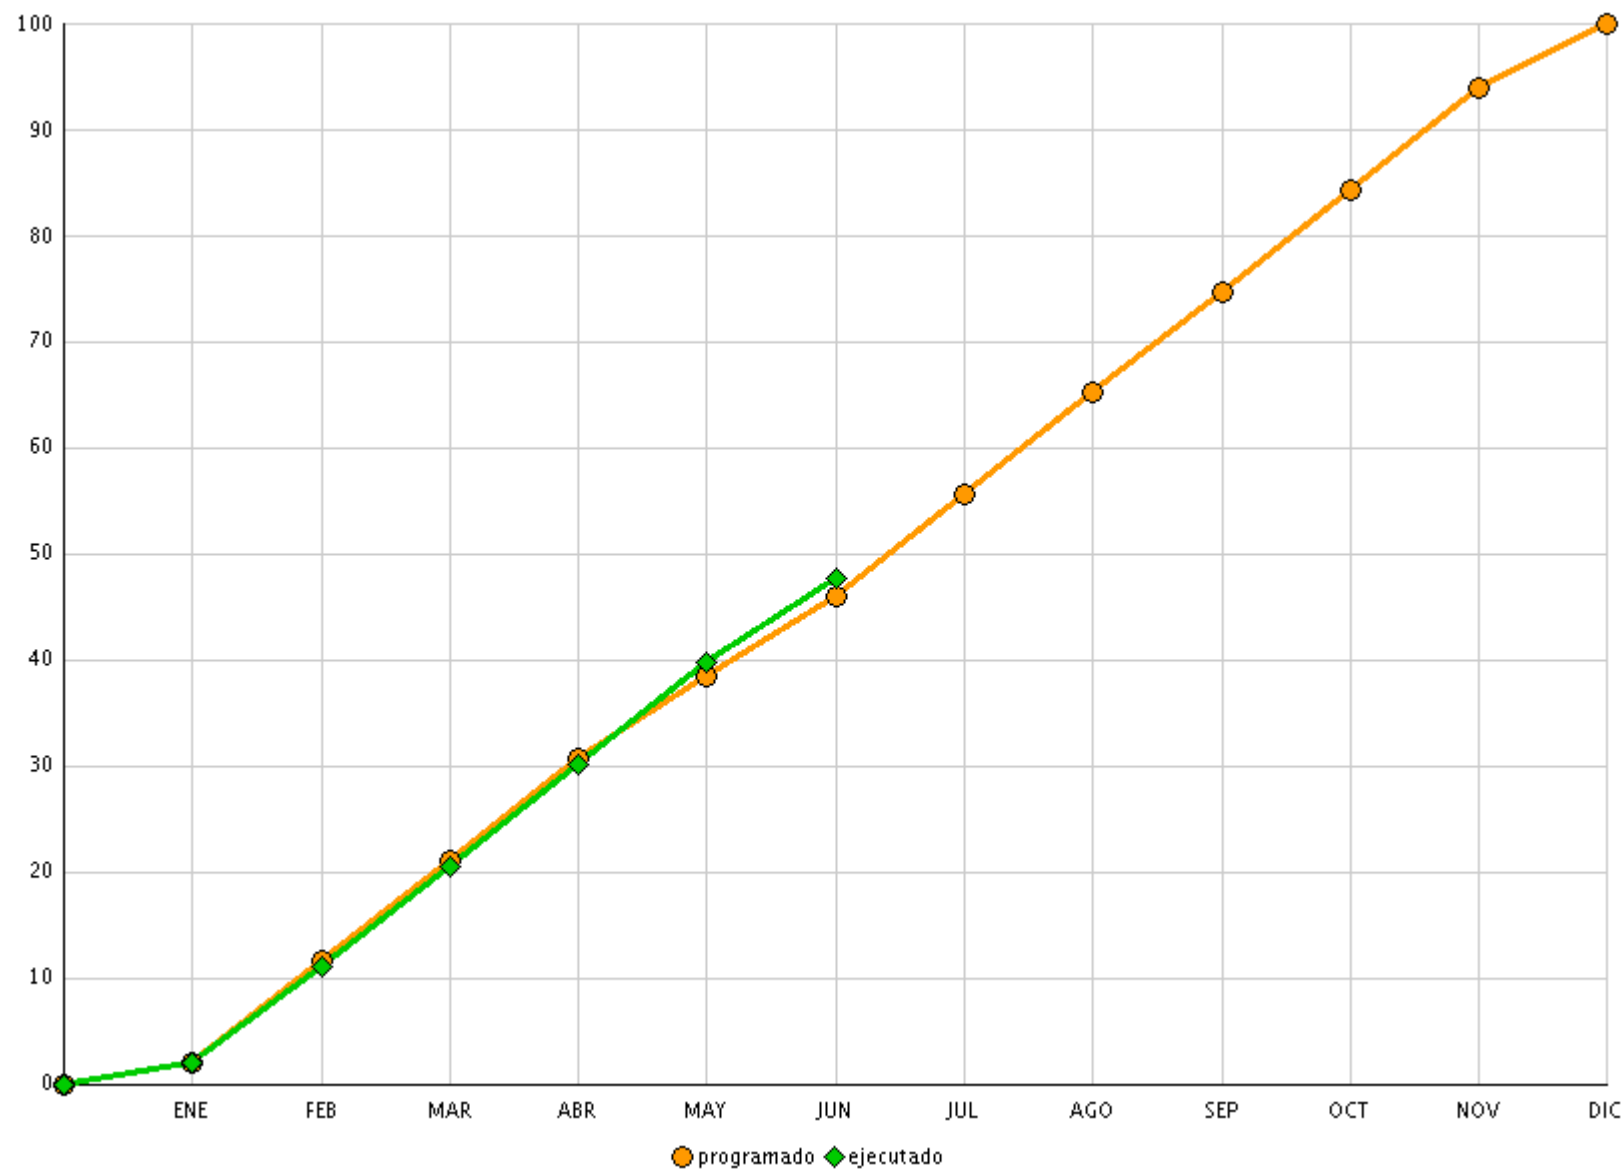


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	11.60	21.20	30.80	38.40	46.00	55.60	65.20	74.80	84.40	94.00	100.00
Ejecutado	2.00	11.20	20.60	30.20	39.80	47.80						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7624 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

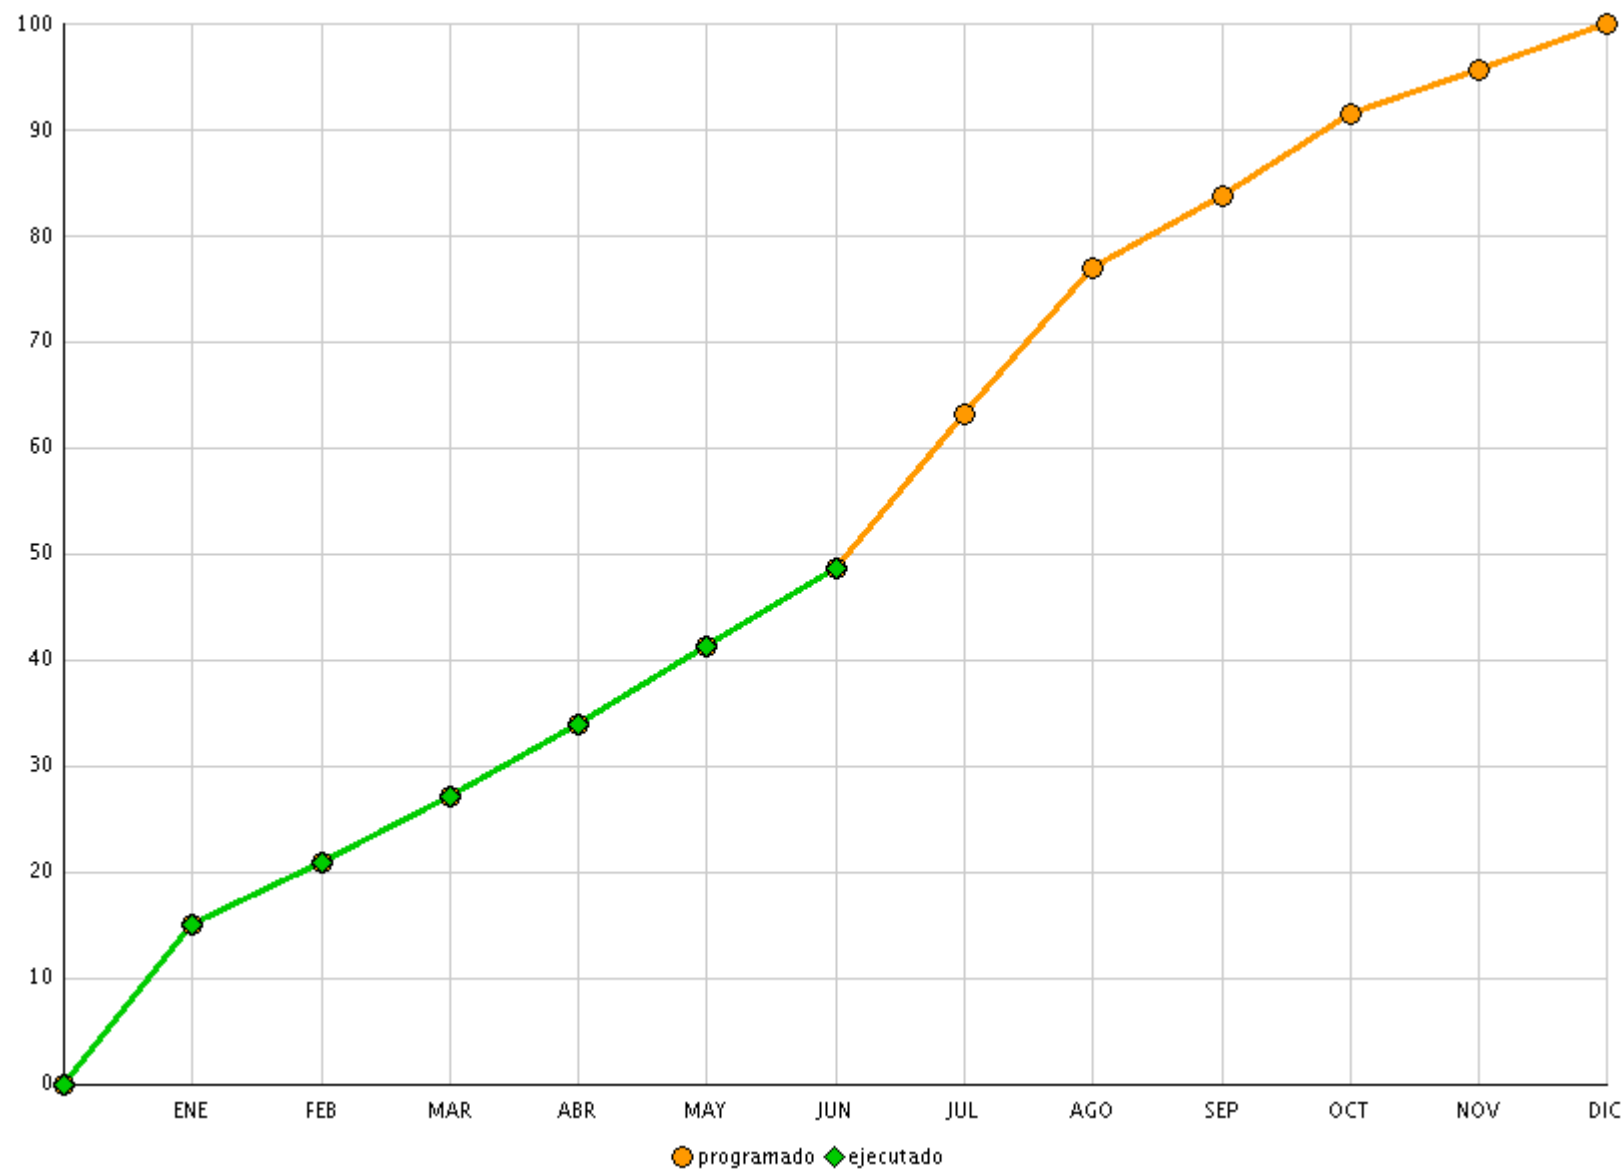


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	15.10	20.85	27.20	33.95	41.30	48.65	63.20	77.00	83.75	91.50	95.75	100.00
Ejecutado	15.10	20.85	27.20	33.95	41.30	48.65						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

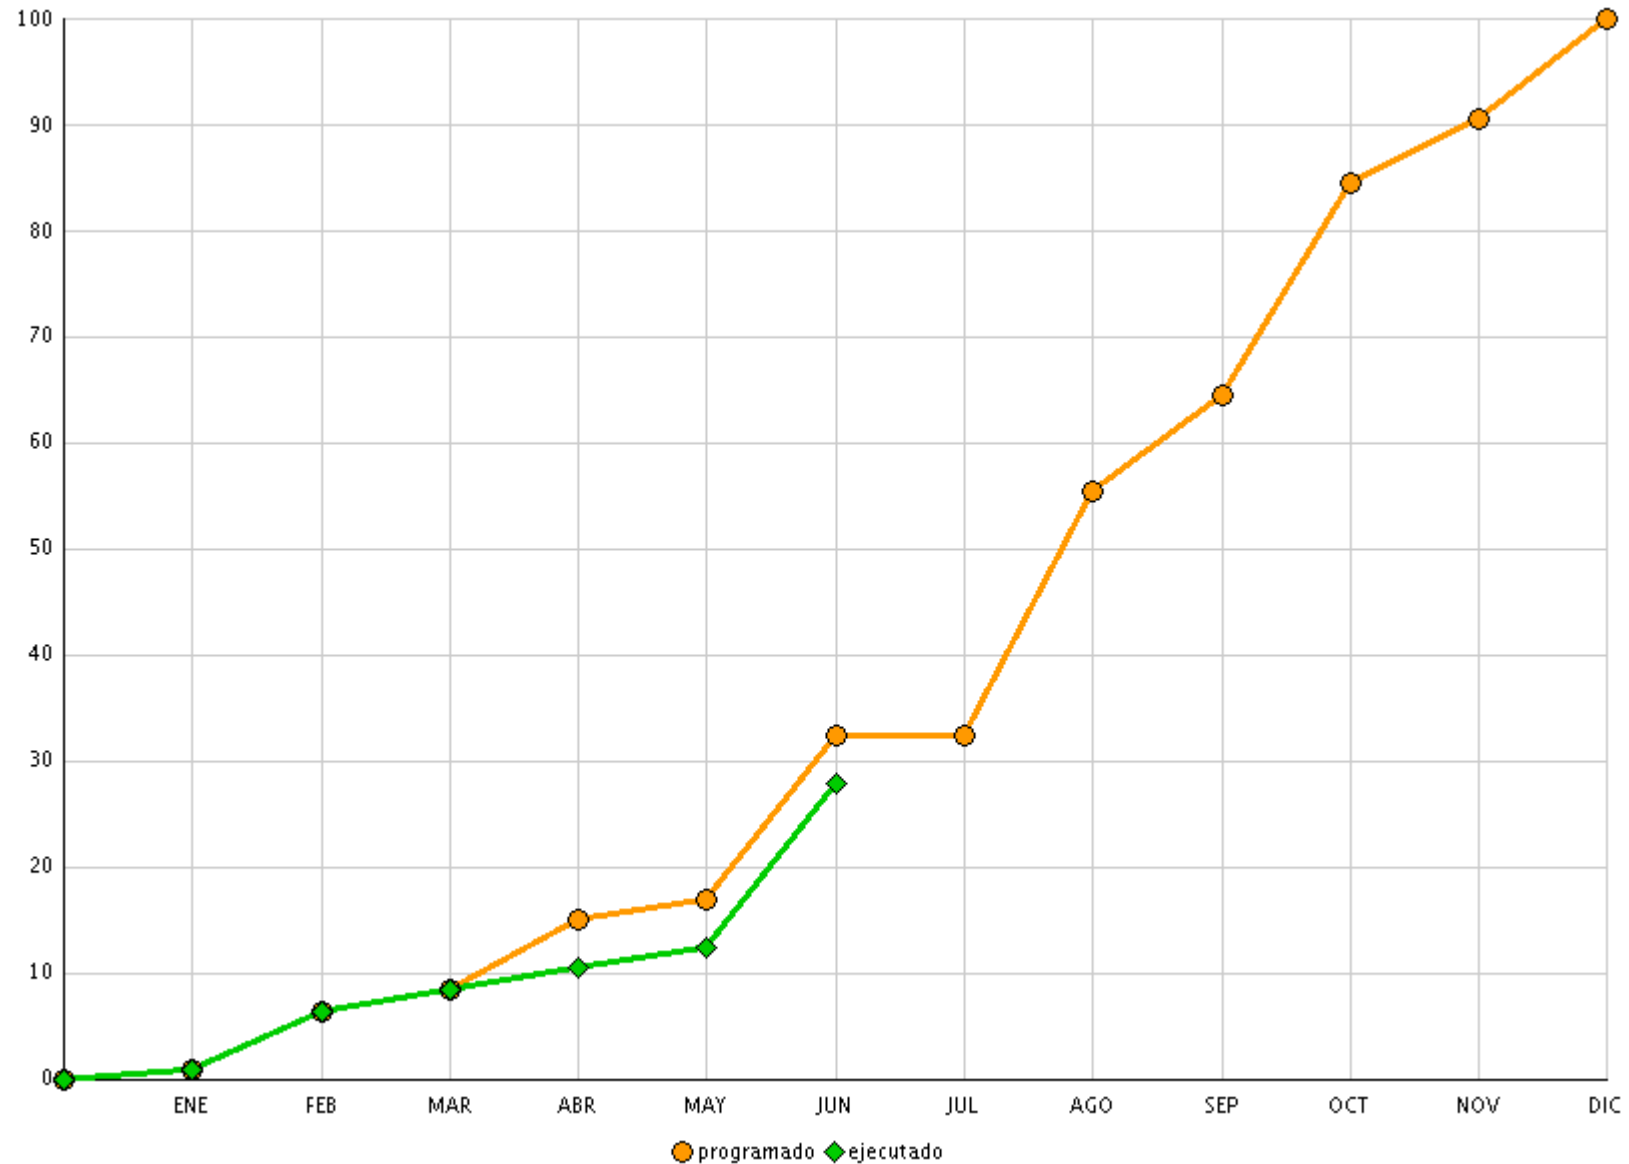


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.00	6.50	8.50	15.00	17.00	32.50	32.50	55.50	64.50	84.50	90.60	100.00
Ejecutado	1.00	6.50	8.50	10.50	12.50	28.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7643 Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.

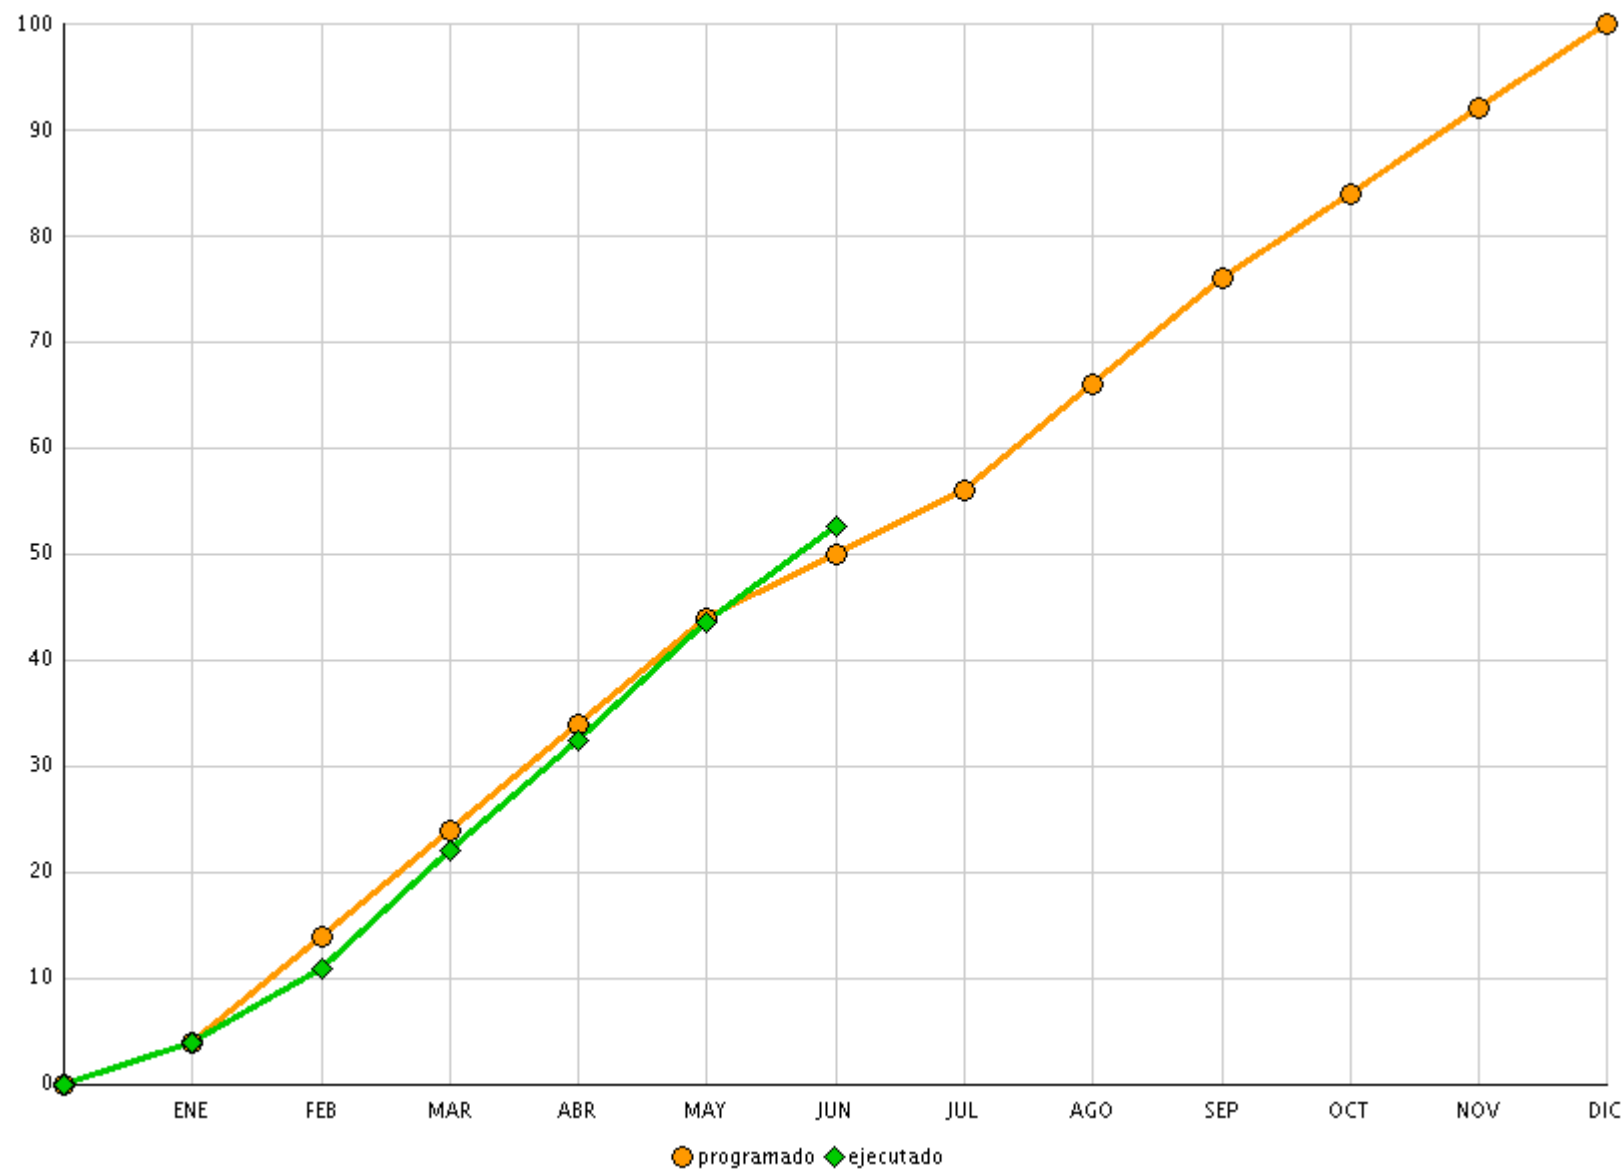


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.00	14.00	24.00	34.00	44.00	50.00	56.00	66.00	76.00	84.00	92.00	100.00
Ejecutado	4.00	11.00	22.00	32.50	43.50	52.70						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7686 Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

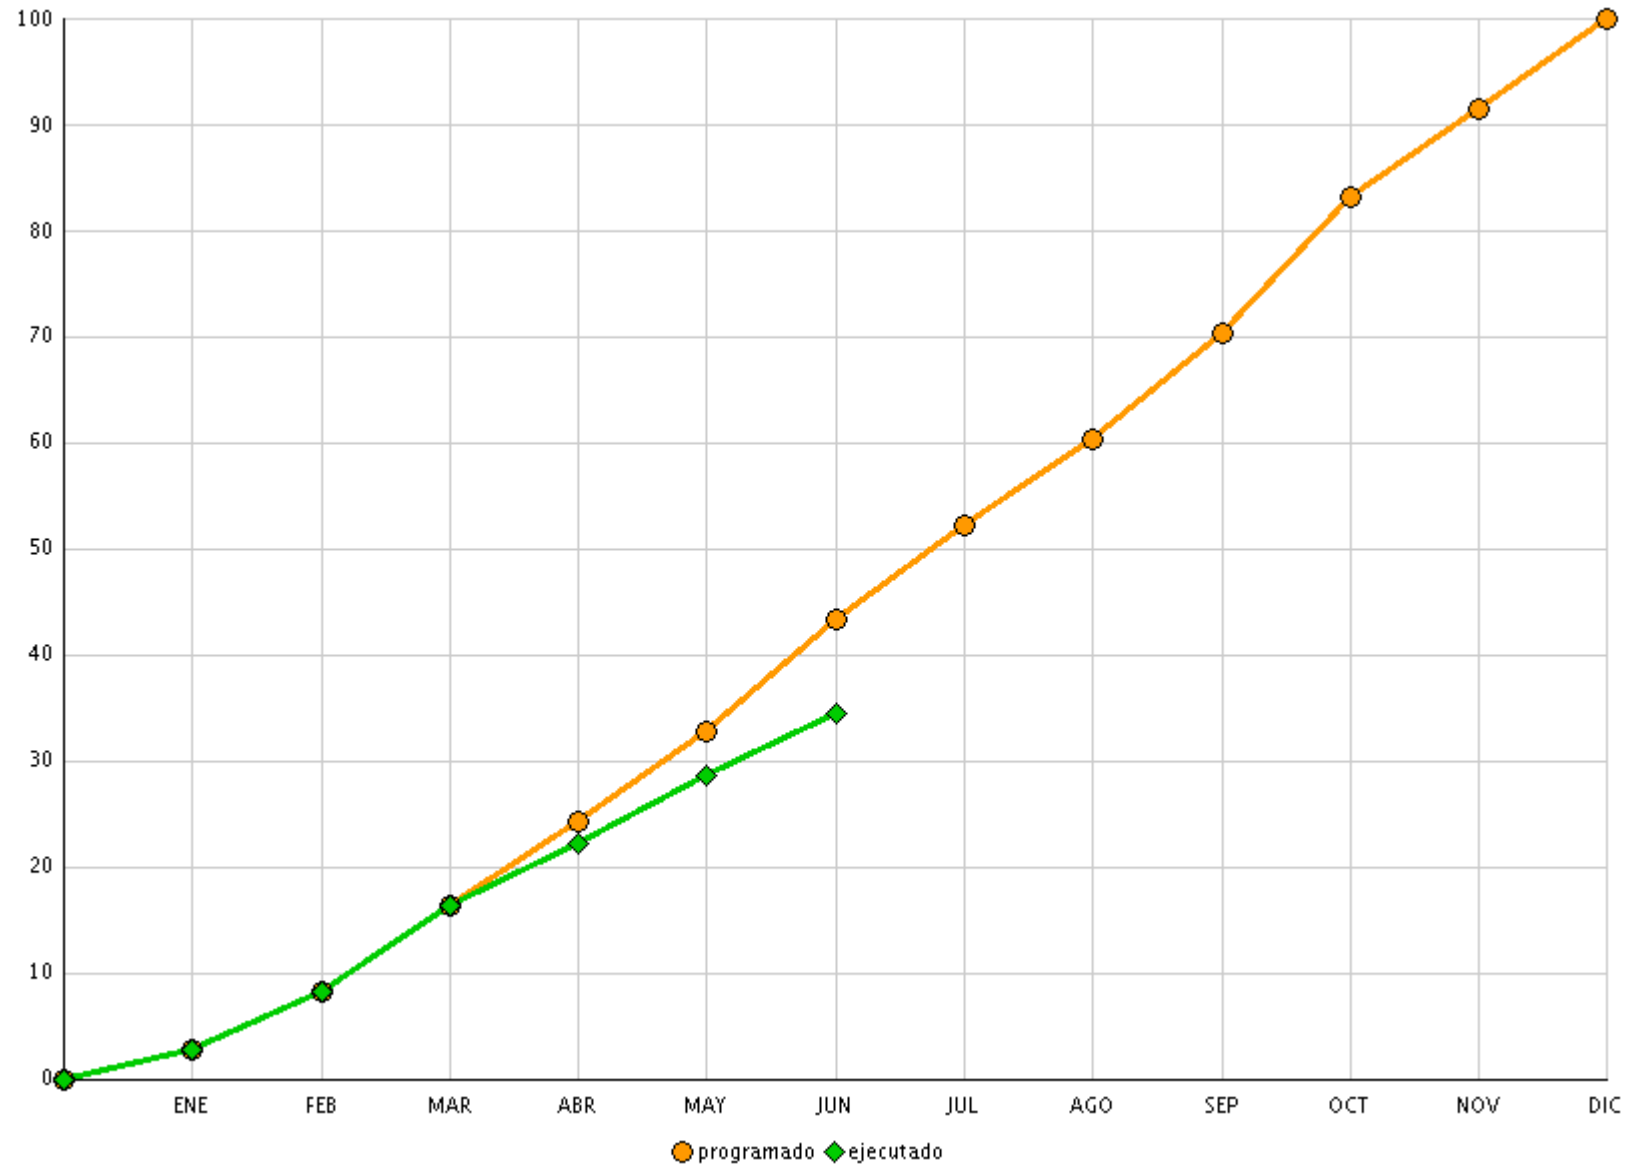


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.90	8.20	16.40	24.30	32.80	43.40	52.20	60.40	70.40	83.30	91.50	100.00
Ejecutado	2.90	8.20	16.40	22.20	28.60	34.50						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7689 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.

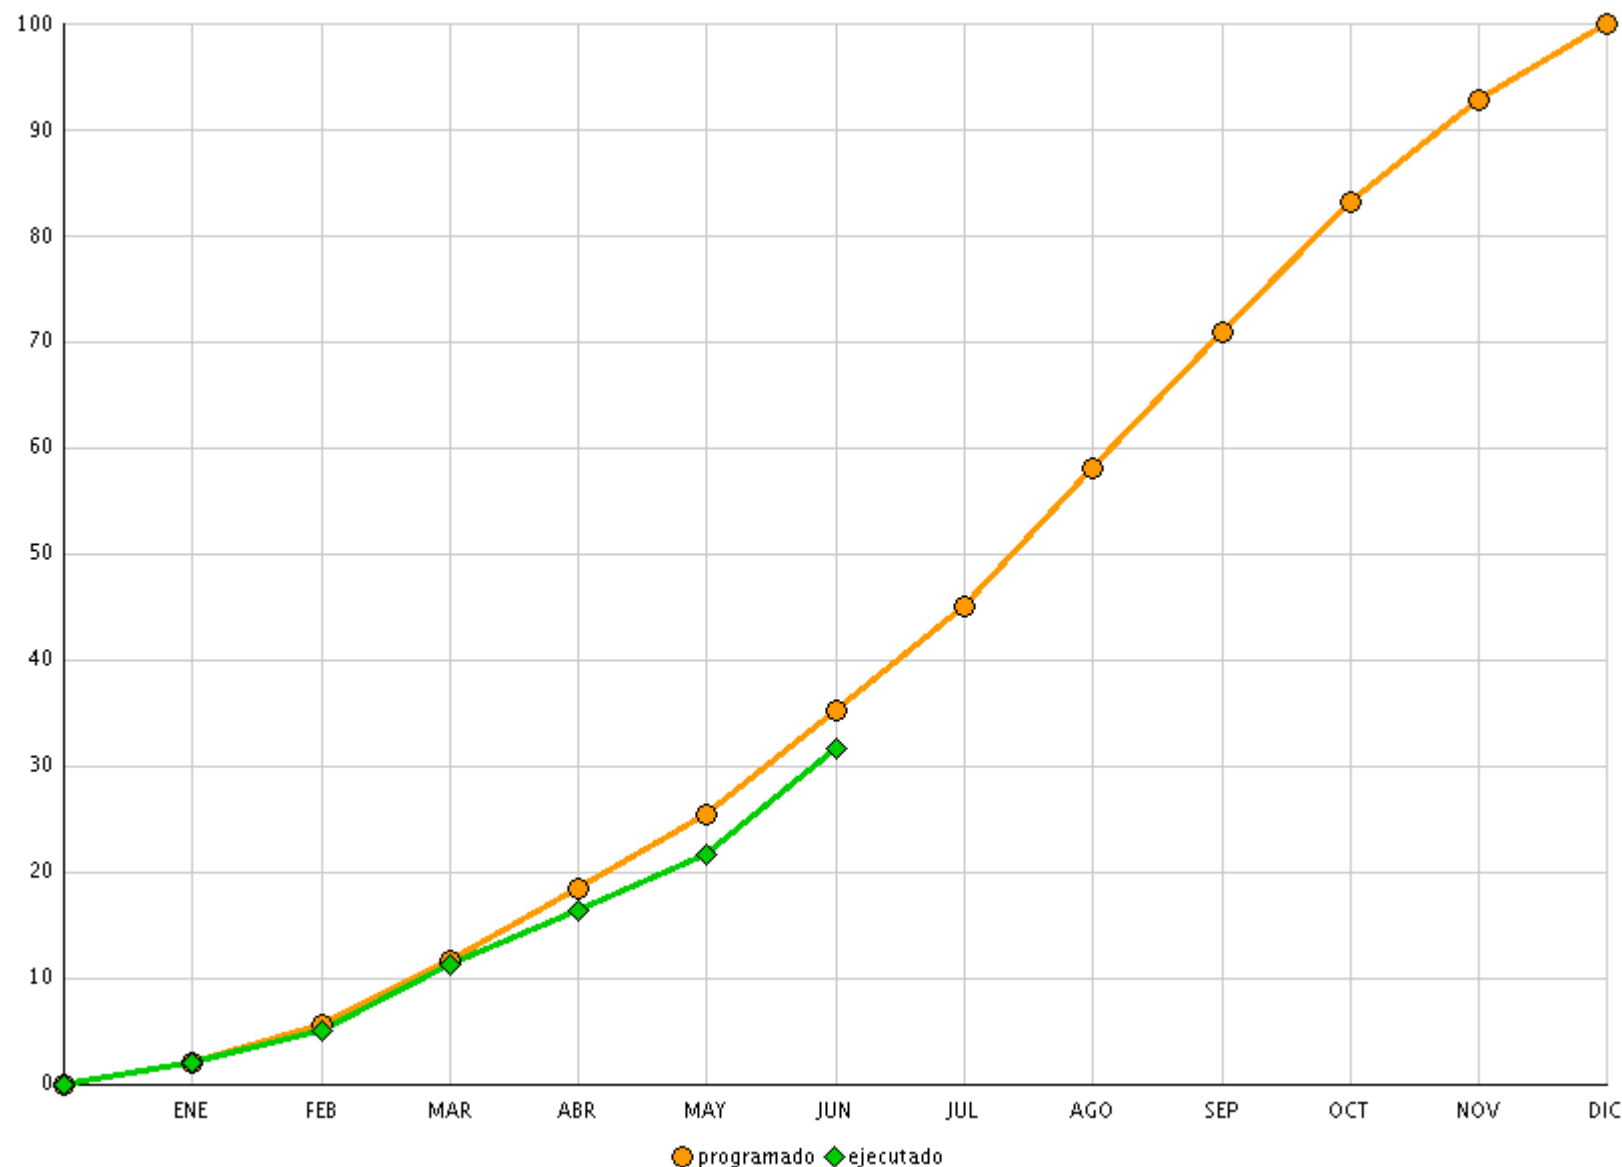


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	5.56	11.73	18.55	25.37	35.24	45.11	58.03	70.95	83.26	92.87	100.00
Ejecutado	2.00	5.04	11.25	16.50	21.75	31.62						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7690 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.

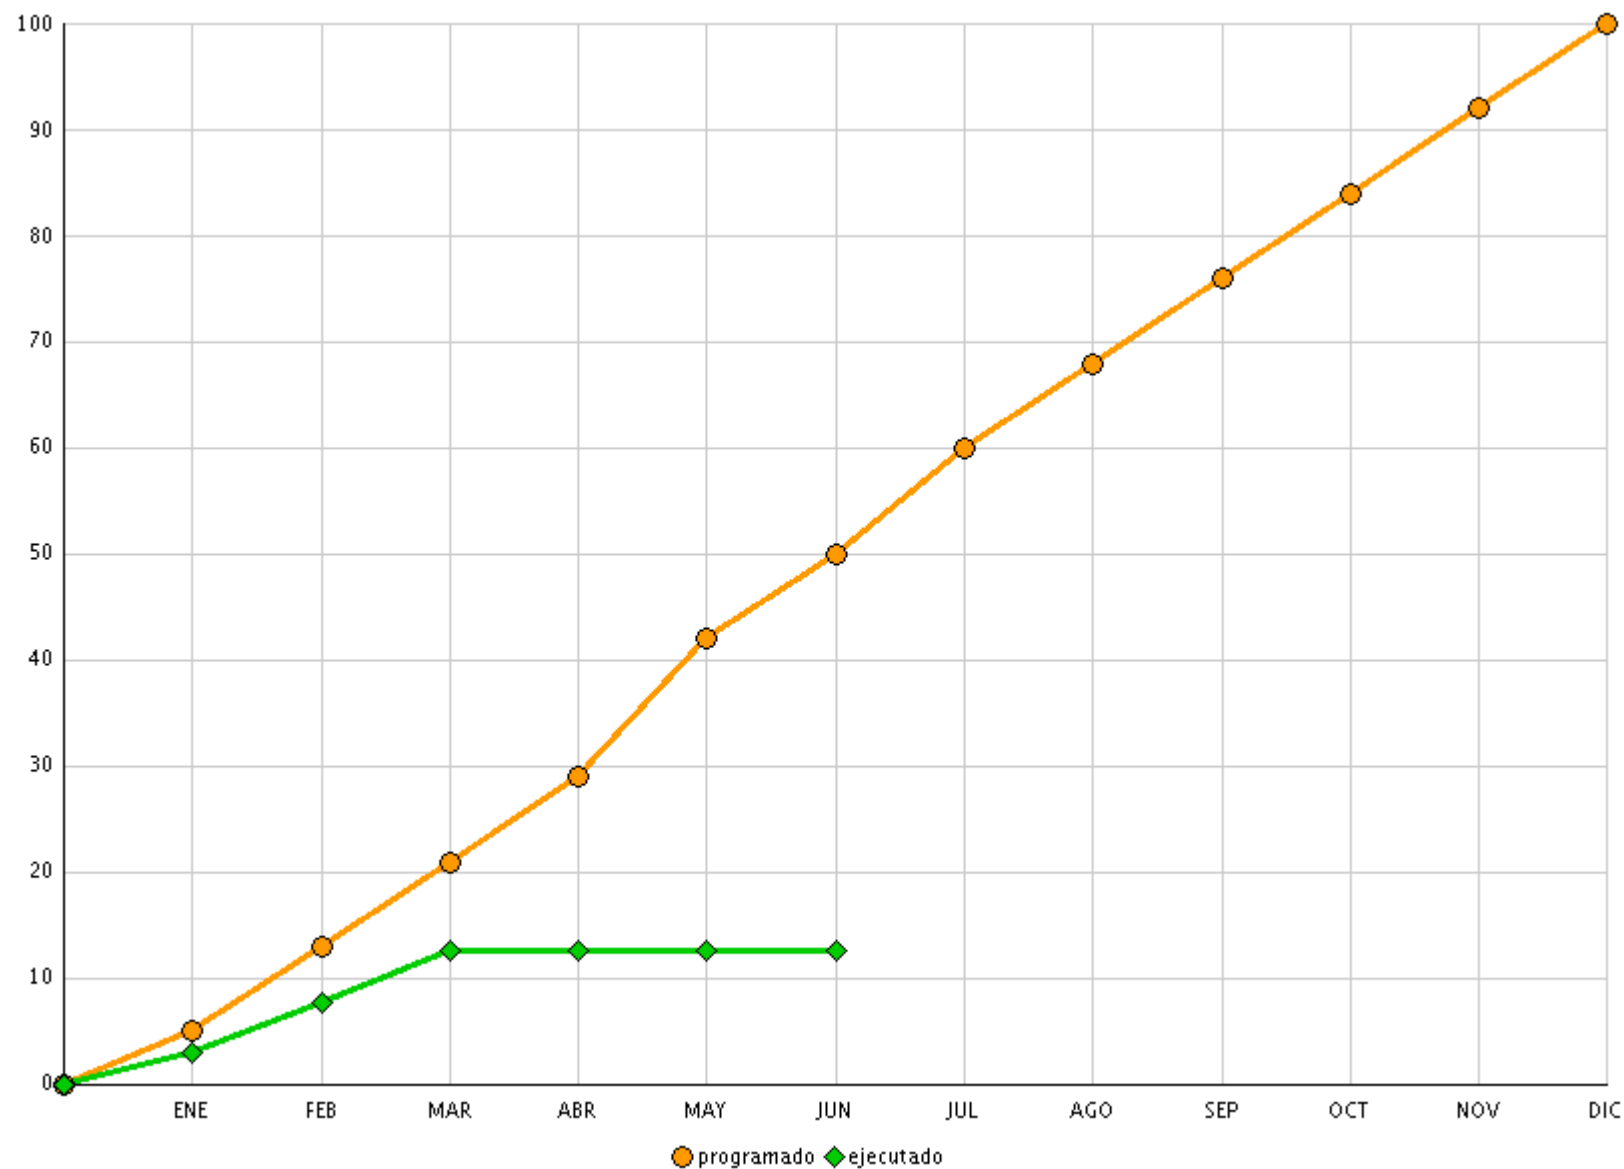


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	13.00	21.00	29.00	42.00	50.00	60.00	68.00	76.00	84.00	92.00	100.00
Ejecutado	3.00	7.80	12.60	12.60	12.60	12.60						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7736 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

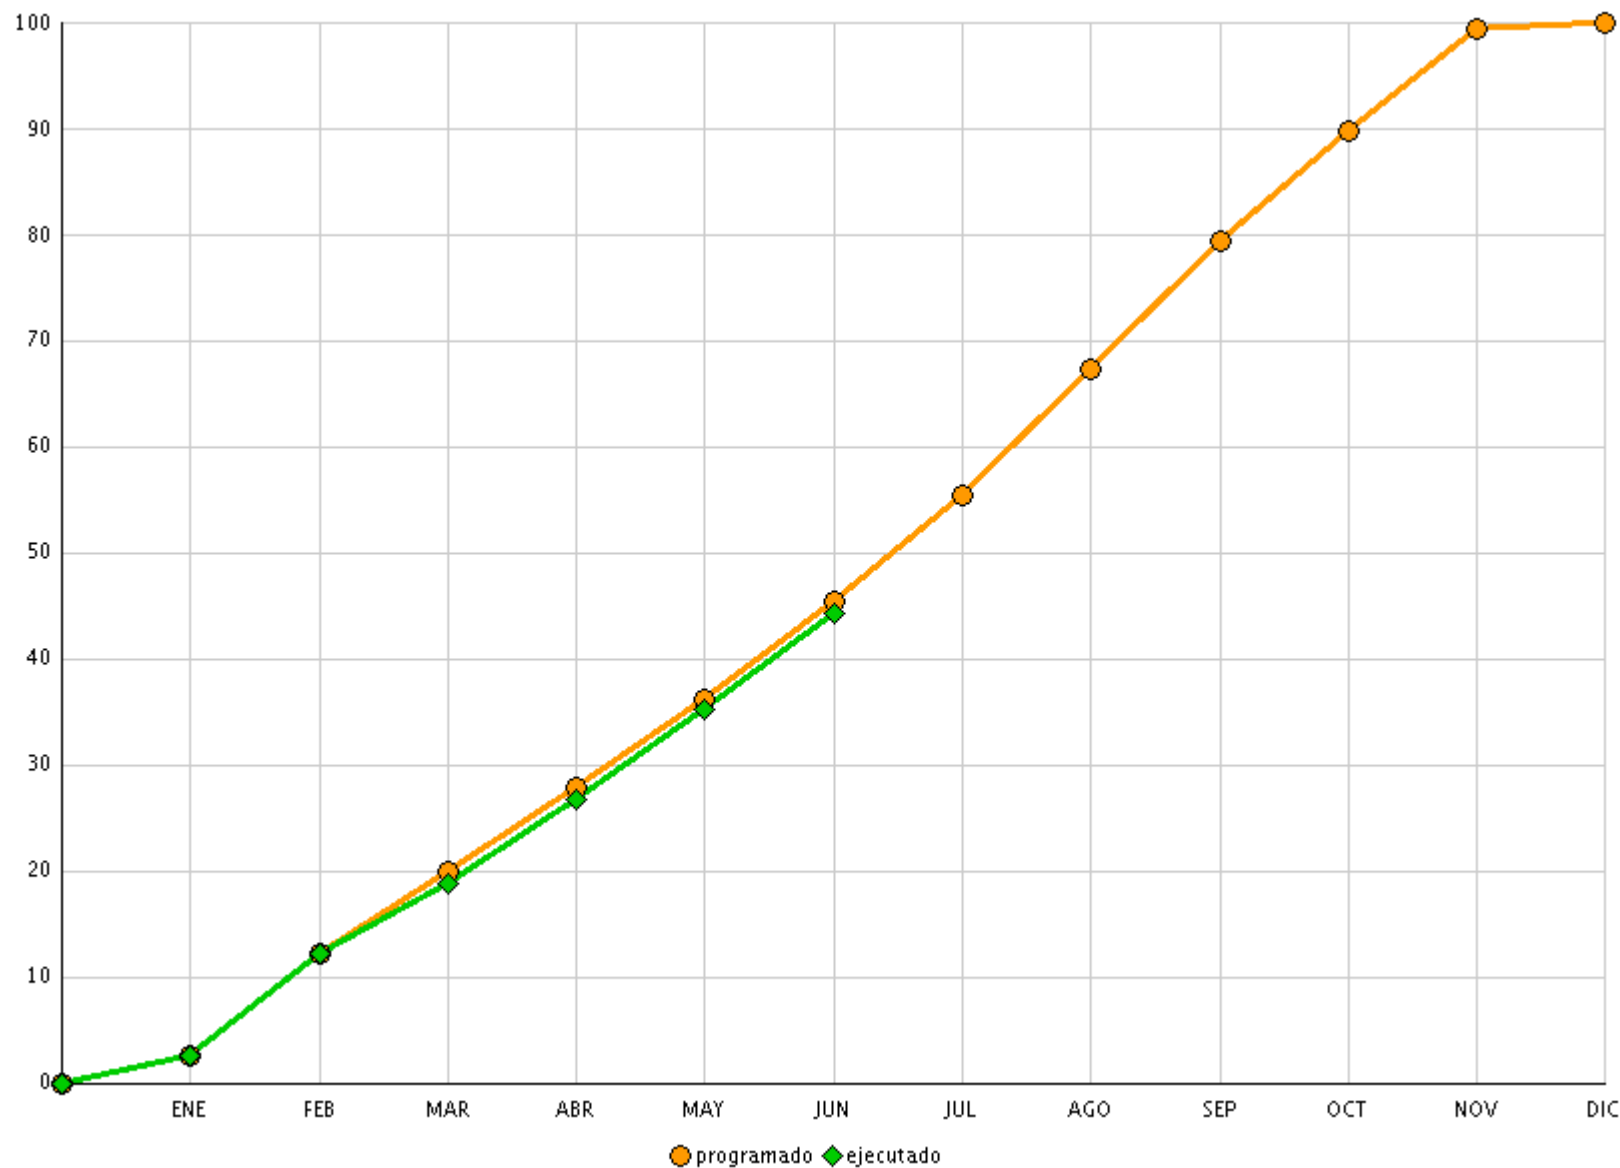


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.70	12.30	19.95	27.90	36.30	45.40	55.55	67.45	79.35	89.75	99.40	100.00
Ejecutado	2.70	12.30	18.90	26.85	35.25	44.35						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7737 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.

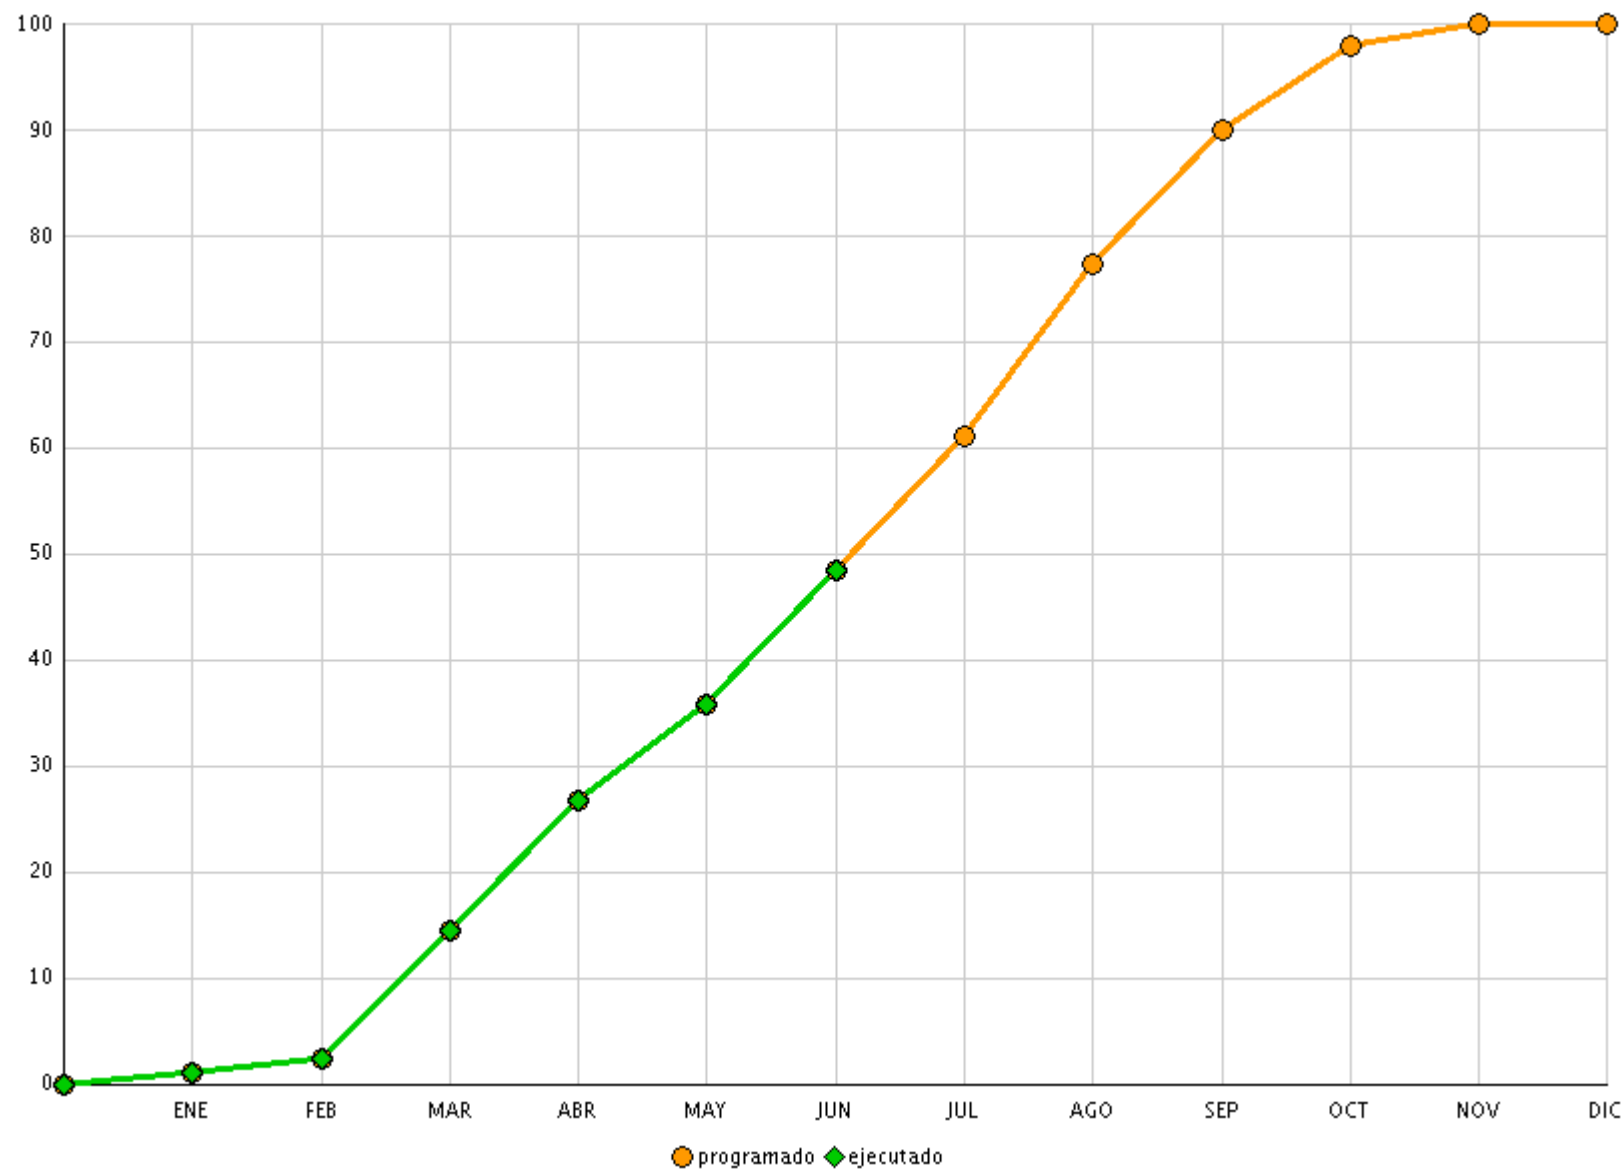


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.20	2.40	14.60	26.80	35.80	48.40	61.20	77.40	90.00	98.00	100.00	100.00
Ejecutado	1.20	2.40	14.60	26.80	35.80	48.40						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7746 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.

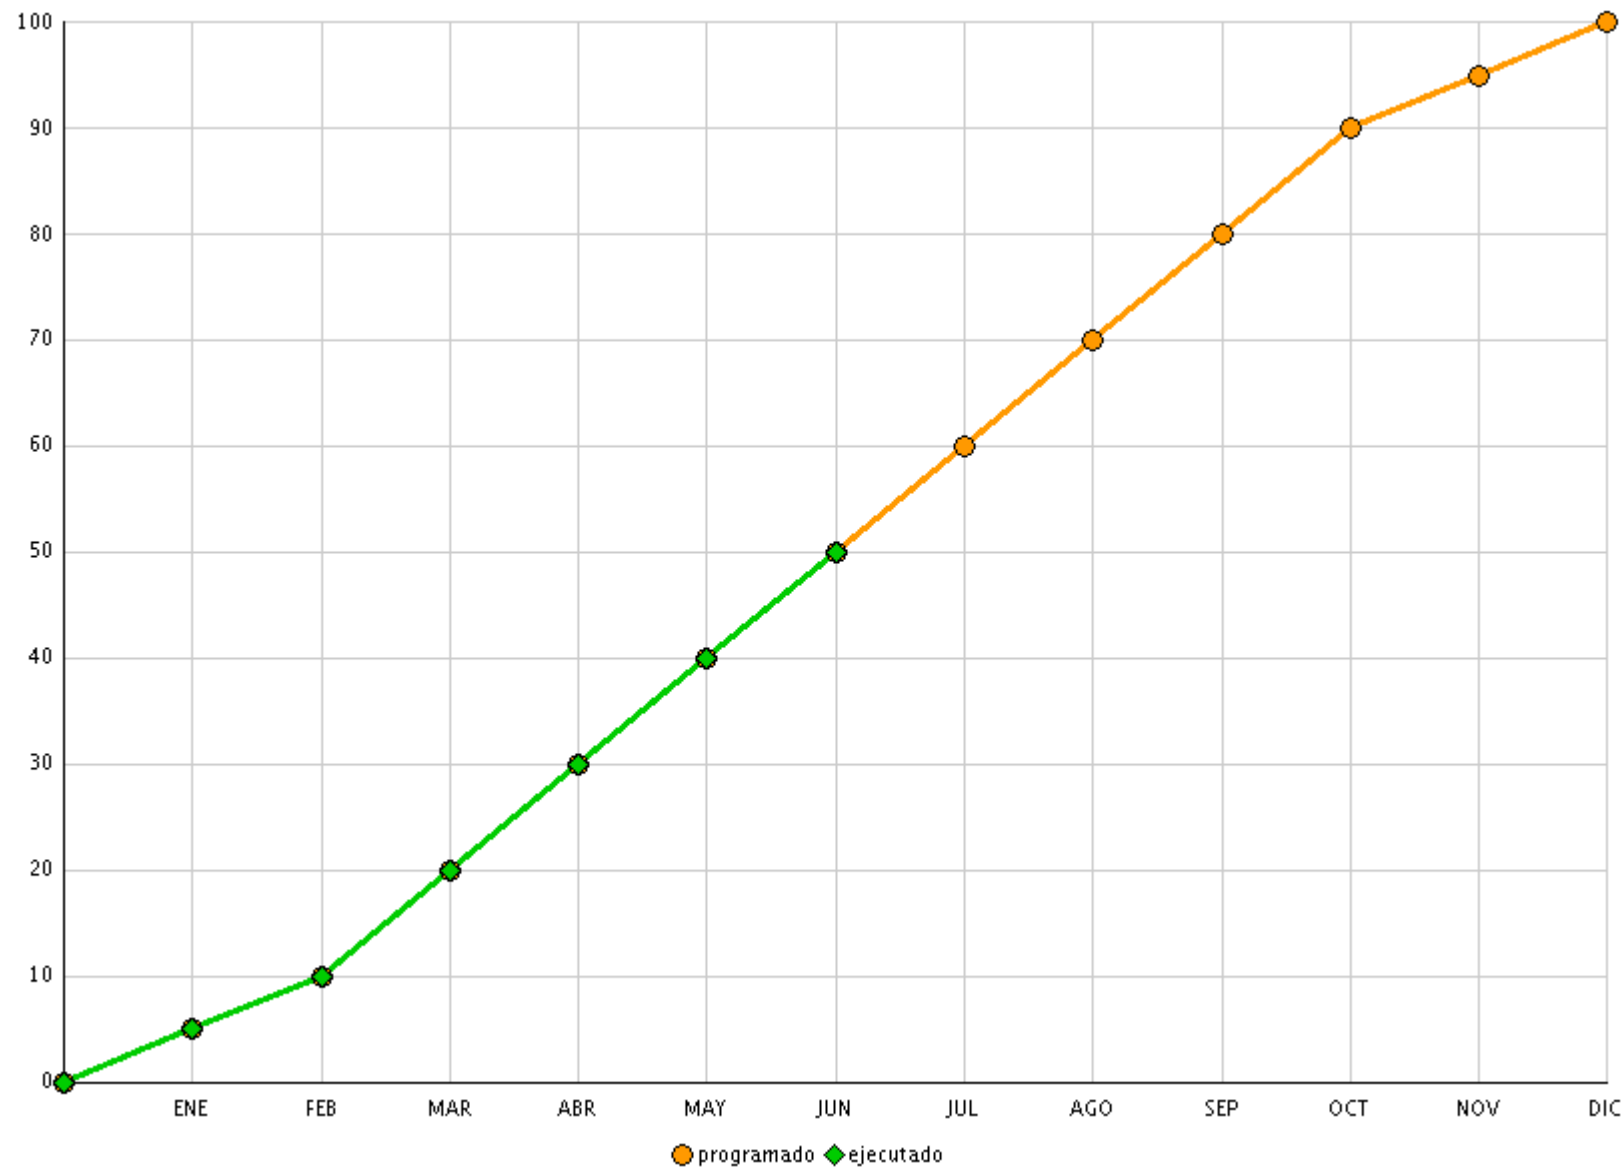


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7758 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C

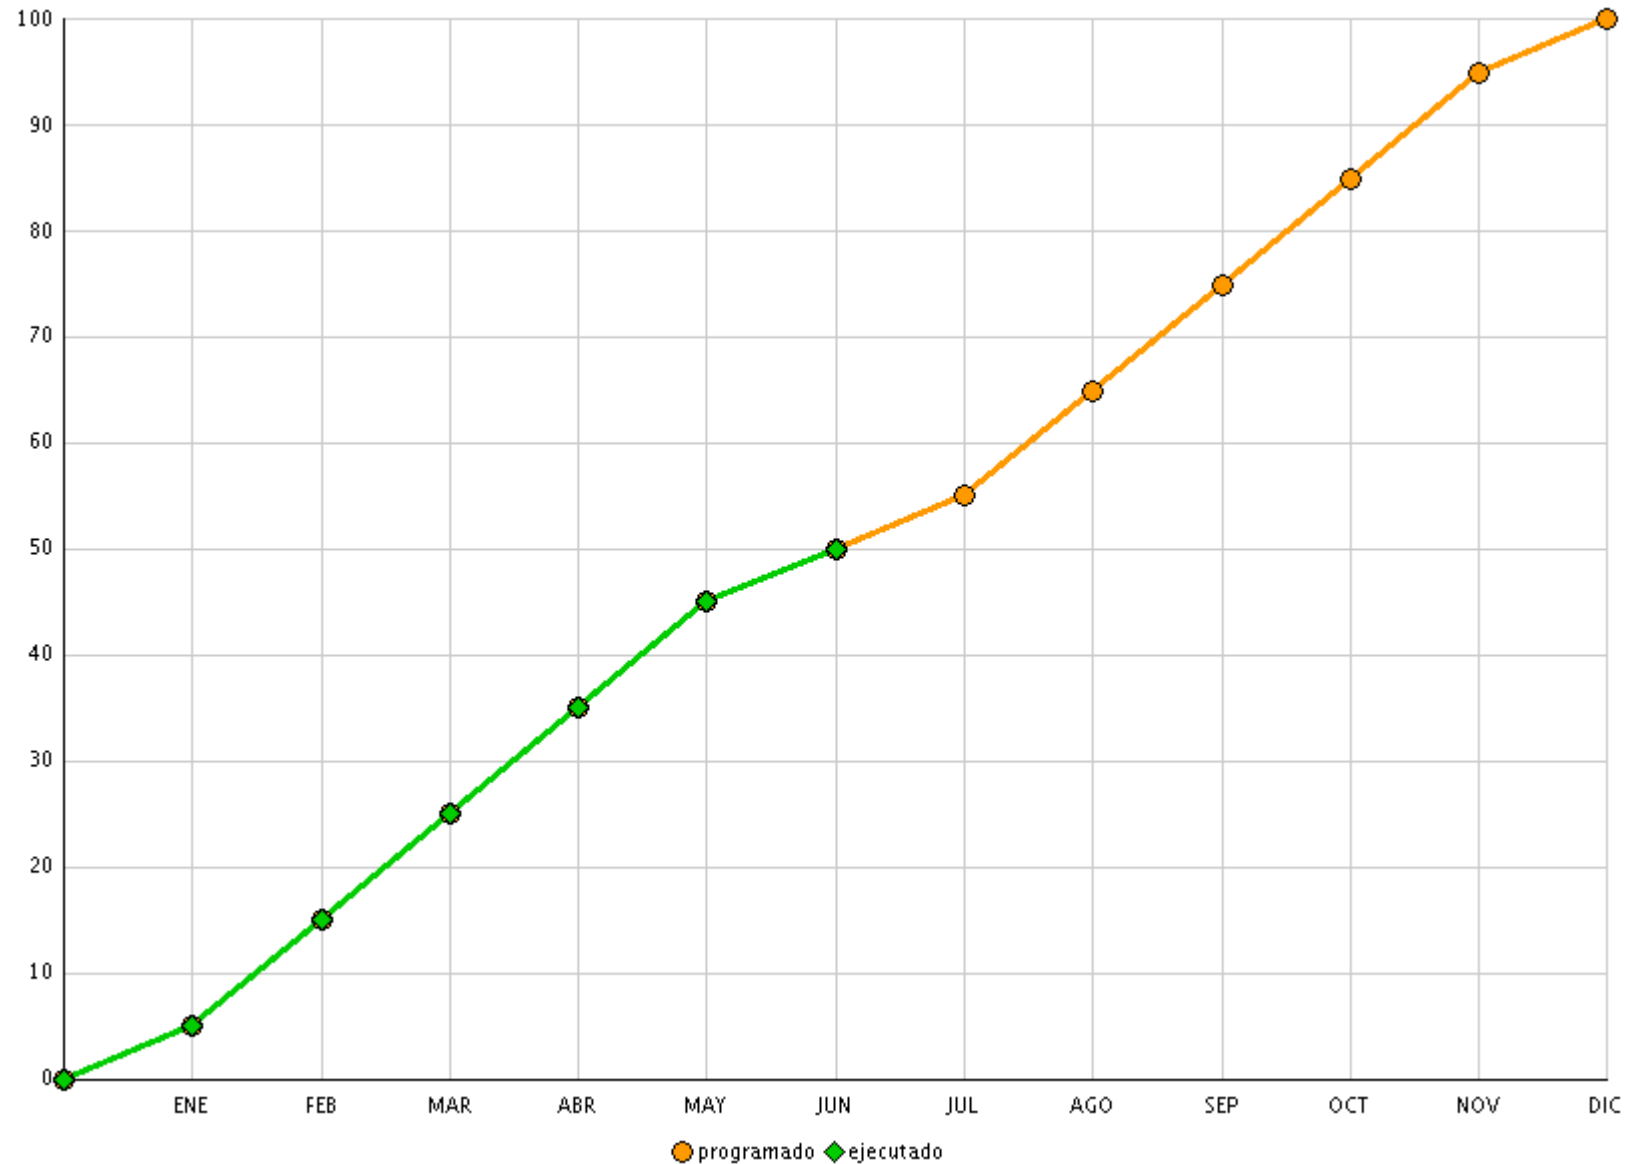


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	15.00	25.00	35.00	45.00	50.00	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00
Ejecutado	5.00	15.00	25.00	35.00	45.00	50.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7774 Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.

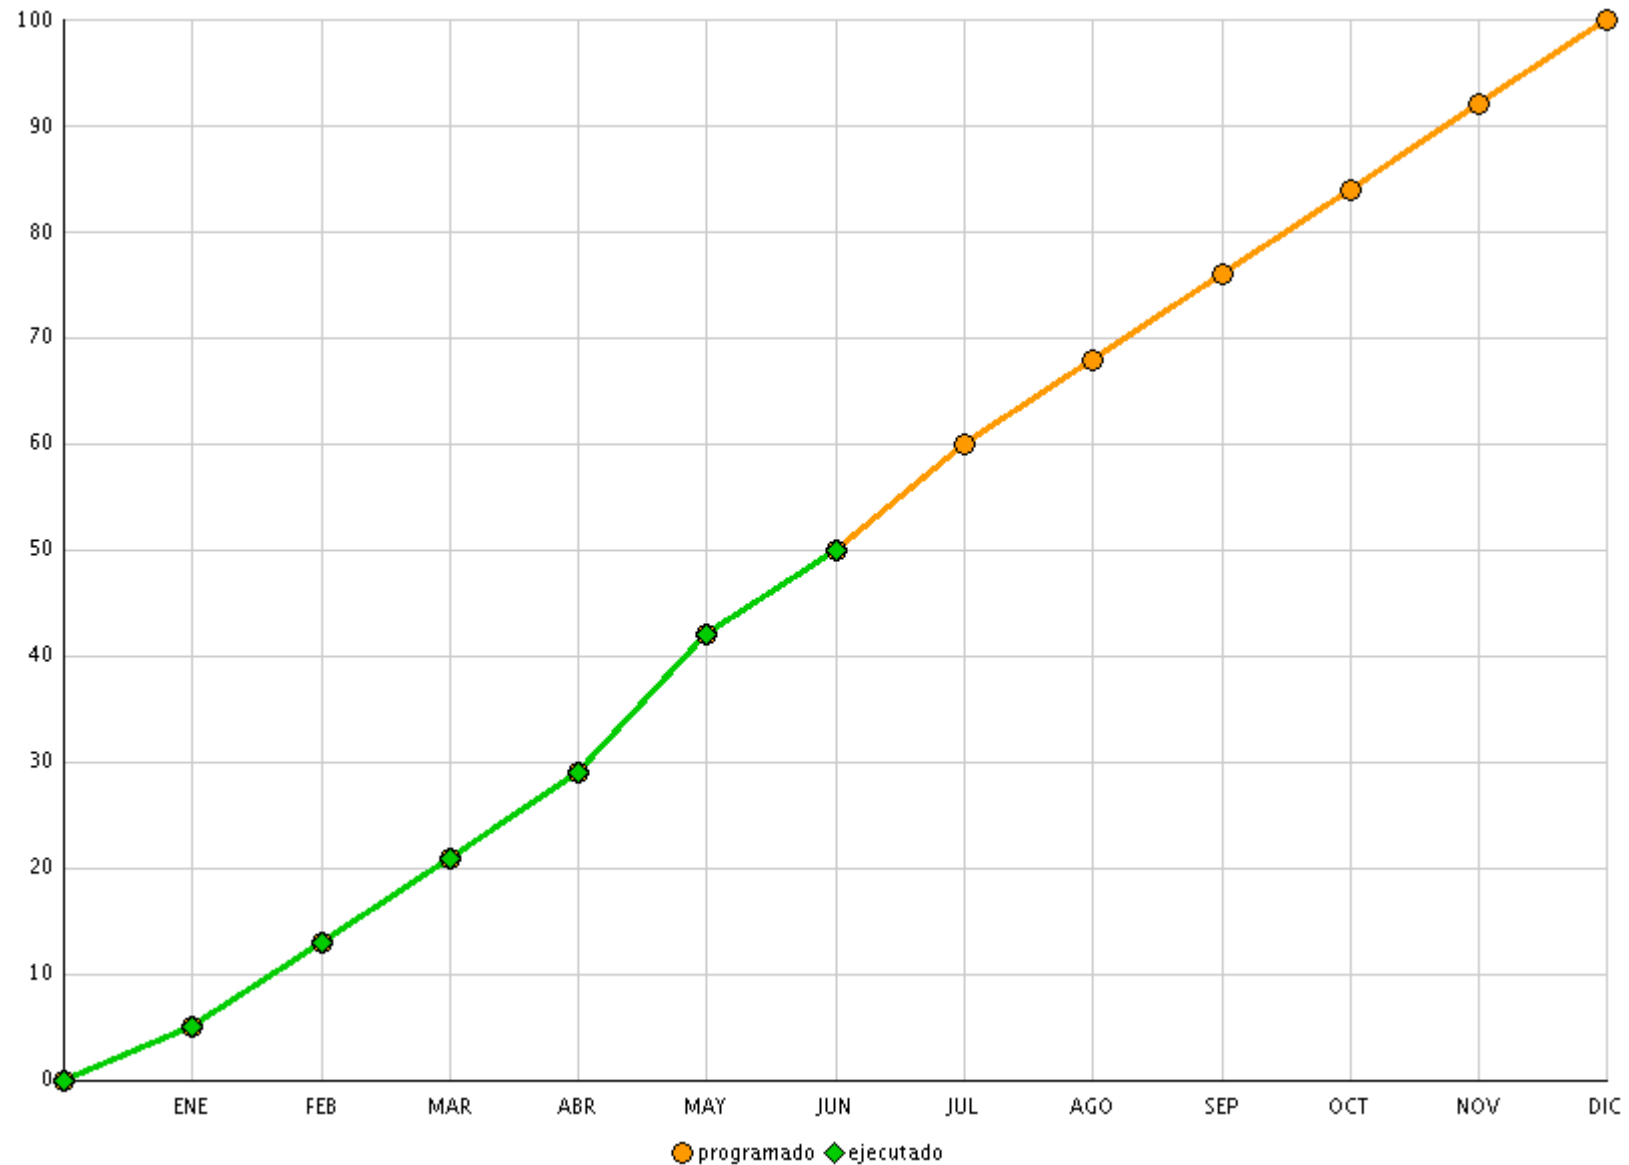


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	13.00	21.00	29.00	42.00	50.00	60.00	68.00	76.00	84.00	92.00	100.00
Ejecutado	5.00	13.00	21.00	29.00	42.00	50.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7784 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.

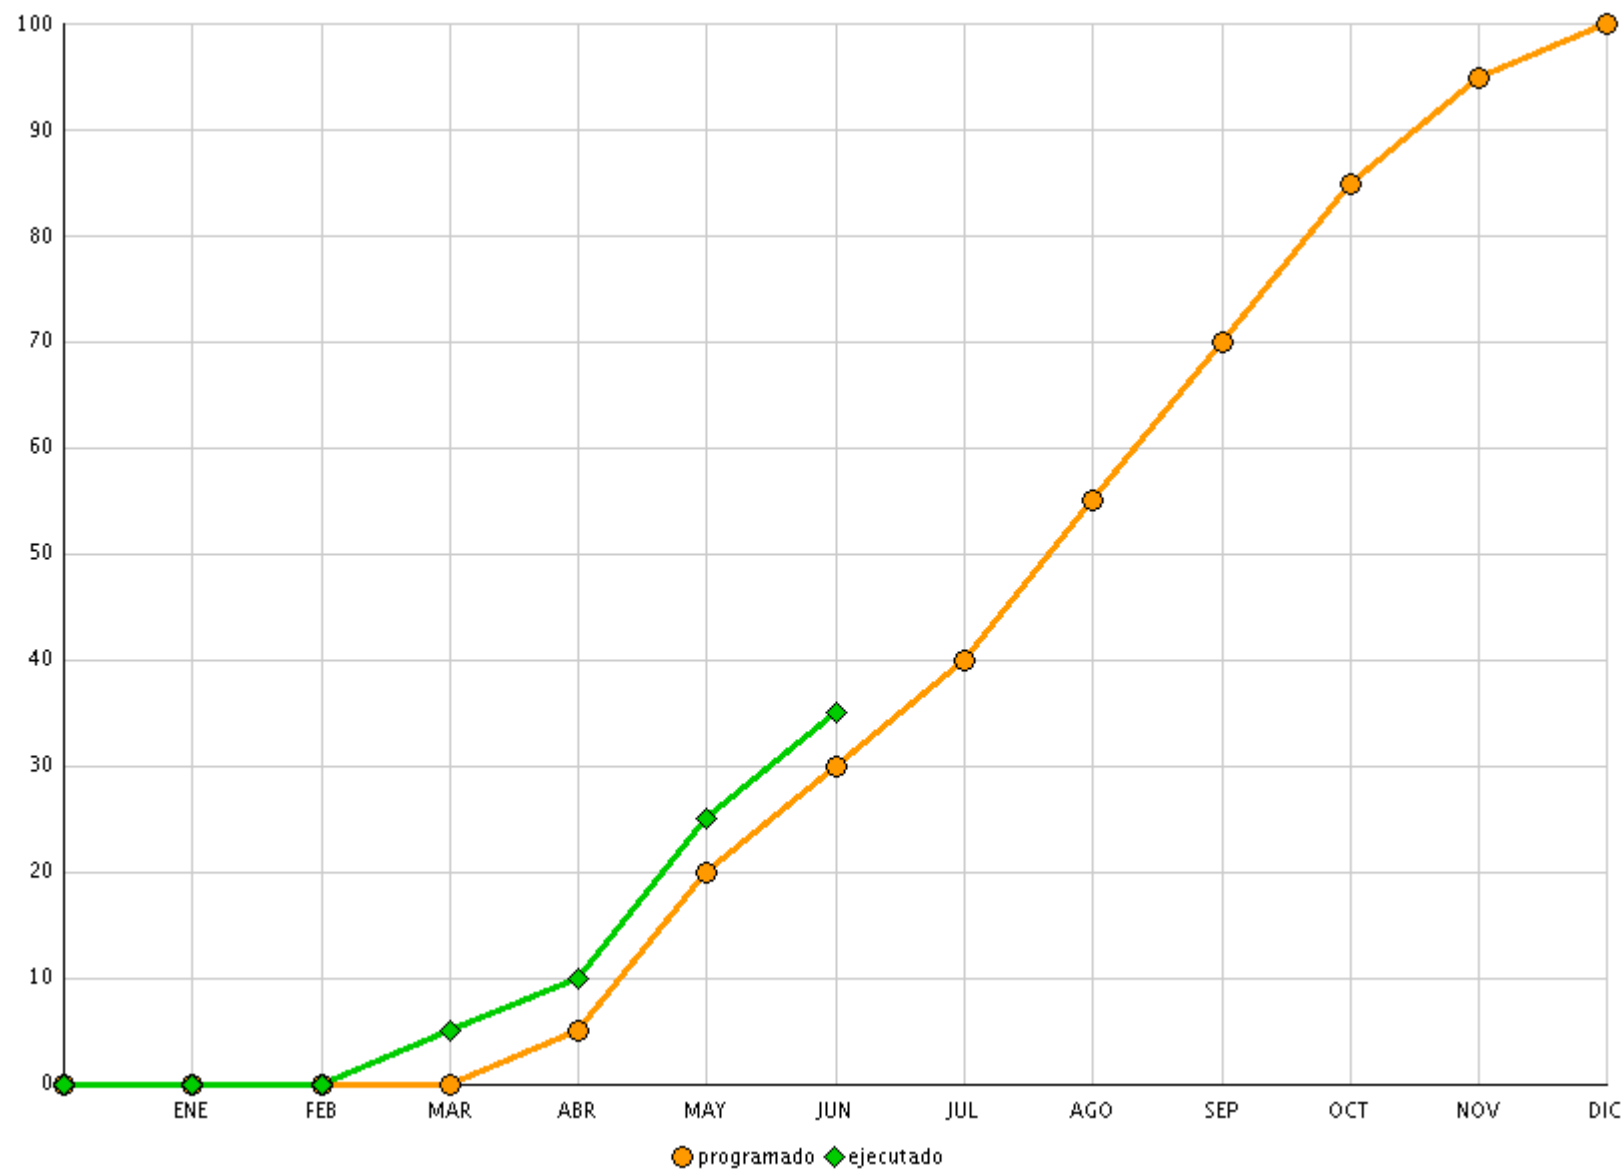


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	30.00	40.00	55.00	70.00	85.00	95.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	5.00	10.00	25.00	35.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7807 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.

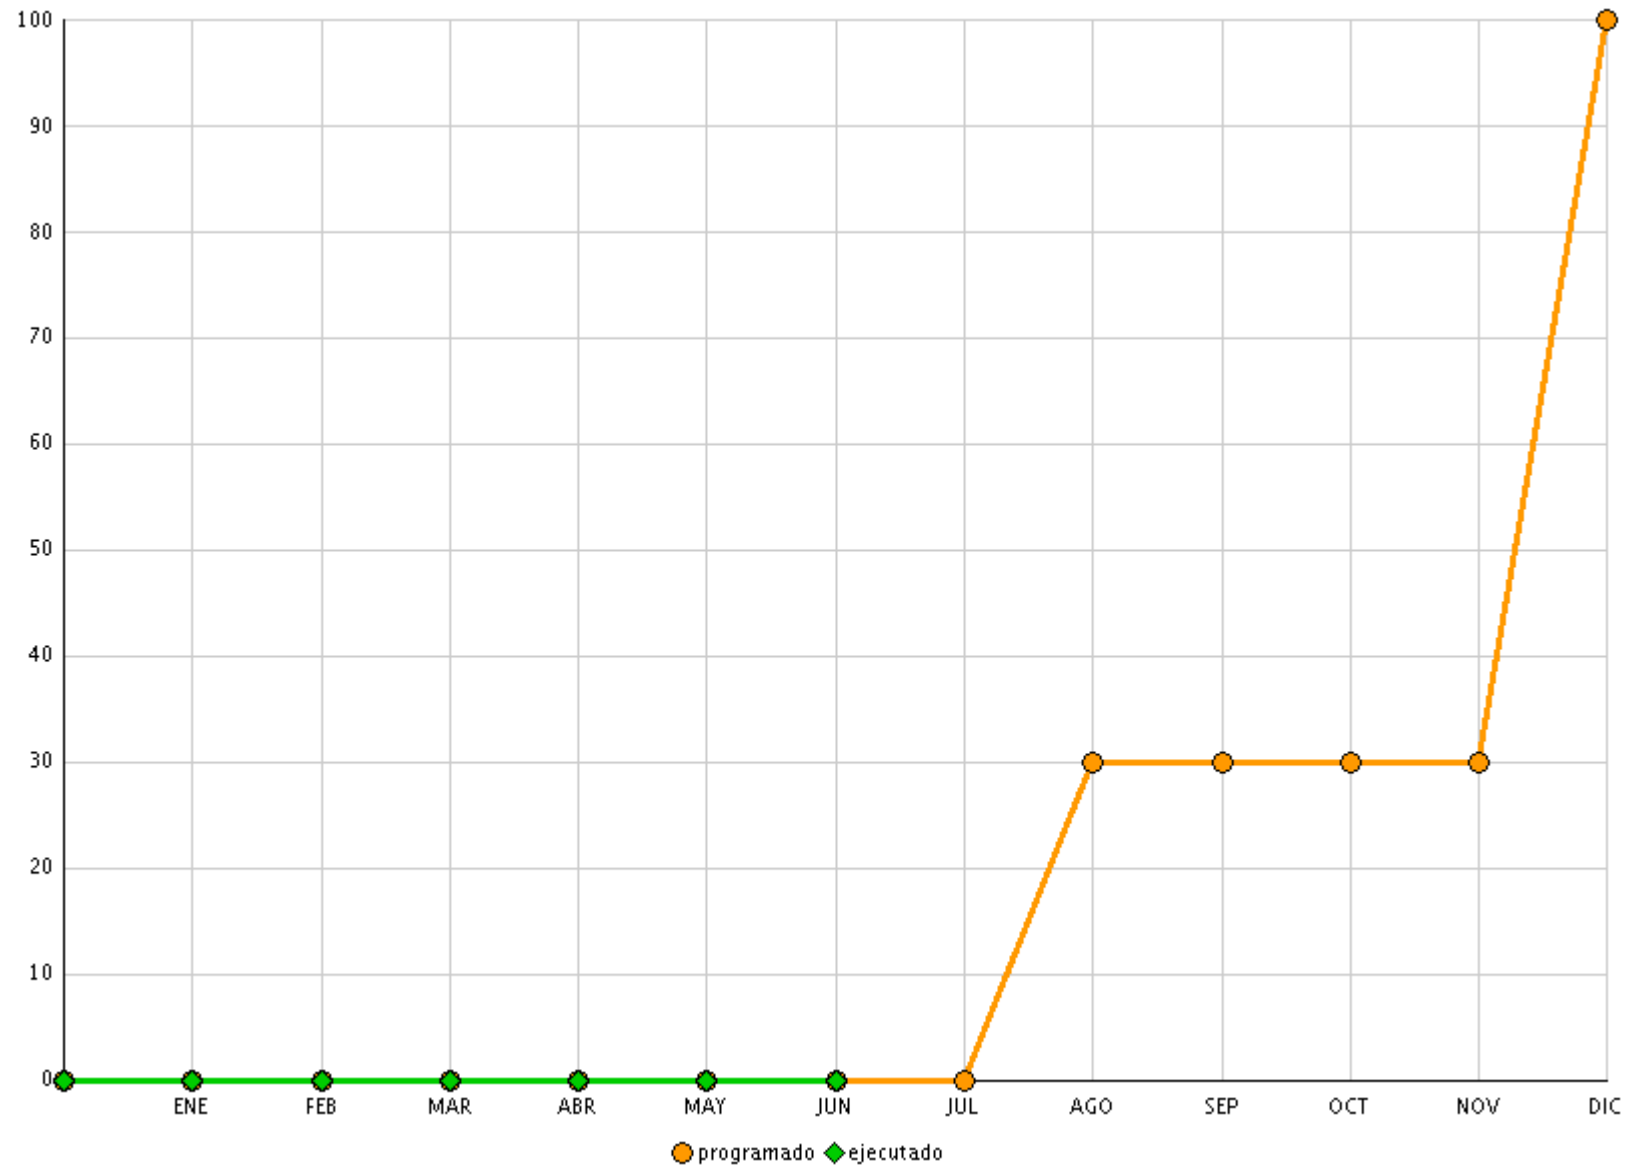


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7808 Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.

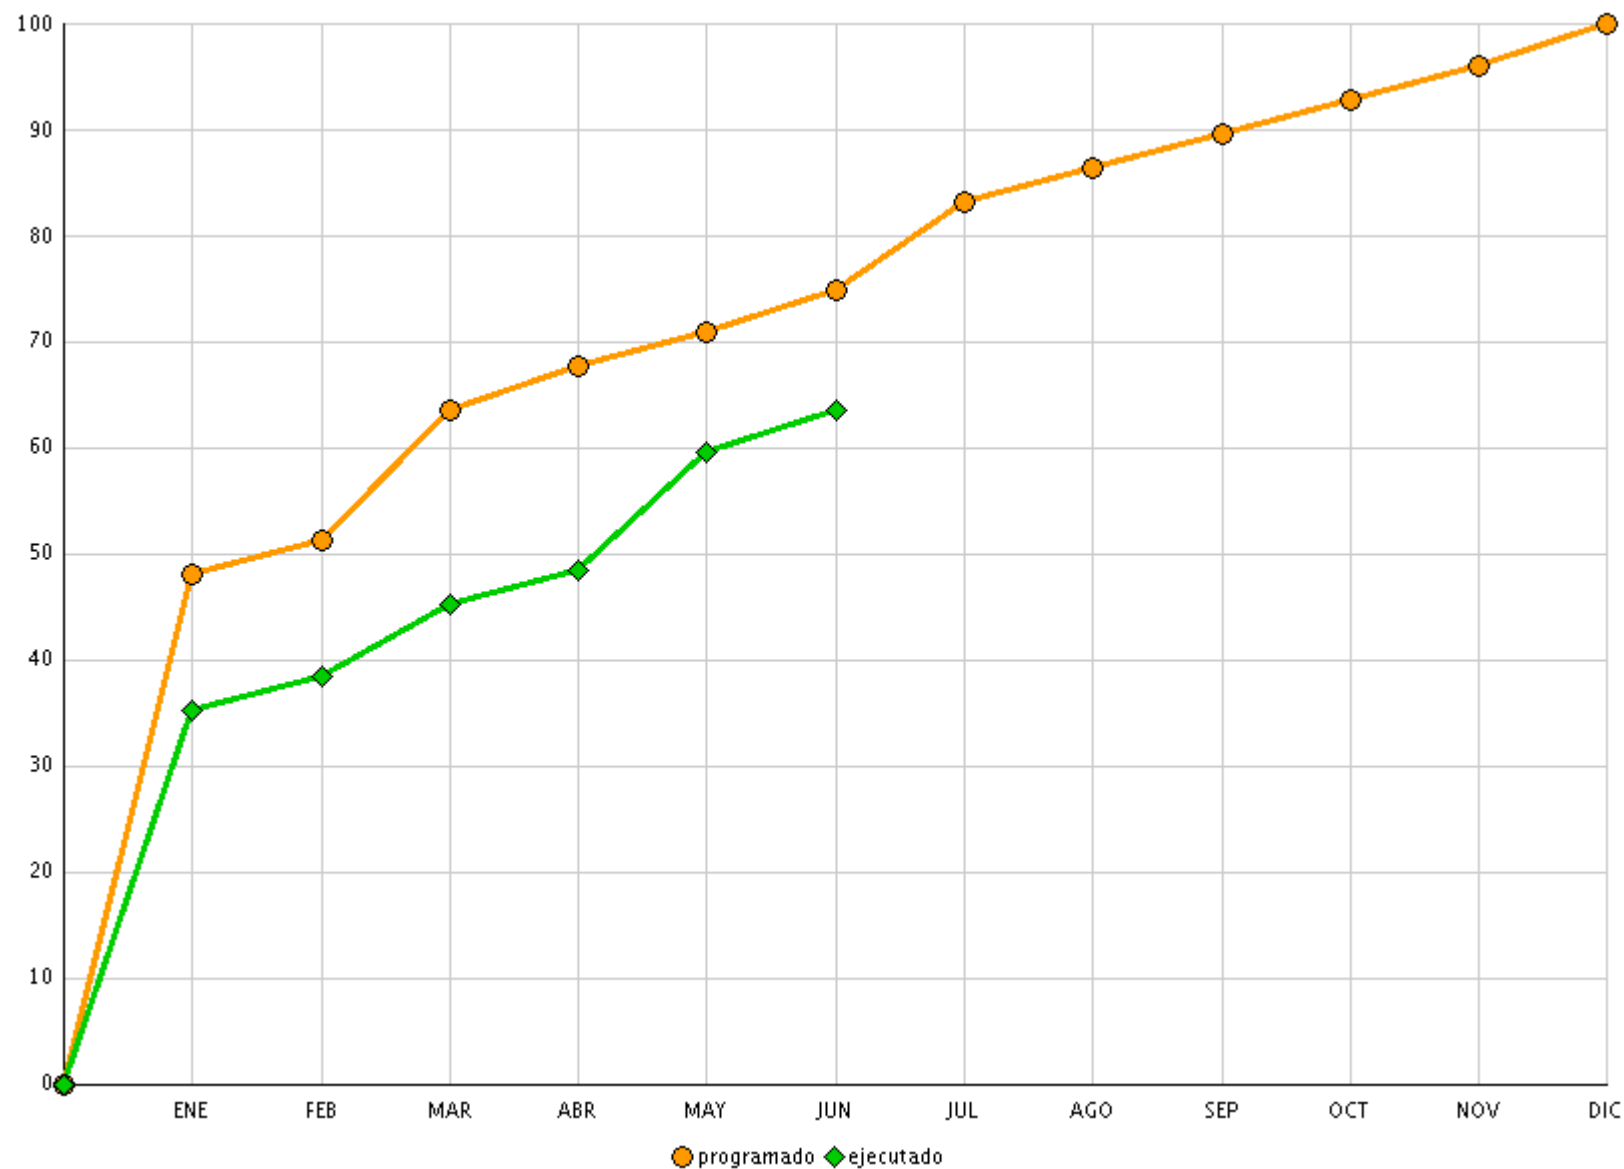


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	48.20	51.40	63.60	67.80	71.00	75.00	83.20	86.40	89.60	92.80	96.00	100.00
Ejecutado	35.30	38.50	45.20	48.40	59.60	63.65						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7809 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C

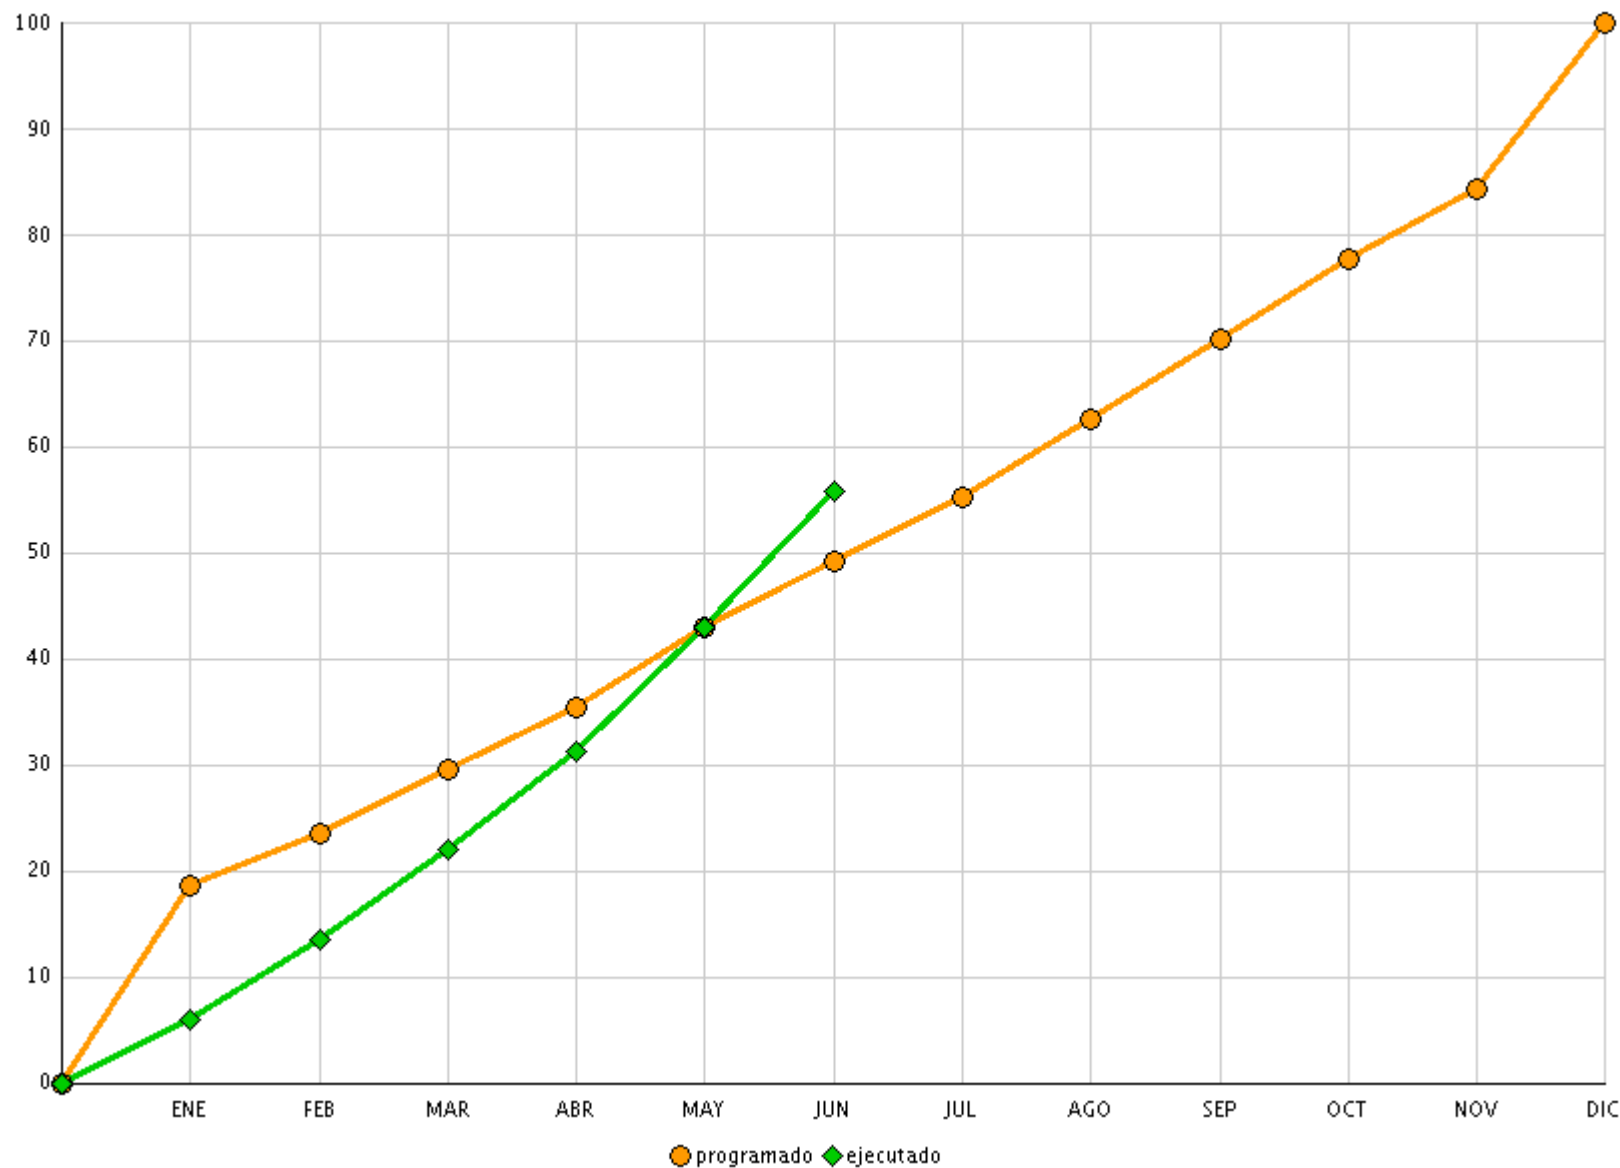


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	18.60	23.55	29.55	35.55	43.05	49.20	55.35	62.70	70.20	77.70	84.30	100.00
Ejecutado	6.10	13.55	22.05	31.30	43.10	55.80						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.

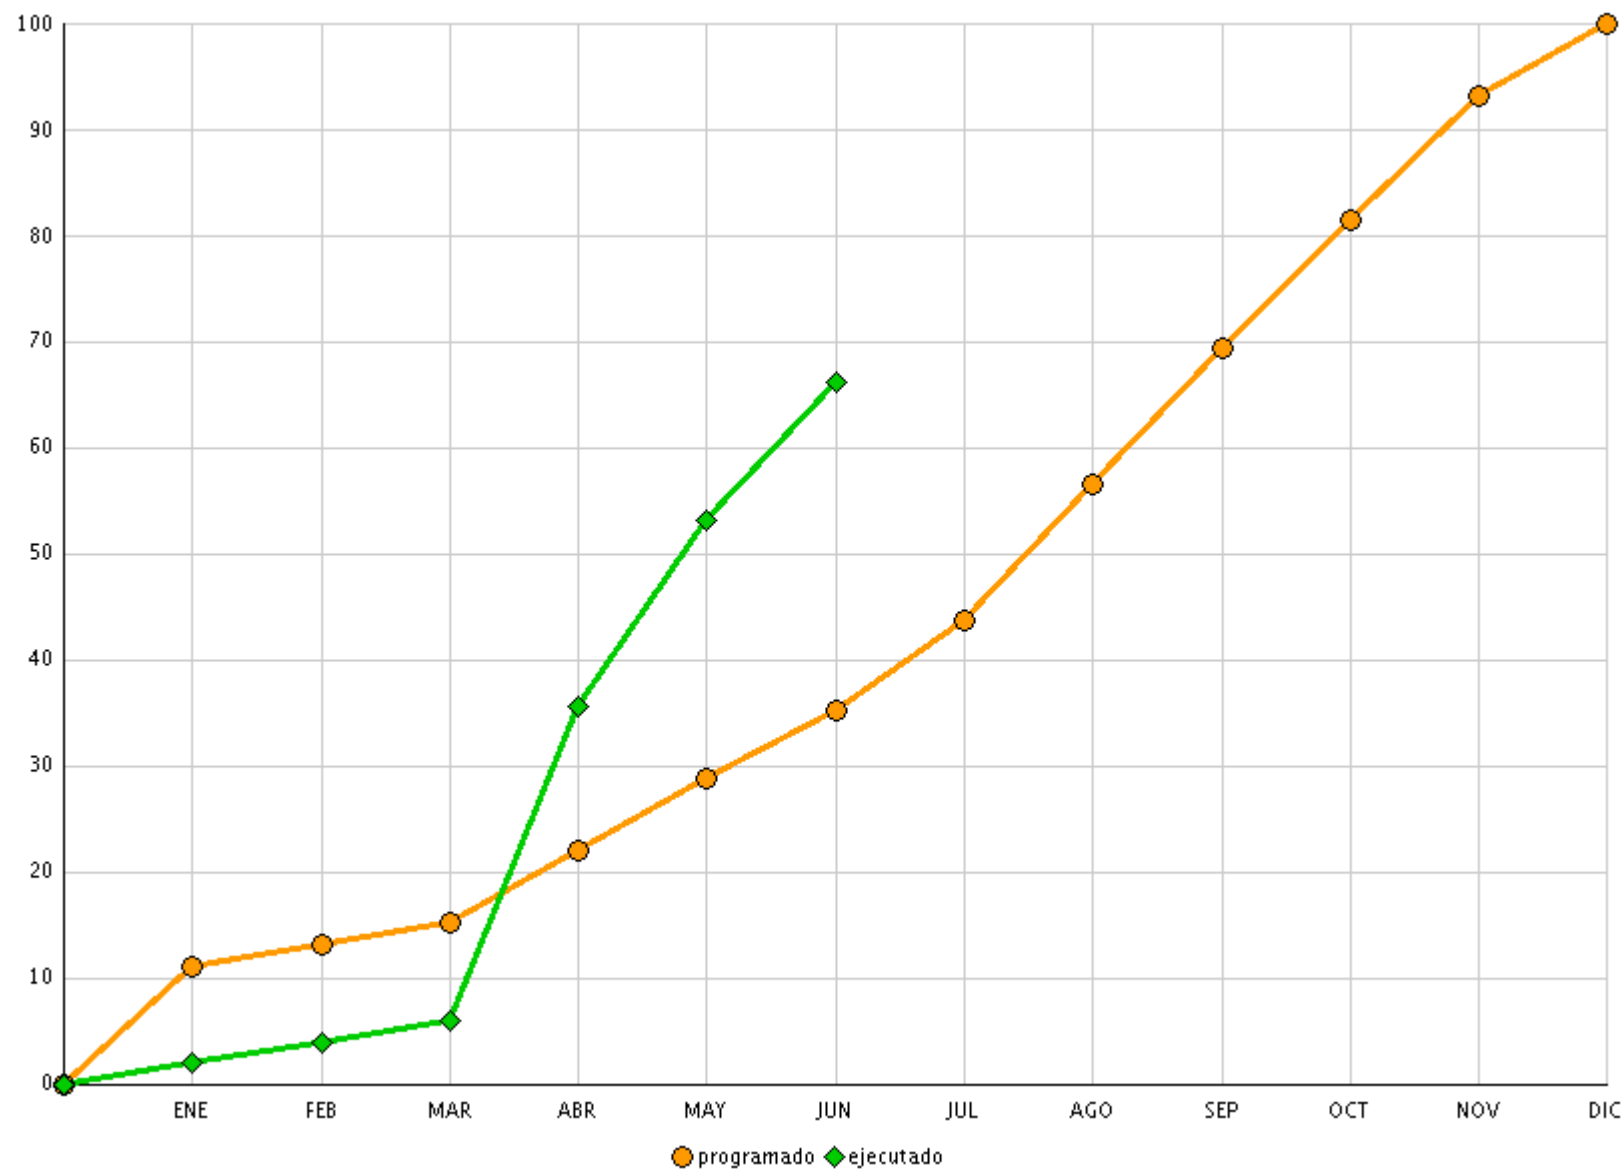


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	11.20	13.20	15.20	22.00	28.80	35.20	43.80	56.60	69.40	81.60	93.20	100.00
Ejecutado	2.00	4.00	6.00	35.60	53.20	66.20						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7818 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.

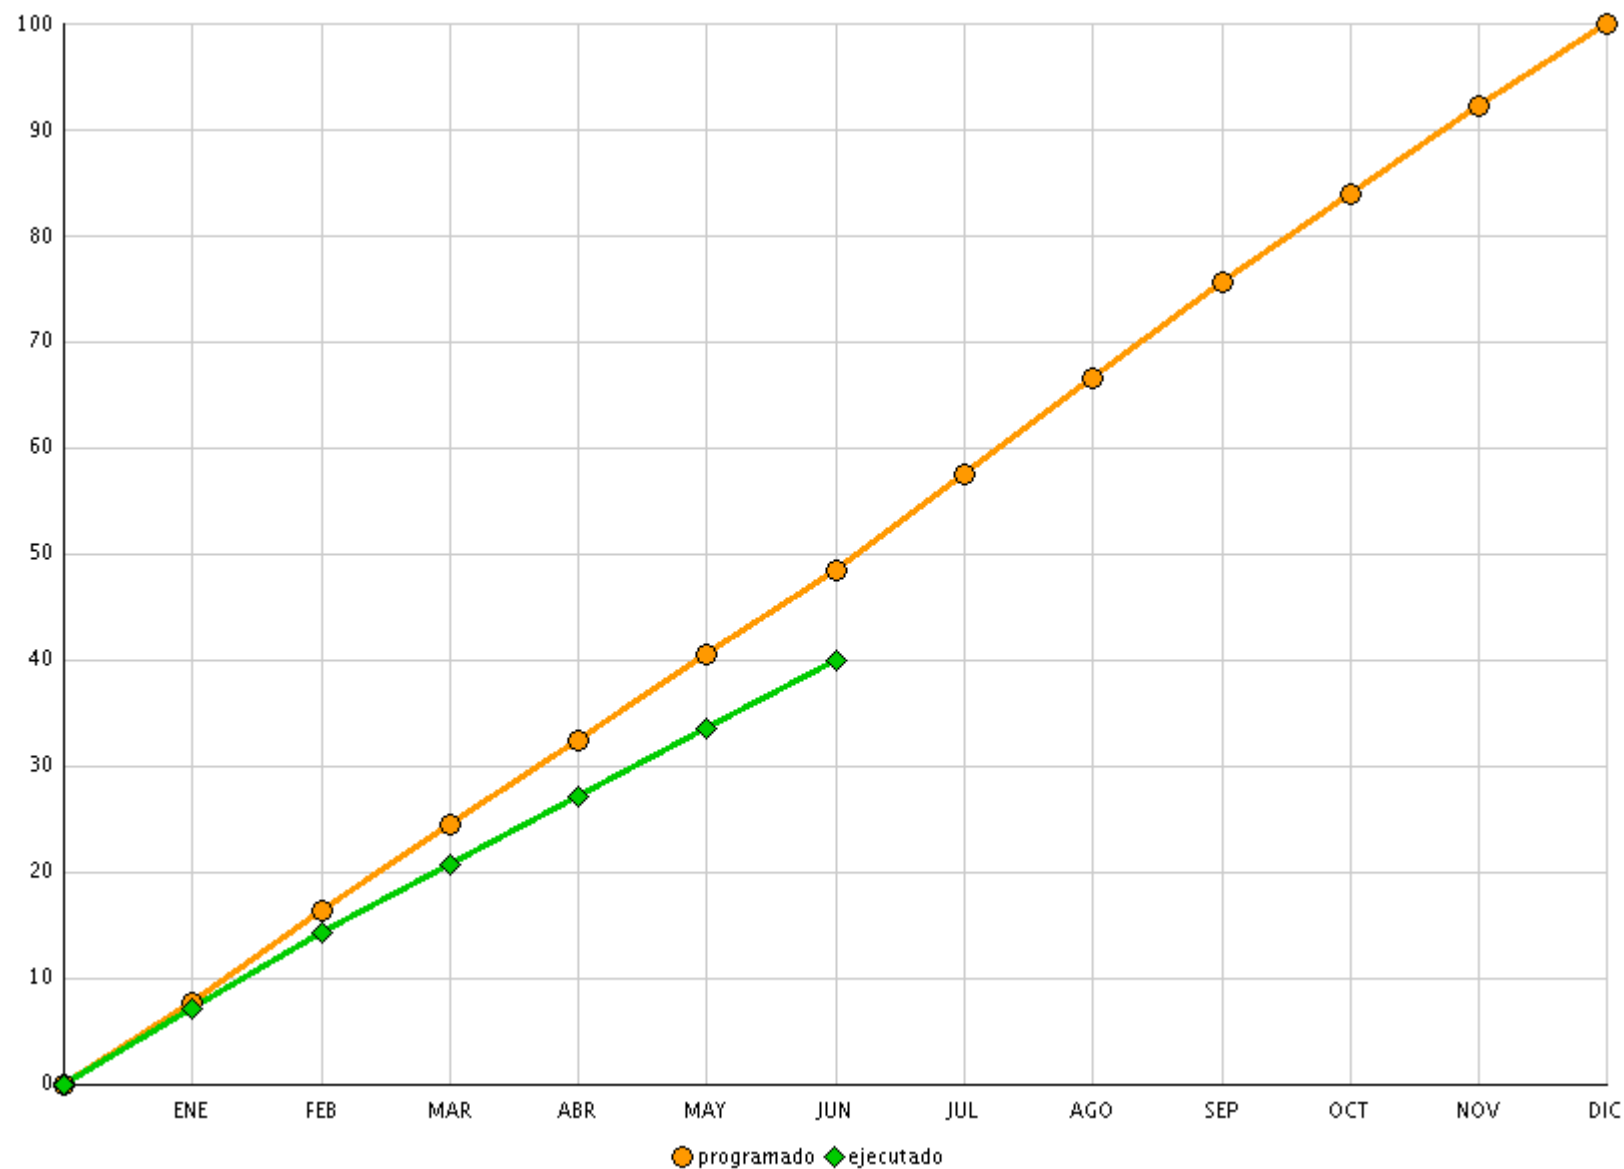


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.65	16.50	24.50	32.50	40.50	48.50	57.55	66.60	75.65	83.95	92.35	100.00
Ejecutado	7.20	14.32	20.72	27.12	33.52	39.92						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7888 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

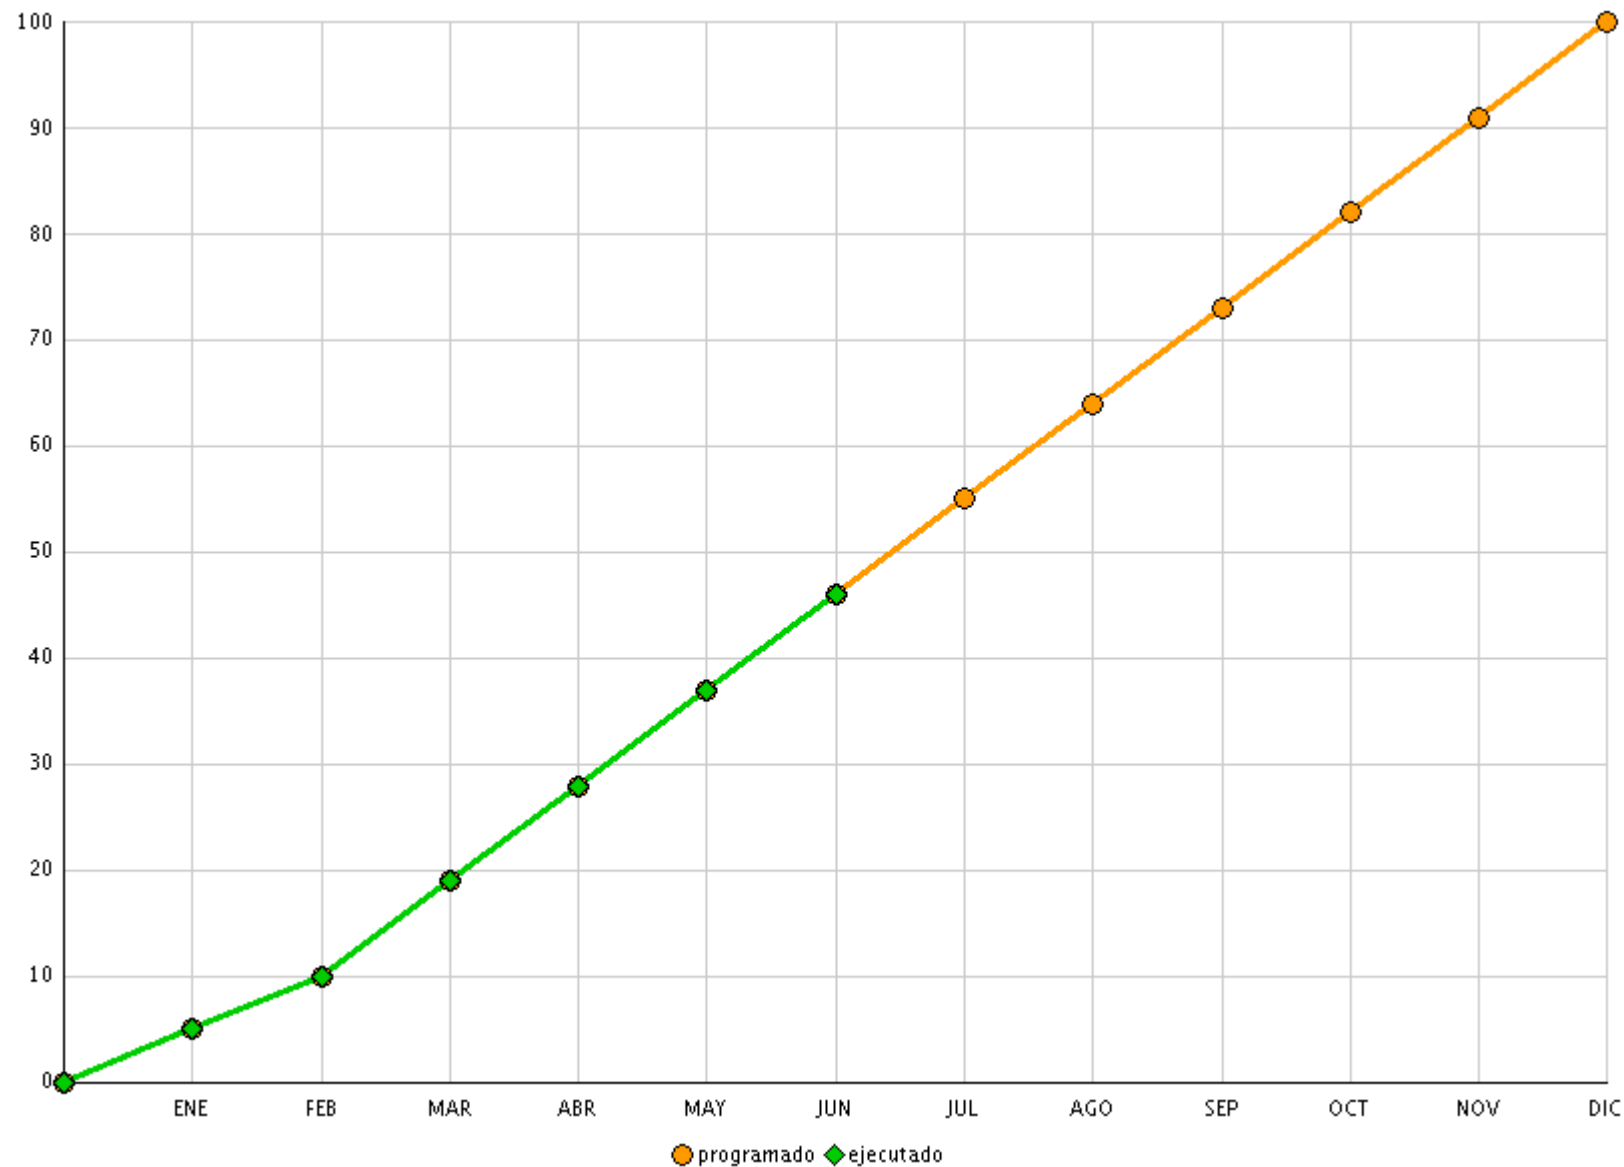

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	19.00	28.00	37.00	46.00	55.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	19.00	28.00	37.00	46.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7599 21 Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACOMPANAR A COLEGIOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRAE Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS.	20.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	10.00
2.	DESARROLLAR UN PORCENTAJE DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES PRAE Y DE SSA DE LAS IED.	20.00	0.00	0.00	9.00	7.00	9.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	44.00	8.80
3.	IMPLEMENTAR EN COLEGIOS LA ESTRATEGIA DE SERVICIO SOCIAL AMBIENTAL EN LAS IED	20.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	10.00
4.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y/O PROTECCIÓN ANIMAL DIRIGIDAS A LAS IED	20.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	9.00
5.	DESARROLLAR LOS EVENTOS DE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y/O PROTECCIÓN ANIMAL.	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7624 32 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA DESERCTIONS ESCOLAR EN IED	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	60.00	9.00
2.	PROCESO DE MATRICULA	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	45.00	9.00
3.	ACTIVIDADES AFIRMATIVAS PARA POBLACIONES VULNERABLES	20.00	13.00	13.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	19.00		9.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	52.00	10.40
4.	ADMINISTRACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	20.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		15.00		5.00		5.00		100.00	45.00	9.00
5.	POLITICA EDUCATIVA RURAL	25.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		30.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	45.00	11.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										48.65

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7638 30 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONSTRUCCION Y TERMINACION	45.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		10.00		0.00		30.00		0.00		10.00		100.00	40.00	18.00
2.	MEJORAMIENTOS	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3.	DOTACIONES	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		5.00		10.00		15.00		13.00		7.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										28.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7643 22 Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las victimas del conflicto armado

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	INTEGRACION DE EDUCACION SOCIOEMOCIONAL	20.00	4.00	4.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	10.00	6.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	44.00	8.80
2.	MOVILIZACIÓN SOCIAL DE COMUNIDADES EDUCATIVAS	30.00	4.00	4.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	10.00	6.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	44.00	13.20
3.	DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA ESCOLAR	20.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	15.00	6.00	6.00	6.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	65.00	13.00
4.	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	10.00	4.00	4.00	10.00	5.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	6.00	10.00	6.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	59.00	5.90
5.	PARTICIPACIÓN PARA LA TRANSFORMACION.	20.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	10.00	6.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	59.00	11.80

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 52.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7686 34 Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASESORAR COLEGIOS PARA LA RESIGNIFICACIÓN DEL PEI Y CURRICULOS.	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	5.40
2.	ACOMPañAR A COLEGIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, DIDÁCTICAS Y LA	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	4.20
3.	FORTALECER EN COLEGIOS EN LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA RESPONDER A LOS CAMBIOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS DEL SIGLO XXI	12.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	40.00	4.80
4.	IMPLEMENTAR EN COLEGIOS UN MODELO SOSTENIBLE DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	12.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	5.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	4.20
5.	ACOMPañAR A COLEGIOS CON ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO EN UNA SEGUNDA LENGUA, EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE BILINGÜISMO Y CON ÉNFASIS EN EL	12.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	5.40
6.	DESARROLLAR CON DOCENTES UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		20.00		5.00		5.00		100.00	45.00	4.50
7.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INICIAL, PERMANENTE Y POSGRADUAL PARA MAESTRAS,	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		20.00		5.00		5.00		100.00	20.00	2.00
8.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, FORTALECIMIENTO DE REDES, SEMILLEROS, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y, RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LA LABOR DOCENTE.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		20.00		5.00		5.00		100.00	20.00	2.00
9.	ACOMPañAR COLEGIOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	10.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		9.00		7.00		4.00		100.00	20.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										34.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7689 20 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LAS IED EN TORNO AL FORTALECIMIENTO DE LAS DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍAS	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	5.00	2.00	5.00	2.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		14.00		10.00		7.00		100.00	22.00	2.64
2.	REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y AJUSTE CURRICULAR EN LAS IED	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	5.00	2.00	5.00	2.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		14.00		10.00		7.00		100.00	22.00	2.64
3.	IMPLEMENTAR EN LAS IED LA ESTRATEGIA DE INMERSIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON ESTUDIANTES DE MEDIA	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	5.00	2.00	5.00	2.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		14.00		10.00		7.00		100.00	22.00	2.64
4.	IMPLEMENTAR EN LAS IED ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERTINENCIA CURRICULAR	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	5.00	2.00	5.00	2.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		14.00		10.00		7.00		100.00	22.00	2.64
5.	IMPLEMENTAR, CONSOLIDAR Y/O INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL EN LAS IED FOCALIZADAS	13.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		14.00		10.00		7.00		100.00	27.00	3.51
6.	IMPLEMENTAR Y ARTICULAR ACCIONES PROPIAS DE LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL CON LAS DIRECCIONES LOCALES DE EDUCACIÓN, EL SECTOR PRODUCTIVO Y ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LAS LOCALIDADES.	13.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	5.46
7.	PROMOVER PROCESOS DE DIVERSIFICACIÓN Y/O APERTURA EN LAS IED DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA (SENA U OTROS) ACORDES A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, LA EDUCACIÓN POSMEDIA Y EL SECTOR PRODUCTIVO	13.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	47.00	6.11
8.	IMPLEMENTAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS.	13.00	2.00	2.00	8.00	4.00	9.00	13.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	5.98
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										31.62

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7690 28 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, ASIST. TECNICA Y ADMTVA Y SEGUIMIENTO EN FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE ATENCION A POBLACIONES Y GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL EN EL SIST.EDUCATIVO DISTRITAL	15.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	21.00	3.15
2.	DESARROLLAR PROCESOS DE CUALIFICACION Y FORTALECIMIENTO	25.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	21.00	5.25
3.	DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPA. PEDAGOGICO, APOYO, ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y EVAL. PARA FORTALOECIMIENTO DE ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL A TRAVÉS DE ESTRAT. Y METODOLOGIAS EDUCATIVAS FLEXI	20.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	21.00	4.20
4.	REALKIZAR ACOMPA., ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO PARA PROMOVER Y FORTAELCER LA EDUCACION INTERCULTURAL CON GRUPOS ETNICOS, LA CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS Y LOS PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION	15.00	5.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	0.00	0.00
5.	DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPA, APOYO Y ASISTENCIA TECNICA AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION CON ESTUDIANTES VICTIMAS DEL CONFLICTO Y MIGRANTES, Y LA MOVILIZACION DE EJERICIOS DE MEMORIA HISTORICA.	15.00	5.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	0.00	0.00
6.	ACOMPA;AR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA PROMOVER UNA EDUCACION CON EQUIDAD DE GENERO Y EL RESPETO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y FORTALECER LOS PROCESOS DE ATENCION A ESTUDIANT	10.00	5.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 12.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7736 35 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ENTREGAR DESAYUNOS, ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y PAQUETES ALIMENTARIOS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES DE BOGOTÁ D.C.	50.00	3.00	3.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		7.00		9.00		0.00		100.00	54.00	27.00
2.	FOMENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE, MOVILIDAD SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SEGURO ESCOLAR, COBERTURA DE ARL, Y PAGOS DE FALLOS	15.00	1.00	1.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		4.00		100.00	41.00	6.15
3.	PRESTAR APOYO A LA MOVILIDAD ESCOLAR A ESTUDIANTES DE COLEGIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES DE BOGOTÁ, EN CADA UNA DE SUS MODALIDADES: RUTA ESCOLAR, SUBSIDIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES.	35.00	3.00	3.00	10.00	10.00	5.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		0.00		100.00	32.00	11.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							44.35			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7737 15 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GENERAR, DESARROLLAR Y DOCUMENTAR INICIATIVAS CIUDADANAS LIDERADAS POR NIÑAS Y NIÑOS QUE RESIGNIFIQUEN SU VOZ EN LA TRASNFORMACIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD.	60.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	17.00	17.00	17.00	5.00	5.00	11.00	11.00	18.00		17.00		11.00		0.00		0.00		0.00		100.00	54.00	32.40
2.	CONSTRUIR DE MANERA COLABORATIVA CON LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS PARA FORTALECER SU INCIDENCIA EN LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN FORMALES Y NO FORMALES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	40.00	8.00
3.	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN A DIFERENTES ACTORES DE LA ESCUELA QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS COMO SUJETOS POLITICOS CAPACES DE APORTAR A LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		20.00		10.00		0.00		100.00	40.00	8.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		48.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7746 15 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYAR LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INICIATIVAS COMUNITARIAS RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ENTORNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	20.00
2.	CONSOLIDAR UNA RED DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE APORTEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	12.50
3.	APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESOS DE APERTURA A LA COMUNIDAD EN DIFERENTES MODALIDADES	35.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	17.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							50.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7758 22 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A COLEGIOS DE JORNADA ÚNICA Y COMPLETA	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	5.00
2.	FORMACIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES EN JORNADA ÚNICA DE COLEGIOS URBANOS Y RURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL SIGLO XXI Y DEL DESARROLLO HUMANO	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	15.00
3.	FORMACIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES EN JORNADA COMPLETA DE COLEGIOS URBANOS Y RURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL SIGLO XXI Y DEL DESARROLLO HUMANO.	40.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	20.00
4.	ASISTENCIA TÉCNICA A COLEGIOS DE JORNADA UNICA Y JORNADA COMPLETA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR.	20.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7774 21 Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 08 Prevención y atención de maternidad temprana

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD	50.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	13.00	8.00	8.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	25.00
2.	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA	25.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	13.00	8.00	8.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	12.50
3.	RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS	25.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	13.00	8.00	8.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7784 18 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		100.00	35.00	14.00
2.	PARTICIPACIÓN FAMILIAS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		100.00	35.00	10.50
3.	DESARROLLO INTEGRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		100.00	35.00	10.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										35.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7807 16 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. OPORTUNIDADES DE ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR O EDUCACIÓN POST MEDIA	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		0.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7808 31 Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. NÓMINA	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	50.00	20.00
2. APOYO A LA GESTIÓN DE LA SED	15.00	100.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	94.00	14.10
3. BIENESTAR INTEGRAL	30.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	24.00
4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	35.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	5.50
5. PROVISIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y/O ADMIINISTRATIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	1.00	0.05
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		63.65		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7809 41 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DIÁLOGO DE SABERES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA EDUCATIVA	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	7.20
3. MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE COOPERACIÓN ESCOLAR	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	100.00	15.00
5. INTERCAMBIO EXPERIENCIAS SECTOR PUBLICO/PRIVADO DEL DISTRITO	15.00	1.00	1.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	5.00	12.00	6.00	3.00	6.00	3.00		11.00		12.00		12.00		11.00		1.00		100.00	40.00	6.00
6. PRUEBA PILOTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	78.00	7.80
7. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	14.00	10.00	17.00	10.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	66.00	19.80
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		55.80		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7813 24 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	INNOVACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TI	40.00	25.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00	35.00	14.00	11.00	13.00	10.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	62.00	24.80
2.	CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAEST TI	60.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00	2.00	22.00	2.00	15.00	11.00		18.00		18.00		17.00		16.00		8.00		100.00	69.00	41.40
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										66.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7818 43 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA ENTIDAD Y DISPONER DEL SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL	30.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	50.00	15.00
2.	DISPONER DE LOS BIENES INMUEBLES PARA CUBRIR LA DEMANDA DE CUPOS EDUCATIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ.	10.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	0.00	0.00
3.	IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Y DISPONER DEL SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	25.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	50.00	12.50
4.	CERTIFICAR EL PROCESO DE SERVICIO A LA CIUDADANIA EN LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD.	10.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	0.00	0.00
5.	FORTALECER LOS CANALES DE ATENCIÓN DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL EJECUTAR EL PROCESO DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	7.00	0.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		0.00		100.00	50.00	3.50
6.	ARRENDAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	50.00	5.00
7.	SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	8.00	0.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		0.00		100.00	49.00	3.92
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								39.92		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7888 15 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022


AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. IMPLEMENTACION ARTICULADA DE POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	50.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	23.00			
2. APROPIACION DE POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	50.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	23.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.00	

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7563 Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá

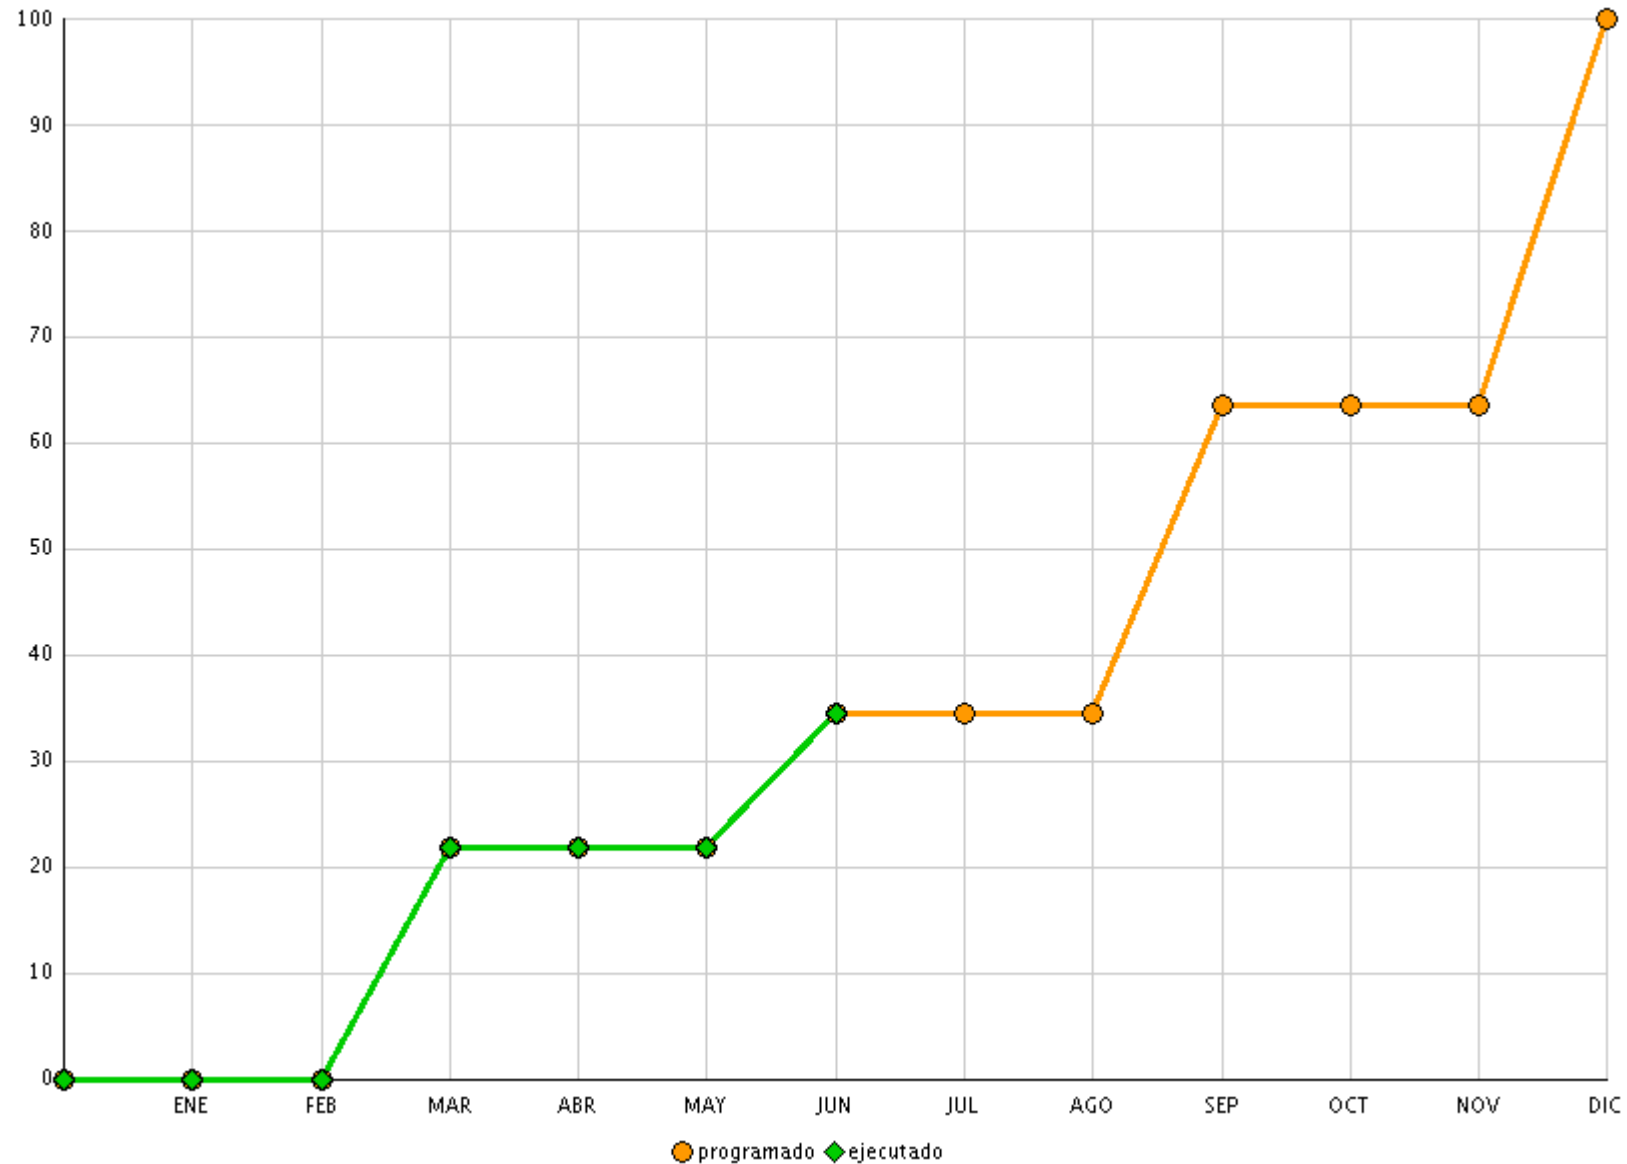


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	21.81	21.81	21.81	34.44	34.44	34.44	63.57	63.57	63.57	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	21.81	21.81	21.81	34.44						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7568 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

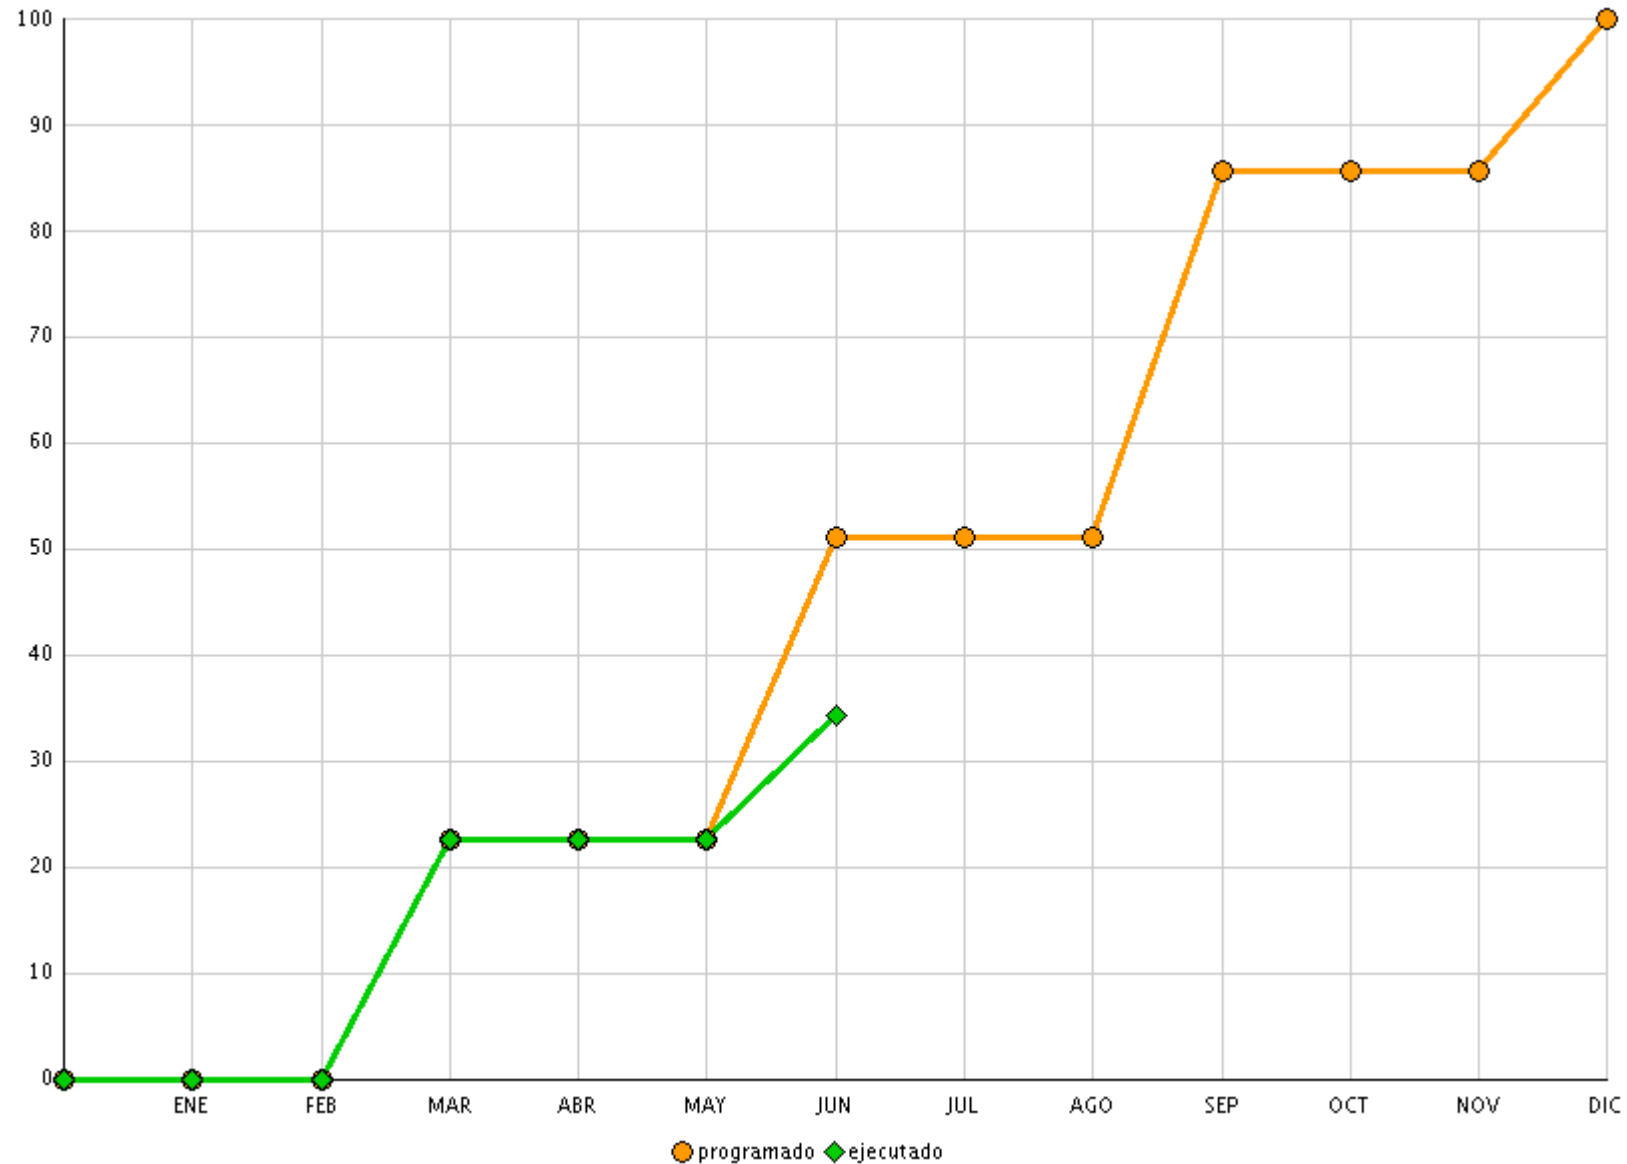


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	22.66	22.66	22.66	51.20	51.20	51.20	85.72	85.72	85.72	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	22.66	22.66	22.66	34.40						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7570 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

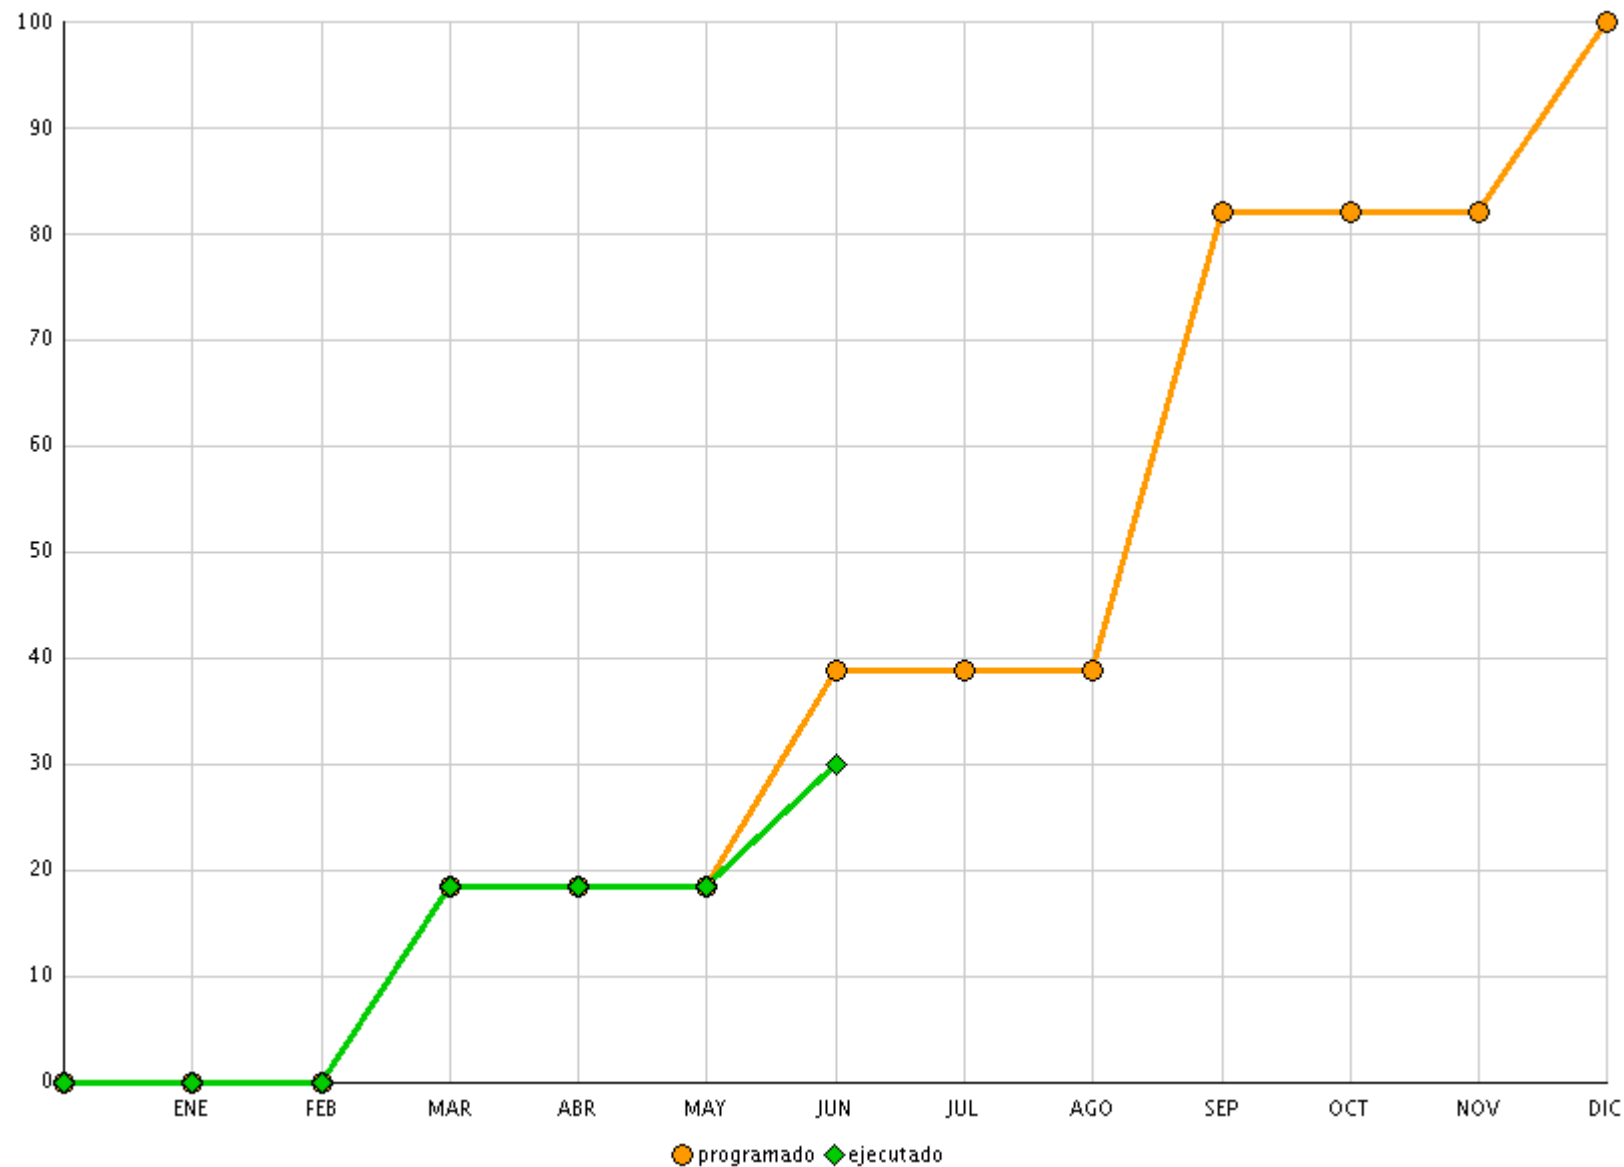


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	18.56	18.56	18.56	38.81	38.81	38.81	82.13	82.13	82.13	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.56	18.56	18.56	29.94						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7573 Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

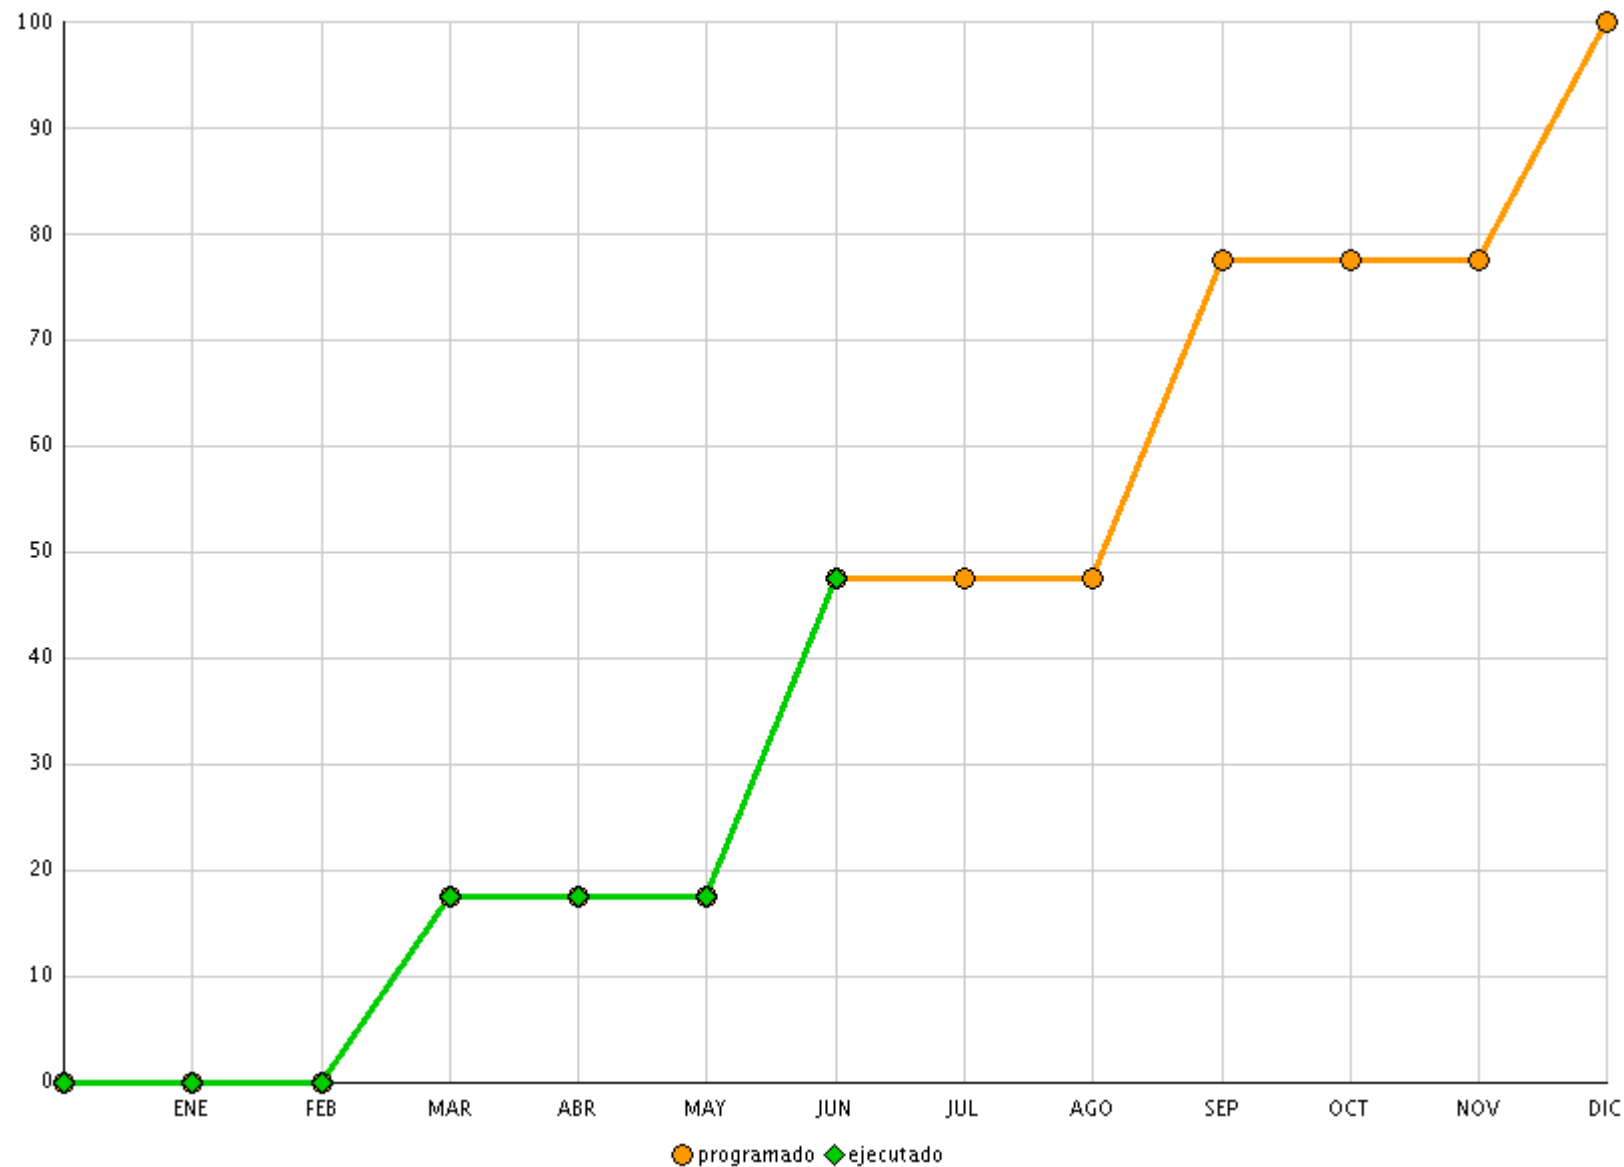


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	17.50	17.50	17.50	47.48	47.48	47.48	77.46	77.46	77.46	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.50	17.50	17.50	47.48						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7574 Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá

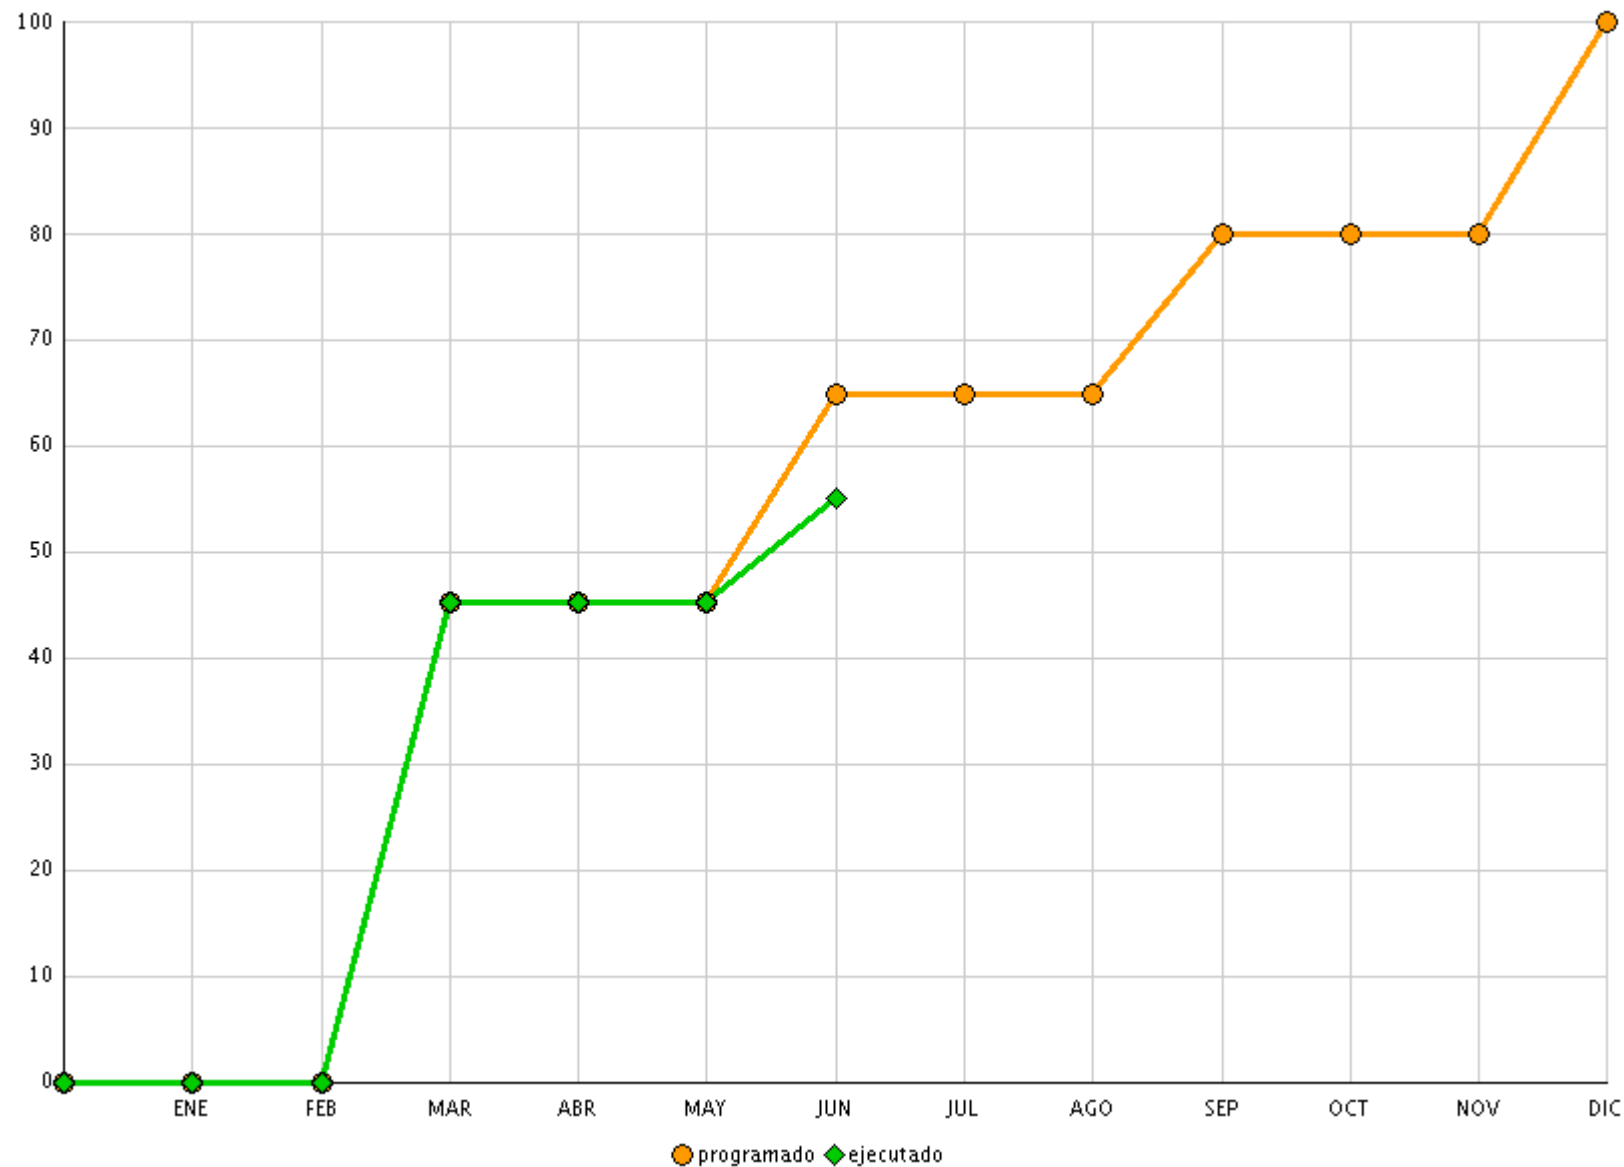


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	45.22	45.22	45.22	64.90	64.90	64.90	80.02	80.02	80.02	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	45.22	45.22	45.22	55.02						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7576 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá

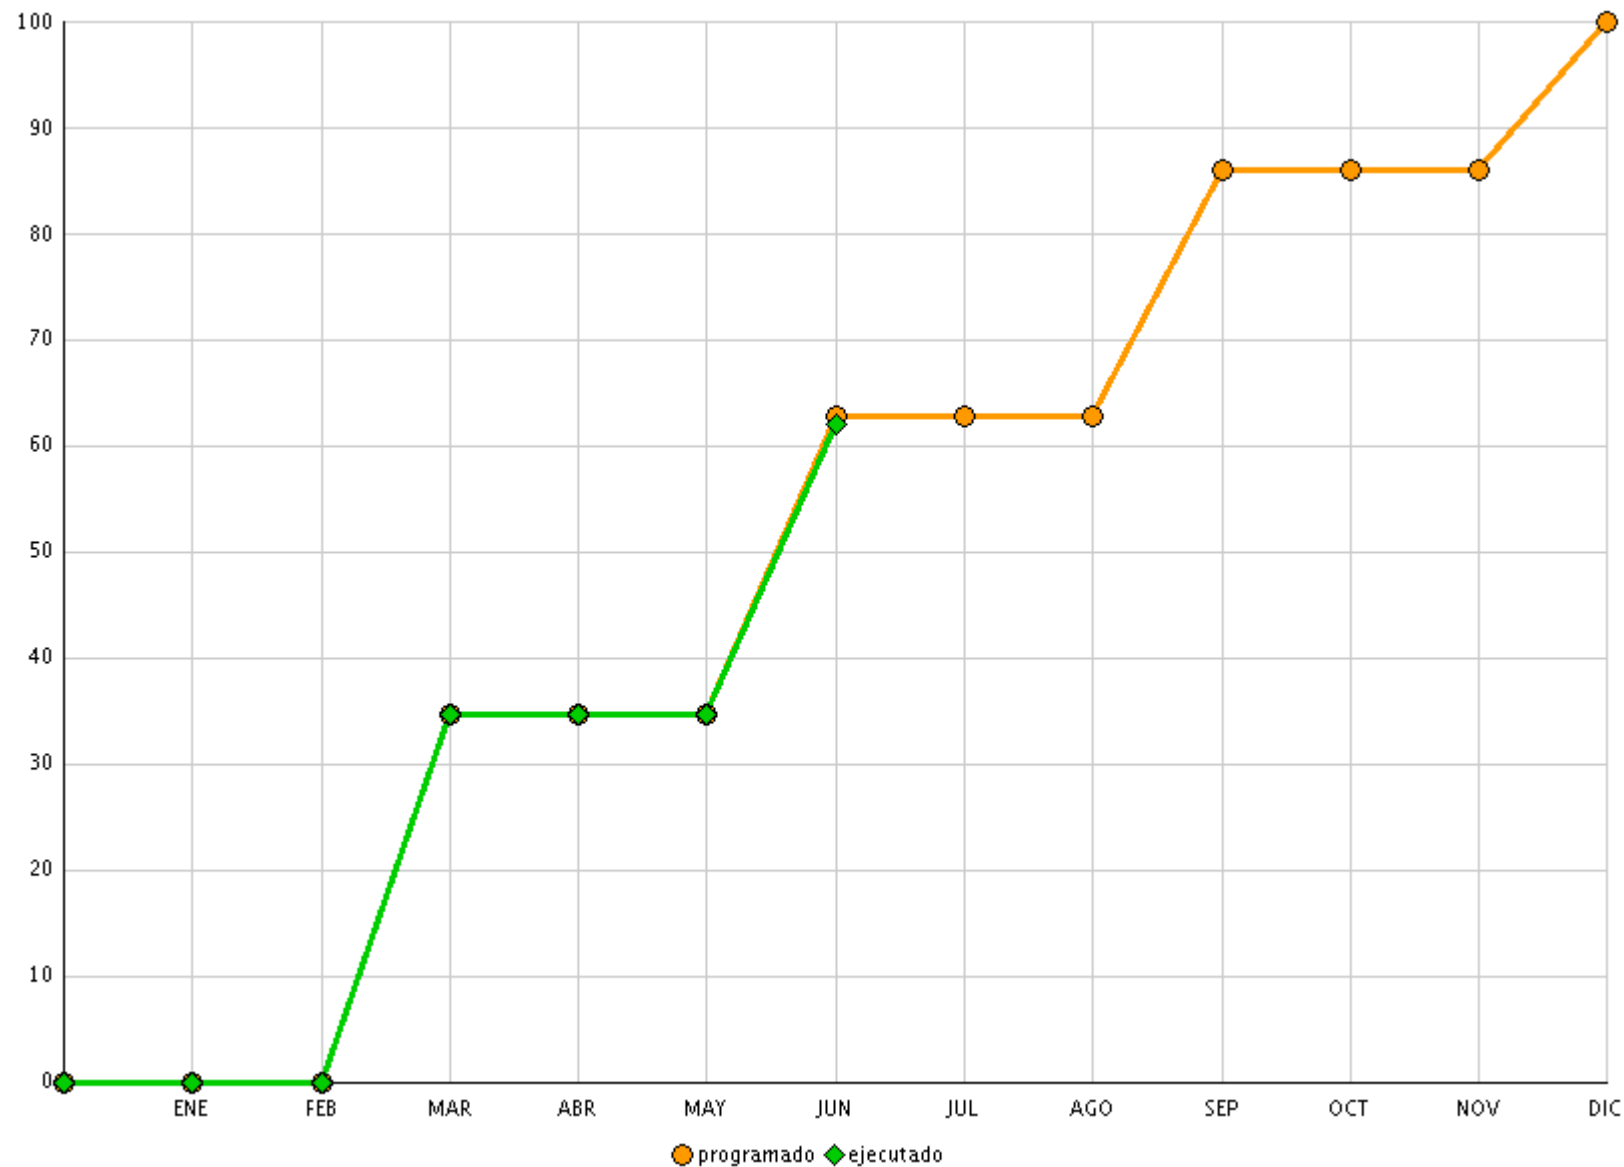


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	34.63	34.63	34.63	62.90	62.90	62.90	86.13	86.13	86.13	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	34.63	34.63	34.63	62.10						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7578 Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

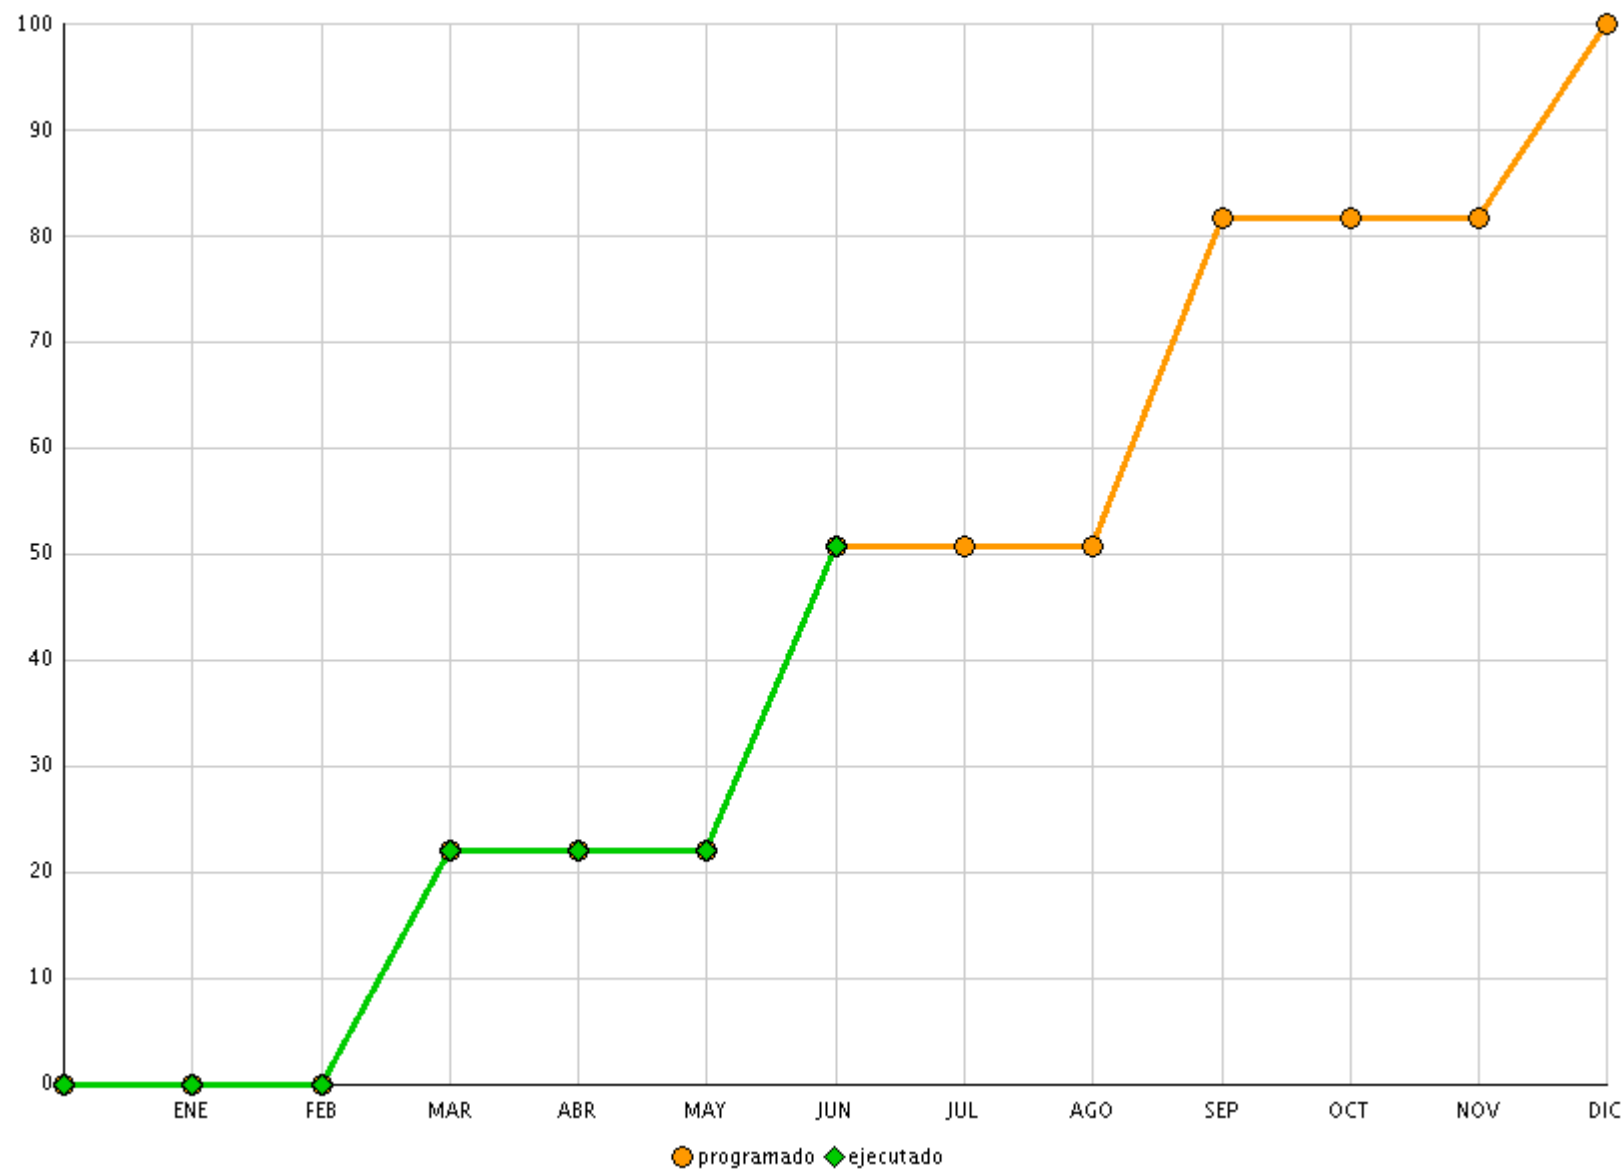


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	22.16	22.16	22.16	50.76	50.76	50.76	81.70	81.70	81.70	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	22.16	22.16	22.16	50.76						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7579 Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

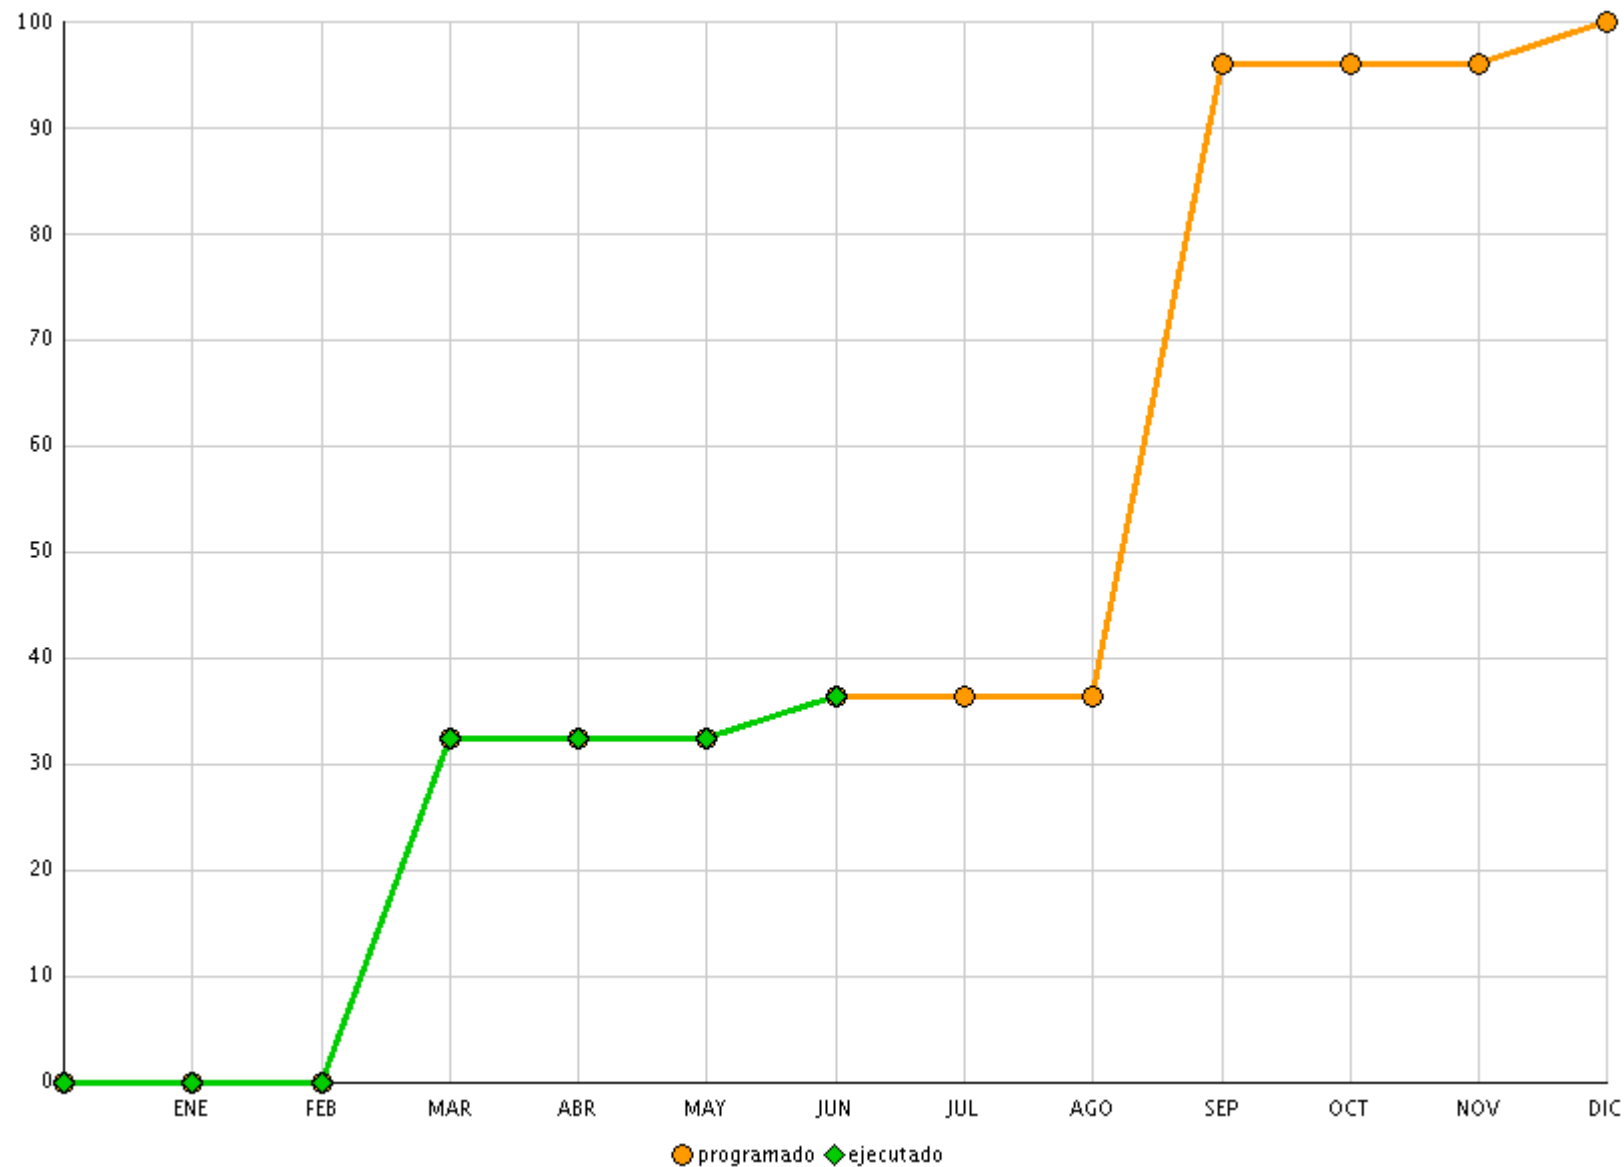


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	32.50	32.50	32.50	36.50	36.50	36.50	96.00	96.00	96.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	32.50	32.50	32.50	36.50						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7581 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá

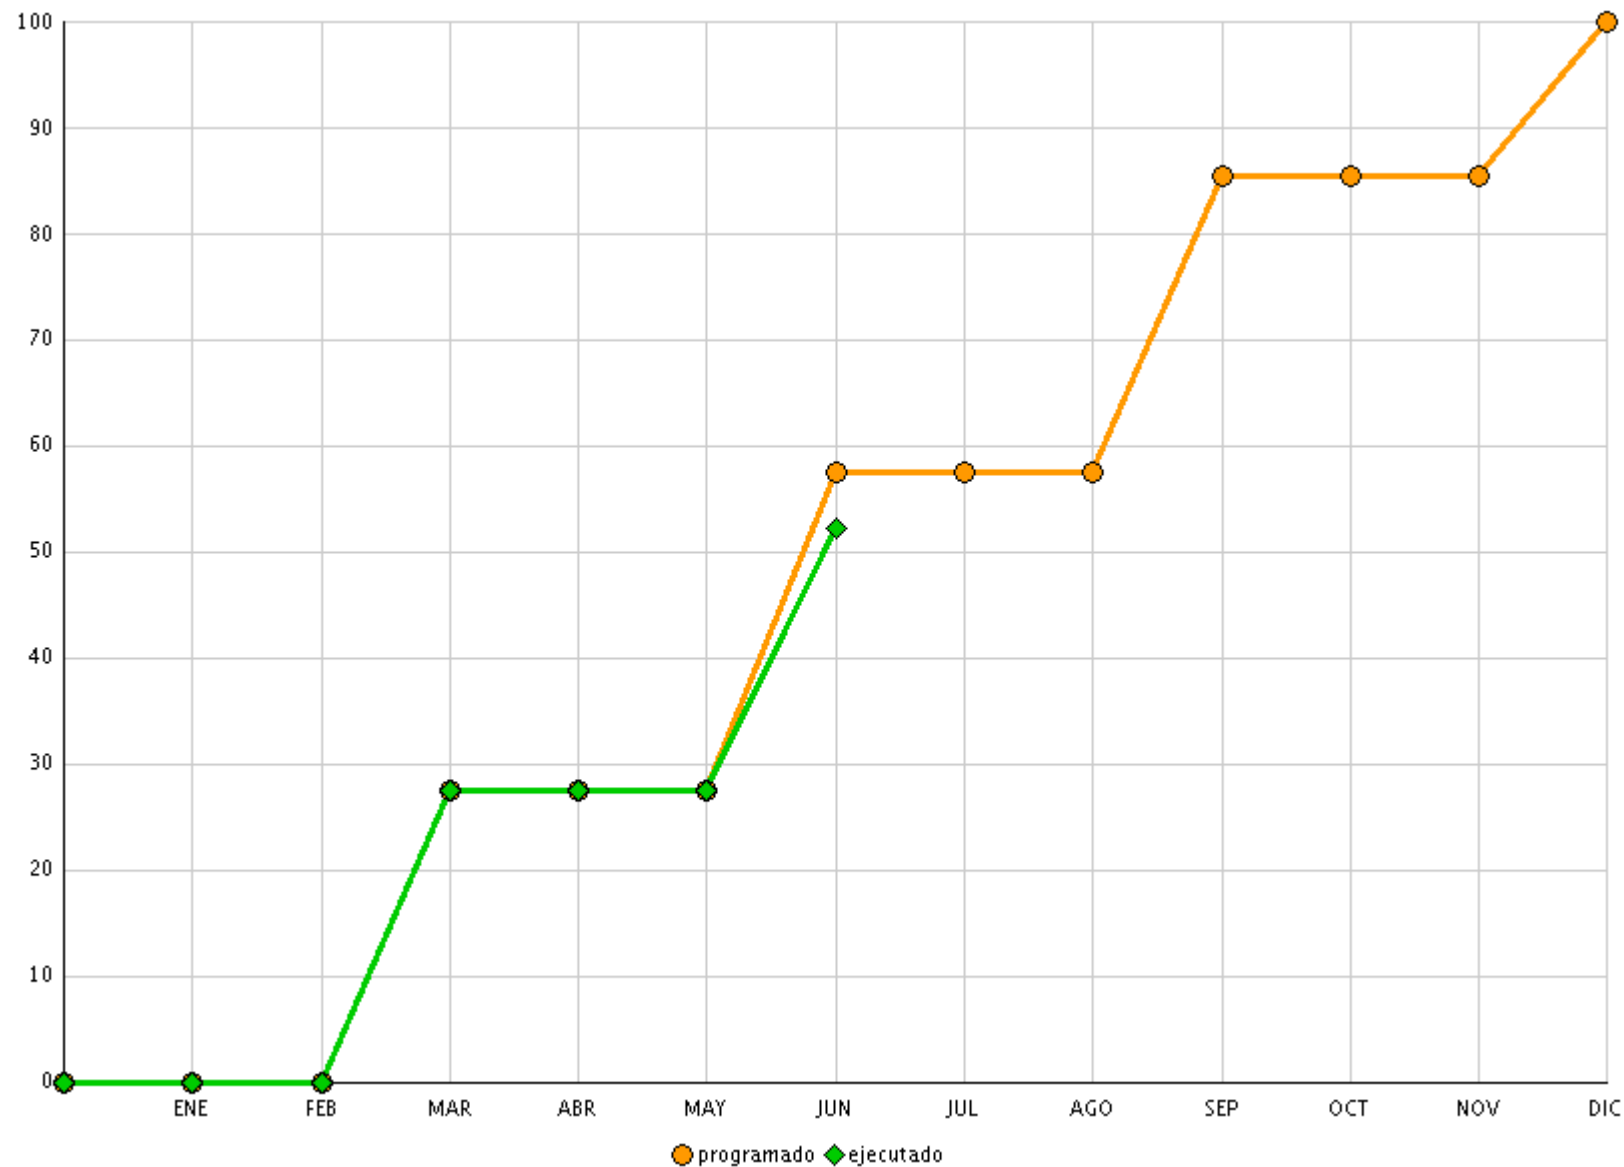


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	27.60	27.60	27.60	57.60	57.60	57.60	85.40	85.40	85.40	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	27.60	27.60	27.60	52.20						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7583 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

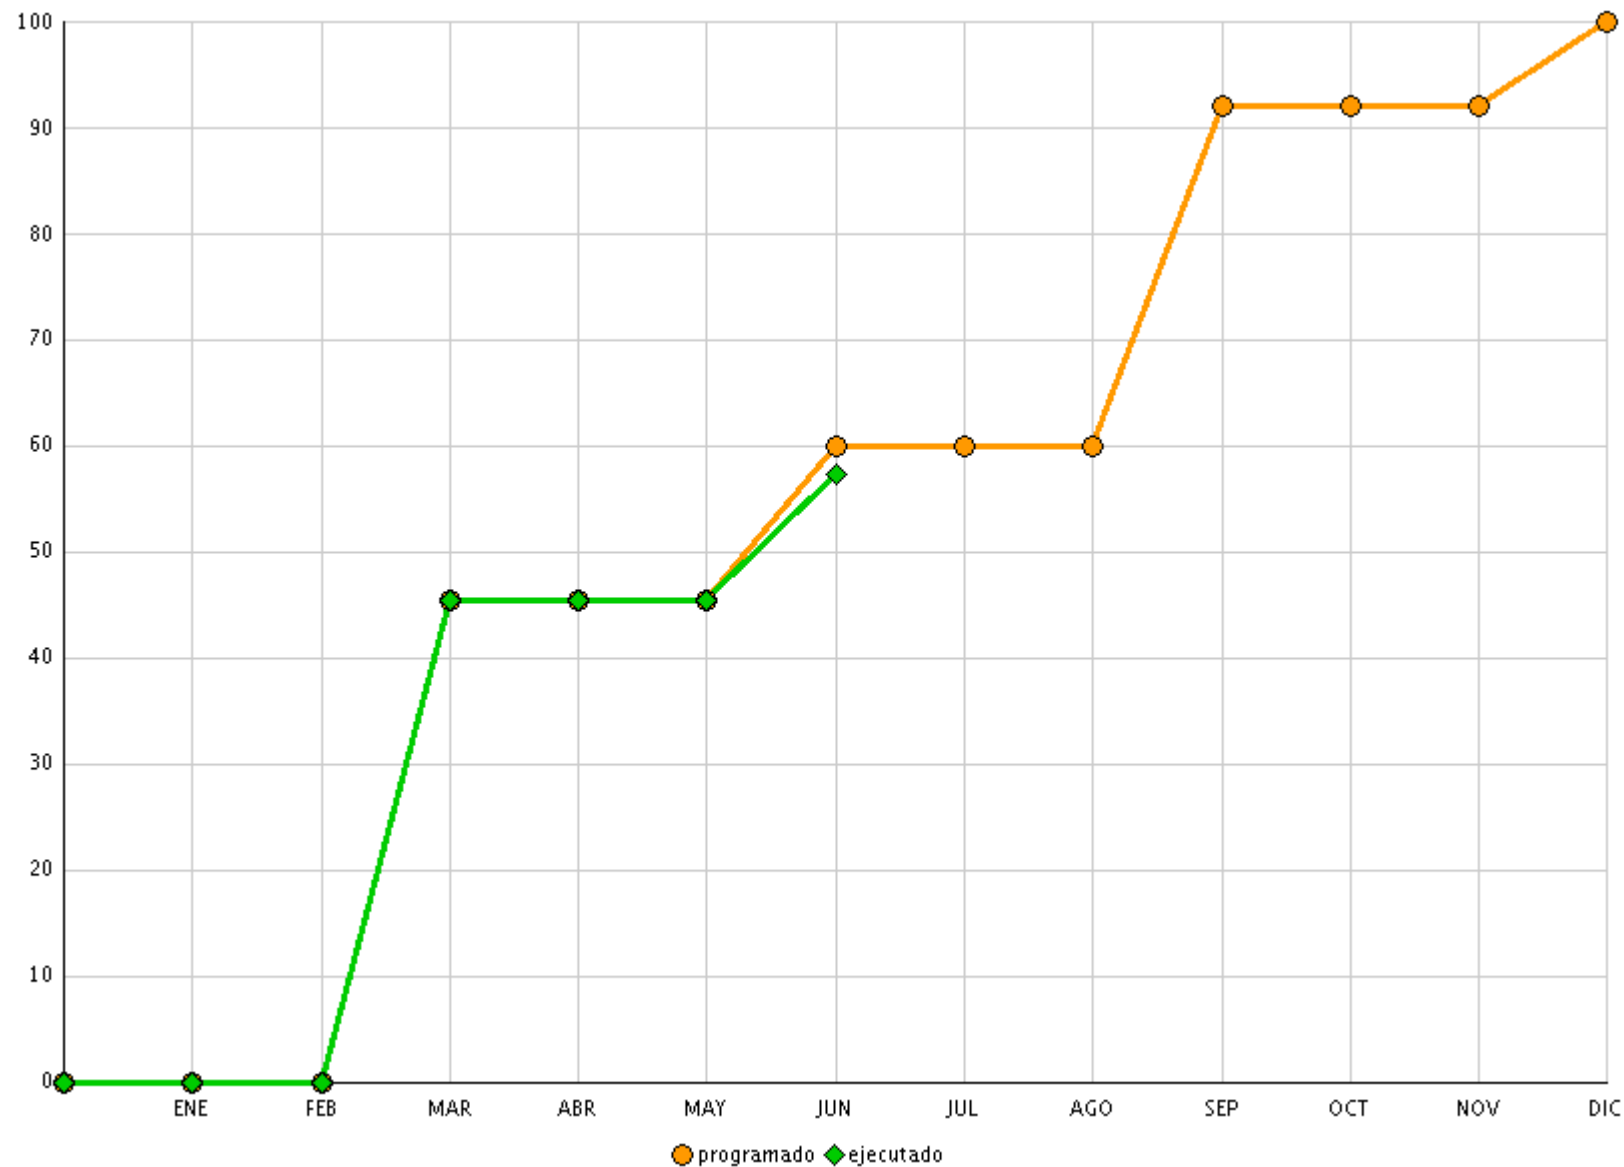


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	45.44	45.44	45.44	60.05	60.05	60.05	92.15	92.15	92.15	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	45.44	45.44	45.44	57.34						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7587 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

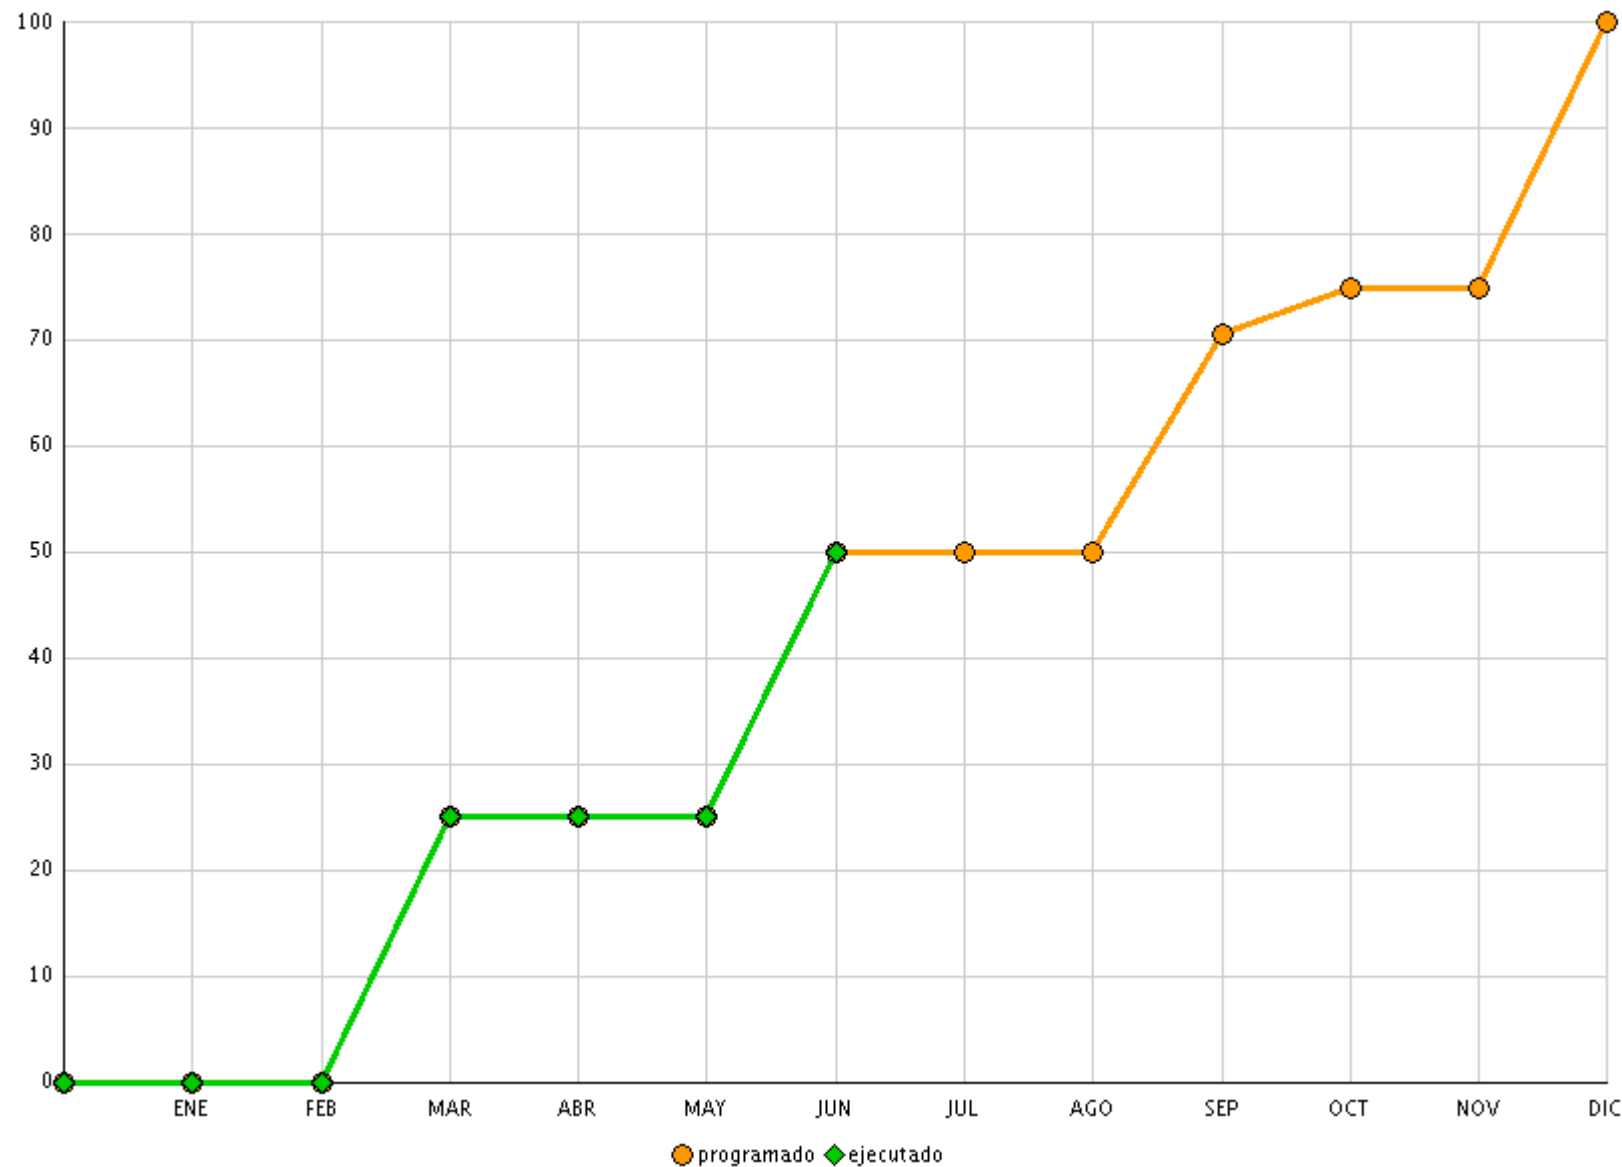


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	70.50	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

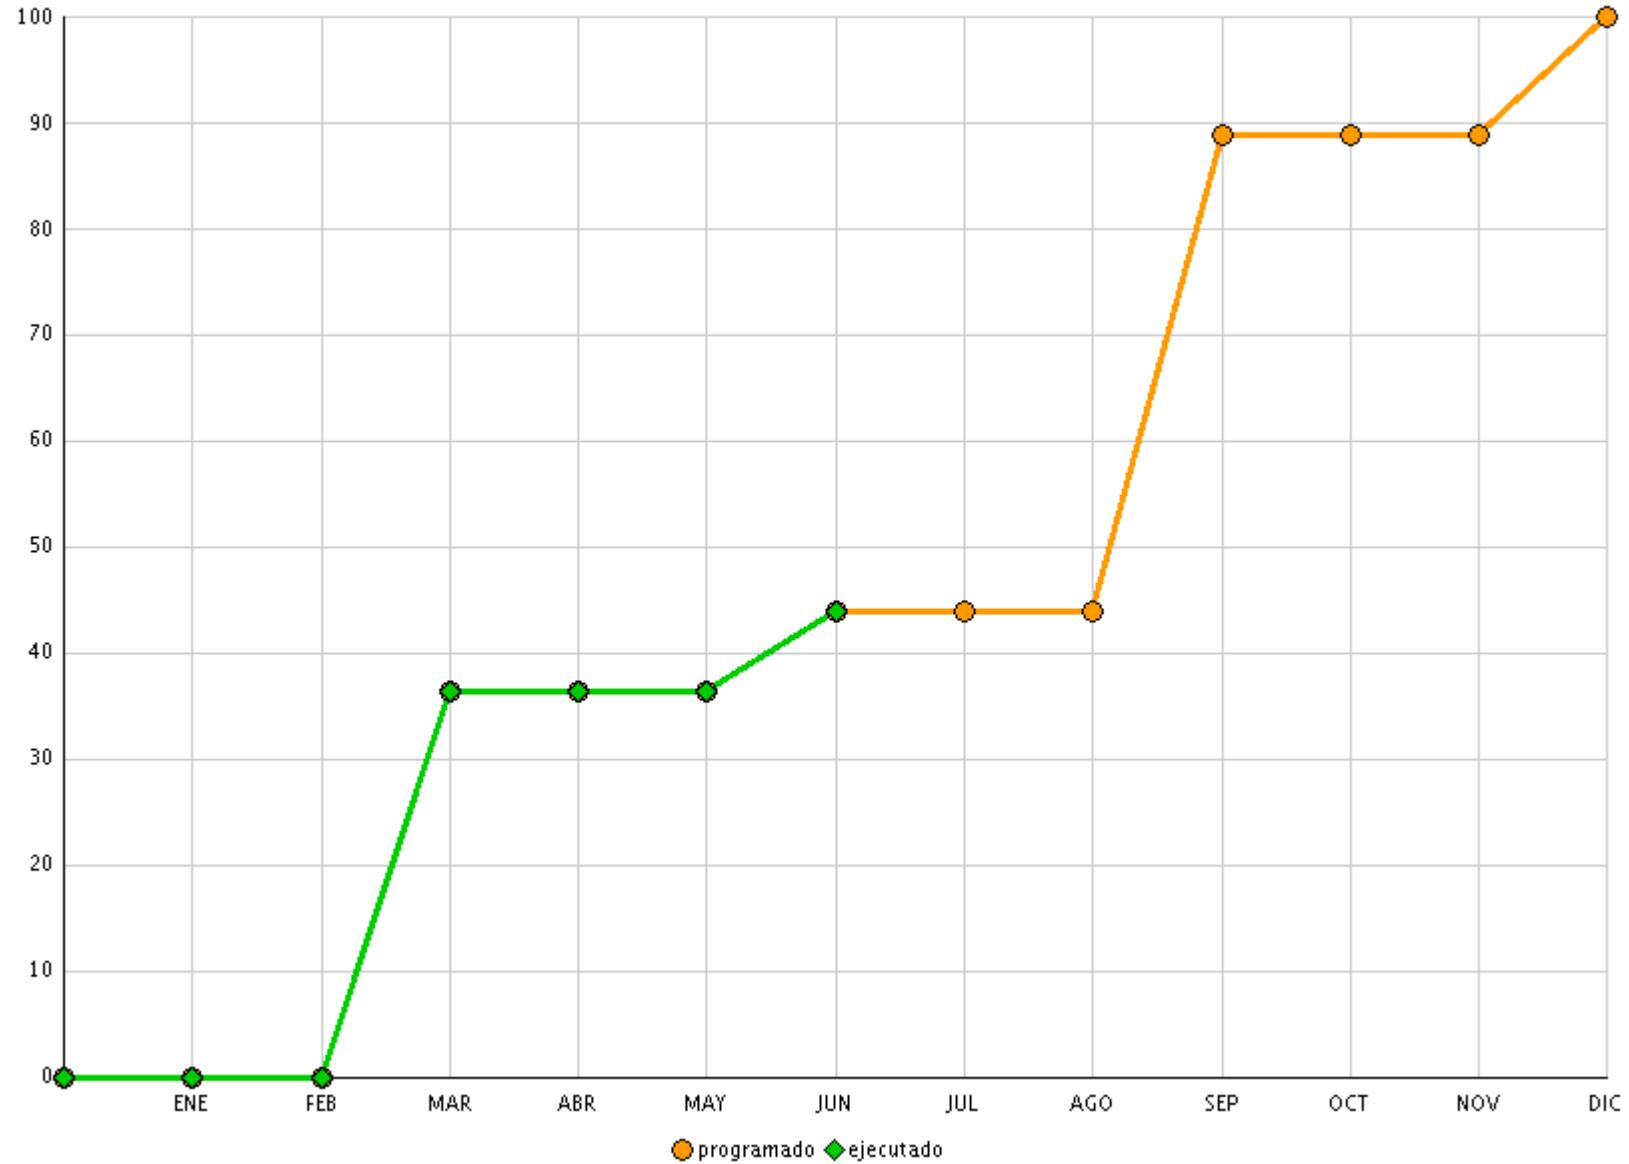


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	36.50	36.50	36.50	44.01	44.01	44.01	88.81	88.81	88.81	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	36.50	36.50	36.50	44.01						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7589 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá

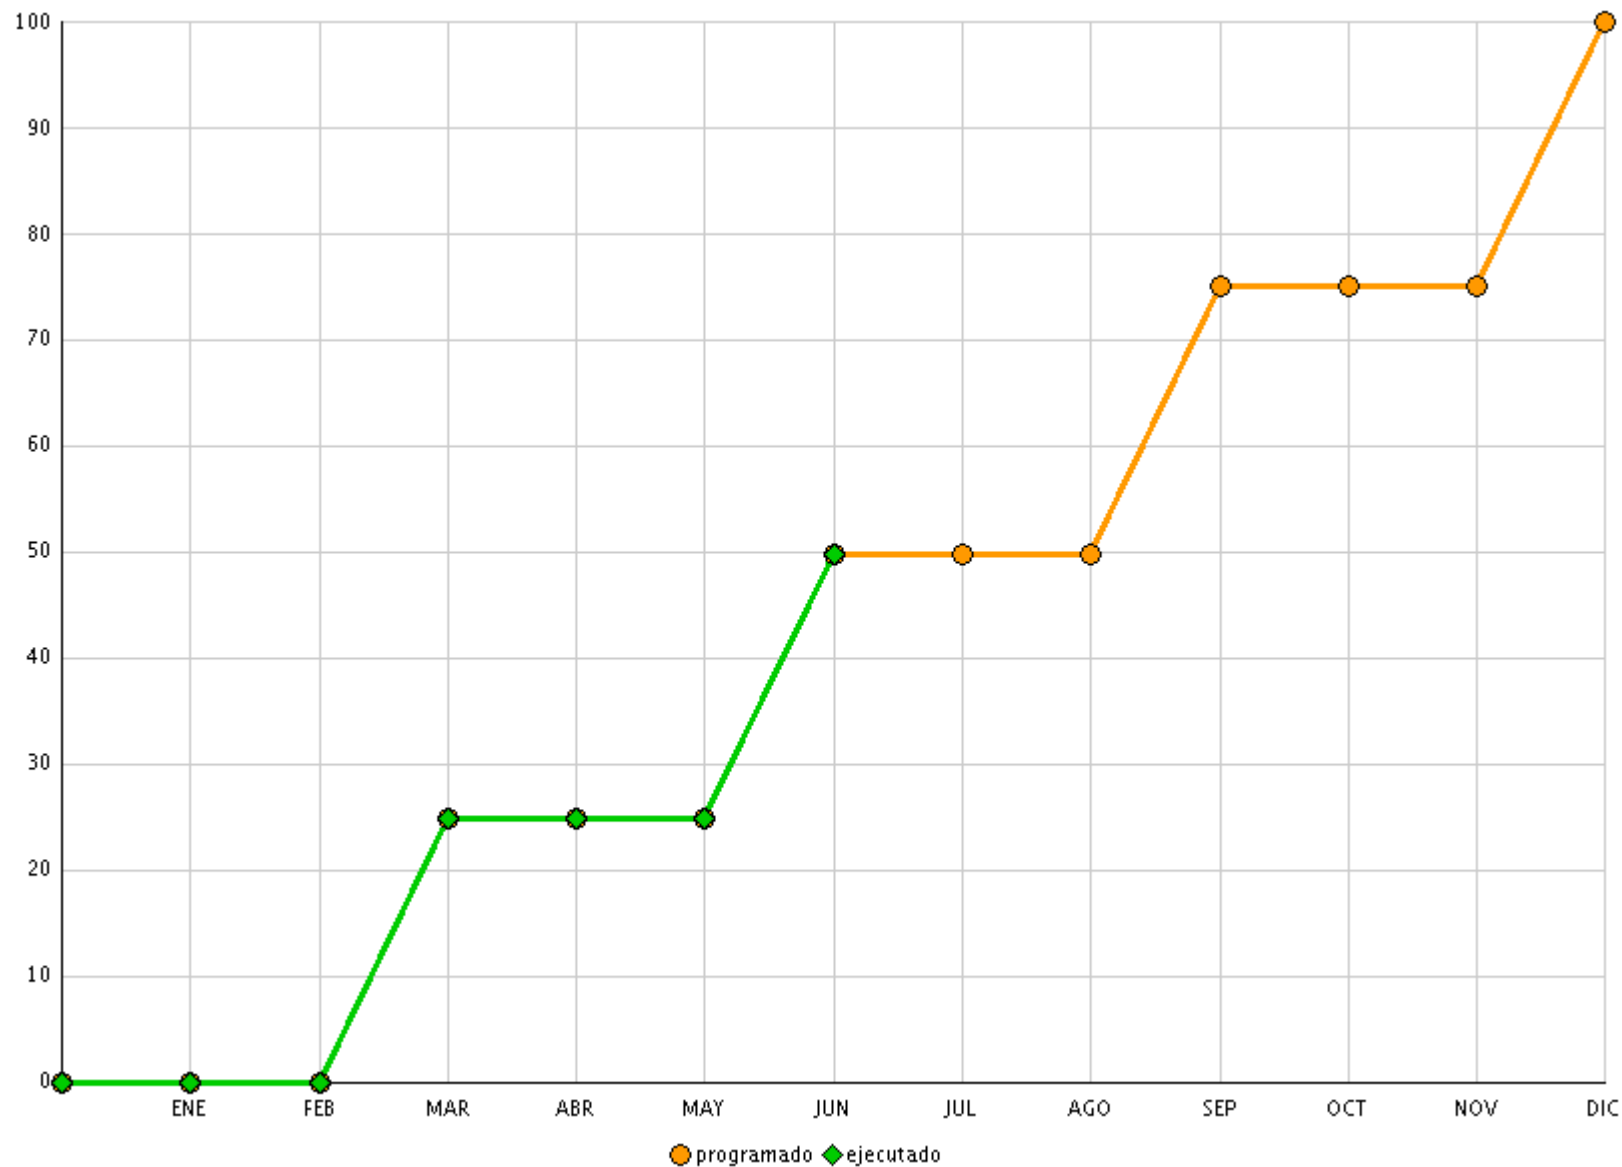


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	24.95	24.95	24.95	49.90	49.90	49.90	75.05	75.05	75.05	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	24.95	24.95	24.95	49.90						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7593 Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá

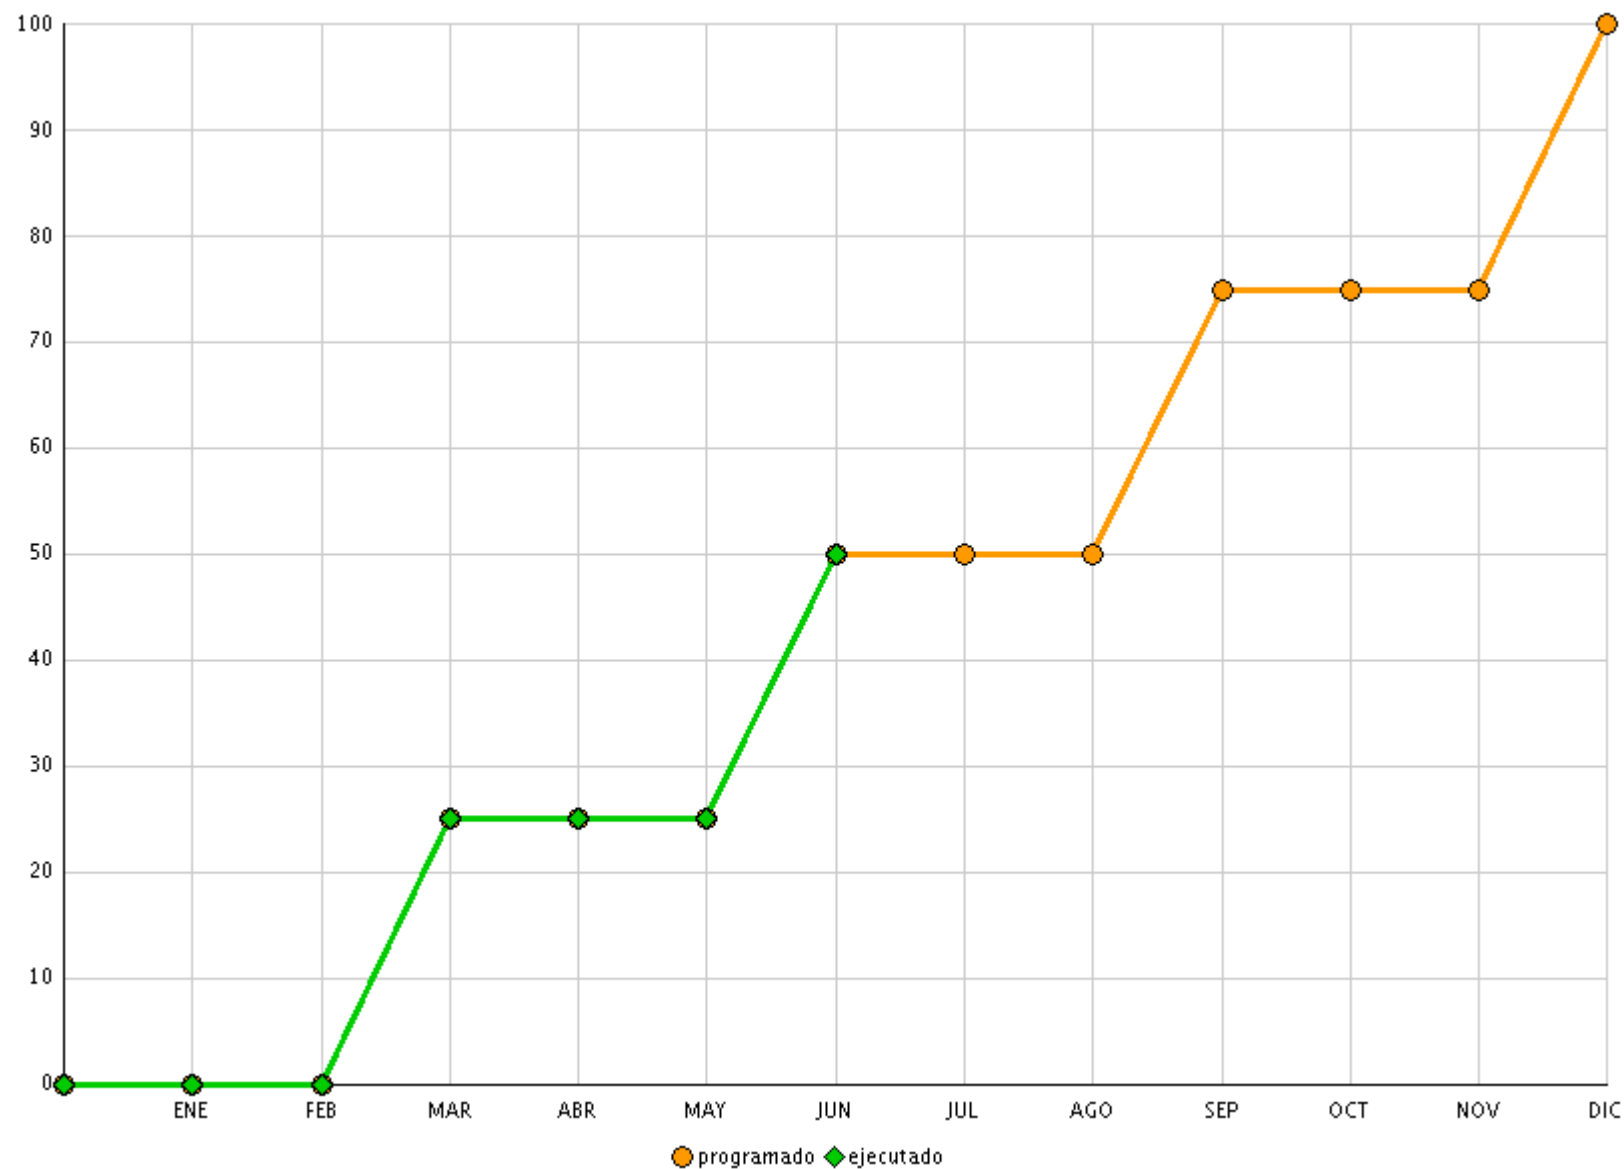


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7595 Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá

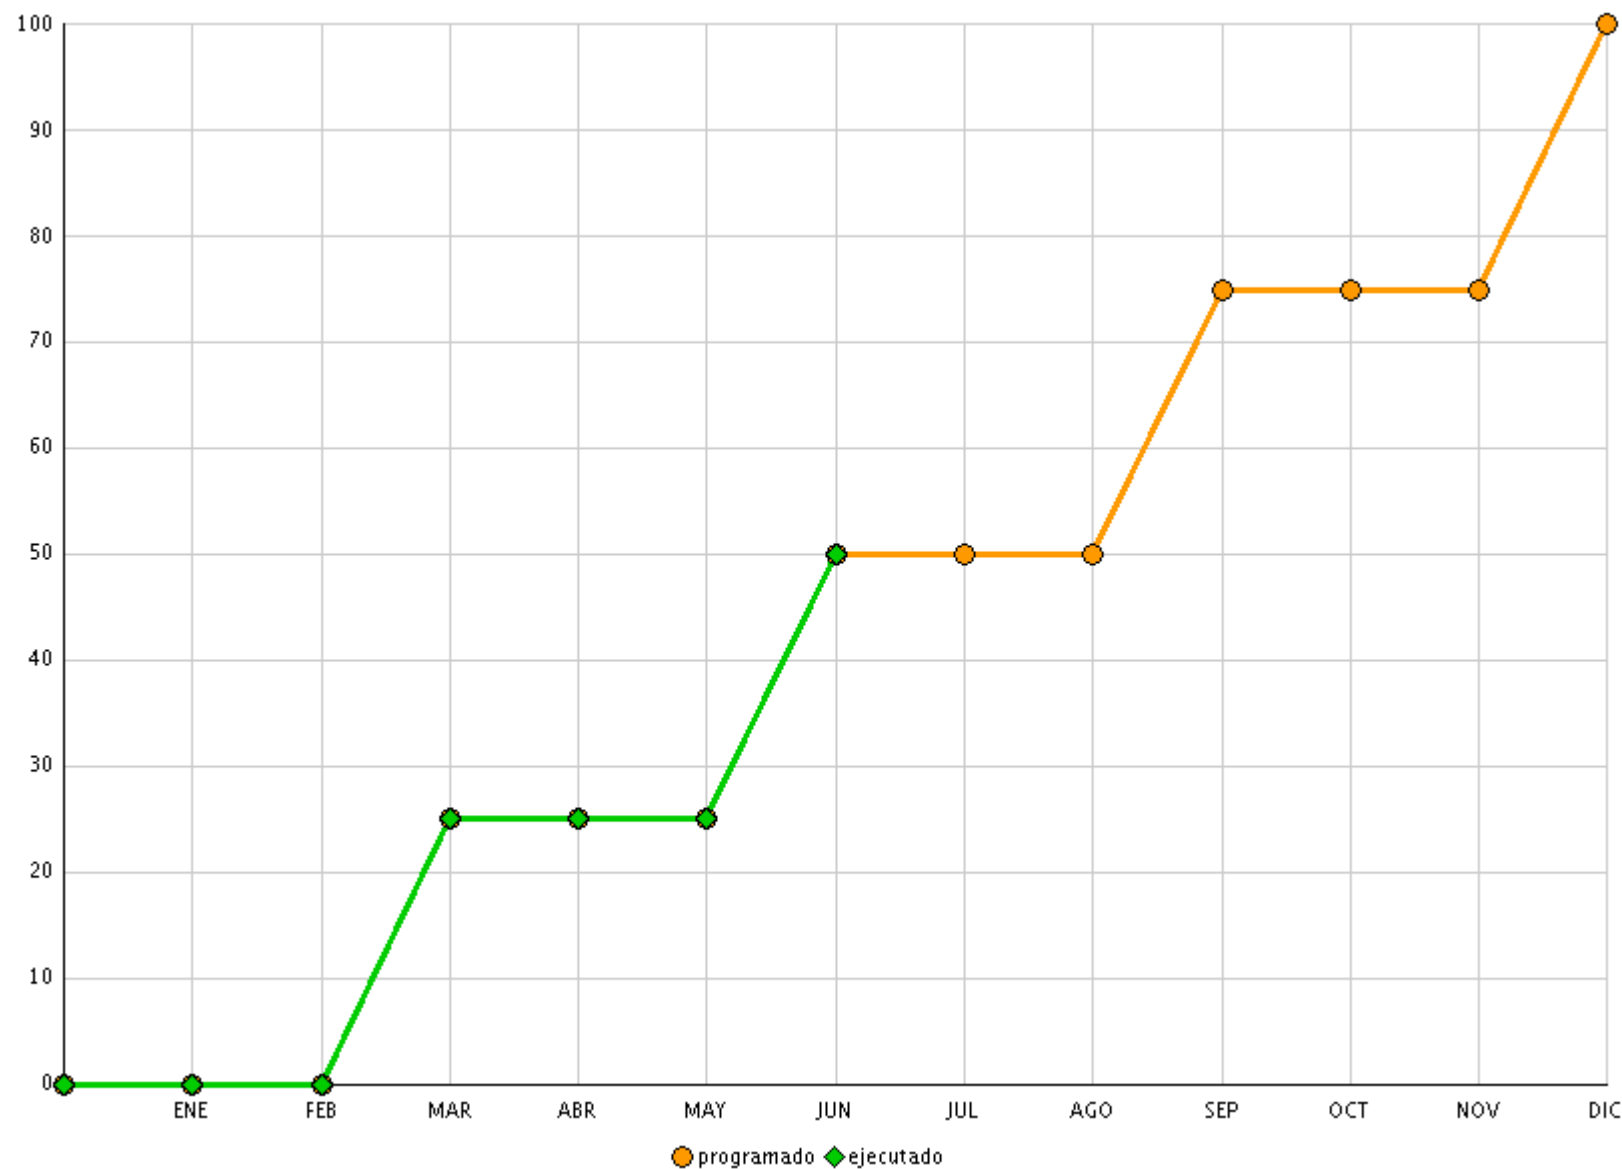


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7596 Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

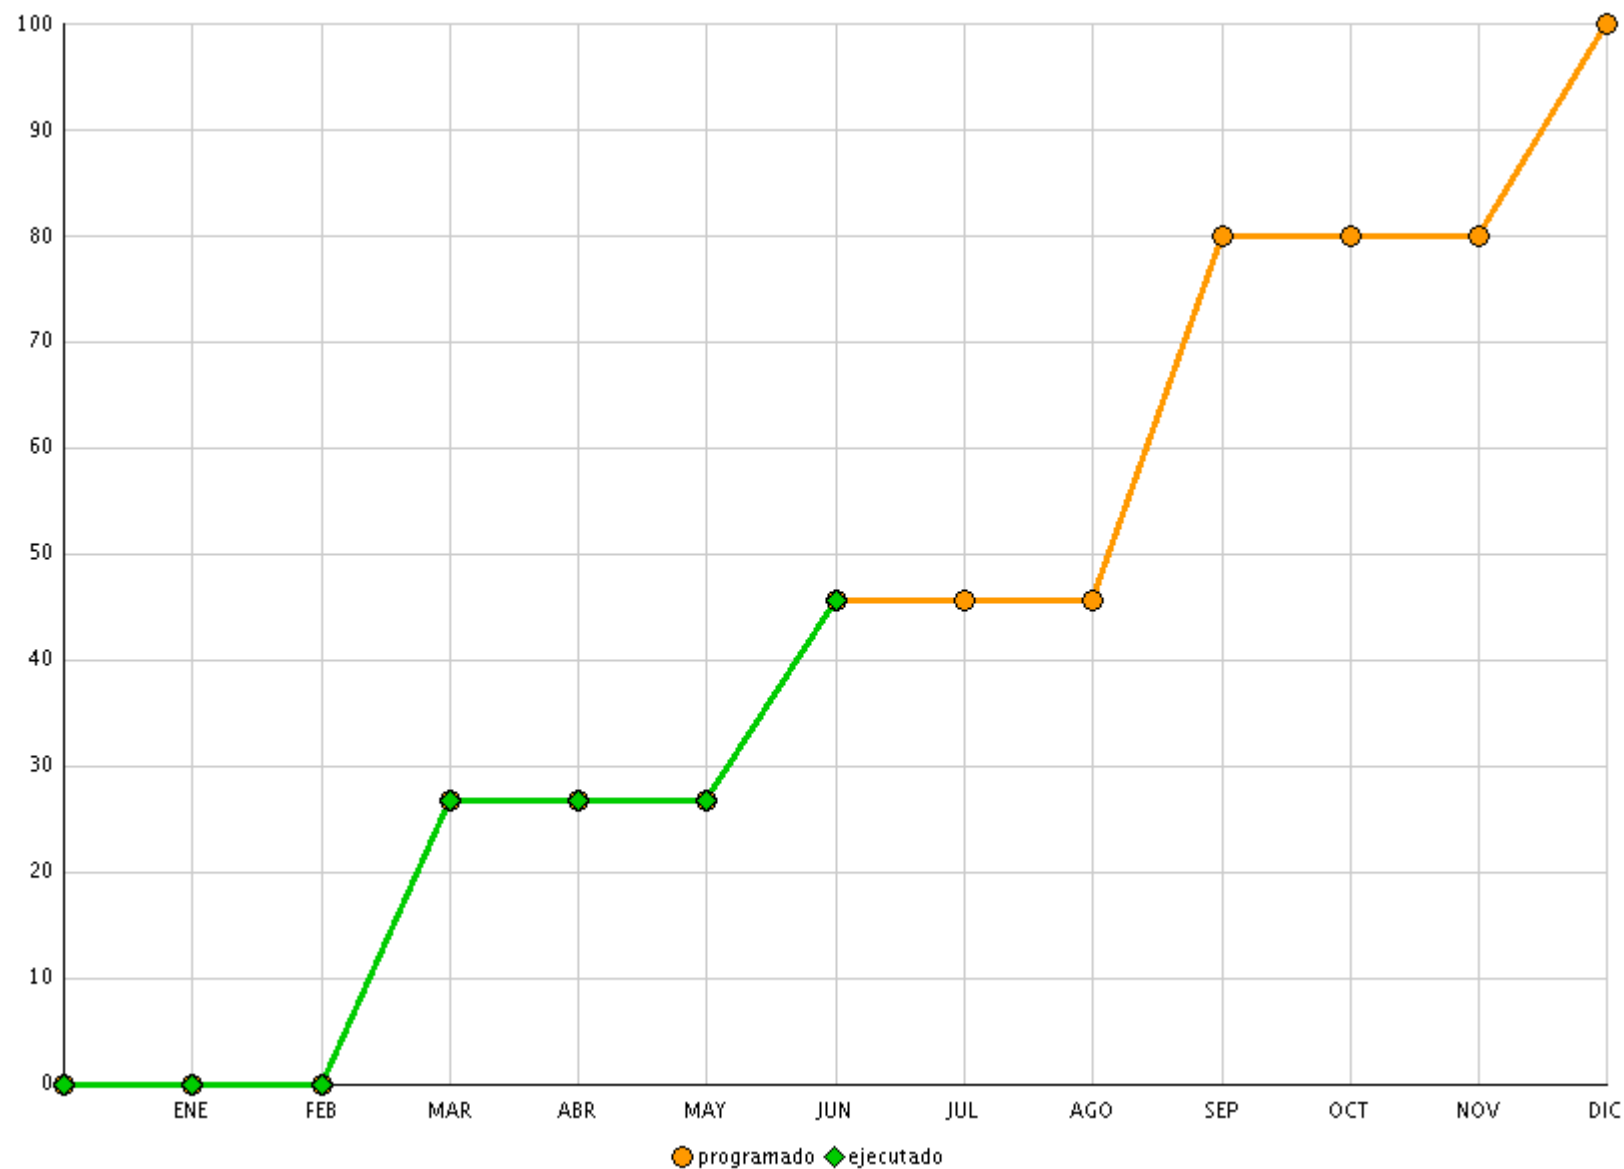


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	26.83	26.83	26.83	45.59	45.59	45.59	80.05	80.05	80.05	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	26.83	26.83	26.83	45.59						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7653 Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá

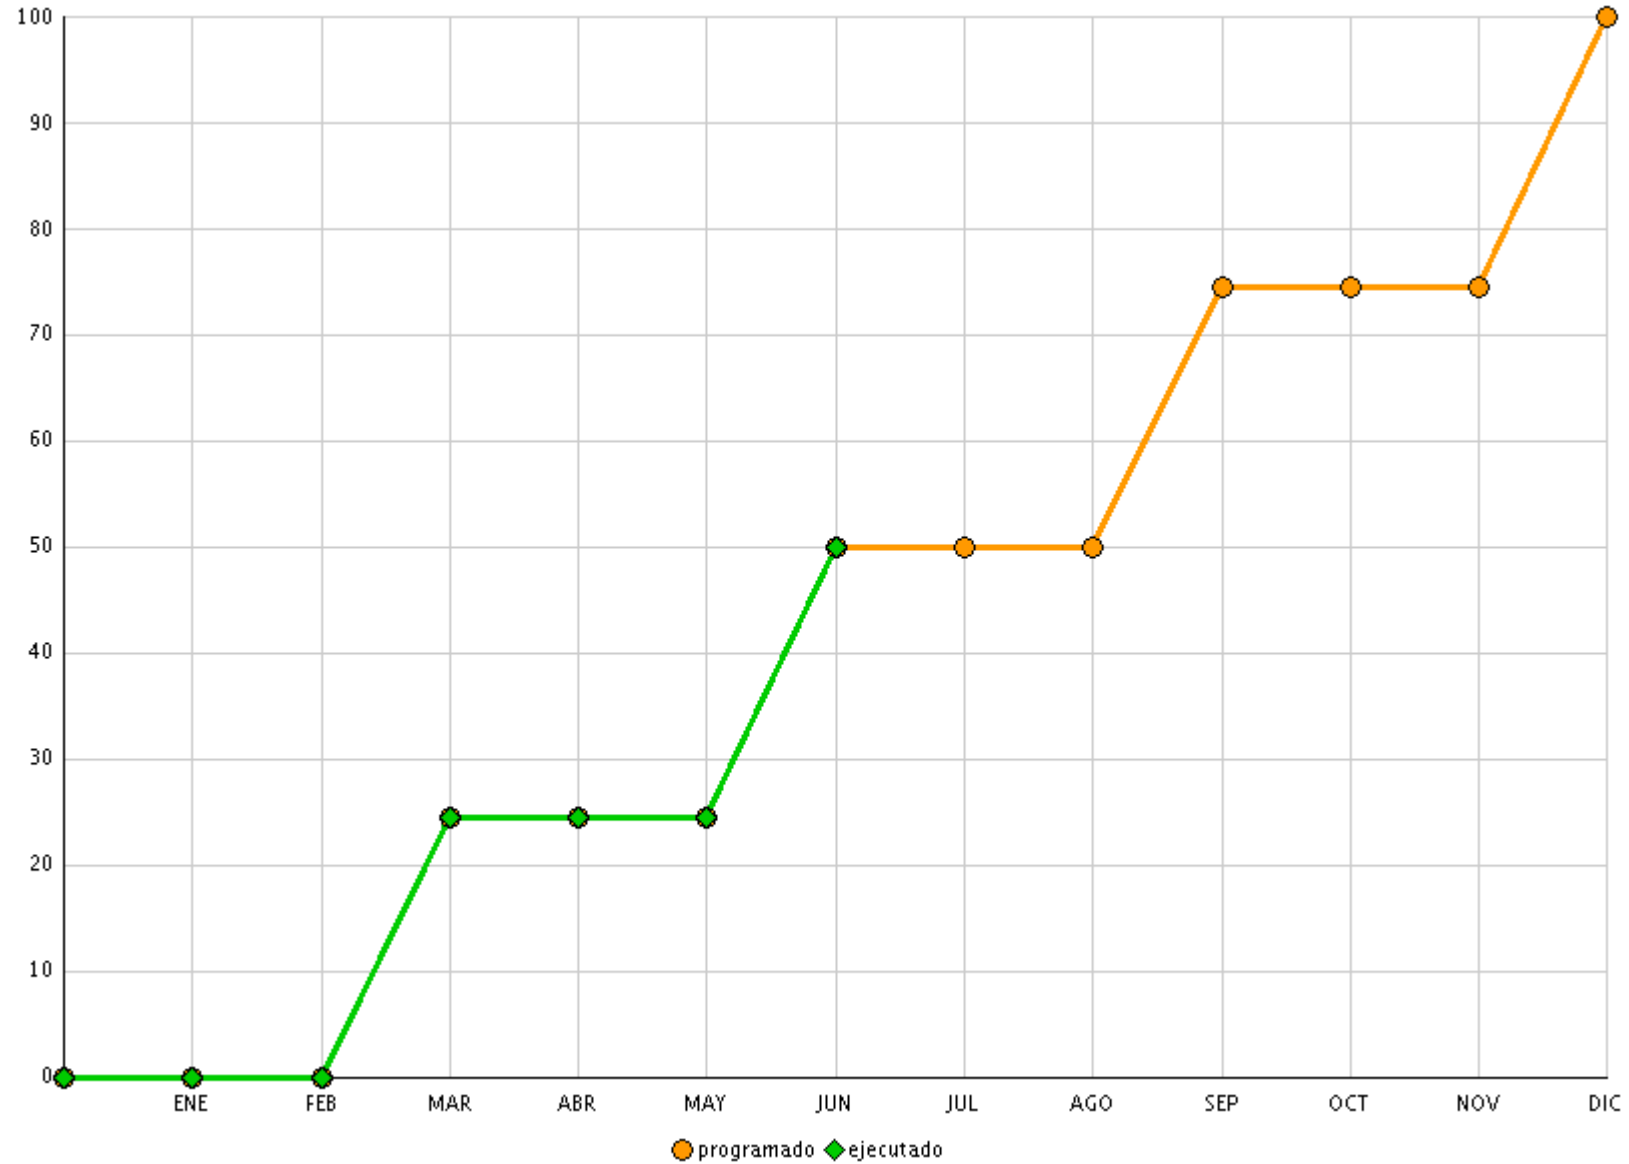


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	50.00	50.00	50.00	74.50	74.50	74.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	50.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7907 Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá

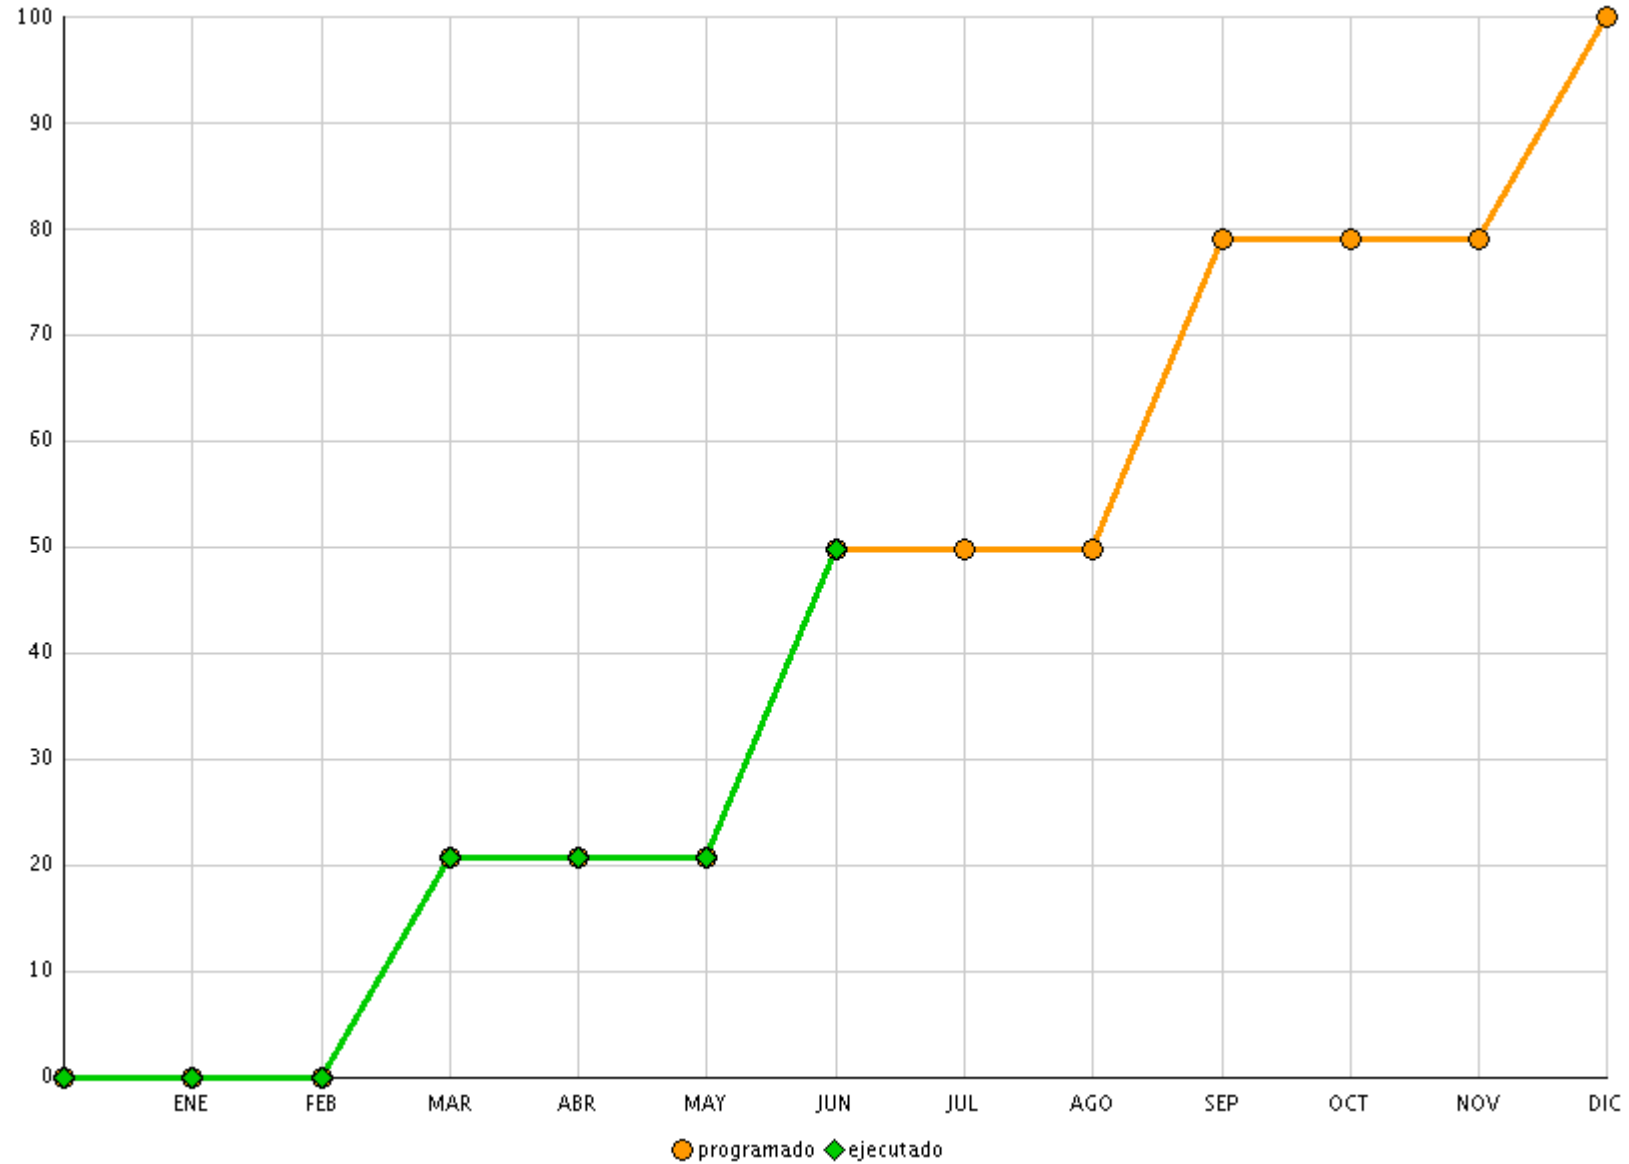

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	20.75	20.75	20.75	49.75	49.75	49.75	79.00	79.00	79.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	20.75	20.75	20.75	49.75						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7563 19 Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO - SGAS	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00		0.00		5.00		0.00		0.00		75.00		100.00	20.00	6.80
2.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PAAI	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18.13	18.13	0.00		0.00		28.13		0.00		0.00		18.11		100.00	53.76	17.74
3.	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y LÚDICO PEDAGÓGICAS QUE PROMOCIONEN LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		55.00		0.00		0.00		15.00		100.00	30.00	9.90
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										34.44

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaria Distrital de Movilidad
7568 22 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO A LA SGC	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		10.00		100.00	65.00	9.10
2.	CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	9.00	0.00		0.00		32.00		0.00		0.00		32.00		100.00	9.00	0.36
3.	ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	41.00	0.00		0.00		32.00		0.00		0.00		13.00		100.00	41.00	4.10
4.	ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	4.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	4.00	0.56
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEJORA A LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS DE MIPG	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	4.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		9.00		100.00	33.00	1.32
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEJORA A LA POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE MIPG	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	4.00	0.00		0.00		19.00		0.00		0.00		6.00		100.00	71.50	2.86
7.	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES POLÍTICAS DE MIPG, INCLUIDO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.50	0.00		0.00		55.00		0.00		0.00		15.00		100.00	16.50	0.66
8.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CERTIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	1.00	0.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00		100.00	1.00	0.04
9.	ADELANTAR LA ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		100.00	80.00	11.20
10.	REALIZAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES E INTERVENTORIA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		20.00		100.00	30.00	4.20
11.	ADELANTAR LA ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		75.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
12.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION - EFR 1000	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		75.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										34.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7570 22 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ADQUIRIR Y RENOVAR ELEMENTOS TICS, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, LICENCIAMIENTOS Y CONTRATOS DE SOPORTES.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00		0.00		43.00		0.00		0.00		37.00		100.00	20.00	2.50	
2.	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ¿ PETI.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		100.00	80.00	10.00	
3.	GARANTIZAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA MODELAMIENTO Y PREDICCIÓN DE TRÁFICO Y HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS EN SIMUR, ENTRE OTROS.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00		0.00		22.00		0.00		0.00		16.00		100.00	62.00	7.75	
4.	ADQUIRIR SERVICIOS PARA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00		88.00		0.00		0.00		6.00		100.00	5.00	0.63	
5.	PARAMETRIZAR, DESARROLLAR Y ASEGURAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00		0.00		30.50		0.00		0.00		14.00		100.00	55.50	6.94	
6.	PARAMETRIZAR, DESARROLLAR, FORTALECER Y ASEGURAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		85.00		0.00		0.00		9.00		100.00	6.00	0.75	
7.	PREPARAR A LA ENTIDAD PARA LA ACTIVACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DIGITAL.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		3.00		100.00	7.00	0.88	
8.	ADQUIRIR BIENES, LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		58.00		0.00		0.00		38.00		100.00	4.00	0.50	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		29.94

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7573 34 Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1 - REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS, REGULATORIOS O SANCIONATORIOS, SANCIONAR A LOS ACTORES VIALES QUE INFRINGEN LAS NORMAS DE TRÁNSITO	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	17.50
2. META 2 - REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN VIAL Y SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	17.50
3. META 3 - REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS A CONTROLES PREVENTIVOS, REGULATORIOS O SANCIONATORIOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	41.60	0.00		0.00		41.60		0.00		0.00		16.80		100.00	41.60	12.48
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		47.48		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7574 19 Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	14.00
2.	AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE LA SDM	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	7.00
3.	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LA MESA DE SERVICIO RELACIONADOS CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	7.00
4.	CONTRATACIÓN DEL PROCESO DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	10.50
5.	PROCESOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DE ARCHIVO CENTRAL Y UNIFICACIÓN DE GESTIÓN O SATÉLITES	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		20.00		100.00	50.00	7.00
6.	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERCERIZACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	10.00	0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		12.00		100.00	68.00	9.52
7.	APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (DISPOSICIÓN FINAL)	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		75.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										55.02

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7576 27 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1 - VIAJES DE ACOMPAÑAMIENTO DESDE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO HACIA LOS COLEGIOS Y VICEVERSA.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		21.00		0.00		0.00		5.00		100.00	74.00	22.20
2.	META 2 - LLEVAR A CABO EL MODELO OPERATIVO DEL PROYECTO DESDE SU PLANEACIÓN HASTA SU CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS ACTORES VIALES, OPERACIÓN EN VIA, REGISTRO DE ACTIVIDADES Y ATENCIÓN DE NOV	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	26.00	0.00		0.00		26.50		0.00		0.00		17.50		100.00	52.00	10.40
3.	META 3 - SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE LAS VISITAS A INSTITUCIONES	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	0.00		0.00		21.25		0.00		0.00		13.75		100.00	65.00	19.50
4.	META 4 - PREVENIR, CONTROLAR Y VERIFICAR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	26.25	0.00		0.00		26.25		0.00		0.00		23.75		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							62.10			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7578 39 Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1- DESARROLLAR A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS ACCIONES EN RELACIÓN A LA OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.00
2.	META 1 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ESTADÍSTICAS POR TIPO DE FALLA Y RECURRENCIA DE ESTAS, POR COMPONENTE (ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, COMUNICACIONES, OBRAS O POSTES)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.00
3.	META 1 - REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS QUE ATIENDAN LOS DIFERENTES COMPONENTES (OBRAS CIVILES, POSTES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, ETC)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		15.00		100.00	35.00	3.50
4.	META 2 - DESARROLLAR A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS LAS ACCIONES EN RELACIÓN A LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA INSTALANDO CONTROLES SEMAFÓRICOS EN INTERSECCIONES DE LA CIUDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		18.00		100.00	48.00	4.80
5.	MTEA 3 - OPERAR LOS COMPONENTES DEL SIT Y LLEVAR A CABO LAS IMPLEMENTACIONES REQUERIDAS PARA LA EXPANSIÓN DEL MISMO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		10.00		100.00	80.00	8.00
6.	META 4 - REVISAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) JUNTO CON LOS SOPORTES DE ANÁLISIS DE TRÁNSITO (MODELACIÓN) EN AQUELLOS CASOS QUE APLIQUEN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		10.00		100.00	50.00	5.00
7.	META 5 - REALIZAR LA REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A PMTS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		20.00		100.00	50.00	5.00
8.	META 6 - INTERVENIR TRAMOS VIALES PARA MEJORAR SU VELOCIDAD PROMEDIO EN UN 15%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		17.00		100.00	53.00	5.30
9.	META 7 - REALIZAR LAS JORNADAS DE GESTIÓN EN VÍA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00		0.00		32.00		0.00		0.00		18.00		100.00	50.00	5.00
10.	META 8 - DESARROLLAR LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		33.40		0.00		0.00		25.00		100.00	41.60	4.16
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7579 24 Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDSV	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00		0.00		59.50		0.00		0.00		4.00		100.00	36.50	36.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									36.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7581 22 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC													
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
TOTAL						\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA EL DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		10.00		100.00	50.00	10.00
2.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA PARA LA MOVILIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		20.00		100.00	45.00	9.00
3.	ADELANTAR LAS ACCIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE CULTURA PARA LA MOVILIDAD PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		10.00		100.00	60.00	12.00
4.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PARA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN VIAL PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		10.00		100.00	70.00	14.00
5.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	18.00	0.00		0.00		24.00		0.00		0.00		23.00		100.00	36.00	7.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										52.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7583 25 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META1_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA QUE DESARROLLEN LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	23.26	23.26	0.00		0.00		13.87		0.00		0.00		12.50		100.00	73.63	2.00
2.	META1_REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGÍSTICA RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	META1_DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, EN EL DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.40
4.	META1_META 1_REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA POSTULACION DE LA CULTURA BOGOTANA DEL USO Y DISFRUTE DE LA BICICLETA	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00				100.00	0.00	0.00
5.	META1_ENTREGAR DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA CIUDADANA(PPBICI)	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60	66.60	0.00		0.00		33.40		0.00		0.00				100.00	66.60	1.86
6.	META1_REALIZACIÓN DEL EVENTO CICLÍSTICO DENOMINADO VUELTA A COLOMBIA ETAPA 10 MASCULINA Y ETAPA 7 FEMENINA	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00				0.00				100.00	0.00	0.00
7.	META1_ESTABLECER ACCIONES CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	META2_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA (COMPARTIDA)	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	75.00	12.00
9.	META3_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA LAS POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD MOTORIZADA DE CERO Y BAJA EMISIONES RECURSO HUMANO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	75.00	12.00
10.	META4_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA FORTALECER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL DE MOVILIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96	11.12	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	41.16	3.29
11.	META4_REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL DISEÑO DE UN VEHÍCULO FINANCIERO QUE PROPENDAN POR LA MODERNIZACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00		0.00				100.00	100.00	8.00
12.	META5_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO E INFORMES TÉCNICOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00		0.00		19.42		0.00		0.00		12.50		100.00	68.08	2.72
13.	META5_REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGÍSTICA RELACIONADOS PARA ADELANTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14.	META5_REALIZAR LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, PARA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7583 25 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
ADELANTAR LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN																															
15. META5_ENTREGAR DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.00			
16. META6_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO PARA ADELANTAR UN ESQUEMA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE MEDIANTE EL FOMENTO DE LA MICROMOVILIDAD	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	75.00	12.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										57.34	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7587 31 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1 - REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DE TRÁNSITO, PACIFICACIÓN O TRÁFICO CALMADO DE LOS PUNTOS PRIORIZADOS EN LAS VÍAS DEL DISTRITO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.00
2.	META 2 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES VERTICALES DE LAS DIFERENTES VÍAS DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
3.	META 3 - IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN Y OTROS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
4.	META 4 - INSTALAR LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DISEÑADA PARA LAS DIFERENTES VÍAS DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
5.	META 5 - IMPLEMENTAR DESARROLLOS DE ZONAS ESCOLARES EN LAS VÍAS ALEDAÑAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DITRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
6.	META 6 - IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE URBANISMO TÁCTICO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
7.	META 7 - DEMARCAR LOS PASOS PEATONALES PRIORIZADOS DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
8.	META 8 -REALIZAR LA DEMARCACIÓN DE LAS VÍAS CONSTRUIDAS Y MANTENIDAS EN EL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
9.	META 9 -MANTENER SEÑALIZADO INTEGRALMENTE LOS 14 CORREDORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
10.	META 10 - REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLORRUTAS SEGREGADAS EN LAS CALZADAS DE LOS DIFERENTES CORREDORES VIALES DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
11.	META 11 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LA CICLO-INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS VÍAS DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaria Distrital de Movilidad
7588 24 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META1_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA QUE DESARROLLEN LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL USUARIO Y PRESTADOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	75.00	8.25
2. META2_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA QUE DESARROLLEN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	75.00	2.25
3. META2_REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGÍSTICA RELACIONADOS CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. META2_PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.30
5. META2_PRESTAR SERVICIOS DE ACCESO A ESPACIOS DE DIVULGACION EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.91		0.00		0.00		0.00		100.00	59.09	1.77
6. META3_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE QUE FOMENTEN EL USO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS PRIVADOS	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57	24.57	0.00		0.00		12.72		0.00		0.00		11.84		100.00	75.44	2.07
7. META3_PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00		0.00		95.00		0.00		0.00		0.00		100.00	5.00	0.14
8. META3_PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS QUE REQUIERA ORGANIZAR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD RELACIONADOS CON LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. META3_PRESTAR SERVICIOS DE ACCESO A ESPACIOS DE DIVULGACION EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIO	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.38
10. META4_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA APOYAR ES TEMAS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y/O FINANCIEROS A LOS PROYECTOS DE MOVILIDAD	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		41.00		0.00		0.00		0.00		100.00	59.00	6.49
11. META5_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE QUE FOMENTEN EL USO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS PRIVADOS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00		0.00		26.50		0.00		0.00		12.50		100.00	61.00	6.71
12. META6_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	14.04	0.00		0.00		12.28		0.00		0.00		12.28		100.00	75.44	1.36
13. META6_PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7588 24 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y																															
14. META6_PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS QUE REQUIERA ORGANIZAR LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
15. META6_PRESTAR SERVICIOS DE ACCESO A ESPACIOS DE DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		66.67		0.00		0.00				100.00	33.30	0.60			
16. META6_PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00		0.00				100.00	100.00	1.80			
17. META6_REALIZAR LA EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE TRANSPORTE DE PRIMERA Y ULTIMA MILLA O COMPLEMENTARIO AL SISTEMA INTEGRADO DE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00			
18. META7_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORME PARA APOYAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00		0.00		17.50		0.00		0.00		12.50		100.00	70.00	7.70			
19. META8_ACTUALIZACION DE LA CARACTERIZACION DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PERMANENTE EN LA CIUDAD Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MOVILIDAD ACCESIBLE	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		75.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00			
20. META9_CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES EN EL DESARROLLO LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00		0.00		16.79				0.00		13.21		100.00	70.00	1.54			
21. META9_PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
22. META9_PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS QUE REQUIERA ORGANIZAR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD RELACIONADOS CON LAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
23. META9_PRESTAR SERVICIOS DE ACCESO A ESPACIOS DE DIVULGACION EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		75.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	0.55			
24. META9_FORMULACION INICIAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO LOGISTICO COMO UNA MEDIDA DE ORDENAR EL TERRITORIO BOGOTA REGION EN UN MODELO OPERATIVO, FUNCIONAL, COMERCIAL, EMPRESARIAL,	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	1.10			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		44.01	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7589 20 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA SUBSECRETARIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
2. TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA DRJ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00		0.00		25.75		0.00		0.00		24.75		100.00	49.50	9.90
3. TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA DNC	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
4. TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA DC	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
5. RECAUDO OBLIGACIONES A FAVOR DE LA SDM	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.90		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7593 24 Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FALLAR LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	16.50	
2.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FALLAR LOS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	16.50	
3.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FALLAR LOS RECURSOS DE APELACIÓN O QUEJA PRESENTADOS POR LOS SANCIONADOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	17.00	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7595 18 Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1.	DESARROLLAR	LAS	ACCIONES	NECESARIAS	PARA	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	16.50
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN CONSTANTE CON LA CIUDADANÍA.																																	
2.	DESARROLLAR	LAS	ACCIONES	NECESARIAS	PARA	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	17.00
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CIUDADANA																																	
3.	DESARROLLAR	LAS	ACCIONES	NECESARIAS	PARA	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	16.50
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE CONSULTA Y COGESTIÓN PARTICIPATIVA																																	
Total ponderación vertical					100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																											50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7596 24 Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1_EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONTEXTOS ESTRUCTURALES Y SITUACIONALES DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, SOBRE VARIABLES DETERMINADAS	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00		0.00		23.00		0.00		0.00		16.00		100.00	61.00	20.13
2.	META 2_EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA APOYAR EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE Y ESTUDIOS DEL SECTOR	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00		0.00		26.00		0.00		0.00		29.00		100.00	45.00	14.85
3.	META 3_EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00		0.00		53.80		0.00		0.00		15.00		100.00	31.20	10.61
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							45.59			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7653 27 Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ENTIDAD.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	25.00
2.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OPTIMIZAR LOS TRÁMITES DE LA ENTIDAD Y DE ESTA MENRA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE RACIONALIACIÓN DE TRÁMITES.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00		0.00		24.00		0.00		0.00		26.00		100.00	50.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7907 20 Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022


AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1- DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	16.50
2. META 1 - SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A VÍCTIMAS, A PARTIR DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEFINIDAS PARA EL MISMO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	12.50
3. META 1 - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y LÍNEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y METODOLÓGICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	8.25
4. META 2 - DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS Y PROBLEMÁTICAS VINCULADAS CON LOS IMPACTOS DE LOS SINIESTROS VIALES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.75		

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7837 Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

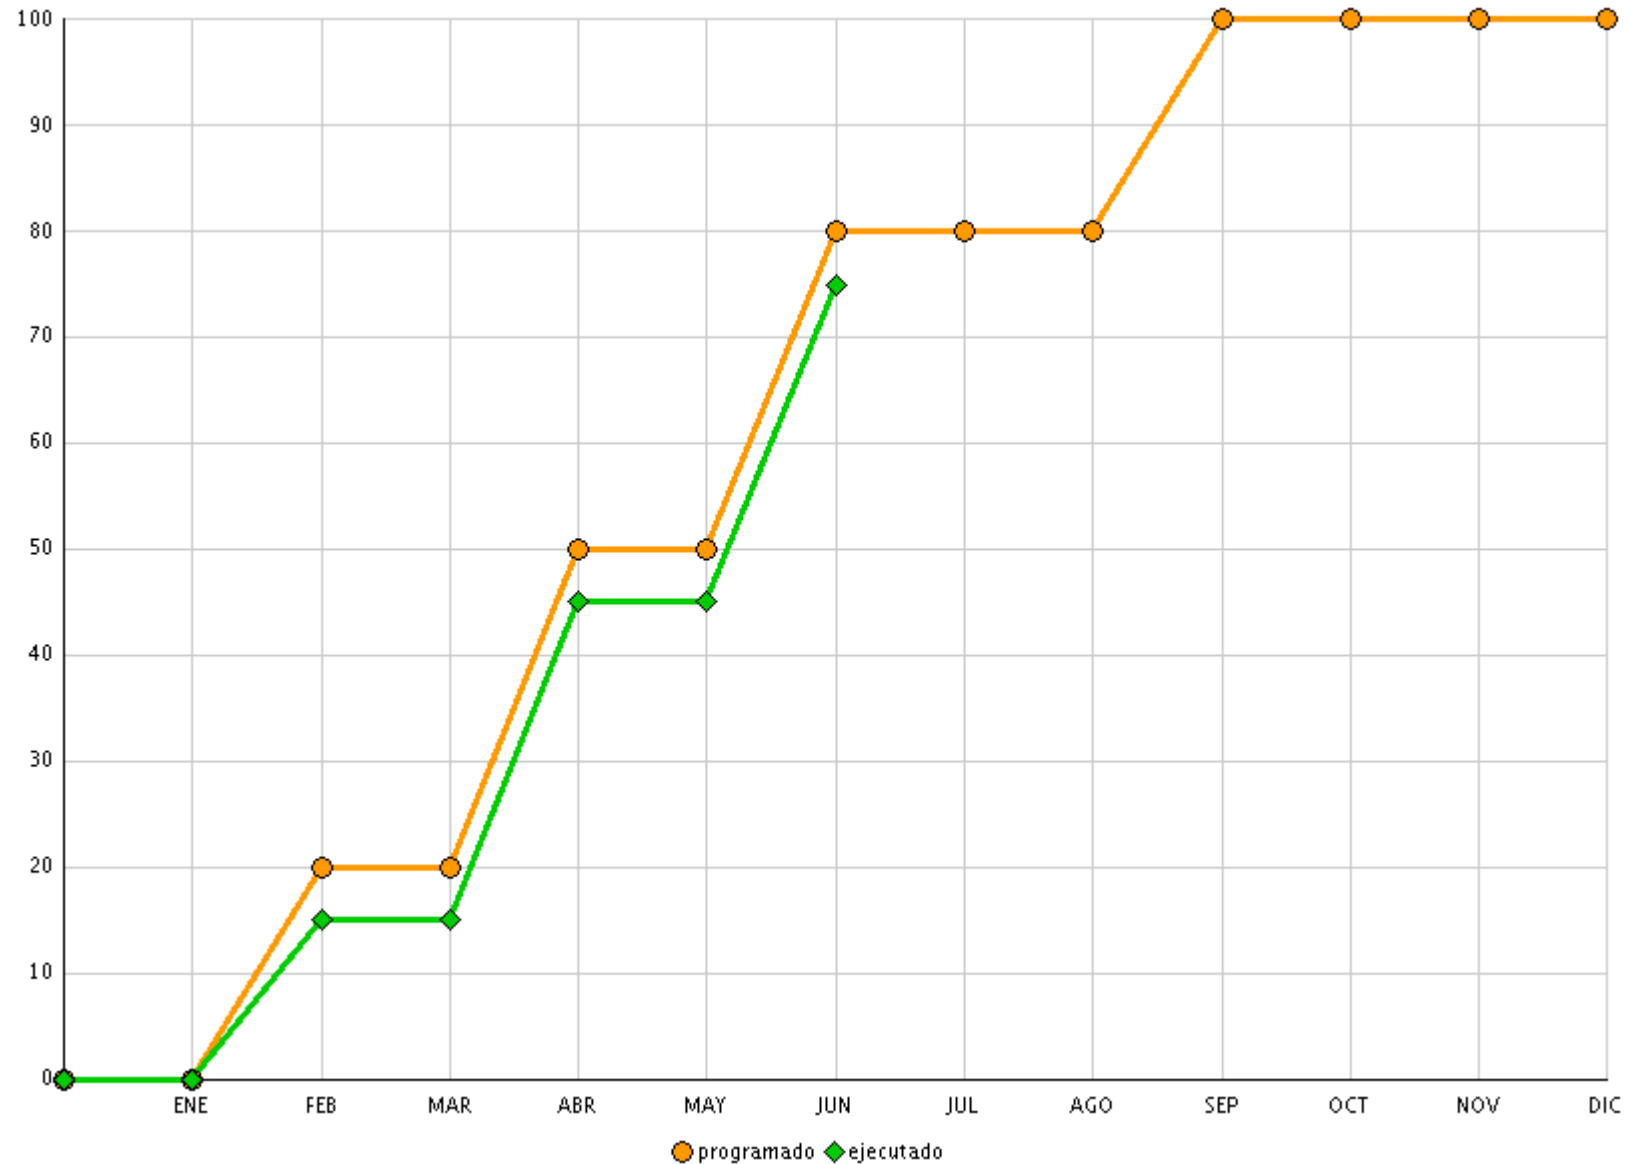


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	20.00	20.00	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	15.00	15.00	45.00	45.00	75.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7842 Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá

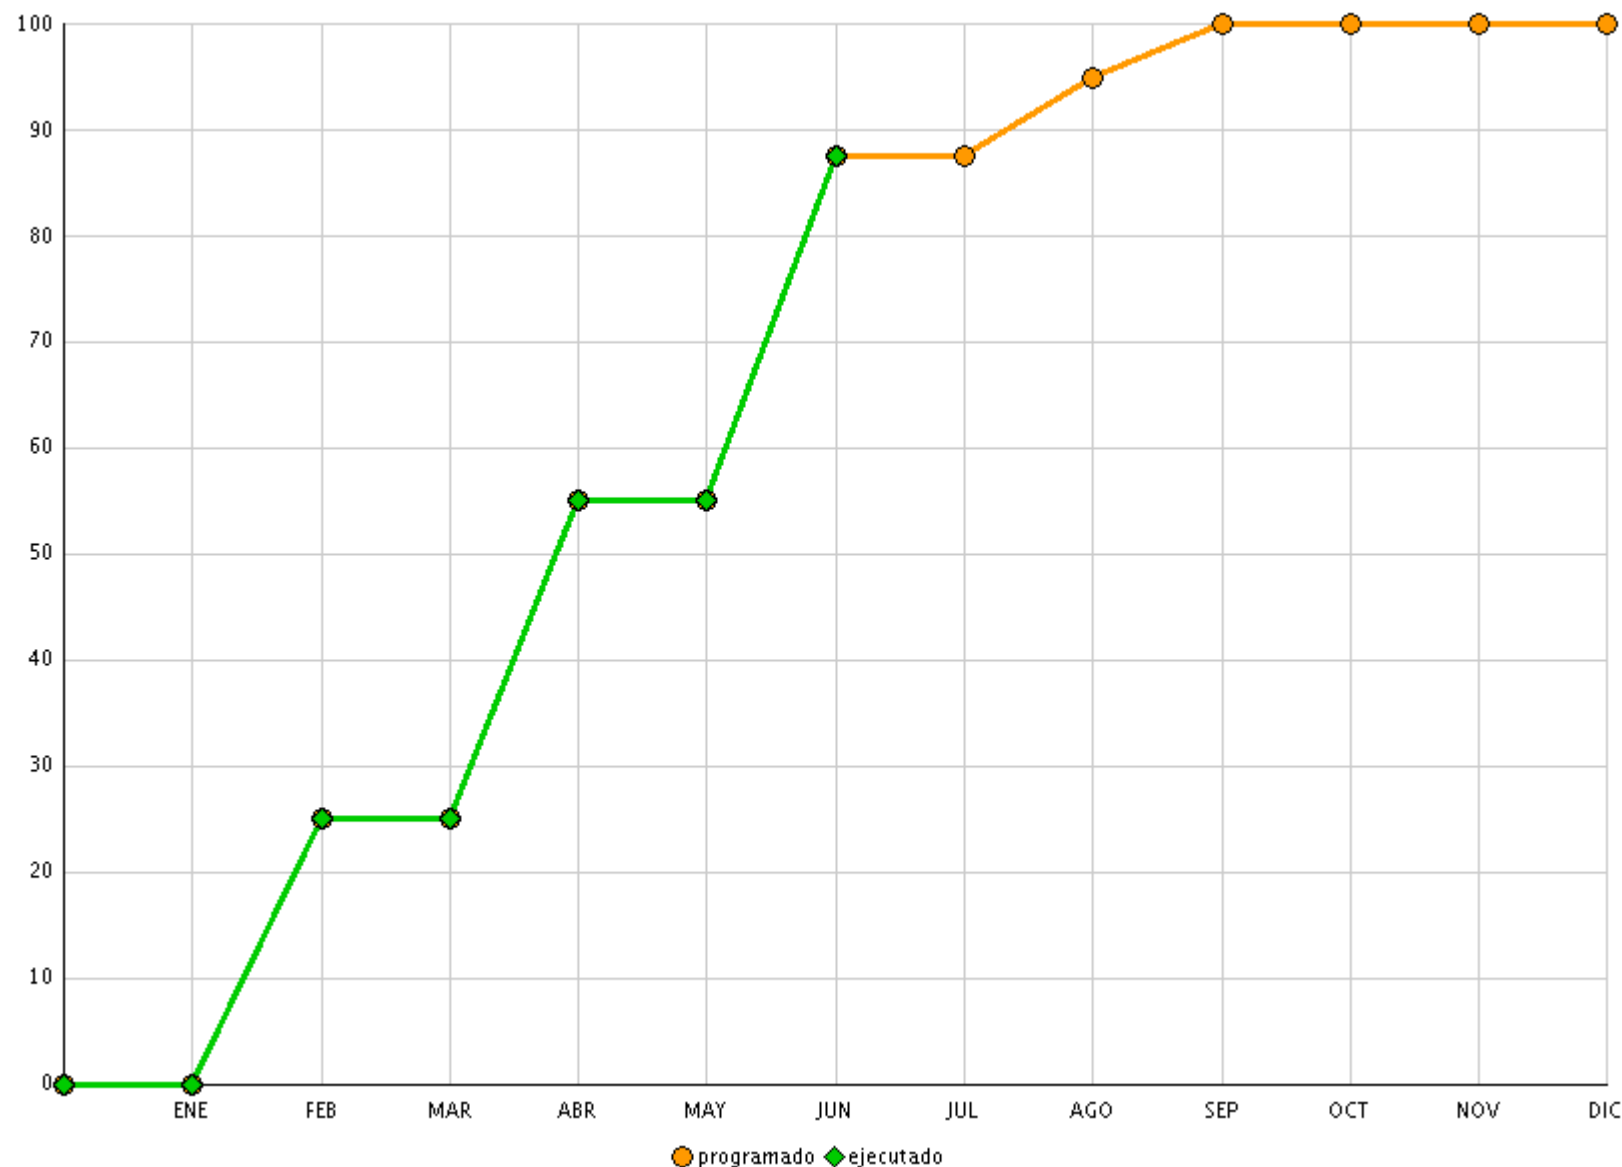


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	25.00	25.00	55.00	55.00	87.50	87.50	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	25.00	25.00	55.00	55.00	87.50						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7843 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

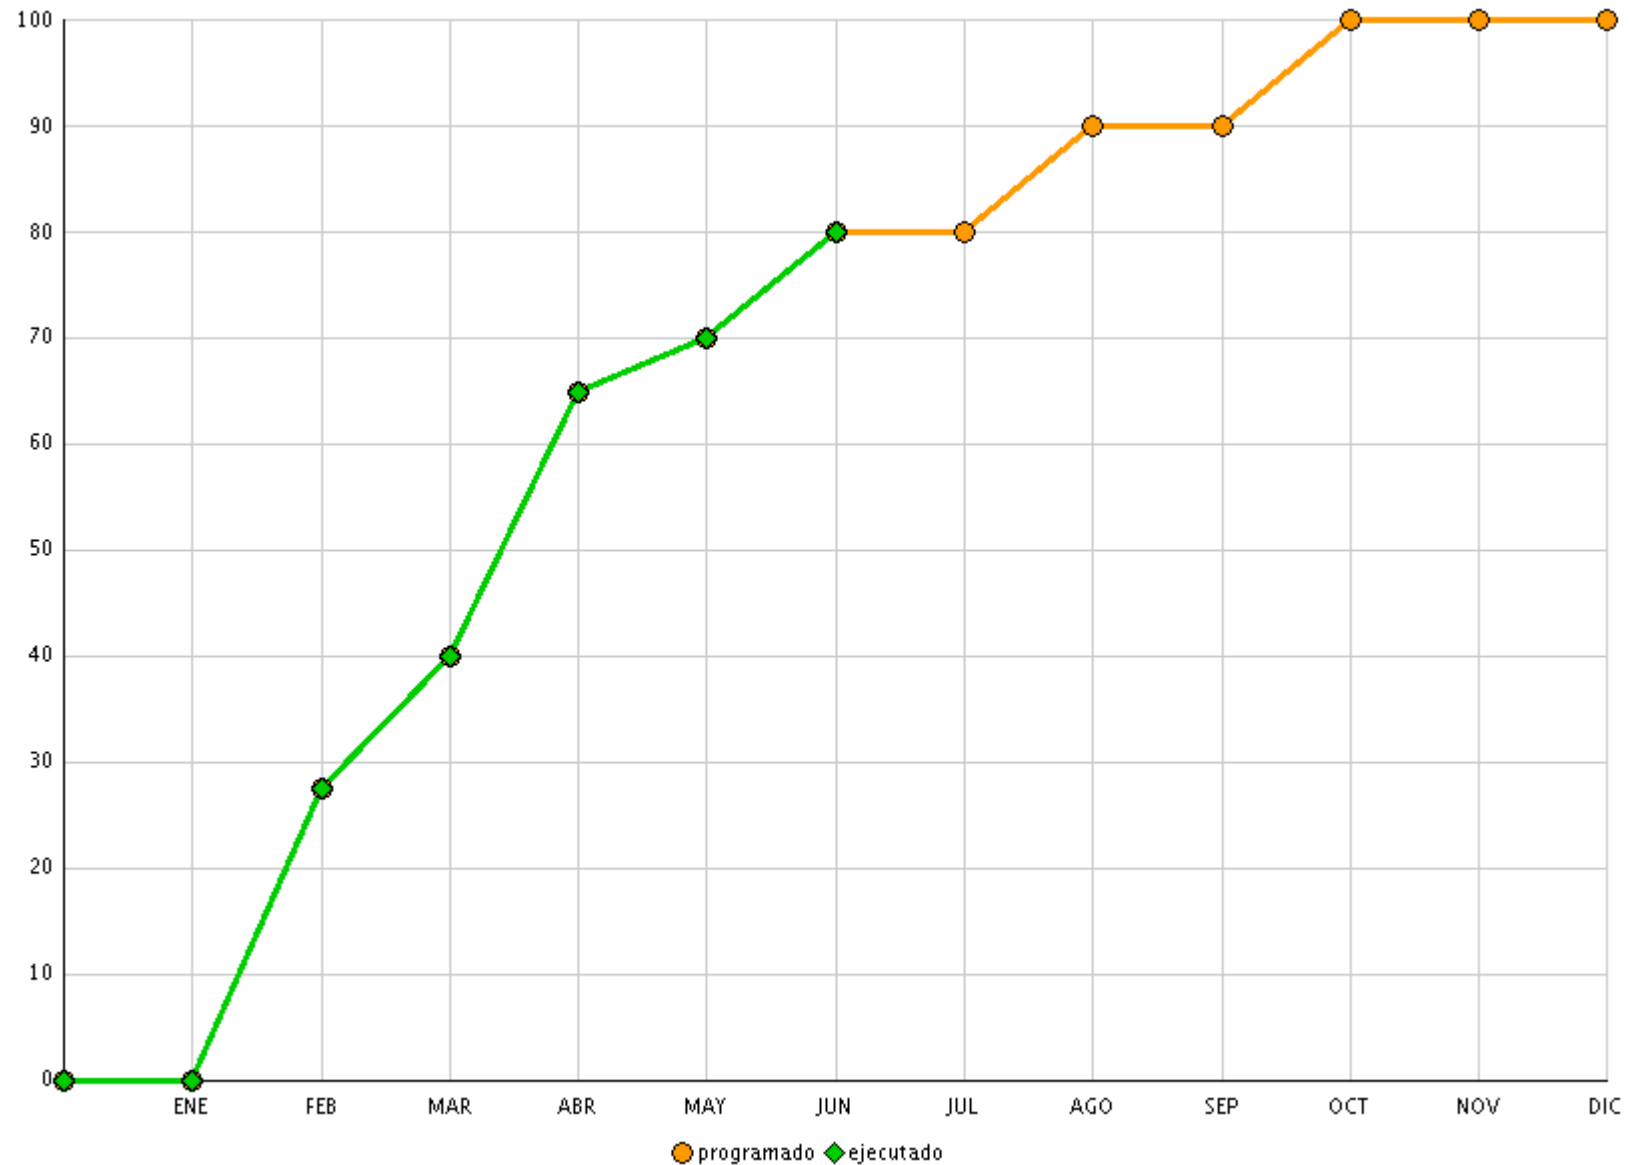


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	27.50	40.00	65.00	70.00	80.00	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	27.50	40.00	65.00	70.00	80.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7844 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

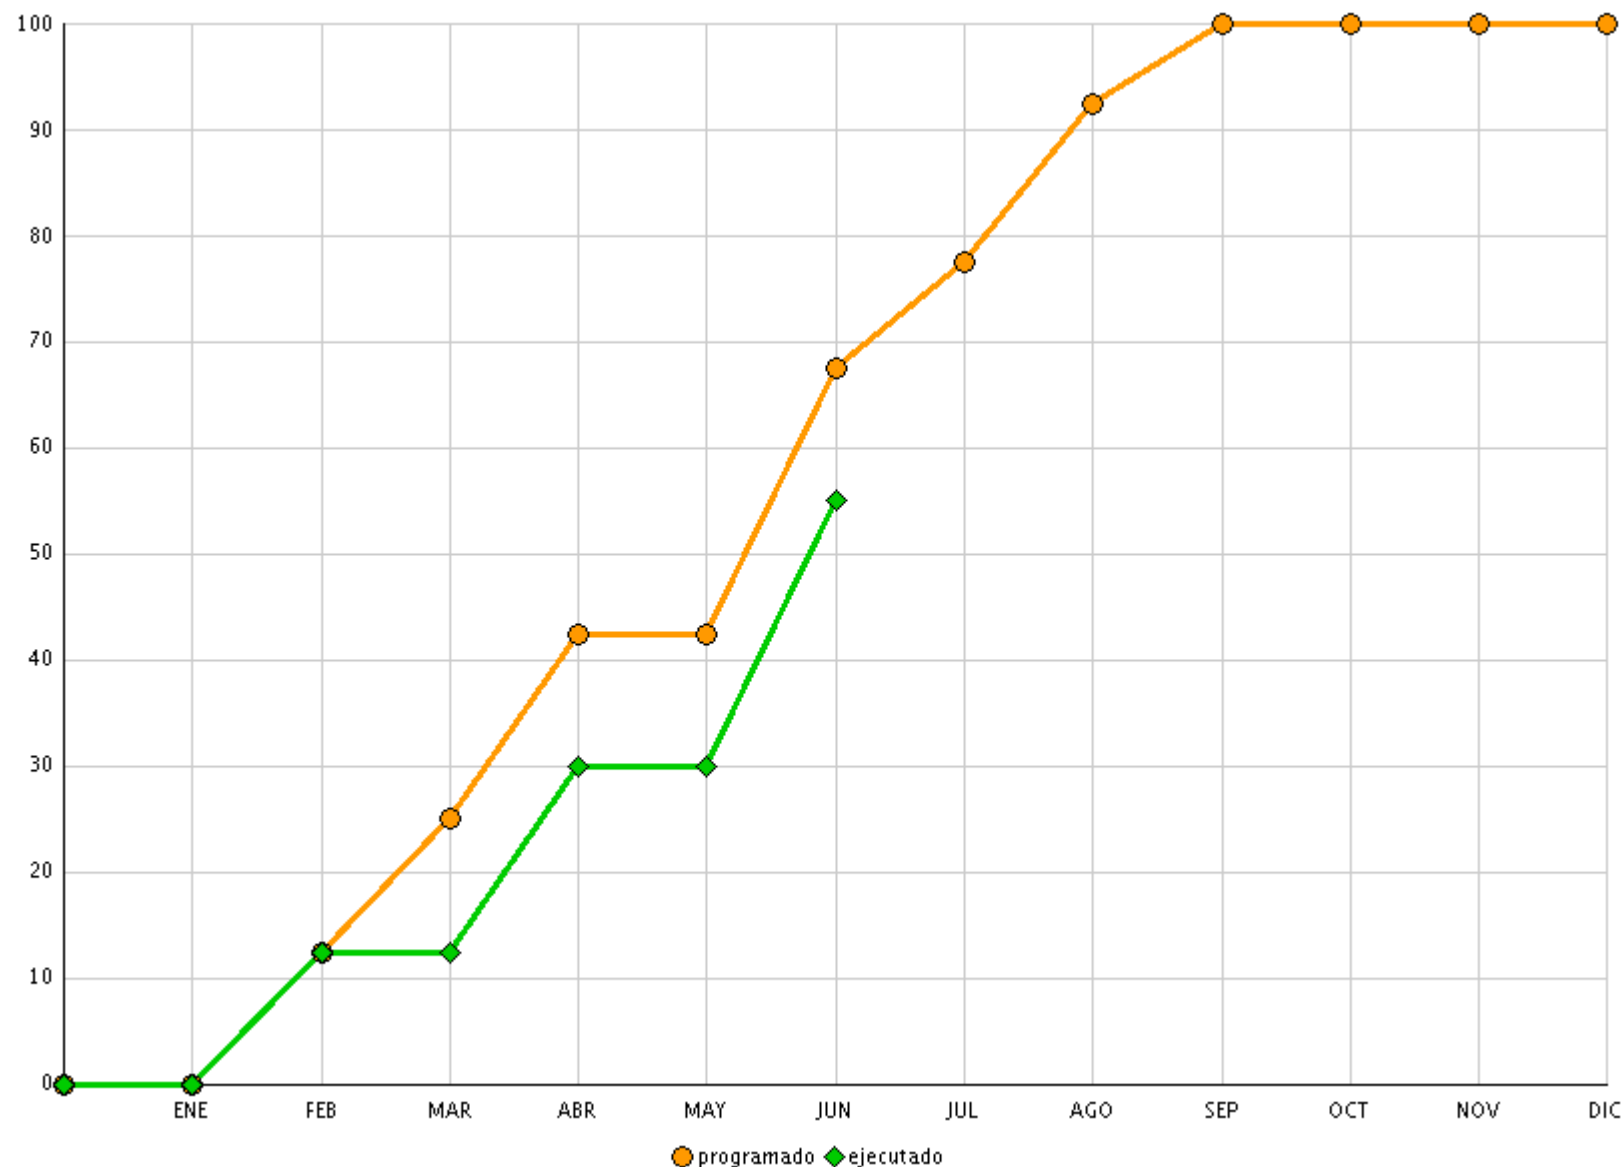


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	12.50	25.00	42.50	42.50	67.50	77.50	92.50	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	12.50	12.50	30.00	30.00	55.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7845 Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

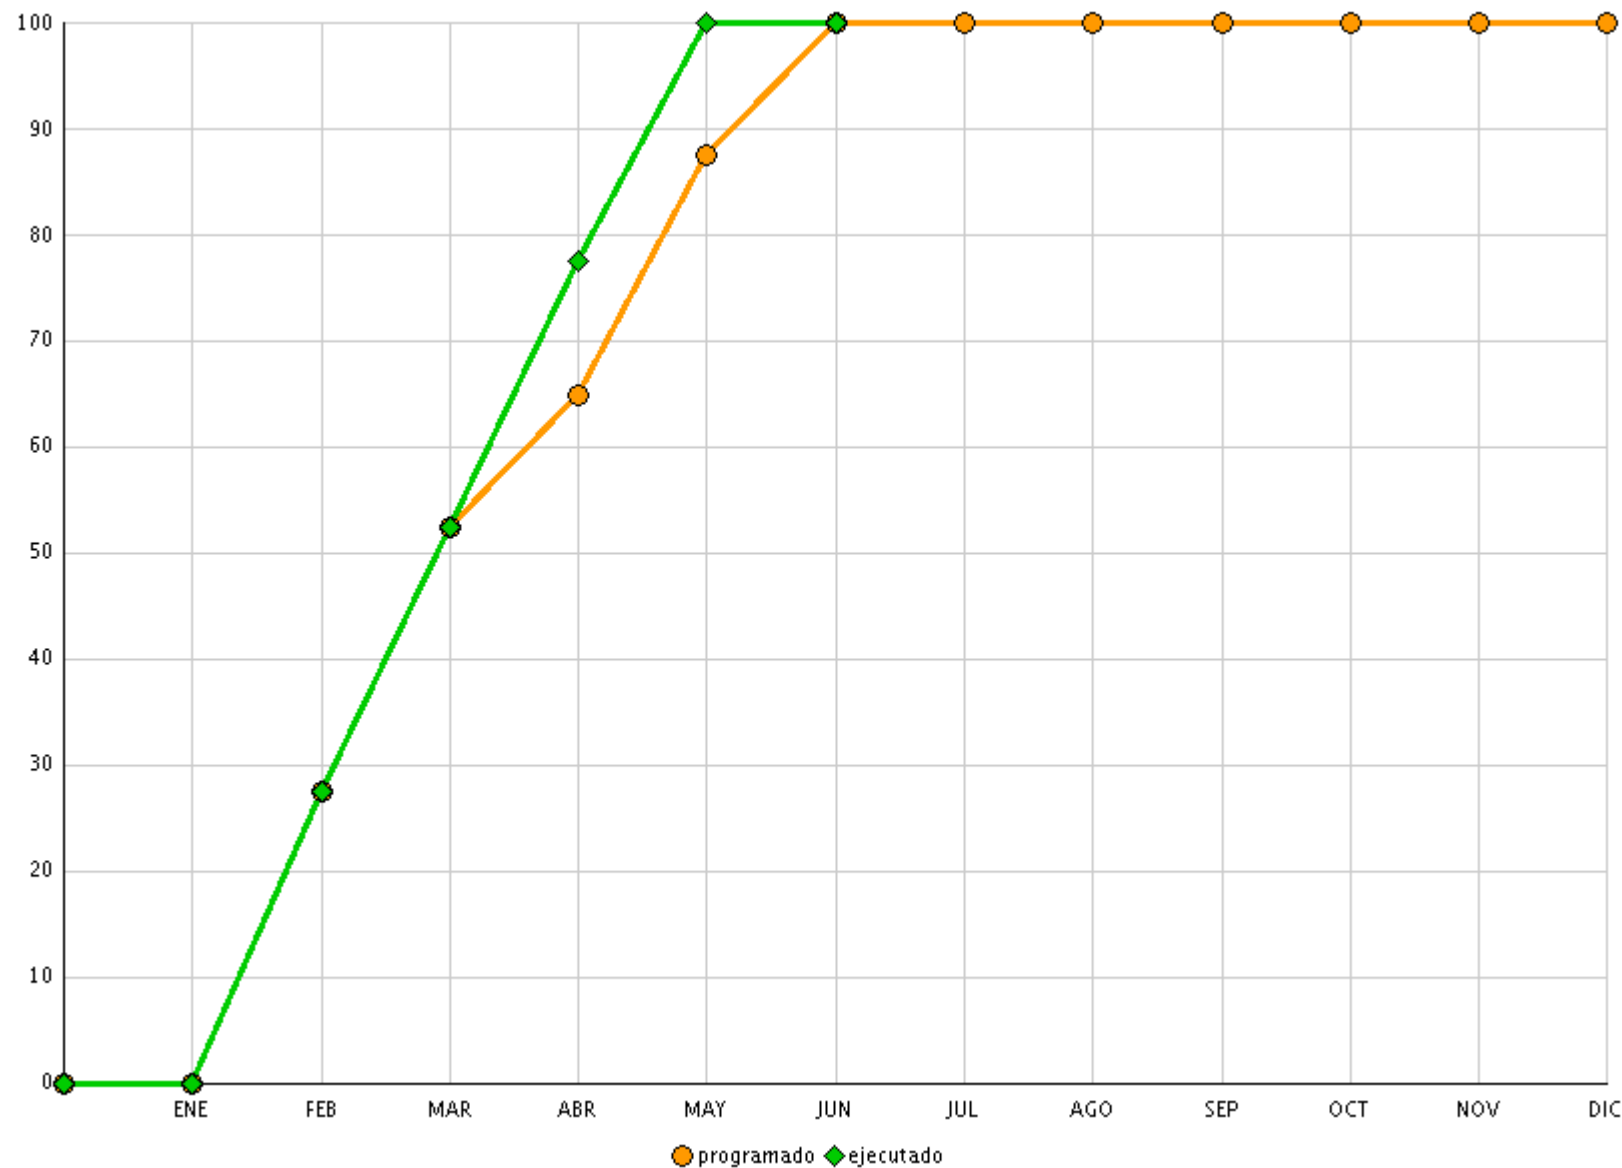


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	27.50	52.50	65.00	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	27.50	52.50	77.50	100.00	100.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7846 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

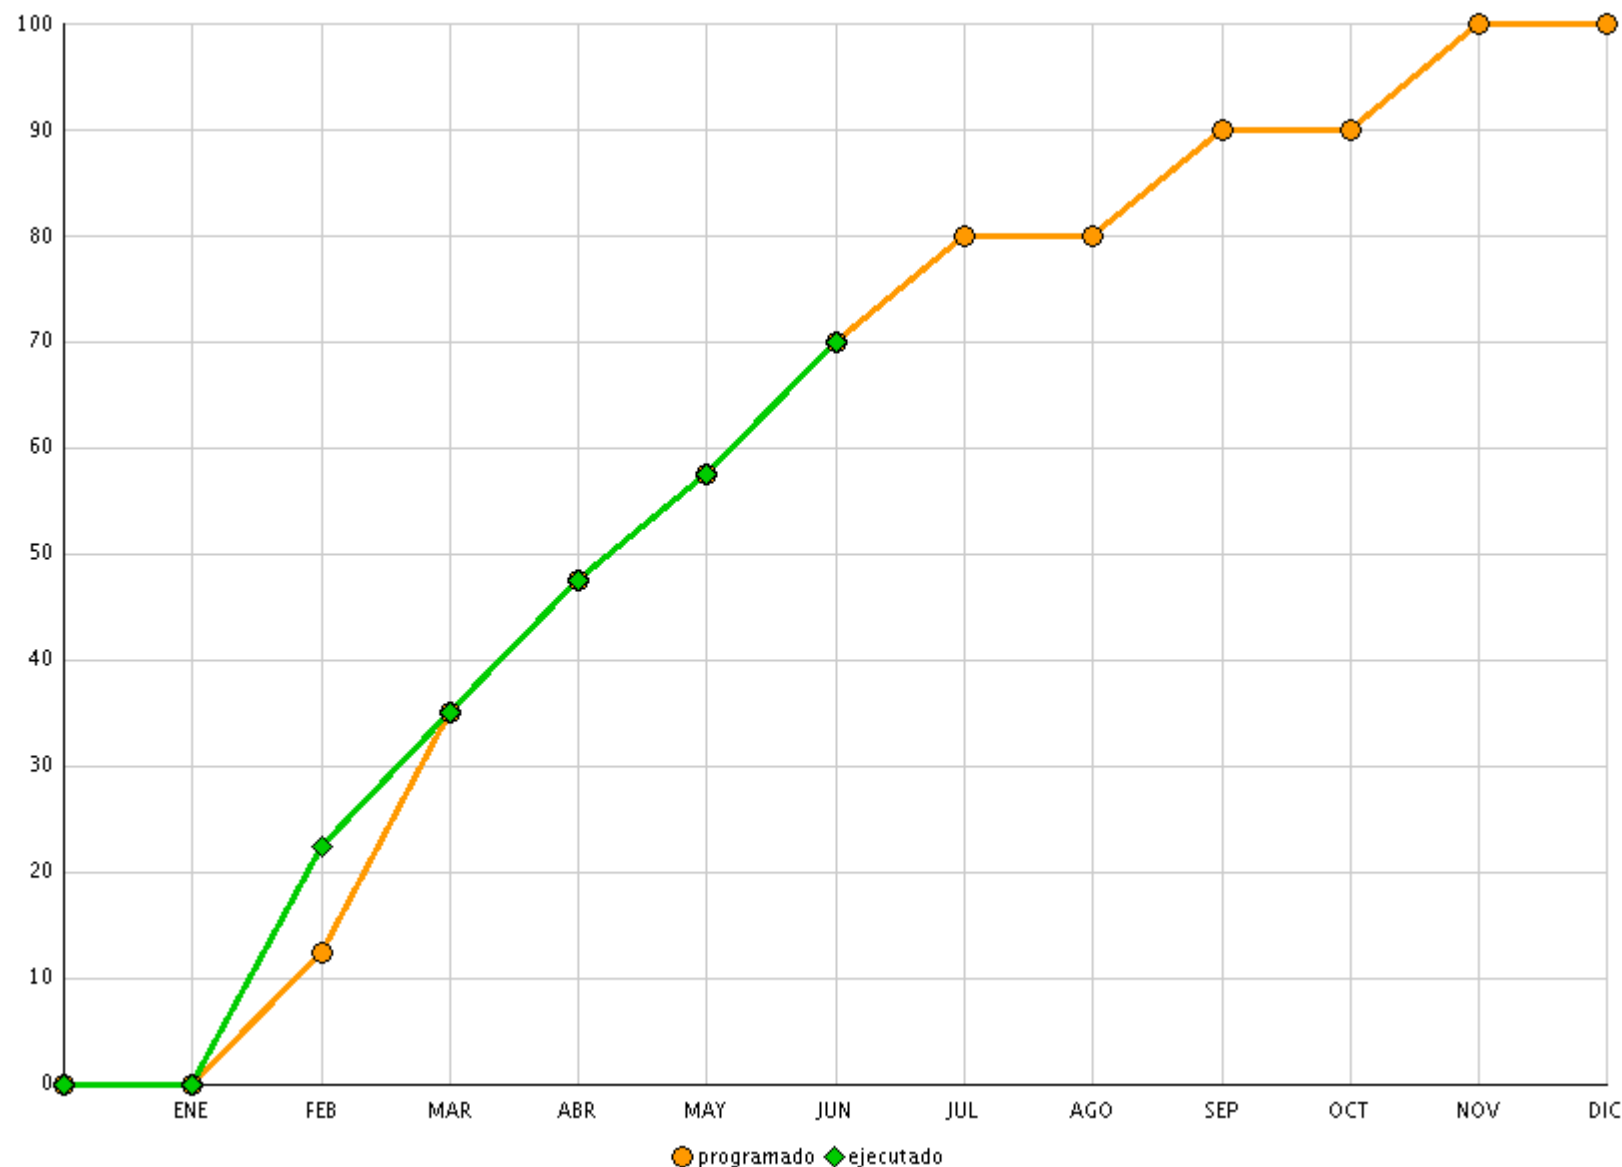


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	12.50	35.00	47.50	57.50	70.00	80.00	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	22.50	35.00	47.50	57.50	70.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7847 Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

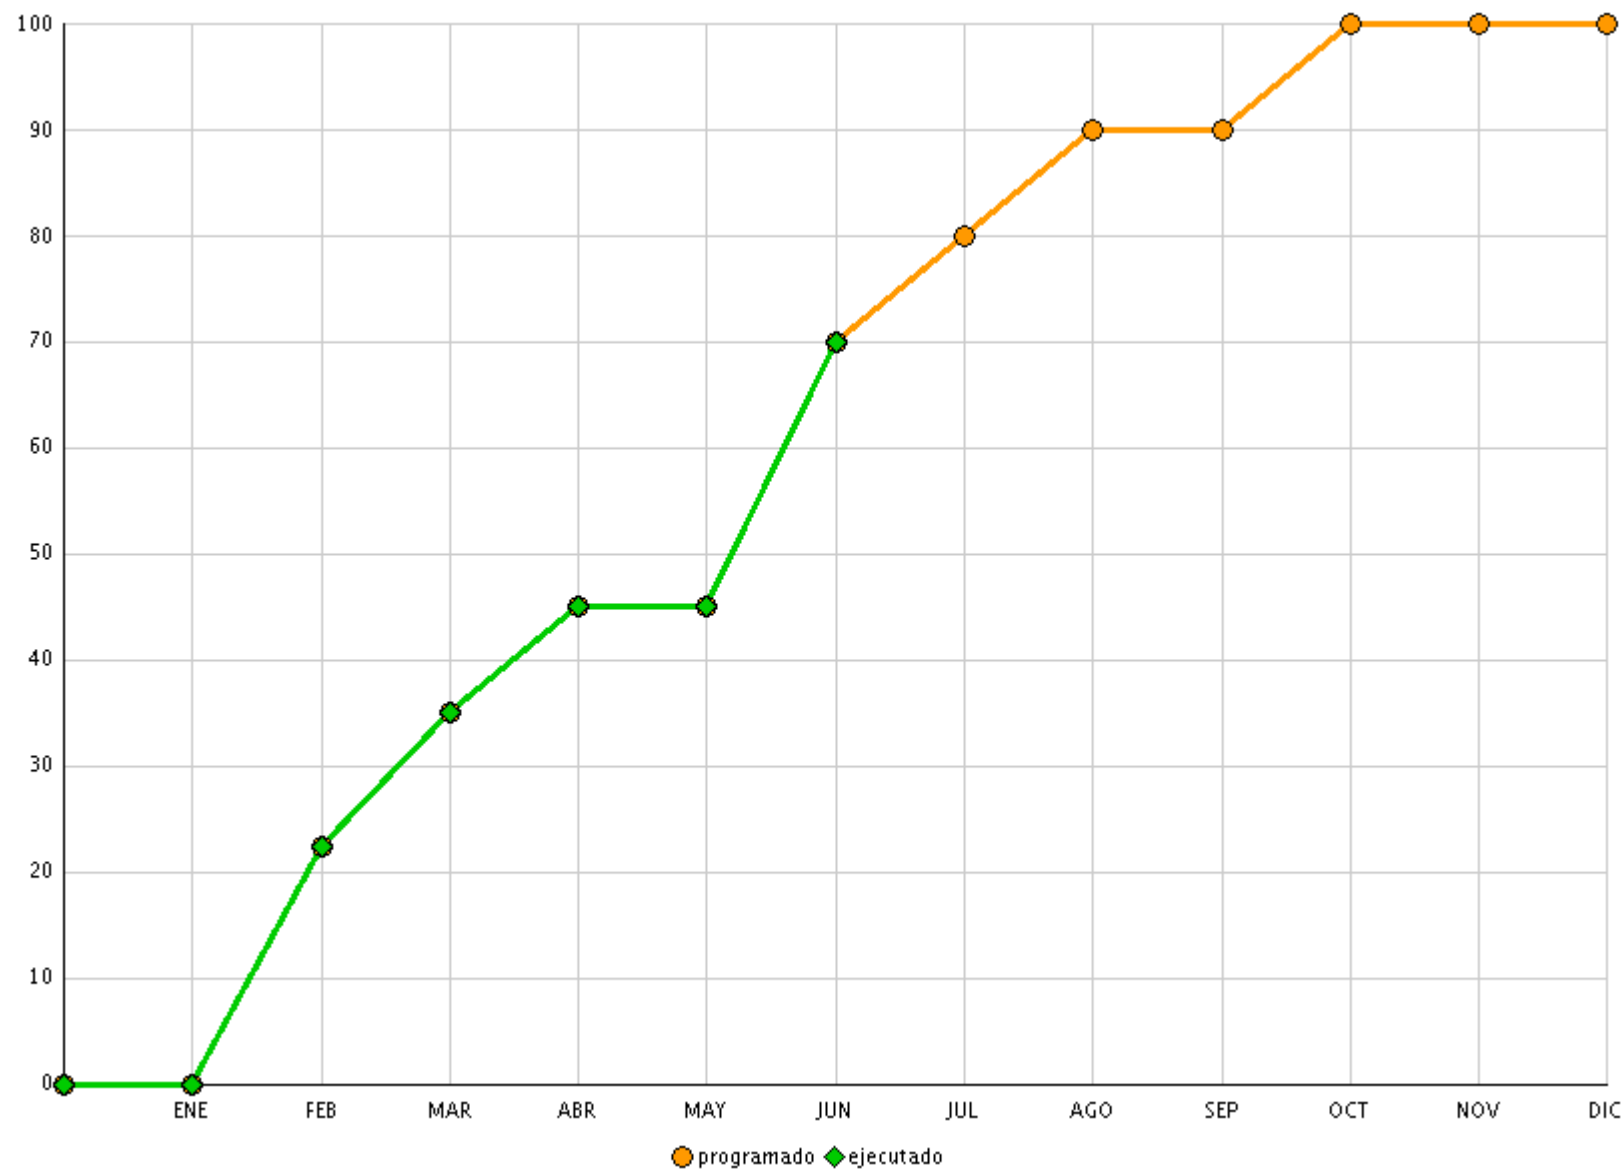


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	22.50	35.00	45.00	45.00	70.00	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	22.50	35.00	45.00	45.00	70.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7848 Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

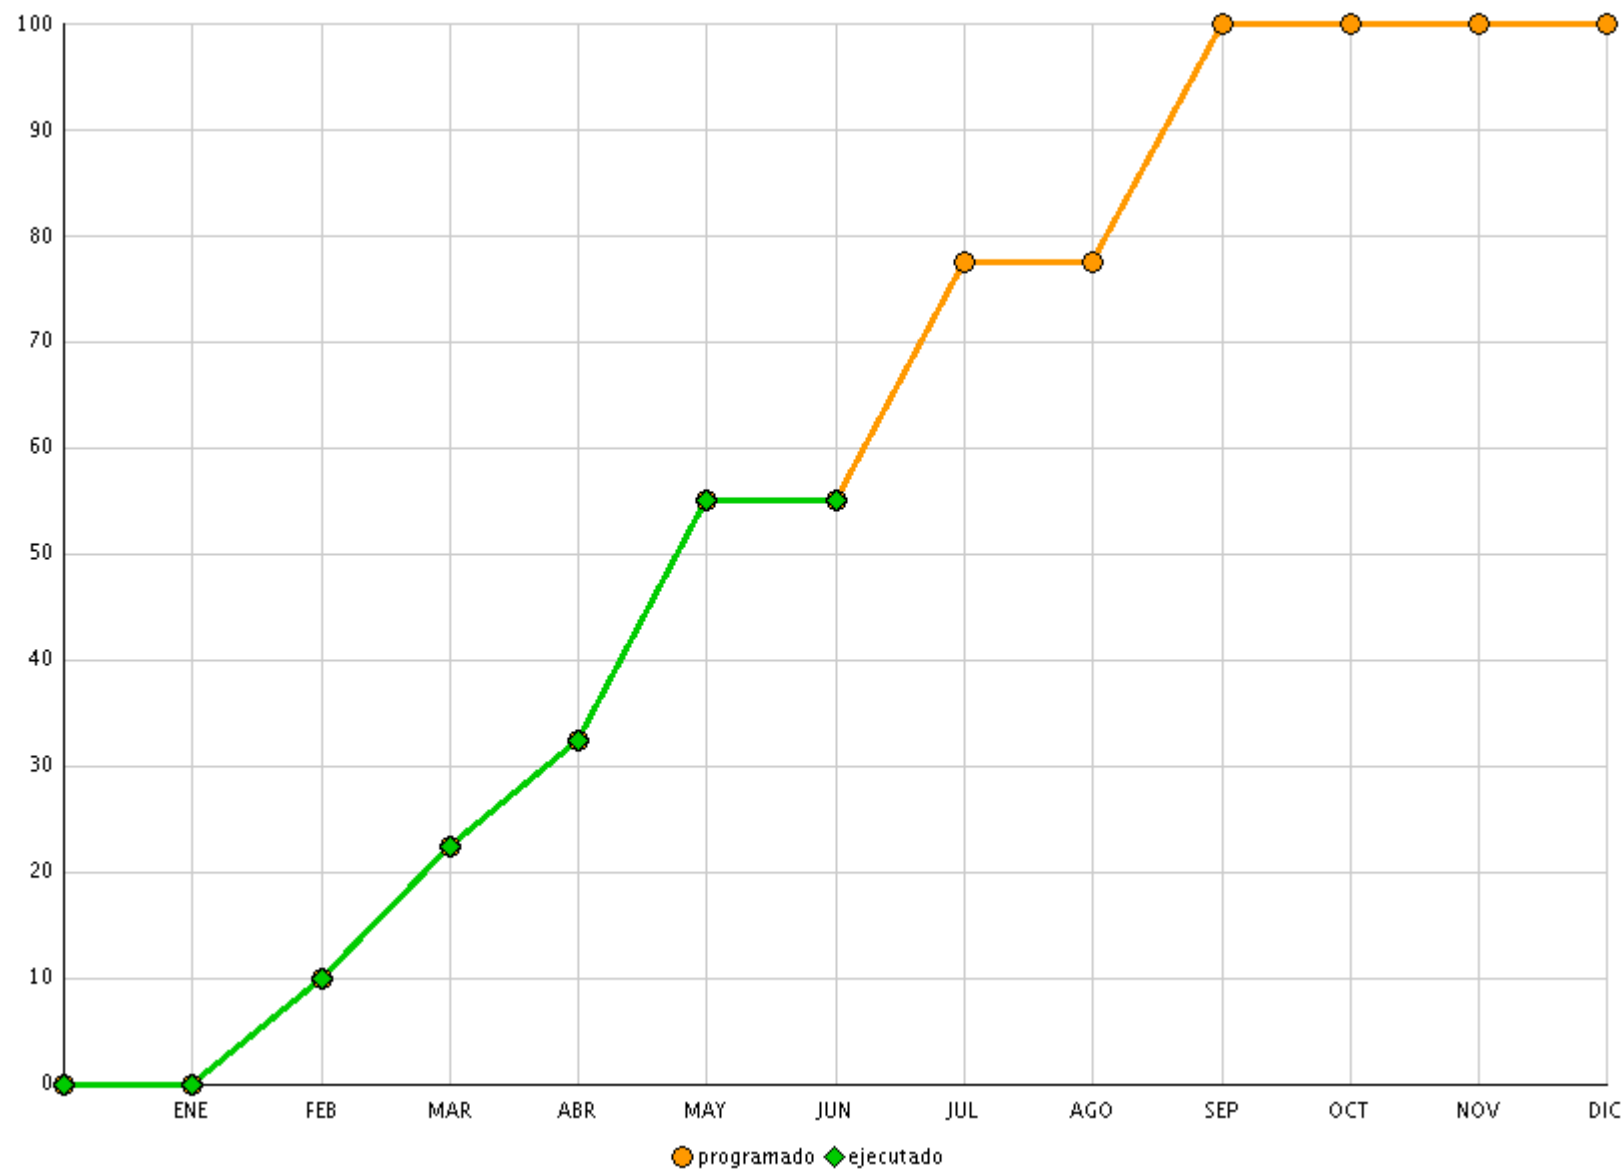


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.00	22.50	32.50	55.00	55.00	77.50	77.50	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	10.00	22.50	32.50	55.00	55.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7849 Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

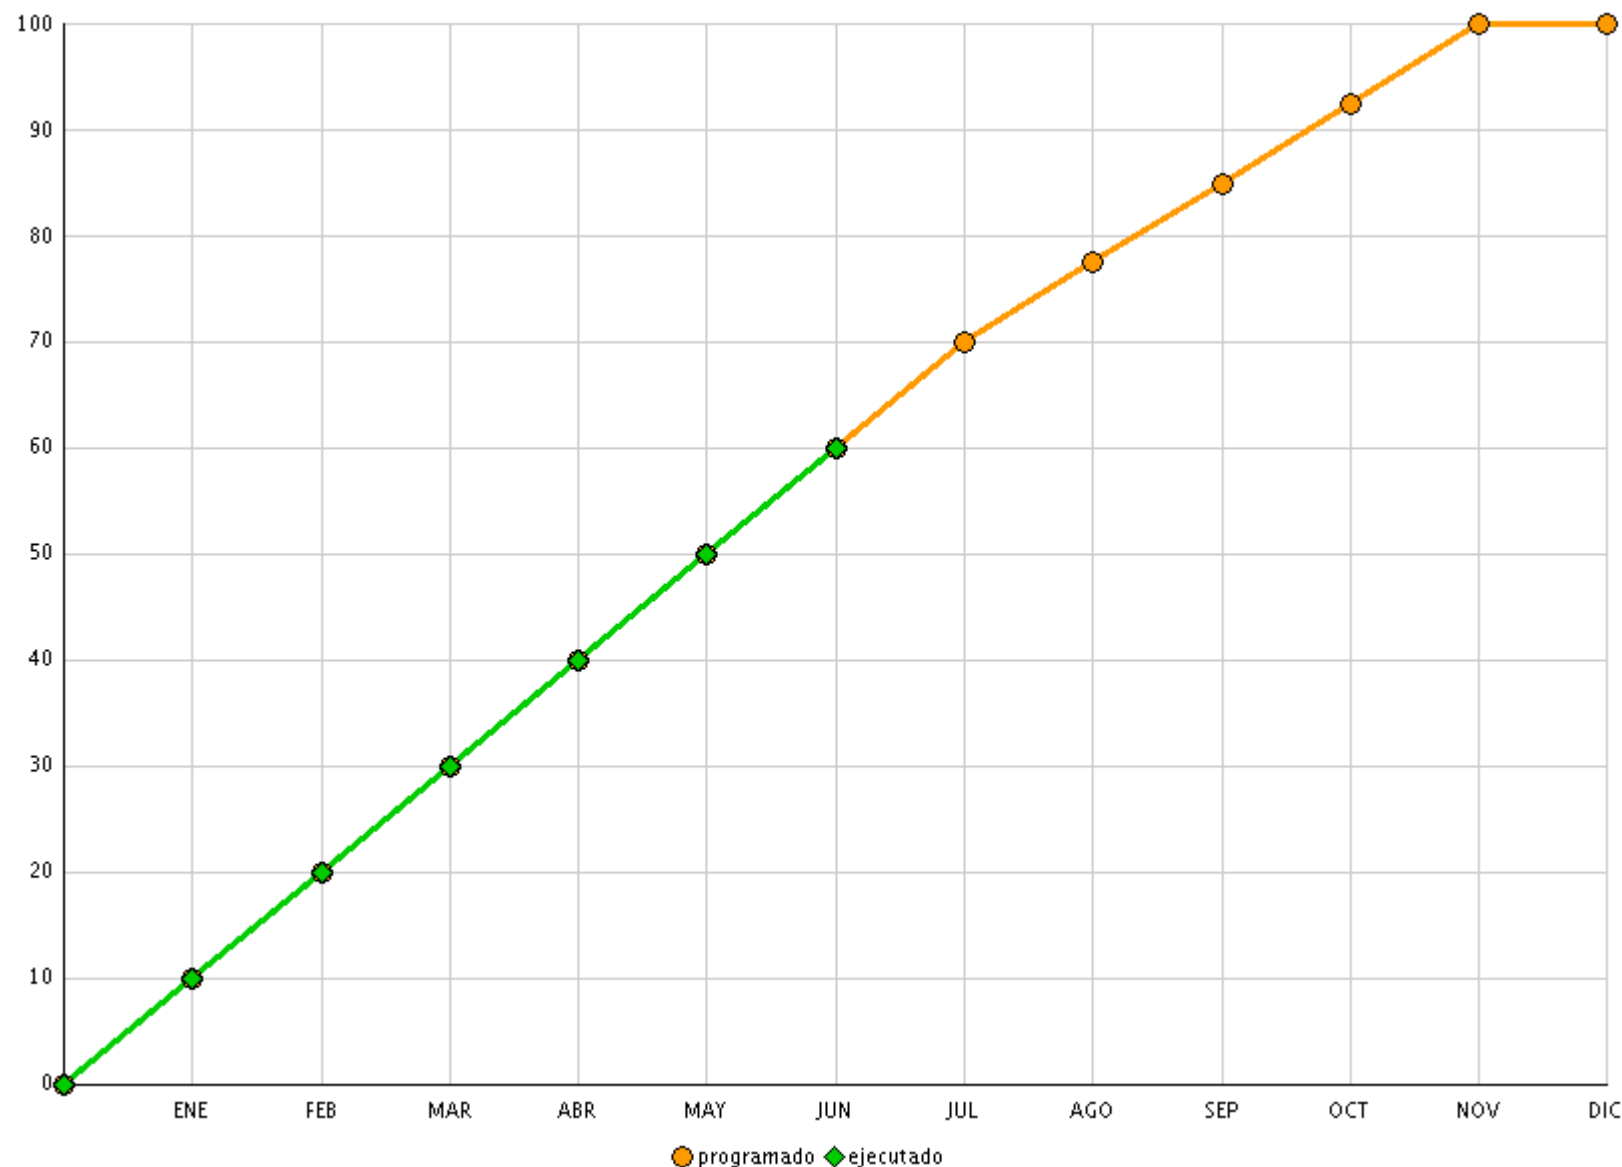


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	77.50	85.00	92.50	100.00	100.00
Ejecutado	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7863 Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

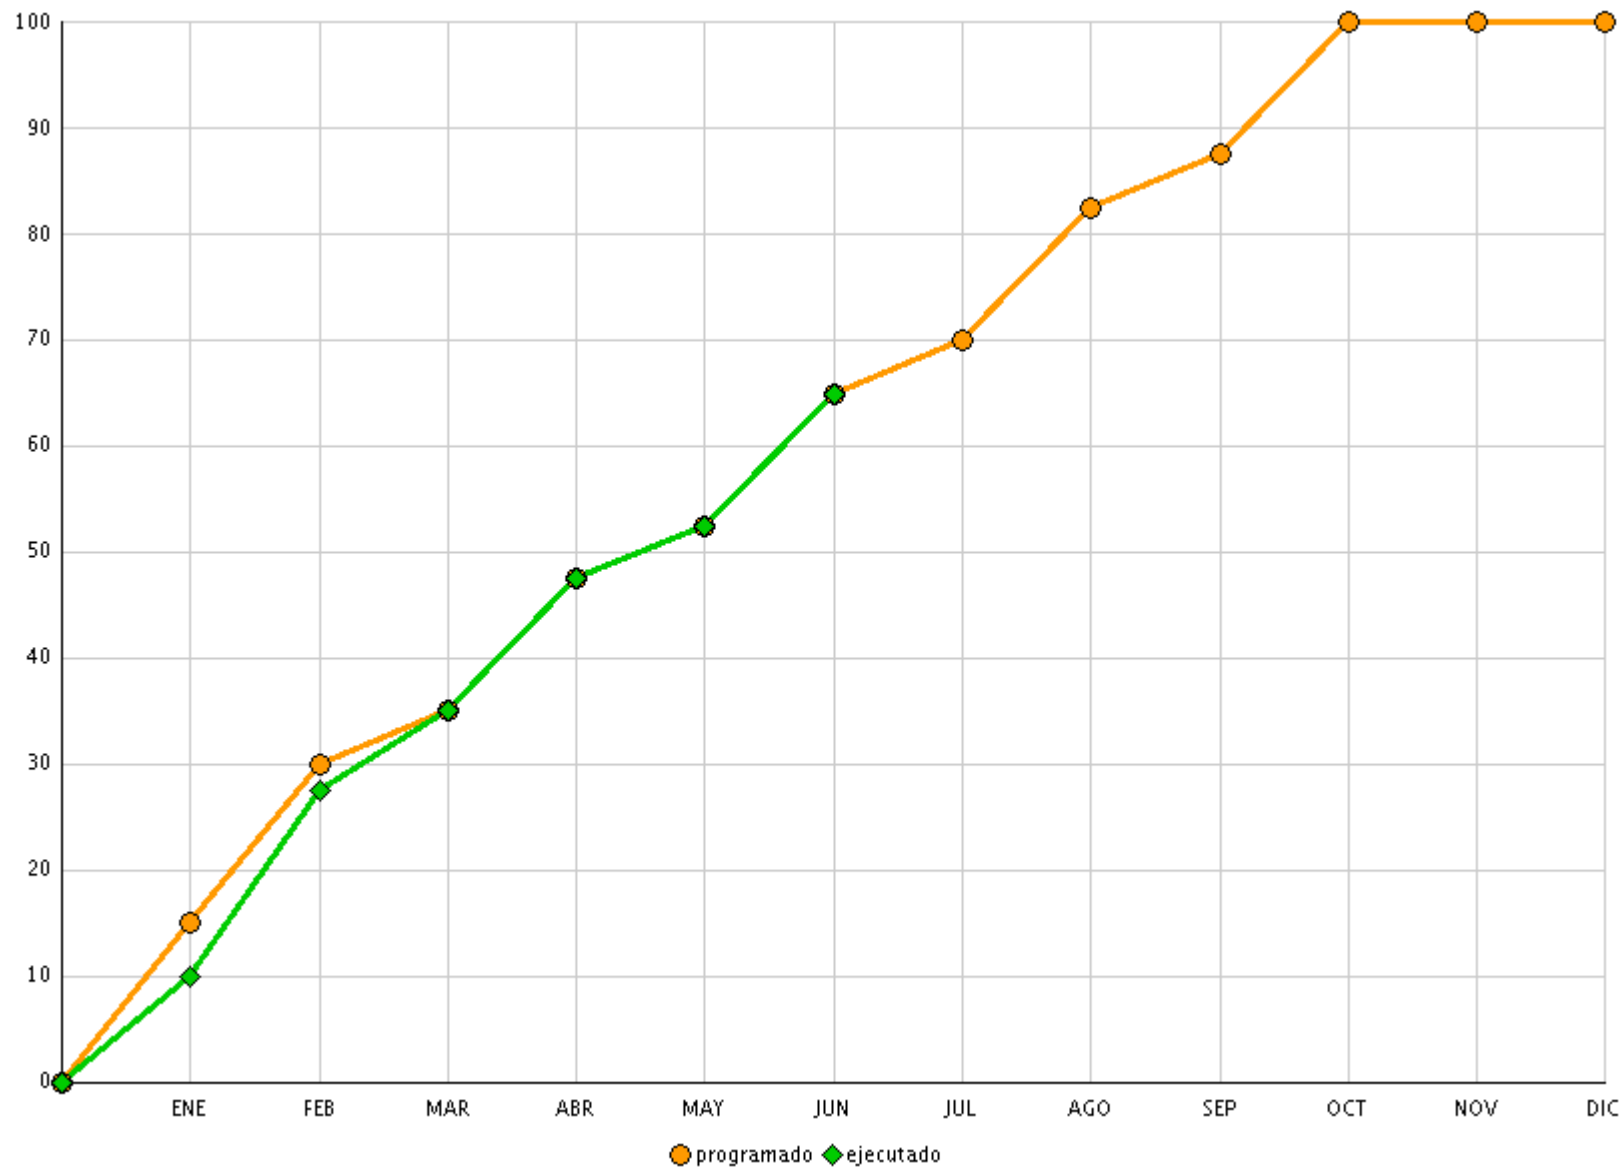


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	15.00	30.00	35.00	47.50	52.50	65.00	70.00	82.50	87.50	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	10.00	27.50	35.00	47.50	52.50	65.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7864 Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

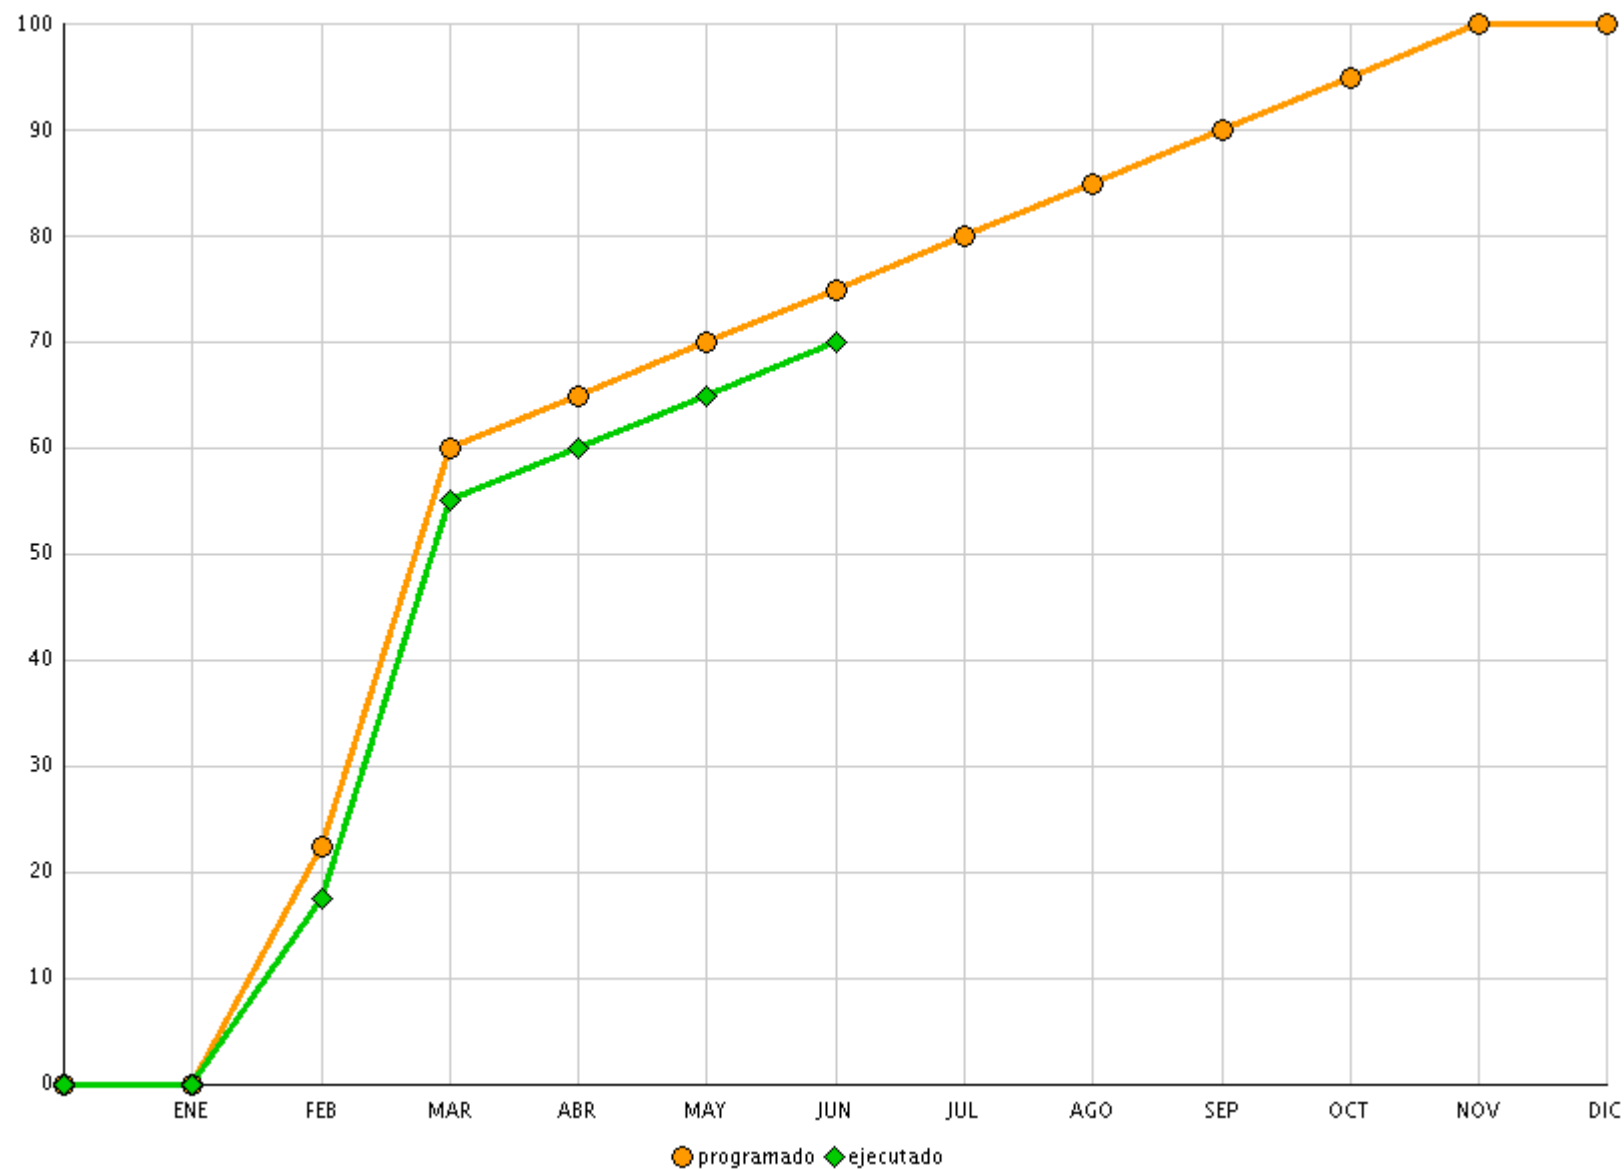


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	22.50	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	17.50	55.00	60.00	65.00	70.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7865 Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá

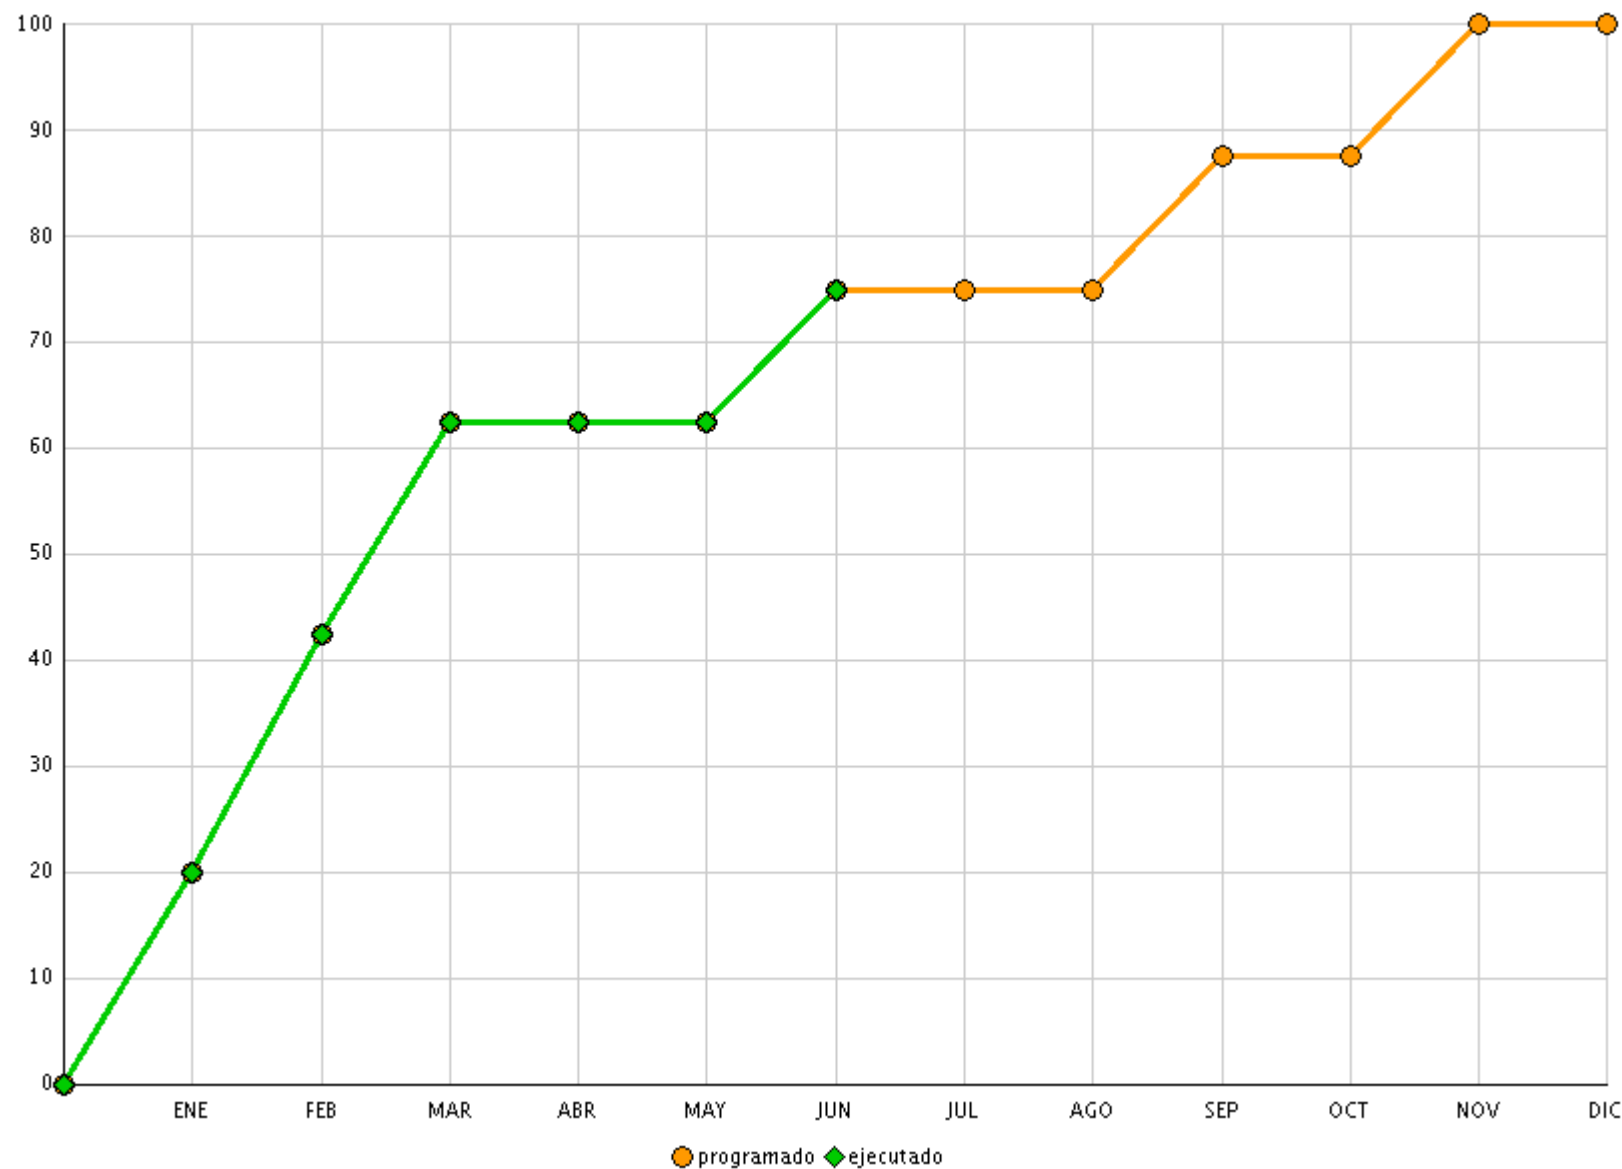


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	20.00	42.50	62.50	62.50	62.50	75.00	75.00	75.00	87.50	87.50	100.00	100.00
Ejecutado	20.00	42.50	62.50	62.50	62.50	75.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7874 Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

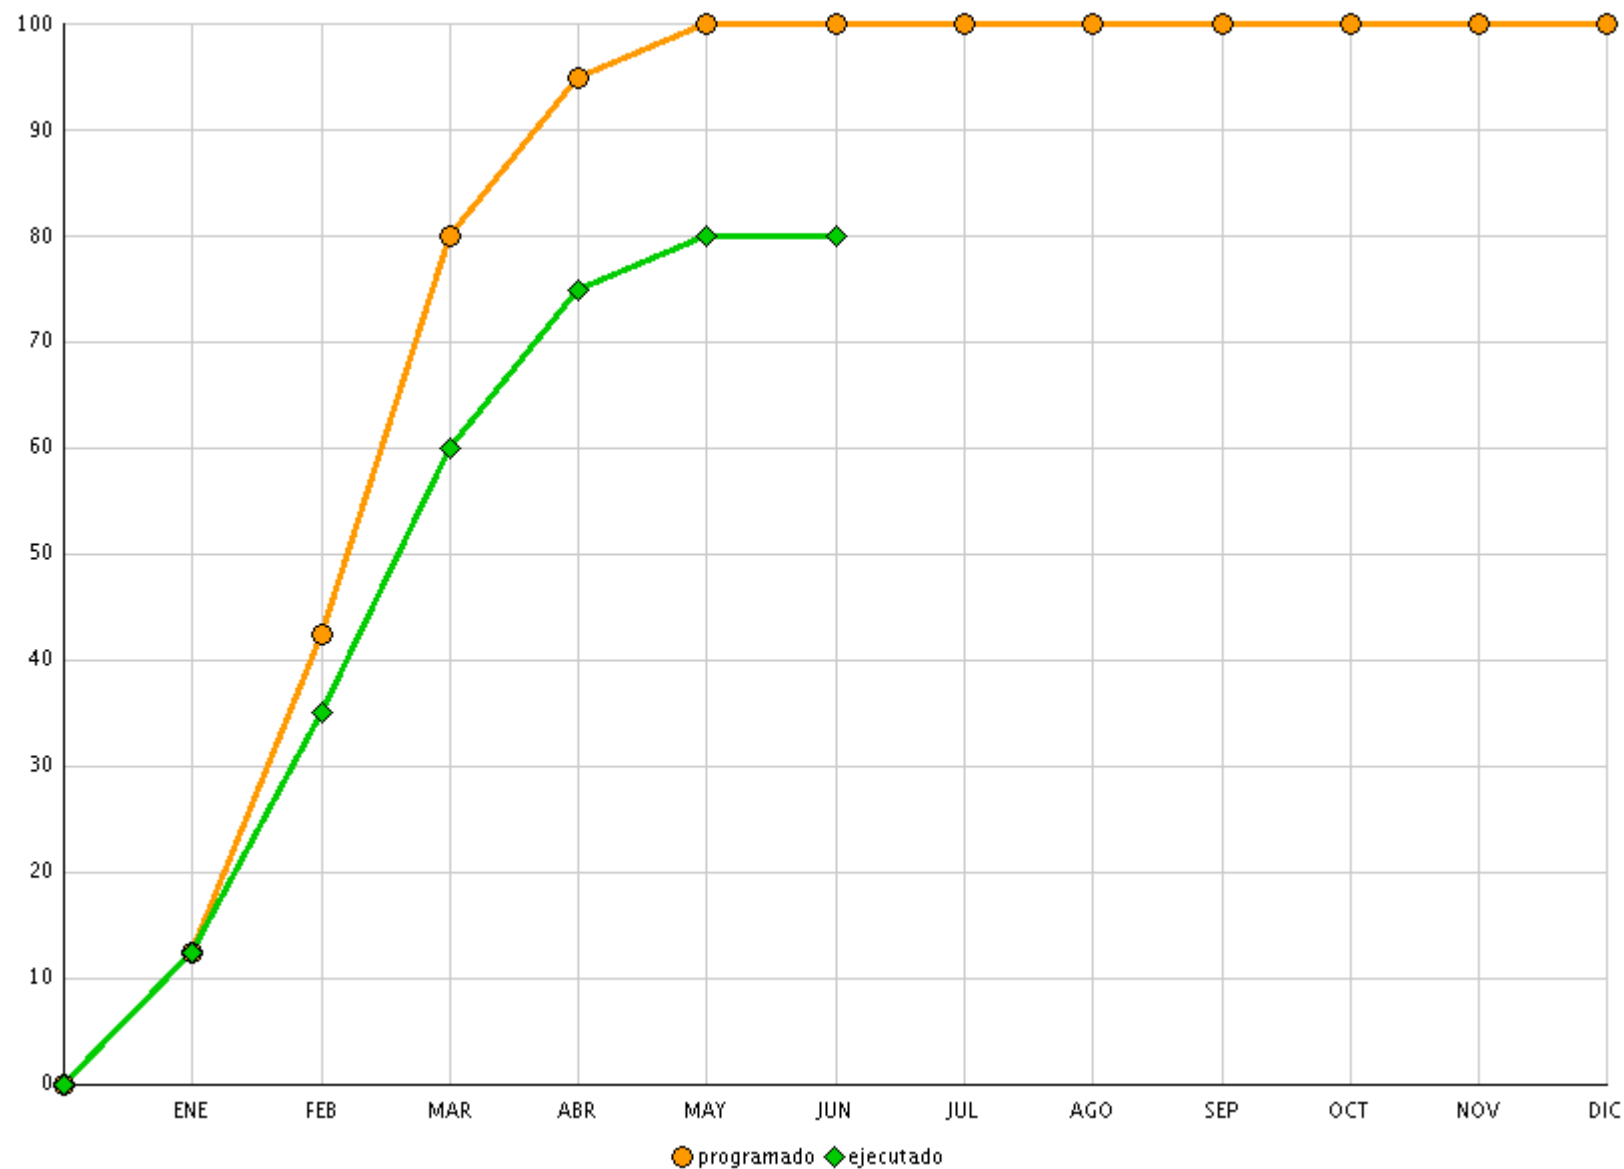


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	12.50	42.50	80.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	12.50	35.00	60.00	75.00	80.00	80.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7906 Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

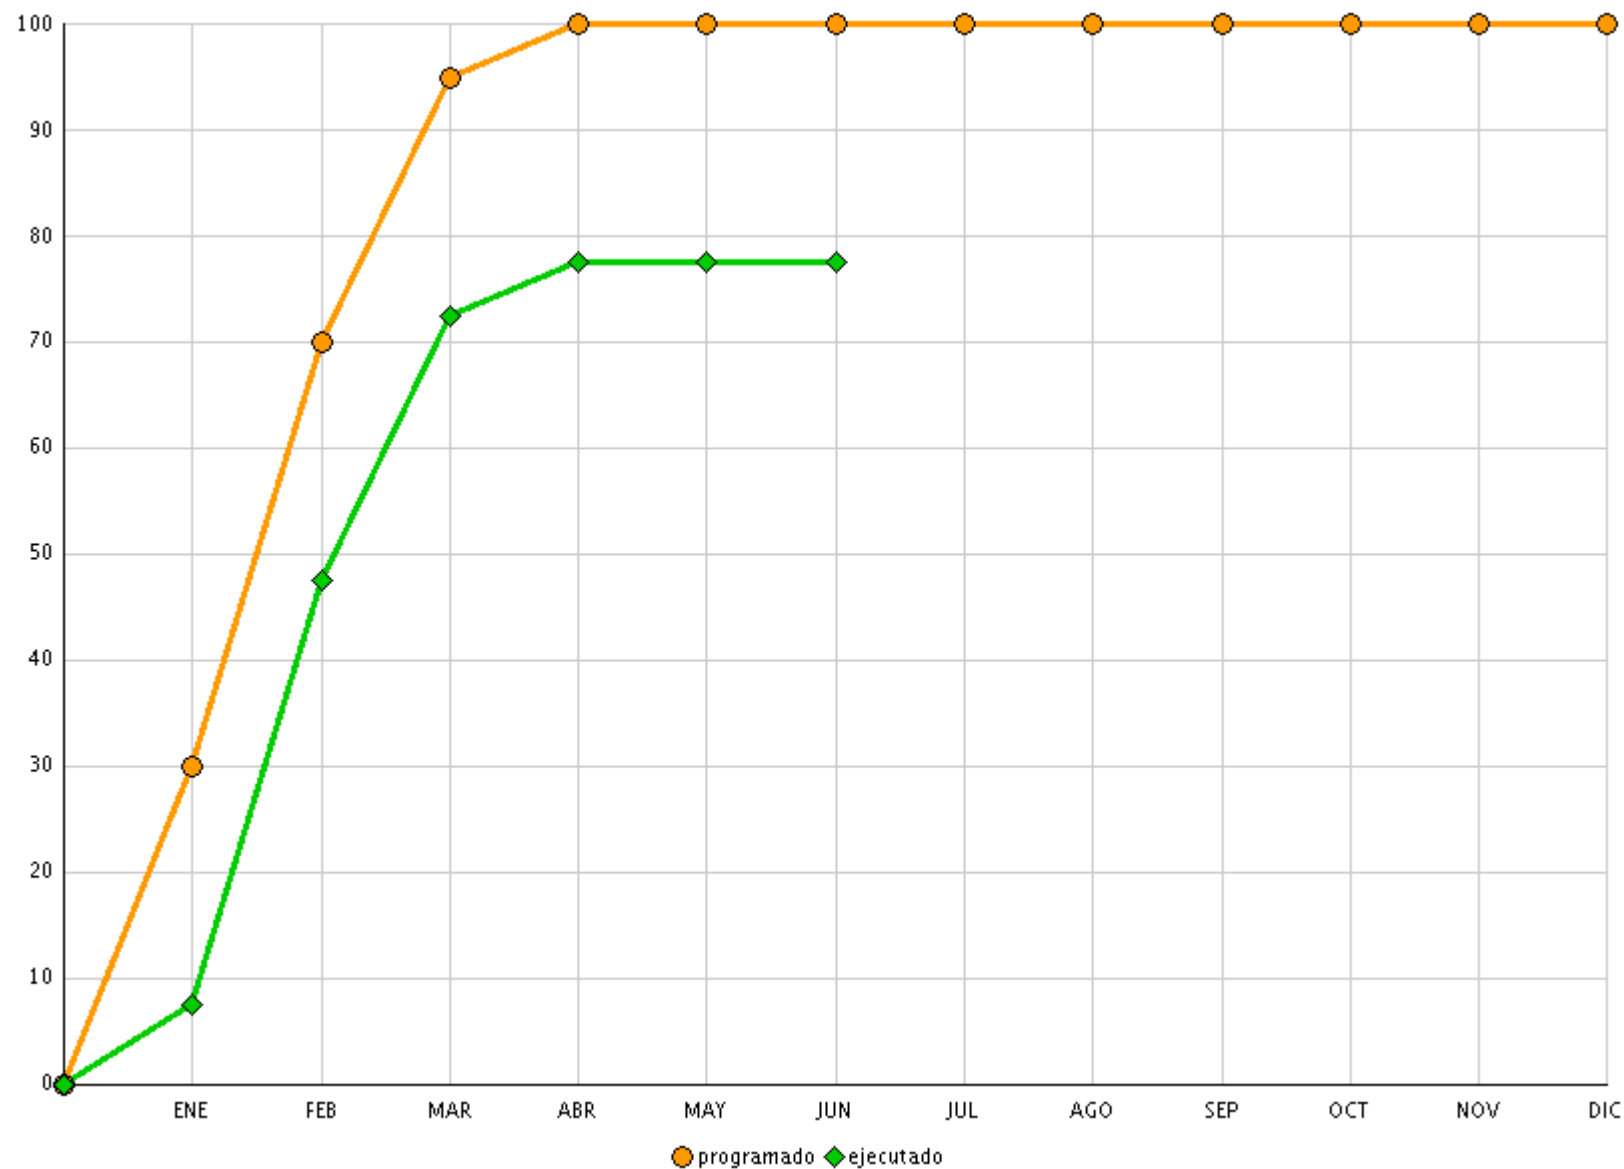

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	30.00	70.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	7.50	47.50	72.50	77.50	77.50	77.50						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7837 20 Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES	*****	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	75.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		75.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7842 25 Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	42.50
2.	IDENTIFICAR LOS ACTORES RELEVANTES DEL ECOSISTEMA	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	45.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		87.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7843 17 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS POLÍTICAS	50.00	0.00	0.00	35.00	35.00	25.00	25.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	50.00
2.	ORGANIZAR ACTIVIDADES INTERNAS QUE PERMITAN LA	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	60.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									80.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
7844 18 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR DIAGNÓSTICOS SOBRE EL ENTORNO COMPETITIVO	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	42.50
2.	REALIZAR CONVENIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	20.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									55.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7845 15 Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FAMILIAS CAMPESINAS	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	50.00	
2.	FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL APOYO PRODUCTIVO Y LA RECONVERSIÓN	50.00	0.00	0.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7846 17 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR PROCESOS DE AGREGACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA EN FUNCIÓN DE NEGOCIACIONES A TRAVÉS DE DIVERSOS CANALES DIRECTOS DE COMERCIALIZACIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	20.00
2.	AJUSTAR E IMPLEMENTAR PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO ENCORRESPONDENCIA CON EL POT	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										70.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7847 19 Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	40.00
2.	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	60.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									70.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7848 20 Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PARTICIPAR EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE CONLLEVEN A DESARROLLAR Y ACELERAR EL CONOCIMIENTO, LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00		0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	25.00
2.	PROMOVER LA ACELERACIÓN DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO DE LA CIUDAD	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										55.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7849 16 Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD			50.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			5.00		5.00		5.00		5.00		0.00		100.00	70.00	35.00
2.	IDENTIFICAR LOS COMPROMISOS Y RESPONSABLES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO			50.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	25.00
Total ponderación vertical				100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										60.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
7863 14 Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	50.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		100.00	70.00	35.00
2.	DEFINIR SECTORES Y/O EMPRESAS POTENCIALMENTE GENERADORES DE PLAZAS LABORALES	50.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	60.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									65.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7864 11 Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE INFORMES Y ANÁLISIS DE DATOS DEL MERCADO LABORAL DE LA CIUDAD	50.00	0.00	0.00	35.00	35.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	50.00
2.	REALIZAR ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL SOBRE LA DINÁMICA LABORAL	50.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									70.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7865 12 Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORAR UN INVENTARIO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIONES POR ÁREA MISIONAL Y POR TEMAS SUGERIDOS POR LA SECRETARIA	50.00	40.00	40.00	45.00	45.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	50.00
2.	LIDERAR Y DINAMIZAR LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00			0.00		25.00				25.00		0.00		100.00	50.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										75.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7874 17 Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	50.00	25.00	25.00	35.00	35.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	50.00
2.	HACER ESTUDIOS PARA IDENTIFICAR LAS MEJORES PROPUESTAS DE VEHICULO FINANCIERO	50.00	0.00	0.00	25.00	10.00	35.00	10.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									80.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
7906 7 Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IDENTIFICAR EVENTOS CLAVE PARA EL EMPRENDIMIENTO	50.00	35.00	0.00	45.00	45.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	32.50
2.	PLANIFICAR ACTORES RELEVANTES, ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS	50.00	25.00	15.00	35.00	35.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	45.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									77.50	

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7575 Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024

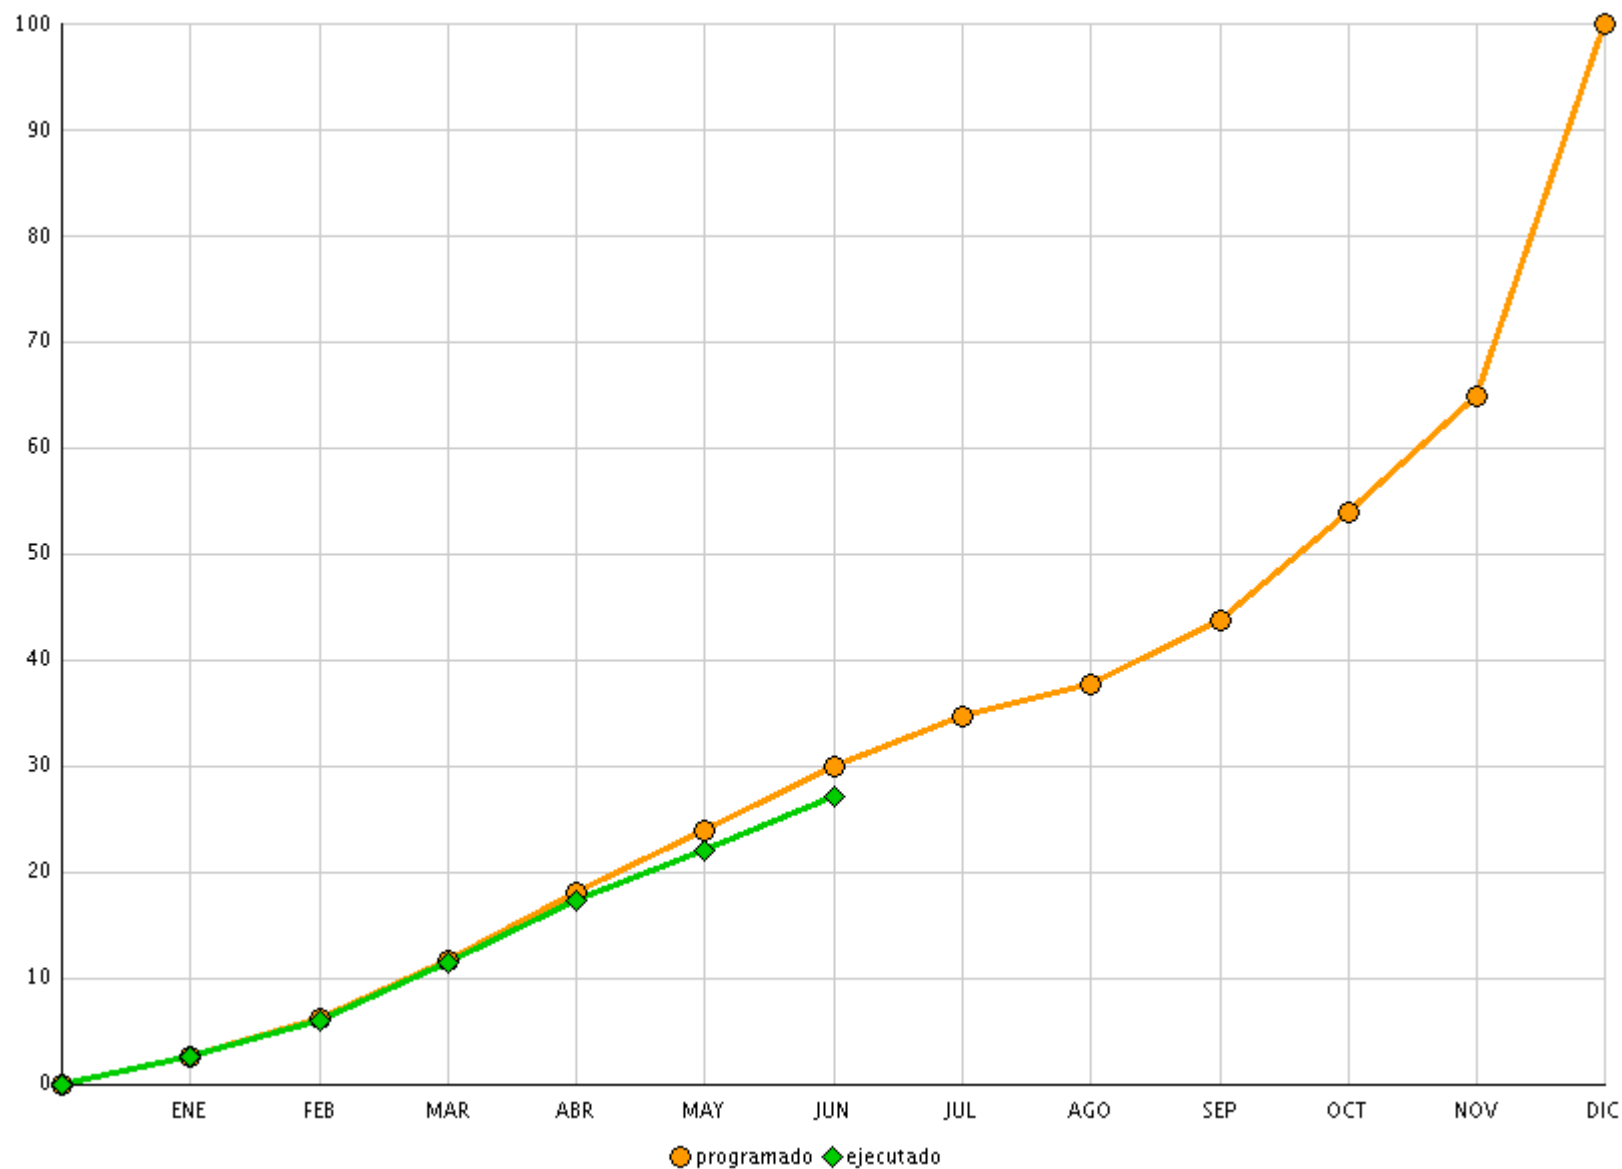


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.71	6.17	11.64	18.13	23.94	29.99	34.70	37.76	43.82	53.88	64.94	100.00
Ejecutado	2.71	6.00	11.47	17.33	22.14	27.19						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7577 Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá

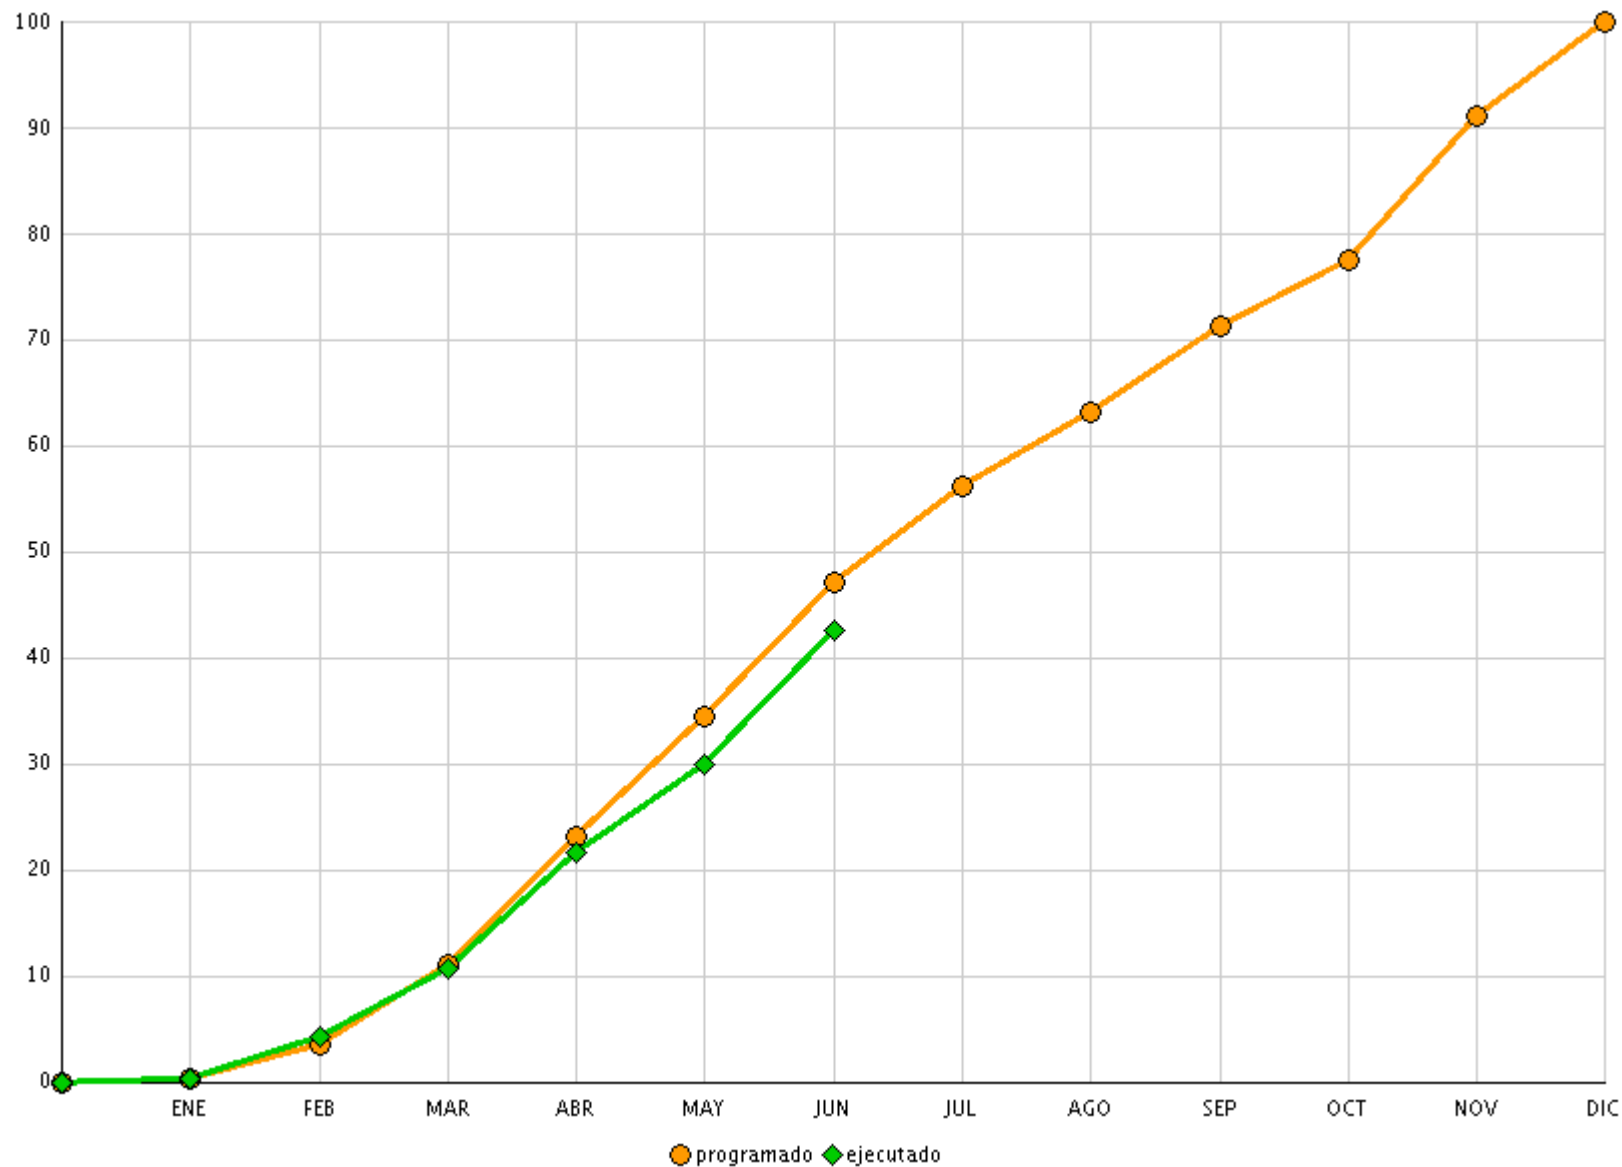


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.40	3.54	11.03	23.14	34.48	47.22	56.23	63.15	71.41	77.63	91.09	100.00
Ejecutado	0.40	4.36	10.71	21.74	30.02	42.67						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7582 Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas

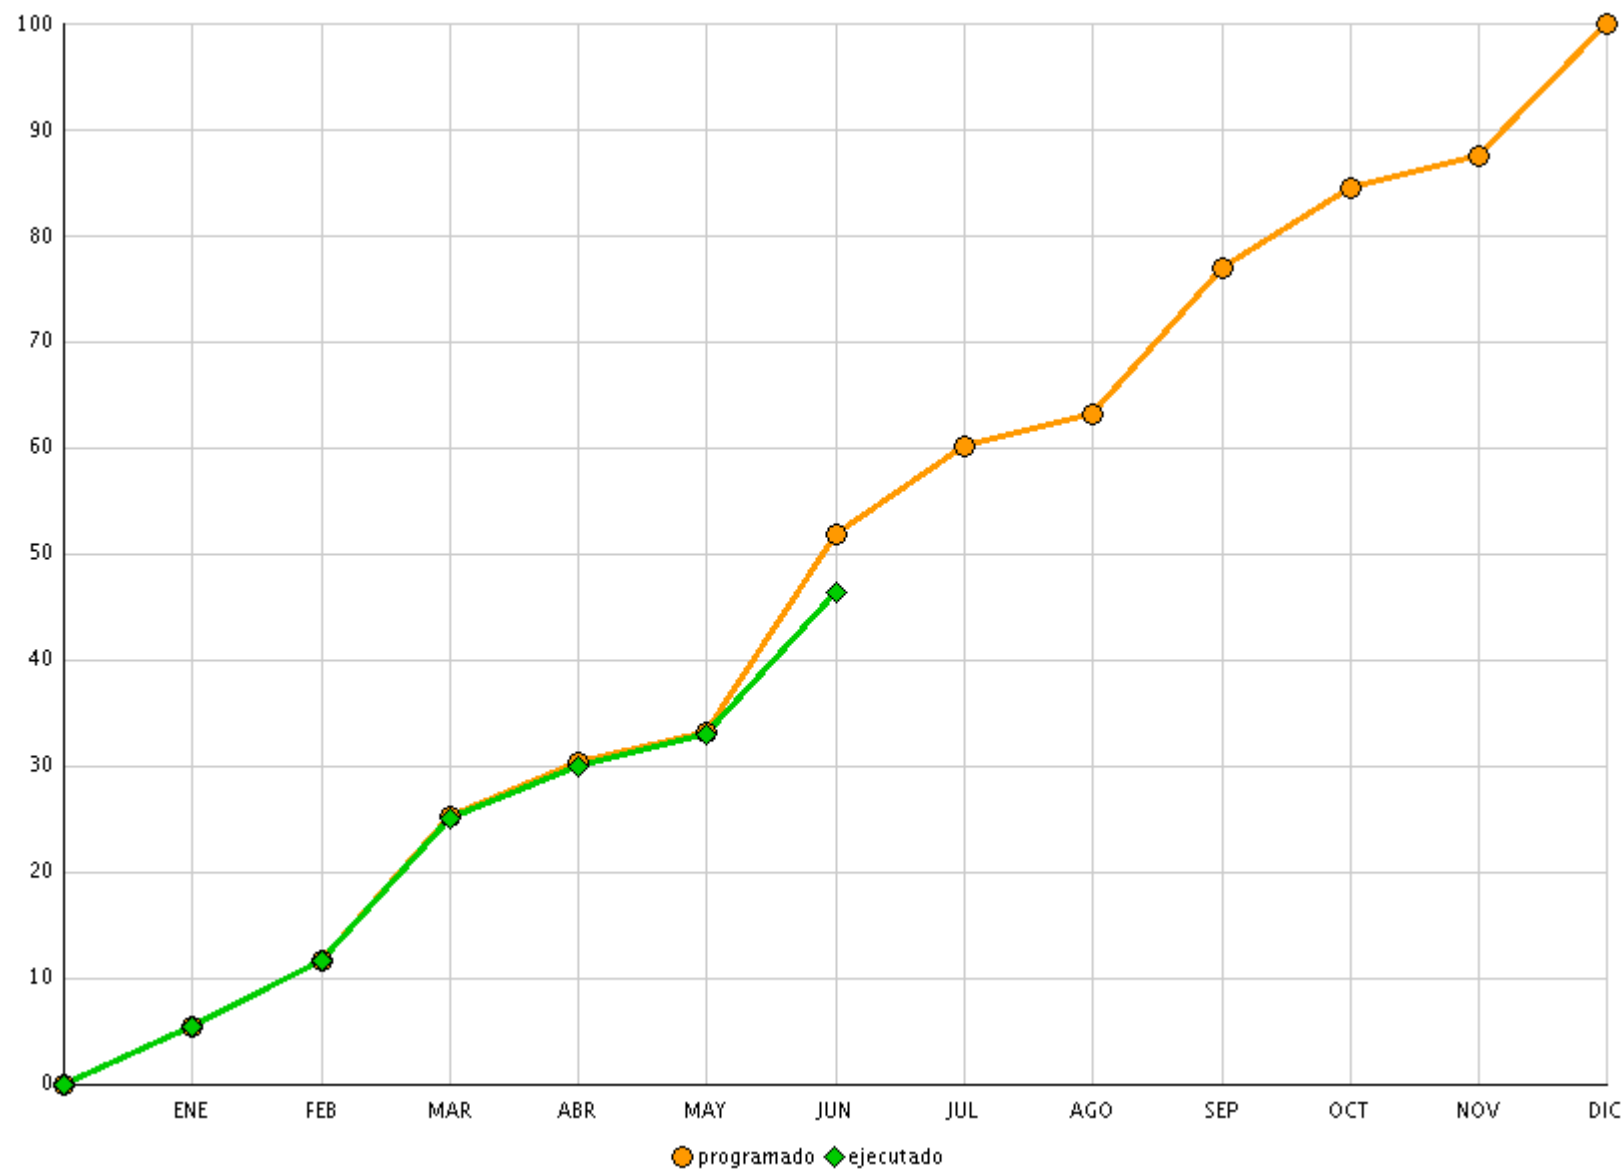


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.46	11.66	25.36	30.32	33.22	51.92	60.24	63.15	77.00	84.62	87.56	100.00
Ejecutado	5.46	11.66	25.12	30.07	32.98	46.42						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7590 Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá

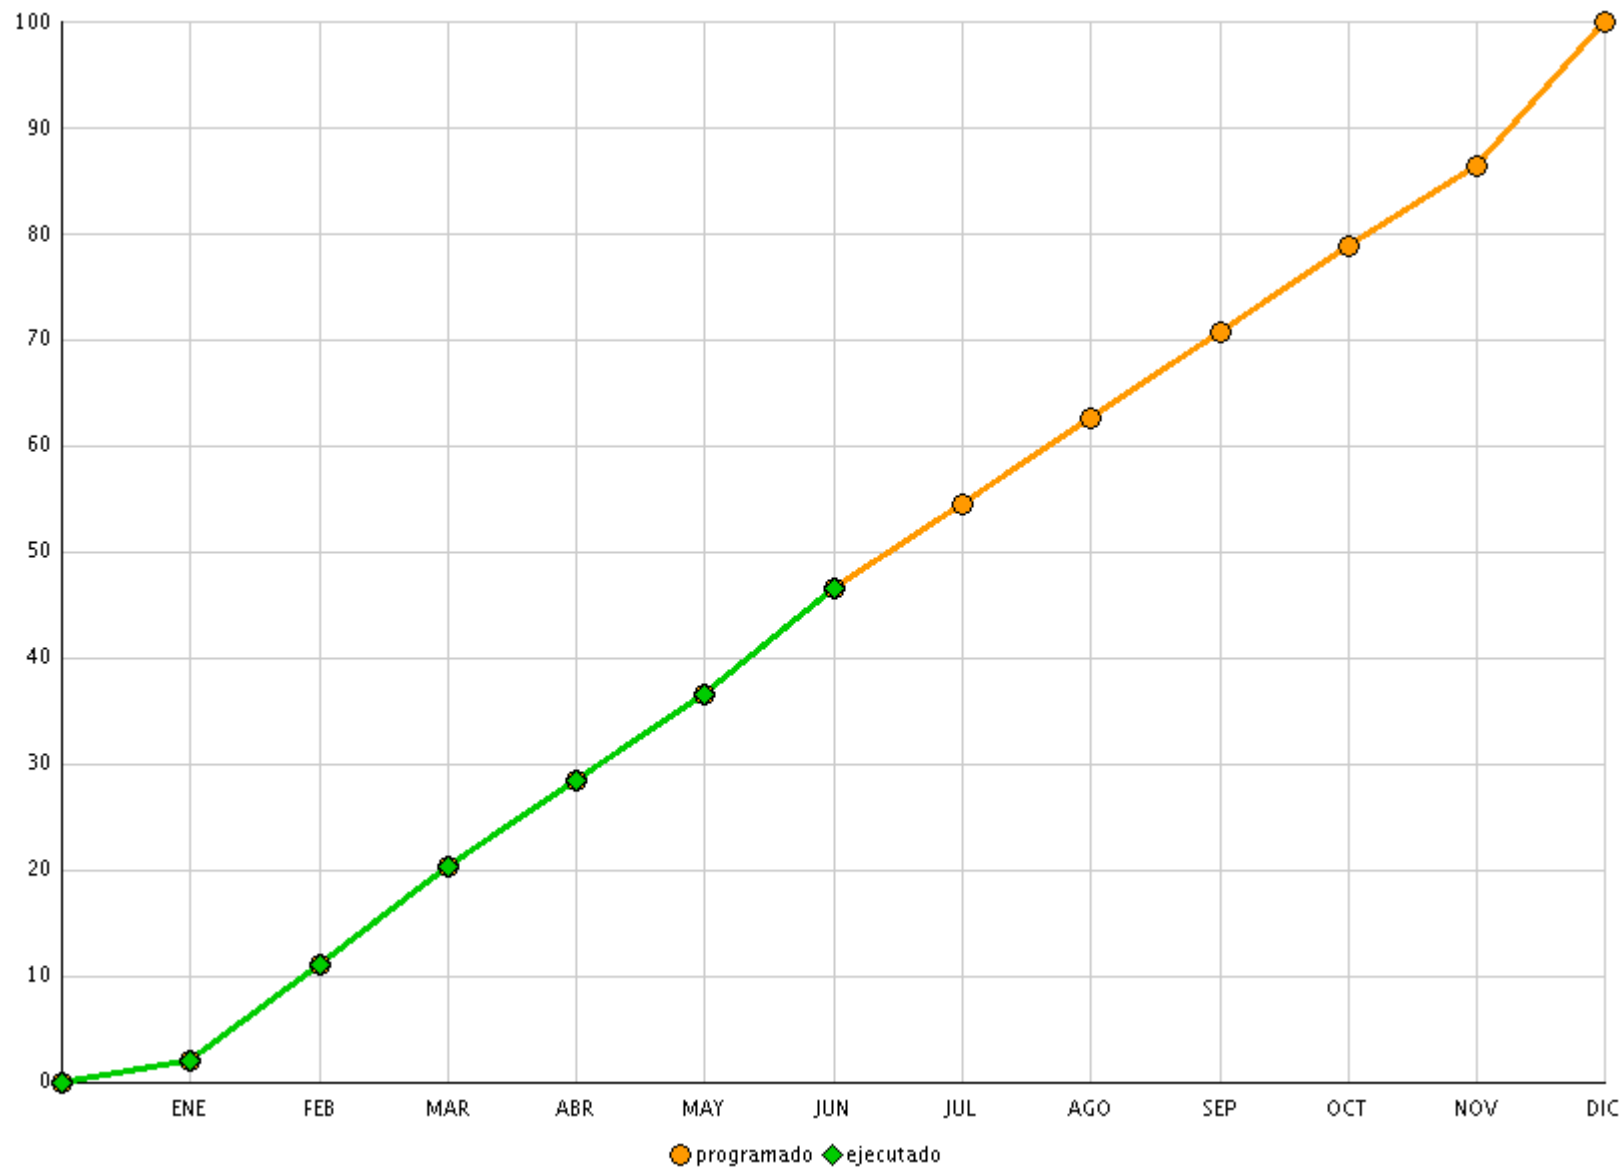


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	11.20	20.40	28.40	36.60	46.60	54.60	62.60	70.80	78.80	86.40	100.00
Ejecutado	2.00	11.20	20.40	28.40	36.60	46.60						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7602 Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá

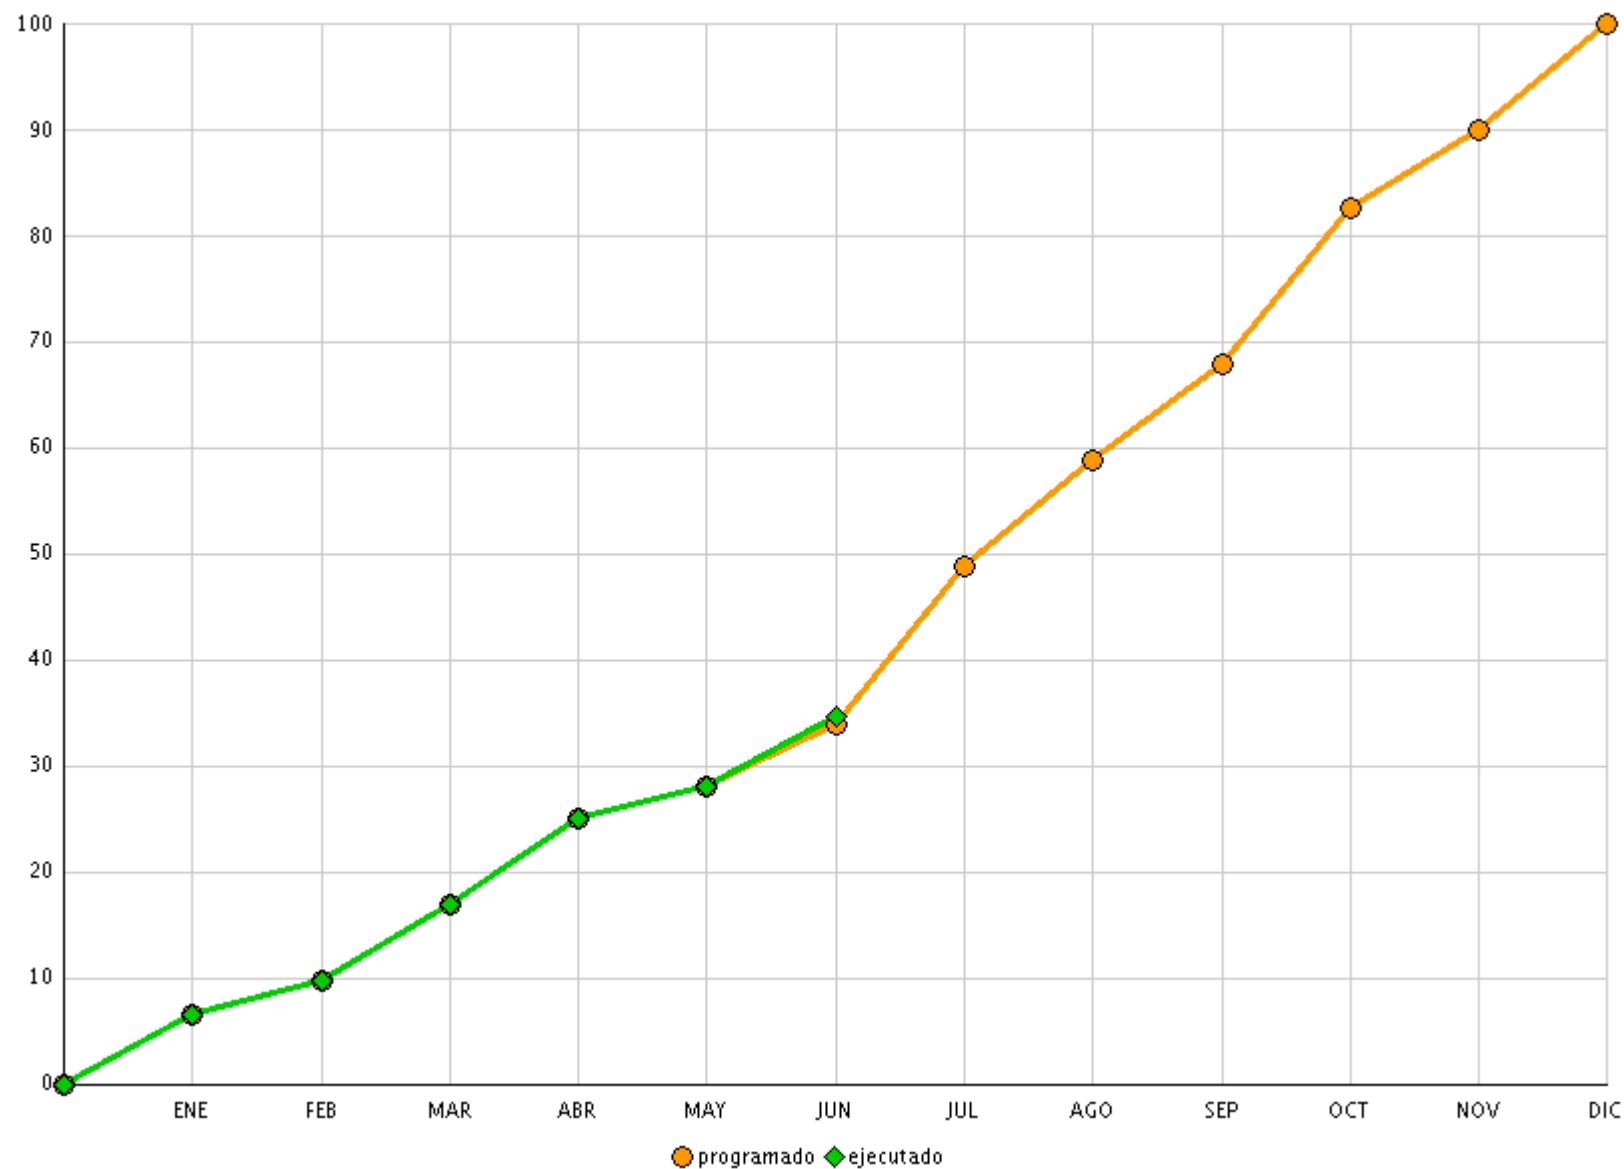


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.64	9.77	16.90	25.02	28.14	34.02	48.89	58.81	67.99	82.66	90.09	100.00
Ejecutado	6.64	9.77	16.91	25.02	28.14	34.77						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7606 Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá

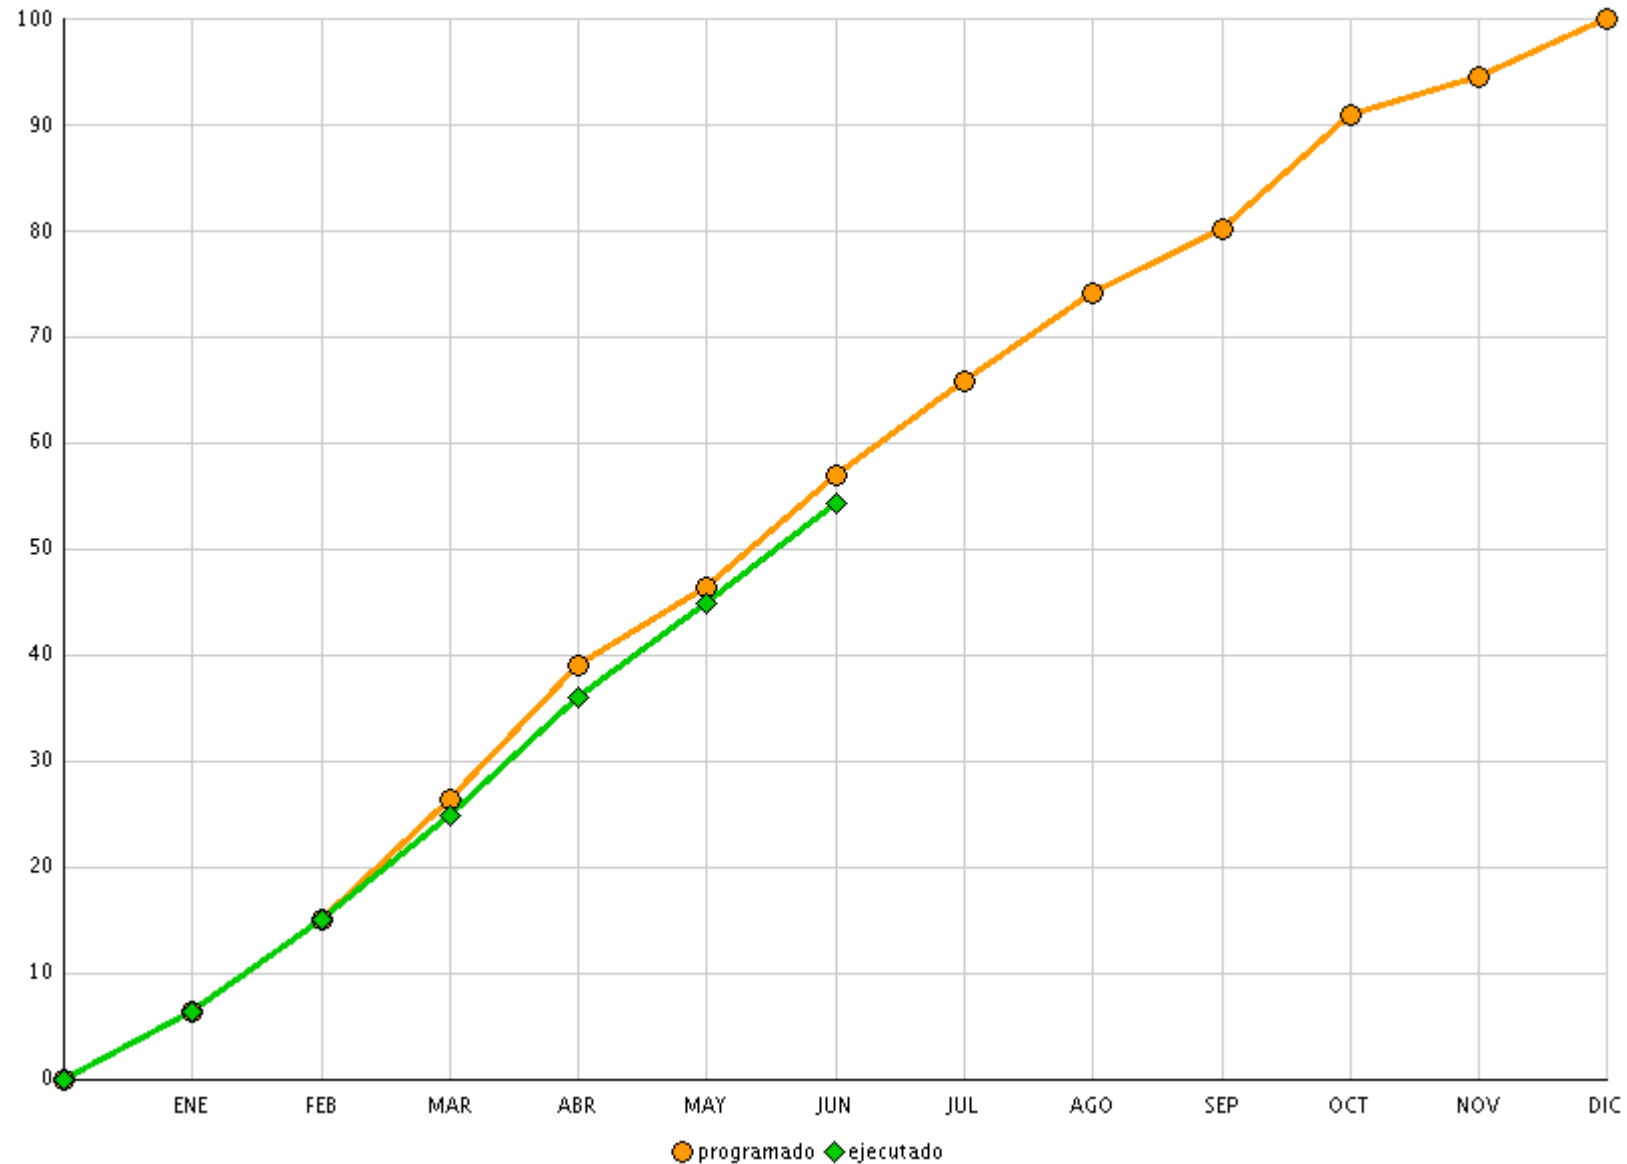


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.44	15.04	26.44	38.99	46.49	57.07	65.83	74.12	80.23	90.87	94.49	100.00
Ejecutado	6.44	15.04	24.86	35.97	44.92	54.25						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7615 Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá

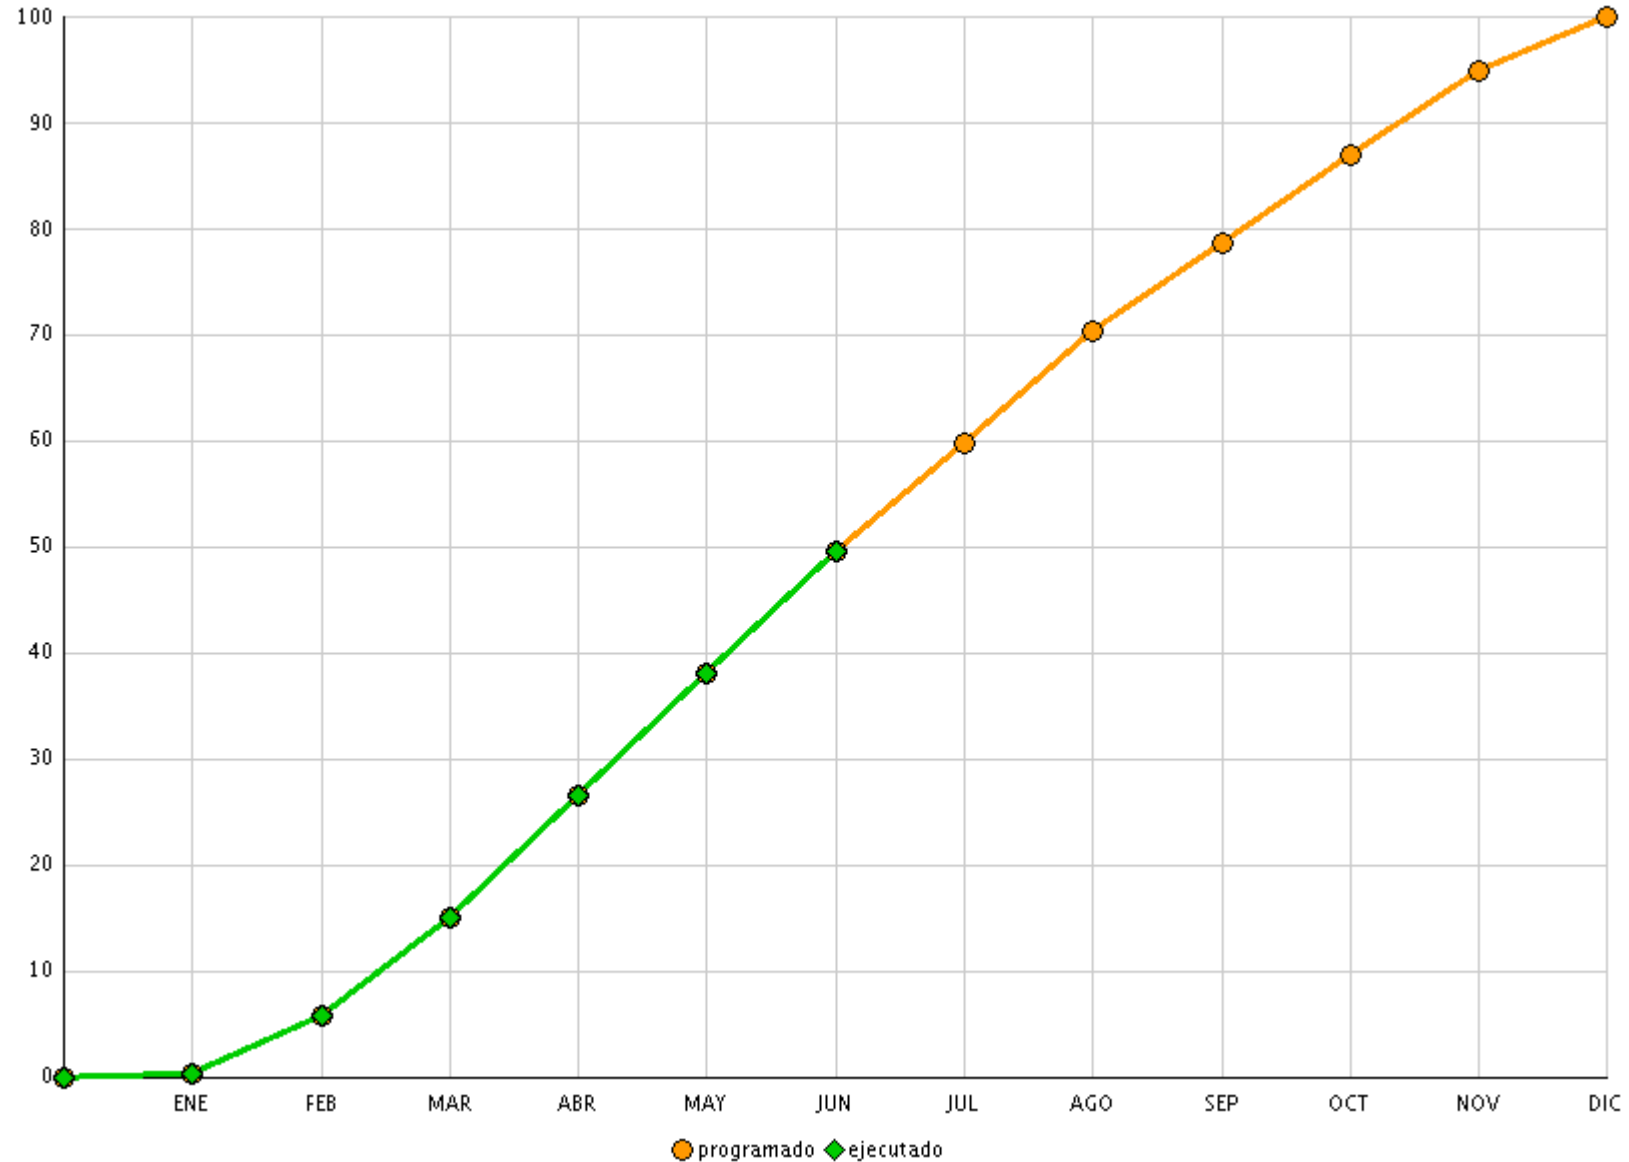


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.39	5.78	15.07	26.56	38.05	49.54	59.73	70.31	78.69	87.07	94.90	100.00
Ejecutado	0.39	5.78	15.07	26.56	38.05	49.54						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7618 Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá

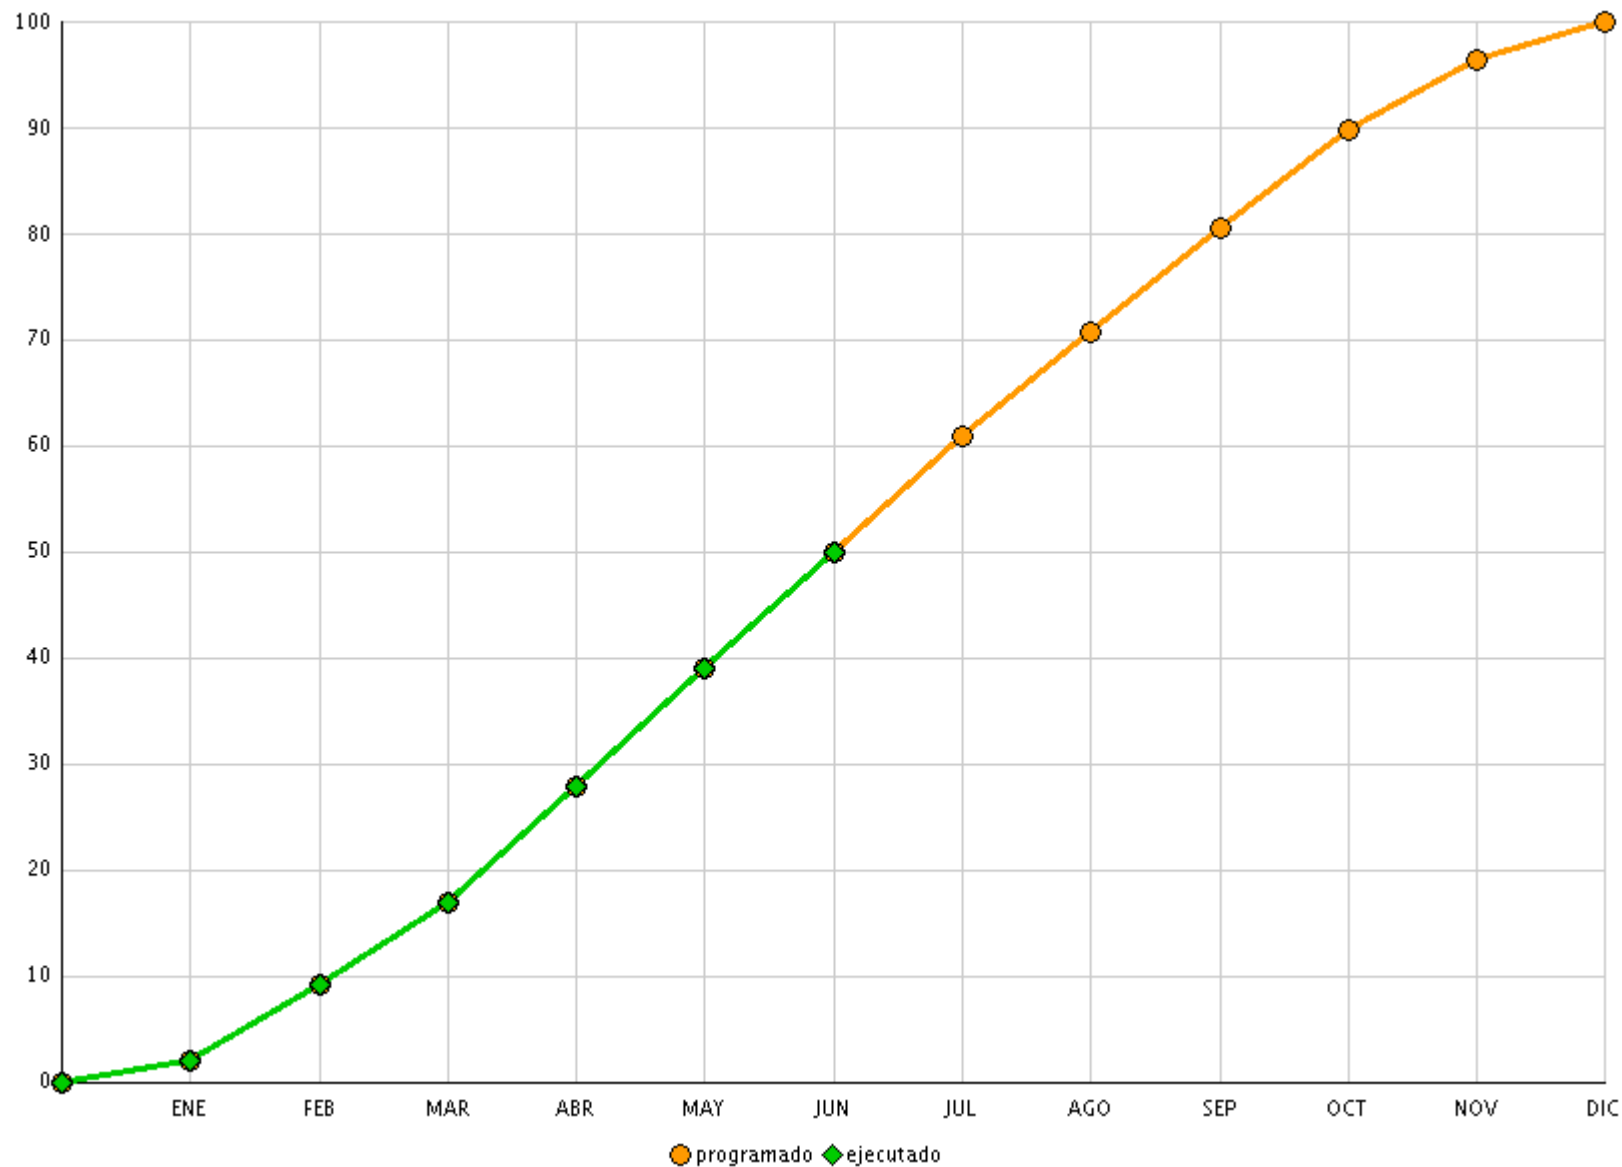


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	9.25	17.00	28.00	39.00	50.00	61.00	70.75	80.50	89.75	96.50	100.00
Ejecutado	2.00	9.25	17.00	28.00	39.00	50.00						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7641 Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá

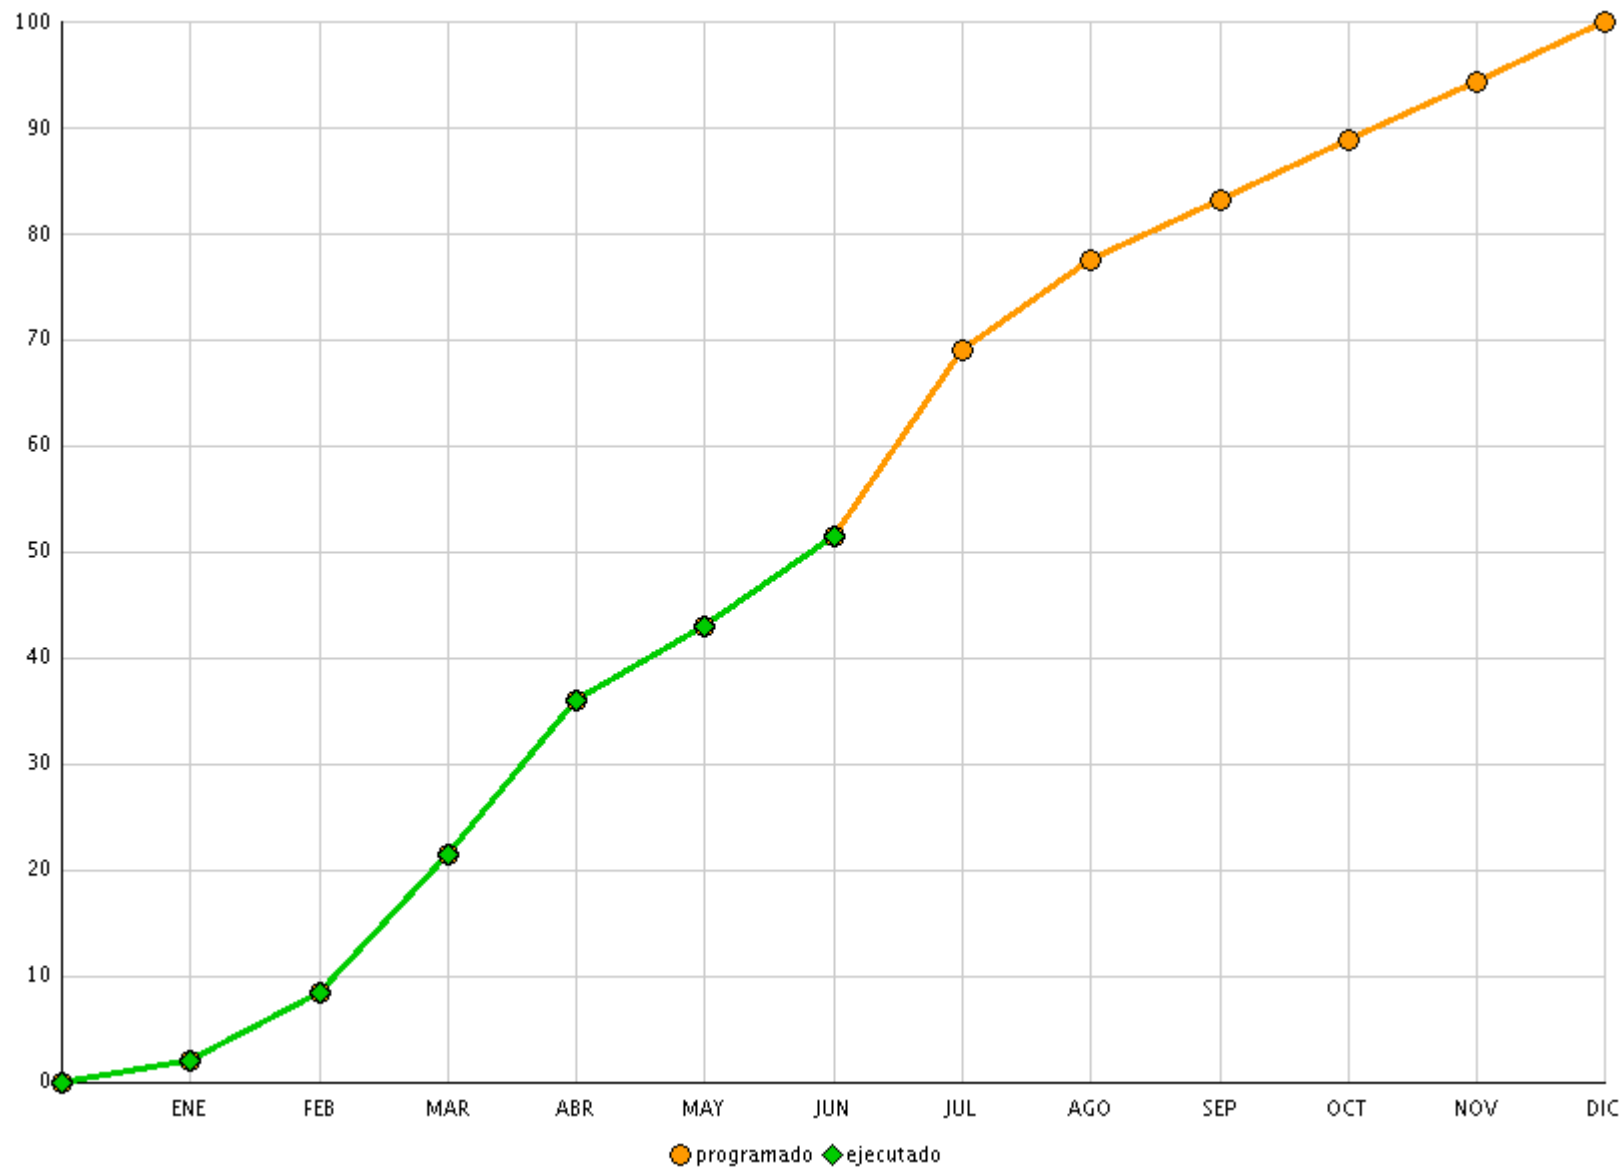


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.10	8.50	21.50	36.00	43.00	51.50	69.00	77.60	83.20	88.80	94.40	100.00
Ejecutado	2.10	8.50	21.50	36.00	43.00	51.50						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7642 Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá

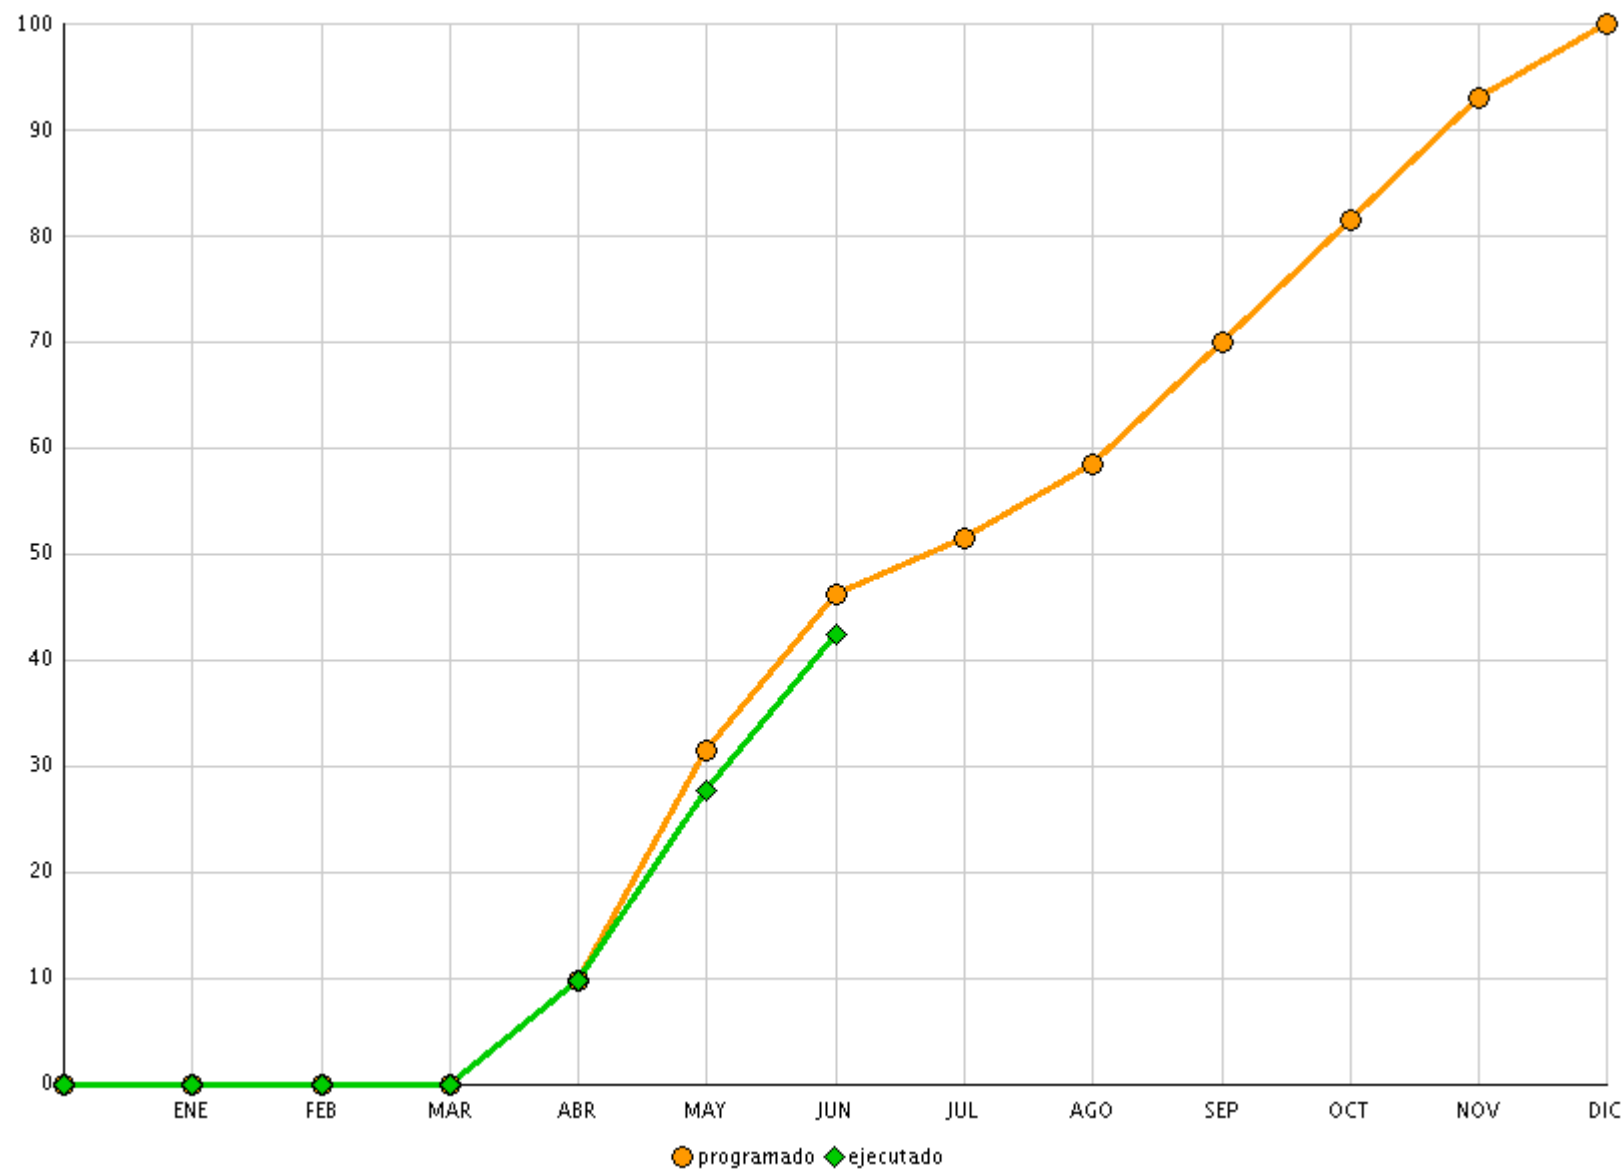


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	9.75	31.50	46.25	51.50	58.50	70.00	81.50	93.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	9.75	27.75	42.50						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7645 Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá

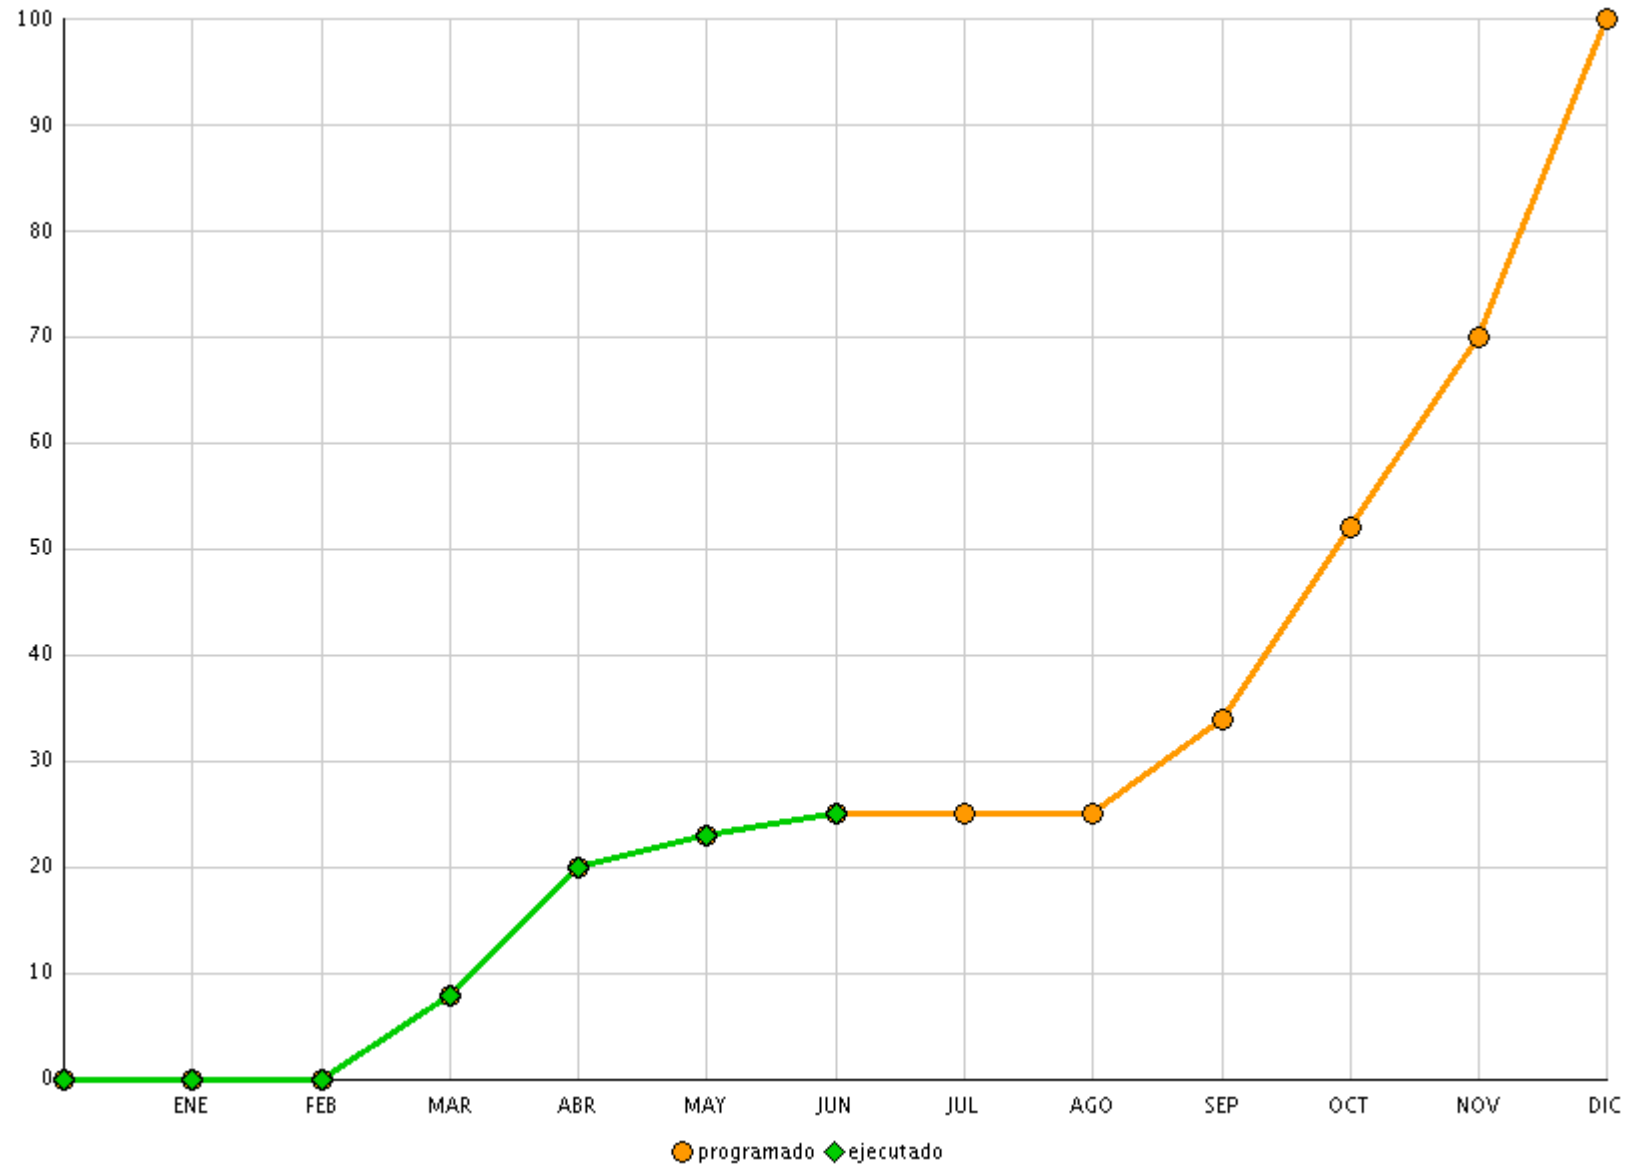


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	8.00	20.00	23.00	25.00	25.00	25.00	34.00	52.00	70.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	8.00	20.00	23.00	25.00						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7659 Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá

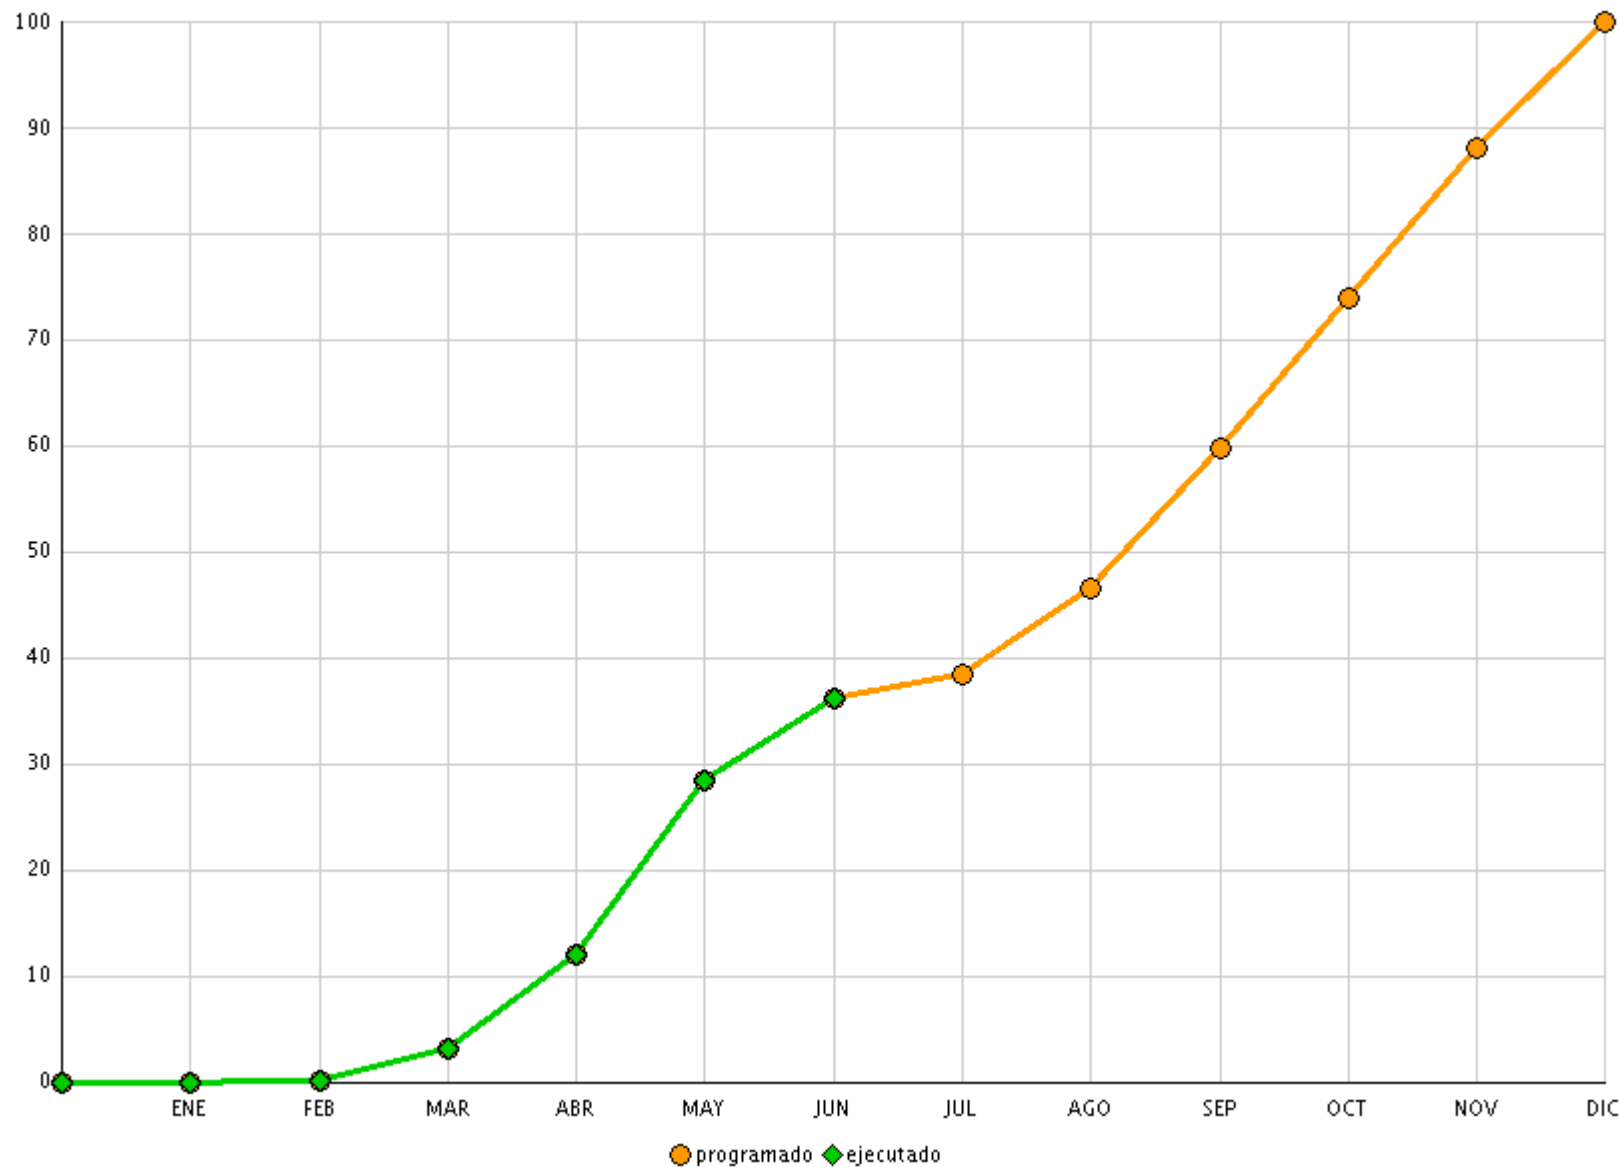


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.26	3.26	12.06	28.46	36.26	38.46	46.66	59.86	73.96	88.06	100.00
Ejecutado	0.00	0.26	3.26	12.06	28.46	36.26						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7715 Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá

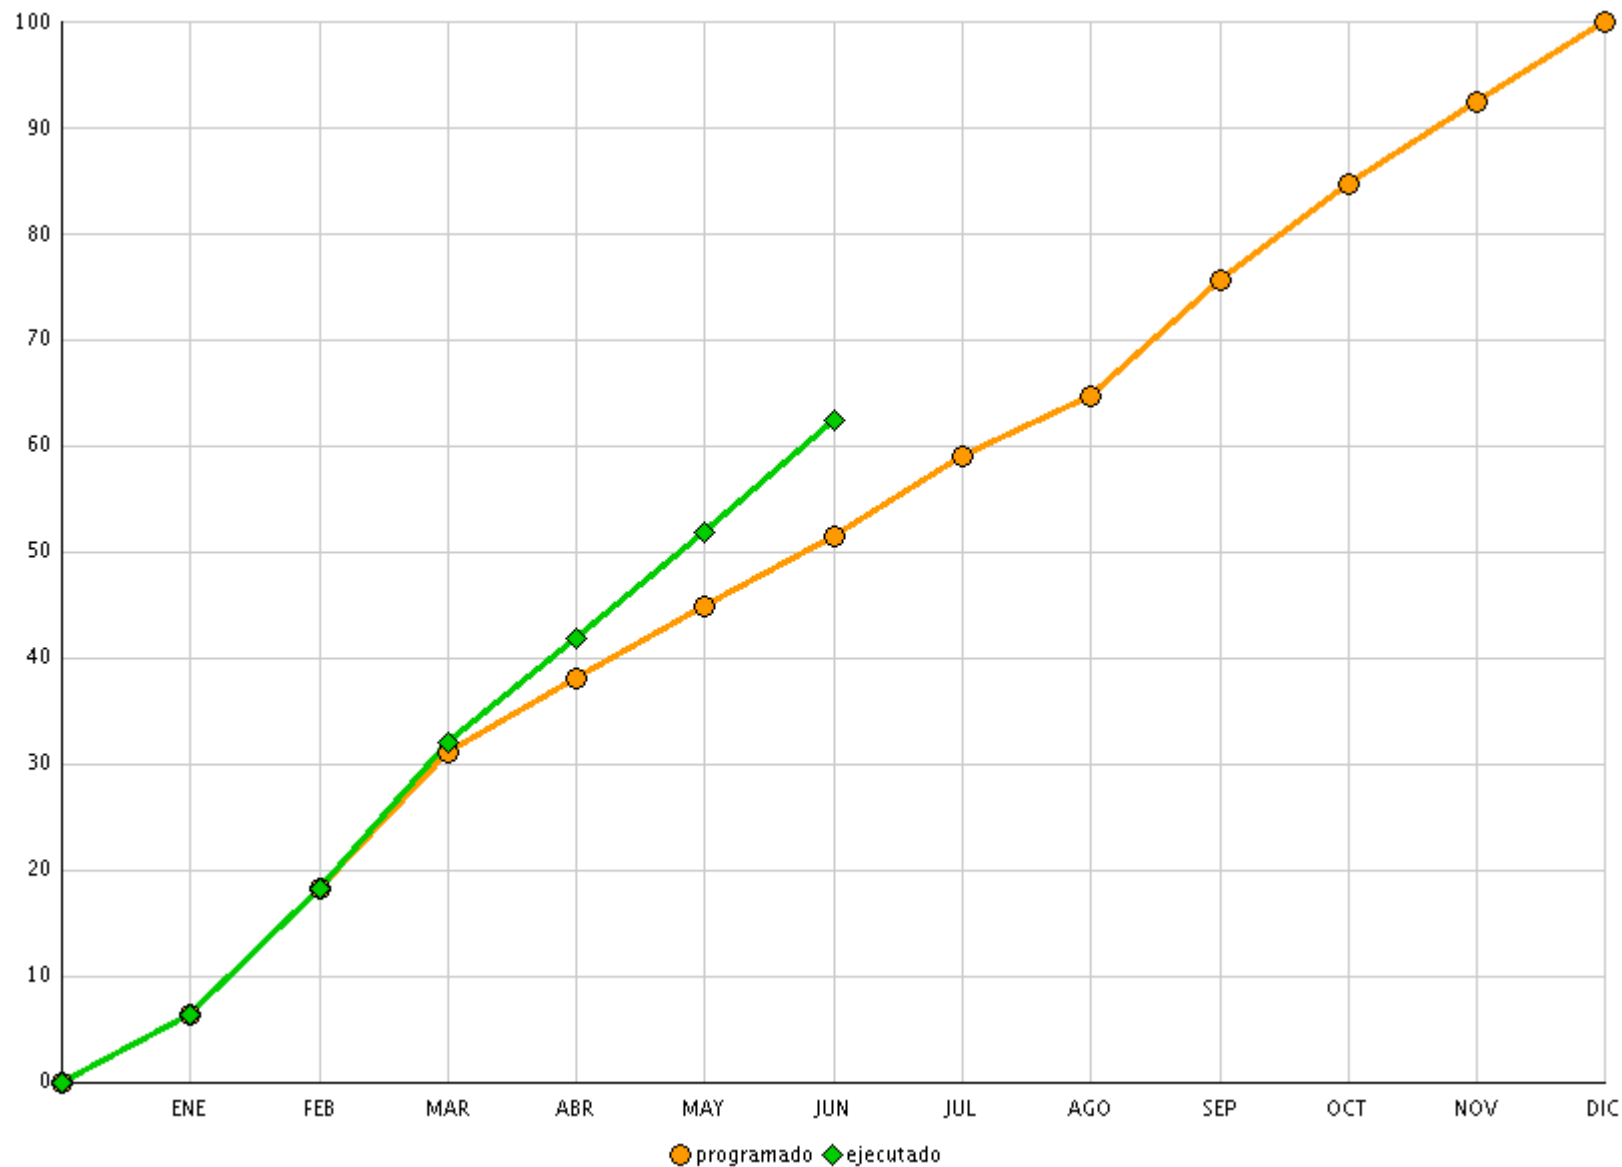


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.41	18.38	31.13	38.13	44.95	51.54	59.02	64.67	75.63	84.76	92.46	100.00
Ejecutado	6.41	18.38	31.99	41.86	51.92	62.37						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7721 Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá

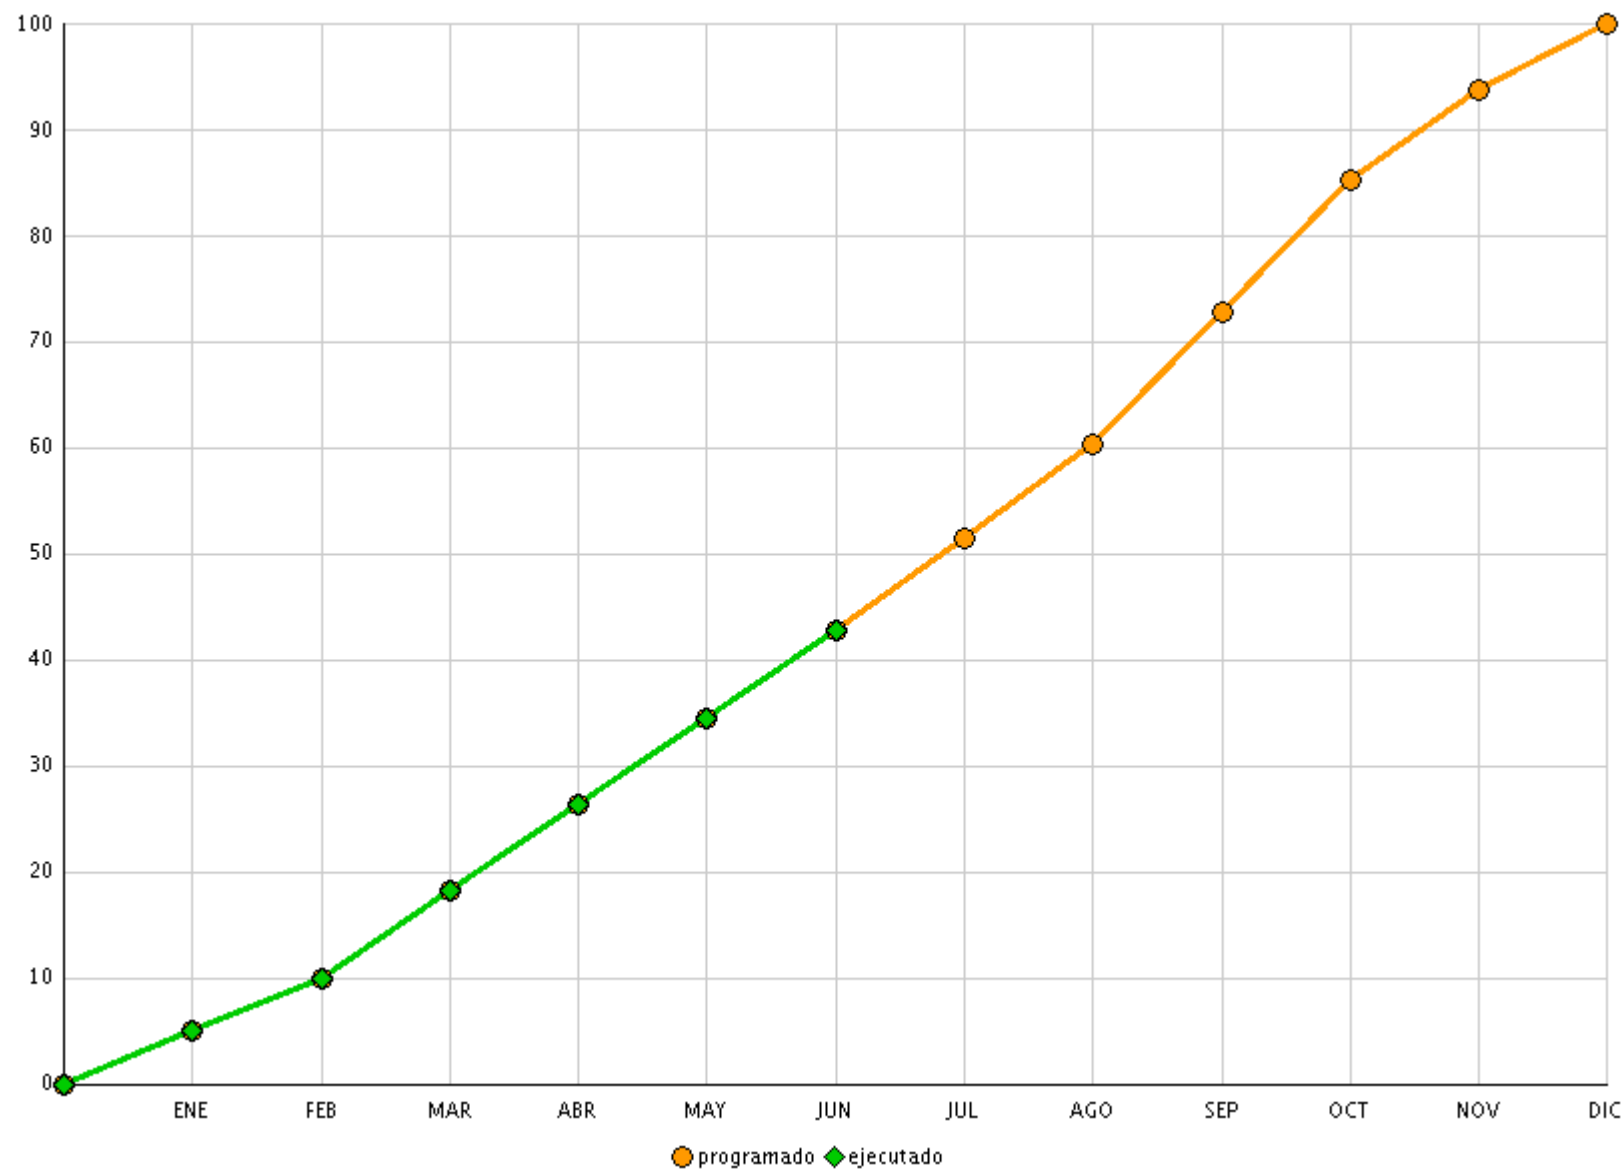


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	18.20	26.40	34.60	42.80	51.60	60.40	72.80	85.20	93.80	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	18.20	26.40	34.60	42.80						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7728 Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá

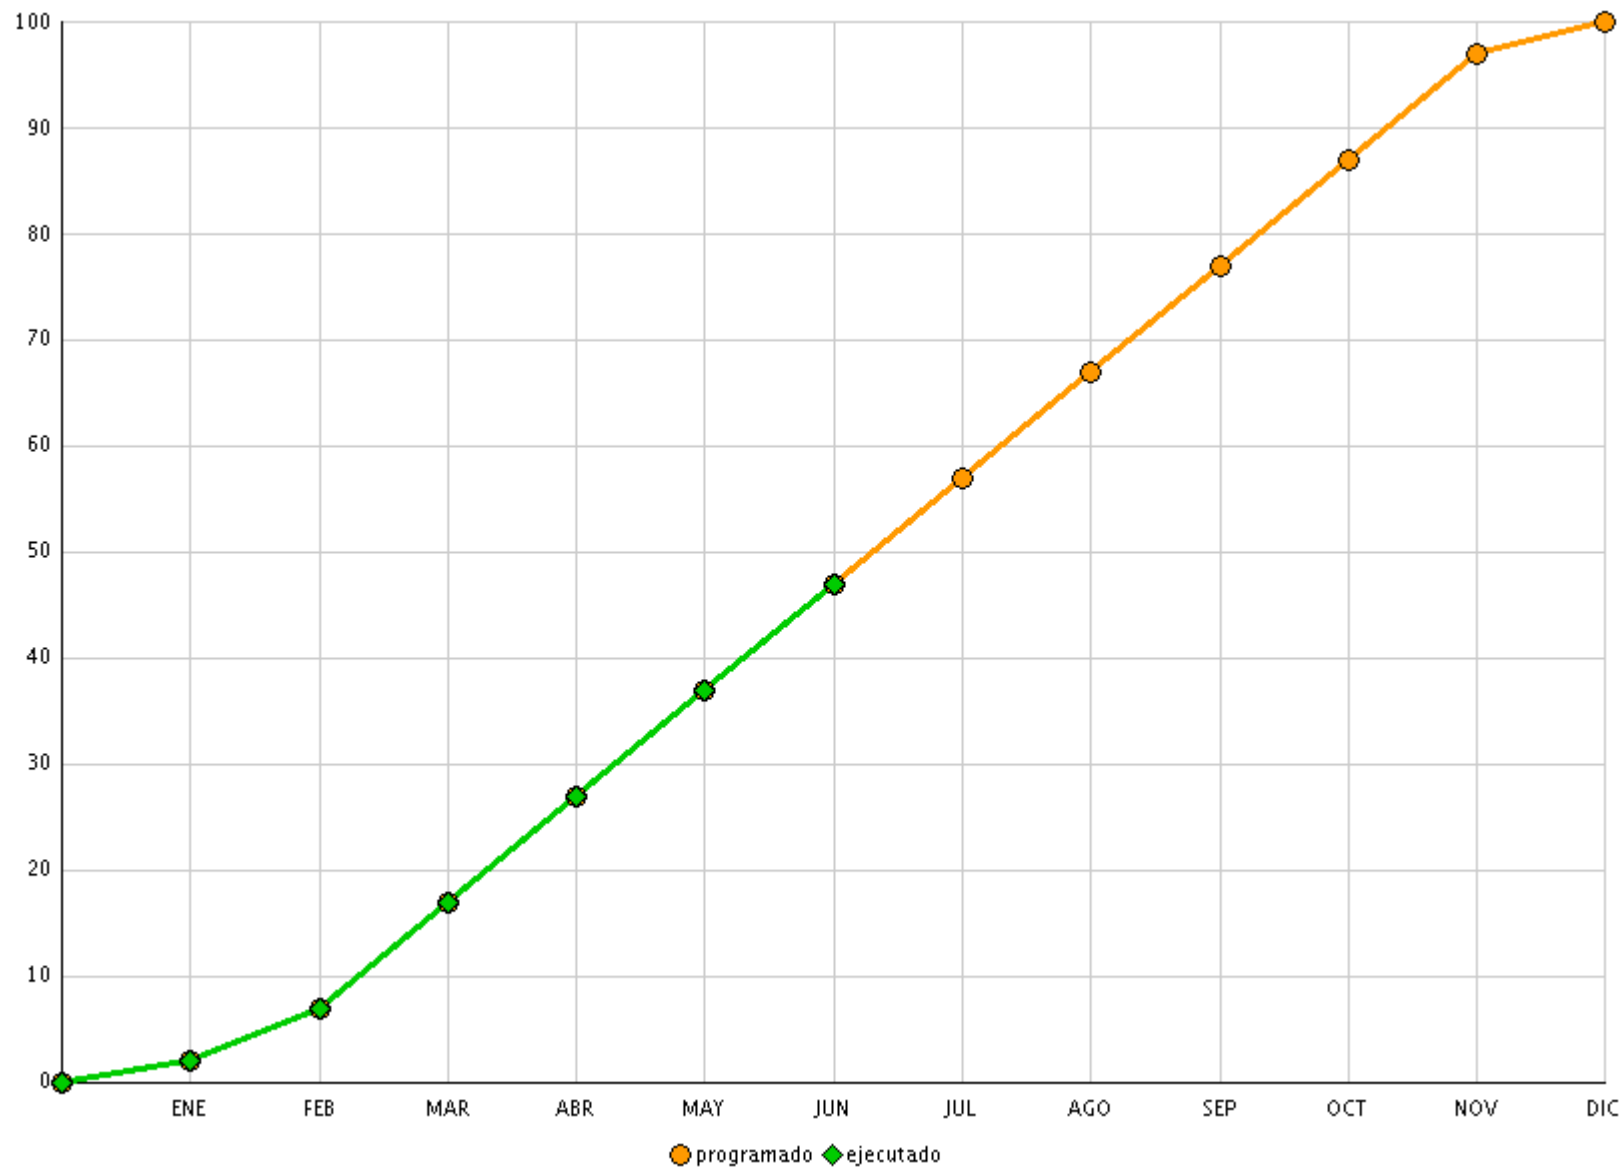


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	7.00	17.00	27.00	37.00	47.00	57.00	67.00	77.00	87.00	97.00	100.00
Ejecutado	2.00	7.00	17.00	27.00	37.00	47.00						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7747 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá

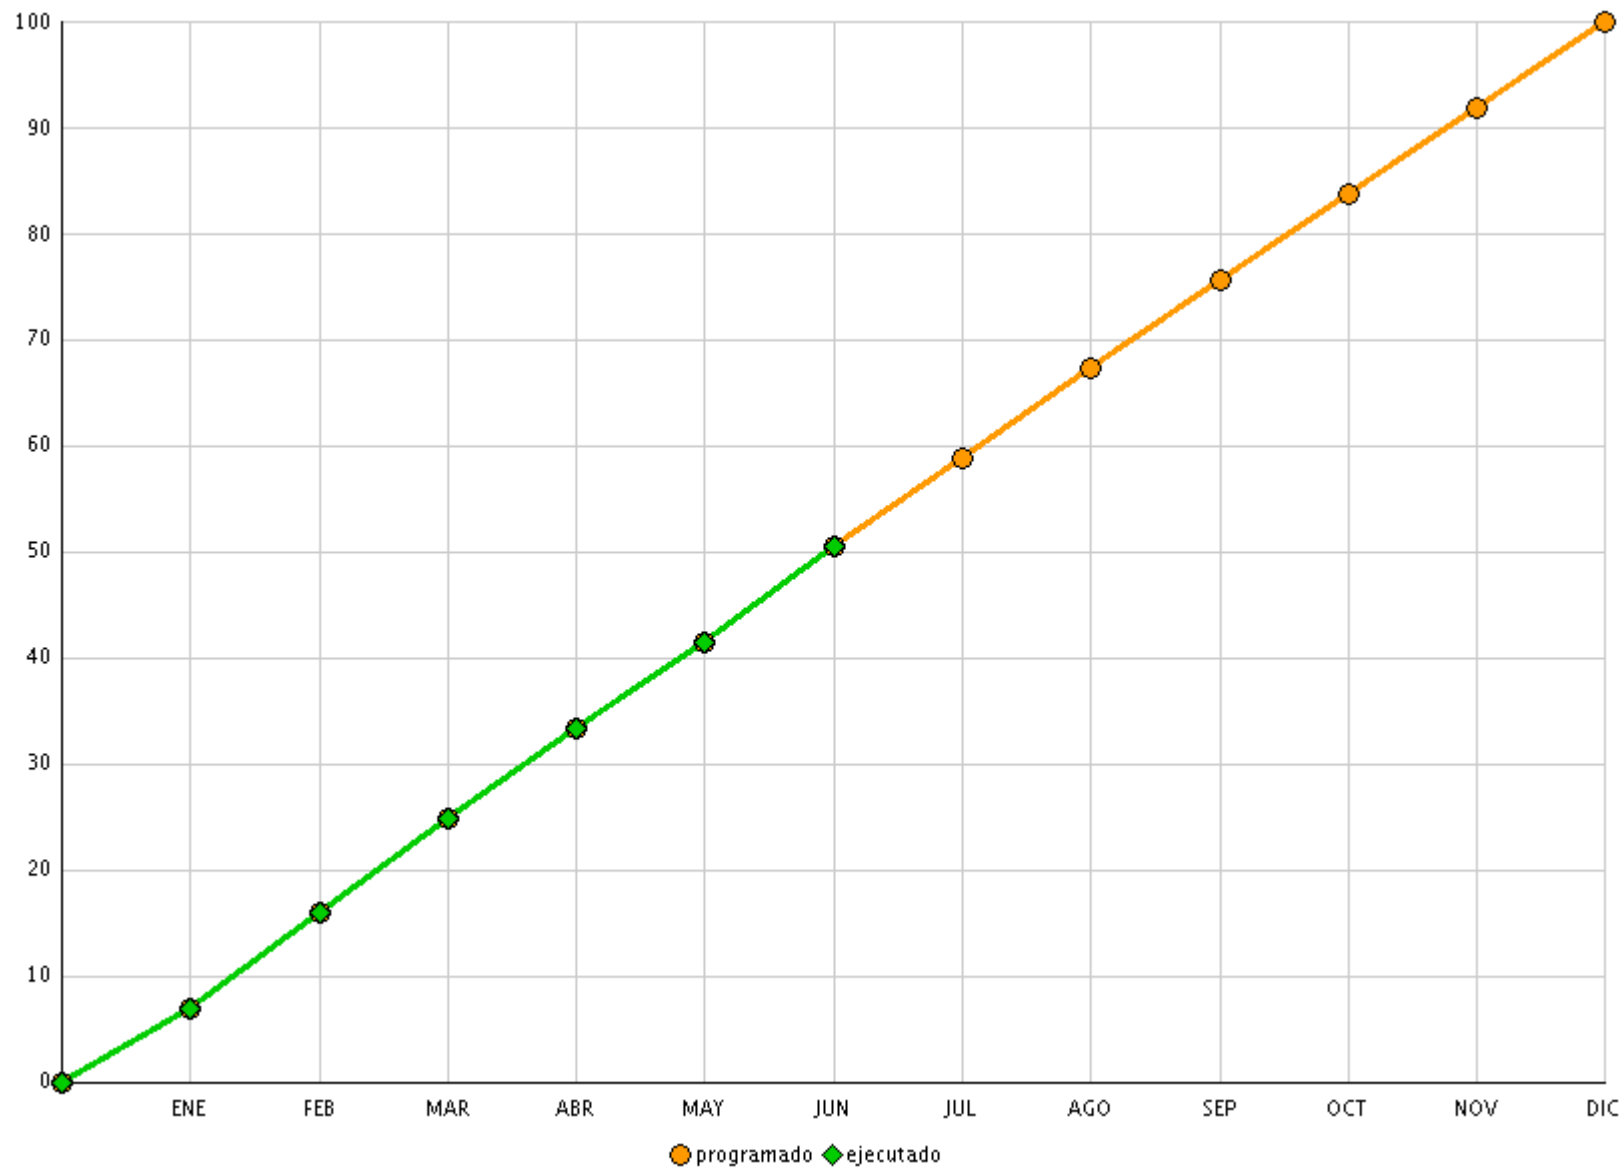


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.03	15.95	24.88	33.42	41.59	50.57	58.94	67.29	75.65	83.81	91.98	100.00
Ejecutado	7.03	15.95	24.88	33.42	41.59	50.57						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7754 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá

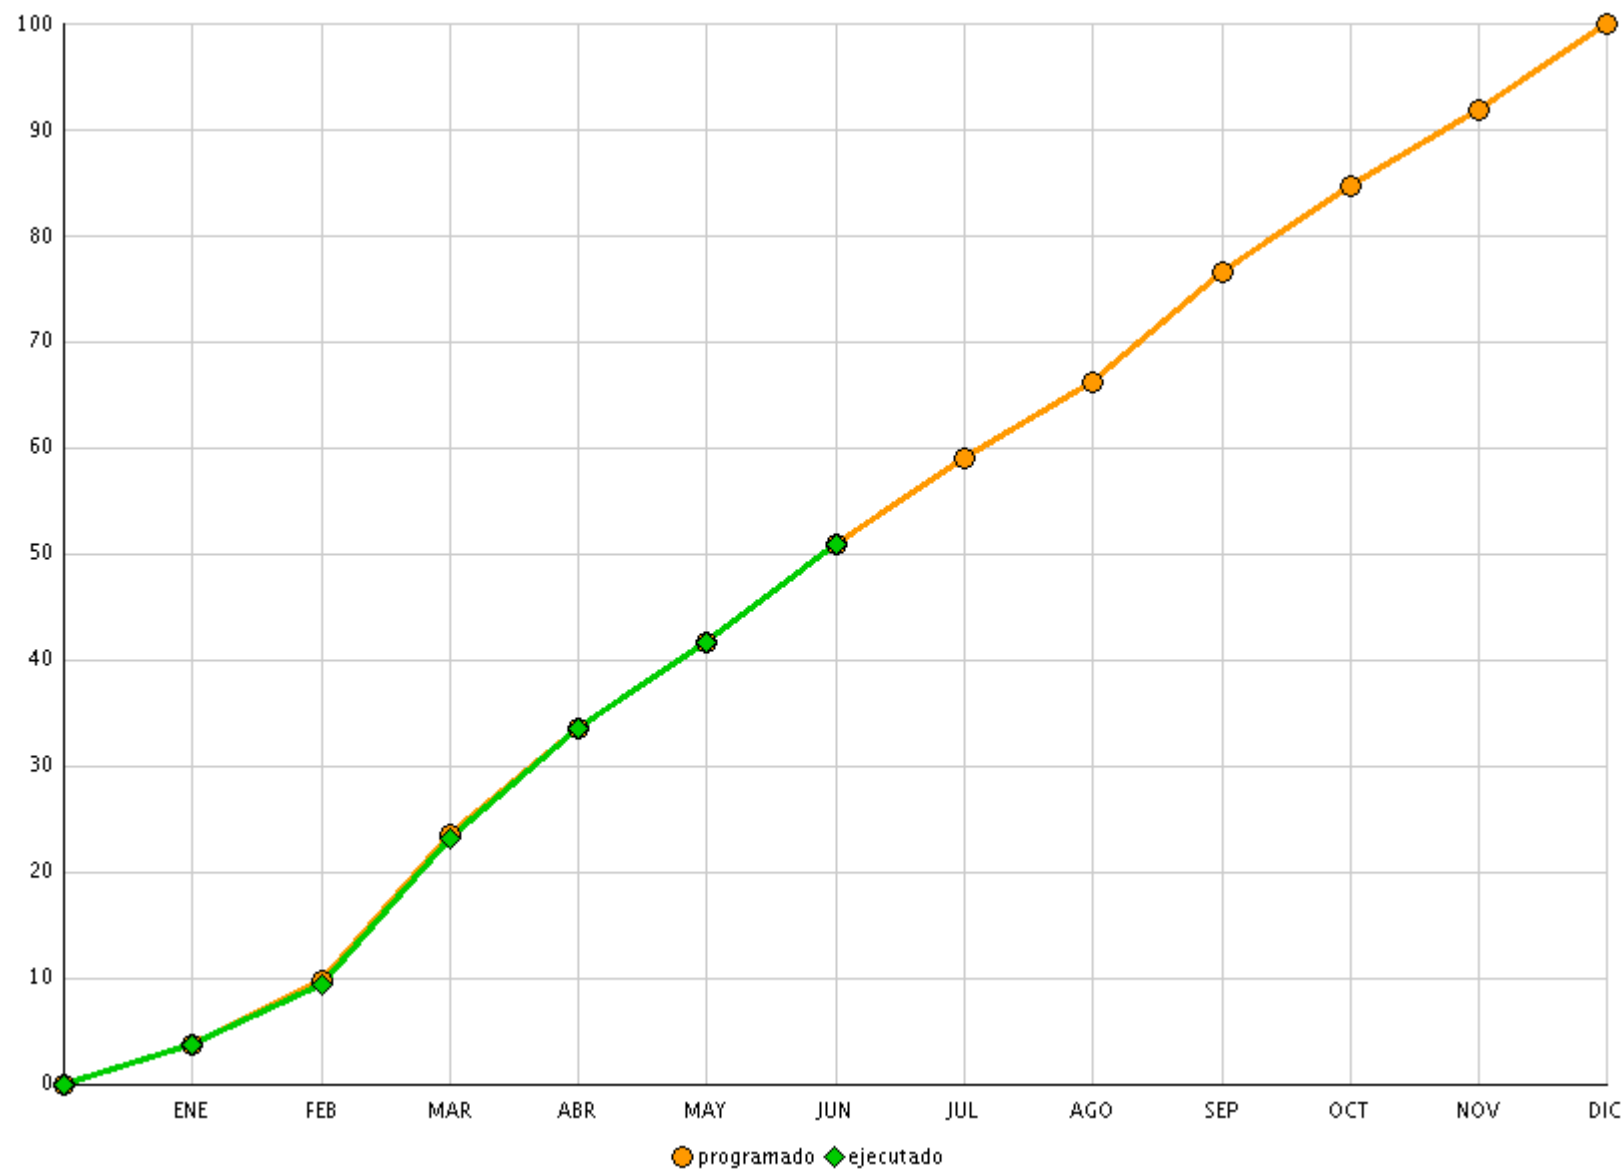


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.73	9.87	23.65	33.58	41.72	50.90	59.03	66.17	76.55	84.68	91.82	100.00
Ejecutado	3.73	9.37	23.15	33.58	41.72	50.90						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7798 Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá

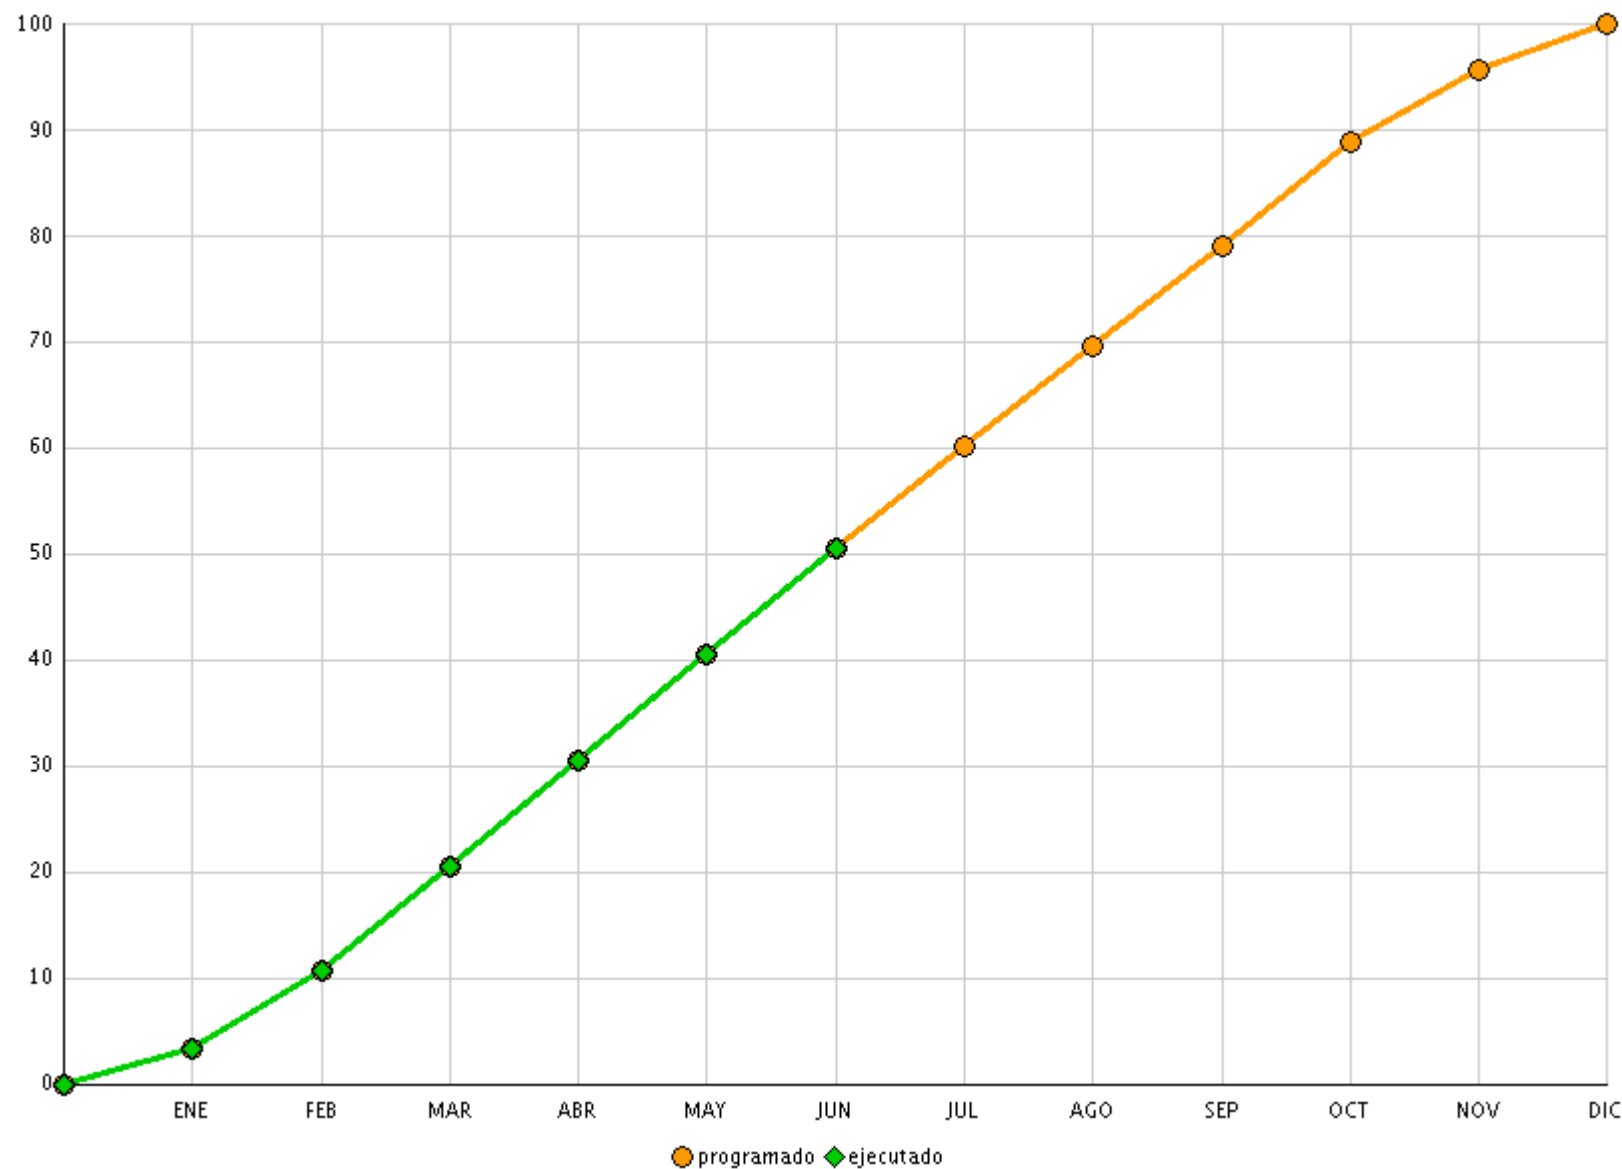


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.35	10.75	20.64	30.59	40.54	50.53	60.16	69.65	79.14	88.95	95.67	100.00
Ejecutado	3.35	10.75	20.64	30.59	40.54	50.53						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7802 Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá

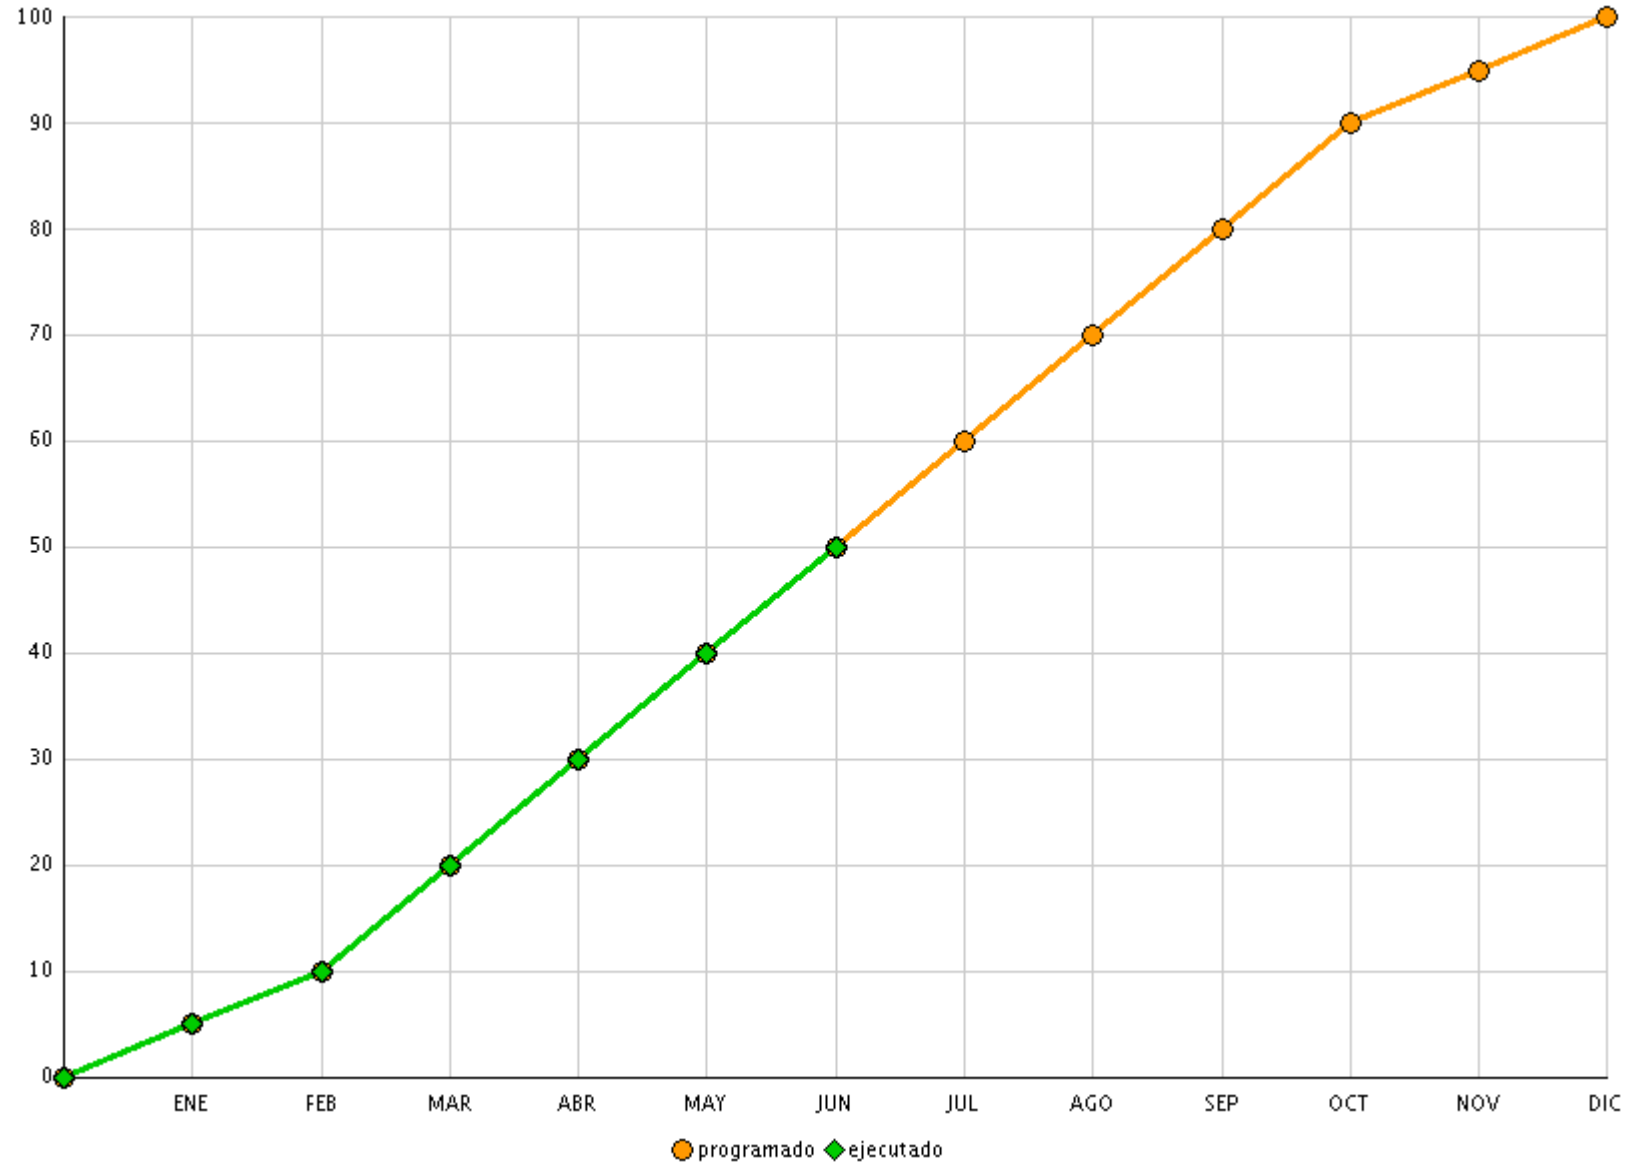


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7810 Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá

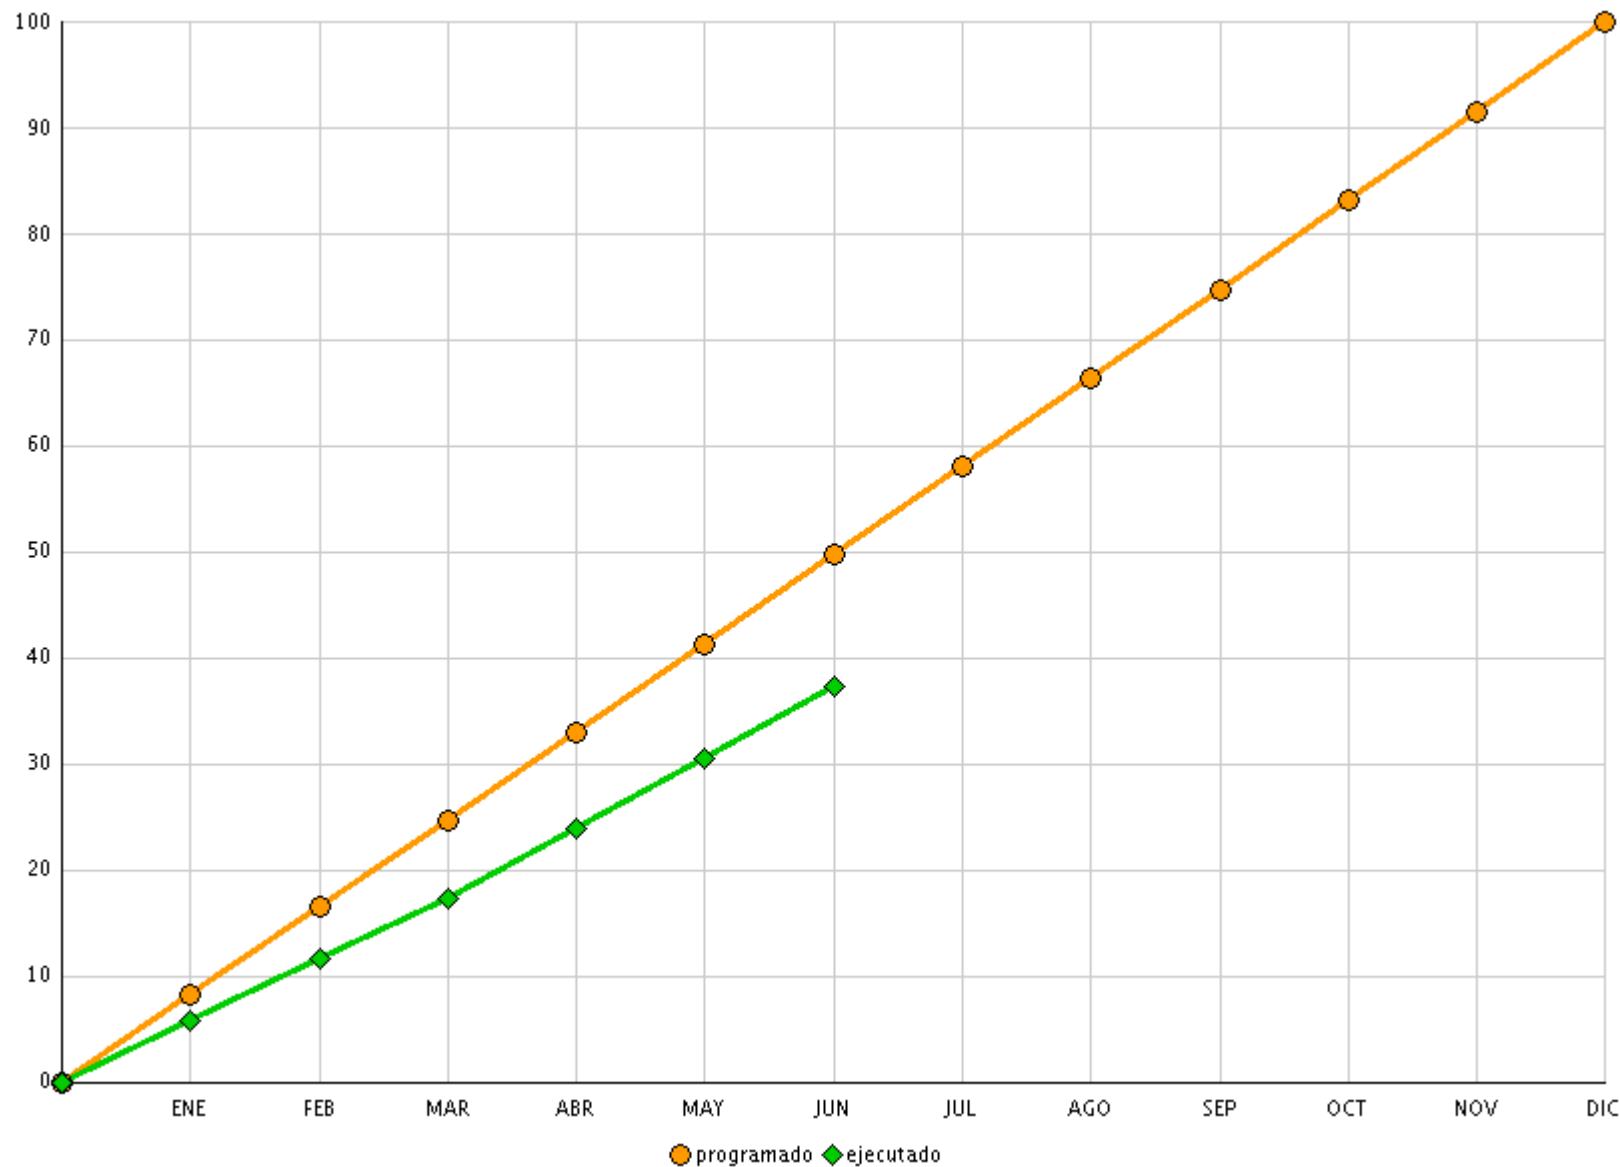


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.34	16.52	24.74	33.07	41.41	49.75	58.09	66.42	74.77	83.17	91.57	100.00
Ejecutado	5.84	11.62	17.34	24.01	30.63	37.30						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7812 Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá

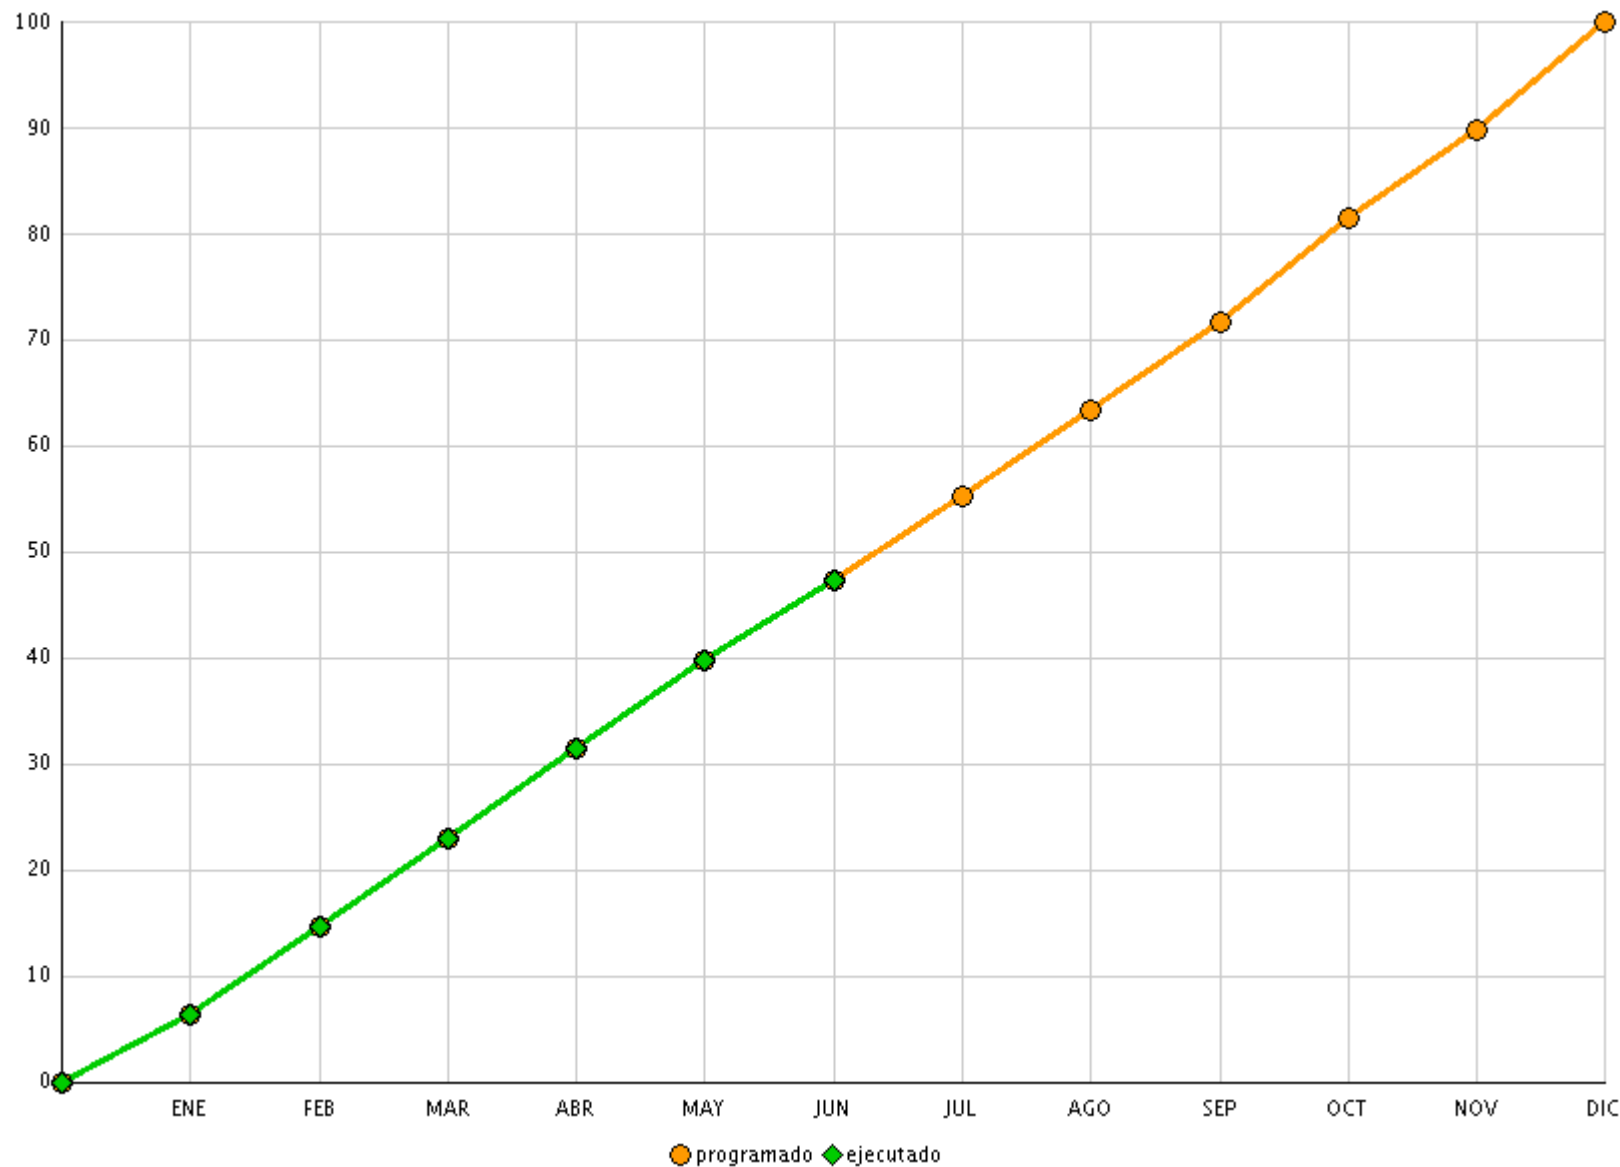


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.45	14.72	23.10	31.57	39.85	47.42	55.19	63.47	71.74	81.52	89.79	100.00
Ejecutado	6.45	14.72	23.10	31.44	39.78	47.42						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7815 Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá

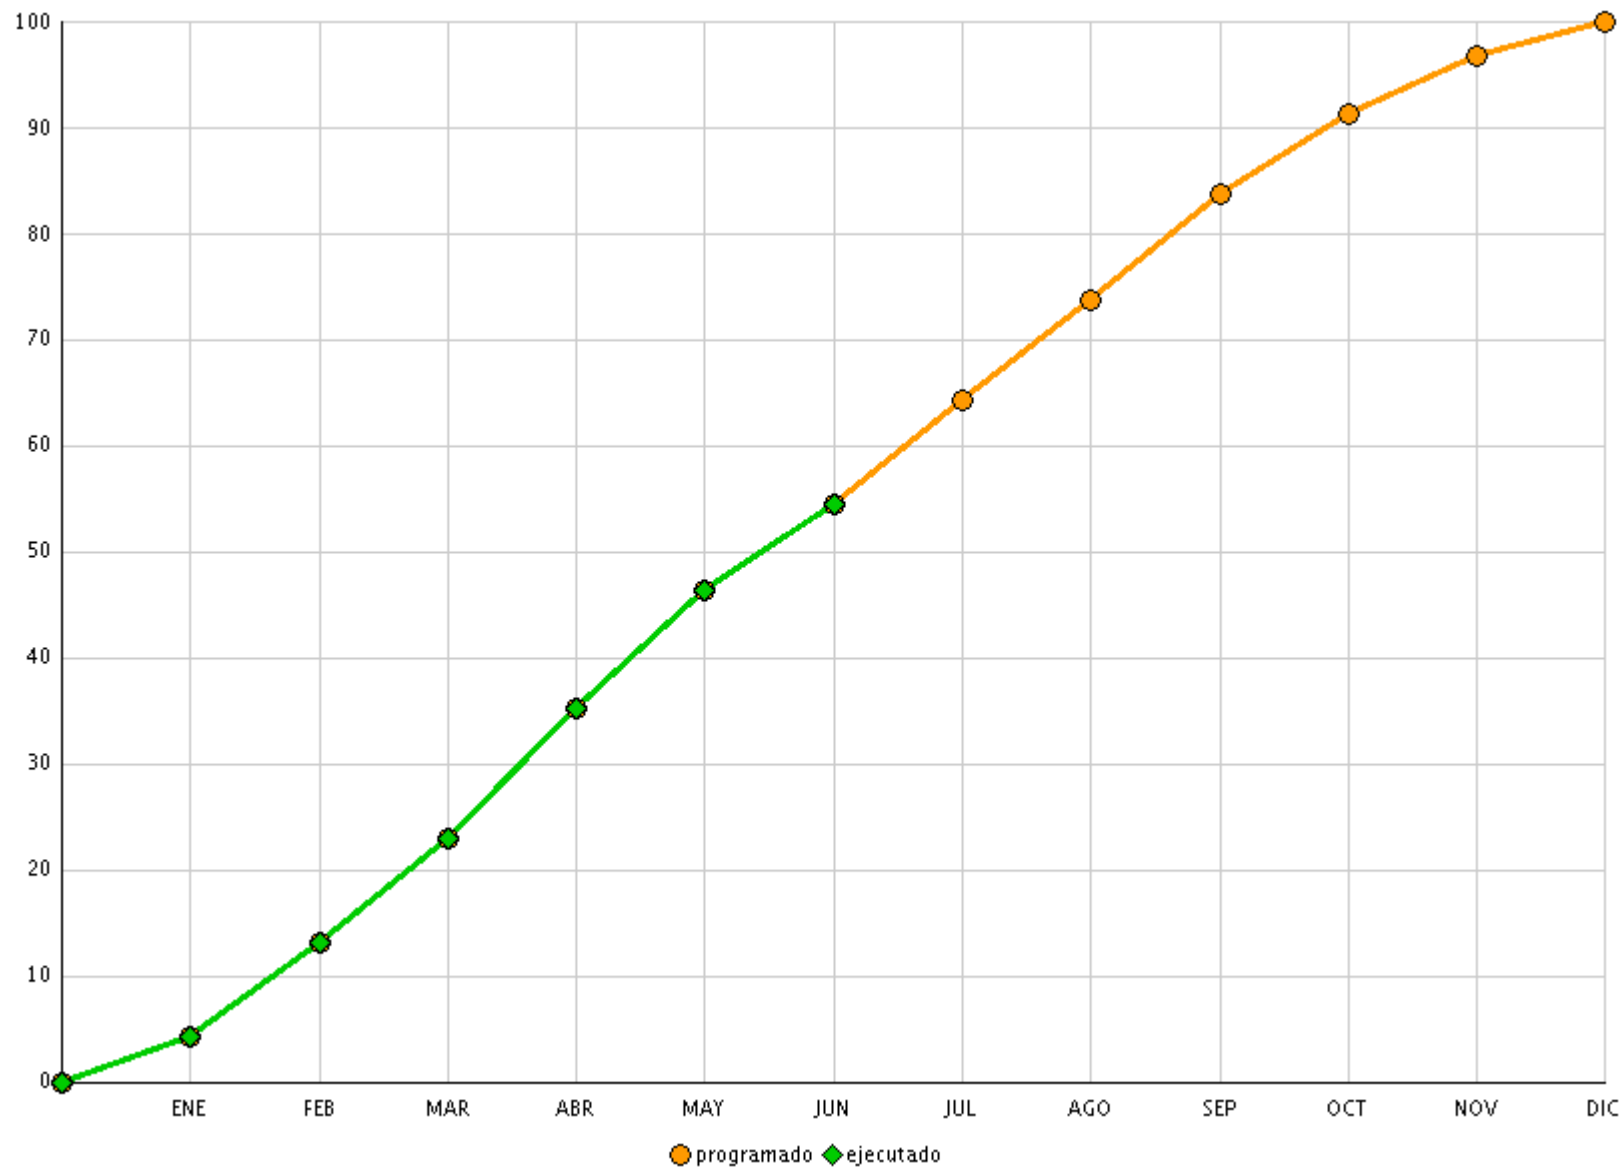


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.25	13.25	23.05	35.35	46.45	54.45	64.35	73.75	83.85	91.25	96.75	100.00
Ejecutado	4.25	13.25	23.05	35.35	46.45	54.45						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7823 Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.

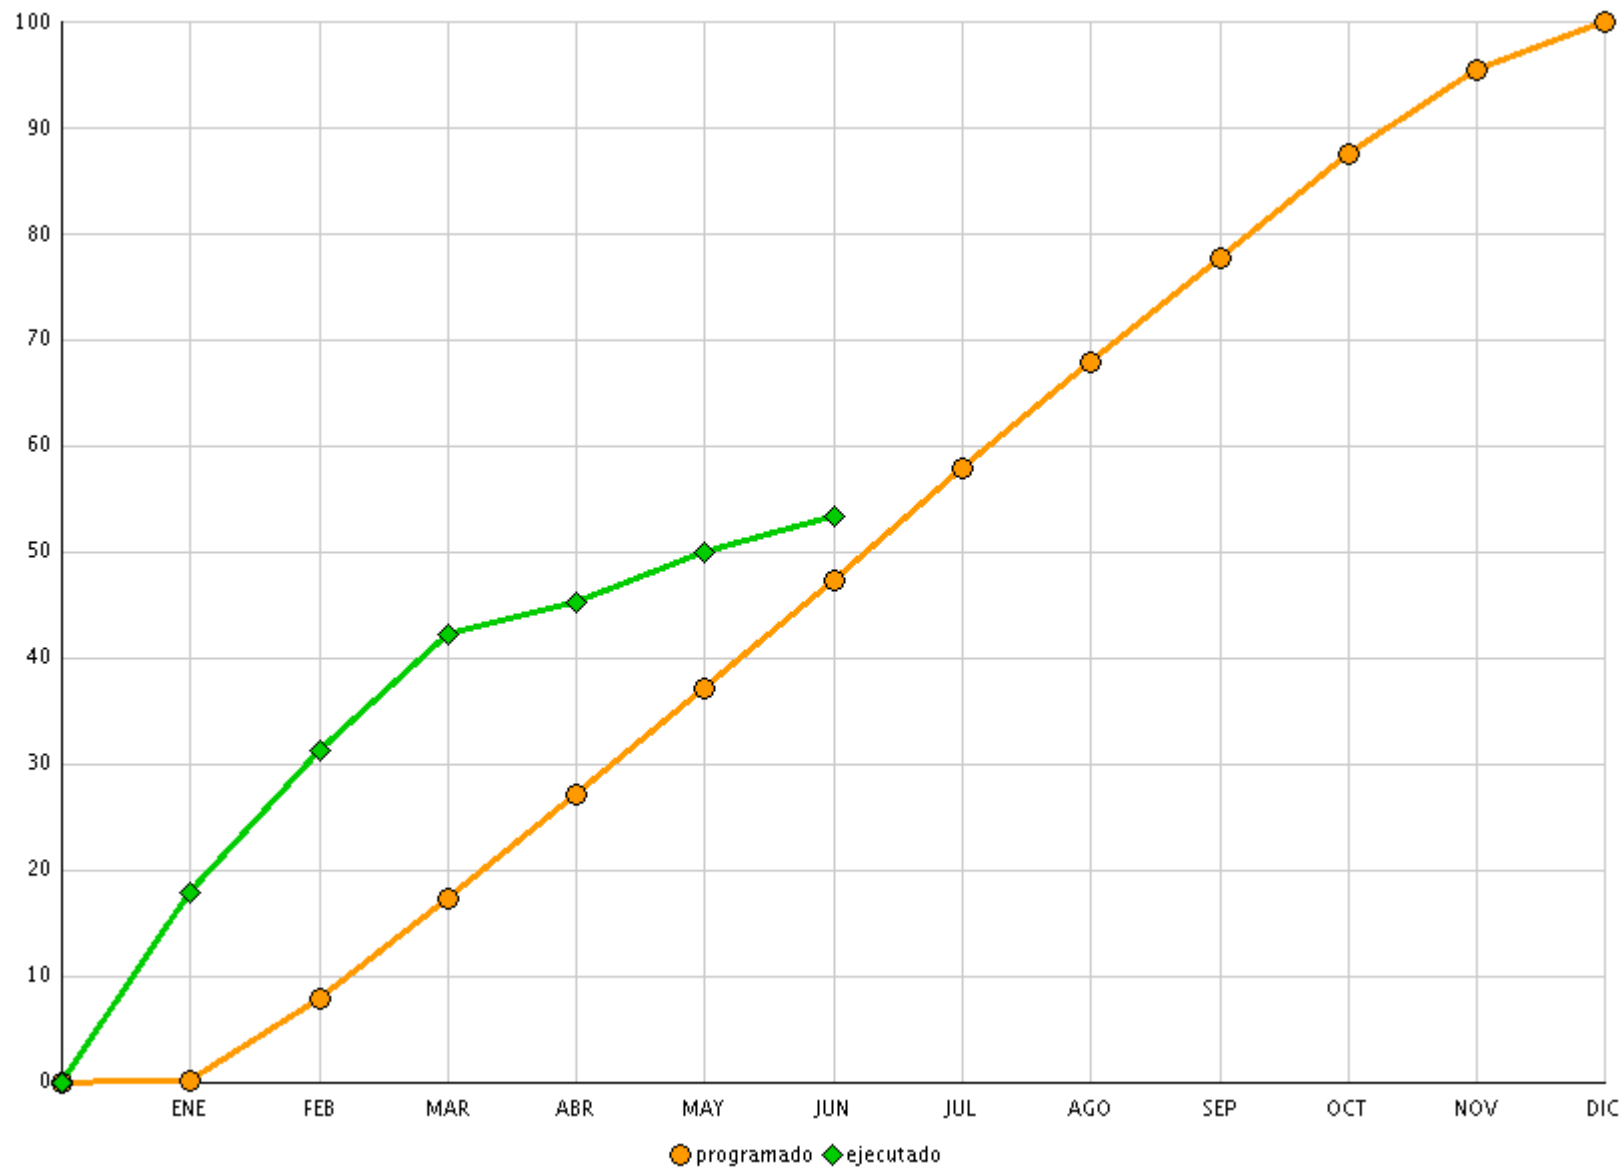


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.20	7.85	17.35	27.20	37.20	47.35	57.85	68.00	77.80	87.60	95.50	100.00
Ejecutado	18.00	31.35	42.35	45.25	50.00	53.40						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7825 Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá

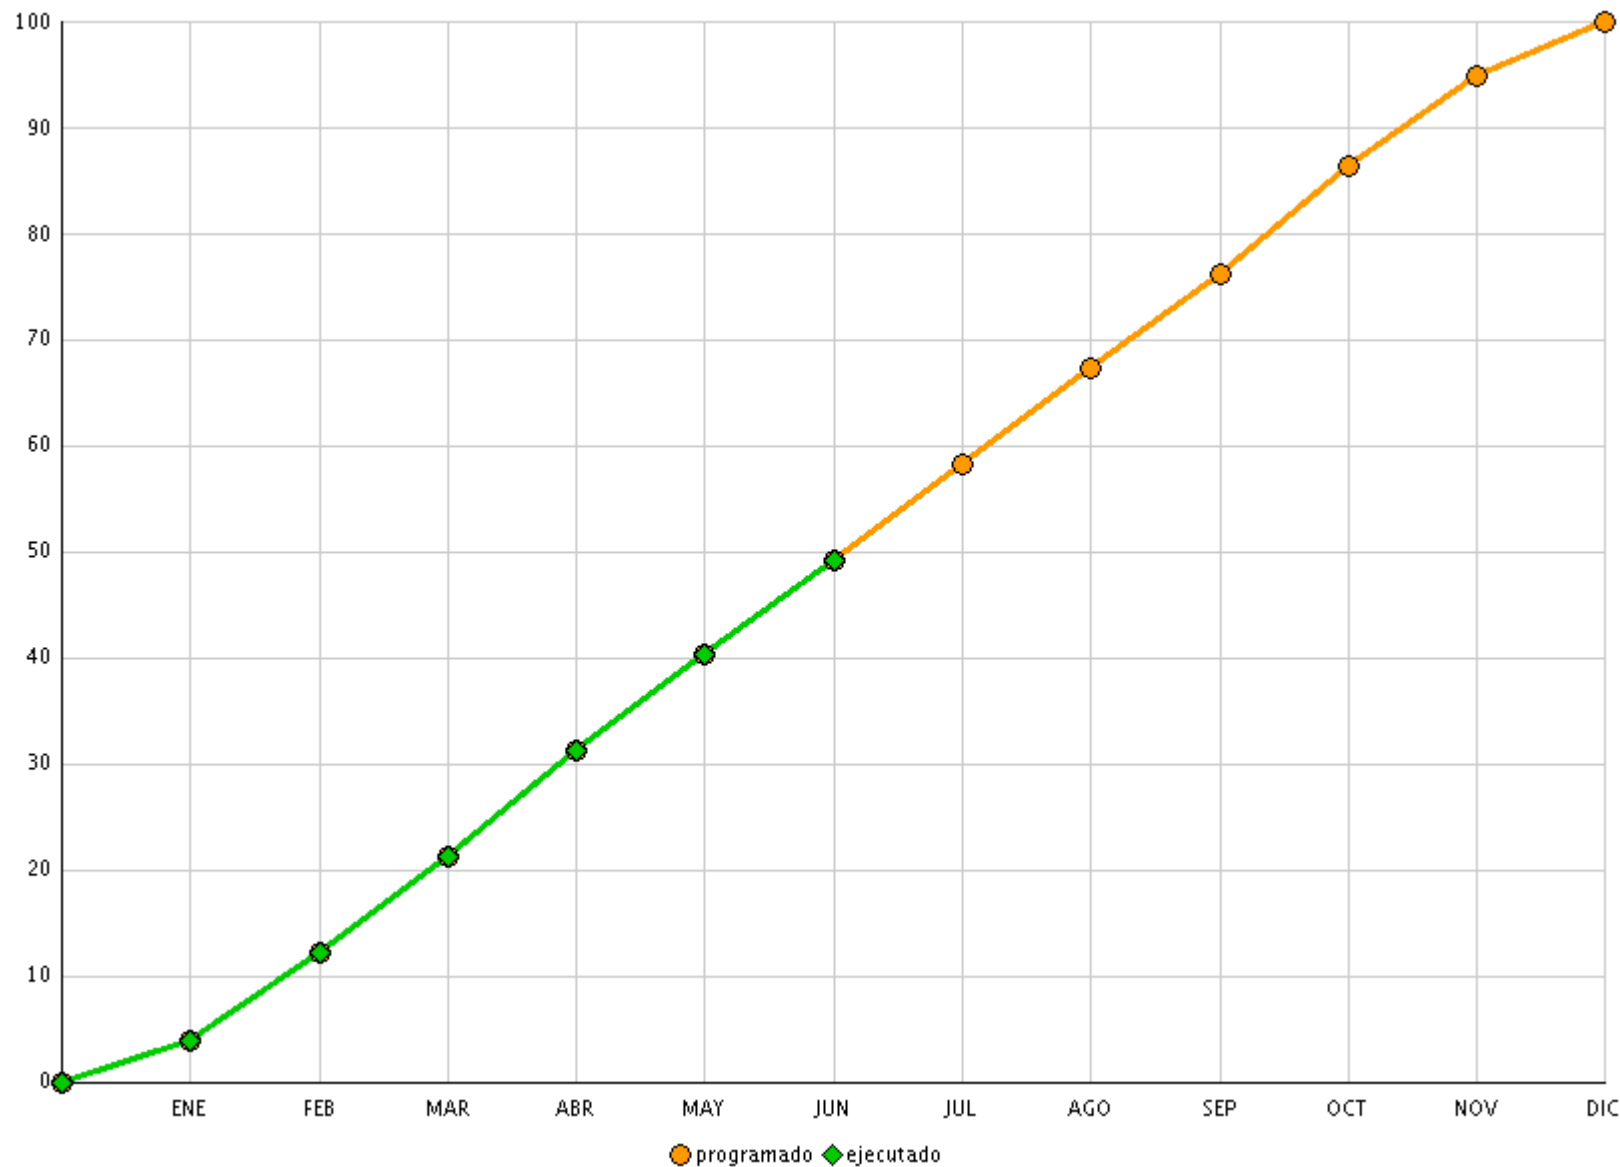


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.00	12.25	21.25	31.30	40.30	49.30	58.30	67.30	76.30	86.35	94.90	100.00
Ejecutado	4.00	12.25	21.25	31.30	40.30	49.30						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7836 Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá

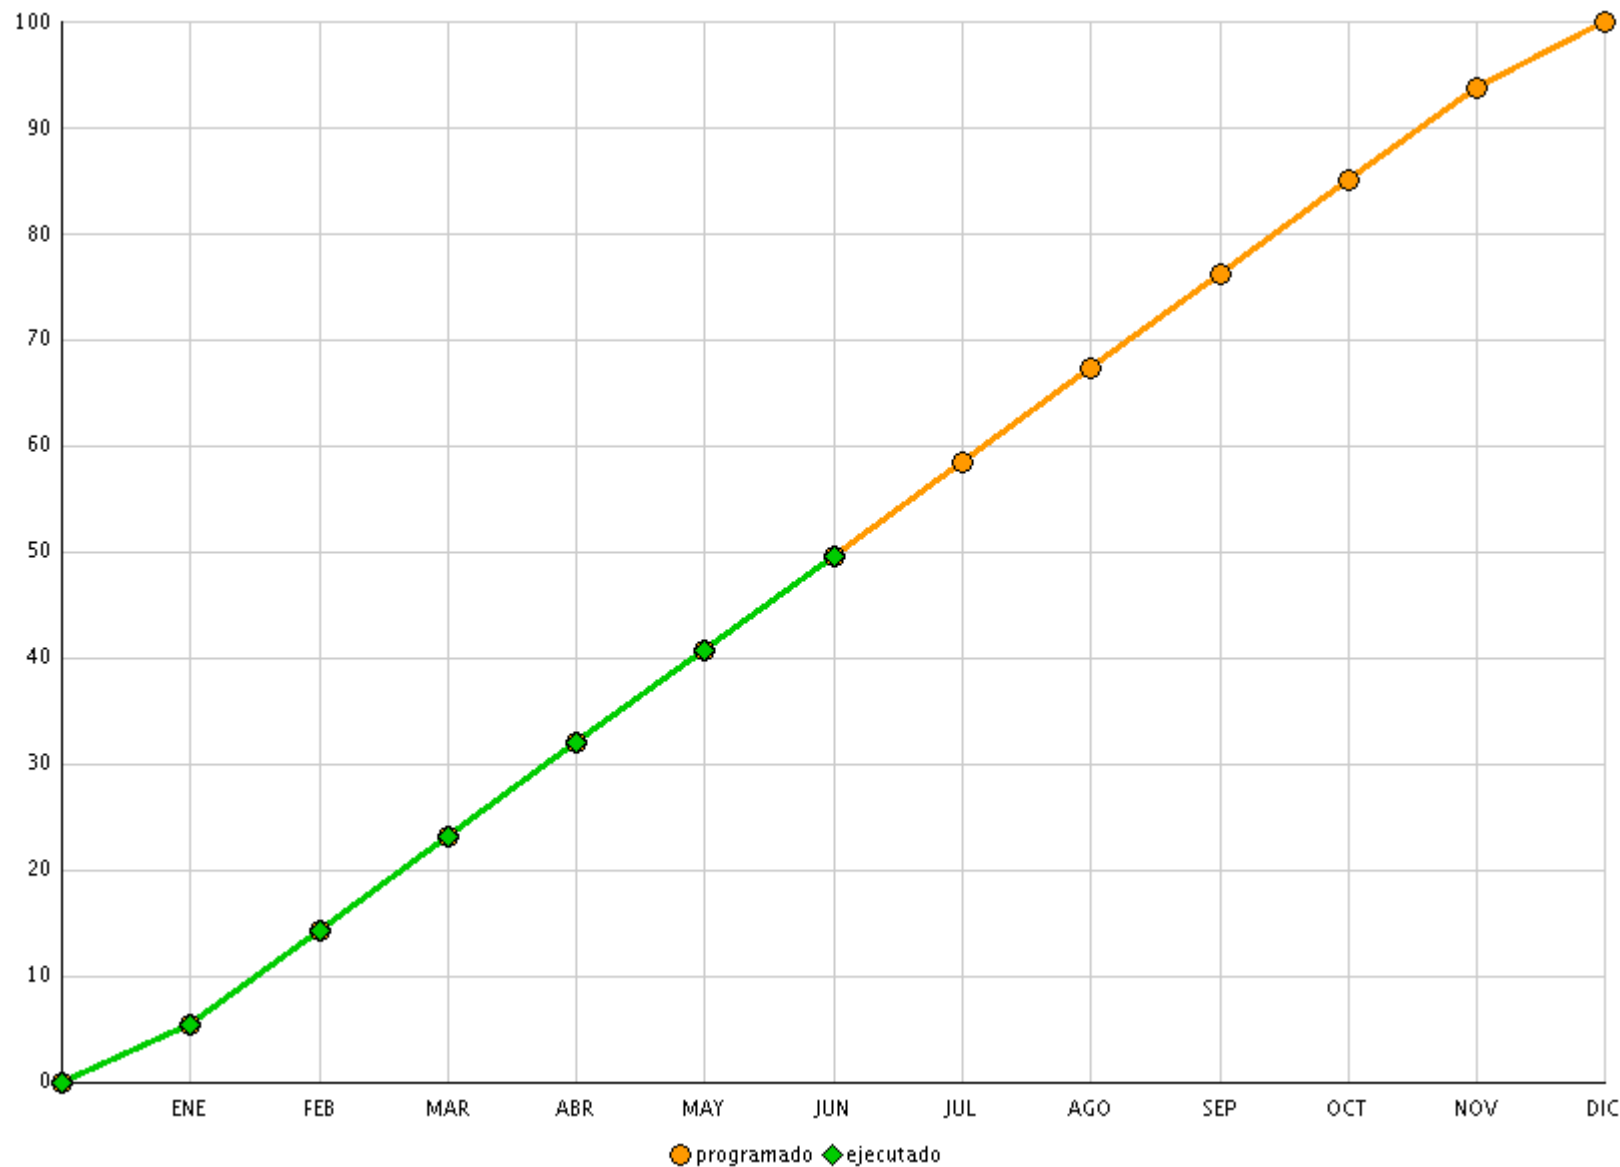

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.50	14.33	23.17	32.00	40.84	49.67	58.50	67.34	76.17	85.01	93.84	100.00
Ejecutado	5.50	14.33	23.17	32.00	40.84	49.67						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7575 38 Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	4.00
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TERRITORIOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	4.15	8.33	8.33	8.33	8.33	4.17		9.17		9.17		9.17		9.17		9.17		100.00	45.80	6.87
3.	APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL POT EN TERRITORIOS PRIORIZADOS	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.50
4.	CARACTERIZAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	2.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
5.	REALIZAR TALLERES DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN, GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
6.	CONSOLIDAR LOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN, GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.25
7.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERINSTITUCIONAL A LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN, GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	2.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.25
8.	APOYAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	2.00
9.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TERRITORIOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	15.00	8.33	8.33	8.33	7.17	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	4.17		9.17		9.17		9.17		9.17		9.17		100.00	48.82	7.32
10.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		70.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		80.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 27.19

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIAL PARA DESARROLLOS LEGALIZADOS SUSCEPTIBLES DE REGULARIZACIÓN.	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	3.00
2.	APOYAR LA ELABORACIÓN DEL INSUMO CARTOGRAFICO Y ESTUDIO DE ALTERACIONES, INCLUYENDO CONCEPTO DE ACEPTACIÓN CARTOGRAFICA DE LA SDP, PARA DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	6.00	6.67	6.67	6.67	6.67	13.33	13.33	6.67	6.67	6.67	6.67	13.33	13.33	6.67		6.67		13.30		6.67		6.67		6.68		100.00	53.34	3.20
3.	GESTIONAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES COMPETENTES Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	8.00	0.00	0.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	13.33		6.67		13.33		6.67		13.33		13.32		100.00	33.35	2.67
4.	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO JURÍDICO - CATASTRAL PARA DESARROLLOS LEGALIZADOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	6.00	0.00	0.00	6.67	6.67	13.33	13.33	6.67	6.67	6.67	6.67	13.33	13.33	6.67		6.67		13.33		6.67		6.67		13.32		100.00	46.67	2.80
5.	RADICAR LOS EXPEDIENTES URBANOS ANTE LA SDP PARA LOS DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	14.00	0.00	0.00	5.88	5.88	5.88	5.88	8.82	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	11.77		8.82		8.82		11.77		11.78		8.82		100.00	29.40	4.12
6.	REALIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA ASENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ADELANTAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	71.53	42.86	14.29	28.57	14.29	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.11	1.00
7.	APOYAR TÉCNICA Y SOCIALMENTE LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y LOS PLANOS DE LOTE0, INCLUYENDO CONCEPTO DE ACEPTACIÓN CARTOGRAFICA DE LA SDP, PARA SENTAMIENTOS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	28.57	42.86	14.29	28.57	57.14	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.00
8.	GESTIONAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES COMPETENTES PARA LOS ASENTAMIENTOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50		12.50		12.50		0.00		12.50		12.50		100.00	37.50	5.63
9.	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO JURÍDICO - CATASTRAL PARA ASENTAMIENTOS INFORMALES EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	7.69	15.38	15.38	15.38	15.38	7.69	7.69	0.00		0.00		0.00		0.00		30.77		23.09		100.00	46.14	5.54
10.	RADICAR LOS EXPEDIENTES URBANOS ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN SDP PARA ASENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ADELANTAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	20.00	0.00	0.00	1.90	6.00	5.70	0.00	7.50	0.00	3.80	3.80	11.30	3.80	15.10		9.40		9.40		13.20		18.90		3.80		100.00	13.60	2.72

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 42.67

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7582 23 Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS SUBSIDIOS DISTRITALES ASIGNADOS	35.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	17.43
2.	GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS CONVENIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
3.	VALIDAR LAS ESTRUCTURACIONES PARA LA ASIGNACIÓN LOS SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA PROGRESIVA	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	13.69	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12	15.10	0.00		0.00		31.18		0.00		0.00		19.01		100.00	34.10	11.94
4.	APOYAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	36.12		0.00		0.00		31.18		0.00		19.01		100.00	13.69	2.05
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										46.42

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7590 37 Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	8.00		8.00		9.00		8.00		6.00		14.00		100.00	47.00	9.40
2.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE EMBELLECIMIENTO CON COLOR Y CALLES MÁGICAS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	40.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		15.00		100.00	45.00	18.00
3.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL EN TEMAS HÁBITAT	40.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	19.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										46.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7602 31 Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG - MIPG 2022	5.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN DE ADECUACIÓN.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.30		0.00		0.00		0.00		33.40		100.00	33.30	3.33
3.	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG MIPG	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.30		0.00		0.00		0.00		33.40		100.00	33.30	1.67
4.	IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD	8.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	3.64
5.	IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN INTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD	8.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	3.64
6.	MONITOREAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORIA EXTERNA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	2.50
7.	SENSIBILIZAR LOS CONCEPTOS ISO 9001:2015 A LA SDHT	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		100.00	45.00	2.25
8.	EJECUTAR AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	ASESORAR LOS TRÁMITES PRESUPUESTALES PARA LLEVAR ACABO MODIFICACIONES, TRASLADOS ENTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ADICIONES Y/O REDUCCIONES EN LOS PLANES DE CONTRATACIÓN Y FORMULACIONES	10.00	8.00	8.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		8.00		100.00	50.00	5.00
10.	ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA SDHT EN LA ELABORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT AJUSTÁNDOSE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		100.00	5.00	0.50
11.	ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ÁREAS DE LA SDHT EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SUS COMPONENTES DE INVERSIÓN, GESTIÓN,	10.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.40	8.30	8.20	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.40		8.40		100.00	50.00	5.00
12.	EJECUTAR AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.25
13.	EJECUTAR AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDHT SEGÚN LA NORMA ISO 14001:2015	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 34.77

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7606 26 Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. REALIZAR EL MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1712 DE 2014 Y OTRAS NORMAS RELACIONADAS CON LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	30.00	11.11	11.11	4.76	4.76	7.94	7.94	14.29	14.29	6.35	6.35	4.76	4.76	9.52		6.35		7.94		11.11		6.35		9.52		100.00	49.21	14.76		
2. EJECUTAR UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO ENTRE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SDHT	24.00	3.85	3.85	7.69	7.69	15.38	15.38	7.69	7.69	7.69	7.69	19.23	19.23	7.69		7.69		7.69		11.54		3.86		0.00		100.00	61.53	14.77		
3. COMPLETAR EL 100% DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO ENFOCADO EN LA PROMOCIÓN INTERNA DE LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR	11.00	0.00	0.00	14.29	14.29	14.29	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	14.29	7.29	0.00		14.29		0.00		14.29		0.00		14.26		100.00	35.87	3.95		
4. AVANZAR EN EL 50% EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR	11.00	0.00	0.00	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	7.14	7.14	7.14		7.14		7.14		7.14		7.14		0.00		100.00	64.30	7.07		
5. EJECUTAR LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN PERMANENTE DE CUENTAS.	24.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	13.64	7.64	9.09	15.09	9.09	7.09	13.64		9.09		4.55		9.09		0.00		4.54		100.00	57.09	13.70		
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									54.25	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7615 22 Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULAR LA BATERÍA DE INDICADORES REQUERIDA PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.50
2.	CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	6.60
3.	DESARROLLAR EL COMPONENTE TÉCNICO EL CUAL SE ORIENTA A LA DEFINICIÓN, PRIORIZACIÓN, VALORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ADEMÁS DE LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS	13.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	5.85
4.	DESARROLLAR EL COMPONENTE ORGANIZACIONAL EL CUAL SE ORIENTA AL SEGUIMIENTO Y ASESORÍA AL ESTADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN SUS COMPONENTES	13.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	5.85
5.	DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL ENCAMINADAS AL RECONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO Y DE	13.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	5.85
6.	FORMULAR EL DOCUMENTO DE ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUIDA LA CONCERTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS	13.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	11.70
7.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONJUNTAMENTE CON EL DESARROLLO DE OTRAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN RELACIONADOS CON SERVICIOS	13.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		16.00		16.00		16.00		16.00		15.00		100.00	18.00	2.34
8.	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE APROVECHAMIENTO	13.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	5.85

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 49.54

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7618 20 Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADELANTAR LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 924-2021 A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE SUS COMPONENTES DE CALIDAD Y	25.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	11.75
2.	EVALUAR LAS PRÁCTICAS APLICABLES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE USUARIOS Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	25.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		10.00		10.00		8.00		0.00		0.00		100.00	57.00	14.25
3.	DEFINIR MEDIANTE UN DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE - DTS EL DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES Y PARÁMETROS DE USUARIOS Y REDES DE	25.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	12.50
4.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 924-2021 EN SU COMPONENTE TÉCNICO	25.00	2.00	2.00	6.00	6.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		6.00		100.00	46.00	11.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7641 37 Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GENERAR	LOS	INSUMOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00	25.00	0.00	0.00	5.00	5.00	35.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	16.50
2.	REALIZAR	SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.		70.00	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	35.00
Total ponderación vertical				100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										51.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7642 36 Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
2.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	17.00	17.00	3.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	32.00	8.00
3.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE OBRA E INTERVENTORIA.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	10.00	4.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							42.50			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7645 34 Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
2.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		60.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	GENERAR LOS INSUMOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	4.00	4.00	0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		60.00		100.00	10.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										25.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7659 23 Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.40
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS VIVIENDAS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS.	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		7.00		100.00	43.00	0.86
4.	GENERAR LOS INSUMOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
5.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBR DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	9.00
6.	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS VIVIENDAS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS.	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.00
7.	GENERAR LOS INSUMOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
8.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA RURAL.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00		25.00		25.00		25.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
10.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11.	CUMPLIR EL 100 % DEL PAGO DE LA SENTENCIA JUDICIAL CON NÚMERO DE RADICACIÓN 25000-23-42-000-2016-03222-01.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 36.26

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7715 21 Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS VIVIENDAS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS	20.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.70	8.40	10.43	9.04	10.43	11.74	10.43	11.82	10.43		8.52		8.70		8.70		7.83		7.83		100.00	49.00	9.80
2.	DESARROLLAR MESA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA ESTRUCTURACIÓN E IDENTIFICACIÓN	7.00	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	8.00	20.22	8.20	10.43	10.43	0.00	18.96	20.87		0.00		19.13		0.00		10.00		7.53		100.00	57.41	4.02
3.	APOYAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	16.70	4.84	16.70	16.70	0.00	0.00	16.70		0.00		16.70		0.00		16.60		16.60		100.00	33.36	1.00
4.	APOYAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	10.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	7.50
5.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	40.00	13.95	13.95	20.93	20.93	16.28	16.28	0.00	10.86	0.00	7.46	0.00	8.14	6.10		6.10		12.21		12.21		6.10		6.12		100.00	77.62	31.05
6.	APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN DE HOGARES PARA INTERVENCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	9.00
7.	APOYAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										62.37

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7721 31 Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR	LA	POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL HÁBITAT	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
2.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DEL SECTOR HÁBITAT			10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
3.	ASISTIR A LOS ESPACIOS POBLACIONALES DEL ORDEN DISTRITAL DESIGNADOS Y GENERAR LINEAMIENTOS QUE INCORPOREN LOS DIFERENTES ENFOQUES POBLACIONALES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POBLACIONALES.			10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
4.	ELABORAR UN DOCUMENTO NORMATIVO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ACORDES CON LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT DEL DISTRITO			20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00			8.00		14.00		14.00		11.00		7.00		100.00	38.00	7.60
5.	ELABORAR ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS, ESTRATEGÍAS Y POLITÍTIICAS DEL SECTOR HÁBITAT.			20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00			8.00		14.00		14.00		11.00		7.00		100.00	38.00	7.60
6.	ELABORAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN Y ACCESO A SOLUCIONES HABITACIONALES			20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00			8.00		14.00		14.00		11.00		7.00		100.00	38.00	7.60
Total ponderación vertical				100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										42.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7728 21 Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN REPOSITORIO DE INFORMACIÓN MISIONAL Y ESTRATÉGICA DEL SECTOR ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD Y GOBIERNO DIGITAL.	20.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	9.40
2.	ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL HÁBITAT DEL DISTRITO CAPITAL.	15.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	7.05
3.	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD Y EL SECTOR, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD Y GOBIERNO DIGITAL, QUE CONTRIBUYAN A LA ESTANDARIZACIÓN	25.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	11.75
4.	FORTALECER LA BATERÍA DE INDICADORES DE CIUDAD	25.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	11.75
5.	ELABORAR BOLETINES CON LA INFORMACIÓN MISIONAL Y ESTRATEGICA DEL SECTOR, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	15.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	7.05
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7747 30 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LOS AJUSTES Y MANTENIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA (MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS)	4.00	2.00	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		4.00		100.00	53.00	2.12
2.	BRINDAR EL 100% DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO REMITIDAS POR LA CVP A LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	50.00	3.00
3.	REALIZAR LOS AJUSTES Y MANTENIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA (PLATAFORMA TRÁMITES)	15.00	2.00	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		4.00		100.00	53.00	7.95
4.	GARANTIZAR EL 99% DE DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	50.00	7.50
5.	PRESENTAR DOCUMENTOS DE PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN Y/O RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA CADENA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	49.98	4.00
6.	EFFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES VIP Y VIS, Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DISTRITO	14.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	49.98	7.00
7.	BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE LA PROMOCIÓN, USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA Y/O GESTIÓN DE TRÁMITES, DIRIGIDAS A ENTIDADES Y/O PROMOTORES Y/O CONSTRUCTORES DE VIVIENDA	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	49.98	4.00
8.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE SEAN INSUMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	50.00	2.00
9.	SOPORTAR FUNCIONALMENTE AL 100% DE USUARIOS DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA, QUE LO REQUIERAN	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	50.00	3.00
10.	REPORTAR LAS UNIDADES DE VIVIENDA VIP Y VIS, EN EL ESQUEMA DE MESA DE SOLUCIONES PROMOVIDAS PARA SU INICIACION	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.57

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7754 30 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	6.00
2. MANTENER LAS CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	4.00
3. ESTANDARIZAR LA OFERTA DE SERVICIOS Y SU CALIDAD ENTRE CANALES, ENTIDADES Y SERVIDORES(AS)	6.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	2.82
4. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES (AS)	8.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	3.76
5. UTILIZAR EVIDENCIA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA PARA LA TOMA DE DECISIONES	6.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	2.82
6. IMPLEMENTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE CORRESPONDENCIA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
7. IMPLEMENTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ARCHIVÍSTICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (LEY 594 DE 2000)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
8. IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE SOPORTE AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
9. EJECUTAR LOS PROGRAMAS ESENCIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN EL PINAR, SIC Y EN EL SGDEA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
10. IMPLEMENTAR (SACAR A PRODUCCIÓN) EL PORTAL WEB CONTRATISTAS EN EL APLICATIVO JSP7 PARA EL TRAMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, RADICADAS EN LA SDHT.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
11. ACTUALIZAR EL ANEXO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGOS, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
12. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE FORMULADO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
13. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS NIVELES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE VIGENCIA Y RESERVA	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.35		8.35		100.00	49.98	2.00
14. ADELANTAR ACCIONES PARA DEPURAR LOS PASIVOS EXIGIBLES DE LA SECRETARÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
15. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
16. IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TALENTO HUMANO QUE REQUIERAN SER MODIFICADOS O CREADOS	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	2.50
17. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO, POLITICA Y DEMÁS SOPORTES DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN LA ENTIDAD.	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	2.50
18. MANTENER EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	5.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7754 30 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
VIGENTE																													
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								50.90	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7798 34 Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
Año	IPC													
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
TOTAL						\$0					REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE PROMOVER LA INICIACIÓN DE VIVIENDA VIS	7.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	3.29
2.	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE PROMOVER LA INICIACIÓN DE VIVIENDA VIP	4.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	1.88
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LOS CUALES SE GENERAN INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN, QUE PERMITEN EL REPORTE DE SUELO	6.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		2.00		8.00		100.00	50.00	3.00
4.	HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES PARCIALES ADOPTADOS CON SUELO DISPONIBLE PARA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS POR MEDIO DE VISITAS EN CAMPO, ESTABLECIENDO EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	18.00	0.00		0.00		0.00		16.00		16.00		18.00		100.00	50.00	1.00
5.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE GENERAN A PARTIR DE LA ESTRUCTURACIÓN Y/O APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	6.00
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES QUE PERMITAN VIABILIZAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE HABILITAN SUELO DISPONIBLE PARA VIVIENDA Y USOS COMPLEMENTARIOS	36.00	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		7.00		3.00		100.00	50.00	18.00
7.	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS CON SUELO DISPONIBLE PARA VIVIENDA EN EL MARCO DEL PDD	31.00	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		7.00		3.00		100.00	50.00	15.50
8.	REALIZAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA ADOPCIÓN Y EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE DECLARATORIA	2.00	20.00	20.00	32.00	32.00	20.00	20.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	93.00	1.86
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.53

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7802 23 Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	RECOPILAR LA INFORMACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES DE INSTANCIAS REGIONALES.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
2.	ELABORAR UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE ARTICULACIÓN REGIONAL	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
3.	CLASIFICAR LA INFORMACIÓN DEL SUELO (DISPONIBLE Y VACANTE) EN LA CIUDAD REGIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
4.	ANÁLIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS SECTORES O ZONAS A PARTIR DE LA CONCENTRACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA EN VIVIENDA O PROYECTOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA BOGOTÁ-REGIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
5.	ELABORAR ANÁLISIS RELACIONADOS CON LA DINÁMICA DEL MERCADO DEL SUELO EN LA CIUDAD REGIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7810 19 Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR COMENTARIOS A LOS PROYECTOS DE LEY, DECRETO, ACUERDO Y RESOLUCIONES COMPETENCIA DEL SECTOR Y DE LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 012	35.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.00	8.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.35		8.42		8.42		8.44		100.00	49.69	17.39
2.	REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO CON CÓDIGO PS06-PR06-V4	15.00	8.34	0.00	8.00	0.00	8.33	0.00	8.34	16.68	8.34	16.34	8.34	16.67	8.34		8.34		8.35		8.42		8.42		8.44		100.00	49.69	7.45
3.	ATENDER EL TOTAL DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE SE FORMULEN EN EL CICLO DE DEFENSA JUDICIAL, BUSCANDO MANTENER EL ÉXITO PROCESAL POR ENCIMA DEL 90%	15.00	8.34	8.34	8.00	8.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.35		8.42		8.42		8.44		100.00	49.69	7.45
4.	EXPEDIR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS Y DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN COMPETENCIA DE LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS LEGALES	15.00	8.34	0.00	8.00	0.00	8.33	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34		8.34		8.35		8.42		8.42		8.44		100.00	0.00	0.00
5.	IDENTIFICAR LOS TEMAS, ASUNTOS Y SITUACIONES QUE REQUIERAN UNIFICACIÓN DE CRITERIOS O PRECISIÓN NORMATIVA.	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	2.50
6.	REALIZAR EL TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA.	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	2.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							37.30			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7812 32 Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2022		AVANCE A: 30/06/2022																											
ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR VISITAS MENSUALES A POLIGONOS DE MONITOREO	15.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	50.00	7.50
2.	REPORTAR A LA ALCALDÍA LOCAL, LAS NUEVAS OCUPACIONES O CAMBIOS DE ESTADO DE LAS EXISTENTES, PARA QUE ESTA EJERZA LAS LABORES DE CONTROL URBANÍSTICO PROPIAS DE SU COMPETENCIA	10.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	50.00	5.00
3.	GENERAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ÁREAS DONDE EXISTE LA PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS ILEGALES	10.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	50.00	5.00
4.	EMITIR LA DECISIÓN DE FONDO DE LAS INVESTIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE REGULAN EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN LOS TÉRMINOS DE LEY	15.00	5.00	5.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75		8.75		8.75		8.75		8.75		7.50		100.00	48.75	7.31
5.	REALIZAR EL OFICIO DE RESPUESTA A LOS PROYECTOS RADICADOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEY	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	7.50
6.	REALIZAR EL OFICIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	7.50
7.	EMITIR LA DECISIÓN DE FONDO DE LAS INVESTIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE REGULAN LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN LOS TÉRMINOS DE LEY	15.00	5.00	5.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75		8.75		8.75		8.75		8.75		7.50		100.00	48.75	7.31
8.	REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA T333/21	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.34	10.00		0.00		0.00		75.00		0.00		0.00		100.00	15.00	0.30
9.	EJECUTAR OBRA PARA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DE ACCESIBILIDAD RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T333/21	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							47.42			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7815 23 Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LAS MEJORAS Y MODIFICACIONES EN 3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE LA SDHT.	20.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		12.00		5.00		100.00	43.00	8.60
2.	DEFINICIÓN DETALLADA ESTÁNDARES DE DESARROLLO Y METODOLOGÍAS DE SOFTWARE PARA LA SDHT.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3.	DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE SALIDA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL	5.00	10.00	10.00	40.00	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
4.	DESARROLLO ARQUITECTURAS DE INFORMACIÓN Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SDHT	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	60.00	6.00
5.	AUMENTAR EL GRADO DE AVANCE DEL PHVA DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA SDHT.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
6.	DEFINIR E IMPLMENTAR EL BUS DE INTEROPERABILIDAD O MECANISMOS DE INTEROPERABILIDAD INTERNOS DE LA SDHT	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	1.60
7.	DESARROLLAR DOCUMENTO SOBRE LANGUAGE DE INTERCAMBIO COMUN DE DATOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		30.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8.	DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD EN LAS ÁREAS QUE SE REQUIERA	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	50.00	5.00
9.	DISEÑAR LA ARQUITECTURA DE REFERENCIA ANALÍTICA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	10.00	10.00	10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	65.00	5.20
10.	DEFINIR Y DESARROLLAR EL REPOSITORIO DE DATOS O LAGO DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00		20.00		30.00		10.00		10.00		5.00		100.00	10.00	1.20
11.	ADQUISICIÓN DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE ANALÍTICA, ESTADÍSTICA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGÁFICA	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
12.	DISEÑAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	2.80
13.	REALIZAR CIERRE DE BRECHAS DE VULNERABILIDADES	4.00	10.00	10.00	30.00	30.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
14.	GARANTIZAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										54.45

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7823 35 Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS AHORROS A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MI AHORRO, MI HOGAR	5.00	4.00	0.00	5.00	5.00	11.00	11.00	12.00	11.00	14.00	14.00	15.00	0.00	15.00		8.00		8.00		8.00		0.00		0.00		100.00	41.00	2.05
2.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS HOGARES Y POSTERIOR ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO DEL PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	5.00	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00	17.00	11.00	11.00	12.00	15.00	14.00	14.00	15.00		15.00		8.00		8.00		8.00		0.00		100.00	61.00	3.05
3.	ASIGNAR SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	15.00	10.00	1.00	10.00	2.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	18.00	5.40
4.	ASIGNAR SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CONVENIOS Y COMITÉ DE ELEGIBILIDAD	30.00	0.00	16.00	9.00	0.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	44.00	13.20
5.	ASIGNAR SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN COMPLEMENTARIEDAD CON EL SUBSIDIO DE VIVIENDA OTORGADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN BOGOTÁ EN EL MARCO	30.00	0.00	44.00	10.00	43.00	10.00	12.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	99.00	29.70
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									53.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7825 28 Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC													
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
TOTAL						\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR ALIANZAS CON AGENTES ACADÉMICOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE HÁBITAT EN UN MARCO DE INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.75
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TÉCNICO Y OPERATIVO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA HOGARES DE BAJOS INGRESOS.	15.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	7.50
3.	DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA CAPTAR RECURSOS CON EL OBJETO DE FINANCIAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR HÁBITAT.	15.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	7.50
4.	DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON EL SECTOR PRIVADO PARA CAPTAR RECURSOS CON EL OBJETO DE FINANCIAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR HÁBITAT.	15.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	7.50
5.	REALIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA SOLUCIONES HABITACIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA AGENDA URBANA.	15.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		15.00		5.00		5.00		100.00	51.00	7.65
6.	DESARROLLAR INTERVENCIONES INTEGRALES DE URBANISMO TÁCTICO CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO.	15.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	7.50
7.	APOYAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA BOGOTÁ, EL MEJOR HOGAR PARA LAS MUJERES, COMO UNA APUESTA DE LA CIUDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VALOR PÚBLICO COMPARTIDO ENTRE EL GOBIERNO DE BOGOTÁ	10.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		6.00		100.00	49.00	4.90
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										49.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7836 30 Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORAR FULLES DE DECLARACIONES, NOTAS WEB, VIDEOS, BOLETINES DE PRENSA, PODCASTS, PROGRAMAS DE RADIO, INFOGRAFÍAS, SINERGIAS Y EVENTOS	30.00	5.50	5.50	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89			8.89		8.89		8.89		8.89		5.60		100.00	49.95	14.99
2.	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTRATEGIAS DIGITALES POR LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA SDHT	20.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00			9.00		9.00		9.00		9.00		6.00		100.00	49.00	9.80
3.	ATENDER LAS NECESIDADES COMUNICACIONALES DE LAS ÁREAS DE LA SDHT Y DISEÑAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN CON INFORMACIÓN DE INTERÉS	20.00	7.00	7.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50			8.50		8.50		8.50		8.50		8.00		100.00	49.50	9.90
4.	REALIZAR ACCIONES DE CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN TERRITORIO	15.00	5.50	5.50	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89			8.89		8.89		8.89		8.89		5.60		100.00	49.95	7.49
5.	REALIZAR EL DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS, PRODUCTOS AUDIOVISUALES, GALERÍAS DE FOTOS, NOTAS WEB, PARA LA DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA SDHT	15.00	5.50	5.50	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89			8.89		8.89		8.89		8.89		5.60		100.00	49.95	7.49
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										49.67

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7610 Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá

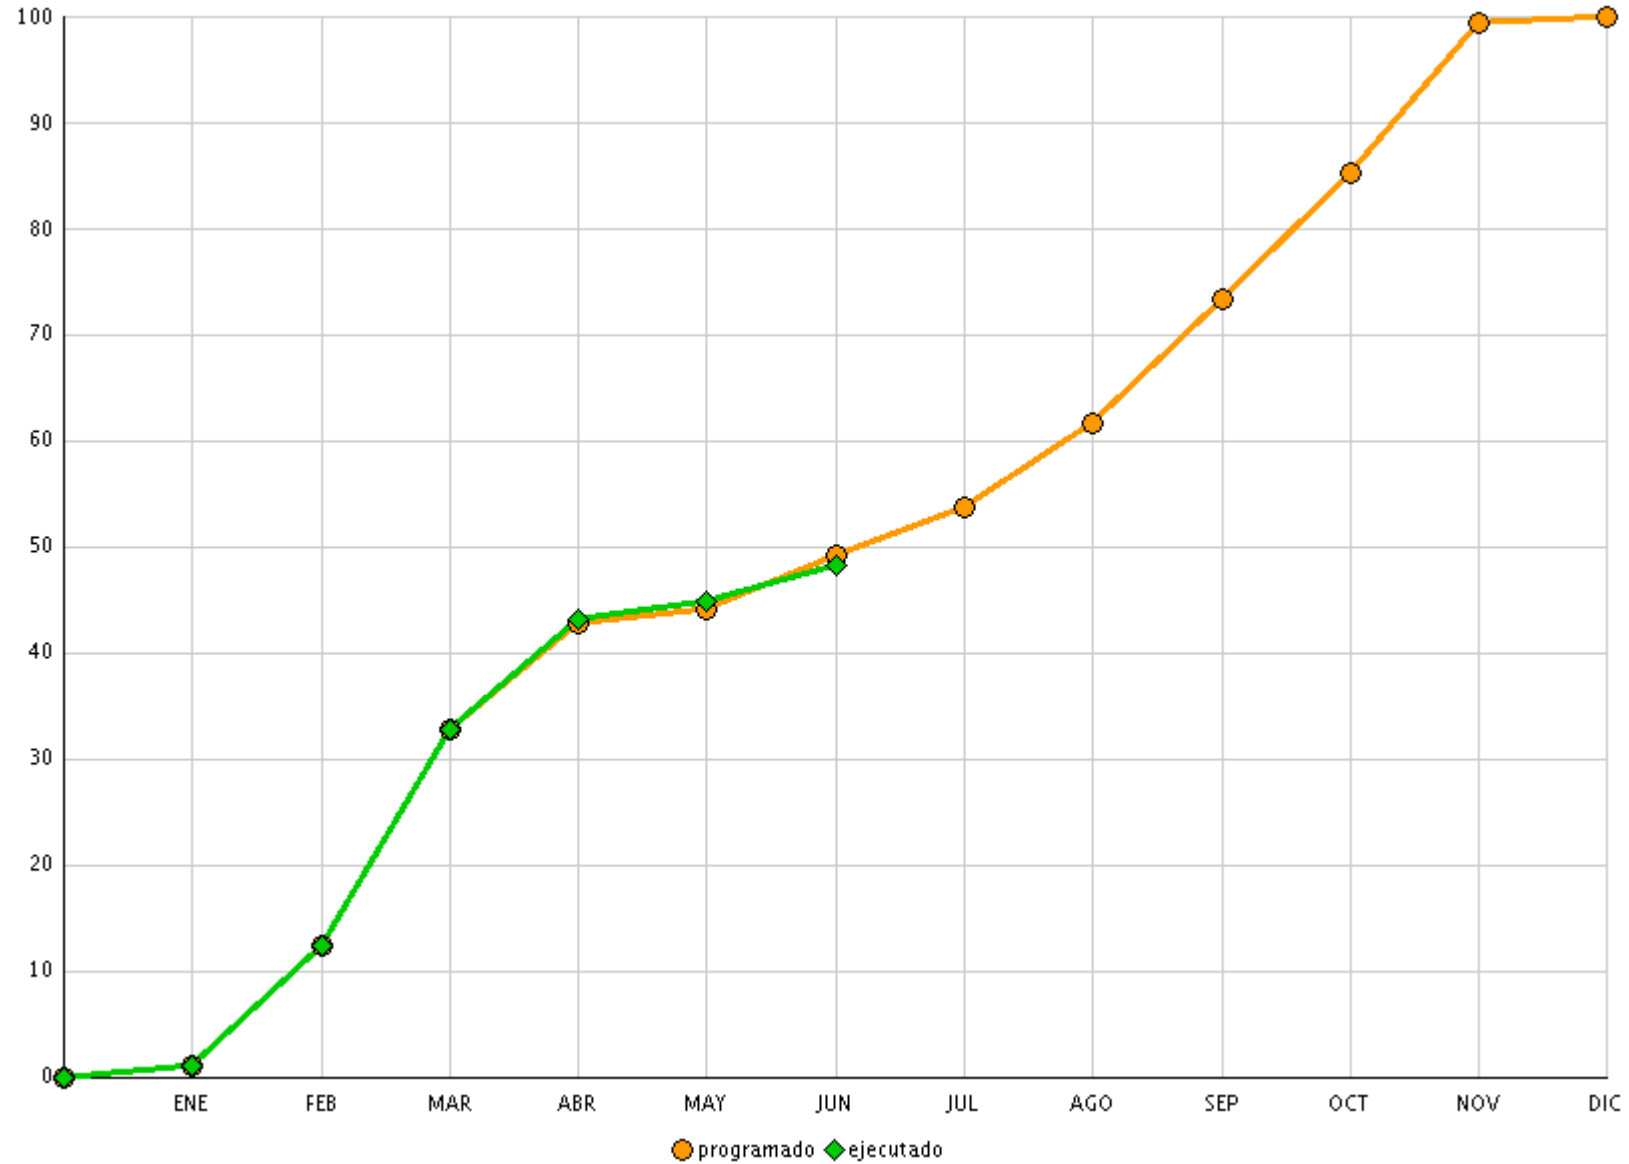


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.05	12.40	32.75	42.75	44.14	49.34	53.78	61.62	73.42	85.35	99.35	100.00
Ejecutado	1.05	12.40	32.75	43.21	44.86	48.35						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7646 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

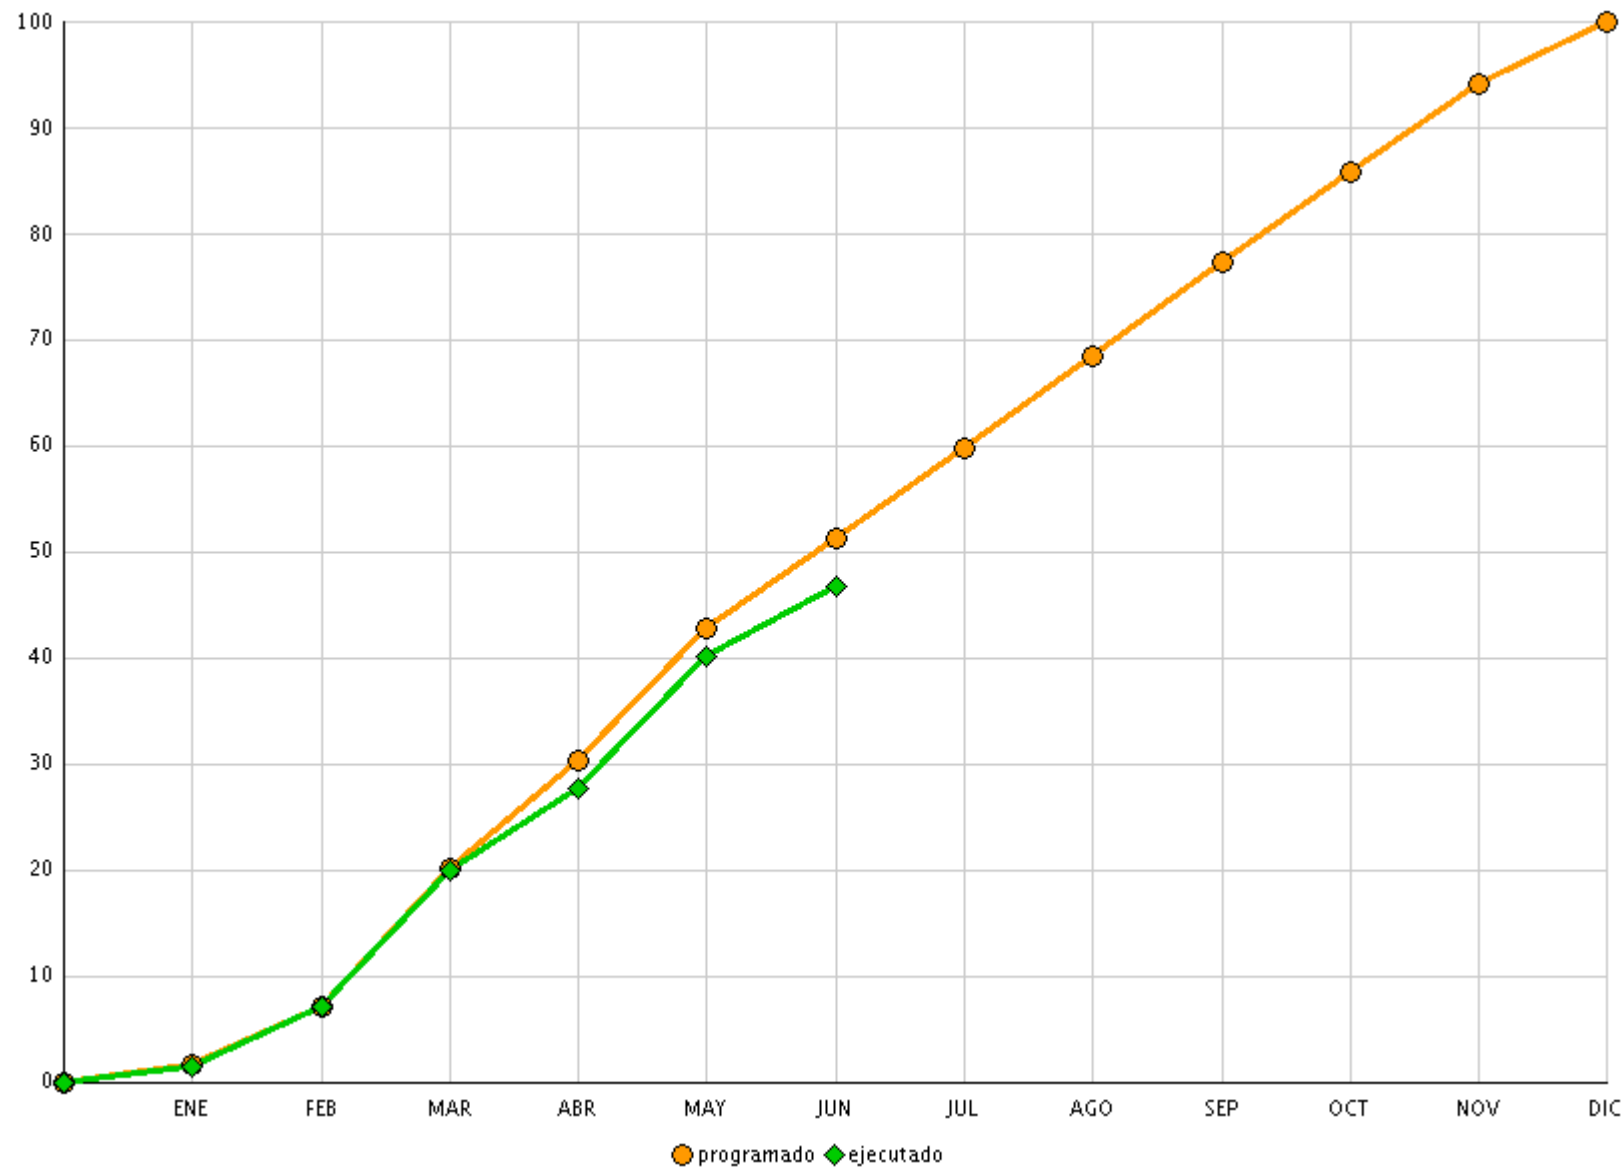


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.65	7.23	20.13	30.44	42.74	51.32	59.80	68.58	77.40	85.81	94.23	100.00
Ejecutado	1.57	7.15	20.05	27.81	40.11	46.89						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7648 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

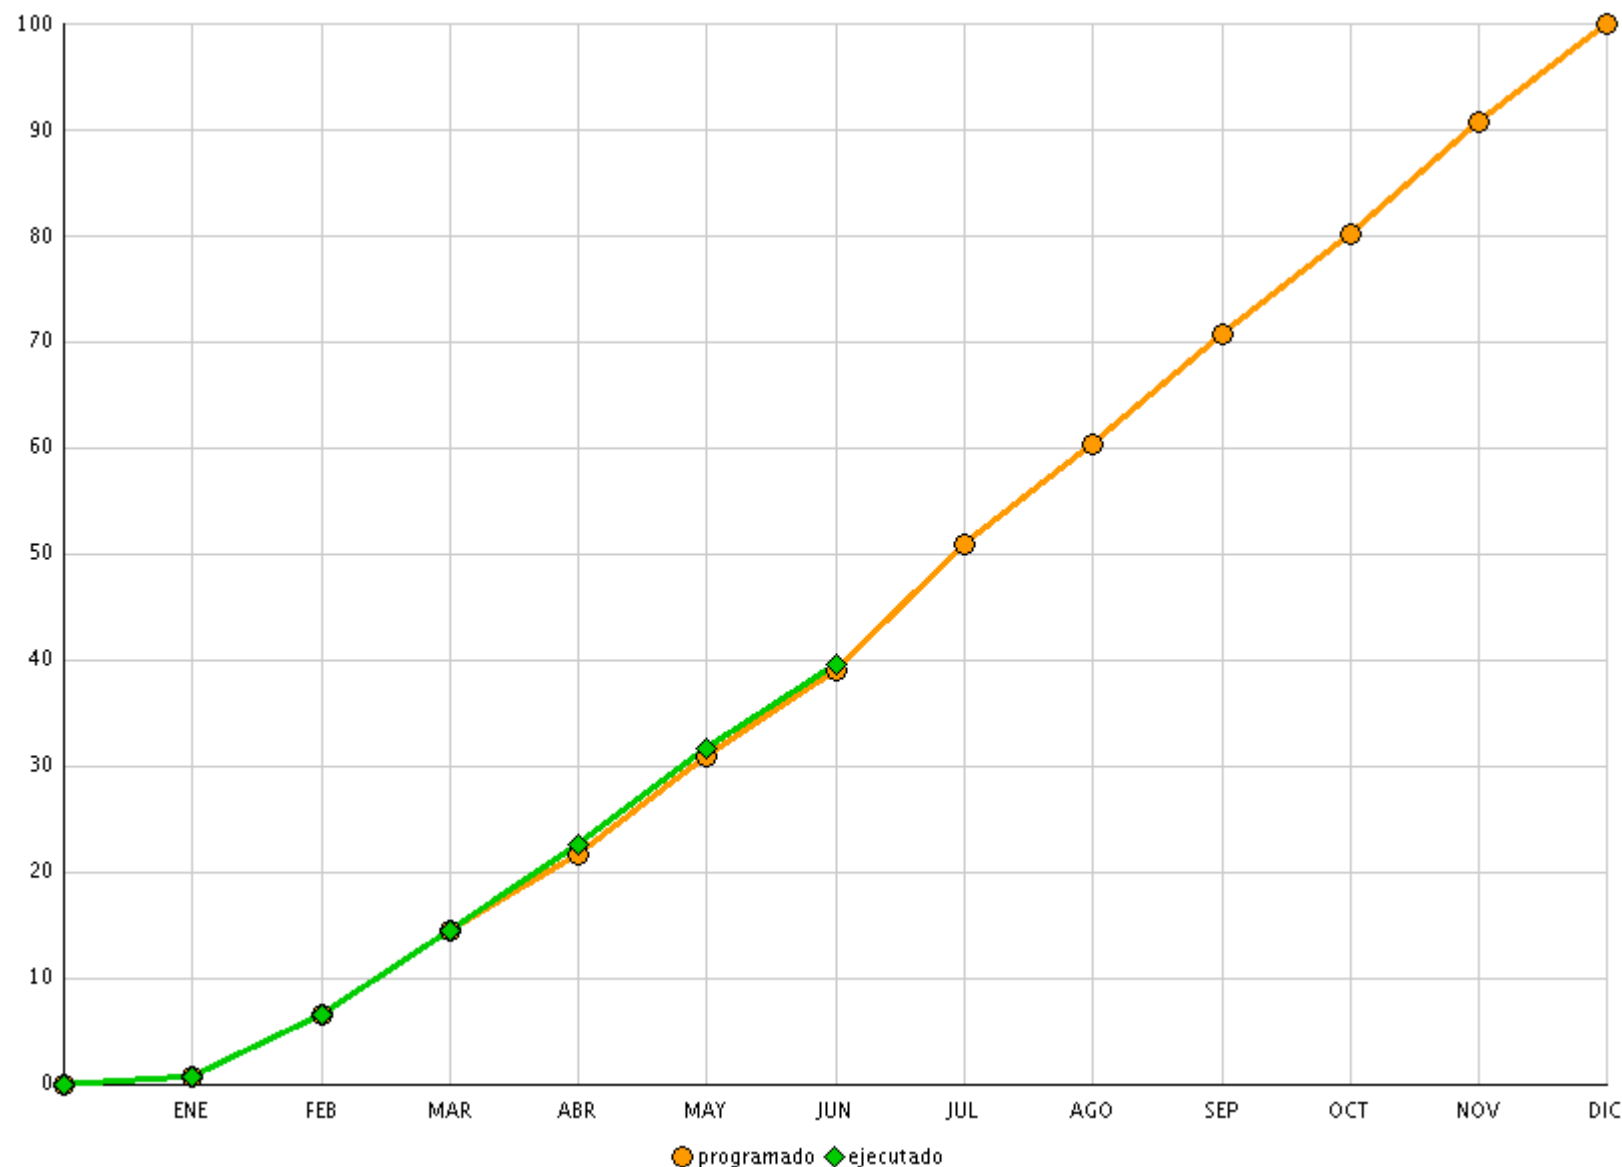


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.77	6.61	14.53	21.78	30.90	39.05	50.88	60.44	70.83	80.25	90.79	100.00
Ejecutado	0.77	6.61	14.53	22.61	31.73	39.71						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7650 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

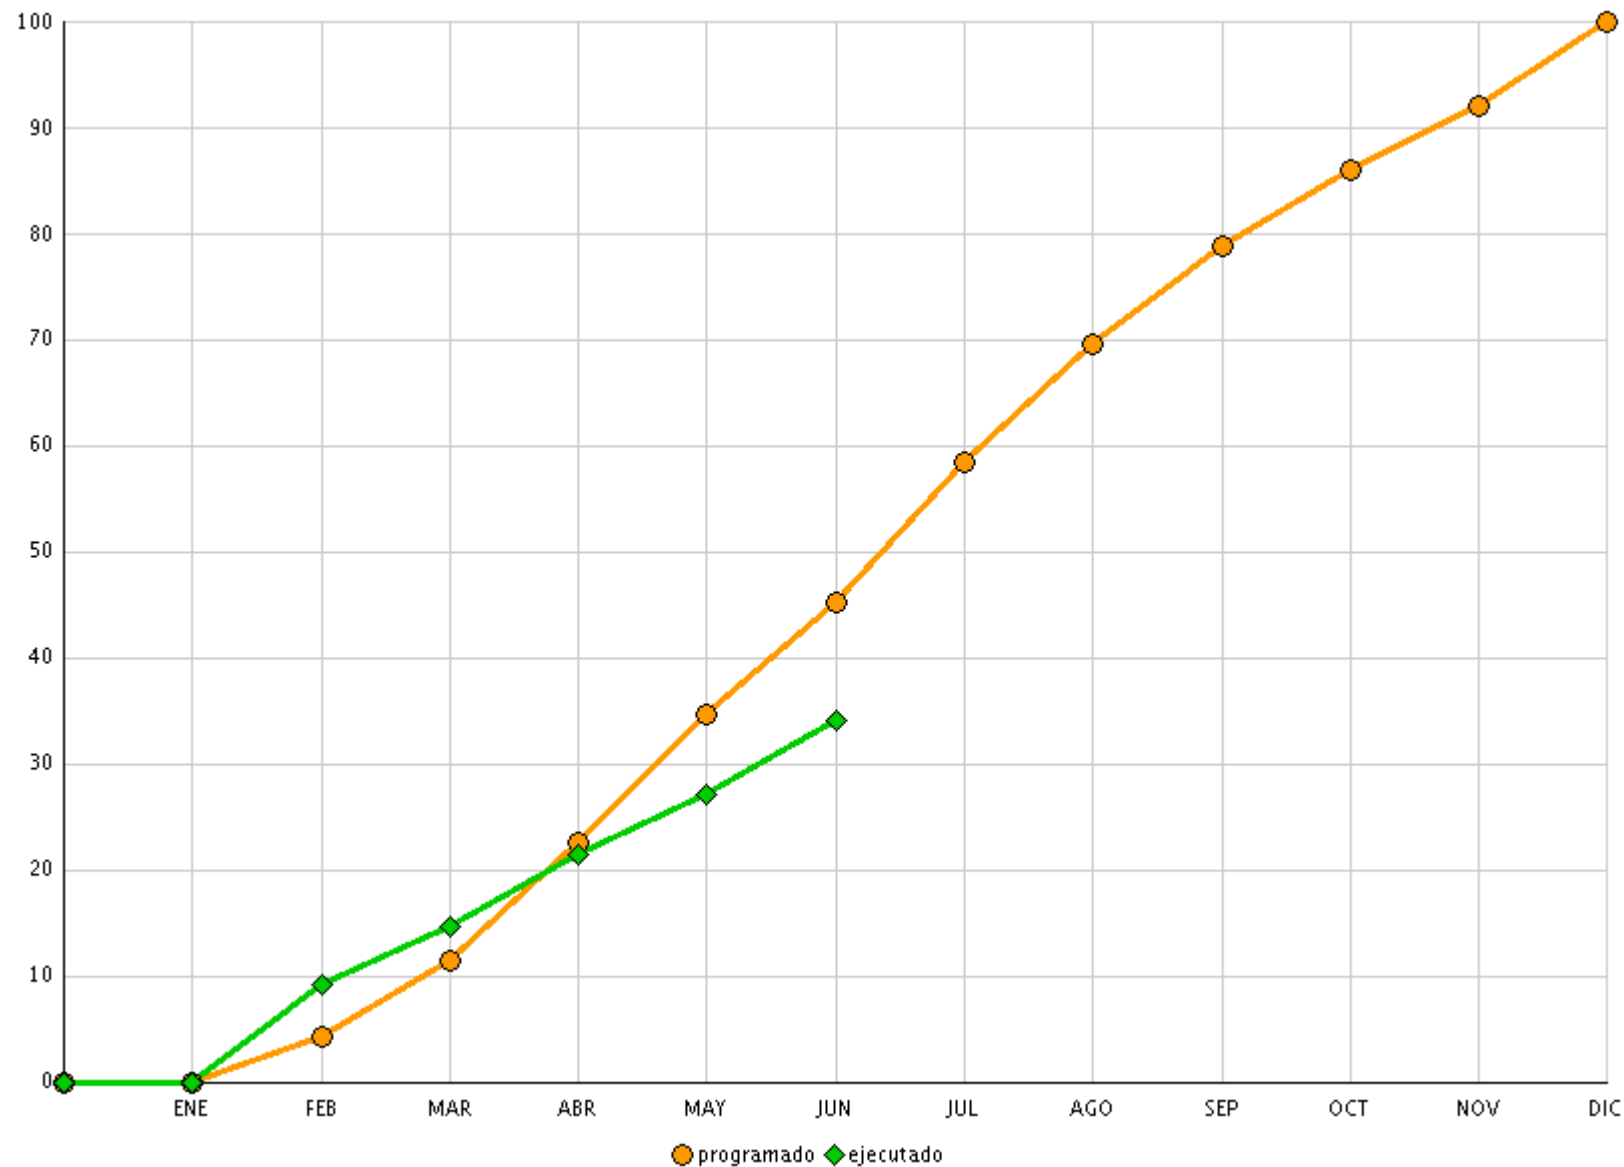


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.35	11.58	22.60	34.64	45.35	58.43	69.70	78.88	86.10	92.15	100.00
Ejecutado	0.00	9.15	14.68	21.45	27.15	34.06						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7654 Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá

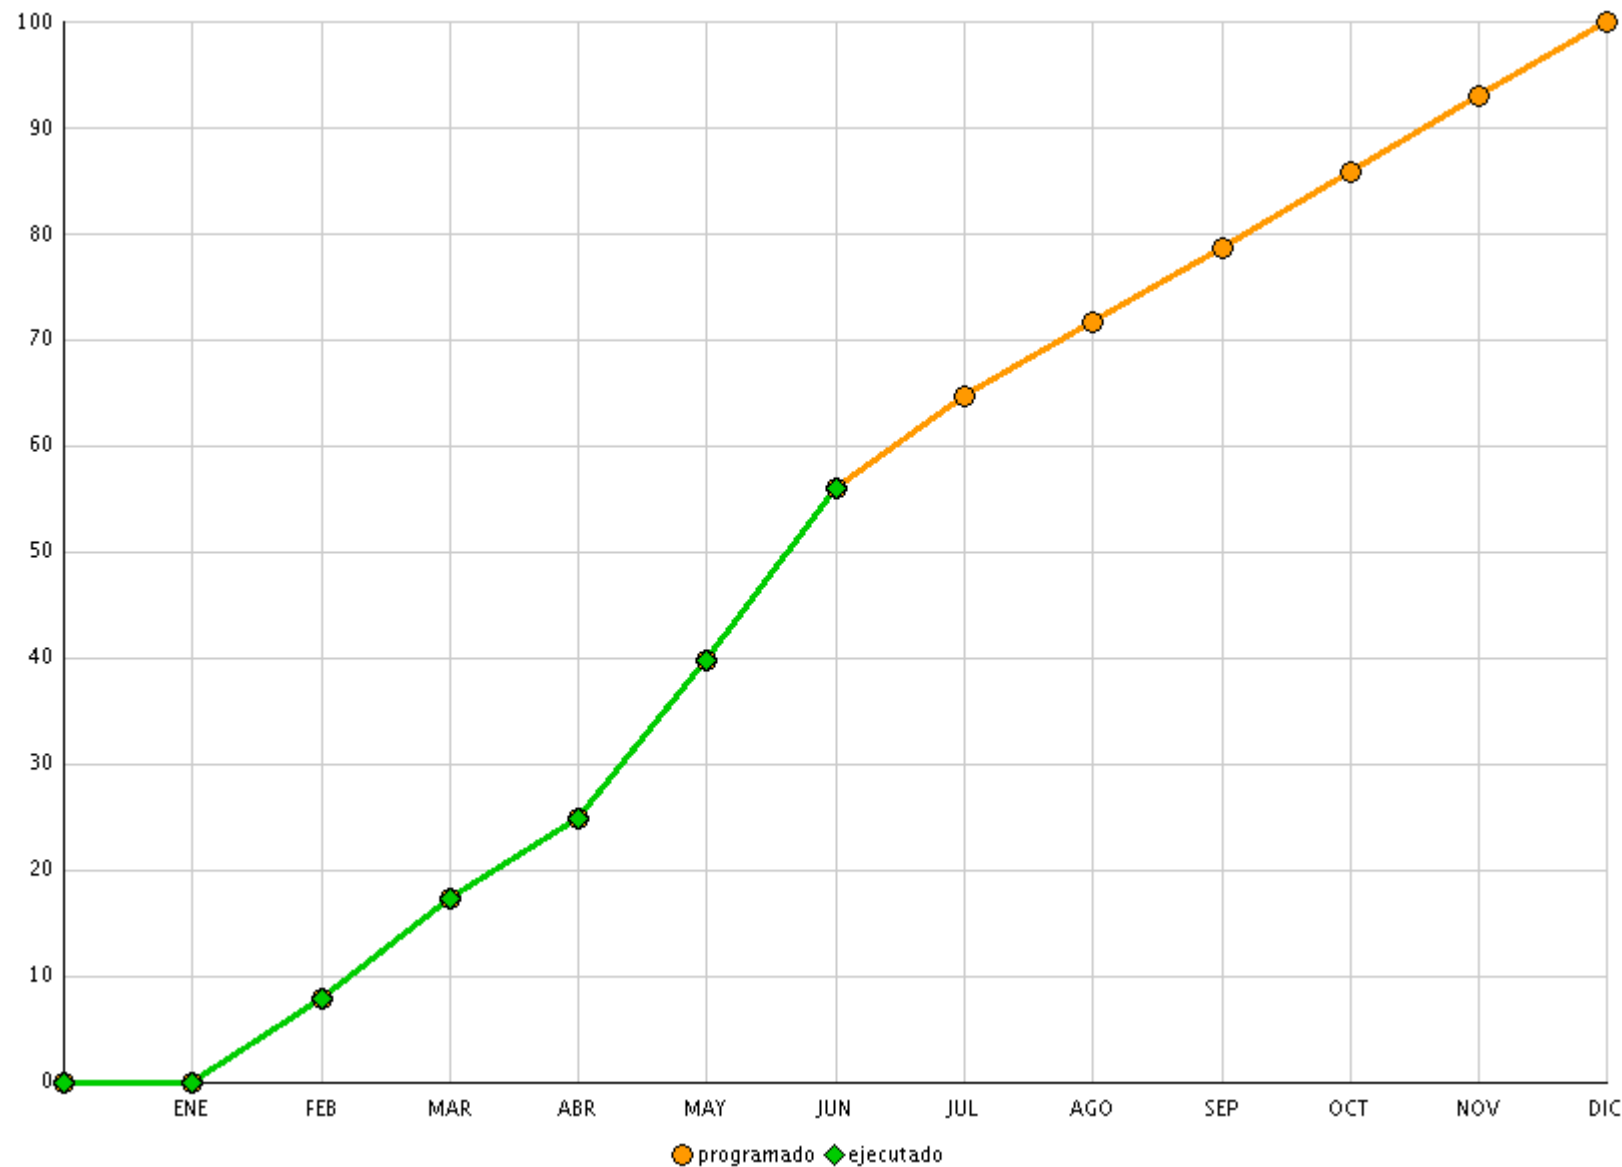


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	7.86	17.35	24.84	39.73	56.02	64.67	71.67	78.77	85.87	92.97	100.00
Ejecutado	0.00	7.90	17.39	24.88	39.77	56.06						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7656 Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá

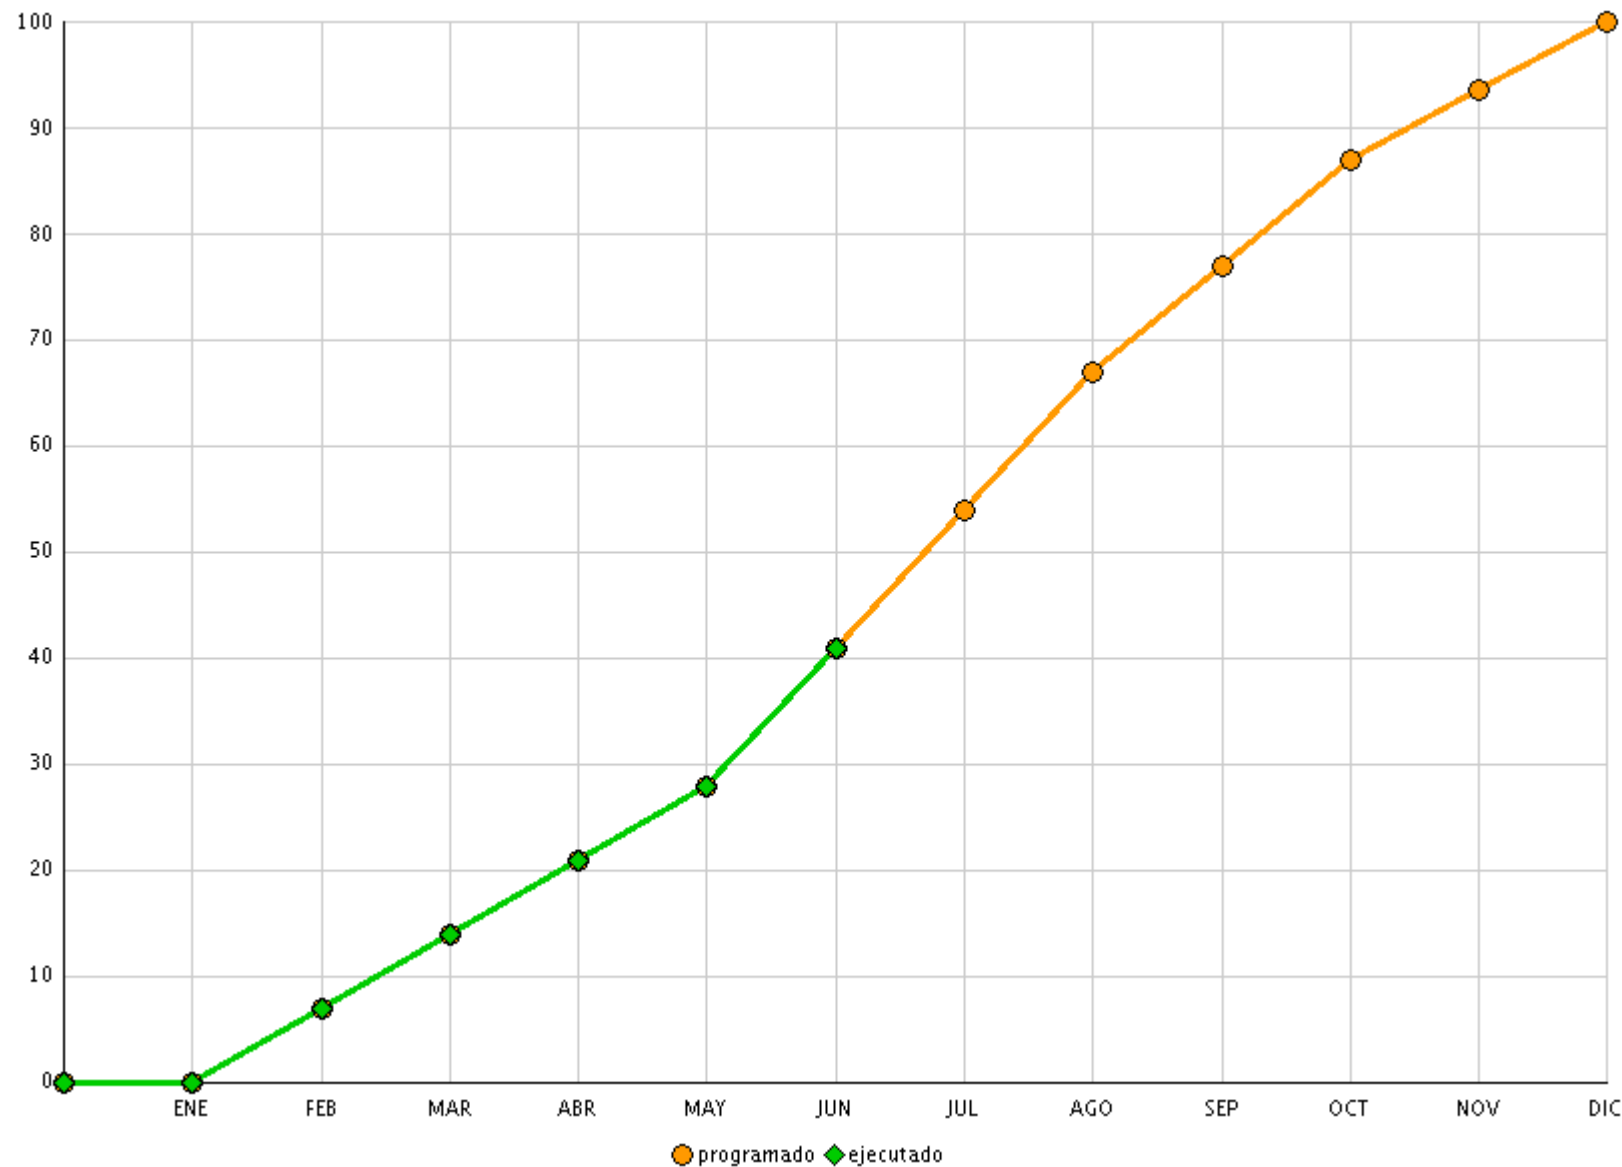


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	7.00	14.00	21.00	28.00	41.00	54.00	67.00	77.00	87.00	93.50	100.00
Ejecutado	0.00	7.00	14.00	21.00	28.00	41.00						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7879 Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

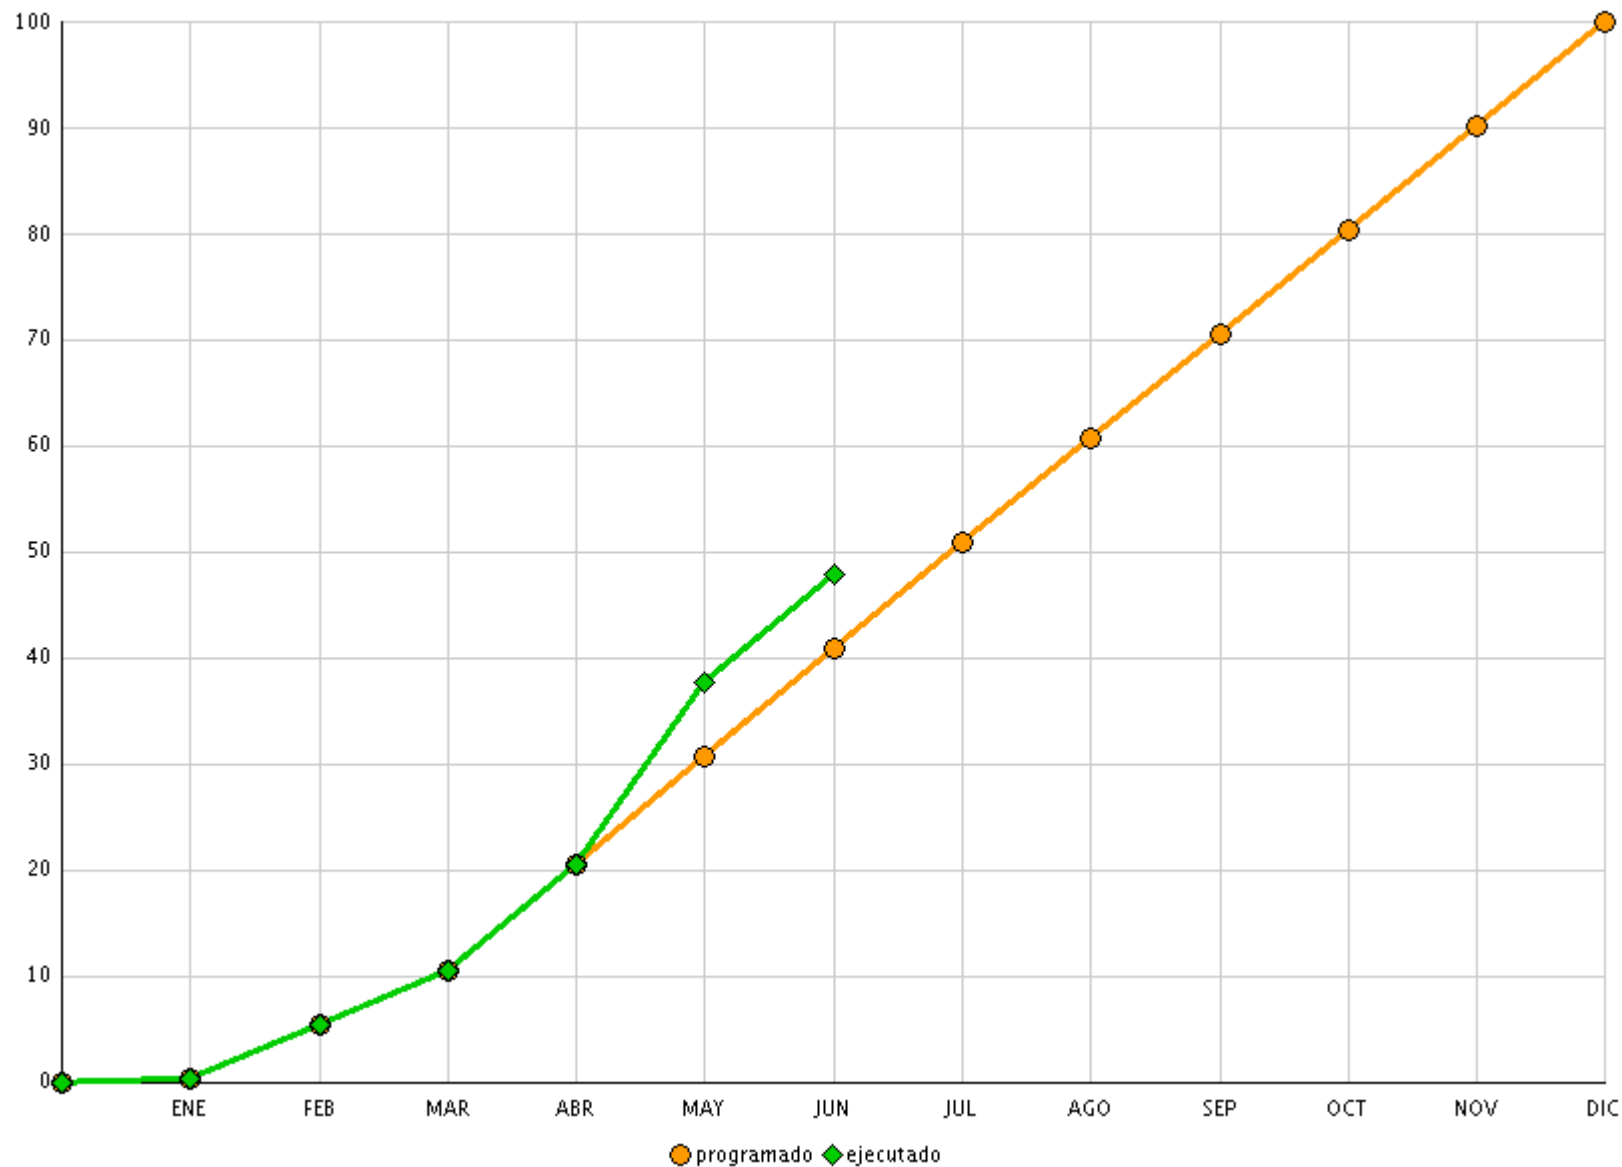


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.35	5.45	10.55	20.60	30.80	41.00	51.00	60.80	70.60	80.40	90.20	100.00
Ejecutado	0.35	5.45	10.55	20.60	37.73	47.93						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7880 Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

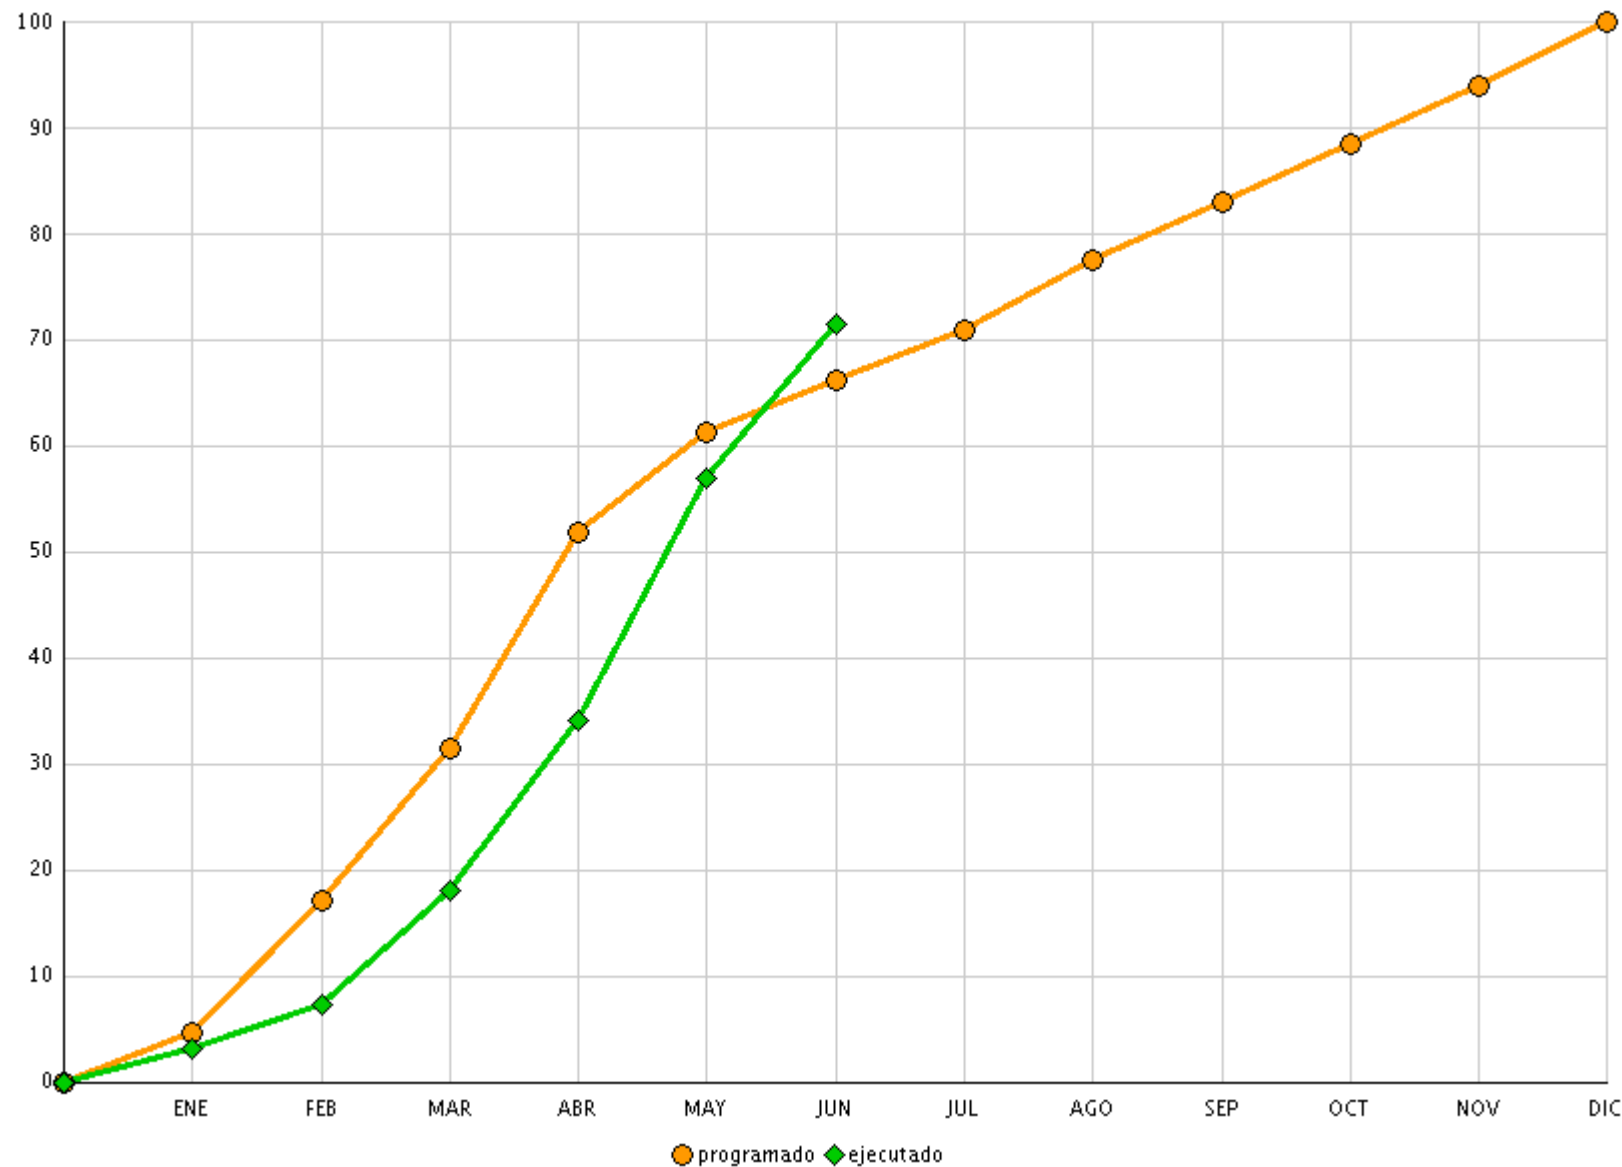


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.73	17.23	31.43	51.88	61.33	66.28	70.99	77.58	83.03	88.48	93.93	100.00
Ejecutado	3.25	7.36	18.12	34.08	56.98	71.60						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7881 Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

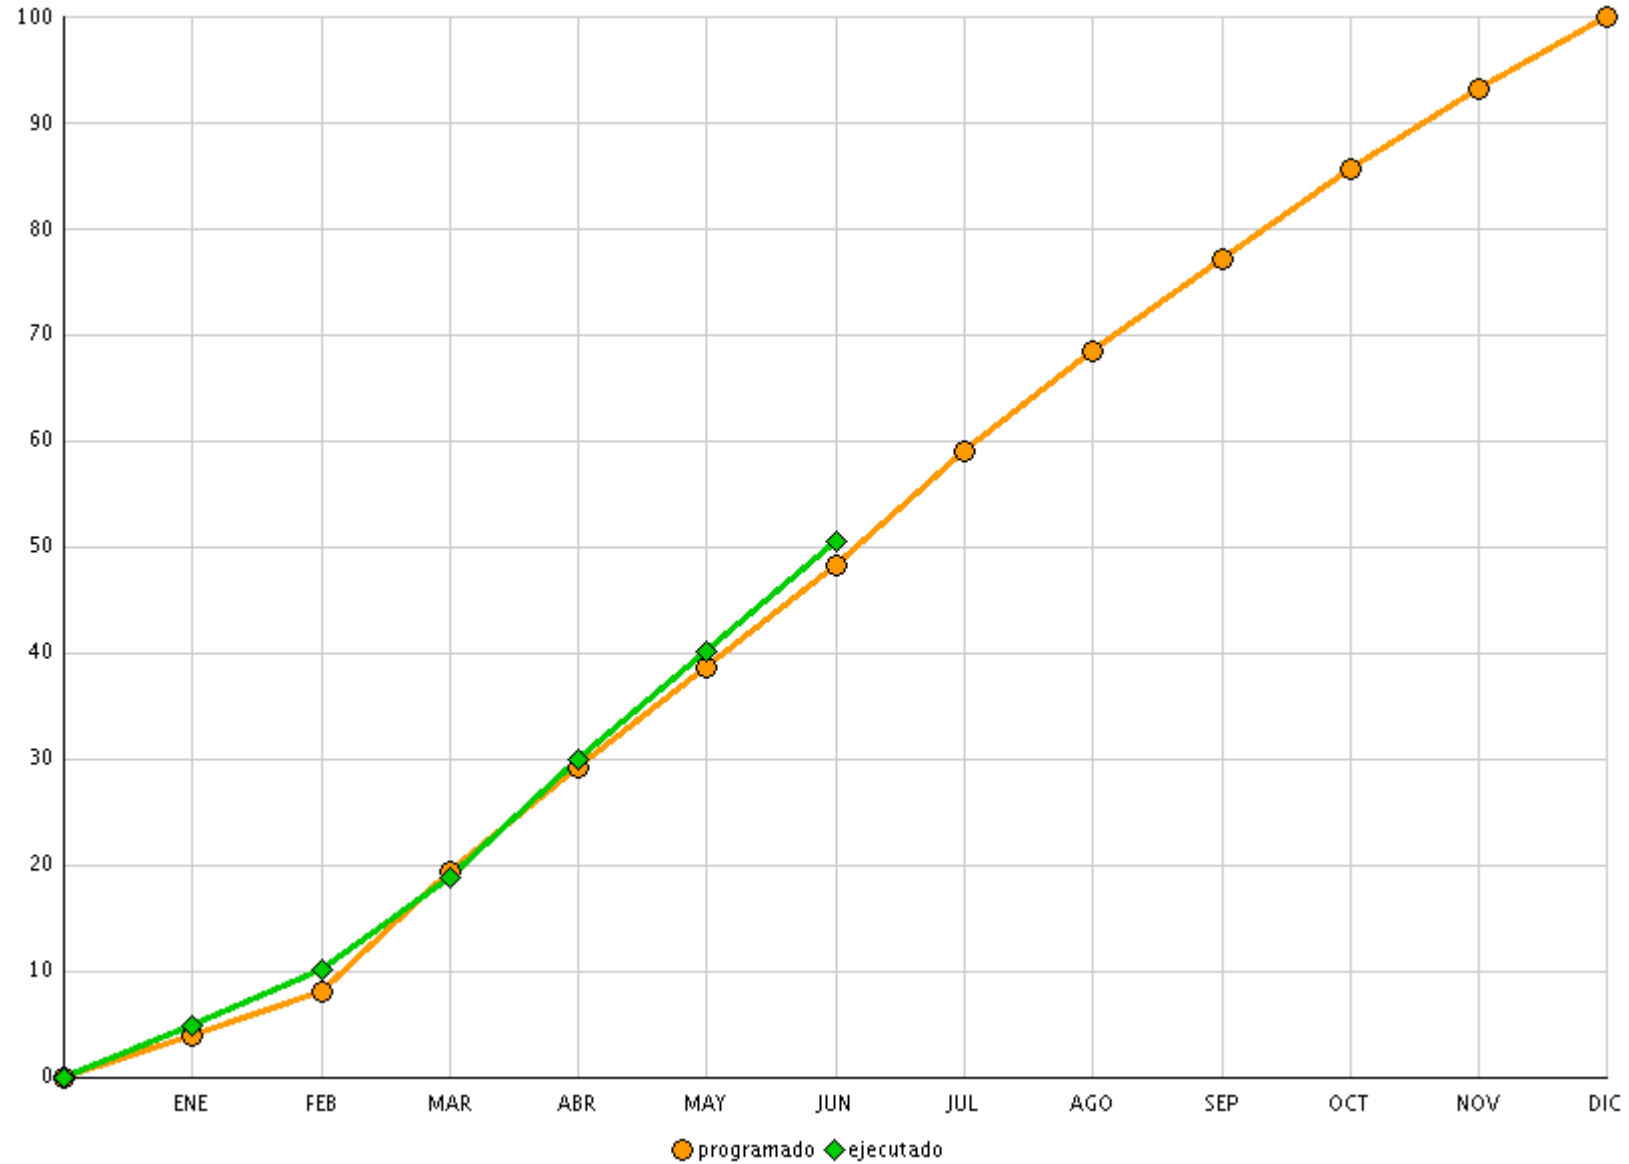


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.90	8.10	19.40	29.25	38.70	48.35	59.00	68.50	77.10	85.60	93.30	100.00
Ejecutado	4.90	10.10	18.90	30.00	40.20	50.60						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7884 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

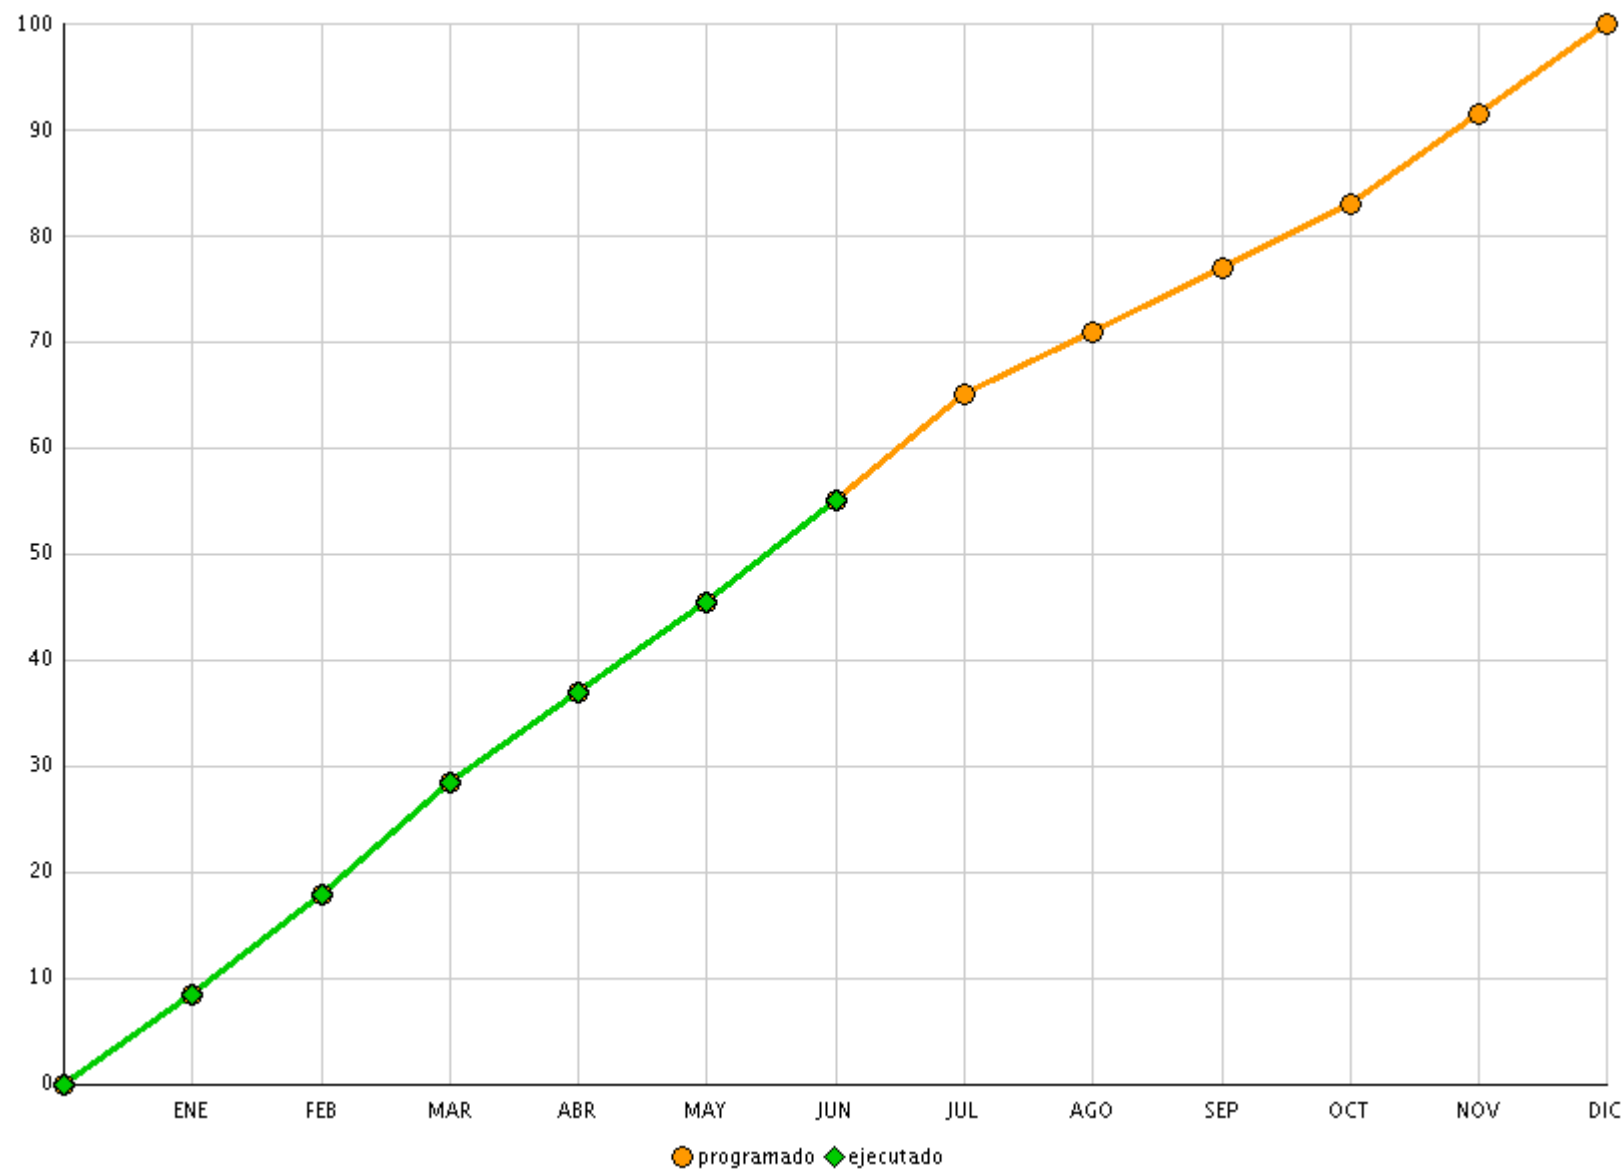


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.50	18.00	28.50	37.00	45.51	55.01	65.01	71.01	77.01	83.00	91.50	100.00
Ejecutado	8.50	18.00	28.50	37.00	45.51	55.01						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7885 Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá

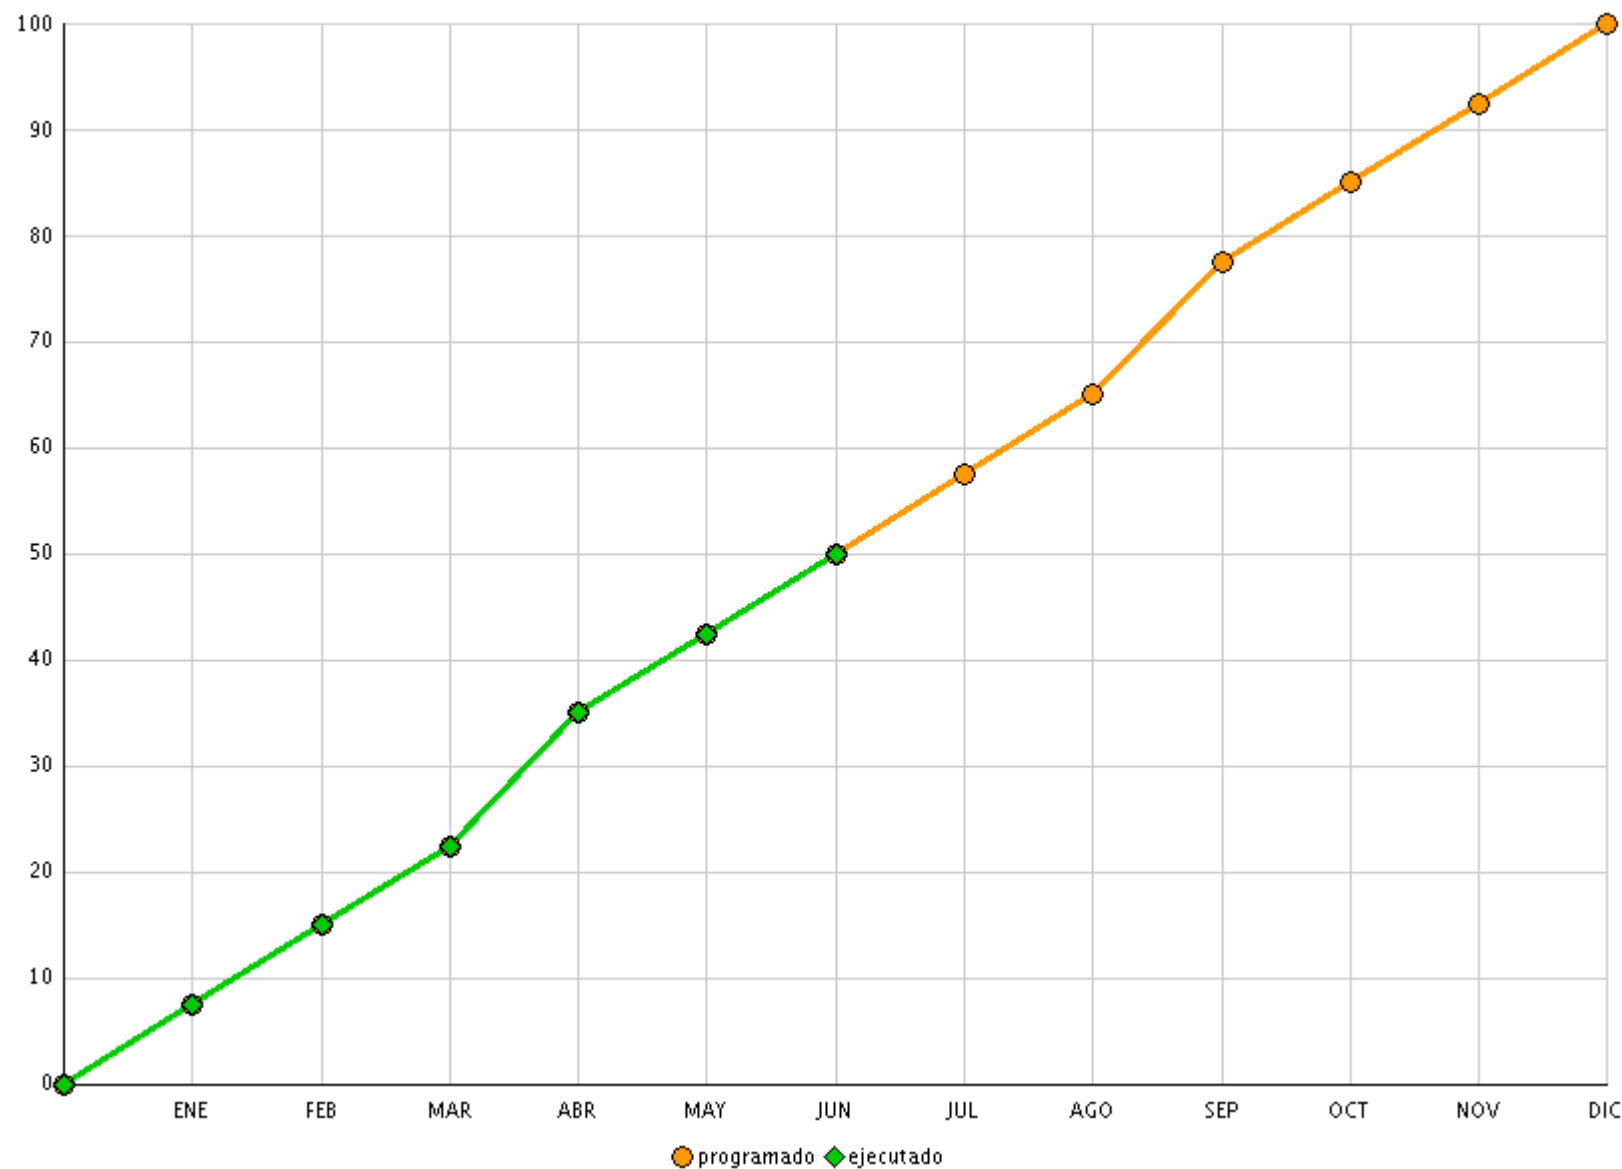


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.50	14.99	22.50	35.01	42.51	50.02	57.52	65.01	77.51	85.01	92.50	100.00
Ejecutado	7.50	14.99	22.50	35.01	42.51	50.02						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7886 Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá

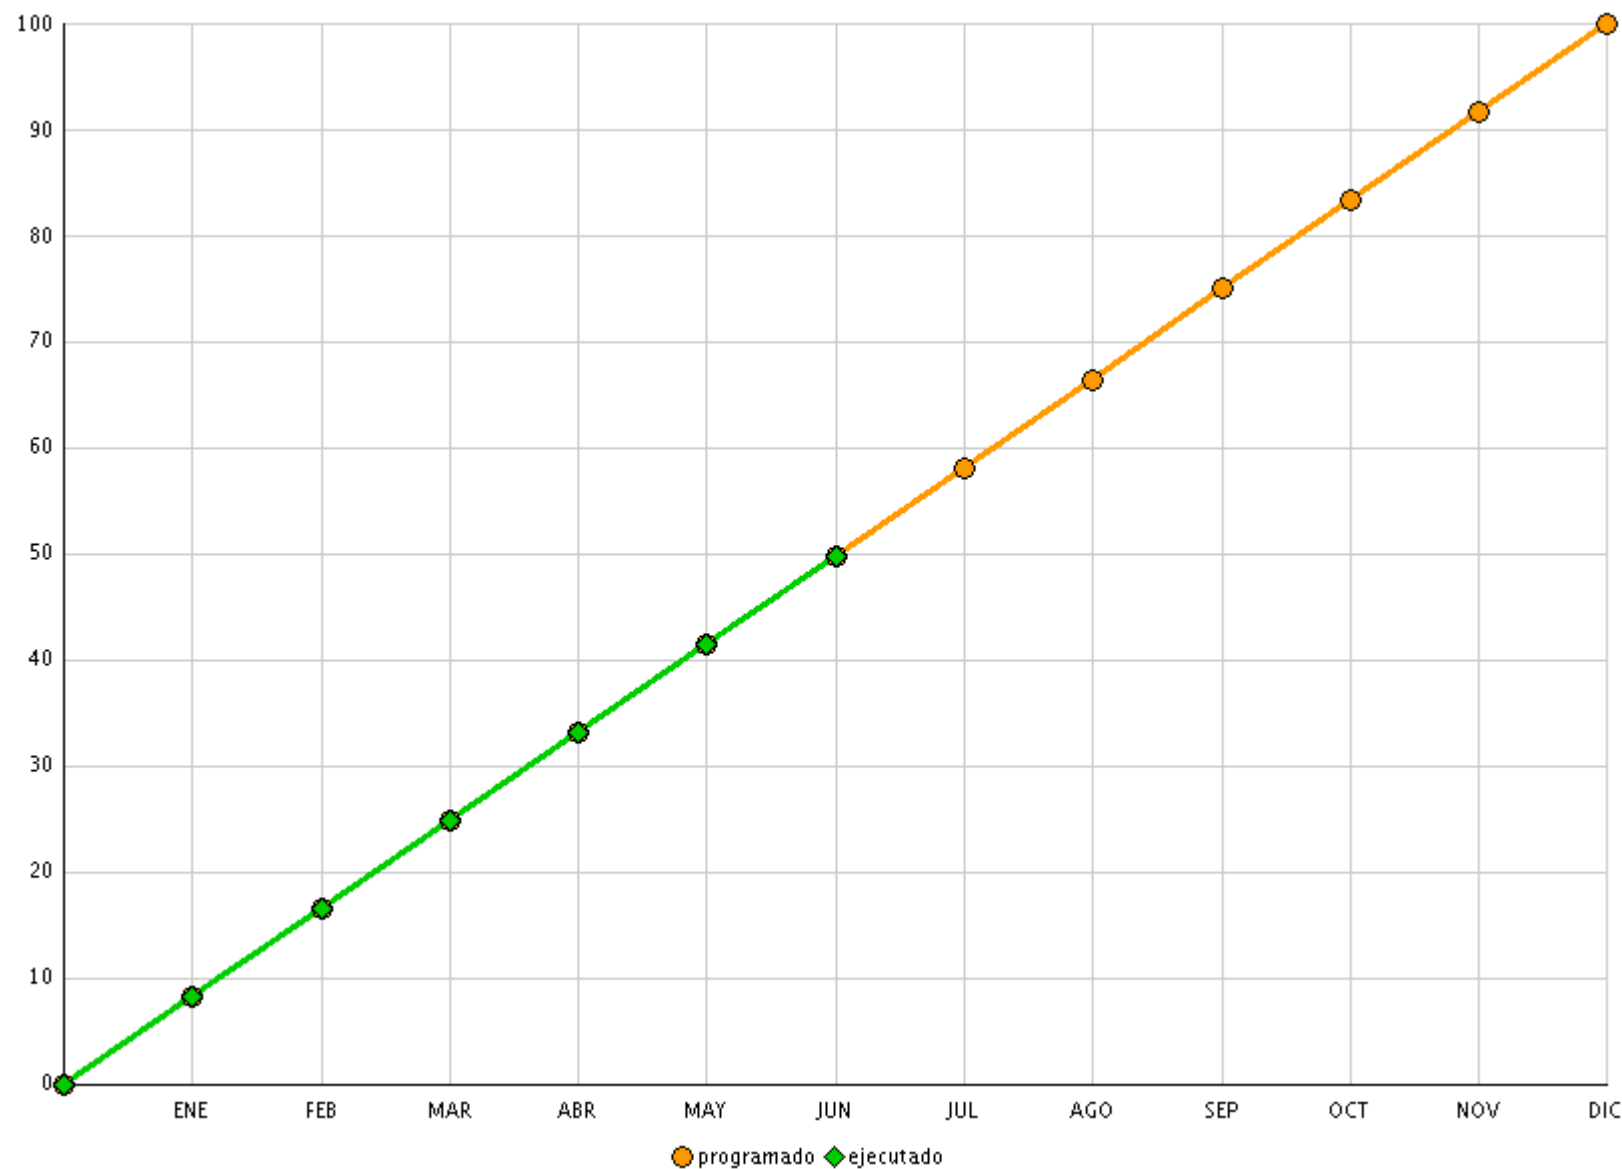


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.29	16.59	24.89	33.19	41.49	49.79	58.08	66.37	75.12	83.42	91.71	100.00
Ejecutado	8.29	16.59	24.89	33.19	41.49	49.79						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7887 Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

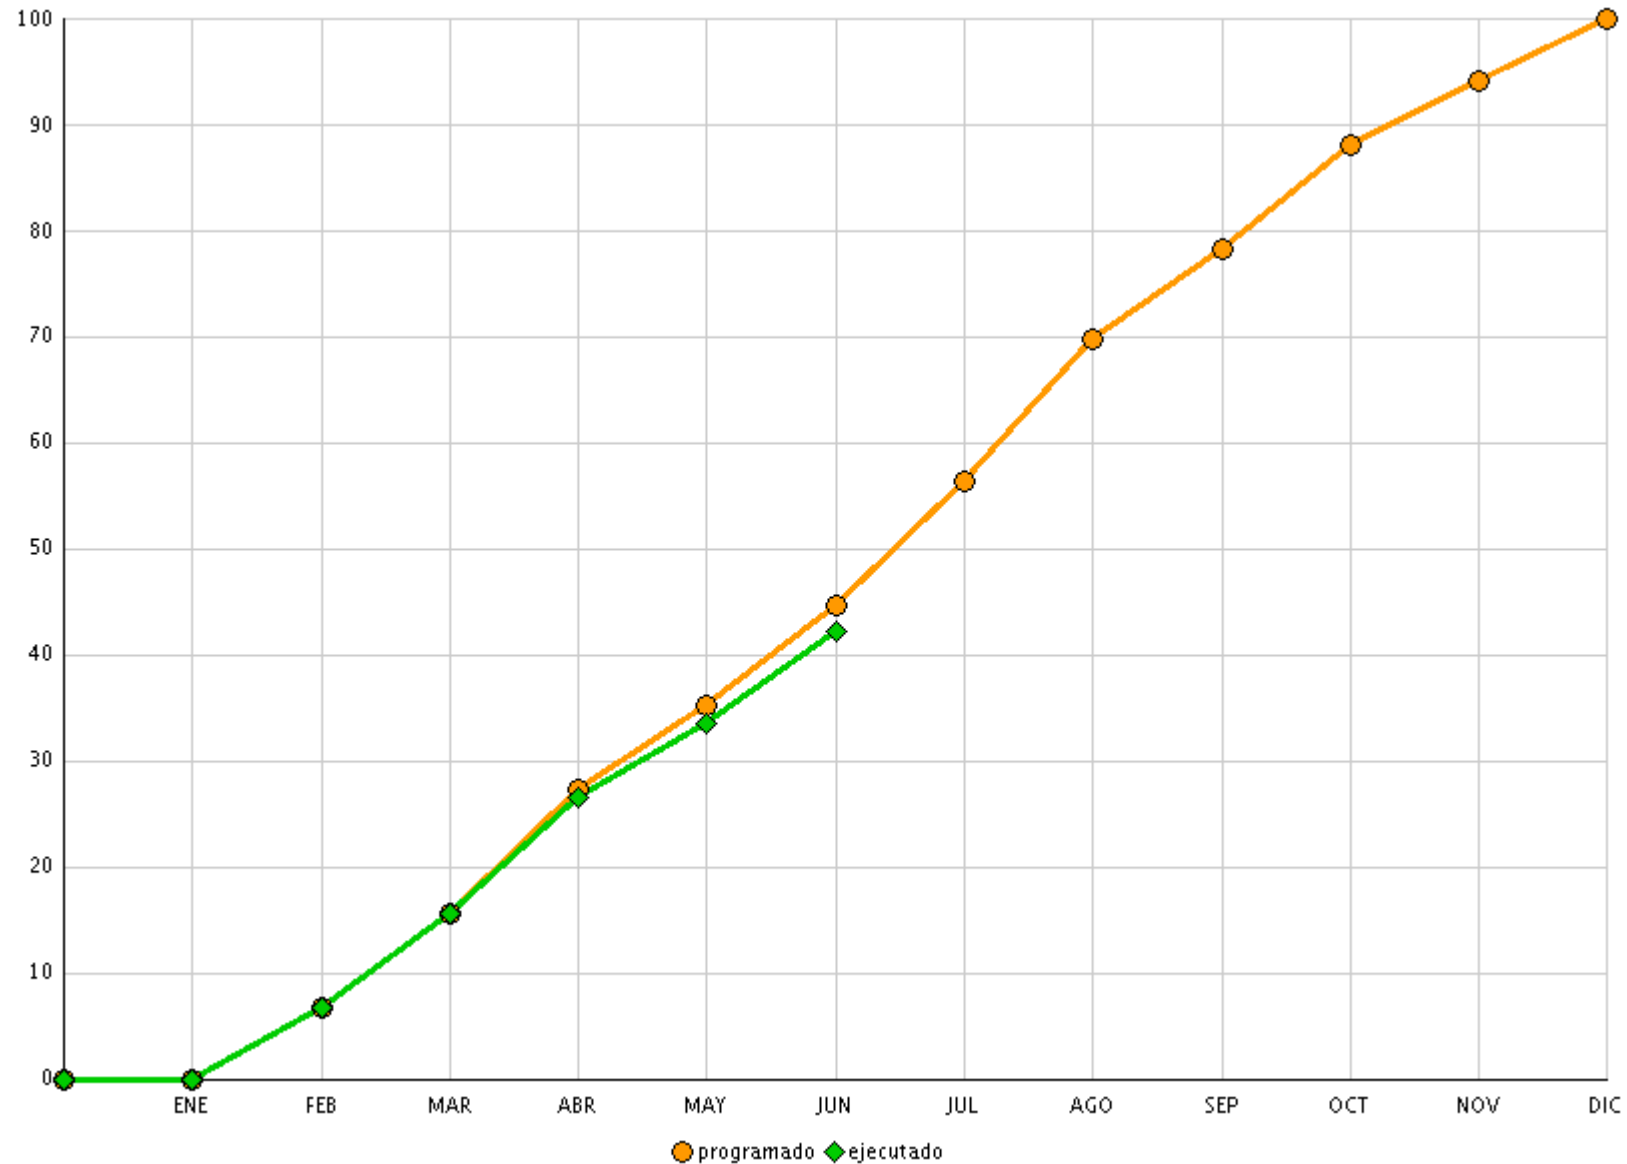

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	6.86	15.72	27.38	35.29	44.64	56.46	69.76	78.30	88.18	94.09	100.00
Ejecutado	0.00	6.86	15.72	26.56	33.65	42.19						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7610 21 Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	JORNADAS DE PLANEACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	4.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
2.	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL	18.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	18.00
3.	CONCERTACIONES CON ORGANIZACIONES DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	18.00
4.	PLANES DE ACCIÓN DE TRANSFORMACIONES CULTURALES PARA LA PAZ DE CADA TERRITORIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	12.84	12.84	12.86	15.00	12.86		12.86		12.86		12.86		12.86		5.00		100.00	32.84	1.64
5.	ESTABLECIMIENTO DE MESAS INTERINSTITUCIONALES	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	52.00	2.60
6.	ENCUENTROS CULTUALES INTERCULTURALES	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		100.00	3.00	0.42
7.	LABORATORIOS DE FORMACIÓN CULTURAL	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	10.00	1.40
8.	ESCENAS INTERLOCALES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00		0.00		33.00		34.00		33.00		0.00		100.00	4.50	0.54
9.	SEGUNDO ENCUENTRO DISTRITAL DE TRANSFORMADORES CULTURALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	FORTALECIMIENTO DE LAS FORTALECIMINETO DE INICITATIVAS SOCIO-CULTURALES Y LA EJECUCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	10.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	35.00	1.75
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										48.35

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7646 24 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTRUCTURACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA Y TÉRMINOS DE REFERENCIA NECESIDADES DE RENOVACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
2. PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
3. CONTINUAR CON LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA MISIONAL QUE OPTIMIZARA LA UNIFICACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y TRAMITES EN LA SDCRD	13.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	35.00	4.55
4. ALINEAR LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR A SATISFACER LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	35.00	1.75
5. DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS MISIONALES, TRANSVERSALES Y OPERATIVOS DE LA ENTIDAD BAJO UN ENFOQUE DE APROPIACIÓN DE LAS TI.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	35.00	1.75
6. REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 5 SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SCRD EN BUEN ESTADO Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS REFERENTES A LOS MISMOS.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00		13.00		12.00		12.00		12.00		12.00		100.00	26.00	0.65
7. ADECUACIÓN CENTRO DE COMPUTO Y RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	30.00	0.75
8. GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	20.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	38.00	7.60
9. IMPLEMENTACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: PGD, PINAR, MOREQ, TRD, FUID,TVD	4.20	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		2.00		100.00	50.00	2.10
10. CONSTRUCCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL	1.80	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	0.85
11. SEGUIMIENTOS A LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE EVALUACIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		100.00	30.00	0.30
12. COORDINACIÓN EN EL REPORTE DEL APLICATIVO FURAG.	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
13. REALIZAR LA REVISIÓN, VALIDACIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	0.50
14. REALIZAR ACCIONES DE LEVANTAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN FUNCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUIMS	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	35.00	0.35
15. CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PERIODICAMENTE EN CULTURED	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00		15.00		5.00		10.00		15.00		5.00		100.00	45.00	0.45
16. GESTIONAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN LA SCRD Y EL SECTOR	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00		15.00		10.00		10.00		15.00		5.00		100.00	40.00	0.40
17. FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN DE LA VIGENCIA 2023	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00		30.00		10.00		25.00		10.00		10.00		100.00	5.00	0.05
18. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE	1.00																									100.00	41.00	0.41

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7646 24 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
INVERSIÓN		8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		9.00				
19. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE METAS SECTORIALES PDD	1.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00		5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		100.00	50.00	0.50
20. ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 DE LA SCRD.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
21. FORMULACIÓN Y MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00		0.00		16.67		0.00		0.00		16.66		100.00	66.67	0.67
22. ACOMPAÑAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA ENTIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN EN LA SCRD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
23. DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN CULTURAL COMO PARTE DEL QUEHACER COTIDIANO DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD, REFORZANDO SU CERCANÍA CON LOS DIVERSOS CREADORES Y CON SU TRABAJO A NIVEL LOCAL	4.80	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	2.18
24. AMPLIACIÓN DEL IMPACTO DE LOS DIVERSOS ESFUERZOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA DESDE LA CREACIÓN EN UN SENTIDO AMPLIO Y DESDE LA CULTURA CIUDADANA, COMUNICACION PUBLICA Y ACCIONES EN EL TERRITORIO	4.60	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	2.09
25. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA MEDIÁTICA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD QUE PONGAN EN LA CONVERSACIÓN PÚBLICA LAS ACCIONES DE LA SCRD.	4.60	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	2.09
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.89

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7648 18 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. LIDERAZGO Y ARTICULACIÓN	11.00	1.00	1.00	2.00	2.00	9.00	9.00	8.50	8.50	8.50	8.50	10.00	8.50	9.80		9.80		9.80		9.80		12.00		9.80		100.00	37.50	4.13
2. GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN	7.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.10	9.10	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		100.00	45.46	3.18
3. FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES CULTURALES	1.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	9.00	7.37	7.37	8.33	8.33	9.33	9.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	4.50
5. ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y CUALIFICACIÓN	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.25	9.25	9.00	9.00	9.00	9.00	9.25		9.00		9.00		9.25		9.00		9.25		100.00	45.25	2.26
6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS, REGISTRO Y EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SDACP	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	4.60
7. ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE CIRCULARES, METODOLOGÍAS, CRONOGRAMA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS CLACP EN COMPAÑÍA DE IDPAC Y SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		100.00	25.00	1.00
8. COMISIOS ELECTORALES	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	8.50	8.50	8.50	8.50	9.50	9.50	10.50	10.50	10.00		9.00		10.00		10.00		10.00		9.00		100.00	42.00	4.20
9. PROGRAMA DE FORMACION Y FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A CONSEJEROS	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
10. PORTAFOLIO DE ESTIMULOS POBLACIONALES	9.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00		9.00		10.00		9.00		9.00		5.00		100.00	49.00	4.41
11. CONSEJOS DE CULTURA ETARIO,ÉTNICO, SOCIAL Y POBLACIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	18.00	18.00	5.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00		0.00		18.00		0.00		18.00		0.00		100.00	59.00	2.95
12. PEDAGOGÍAS PARA LA INTERCULTURALIDAD	9.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		100.00	22.00	1.98
13. PLANES INTEGRALES DE ACCIONES AFIRMATIVAS (5 GRUPOS ETNICOS)	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		100.00	20.00	1.00
14. PLAN DE VIDA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		100.00	20.00	1.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 39.71

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7650 24 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DEFINICIÓN DE AGENDA DEL DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PENSAMIENTO EN FOMENTO			1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
2.	DESARROLLO DE SESIONES DEFINICIÓN DE AGENDA DEL DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PENSAMIENTO EN FOMENTO			3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
3.	ELABORACIÓN DE RELATORÍAS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL PROCESO DEL DESARROLLO DE SESIONES DEFINICIÓN DE AGENDA DEL DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PENSAMIENTO EN FOMENTO			3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00		15.00		20.00		15.00		15.00		100.00	20.00	0.60
4.	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTO DE CIERRE DE CONSEJO CONSULTIVO			1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	0.45
5.	DISEÑO METODOLÓGICO (PROPUESTA DE TRABAJO) DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CON MIRAS A LINEAMIENTOS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA (EVALUACIONES, INVESTIGACIONES DE SECTOR DE CARACTER PARTICIPATIVO, MEMORIAS)			1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	30.00	30.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	1.20
6.	RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CON MIRAS A LINEAMIENTOS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA (EVALUACIONES, INVESTIGACIONES DE SECTOR DE CARACTER PARTICIPATIVO, MEMORIAS)			2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		0.00		40.00		0.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CON MIRAS A LINEAMIENTOS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA (EVALUACIONES, INVESTIGACIONES DE SECTOR DE CARACTER PARTICIPATIVO, MEMORIAS)			2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		30.00		30.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8.	IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ALIADOS PARA LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL CON ENFOQUE TERRITORIAL.			2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	0.56
9.	ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES SEGÚN LÍNEAS ACORDADAS EN EL MARCO DEL PDE.			4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	25.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
10.	GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE CONVENIOS.			4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
11.	DISEÑO DE CONVOCATORIAS A OFERTARSE EN ALIANZA CON ENTIDADES EN CONVENIO DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTOS DEL PDE.			3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12.	DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS AGENTES DEL SECTOR (PFAS)			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
13.	DISEÑO CONCEPTUAL, METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL PFAS			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	60.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.80
14.	IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO FORMATIVO			6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15.	DISEÑO DE LAS CONVOCATORIAS.			4.50	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	3.15
16.	DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA OFERTA			3.00	0.00	0.00	30.00	40.00	20.00	20.00	5.00	5.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00		10.00		0.00		0.00		5.00		0.00		100.00	70.00	2.10

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7650 24 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
17. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	6.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5.00	5.00	30.00	0.00	15.00	5.00	25.00		10.00		10.00		5.00		0.00		0.00		100.00	60.00	3.60
18. ADJUDICACIÓN DE ESTÍMULOS Y APOYOS	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	0.00	30.00	40.00	15.00		25.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	3.30
19. ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	15.00	15.00		15.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	15.00	0.90
20. ELABORACIÓN DE INFORMES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
21. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	5.00		5.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	10.00	0.60
22. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS PROCESOS DE FOMENTO, CON ENFASIS TERRITORIAL Y DE ACCESO A LA PLATAFORMA. (PEDAGOGÍA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	30.00	2.40
23. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PRENSA Y MEDIOS, CON ENFASIS EN MEDIOS COMUNITARIOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	2.40
24. BRINDAR ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS ESAL DE COMPETENCIA DE LA SCRD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y REQUERIMIENTOS	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	40.00	2.00
25. PRACTICAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y CUANDO SE REQUIERA SUSCRIBIR PLANES DE MEJORAMIENTO, A LAS ESAL SUJETAS A INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.50
26. REALIZAR 5 JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN ASPECTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	2.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00	80.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00																							TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		34.06	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7654 25 Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RETROALIMENTACIÓN/ EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO (SEGÚN METODOLOGÍA DEL ENCUENTRO)	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
2. VERSIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS	5.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	3.75
3. VERSIÓN FINAL DE DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4. PUBLICACIÓN DE PROYECTOS VIABILIZADOS DEL BANCO DE PROYECTOS	4.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
5. DESARROLLO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA LEP	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	9.80
6. SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS/ACTAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (PROCESOS LICITATORIOS)	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	14.00
7. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL (VIGENCIA Y PASIVOS)	38.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	15.20
8. FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
9. DEFINICIÓN METODOLÓGICA DE LOS ENCUENTROS	2.00	0.00	0.00	0.50	0.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		9.50		100.00	40.50	0.81
10. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.50	0.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		9.50		100.00	40.50	1.22
11. DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO CON LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PRIORIZADOS	7.00	0.00	0.00	0.50	0.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		9.50		100.00	40.50	2.84
12. RETROALIMENTACIÓN/ EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO (SEGÚN METODOLOGÍA DEL ENCUENTRO)	1.00	0.00	0.00	0.50	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		9.50		100.00	45.00	0.45
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		56.06

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7656 20 Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	M1: APOYAR A LA SCRD EN LA BÚSQUEDA PERIÓDICA DE OPORTUNIDADES DE GESTIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	17.50	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	8.75
2.	APOYAR A LA SCRD, DURANTE LAS ETAPAS, DE IMPLEMENTACIÓN, APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y TÉCNICOS	17.50	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	8.75
3.	ACOMPañAR A LA SCRD EN EL APOYO AL SEGUIMIENTO DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ACCIONES, GESTIONES Y PROCESOS DE RELACIONAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	17.50	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	8.75
4.	M2: APOYAR A LA SCRD EN LA BÚSQUEDA PERIÓDICA DE OPORTUNIDADES DE GESTIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	17.50	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	8.75
5.	DESARROLLAR CONTENIDOS PARA LA GENERACIÓN DE HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPRESAS CREATIVAS DE MEDIANO Y PEQUEÑO TAMAÑO DE BOGOTÁ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	20.00	3.00
6.	IMPLEMENTAR UN MÓDULO DE FORMACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS EN BOGOTÁ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	20.00	3.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									41.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7879 23 Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)			Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SUBSECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	1.80
2.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
3.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN AMBITO SALUD, COMPORTAMIENTO Y CULTURA		7.70	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.08
4.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN AMBITO GÉNERO Y DIVERSIDAD		7.70	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.08
5.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN ÁMBITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		7.70	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	130.00	10.01
6.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN AMBITO CULTURA AMBIENTAL		7.70	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.08
7.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN ÁMBITO DE MOVILIDAD, CULTURA CIUDADANA Y CAMBIO SOCIAL		7.70	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.08
8.	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS DE CULTURA CIUDADANA PRIORIZADOS.		7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
9.	RED DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA		7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
10.	POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA CIUDADANA		7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
11.	APROPIACIÓN SOCIAL Y DIVULGACIÓN		3.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.40
12.	LABORATORIO CREATIVO		3.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.40
13.	GESTIÓN TRANSVERSAL Y ADMINISTRATIVA		3.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.40
14.	DESARROLLO DEL PILOTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
15.	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA		15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00
Total ponderación vertical			100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							47.93			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7880 21 Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ - BIBLORED, A TRAVÉS DE SUS PROCESOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.	50.00	8.33	6.50	8.33	4.17	8.33	13.61	8.33	12.13	8.33	10.33	8.33	9.45	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	56.19	28.10
2.	APOYO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN DE BIBLORED Y LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE BIBLIOTECAS (SDB)	3.00	2.00	0.00	3.00	0.82	9.50	9.61	9.50	9.14	9.50	9.18	9.50	9.18	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		100.00	37.93	1.14
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CIUDADANAS EN TORNO A LA CULTURA ESCRITA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	13.00		57.00		0.00		0.00		0.00		30.00		100.00	8.75	0.18
4.	FASE DE FORMULACIÓN POLITICA DISTRITAL DE LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS	15.00	0.00	0.00	15.00	8.33	31.67	13.33	40.00	26.67	13.33	46.67	0.00	54.63	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	149.63	22.44
5.	FASE DE AGENDA PÚBLICA-SOCIALIZACIÓN Y REALIMENTACIÓN POLITICA PÚBLICA	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	6.67	50.00	7.50	10.00	45.83	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	6.00
6.	FASE DE DEFINICIÓN Y TOMA DE DECISIONES	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	15.00	18.75	20.00	56.25	5.00	12.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	87.50	8.75
7.	FASE DE IMPLEMENTACIÓN PILOTO Y MONITOREO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8.	REALIZACIÓN DE EVENTOS DISTRITALES DE GRAN FORMATO QUE FOMENTEN LA LECTURA Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL LIBRO: FILBO	5.00	10.00	0.00	20.00	15.00	0.00	20.00	70.00	60.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										71.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7881 21 Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS CREATIVOS	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
2.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS CREATIVOS.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	15.00		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		100.00	47.50	9.50
3.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS O IMPACTO DE LOS DISTRITOS CREATIVOS.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	7.50	10.00	7.50	10.00	7.50	10.00	7.50		15.00		7.50		7.50		7.50		7.50		100.00	55.00	5.50
4.	DISEÑAR Y/O PROMOVER CURSOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES .	20.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	5.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	60.00	12.00
5.	DISEÑAR Y/O PROMOVER LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO QUE RESPONDAN A LA REALIDAD DE LOS AGENTES DEL SECTOR	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
6.	DISEÑAR Y/O PROMOVER INICIATIVAS Y/O PROYECTOS PARA LA CIRCULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES Y CREATIVOS (REACTIVACIÓN).	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
7.	DESARROLLO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICOS E IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS MIXTOS, QUE PERMITAN ORIENTAR LA TOMA DE DECISIONES PARA MITIGAR Y REACTIVAR EL SECTOR CULTURAL	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		10.00		15.00		15.00		13.00		4.00		100.00	35.00	1.75
8.	IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES TEMÁTICOS DE CULTURA- AGENDA 2030, PARA DETERMINAR Y POTENCIAR EL APOORTE SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS DEL SECTOR EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	47.00	2.35
9.	ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS PARA IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE LOS AGENTES	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00		10.00		12.00		12.00		10.00		5.00		100.00	41.00	2.05
10.	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, QUE RESPONDAN A LOS CAMBIOS GENERADOS EN EL ECOSISTEMA CULTURAL Y CREATIVO.	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		5.00		100.00	49.00	2.45

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 50.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7884 24 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN TEMAS RELACIONADOS CON ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO.	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	3.50
2. IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA CON ALIADOS ESTRATÉGICOS.	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	3.50
3. ELABORAR INFORMES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN VIRTUALES Y/O PRESENCIALES.	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.01	3.50
4. DAR SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIOS INSCRITOS DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISPUESTOS (CHAT, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO).	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	3.50
5. DIFUNDIR Y POSICIONAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN LA CIUDADANÍA.	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	3.50
6. DISEÑAR, FORMULAR Y SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE BECAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DISTRITAL DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	5.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
7. REALIZAR LA VERIFICACIÓN TÉCNICA DE REQUISITOS DE POSTULANTES A LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE JURADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
8. REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES DE LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN CULTURAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. DESARROLLAR EL BALANCE DE LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
11. CONSTRUIR LA VERSIÓN FINAL DEL ÍNDICE DE TRANSFORMACIONES CULTURALES QUE PERMITA MEDIR EL IMPACTO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	2.50
12. DISEÑAR E IMPLEMENTAR DE LOS INSTRUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS Y REALIZAR LOS PILOTAJES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS MISMOS.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	2.50
13. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS PROCESOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MESAS TÉCNICAS CON LOS EQUIPOS A NIVEL INSTITUCIONAL Y SECTORIAL.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	2.50
14. REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	2.50
15. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL SISTEMA DISTRITAL DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (DECRETO 863 DE 2019)	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	2.50
16. REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS PROYECTOS DEL CONCEPTO DE GASTO DE FORMACIÓN	7.50	16.66	16.66	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.66	16.66	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7884 24 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
ARTÍSTICA DEL PROGRAMA ES CULTURA LOCAL.																															
17. IMPLEMENTAR EL PROCESO DE FORMACIÓN PARA EL COMPONENTE B DEL PROGRAMA ES CULTURA LOCAL.	7.50	16.66	16.66	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.66	16.66	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.50			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		55.01	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7885 15 Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN PARA CREADORES Y GESTORES, COMO POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	7.50
2.	BRINDAR ORIENTACIÓN Y APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y SUBSANACIÓN DE LOS CREADORES Y GESTORES	30.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	15.01
3.	REVISAR LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN APORTADA POR LOS ASPIRANTES EN LA PLATAFORMA.	35.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	17.51
4.	REMITIR BASE DE DATOS CON EL LISTADO DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN REQUISITOS AL MINISTERIO DE CULTURA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	5.00
5.	ADELANTAR LAS GESTIONES Y TRÁMITES RELACIONADOS CON SOLICITUDES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y /O COLPENSIONES	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									50.02	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7886 17 Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE PATRIMONIO CULTURAL	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	2.50
2.	REALIZAR REUNIONES INTERNAS E INTERINSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 070 DE 2015 Y SU COORDINACIÓN CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	5.00
3.	DEFINIR TAREAS PRIORITARIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NUEVAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL DECRETO 555 DE 2021 (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT)	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	5.00
4.	ELABORAR PIEZAS DE DIVULGACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL EN BOGOTÁ	12.00	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18		8.18		10.00		8.20		8.18		8.18		100.00	49.08	5.89
5.	REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA DIVULGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD	13.00	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18		8.18		10.00		8.20		8.18		8.18		100.00	49.08	6.38
6.	REALIZAR LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN A BIENES DE INTERÉS CULTURAL	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	12.51
7.	ACOMPañAR LOS PROCESOS Y POSIBLES POSTULACIONES A LA LISTA INDICATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	12.51
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								49.79		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7887 17 Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LA PROPUESTA NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	8.50
2.	SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO SEGÚN LA NUEVA NORMATIVA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.20
3.	DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA PARA ATENDER A LOS ARTISTAS DEL ESPACIO PÚBLICO	6.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		100.00	45.45	2.73
4.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.	6.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		100.00	45.45	2.73
5.	APOYAR EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CUALIFICACIÓN SOBRE ARTE EN ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	0.50	0.50	15.00	15.00	10.00		10.00		4.25		4.25		0.50		0.50		100.00	70.50	7.05
6.	GESTIONAR ANTE EL COMITÉ PARA LA PRÁCTICA RESPONSABLE DEL GRAFITI LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ARTE URBANO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	6.60
7.	DISEÑAR, PRODUCIR Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA ESTRATEGIA DE ARTE URBANO RESPONSABLE	24.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		15.00		10.00		25.00		10.00		10.00		100.00	25.00	6.00
8.	DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DE IMPACTO ARTISTICO REALIZADAS EN EL MARCO DE LA IMPLMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ARTE URBANO REWSPONSABLE	9.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.10		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		100.00	18.18	1.64
9.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA PROPUESTA NORMATIVA PARA LAS EXPRESIONES ARTISTICAS DE CORTA PERMANENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00		20.00		20.00		5.00		5.00		5.00		100.00	25.00	3.75


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 42.19

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7604 Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos

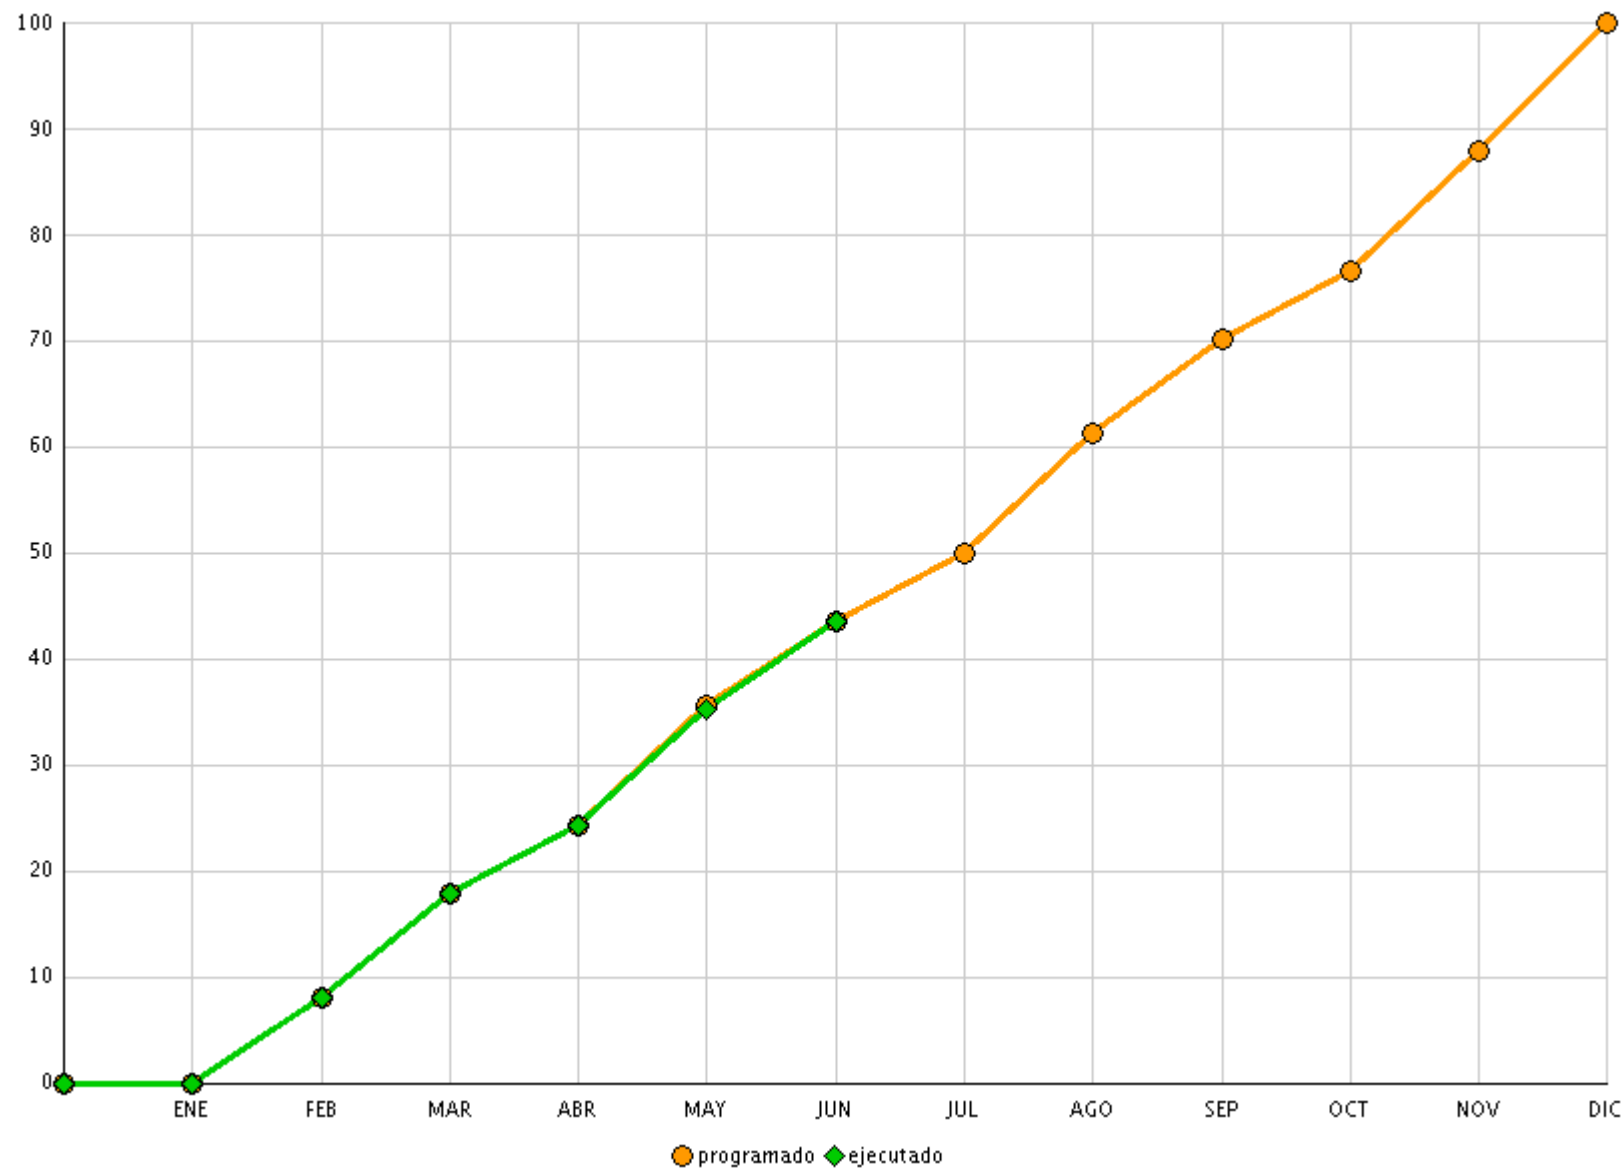


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	8.15	18.01	24.38	35.70	43.60	49.97	61.29	70.21	76.58	87.90	100.00
Ejecutado	0.00	8.15	18.01	24.38	35.21	43.60						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7623 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

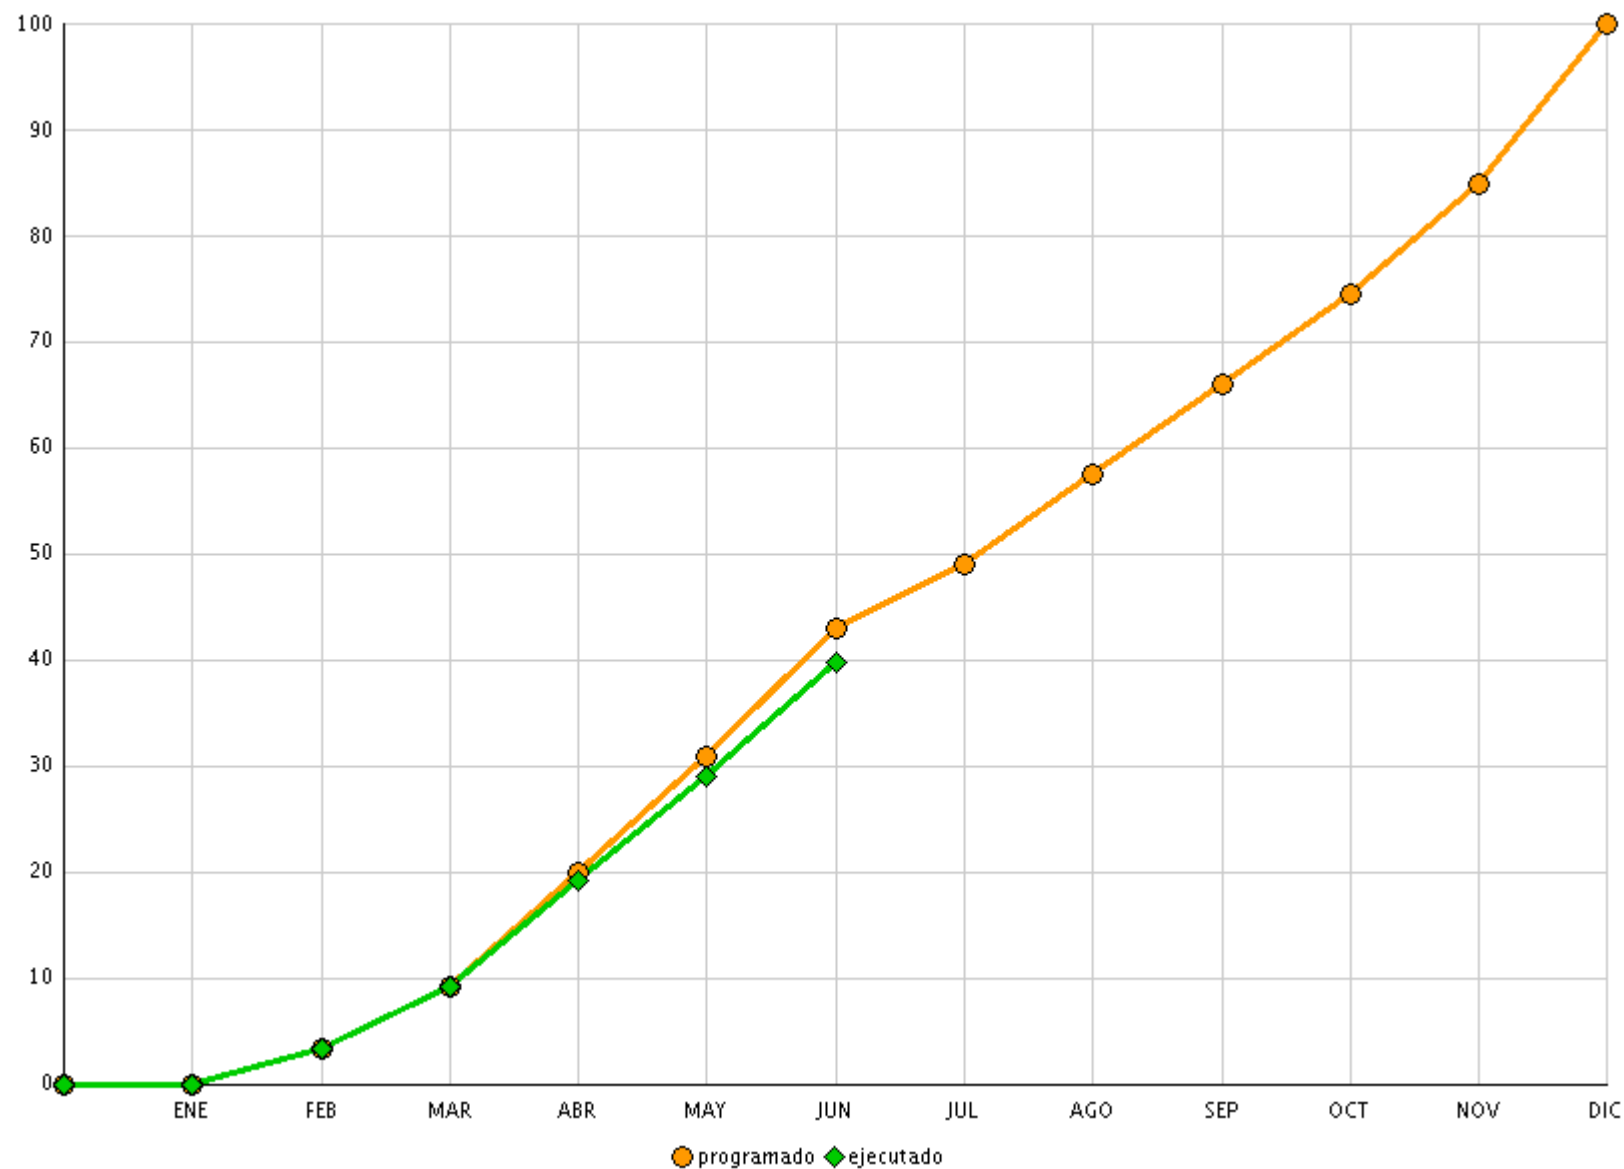


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.35	9.25	20.05	30.85	42.95	49.05	57.55	66.05	74.55	84.85	100.00
Ejecutado	0.00	3.35	9.25	19.15	29.05	39.85						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7629 Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá

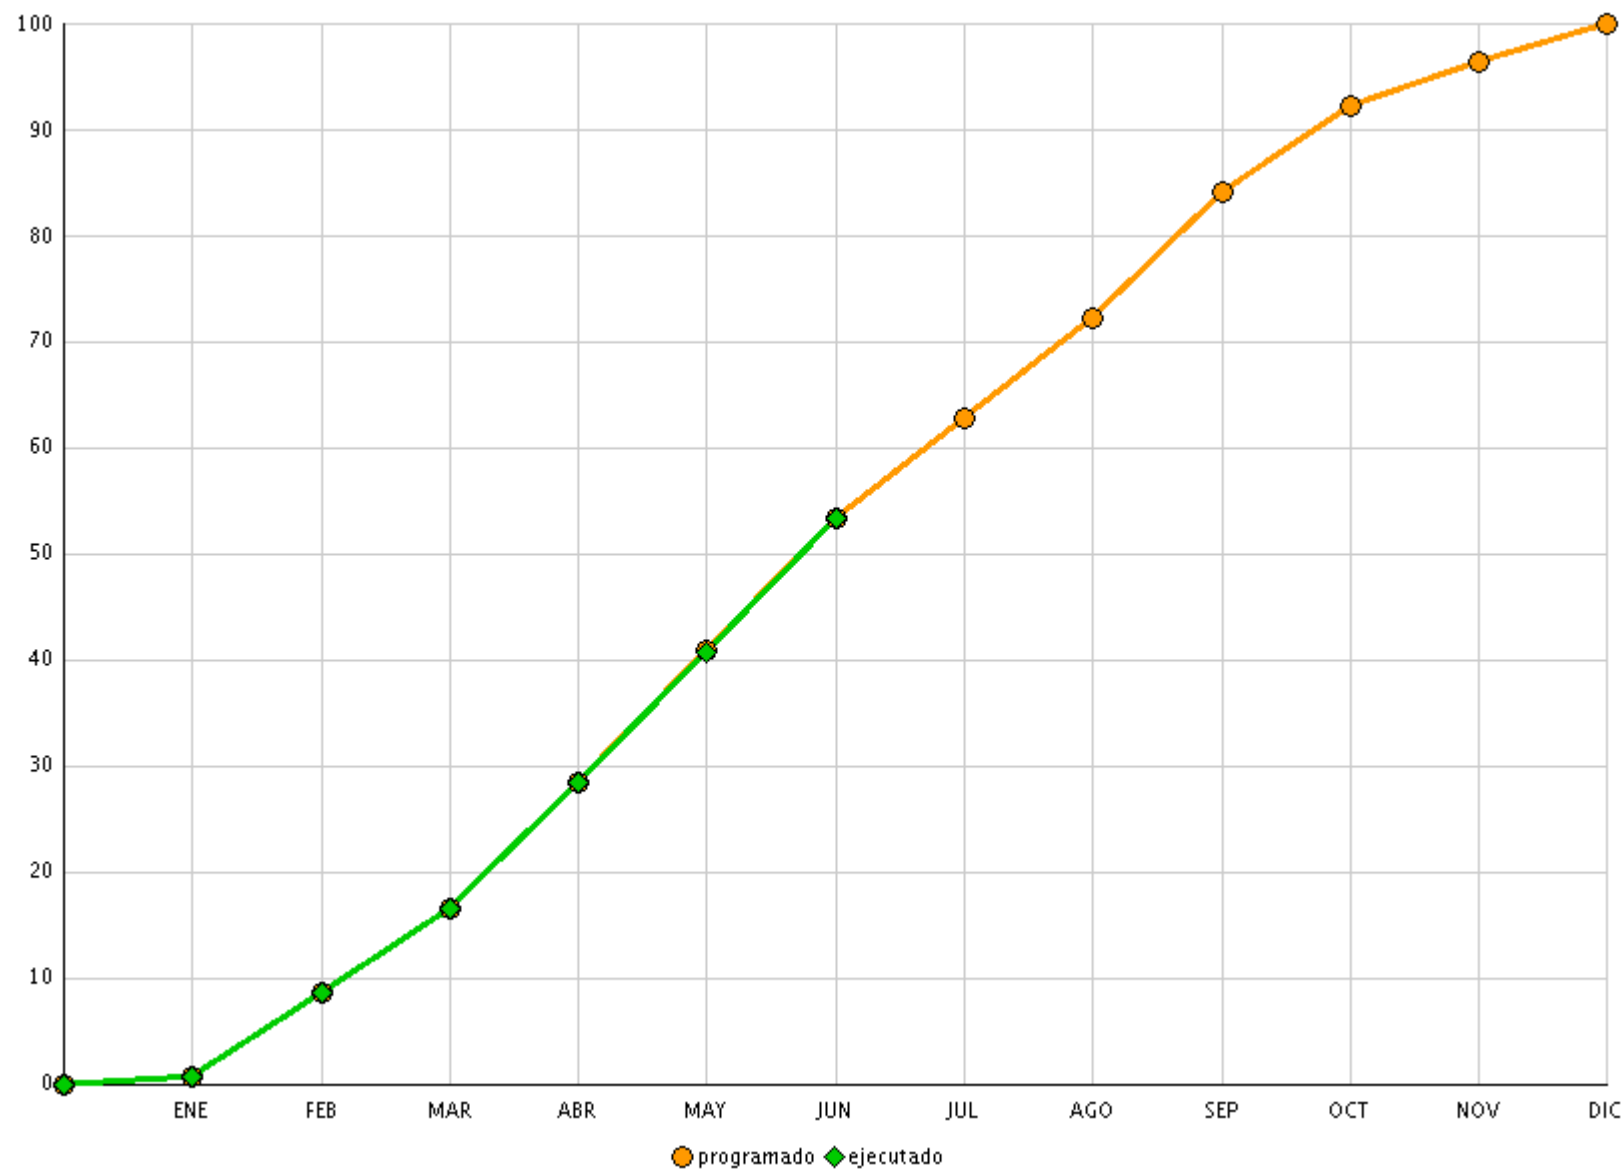


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.83	8.64	16.52	28.48	40.99	53.39	62.74	72.19	84.24	92.27	96.46	100.00
Ejecutado	0.83	8.64	16.52	28.48	40.79	53.39						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7630 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

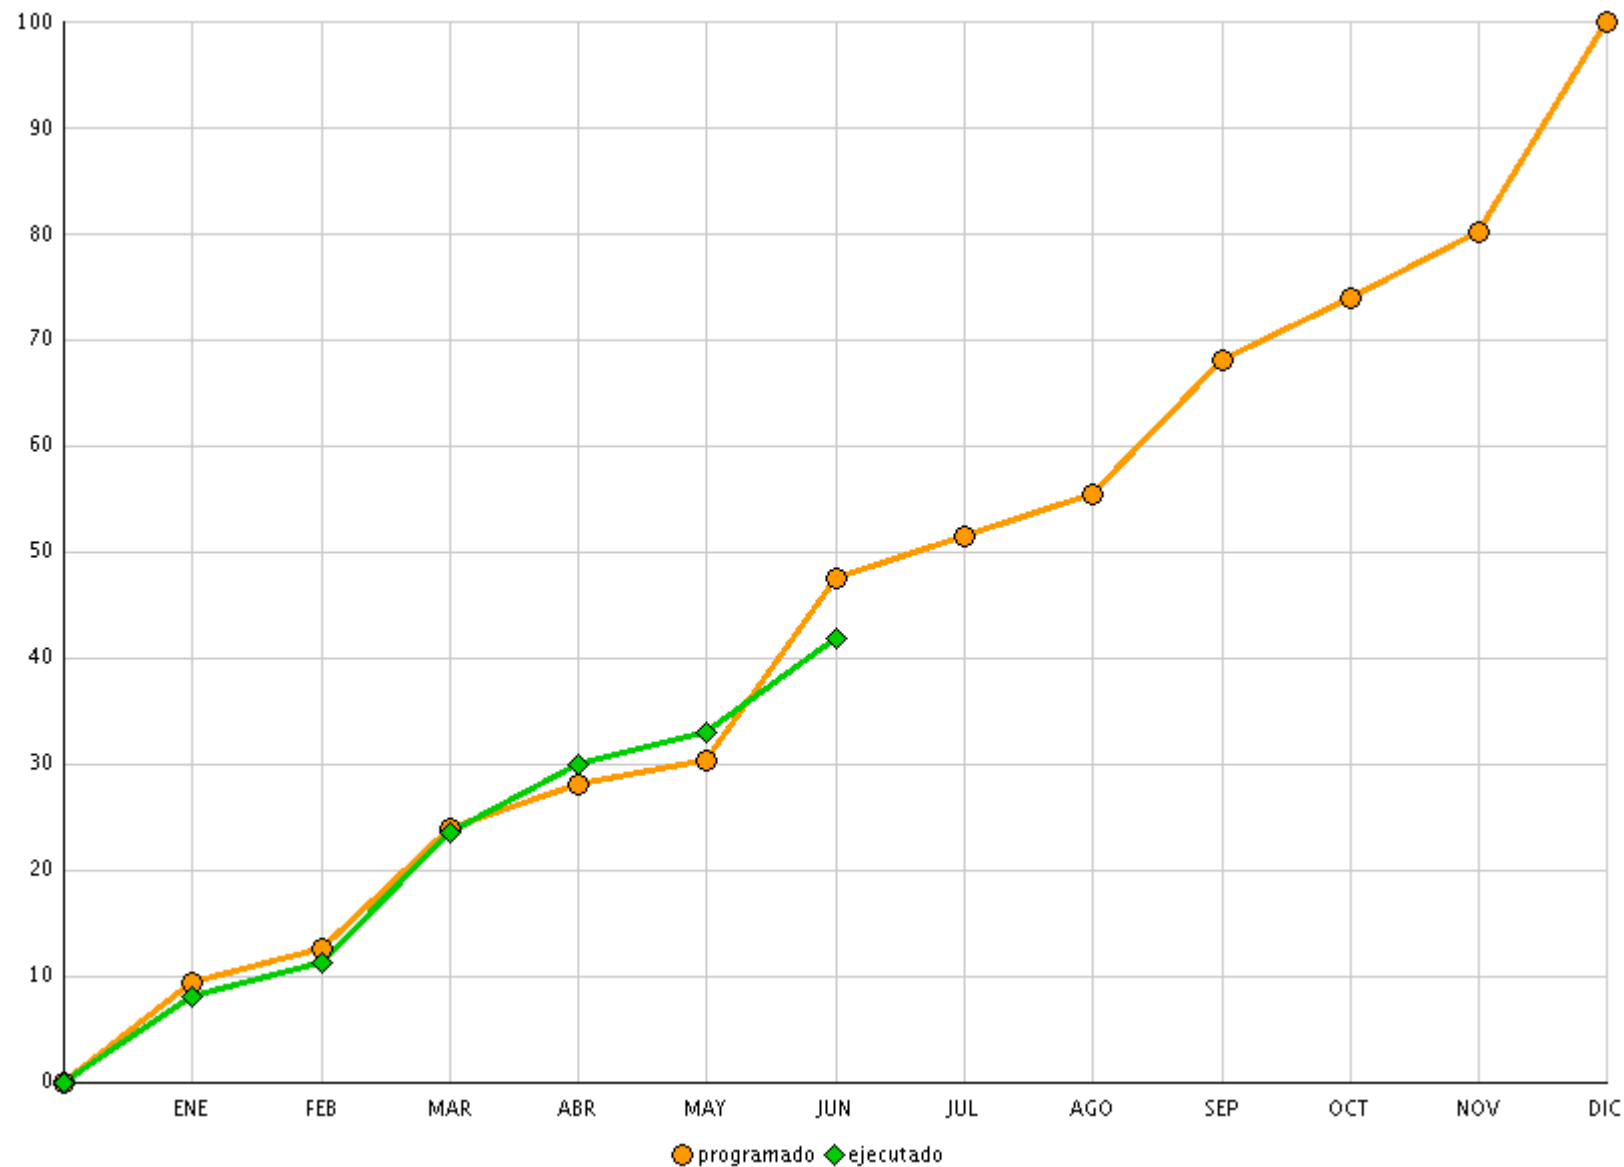


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.38	12.69	23.96	28.18	30.39	47.55	51.46	55.47	68.06	74.04	80.16	100.00
Ejecutado	8.06	11.26	23.66	29.92	33.02	41.88						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7631 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

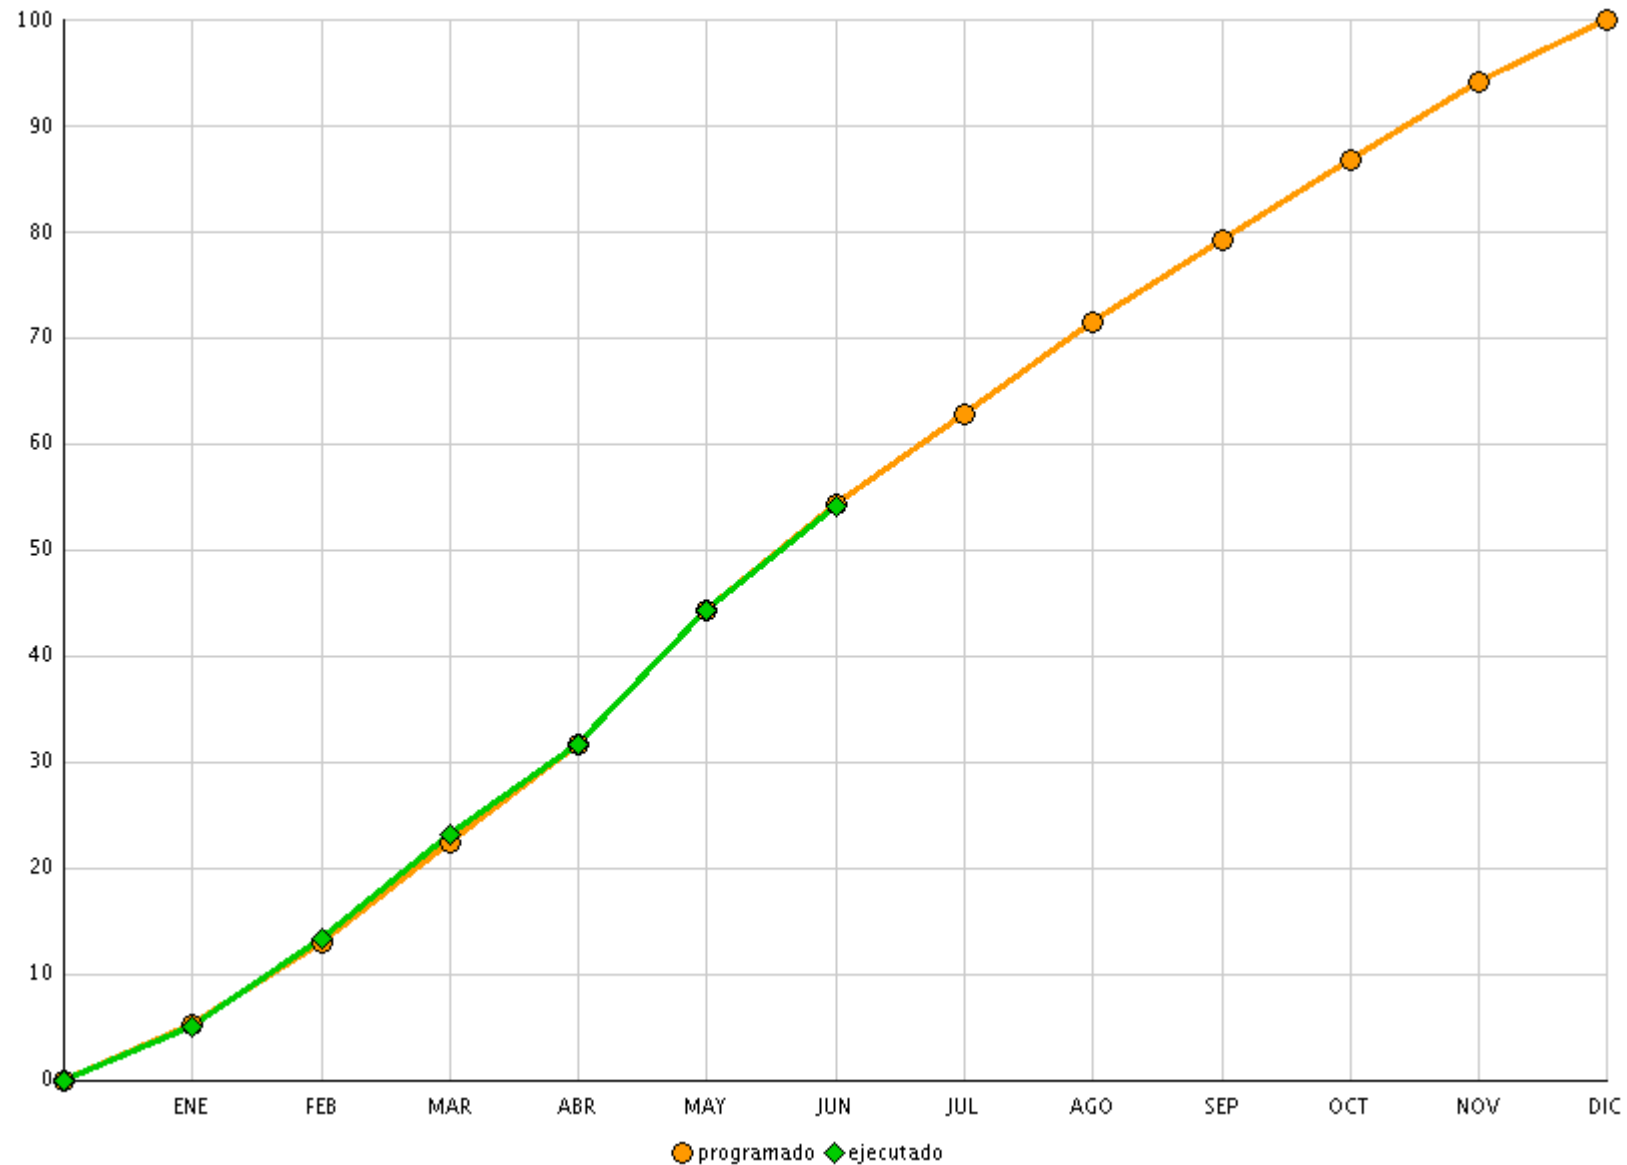


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.22	12.96	22.36	31.71	44.27	54.31	62.91	71.55	79.29	86.85	94.13	100.00
Ejecutado	5.02	13.40	23.23	31.66	44.27	54.16						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7633 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

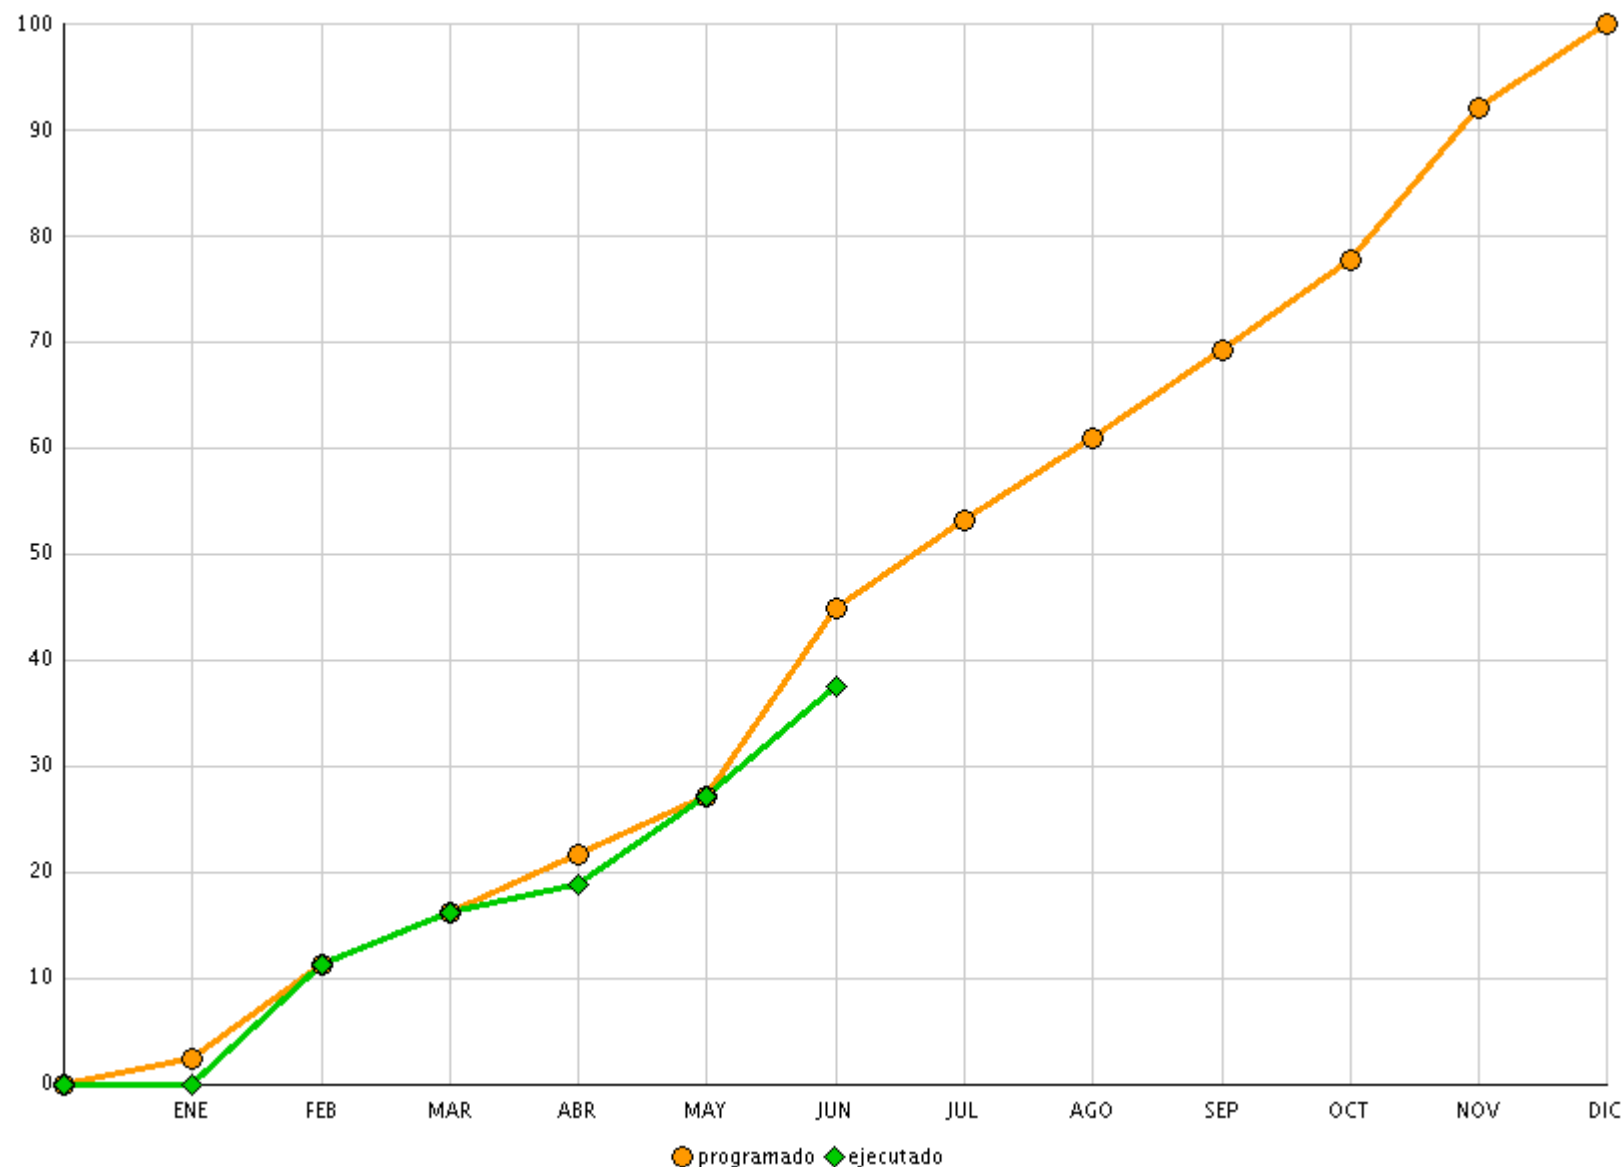


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.50	11.26	16.17	21.63	27.09	44.90	53.25	60.90	69.30	77.70	92.00	100.00
Ejecutado	0.00	11.26	16.17	18.88	27.09	37.60						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7634 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas

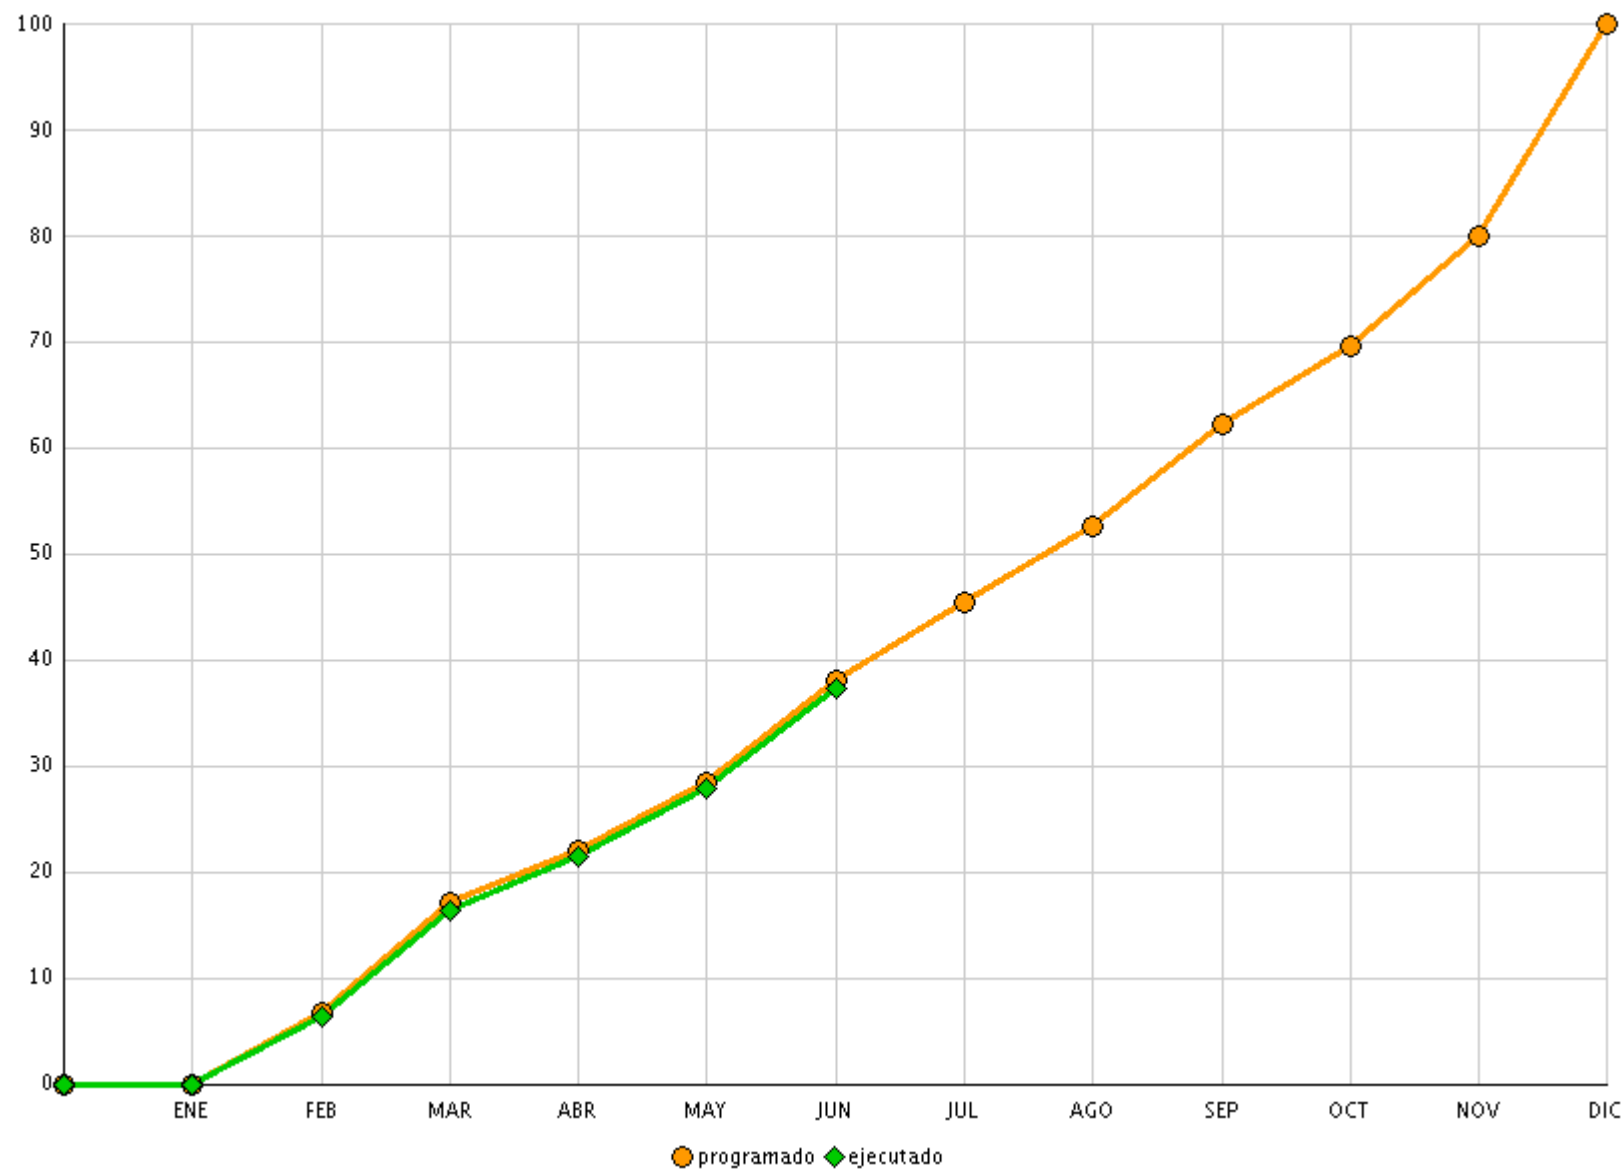


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	6.70	17.10	22.15	28.55	38.10	45.40	52.70	62.25	69.55	80.00	100.00
Ejecutado	0.00	6.35	16.40	21.45	27.85	37.40						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7635 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

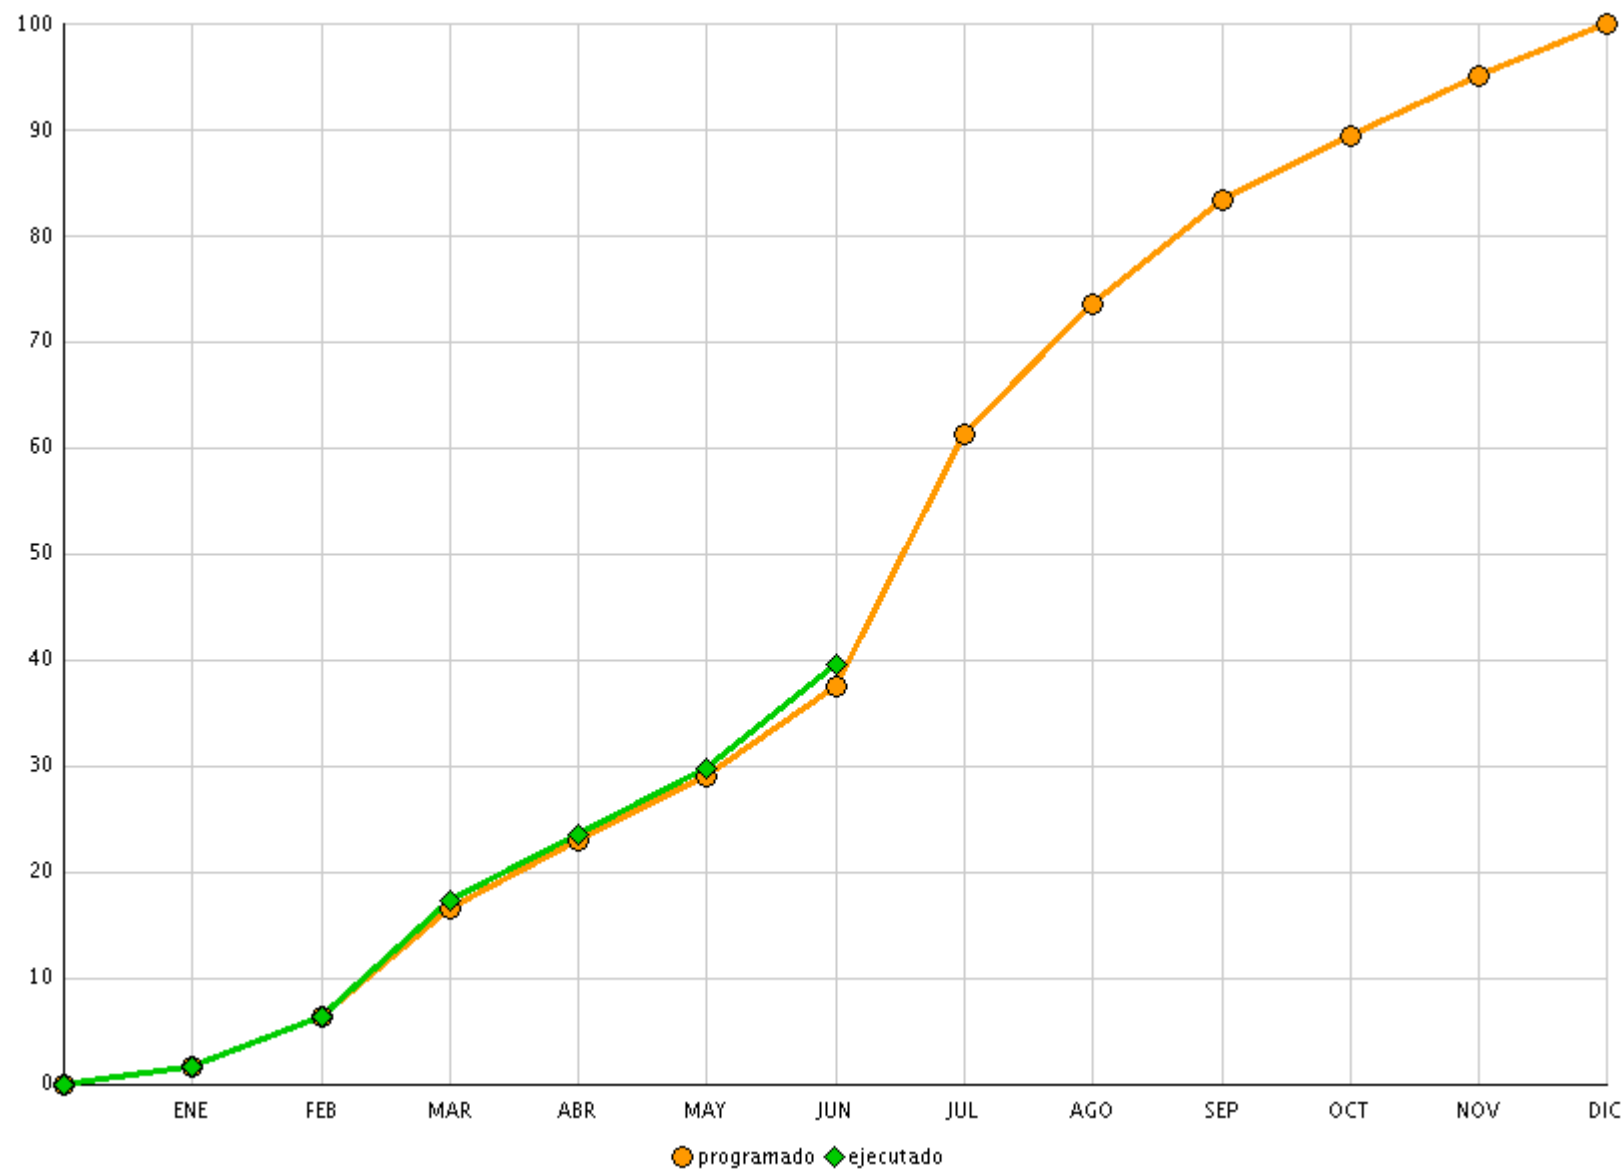


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.62	6.37	16.69	23.01	29.12	37.58	61.30	73.65	83.45	89.41	95.03	100.00
Ejecutado	1.62	6.37	17.35	23.67	29.78	39.56						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7636 Fortalecimiento Institucional de la SDP

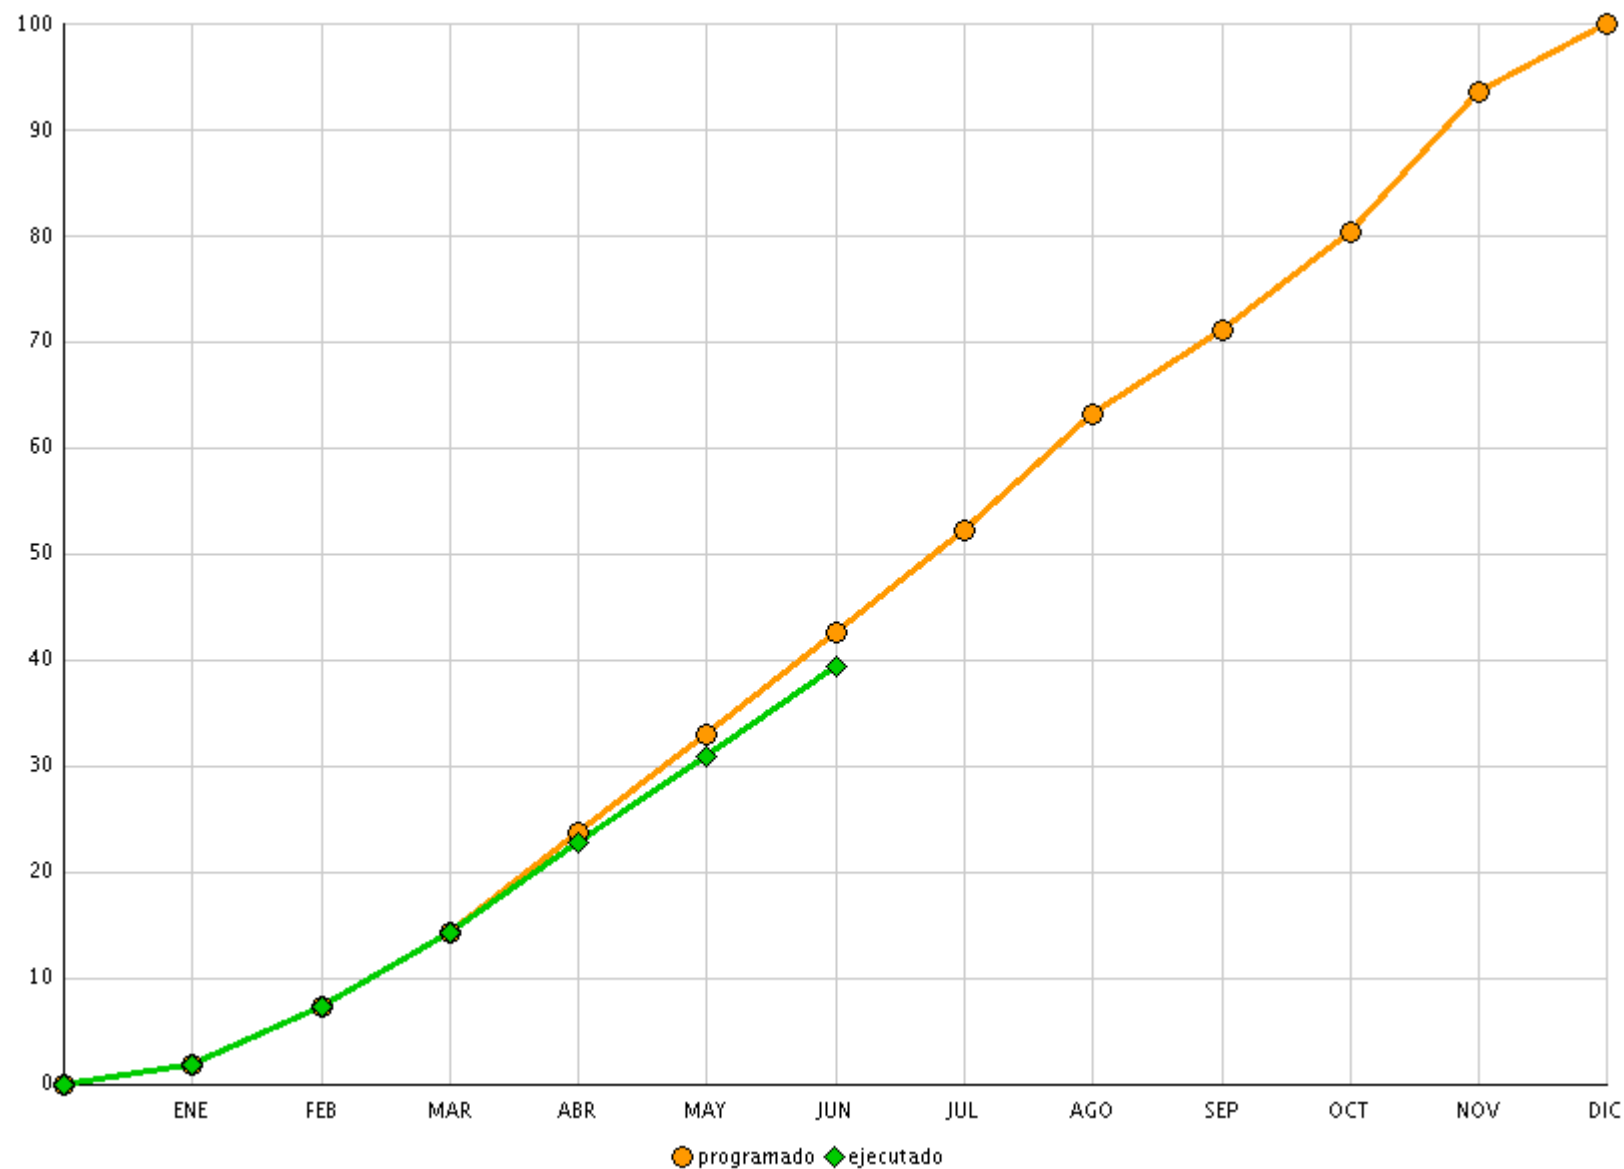


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.84	7.39	14.35	23.76	32.96	42.59	52.32	63.19	71.18	80.37	93.64	100.00
Ejecutado	1.84	7.39	14.35	22.78	31.01	39.51						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7665 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá

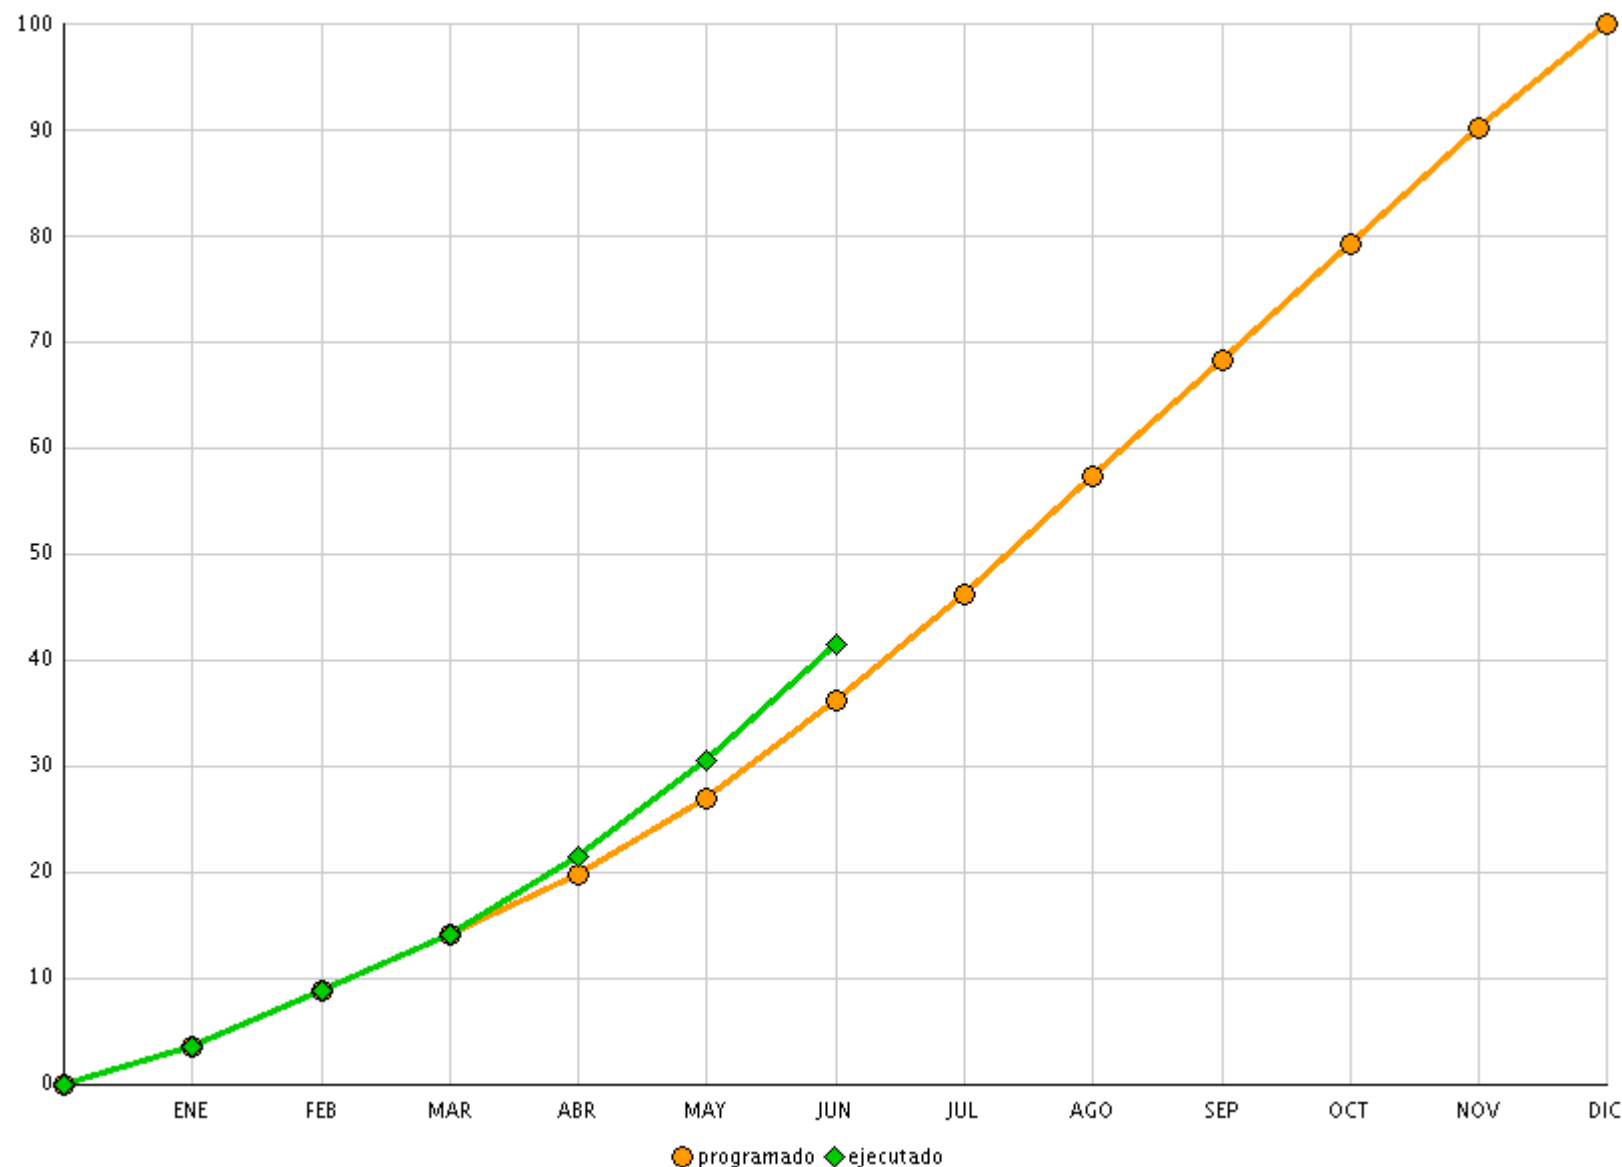


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.49	8.78	14.08	19.73	27.04	36.17	46.30	57.28	68.25	79.22	90.27	100.00
Ejecutado	3.49	8.78	14.08	21.53	30.64	41.57						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7759 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

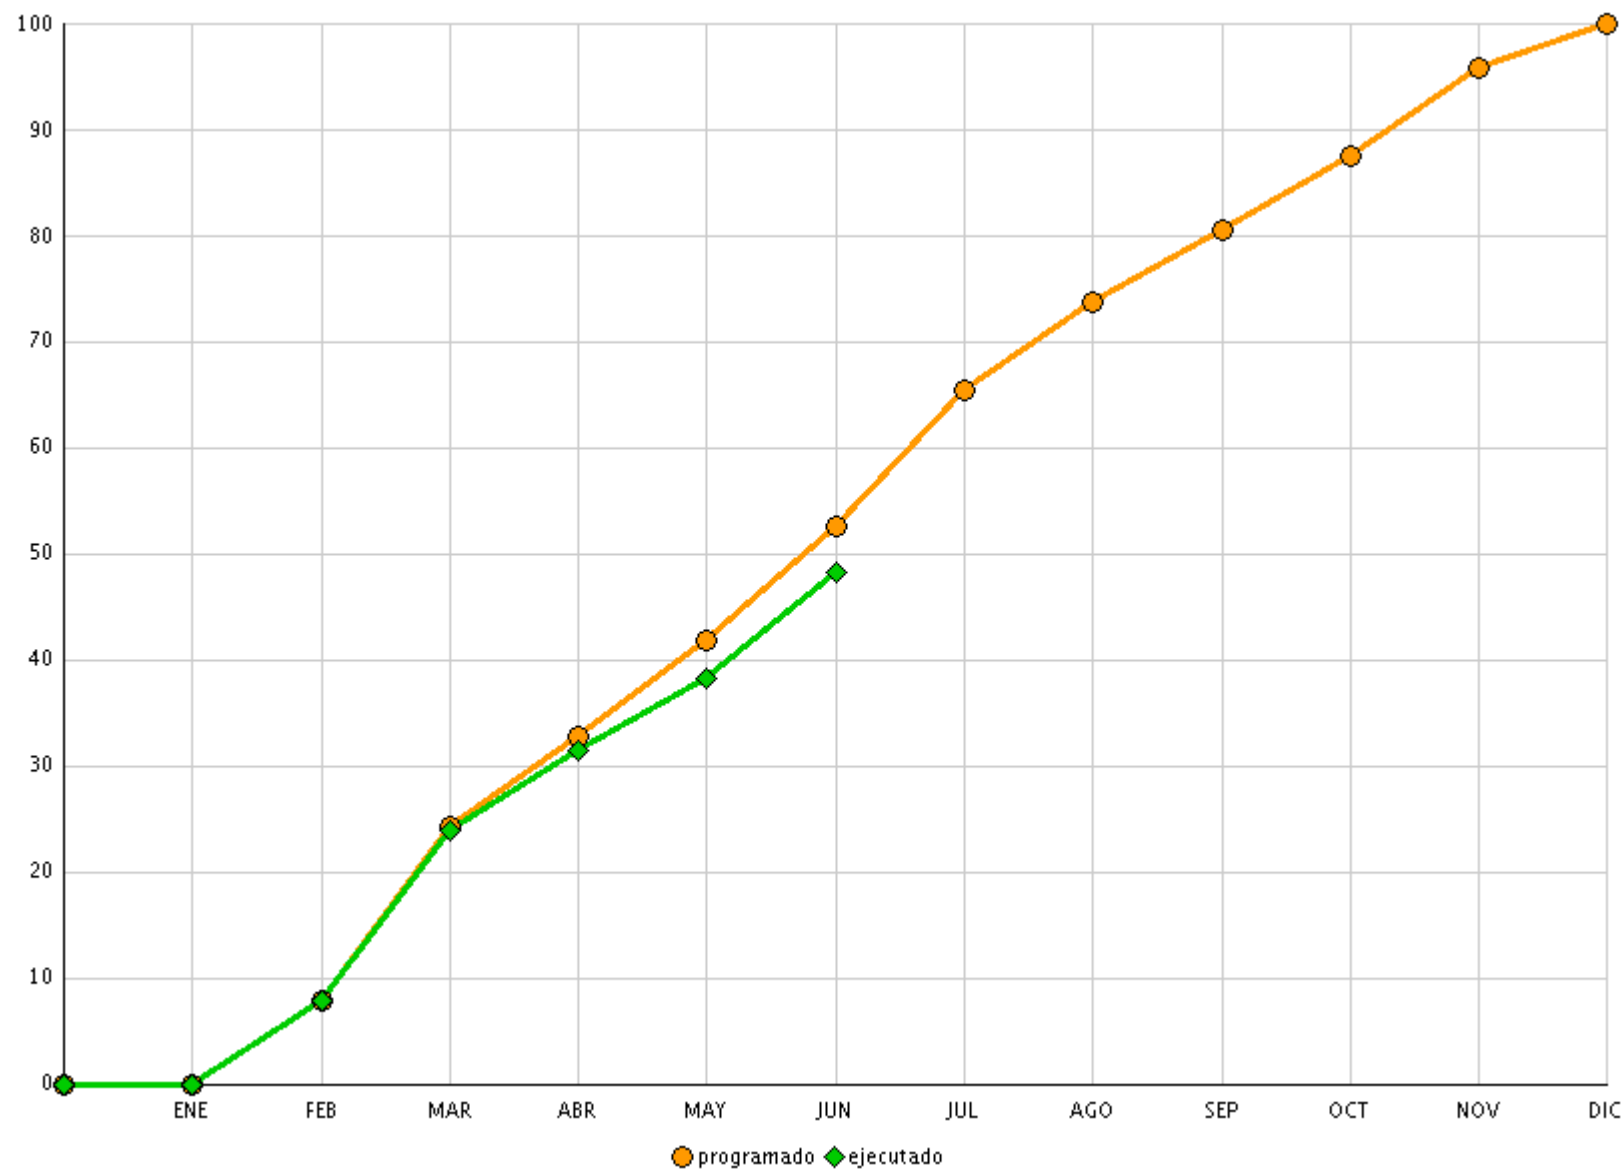

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	7.82	24.37	32.82	41.87	52.60	65.57	73.82	80.53	87.52	95.92	100.00
Ejecutado	0.00	7.82	24.00	31.59	38.35	48.23						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7604 31 Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. IMPLEMENTAR (1) MODELO COLABORATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	0.00																											
1.1 APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y METODOLÓGICO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DISTRITAL - CTPD, EN EL DESARROLLO DE SU PLAN DE ACCIÓN 2022	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
1.2 ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SDP AL ENFOQUE DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, DE ACUERDO CON EL MODELO COLABORATIVO DE PARTICIPACIÓN	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.15
1.3 CONCEPTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE METODOLÓGICO DEL MODELO COLABORATIVO DE PARTICIPACIÓN Y SU CAJA DE HERRAMIENTAS	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.15
1.4 CONCEPTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE COMUNICACIONES DEL MODELO COLABORATIVO DE PARTICIPACIÓN Y SUS MECANISMOS	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.15
1.5 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DISTRITALES Y LOCALES DE PARTICIPACIÓN PARA LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN TORNO AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.15
1.6 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DISTRITALES Y LOCALES DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EN FUNCIÓN DE LA AGENDA ANUAL DE PARTICIPACIÓN	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.15
1.7 DESARROLLO DEL COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN DEL DOCUMENTO CONPES PARA LA POLÍTICA DE ODS, ATENDIENDO LOS ENFOQUES DEL PLAN DE DESARROLLO	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.15
1.8 ASISTENCIA TÉCNICA, OPERATIVA Y LOGÍSTICA A LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.15
1.9 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CON ENFOQUE POBLACIONAL-DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.15
1.10 ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DISTRITAL EN LAS QUE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN TENGA DELEGACIÓN	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.15
2. IMPLEMENTAR 100 % DE LA ESTRATEGIA, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	0.00																											
2.1 ASESORAR Y ACOMPAÑAR PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ALCALDÍAS LOCALES, REVISANDO APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DISEÑADA E INCLUYENDO DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA DE ENFOQUE	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	4.95

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7604 31 Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
DE GÉNERO																													
2.2	APORTAR TÉCNICA Y METODOLÓGICAMENTE A LA COORDINACIÓN GRAL DE PPTOS PARTICIPATIVOS EN DEFINICIÓN Y/O MEJORA DE LINEAMIENTOS Y HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO ALPROCESO CON ALCALDÍASLOCALES	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		50.00		100.00	25.00	2.55
2.3	ADOPTAR LAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS QUE SE DEFINAN Y GENERAR LOS REPORTES QUE DEN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS	9.90	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	5.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	4.95
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								43.60		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7623 32 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR 100% LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	0.00																											
1.1 DISEÑAR LA ENCUESTA DISTRITAL DE CAMBIO CULTURAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
1.2 REALIZAR INFORMES DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL Y LAS CAMPAÑAS DERIVADAS DE DICHA ESTRATEGIA.	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.90
1.3 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
1.4 REALIZAR UN INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI EN LA XXXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ FILBO 2022	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
1.5 REALIZAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CAMBIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS TRANS QUE REALIZAN ASP. (PLAN DE ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR EN 15 SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO	0.00																											
2.1 ELABORAR INFORMES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI.	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
2.2 ELABORAR DOCUMENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.00
2.3 ELABORAR DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.00
3. DESARROLLAR 4 ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA PÚBLICA LGBTI TENIENDO EN CUENTA LAS PARTICULARIDADES Y CARACTERÍSTICAS EN RAZÓN AL GÉNERO Y PERTENENCIA A GRUPOS POBLACIONALES	0.00																											
3.1 ELABORAR DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE A LOS SECTORES LGBTI.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.2 ELABORAR DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES PARA CONTRARRESTAR LAS BARRERAS DE ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DE LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES LGBTI	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.3 ELABORAR DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES A LAS RUTAS YA EXISTENTES PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE PERTENECIENTE A LOS SECTORES LGBTI	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR 14 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A PERSONAS TRANSGÉNERO	0.00																											
4.1 REALIZAR LAS REUNIONES REQUERIDAS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS TRANSGÉNERO Y DE LA ALERTA TEMPRANA	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7623 32 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
046.																												
4.2 REALIZAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES SOBRE LA DIRECTIVA 005 DE 2021.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	1.50
4.3 ELABORAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS TRANSGÉNERO Y DE LA ALERTA TEMPRANA 046	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
5. DISEÑAR 1 ESTRATEGIA DE AMBIENTES LABORALES INCLUSIVOS EN EL DISTRITO Y EN EL SECTOR PRIVADO	0.00																											
5.1 REALIZAR SEGUIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN LABORAL DE LA ESTRATEGIA ALI	4.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
5.2 REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS SUSCRITOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD Y FOMENTO AL	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
5.3 REALIZAR SEGUIMIENTO AL DISEÑO DE UN PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALI EN EL SECTOR PRIVADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR 100% ESTRATEGIA DE AMBIENTES LABORALES INCLUSIVOS EN EL DISTRITO Y EN EL SECTOR PRIVADO	0.00																											
6.1 REALIZAR UN INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ALI EN EL DISTRITO Y EL SECTOR PRIVADO.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
6.2 REALIZAR UN INFORME DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE ALI 2022.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
6.3 IMPLEMENTAR Y EVALUAR UN PILOTO QUE COMPRENDA ACCIONES DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO DE PERSONAS LGBTI EN EL SECTOR PRIVADO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. IMPLEMENTAR 100% LAS ACCIONES CONCERTADAS DEL PROYECTO REGIONAL LATINOAMERICANO CON REDES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONALES EN MATERIA DE POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	0.00																											
7.1 ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONCERTADAS DEL PROYECTO REGIONAL LATINOAMERICANO QUE FORTALEZCA LAS ACCIONES DISTRITALES	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
7.2 DESARROLLAR UN PROYECTO REGIONAL QUE IMPULSE EL REGISTRO DE VIOLENCIAS HACIA PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI PARA LA FORTALECER LA GARANTÍA DE SUS	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
7.3 REALIZAR UN PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI MEDIANTE LA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON ACTORES DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
8. DIFUNDIR EL 100% LAS ACCIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	0.00																											
8.1 ELABORAR DOCUMENTO DE LAS ACCIONES TÉCNICAS QUE FORTALEZCAN LA ARTICULACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LGBTI NACIONAL Y DISTRITAL	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
8.2 REALIZAR EL DISEÑO DE CONTENIDOS PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITAL Y NACIONAL LGBTI.	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	35.00	1.40
8.3 REALIZAR LAS ACCIONES DE ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITAL Y NACIONAL LGBTI.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	15.00	0.75
9. FORTALECER 100% LA RUTA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A CASOS DE DISCRIMINACIÓN O VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7623 32 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
9.1 DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN O VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE LOS SECTORES	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	15.00	0.60
9.2 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIAS CONTRA LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI EN	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
9.3 REALIZAR BOLETÍN DE LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN O VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI EN BOGOTÁ.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	1.50
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		39.85

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7629 15 Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 23 Bogotá rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR 1 LA POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD BAJO LAS DIRECTRICES DE LA METODOLOGÍA CONPES	0.00																											
1.1	IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PPR	2.40	0.00	0.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		15.00		10.00		9.00		2.00		0.00		100.00	49.00	1.18
1.2	ELABORAR EL DOCUMENTO DE PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE RURALIDAD	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		10.00		5.00		0.00		0.00		100.00	45.00	1.08
1.3	GENERAR LA PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE RURALIDAD	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		15.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	24.00	0.58
1.4	AJUSTAR Y TERMINAR EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA PARA PRESENTACIÓN AL CONPES D.C.	0.80	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.80
2.	GENERAR 100 PORCIENTO DE LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS, PARA LOGRAR UNA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, COORDINADA Y ARTICULADA PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO RURAL	0.00																											
2.1	IMPLEMENTAR LA RUTA DE REGLAMENTACIÓN PARA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EDER	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		3.00		100.00	42.00	1.68
2.2	ELABORAR LA PROPUESTA PRELIMINAR DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS, PARA LOGRAR UNA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, COORDINADA Y ARTICULADA PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		15.00		3.00		2.00		100.00	35.00	1.40
3.	GENERAR 100 PORCIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, PARA LOGRAR LA CONCORDANCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN EN EL TERRITORIO RURAL DEL D.C, BAJO EL MDRS	0.00																											
3.1	GESTIONAR LA INCORPORACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES DEL MDRS Y CONSTRUIR LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Y TRANSVERSALES.	30.80	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	15.40
3.2	PROPONER EL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DEL MDRS Y VIABILIZAR LAS ALTERNATIVAS PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL MDRS.	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00		10.00		20.00		10.00		5.00		5.00		100.00	40.00	12.32
3.3	AJUSTAR EL COMPONENTE ESTRATEGICO DEL DTS DEL MODELO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE MDRS	15.40	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.40
4.	DESARROLLAR 100 PORCIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL Y LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO RURAL (SIPSDER)	0.00																											
4.1	PONER EN OPERACIÓN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN TODOS SUS MÓDULOS.	2.10	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		14.00		2.00		2.00		2.00		100.00	50.00	1.05
4.2	LEVANTAR LOS REQUERIMIENTOS Y DESARROLLO DE LOS MISMOS FRENTE A LOS MÓDULOS ACTUALES DE LA HERRAMIENTA.	2.10	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		14.00		2.00		2.00		2.00		100.00	50.00	1.05
4.3	CONSECUCIÓN E INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS EN EL	2.80																									100.00	52.00	1.46

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7629 15 Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
SIPSDER		2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		12.00		2.00		2.00		2.00		2.00					
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		53.39	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7630 28 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
Año	IPC													
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
TOTAL						\$0					REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR 3 DOCUMENTOS COMPILATORIOS DE LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN EL 100% DE LAS HECTÁREAS DEFINIDAS CON BASE EN EL POT	0.00																											
1.1 GESTIONAR Y APOYAR EL PROCESO PREVIO A LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, CONCEPTOS, ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, PROYECTOS DE DECRETO	3.60	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.62
1.2 EMITIR CONCEPTOS Y REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE DEMANDE LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES ASOCIADAS AL PROCESO EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS.	3.20	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.44
1.3 ELABORAR PROYECTO DE DECRETO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL COMITÉ TÉCNICO DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO CTPPD	4.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	34.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	2.64
1.4 ELABORAR UN DOCUMENTO DE FORMULACIÓN Y DEMÁS ACCIONES NECESARIAS QUE CONLLEVEN A LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DEL SISTEMA DEL CUIDADO Y SERVICIOS SOCIALES -PSCSS	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	7.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		100.00	13.90	0.11
1.5 REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA DEL CUIDADO Y SERVICIOS SOCIALES	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		100.00	38.00	0.46
1.6 ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REGLAMENTACIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON LOS TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA.	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		100.00	25.00	0.80
1.7 ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y CONCEPTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SISTEMA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DEFINIDOS EN EL POT.	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	40.00	0.48
1.8 APOYAR EN EL AVANCE DE LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA, ACORDE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL POT.	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		33.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
1.9 ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS E INCLUIR NUEVOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN LA REGLAMENTACIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00		0.00		37.50		0.00		0.00		25.00		100.00	15.00	0.48
1.10 FORMULAR PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN URBANÍSTICA.	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.60
1.11 ADELANTAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO LOCAL UPL RURALES (CERROS ORIENTALES, CUENCA TUNJUELO Y SUMAPAZ) Y APOYAR EN LAS DEMÁS UPLS RN EL COMPONENTE RURAL	3.20	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	41.00	1.31
1.12 CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO PRELIMINAR QUE SUSTENTA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ECO URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.	3.60	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	41.00	1.48
1.13 ELABORAR ESTUDIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA URBANÍSTICA CON ENFOQUE EN LAS UNIDADES DE	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	40.00	0.48

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7630 28 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
PLANEAMIENTO LOCAL.																												
1.14 GENERAR DOCUMENTOS DE INTERPRETACIÓN O PRECISIONES EN APLICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS.	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	50.00	0.60
1.15 ADELANTAR UN ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DE APLICATIVO DE INFORMACIÓN DE LA NORMA URBANÍSTICA.	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	40.00	0.48
1.16 ADELANTAR LAS ACCIONES Y MEDIOS DE CONTROL QUE SE PROMUEVAN EN EL MARCO DEL DECRETO 555 DE 2021.	1.20	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.28
1.17 ELABORAR LOS ESTUDIOS Y APOYAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA LA PRECISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS URBANAS, PROYECTOS DE PROXIMIDAD Y NORMA URBANA EN LA ESCALA LOCAL DEL POT	2.80	0.00	0.00	9.00	5.00	9.00	10.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	15.00	0.42
1.18 IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA COMUNICACIÓN PÚBLICA, SOCIALIZACION Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA REGLAMENTACIÓN DEL POT	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. GENERAR 100 PORCIENTO INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS PLANES PARCIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS	0.00																											
2.1 REALIZAR VISITA A TERRENO A CADA UNO DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO ADOPTADOS CON EL FIN DE HACER EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPONENTES URBANÍSTICOS.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	47.00	1.55
2.2 GENERAR UNA FICHA DE SEGUIMIENTO POR PLAN PARCIAL DE DESARROLLO ADOPTADO DE ACUERDO A LOS COMPONENTES DEFINIDOS: ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL, MOVILIDAD, ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA Y OTROS USOS.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	47.00	1.55
2.3 ACTUALIZAR LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL TOTAL DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO ADOPTADOS, A FIN DE ESTABLECER EL ESTADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO.	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	47.00	1.60
3. REALIZAR 5 DOCUMENTOS COMPILATORIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON RELACIÓN A LA VIABILIZACIÓN DE HECTÁREAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD	0.00																											
3.1 GESTIONAR Y APOYAR EL PROCESO PREVIO A LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, CONCEPTOS, PROYECTOS DE DECRETOS, QUE DEMANDE LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES ASOCIADAS AL PROCESO.	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.40
3.2 EMITIR CONCEPTOS Y REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE DEMANDE LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES ASOCIADAS AL PROCESO EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.40
3.3 REVISAR Y EMITIR OBSERVACIONES A LA FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES.	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00		0.00		0.00		0.00		0.00		49.00		100.00	0.00	0.00
3.4 PRESENTAR AL COMITÉ TÉCNICO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD O NO DE LOS PLANES PARCIALES Y CONCERTAR LOS PLANES PARCIALES CON LAS AUTORIDADES AMBIENTALES REQUERIDAS.	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		49.00		100.00	0.00	0.00
3.5 ENVIAR A LA SECRETARÍA GENERAL LOS DOCUMENTOS COMPLETOS DEL PLAN PARCIAL CON LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PROYECTO DE DECRETO PARA SU ADOPCIÓN	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		49.00		100.00	0.00	0.00
3.6 ELABORAR Y EXPEDIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA TRANSICIÓN O DECISIONES NORMATIVAS DEL POT.	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.50	5.00	11.00	10.00	0.00	10.00	2.10	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	21.60	1.21
3.7 REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO Y NORMATIVO PARA VIABILIZAR MEDIANTE ACTOS ADMINISTRATIVOS ÁREAS EN EL TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA.	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	40.00	2.24

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7630 28 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
3.8	ELABORAR Y EXPEDIR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE VÍAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE PERMITAN LA VIABILIZACIÓN DE HECTÁREAS NETAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN LA CIUDAD.	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		28.00		62.00		0.00		100.00	10.00	0.56
3.9	GESTIONAR LAS DECISIONES URBANÍSTICAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES, QUE PERMITAN VIABILIZAR LA ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MATERIA DE ESPACIO PÚBLIC	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	9.20	0.00	90.80	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40.00		100.00	100.00	4.80
3.10	FORMULAR PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA LEGALIZACIÓN Y LA FORMALIZACIÓN URBANÍSTICA PARA LA VIABILIZACIÓN DE HECTÁREAS.	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	11.13	0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		20.00		100.00	16.13	0.90
4.	ACTUALIZAR 1 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS, ARTICULADO CON EL ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD CON EL ENFOQUE DE CUIDADO	0.00																											
4.1	CONSOLIDAR Y FORMULAR LA METODOLOGÍA, QUE PERMITAN ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTOS, ARTICULADO CON EL ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD CON EL ENFOQUE DE CUIDADO	5.00	80.00	80.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
5.	CONSTRUIR 1 LÍNEA BASE PARA LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS CON ENFOQUE REGIONAL Y DE CUIDADO	0.00																											
5.1	CONSOLIDAR Y FORMULAR LA METODOLOGÍA QUE PERMITA DISEÑAR LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CON ENFOQUE REGIONAL Y DE CUIDADO.	5.00	80.00	80.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									41.88	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7631 22 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR 1 BASE MAESTRA DE BOGOTÁ SOLIDARIA A TRAVÉS DE LA RECOPIACIÓN. PROCESAMIENTO. OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN QUE LA CONFORMA PMR	0.00																											
1.1	IDENTIFICAR LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL CANAL DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL SISTEMA DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEFINIDAS POR EL COMITÉ COORDINADOR	3.75	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.87
1.2	ACTUALIZAR LA BASE MAESTRA DEL SISTEMA DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA	3.75	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.87
1.3	GENERAR LOS REPORTE E INFORMES SOLICITADOS POR PARTES INTERESADAS (ENTES DE CONTROL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CONCEJO DE BOGOTÁ, ENTRE OTROS)	3.75	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.87
1.4	DAR REPUESTA A LOS REQUERMIENTOS ASOCIADOS AL CANAL DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS	3.75	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.87
2.	ACTUALIZAR 1 BASE DE DATOS SISBÉN	0.00																											
2.1	APLICAR LAS ENCUESTAS SISBÉN DE ACUERDO CON LA MODALIDAD (DEMANDA, POR TUTELA)	2.40	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.10
2.2	SUPERVISAR LOS OPERATIVOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS SISBÉN	1.80	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.83
2.3	CONSOLIDAR LAS NUEVAS ENCUESTAS SISBÉN EN LA BASE HISTÓRICA DE ENCUESTADOS	2.40	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.10
2.4	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS SISBÉN	1.80	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.83
2.5	REGISTRAR LAS NOVEDADES RELACIONADAS CON LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN	1.80	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.83
2.6	PRESTAR APOYO TÉCNICO AL EQUIPO DE INFORMADORES ASIGANDOS EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN SISBÉN DE LA RED CADE Y SUPERCAD E	1.80	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.83
3.	ACTUALIZAR 1 BASE ÚNICA DE ESTRATIFICACIÓN. CON LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA URBANA DEFINIDA POR EL DANE	0.00																											
3.1	PROCESAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN APORTADA POR CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS	1.60	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	0.80
3.2	RECOLECTAR Y/O ORGANIZAR LA INFORMACIÓN INSUMO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	1.60	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	50.00	0.80
3.3	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA BASE ÚNICA DE ESTRATIFICACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	1.60	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	0.77
3.4	ESTRUCTURAR Y CONSOLIDAR LA ACTUALIZACIÓN URBANA CON LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE DECRETO	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	10.00	0.16
3.5	REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA	1.60	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	0.77
4.	ACTUALIZAR 1 BASE ÚNICA DE ESTRATIFICACIÓN. CON LA	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7631 22 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEFINIDA POR EL DANE. PARA LAS FINCAS Y VIVIENDAS DISPERSAS RURALES Y CENTROS POBLADOS																												
4.1 PROCESAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN APORTADA POR CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN RURAL	1.40	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.64
4.2 RECOLECTAR Y/O ORGANIZAR LA INFORMACIÓN INSUMO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN RURAL DE BOGOTÁ	1.40	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	0.67
4.3 ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA BASE ÚNICA DE ESTRATIFICACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN RURAL DE BOGOTÁ	1.40	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	0.67
4.4 ESTRUCTURAR Y CONSOLIDAR LA ACTUALIZACIÓN RURAL CON LA ELABORACIÓN DE DOS PROYECTOS DE DECRETO: 1) FINCAS Y VIVIENDAS DISPERSAS Y 2) CENTROS POBLADOS.	1.40	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	0.67
4.5 REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN RURAL	1.40	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	0.67
5. HACER 2 ENCUESTAS MULTIPROPÓSITO PARA BOGOTÁ Y MUNICIPIOS	0.00																											
5.1 CONFORMAR, CONSOLIDAR Y DEPURAR LA BASE DE DATOS	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
5.2 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUADROS DE SALIDA DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA MULTIPROPÓSITO, INSUMO PARA SU PUBLICACIÓN	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
5.3 ENTREGAR LA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN RECOLECTADA, DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA, DEPURADA Y ANONIMIZADA Y ENTREGA DE CUADROS DE SALIDA CON LOS PRINCIPALES INDICADORES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	5.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
5.4 REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE CIFRAS DE LA ENCUESTA MULTIPROPÓSITO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	3.00
6. ELABORAR 11 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER URBANO. RURAL. SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL. DIRIGIDOS A SUSTENTAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES	0.00																											
6.1 PLANEAR ELABORACIÓN DOCUMENTOS REFERIDOS A: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA RURALIDAD DE BOGOTÁ; INDICE DE CAPACIDAD DE PAGO PARA BOGOTÁ- REGIÓN Y; EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE ELEMENTOS URBANOS	1.80	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.80
6.2 ELABORAR DOCUMENTO RELACIONADO CON LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE ELEMENTOS URBANOS	1.80	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.72
6.3 ELABORAR DOCUMENTO RELACIONADO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA RURALIDAD DE BOGOTÁ	1.80	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.72
6.4 ELABORAR DOCUMENTO RELACIONADO CON EL INDICE DE CAPACIDAD DE PAGO PARA BOGOTÁ - REGIÓN	1.80	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.72
6.5 COORDINAR EL PORTAL INVENTARIO BOGOTÁ Y SU ARTICULACIÓN CON EL REGISTRO DE PUBLICACIONES DISTRITALES	1.80	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.00	0.81
7. ELABORAR 5 ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN	0.00																											
7.1 DEFINIR LOS COMPONENTES DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN	2.00	10.00	0.00	45.00	55.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
7.2 RECOPIRAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN INSUMO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN DE BOGOTÁ	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00		15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7631 22 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
7.3 PROCESAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN APORTADA POR CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.4 ESTRUCTURAR Y CONSOLIDAR EL ESTUDIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
7.5 REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE ESTRATIFICACIÓN	2.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00		7.00		7.00		15.00		15.00		100.00	42.00	0.84
8. IMPLEMENTAR 100 POR CIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL SECTOR PLANEACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL	0.00																											
8.1 ADELANTAR LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2022 EN LA ESTRATEGIA DE «ORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA A NIVEL DISTRITAL» DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		0.00		100.00	40.00	0.60
8.2 ADELANTAR LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2022 EN LA ESTRATEGIA DE «FORTALECER LA MEDICIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS QUE DA CUENTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS» DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		0.00		100.00	40.00	0.40
8.3 ADELANTAR LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2022 EN LA ESTRATEGIA DE «FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL USO DE ESTADÍSTICA A NIVEL DISTRITAL» DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		0.00		100.00	40.00	0.60
8.4 ADELANTAR LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2022 EN LA ESTRATEGIA DE «FOMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS» DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		0.00		100.00	40.00	0.60
8.5 ADELANTAR LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2022 EN LA ESTRATEGIA «IMPULSAR LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DEL DISTRITO» DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		0.00		100.00	40.00	0.60
8.6 ADELANTAR LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2022 EN LA ESTRATEGIA DE «PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA» DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		0.00		100.00	40.00	0.60
8.7 ADELANTAR LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2022 EN LA ESTRATEGIA DE «IDENTIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS» DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		0.00		100.00	40.00	0.60
9. ACTUALIZAR 1 BASE DE DATOS GEOGRÁFICA CORPORATIVA	0.00																											
9.1 VERIFICAR, ESTRUCTURAR Y CONSOLIDAR EN LA BDGC LA INFORMACIÓN REFERENTE AL NUEVO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	3.06	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.38
9.2 REVISAR, GENERAR Y ACTUALIZAR LOS INSUMOS DOCUMENTALES RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE REPOSA EN LA BDGC	2.97	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.34
9.3 IMPLEMENTAR UN GESTOR DOCUMENTAL DE LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA CORPORATIVA (BDGC) DE LA SDP	1.97	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.89
10. PRODUCIR 41 REPORTES CON INFORMACIÓN DE OPERACIONES URBANAS INTEGRALES A PARTIR DE LA DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BATERÍA DE INDICADORES PARA SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00																											
10.1 GESTIONAR LAS HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES ADOPTADAS O EN FORMULACIÓN	0.50	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	5.00		5.00		5.00		5.00		20.00		0.00		100.00	60.00	0.30
10.2 ELABORAR REPORTES DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES ADOPTADAS O EN FORMULACIÓN	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7631 22 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										54.16	
Total ponderación vertical		100.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7633 23 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ELABORAR 6 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN, PARA LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES ENFOCADOS HACIA LA REGENERACIÓN URBANA	0.00																											
1.1	ADELANTAR LA REVISIÓN, DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA FORMULACIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES.	9.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	5.00		5.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	50.00	4.50
1.2	ESTRUCTURAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES.	9.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	10.00	5.00	5.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	25.00	2.25
2.	IMPLEMENTAR 3 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN PARA LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES QUE INVOLUCRE Y REFLEJE LOS APORTES Y RECOMENDACIONES DE LOS ACTORES RELEVANTES.	0.00																											
2.1	GESTIONAR LA CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA GOBERNANZA DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES.	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.00
2.2	CONSOLIDAR Y FORTALECER LOS ESPACIOS Y HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y GOBERNANZA DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES (CIOEM).	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	10.00	20.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	40.00	1.60
2.3	GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTRAINSTITUCIONAL NECESARIA CON LAS INICIATIVAS DE OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN DISTRITAL Y NACIONAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	5.00	10.00	5.00	5.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	25.00	1.00
3.	ELABORAR 3 DOCUMENTOS DE PROPUESTA DE ACTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE	0.00																											
3.1	ADELANTAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS Y ACTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS DIRECTRICES DE LAS ATUACIONES URABANS INTEGRALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	10.00	0.60
3.2	ESTRUCTURAR EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	5.00		5.00		5.00		5.00		20.00		0.00		100.00	60.00	3.60
4.	GESTIONAR 1 PLAN DE ACCION INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISTRITO AEROPORTUARIO 2020-2024	0.00																											
4.1	ADELANTAR LA REVISIÓN, DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA FORMULACIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUI DEL DISTRITO AEROPORTUARIO.	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	10.00	5.00	5.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	25.00	1.50
4.2	ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DEL DISTRITO AEROPORTUARIO	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	5.00		5.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	50.00	3.00
5.	ELABORAR 8 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CON APOORTE A LA POLÍTICA SECTORIAL Y AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN, CUANDO SEA PERTINENTE	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7633 23 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
INCORPORANDO EL ENFOQUE DE GÉNERO O DIFERENCIAL																												
5.1 ELABORAR LOS DOCUMENTOS DEFINIDOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN, INCLUYENDO UN CAPÍTULO RELACIONADO CON LOS TEMAS DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DENTRO DE UNO DE LOS ESTUDIOS, CUANDO SEA PERTINENTE.	7.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	2.80
5.2 SOCIALIZAR Y/O PUBLICAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5.3 ADELANTAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN QUE INCLUYE LA DEFINICIÓN DE LAS TEMÁTICAS SOBRE LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DOCUMENTOS, Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS.	6.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
6. FORMULAR 2 APUESTAS TERRITORIALES, CON PROPUESTAS DE ARTICULADO Y DOCUMENTOS DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00																											
6.1 SOCIALIZAR Y/O PUBLICAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA VIGENCIA 2021, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RIQUEZA GENERADA POR EL POT	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.2 ADELANTAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN QUE INCLUYE LA DEFINICIÓN DE LAS TEMÁTICAS SOBRE LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DOCUMENTOS, Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	3.75
6.3 SOCIALIZAR Y/O PUBLICAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.4 FINALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROGRAMADOS EN LA VIGENCIA 2021, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RIQUEZA GENERADA POR EL POT	5.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
6.5 ELABORAR LOS DOCUMENTOS DEFINIDOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 37.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7634 15 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR EL 100% DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00																											
1.1	CONSTRUIR UN DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES QUE RECOJA EL ALCANCE DE LOS AJUSTES AL SSEP	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	2.10
1.2	ELABORAR UN REPOSITORIO DE HERRAMIENTAS SOBRE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVALUACIONES EN EL DISTRITO	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
1.3	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE USUARIOS, REQUERIMIENTOS E INCIDENCIAS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SSEPP.	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
2.	ELABORAR 9 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00																											
2.1	ASISTIR A REUNIONES Y ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	9.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	3.15
2.2	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ESTRATEGIA DE INTERLOCUCIÓN SECTORIAL PARA LA DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DE EVALUACIÓN EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL DISTRITO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.40
2.3	ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES APROBADAS POR EL CONPES D.C.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		35.00		100.00	15.00	1.65
3.	DESARROLLAR EL 100% DE LAS HERRAMIENTAS, METODOLÓGICAS Y LINEAMIENTOS A ENTIDADES PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA SU TRANSFERENCIA	0.00																											
3.1	ELABORAR FORMATOS TIPO DE DOCUMENTOS DE DISEÑO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA, PARA ADELANTAR LAS EVALUACIONES QUE COMPONGAN LA AGENDA DE EVALUACIONES DEL DISTRITO	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	2.10
3.2	ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE LA ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN, DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS Y CONTENIDOS DE LAS GUÍAS DE POLÍTICAS PUBLICAS DE LA SDP	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
3.3	ELABORAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DE POLÍTICA PÚBLICA REQUERIDOS A SOLICITUD DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONPES D.C	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	2.10
4.	REALIZAR 15 ESTUDIOS EN EL OBSERVATORIO POBLACIONAL-DIFERENCIAL Y DE FAMILIAS	0.00																											
4.1	DEFINIR LA AGENDA DE LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA VIGENCIA	9.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	9.00
4.2	REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL AVANCE DE LOS ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO POBLACIONAL-DIFERENCIAL Y	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7634 15 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
DE FAMILIAS																													
4.3	REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRODUCIDOS EN EL OBSERVATORIO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		35.00		65.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		37.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7635 17 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASISTIR 100 % LAS FASES DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DISTRITALES	0.00																											
1.1	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA A LOS PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.60	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.83
1.2	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.60	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.83
1.3	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS EJECUTORES DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.60	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.83
1.4	APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN EN LOS TEMAS CORRESPONDIENTES CON LAS PLATAFORMAS MGA, SUIFP TERRITORIO Y SPI NACIÓN	1.80	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	70.00	1.26
1.5	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTIVA EN EL PORTAL WEB DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.60	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.83
1.6	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA PLATAFORMA SUIFP	1.60	9.00	9.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	49.00	0.78
1.7	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN LA PLATAFORMA MGA WEB	1.80	9.00	9.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	49.00	0.88
1.8	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA AL SEGUIMIENTO EN LA PLATAFORMA SPI	1.80	9.00	9.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	49.00	0.88
1.9	APOYAR EN LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A FICHAS EBI-D, INFORMES DE LOS COMPONENTES DE GESTIÓN, INVERSIÓN, TERRITORIALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REGISTRADO EN SEGPLÁN	1.80	9.00	9.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	49.00	0.88
1.10	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA A LAS ENTIDADES DISTRITALES EN TEMAS DE APP DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 004 DE 2019 O LAS QUE LA MODIFIQUEN O REEMPLACEN PARA LA VIGENCIA 2022	1.60	3.00	3.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.74
1.11	VALIDAR LA PERTINENCIA E INTEGRALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LOS COMPONENTES TÉCNICO, JURÍDICO, FINANCIERO Y DE RIESGOS PARA EL AÑOS 2022 DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS BAJO EL ESQUEMA DE APP	1.60	3.00	3.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.74
1.12	ELABORAR CONCEPTO VIABILIDAD PASO ETAPA PREFACTIB A FACTIBILIDAD APP; CONCEPTO ADECUACIÓN POLÍTICA RIESGO CONTRACTUAL PROYECTOS APP-ETAPA FACTIBILIDAD; CONCEPTO SOBRE EJECUCIÓN PROYECTOS A TRAVÉS APP	1.60	3.00	3.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.74
2.	REALIZAR 100 % LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN,	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7635 17 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
CAPACITACIÓN, AJUSTE DE PROYECTOS, Y REUNIONES CON LAS ENTIDADES Y LOCALIDADES																												
2.1 ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES DISTRITALES EN LA INCORPORACIÓN DEL EPD Y DE GÉNERO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		0.00		100.00	45.00	4.50
2.2 ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS LOCALIDADES EN LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL - EPD Y DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	7.00
3. PRESTAR 100 % APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN Y SU ARTICULACIÓN CON LOS ODS Y AL PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL POT	0.00																											
3.1 APOYAR ACCIONES QUE ORIENTEN FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO POLÍTICA PÚBLICA PARA IMPLEMENTACIÓN ODS EN BOGOTÁ, QUE ARTICULEN LAS ACCIONES DE LAS ENTIDADES DISTRITALES PARA SU CUMPLIMIENTO	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		40.00		100.00	35.00	2.38
3.2 APOYAR EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL INFORME DE AVANCE DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO VINCULANDO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AL PLAN DE OBRAS DEL POT	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.30
3.3 APOYAR ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO (DNP) PARA PERMITIR SEGUIMIENTO METAS DE PRODUCTO Y RESULTADOS DEL PDD 2020 - 2024: Y SU DEBIDA ARTICULACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	1.98
4. ACTUALIZAR 4 DOCUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUES POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00																											
4.1 REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON ENTIDADES DISTRITALES Y DEPENDENCIAS DE LA SDP PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO	6.80	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	3.40
4.2 DESARROLLAR LA REVISIÓN DOCUMENTAL PARA LA INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS AL DOCUMENTO METODOLÓGICO	6.60	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	3.30
4.3 ELABORAR LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO	6.60	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.97
5. DESARROLLAR 1 HERRAMIENTA DISEÑADA Y EN FUNCIONAMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	0.00																											
5.1 CONSTRUIR PRUEBAS FUNCIONALES Y SU DISPOSICIÓN AMBIENTE PRUEBAS REPORTES MÓDULOS IP-BP Y LOS DE LOS CASOS DE PRUEBA FASES REPROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, CARGUE MASIVO, Y REPORTES DEL MÓDULO PLAN ACCIÓN	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	65.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	5.00	0.13
5.2 REALIZAR PARA EL SISTEMA, EL ASEGURAMIENTO INTEGRAL GENERAL, PRUEBAS NO FUNCIONALES, MIGRACIÓN DE BP Y PA, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, E IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS LDAPS	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	35.00		60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	5.00	0.12
5.3 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		30.00		45.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.4 REALIZAR LAS REUNIONES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y DE SEGUIMIENTO TÉCNICO PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL SISTEMA	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	35.00		35.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	5.00	0.12
5.5 ELABORAR LOS MANUALES DE USUARIO DE LA NUEVA	2.60																									100.00	5.00	0.13

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7635 17 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN (AFS-IP-BP-PA-VC), Y MANUAL TÉCNICO DE INSTALACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00		15.00		15.00		20.00		20.00		10.00				
5.6	DISPONER EN AMBIENTE DE PRUEBAS A LA SDP LAS FUNCIONALIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE USUARIO DE VISOR CIUDADANO	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.7	REALIZAR EL PASO A PRODUCCIÓN DE LOS MÓDULOS IMPLEMENTADOS Y APROBADOS	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00		35.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.8	GESTIONAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00		55.00		30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										39.56

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7636 23 Fortalecimiento Institucional de la SDP

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REPONER 100 % LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROGRAMADO	0.00																											
1.1	REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA RENOVAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SDP	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		5.00		15.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
1.2	CAPACITAR AL PERSONAL RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ADQUIRIDO SOBRE SU OPERACIÓN, MANEJO Y MANTENIMIENTO	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		70.00		30.00		100.00	0.00	0.00
1.3	ADELANTAR EL REGISTRO EN BOGOTÁ D.C. DEL PARQUE AUTOMOTOR ADQUIRIDO Y DE CONFORMIDAD CON LOS PARAMETROS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		5.00		15.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.	ADECUAR 100 % DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SDP PROGRAMADAS	0.00																											
2.1	EFFECTUAR EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DONDE FUNCIONA LA SDP	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		5.00		15.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.2	REALIZAR EL ESTUDIO DE ILUMINACIÓN CON LA UBICACIÓN, CANTIDAD Y TIPO DE LÁMPARAS	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		5.00		15.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.3	REALIZAR LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS PARA EL RECABLEADO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		5.00		15.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3.	PRESERVAR 100 % DE LA MEMORIA DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	0.00																											
3.1	ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN	3.50	0.00	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	48.00	1.68
3.2	ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ARCHIVO DE BOGOTÁ	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
4.	INTERVENIR ARCHIVÍSTICAMENTE 100 % DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y CENTRAL	0.00																											
4.1	DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE CENTRALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.28
4.2	ACTUALIZAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00		15.00		20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4.3	ACTUALIZAR LA GUÍA NÚMERO 5 INSTRUCTIVO PARA CONFORMAR Y TRANSFERIR LOS EXPEDIENTES DE LAS ACTUACIONES Y LICENCIAS URBANISTICAS TRAMITADAS POR LOS CURADORES URBANOS DEL DISTRITO CAPITAL	2.40	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	1.92
4.4	VALORAR LOS FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS- FDA PARA POSTERIOR AJUSTE DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL- TVD	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00		15.00		20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.5	INTERVENIR ARCHIVÍSTICAMENTE DOCUMENTACIÓN SEGÚN INSTRUMENTO PRIORIZADO	2.40	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.10
4.6	DISEÑAR EL PROYECTO DE TRASLADO DE BODEGA	2.40	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		30.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	45.00	1.08
5.	PRESTAR 100 % DE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES DE LA	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7636 23 Fortalecimiento Institucional de la SDP

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
ENTIDAD																												
5.1 MANTENER ACTUALIZADA, ORGANIZADA Y DISPONIBLE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LAS CONSULTAS DOCUMENTALES	2.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.13
5.2 APOYAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN LOS PUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL	2.50	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	1.63
6. GESTIONAR 100 % DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE LA SDP	0.00																											
6.1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - MOREQ EN LA PLATAFORMA SIPA	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		20.00		20.00		20.00		100.00	15.00	0.31
6.2 REALIZAR AJUSTES AL ESQUEMA DE METADATOS SEGÚN PRIORIZACIÓN	1.98	3.00	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.91
6.3 GESTIONAR EXPEDIENTES HÍBRIDOS Y ELECTRÓNICOS	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		100.00	28.00	0.55
7. IMPLEMENTAR 100 % DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE CLIMA LABORAL	0.00																											
7.1 REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CLIMA LABORAL EN LAS ÁREAS DE LA SDP QUE LO REQUIERAN, CON ÉNFASIS EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL 2020	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	30.00	55.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	3.14
7.2 REALIZAR ACTIVIDADES PARA MEJORAMIENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO A LÍDERES Y EL AFIANZAMIENTO DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES EN EQUIPOS DE TRABAJO	2.20	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		13.00		15.00		0.00		100.00	45.00	0.99
7.3 REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LÍDERES AL INTERIOR DE LA SDP	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		12.00		15.00		20.00		16.00		0.00		100.00	28.00	0.92
7.4 ADELANTAR ACTIVIDADES PARA EL AFIANZAMIENTO DE COMPETENCIAS DE EQUIPOS	2.20	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		10.00		12.00		12.00		10.00		9.00		100.00	39.00	0.86
8. REALIZAR 100 % DE SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SDP	0.00																											
8.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	2.70	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		9.00		100.00	45.00	1.22
8.2 DISEÑO, CORRECCIÓN DE ESTILO, ELABORACIÓN O PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA DE LA ENTIDAD	1.80	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		6.00		100.00	49.00	0.88
8.3 DISEÑO, DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS WEB, APLICACIONES MULTIMEDIA O PRODUCCIÓN DE VIDEOS	4.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		7.00		100.00	49.00	2.21
9. IMPLEMENTAR 100 % LAS DIMENSIONES Y POLÍTICAS DEFINIDAS EN EL MIPG	0.00																											
9.1 DESARROLLAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA	1.80	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		11.00		11.00		100.00	42.00	0.76
9.2 REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EJERCER EL LIDERAZGO A NIVEL DISTRITAL DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00		9.00		9.00		10.00		20.00		13.00		100.00	30.00	0.54
9.3 REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO, LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN-MIPG DE LA SDP	10.80	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	2.48

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7636 23 Fortalecimiento Institucional de la SDP

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
9.4 DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS ENCAMINADAS A LA MEJORA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL EN LA SDP	2.34	2.00	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		10.00		10.00		10.00		100.00	43.00	1.01			
9.5 EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ENTIDAD	1.26	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	65.00	0.82			
10. AUMENTAR 3 PUNTOS PORCENTUALES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA	0.00																														
10.1 REALIZAR ESTUDIO CUALITATIVO DE LOS SERVICIOS Y/O TRÁMITES DEFINIDOS POR LA SDP EN EL 2021 E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	1.28			
10.2 REALIZAR LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES CANALES Y OBTENER EL INDICADOR GLOBAL DE SATISFACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2021	4.80	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	3.12			
11. AUMENTAR 50 % LOS NIVELES DE INTERACCIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA SDP	0.00																														
11.1 ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN DE LA ENTIDAD, DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO 2022	6.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		12.00		9.00		9.00		0.00		100.00	52.00	3.12			
11.2 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA ESTRATEGIA DE LENGUAJE CLARO PARA EL AÑO 2022	1.80	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	0.90			
11.3 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE MODELOS DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES CANALES, QUE PERMITAN MEJORAR Y AUMENTAR LAS INTERACCIONES CON LA CIUDADANÍA 2022	1.80	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	55.00	0.99			
11.4 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE SERVICIO DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN CON EL FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA 2022	2.40	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.20			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										39.51	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7665 29 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN TODOS SUS COMPONENTES	0.00																											
1.1	FORTALECER Y RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS EN PUESTOS DE TRABAJO DE LA SDP	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.92
1.2	FORTALECER Y RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SDP	15.40	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	7.39
2.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES	0.00																											
2.1	FORTALECER Y RENOVAR LAS SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DISPONIBLES PARA LA CIUDADANÍA.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	30.00	6.00
3.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE	0.00																											
3.1	FORTALECER Y RENOVAR LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SDP	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	15.00	0.30
3.2	FORTALECER Y RENOVAR LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS EN PUESTOS DE TRABAJO DE LA SDP	18.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	80.00	14.40
4.	REALIZAR 100 % DE LA MIGRACIÓN PLANEADA DE LOS SERVICIOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	0.00																											
4.1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES QUE APOYEN LA MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS TICS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		10.00		10.00		10.00		10.00		11.00		100.00	42.00	3.36
4.2	REALIZAR ESTUDIOS PARA LA MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS TICS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	15.00	1.80
5.	REALIZAR 100 % DE LA IMPLEMENTACIÓN PLANEADA DE GOBIERNO DIGITAL	0.00																											
5.1	IMPLEMENTAR EL HABILITADOR TRANSVERSAL DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL - SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		10.00		100.00	30.00	1.80
5.2	IMPLEMENTAR EL HABILITADOR TRANSVERSAL DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL - SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	5.60

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 41.57

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7759 22 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTANDARIZAR 1 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES REGIONAL - IDER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	0.00																											
1.1	RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE INFORMACIÓN Y LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE LA BASE CARTOGRÁFICA Y DE DATOS DE LA IDER	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		25.00		0.00		100.00	35.00	1.96
1.2	ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA QUE RECIBE LA IDER Y MEJORAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	5.61	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.52
1.3	REALIZAR CUATRO (4) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA A LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN PARA PROMOVER SU VINCULACIÓN	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.89
2.	DIVULGAR 1 OBSERVATORIO DE DINÁMICAS URBANO REGIONALES ODUR, CONSOLIDADO Y ACTUALIZADO	0.00																											
2.1	ACTUALIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA NECESARIA PARA LA PARA LA OPERACIÓN DEL ODUR	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		35.00		0.00		100.00	15.00	0.87
2.2	GENERAR BOLETINES Y PAPELES DE TRABAJO (PREVIAS MESAS TEMÁTICAS DE EXPERTOS) QUE APOYEN LA VISIÓN REGIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA REGIÓN	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		30.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	30.00	1.68
2.3	PUBLICAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA Y LOS DOCUMENTOS DE ANÁLISIS PARA SU DISPONIBILIDAD A LA COMUNIDAD	5.61	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00		5.00		5.00		5.00		10.00		5.00		100.00	40.00	2.24
3.	ELABORAR 8 DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y DE POLÍTICAS URBANO - REGIONALES	0.00																											
3.1	REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE BORRADORES POR PARTE DE LOS INVESTIGADORES	5.61	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	3.93
3.2	REALIZAR DISCUSIÓN INTERNA PARA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS BORRADORES PRESENTADOS	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	55.00	3.09
3.3	PRESENTAR LAS VERSIONES FINALES DE LOS DOCUMENTOS DE ANÁLISIS REGIONAL	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	25.00	1.45
4.	FORTALECER 1 COMITÉ DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL CIT PARA LA ARMONIZACIÓN DE INICIATIVAS REGIONALES Y LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS QUE LO CONFORMAN	0.00																											
4.1	SISTEMATIZAR LOS PRODUCTOS DEL CONVENIO 537 DE 2021 Y ANTERIORES SUSCRITOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CIT	3.75	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	3.19
4.2	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ARMONIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIONAL	3.75	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.69
4.3	APOYAR TÉCNICA Y METODOLÓGICAMENTE EL DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO REGIONAL DEL CIT	3.75	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	3.00
4.4	AVANZAR CON LA CONSOLIDACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL BANCO DE INICIATIVAS REGIONALES Y PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO REGIONAL	3.75	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	1.88

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación


7759 22 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
5. ELABORAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONFORMACIÓN, INSTITUCIONALIZACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA	0.00																											
5.1 GENERAR INSUMOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA REGIÓN METROPOLITANA	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.40
5.2 GENERAR INSUMOS TÉCNICOS QUE PERMITAN PROMOVER LA INCORPORACIÓN A LA REGIÓN METROPOLITANA TANTO DE BOGOTÁ COMO DE LOS MUNICIPIOS QUE SE VINCULEN	8.50	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	60.00	5.10
6. ELABORAR 1 ESTRATEGIA PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA	0.00																											
6.1 DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE PERMITA LA APROPIACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA A NIVEL SOCIAL E INSTITUCIONAL	8.50	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.50
6.2 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.85
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								48.23

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7662 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

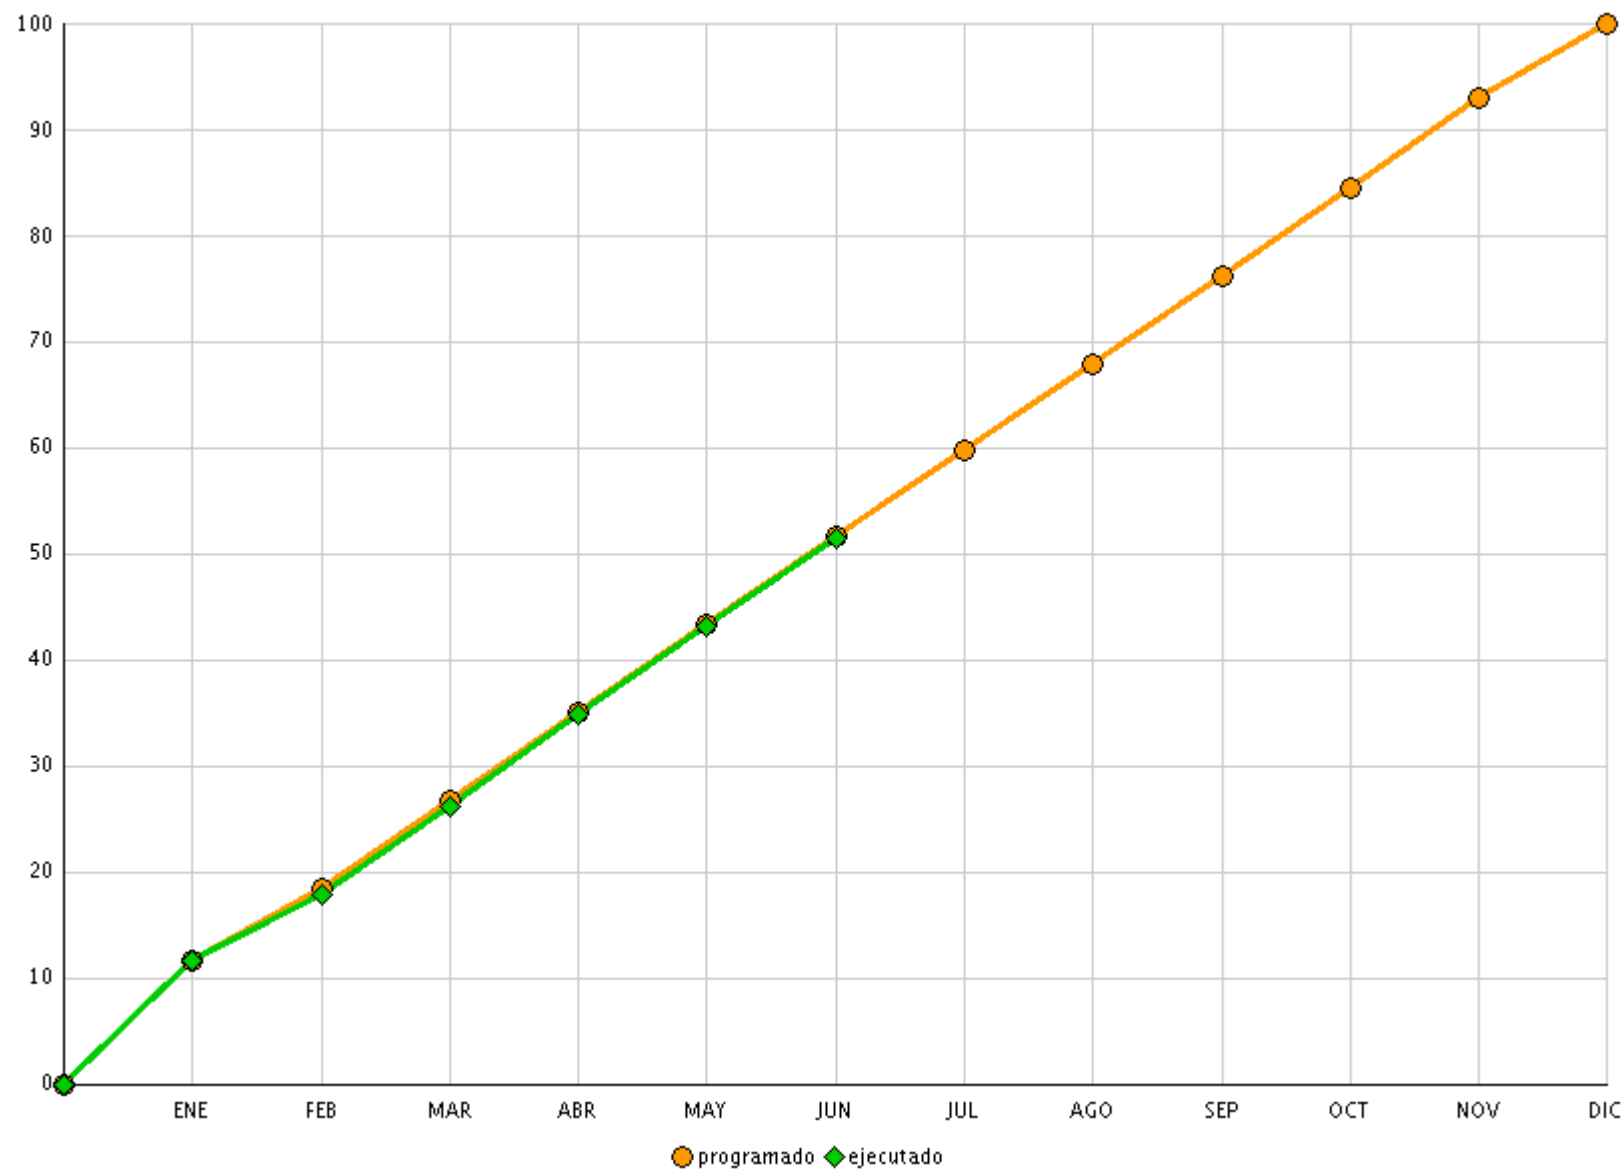


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	11.76	18.45	26.72	35.15	43.41	51.64	59.81	67.98	76.23	84.62	92.94	100.00
Ejecutado	11.64	17.99	26.26	34.86	43.29	51.46						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7668 Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá

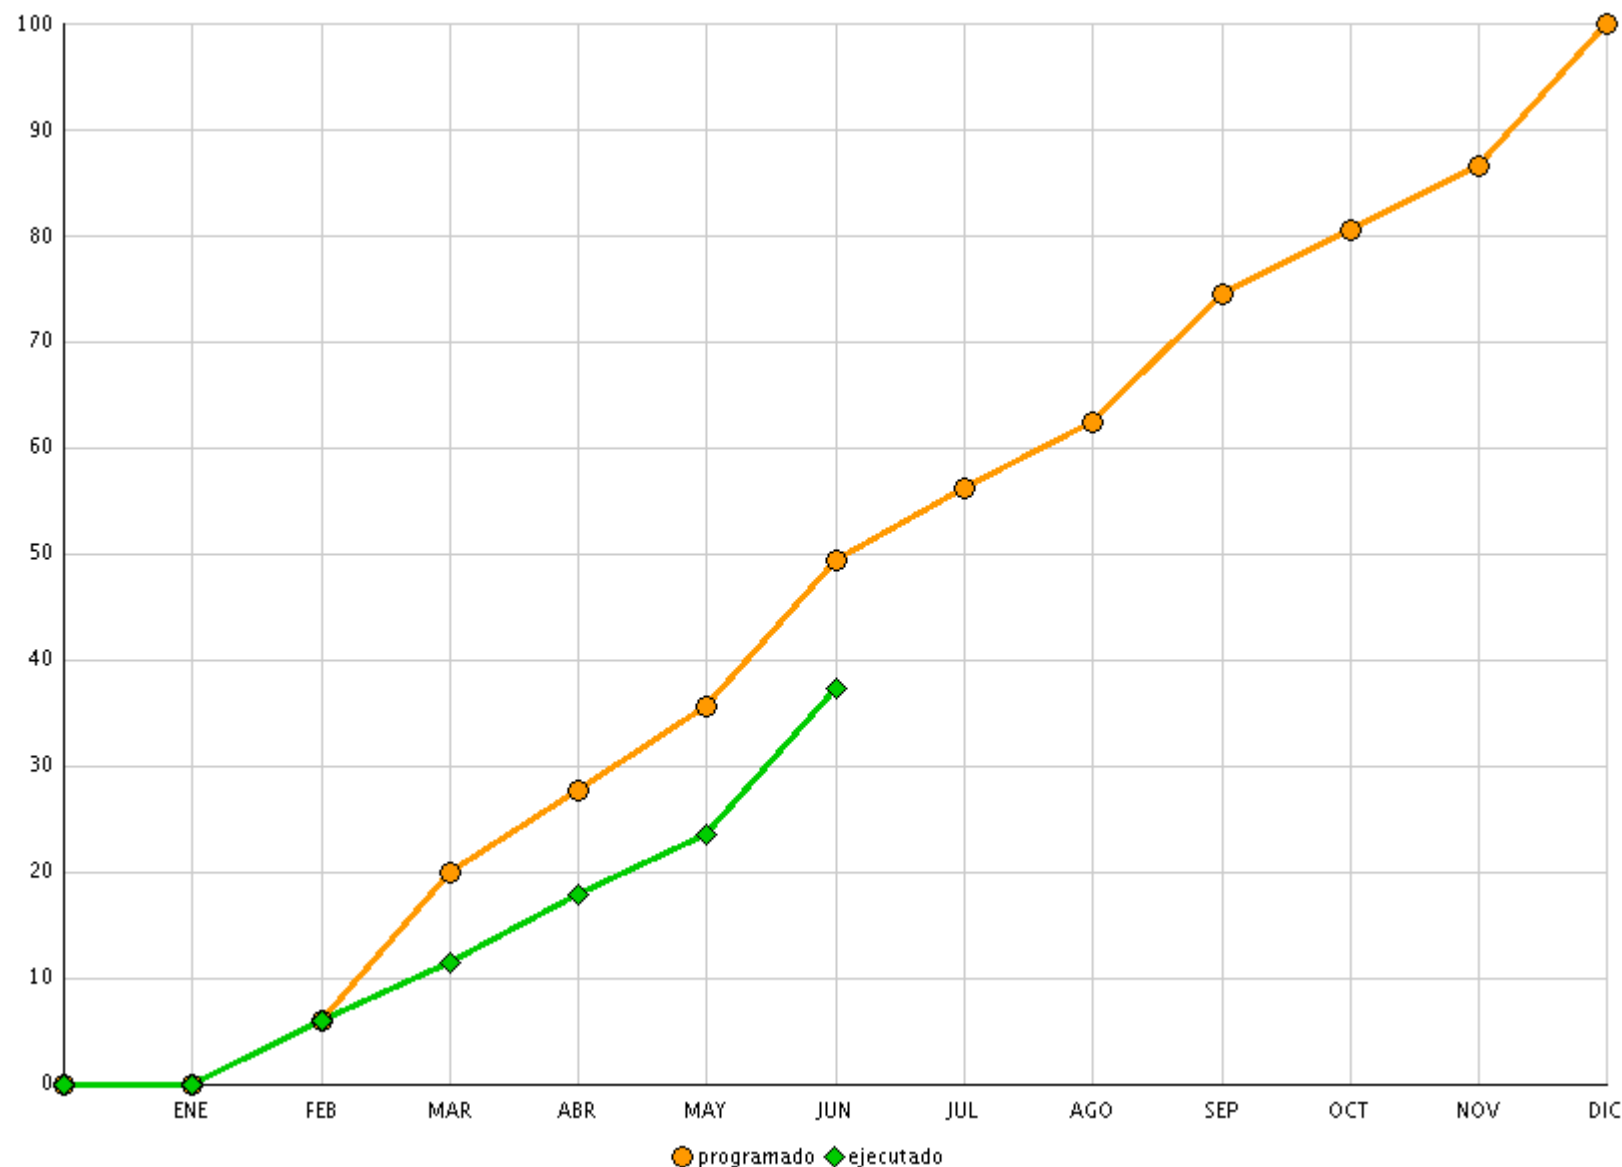


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	6.10	19.92	27.74	35.56	49.38	56.30	62.42	74.54	80.66	86.58	100.00
Ejecutado	0.00	6.02	11.59	17.96	23.53	37.35						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7671 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

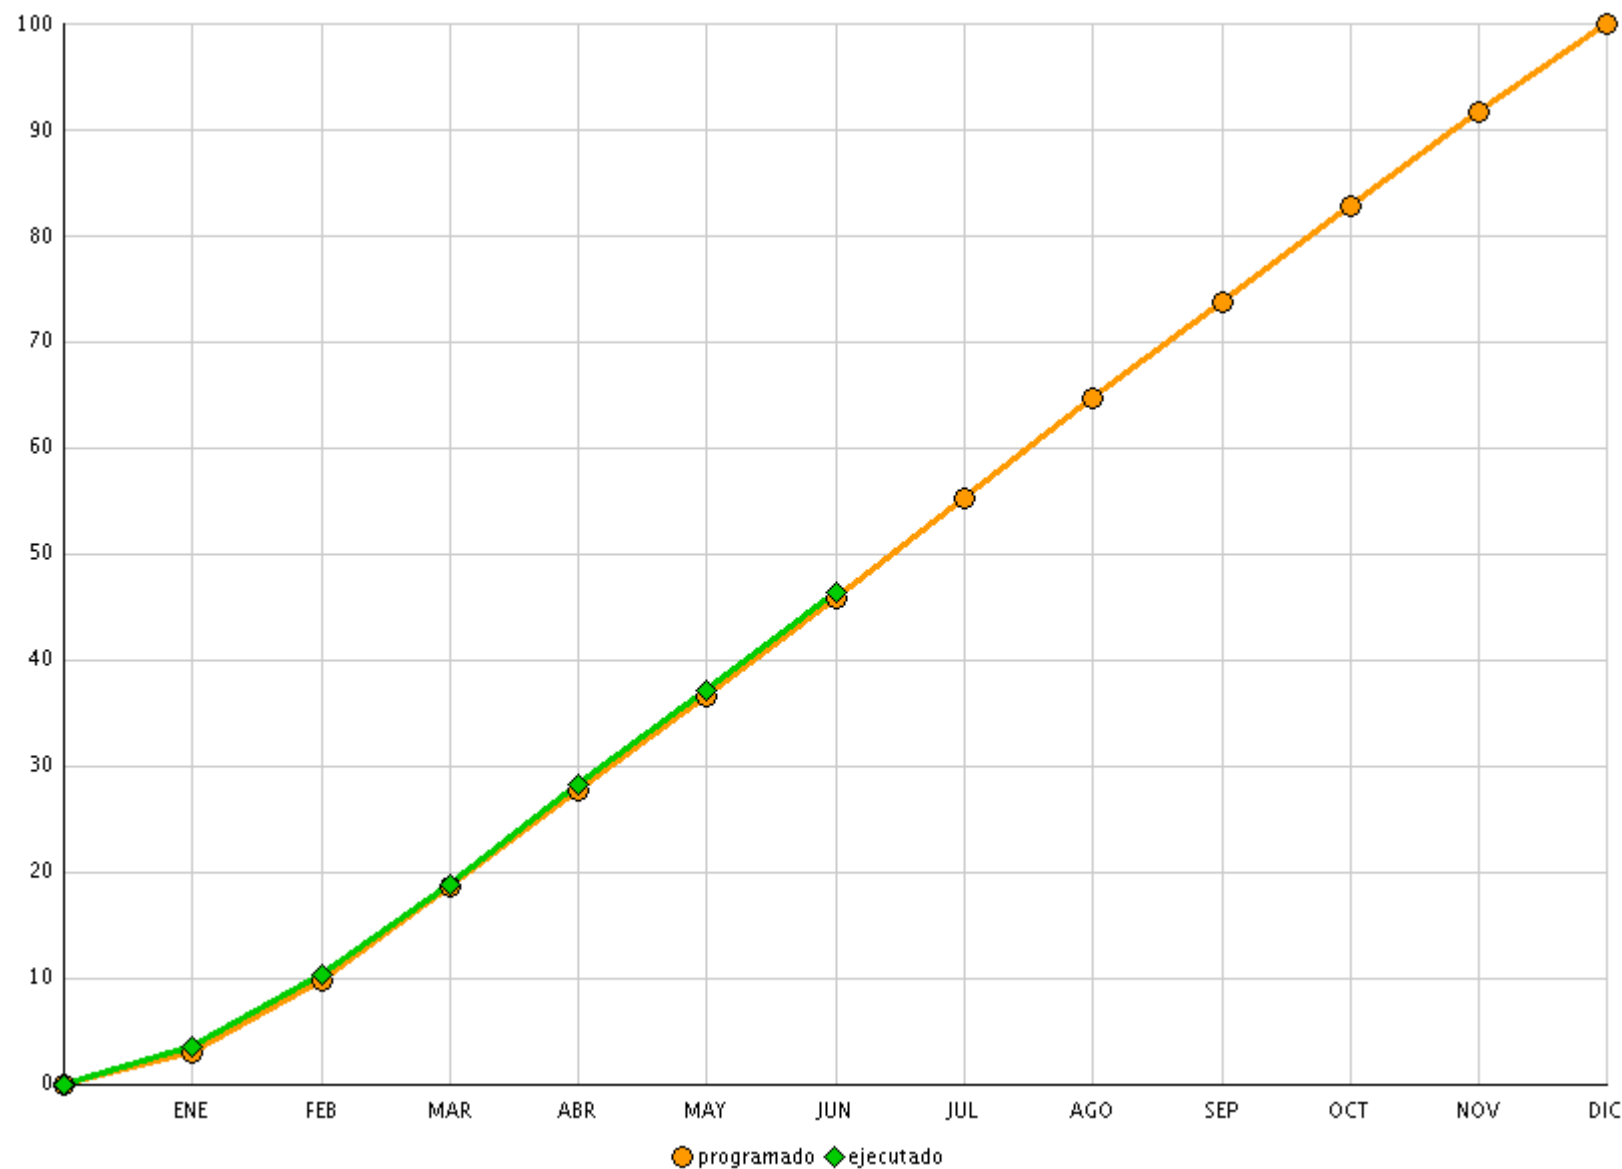


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.02	9.83	18.63	27.76	36.69	45.89	55.34	64.78	73.70	82.92	91.76	100.00
Ejecutado	3.52	10.30	18.94	28.29	37.22	46.38						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7672 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá

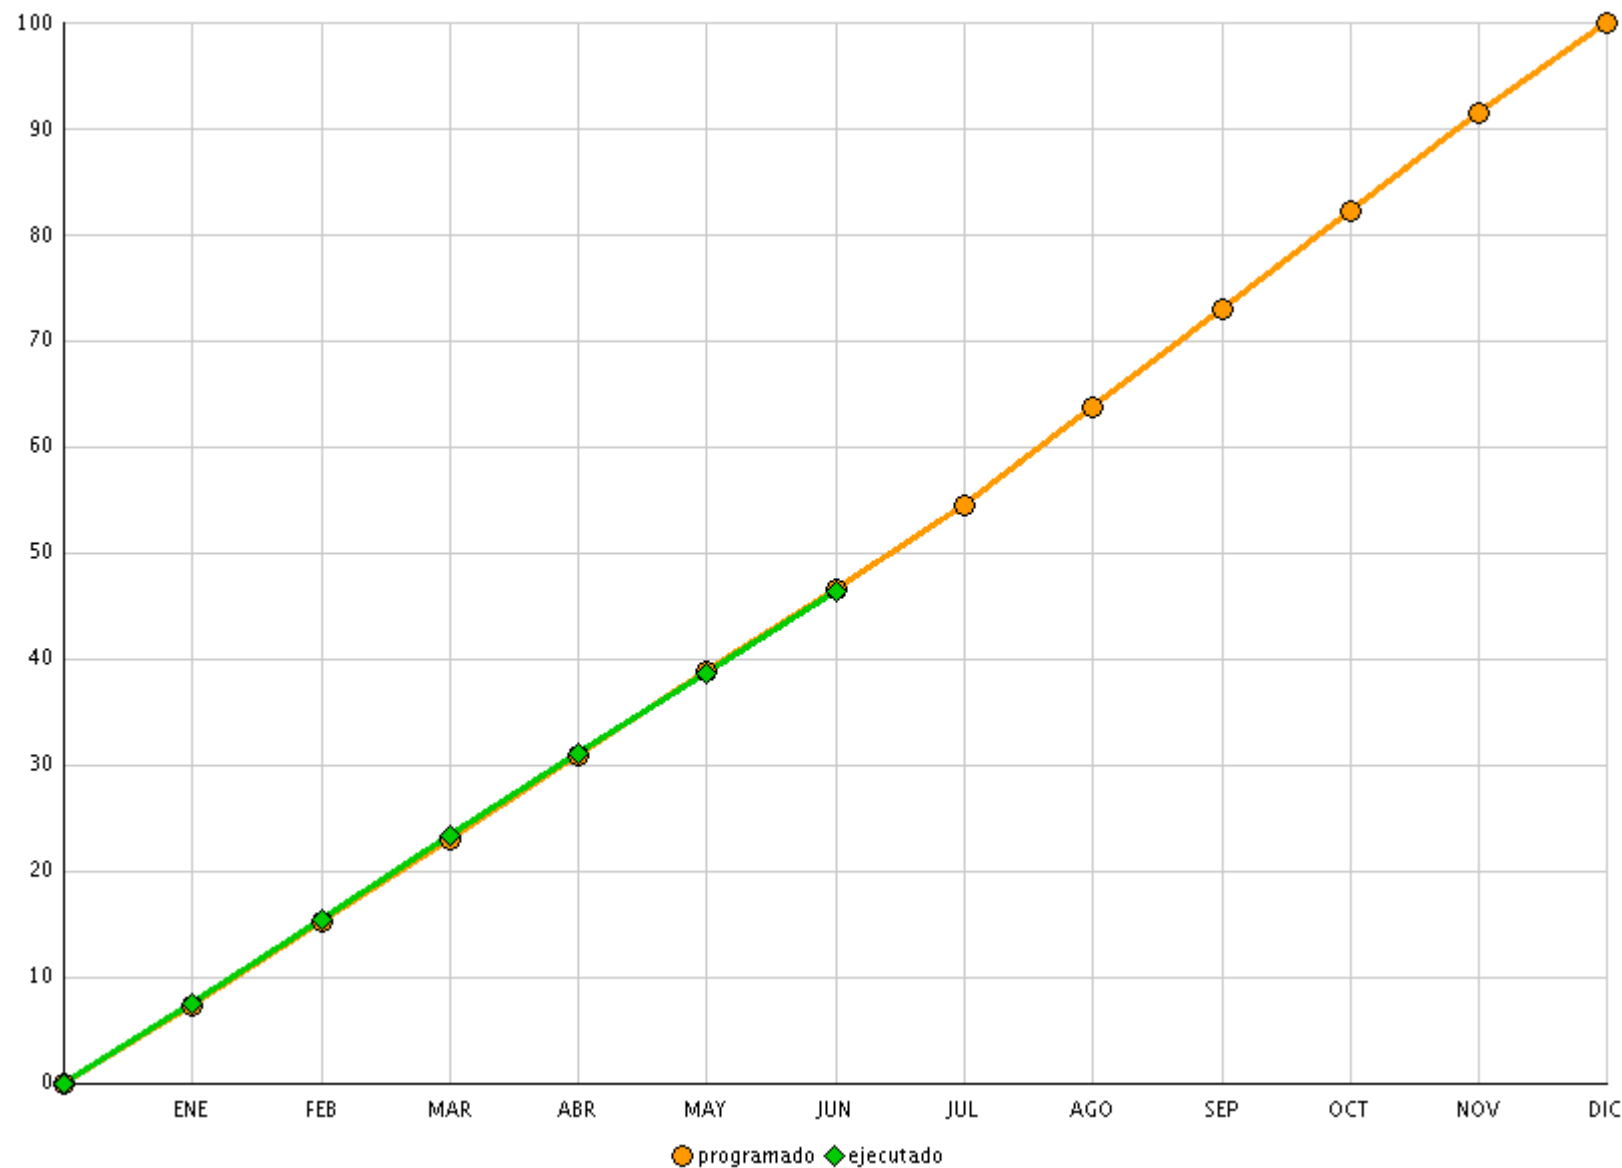


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.40	15.25	23.10	30.95	38.80	46.65	54.50	63.78	73.05	82.33	91.60	100.00
Ejecutado	7.50	15.45	23.40	31.05	38.70	46.35						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7673 Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá

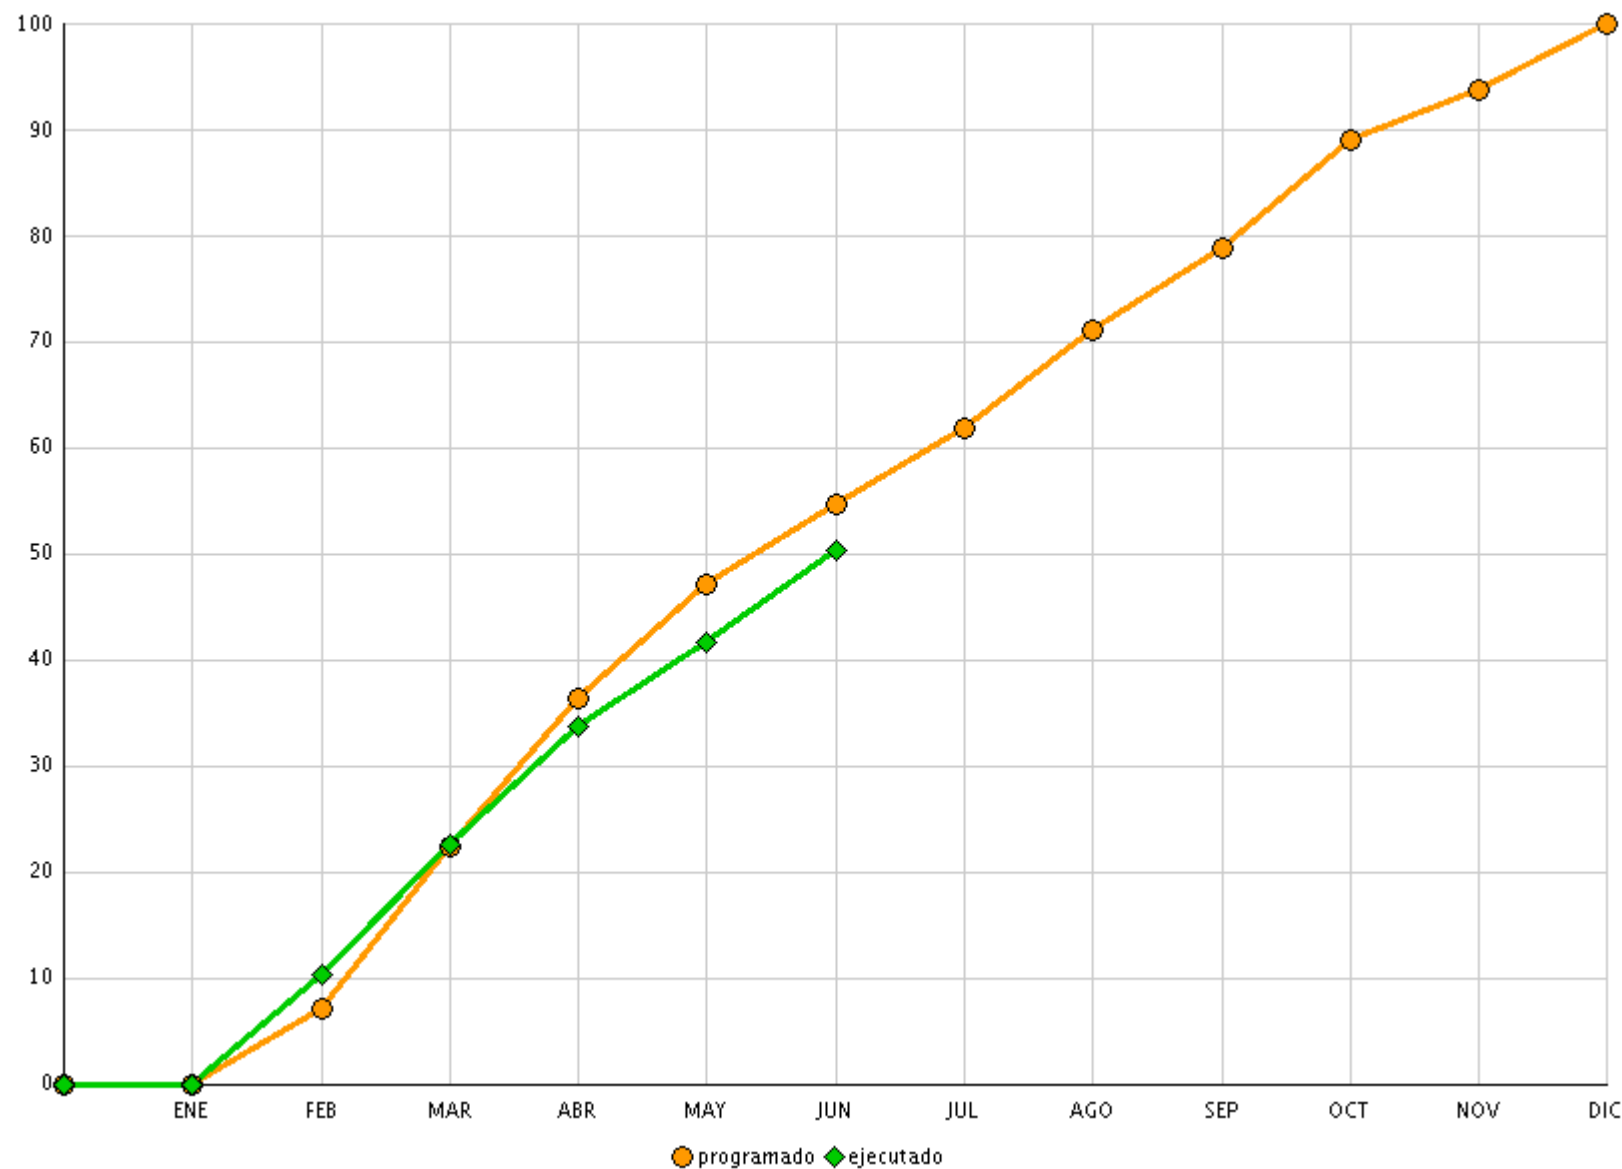


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	7.09	22.39	36.44	47.16	54.79	61.92	71.06	78.94	89.15	93.85	100.00
Ejecutado	0.00	10.36	22.59	33.75	41.60	50.40						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7675 Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá

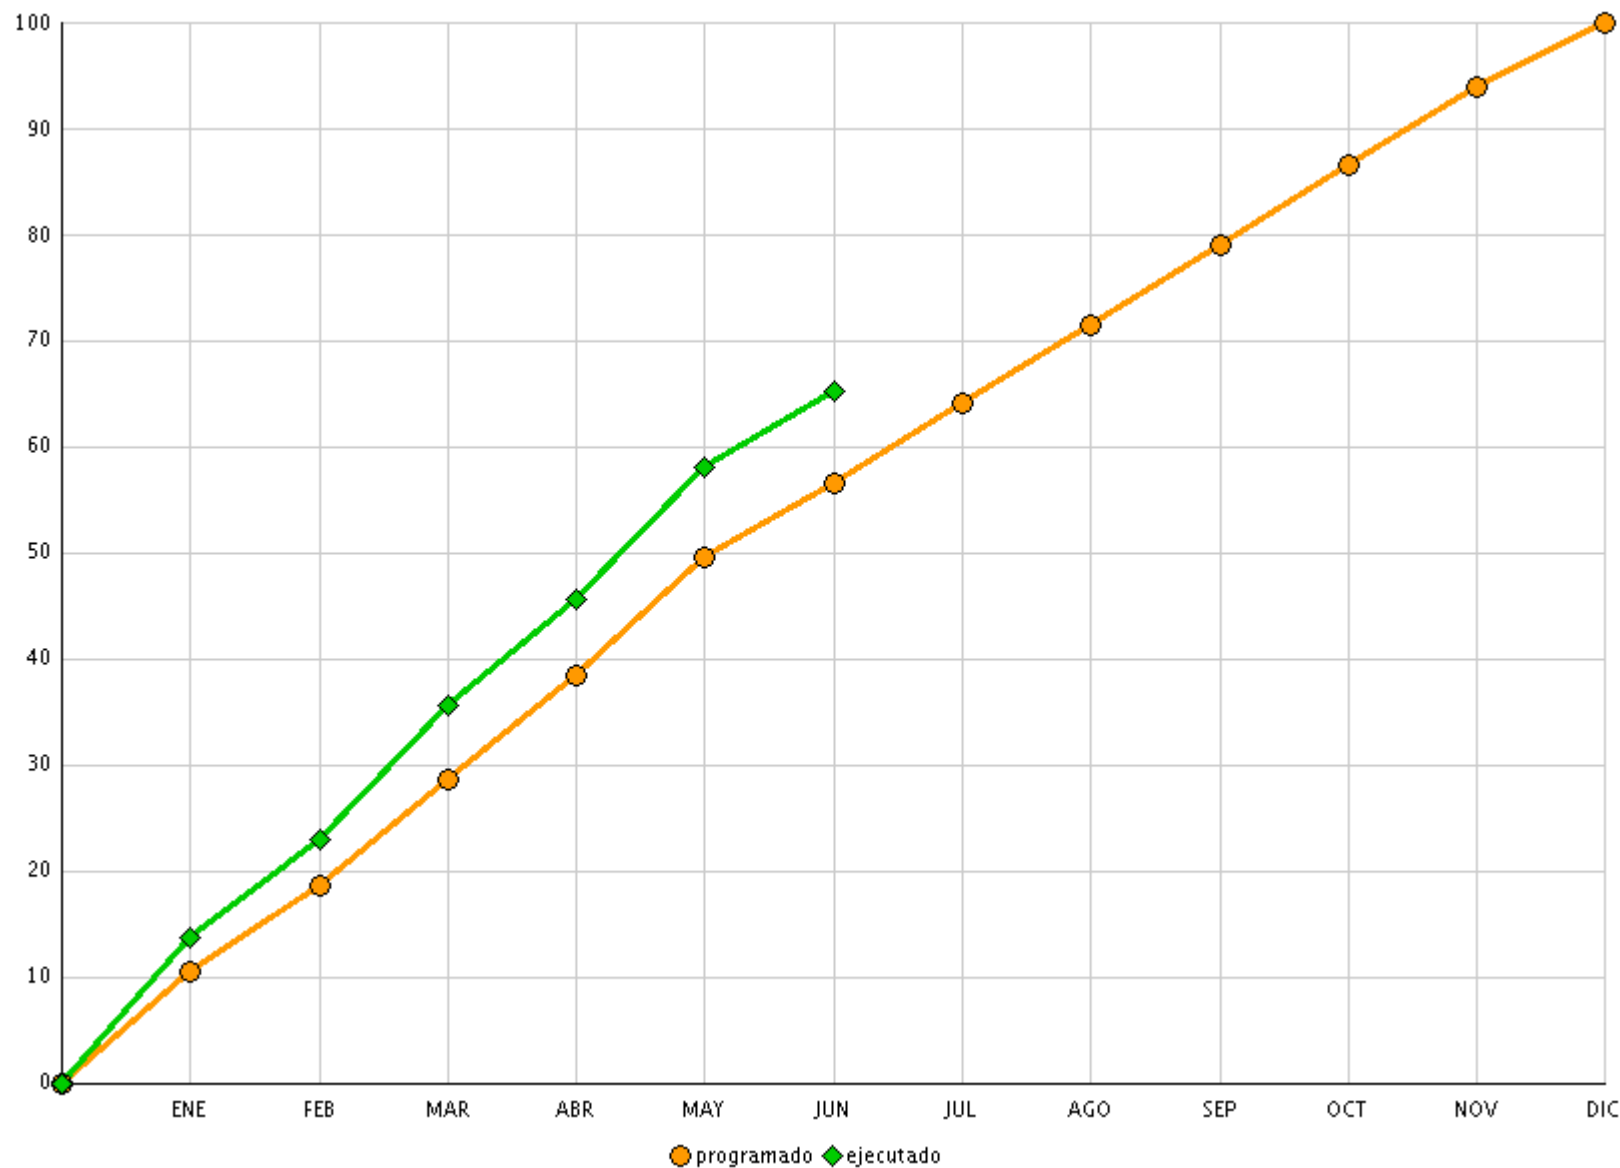


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	10.60	18.71	28.62	38.53	49.64	56.55	64.07	71.48	79.00	86.52	93.93	100.00
Ejecutado	13.70	23.01	35.62	45.68	58.14	65.20						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7676 Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá

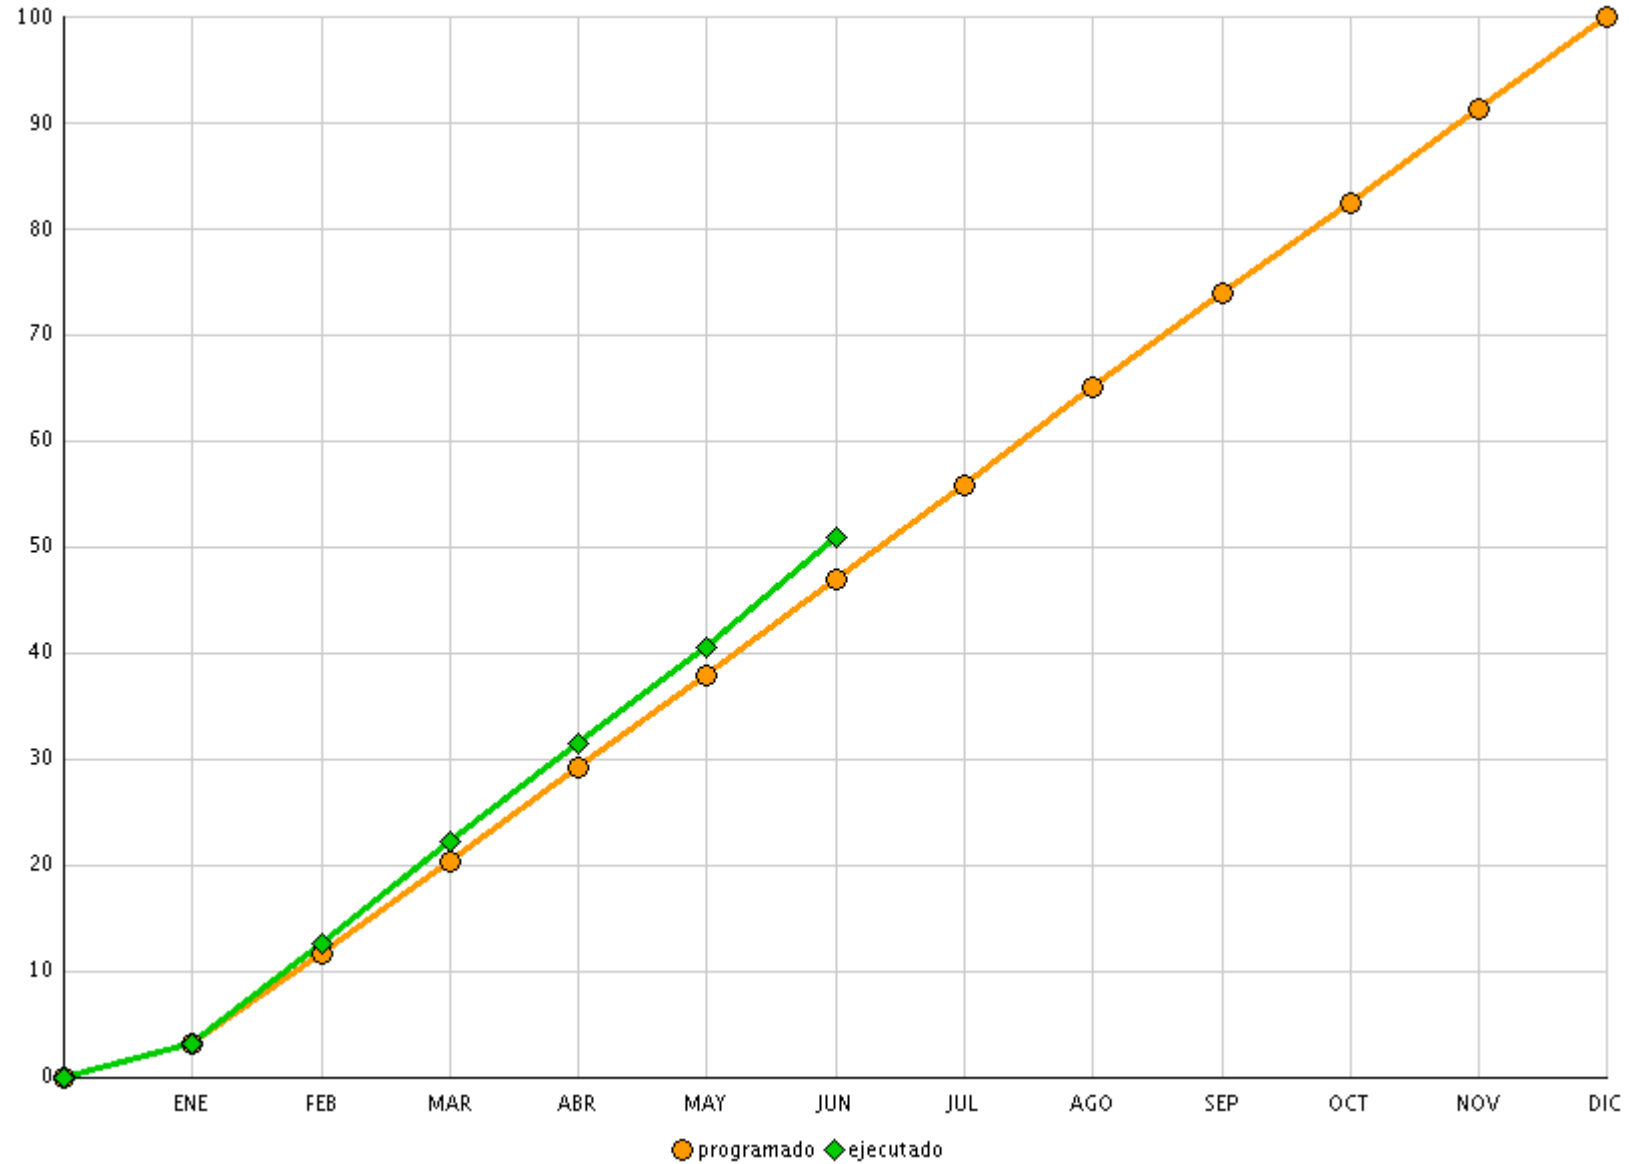


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.20	11.70	20.30	29.30	37.90	47.00	55.90	65.10	73.90	82.50	91.27	100.00
Ejecutado	3.20	12.70	22.20	31.50	40.60	51.03						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7718 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

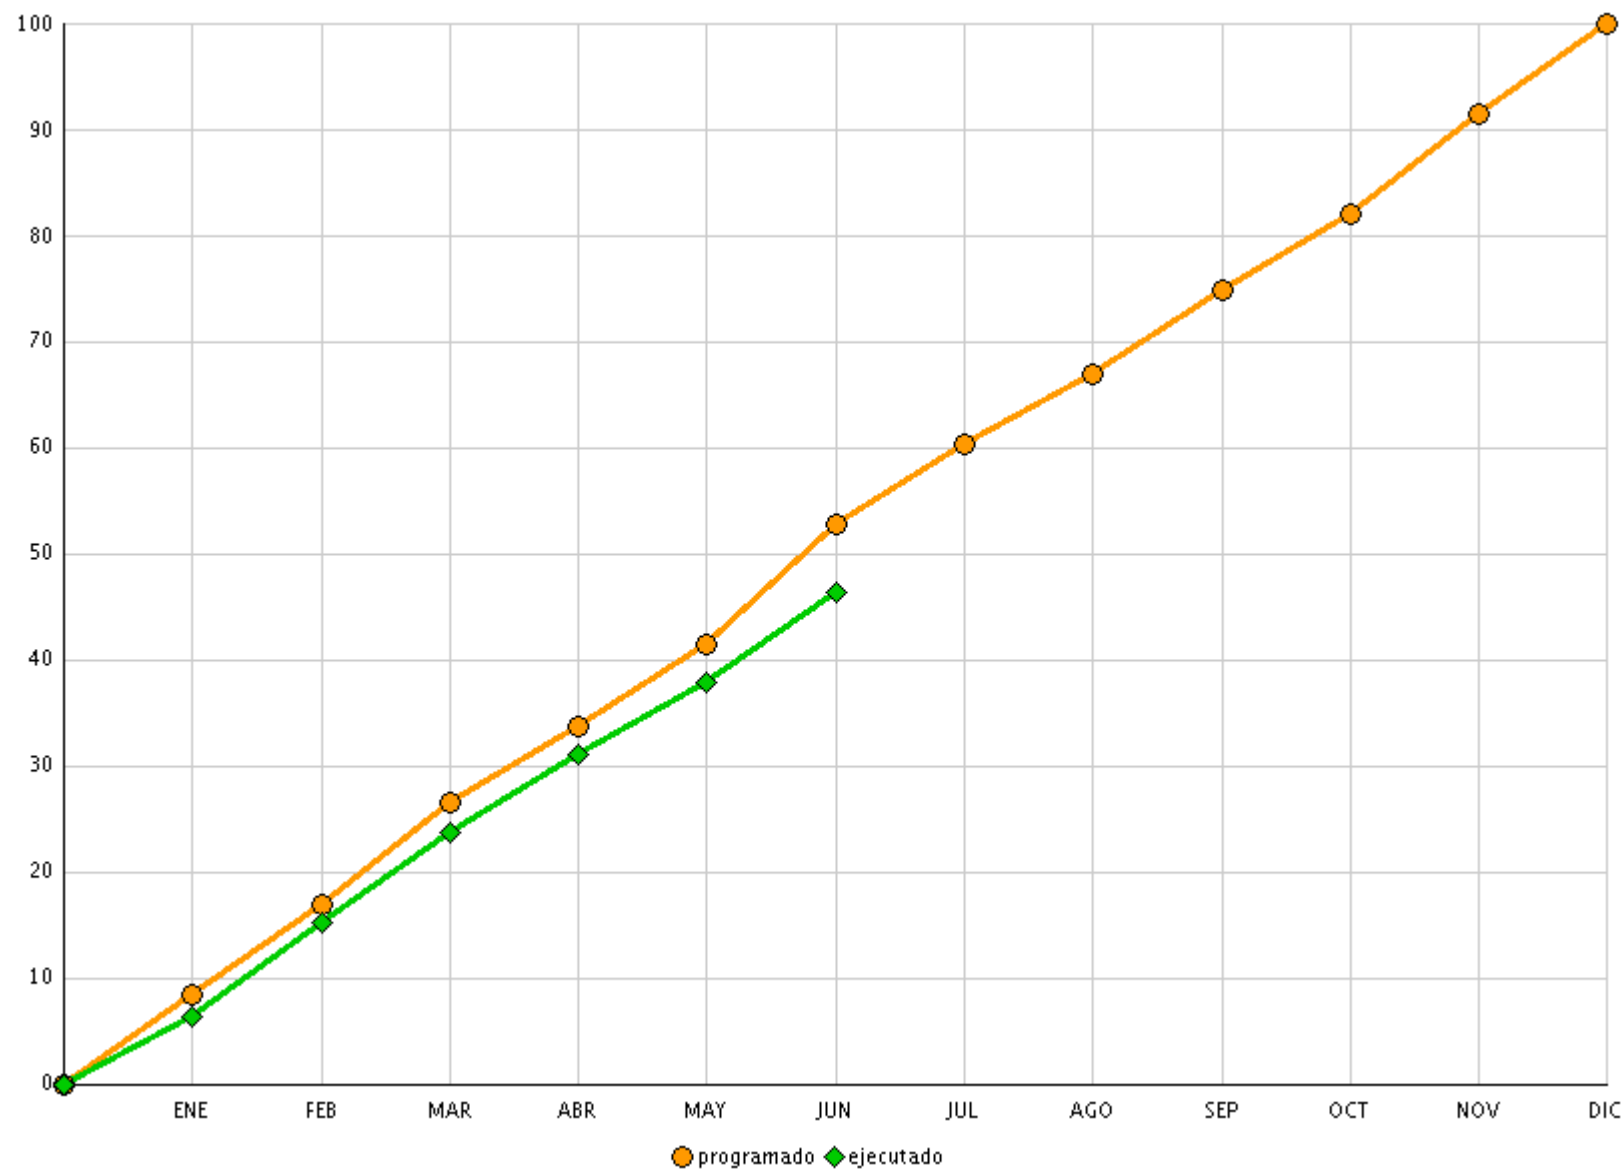


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.47	16.94	26.66	33.82	41.43	52.79	60.39	67.05	74.96	82.03	91.60	100.00
Ejecutado	6.45	15.25	23.80	31.10	38.00	46.40						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7734 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

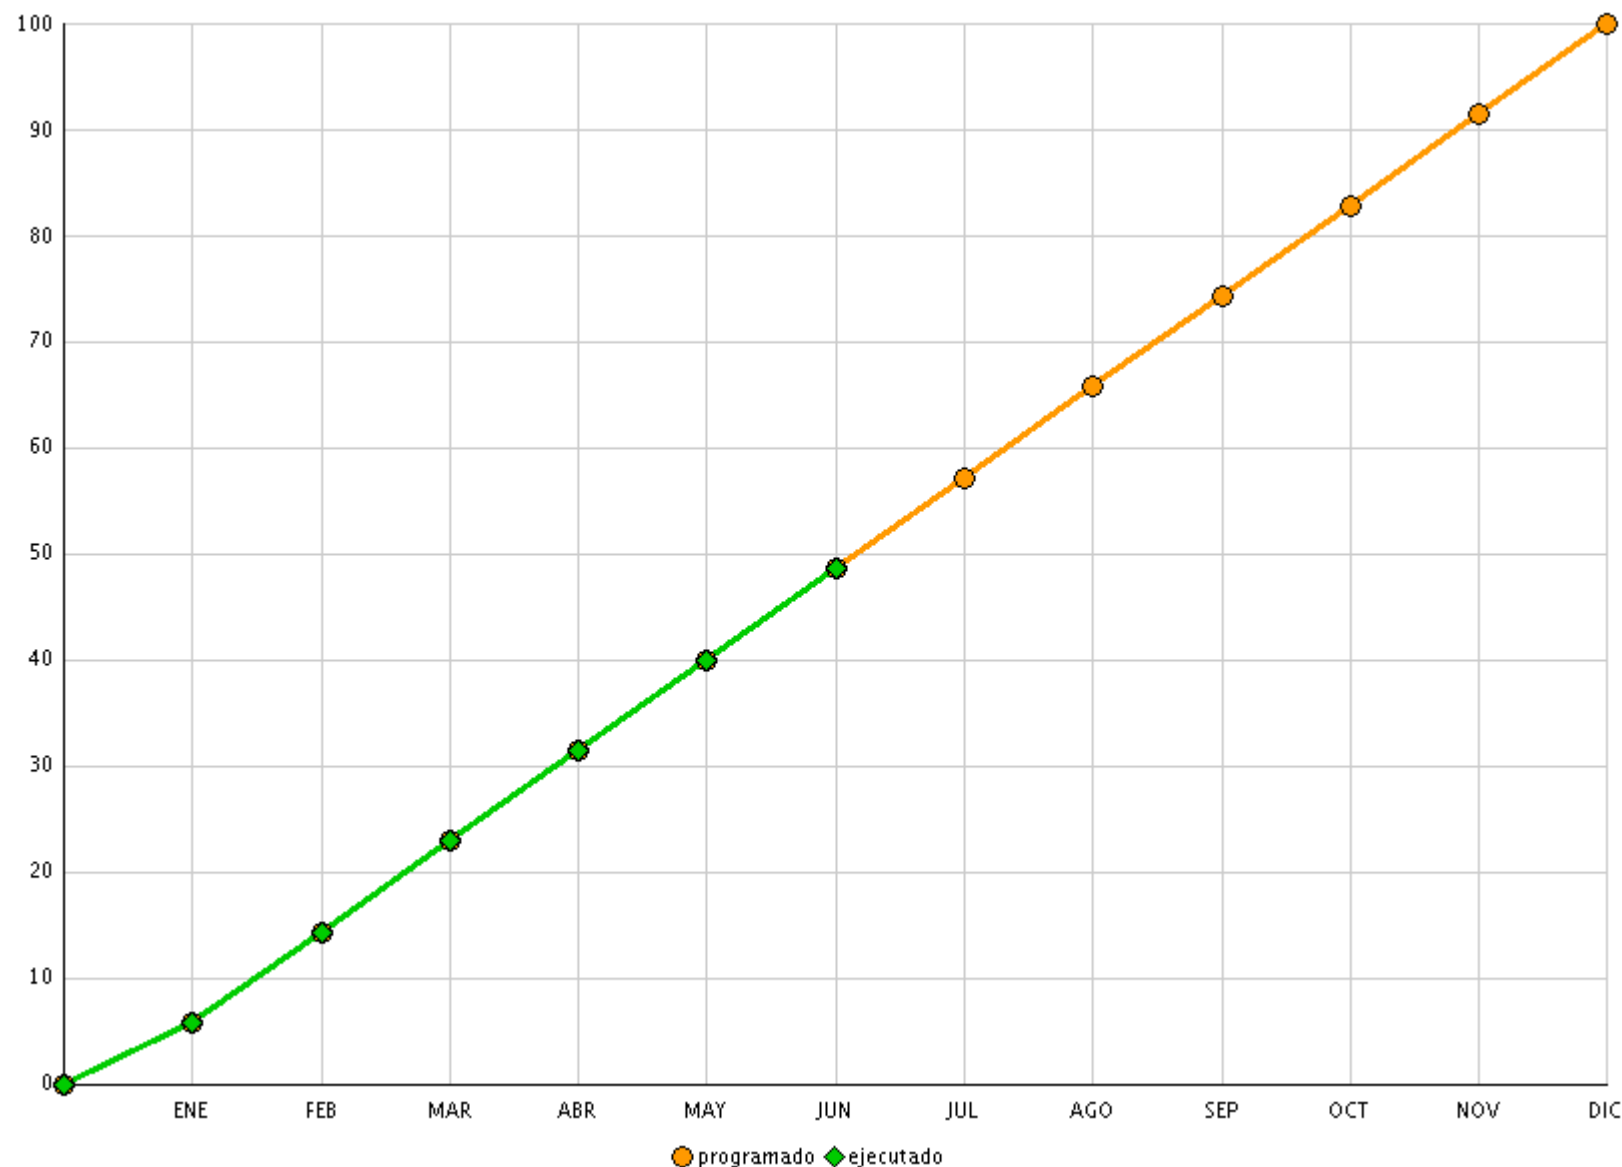


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.83	14.39	22.95	31.51	40.08	48.64	57.20	65.76	74.33	82.89	91.46	100.00
Ejecutado	5.83	14.39	22.95	31.51	40.08	48.64						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7738 Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá

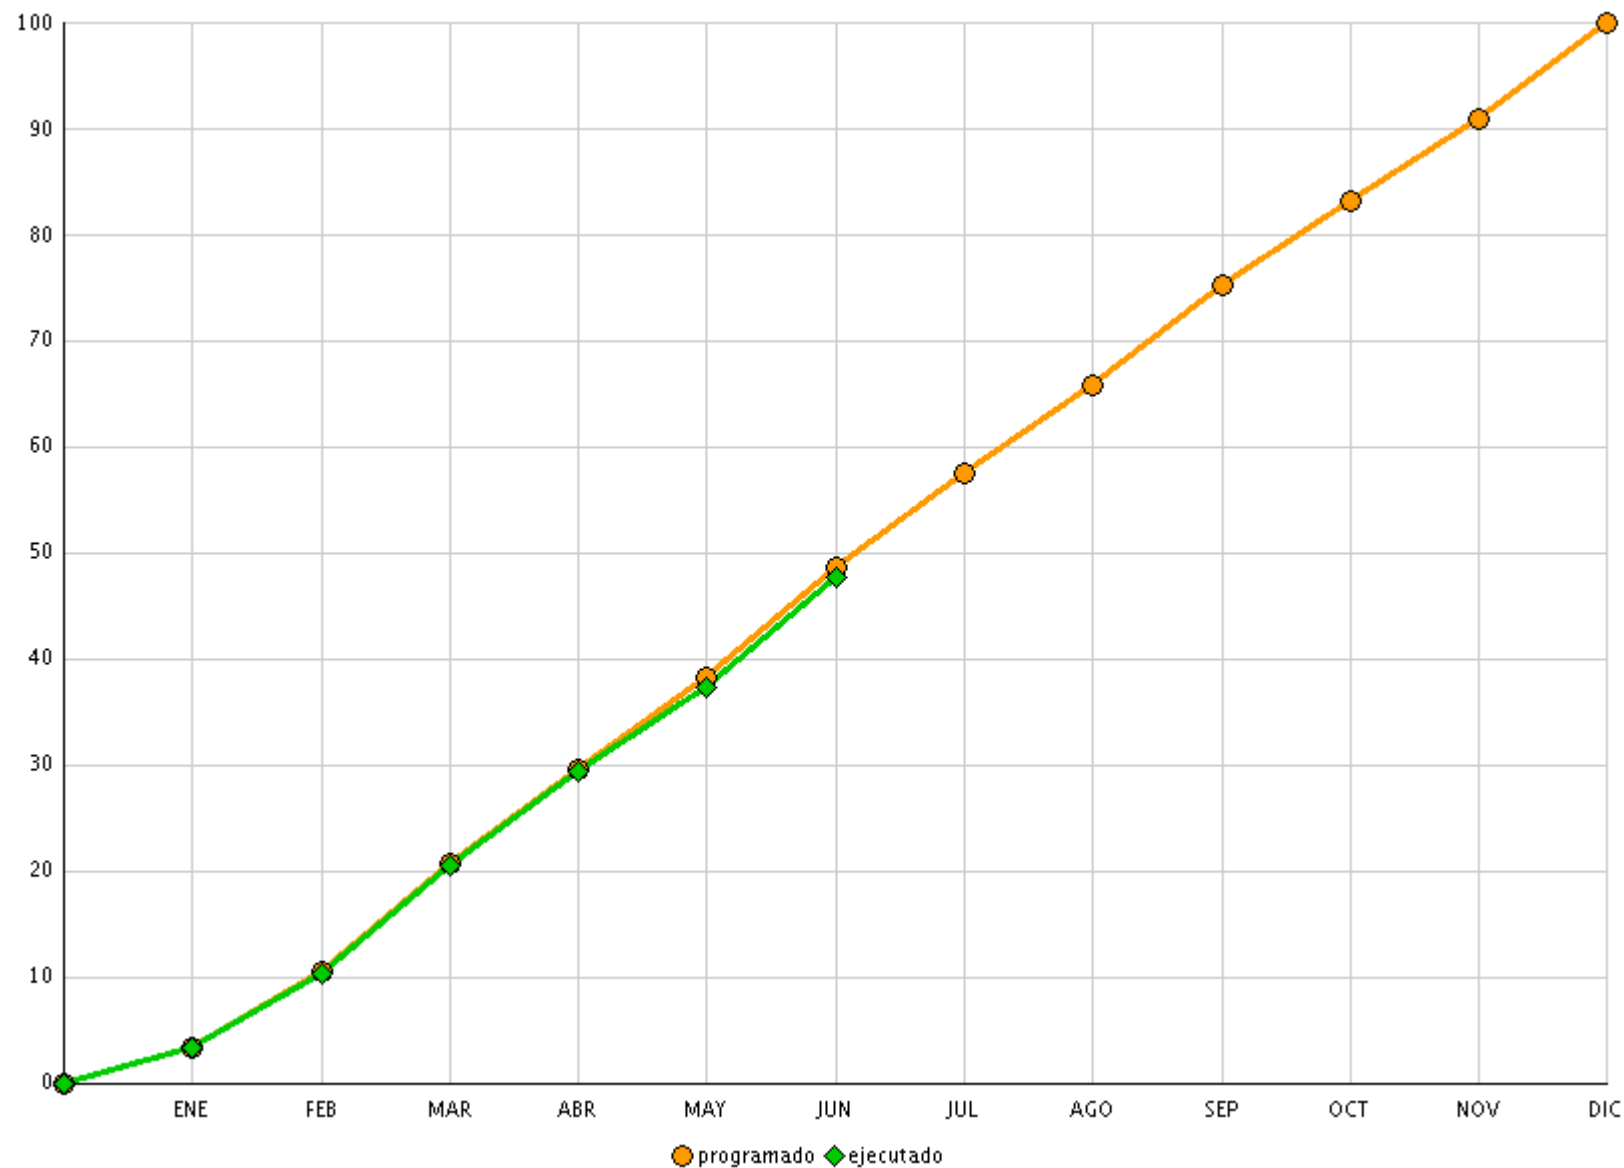


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.34	10.56	20.81	29.56	38.21	48.61	57.60	65.88	75.35	83.15	90.99	100.00
Ejecutado	3.34	10.38	20.63	29.38	37.28	47.73						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7739 Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá

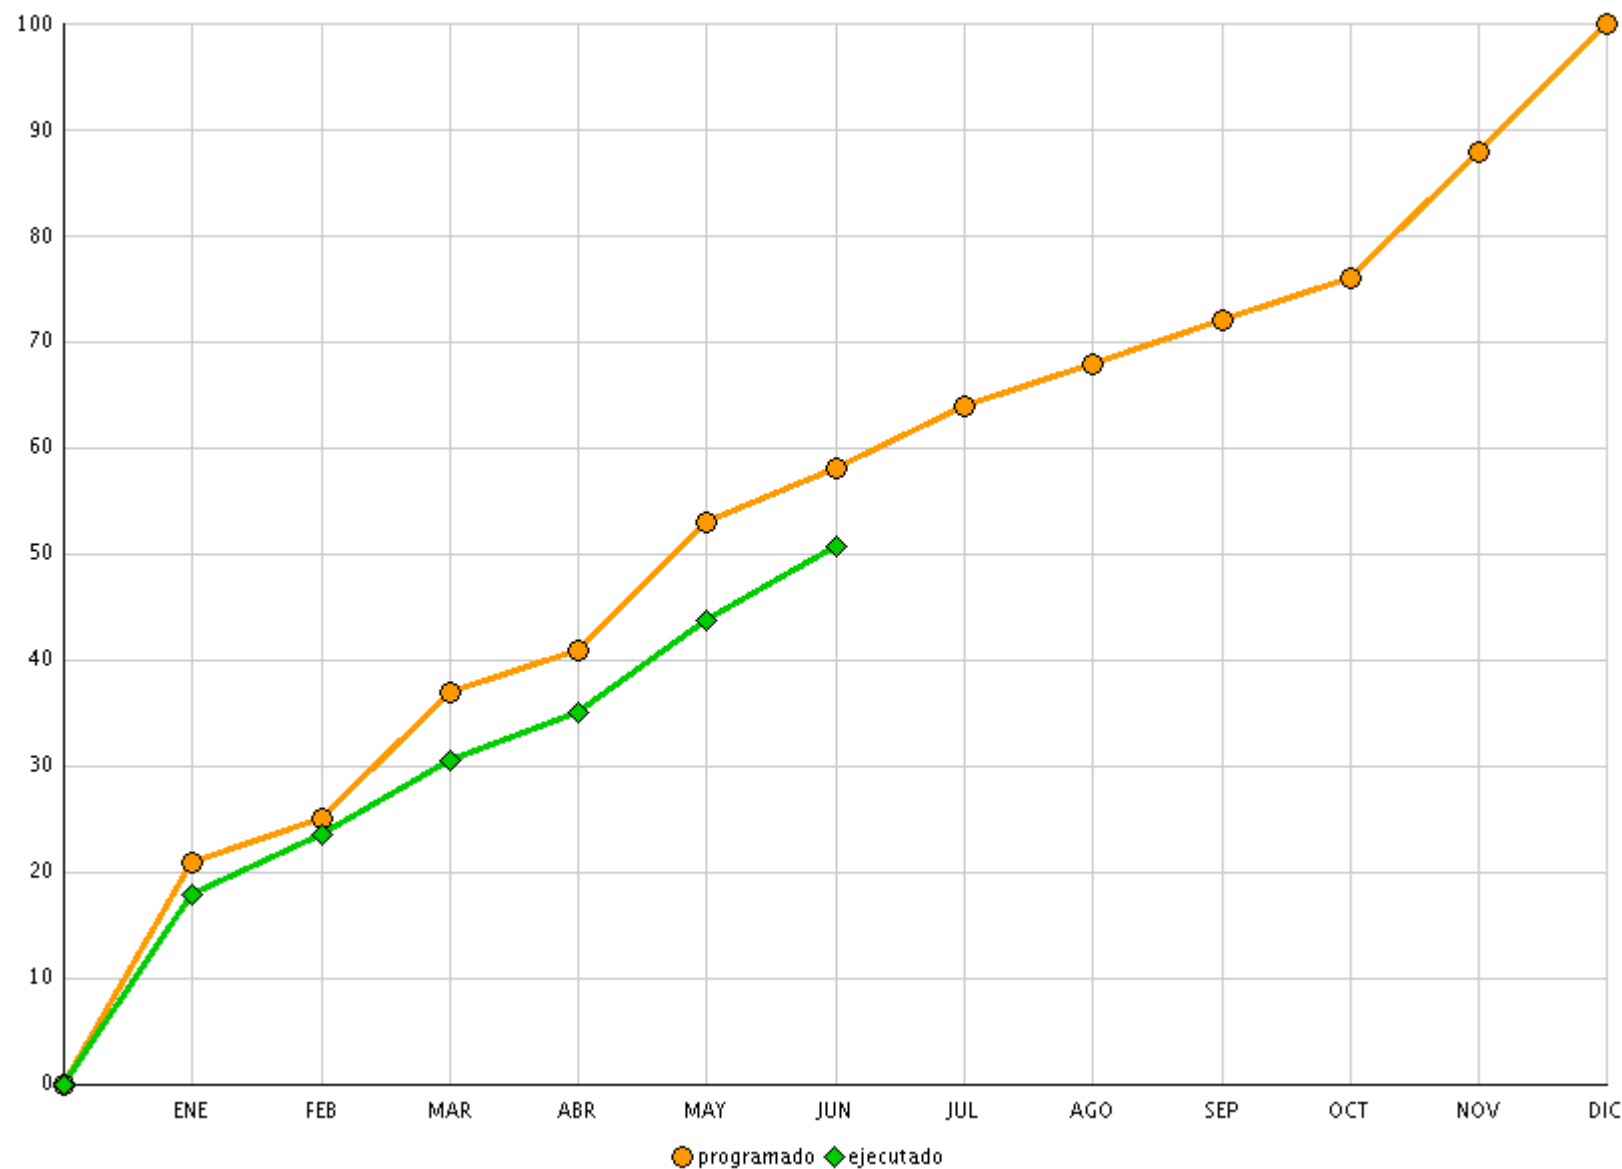

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	21.00	25.00	37.00	41.00	53.00	58.05	64.00	68.00	72.00	76.00	88.00	100.00
Ejecutado	17.92	23.60	30.52	35.00	43.72	50.68						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7662 33 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. AVANZAR EN LA DIMENSIÓN "GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO" EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL - MIPG	4.00	8.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	47.00	1.88
2. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA.	12.00	8.00	8.00	8.00	6.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	6.00
3. GARANTIZAR EL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5.00	8.00	8.00	8.00	6.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.50
4. DESPACHO SUBCOPORATIVA : DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIONAL Y DEL COMPONENTE ESTRATÉGICO COMO EJE TRANSVERSAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	11.60	12.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	6.03
5. CONTRATACIÓN : TRAMITAR LAS DIFERENTES SOLICITUDES RADICADAS EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LAS ETAPAS (PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL).	11.60	60.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00		1.00		1.00		4.00		5.00		5.00		100.00	82.00	9.51
6. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA : ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE IMPACTAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	11.60	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	5.22
7. TALENTO HUMANO : REALIZAR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.	11.60	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	5.22
8. OFICINA ASESORA JURÍDICA: RESPONDER EN LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS Y SEGÚN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE, LOS REQUERIMIENTOS QUE SEAN ASIGNADOS A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA	11.60	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	5.34
9. SOPORTAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MARCO DE MIPG	5.00	3.00	3.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		9.00		100.00	47.00	2.35
10. APOYAR EL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA ENTIDAD, EN EJERCICIO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2.00	4.00	4.00	20.00	20.00	3.00	3.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	3.00	6.00		14.00		8.00		10.00		8.00		8.00		100.00	43.00	0.86
11. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN.	5.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	50.00	2.50
12. TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA DE 80 METROS LINEALES DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD	1.80	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.81
13. INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA DE 150 METROS LINEALES DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	1.80	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		10.00		5.00		5.00		100.00	45.00	0.81
14. ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	1.80	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.81

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7662 33 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
ARCHIVISTICAS Y DEL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO																															
15. IMPLEMENTACIÓN DEL SIC - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL - TERCERA FASE	1.80	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.81			
16. IMPLEMENTACIÓN DEL SIC - PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO TERCERA FASE	1.80	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.81			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										51.46	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7668 21 Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. AUTOMATIZACIÓN DE DATOS DEL OMEG MEDIANTE LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN QUE FAVOREZCA LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y ACTUALIZADA DE TEMAS DE INTERES EN LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO	8.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	4.00			
2. ACTUALIZACIÓN PERMANENTEMENTE LOS INDICADORES DE LA BATERIA DE INFORMACIÓN ASOCIADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OMEG	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.60			
3. OPERACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE USABILIDAD DE LA PÁGINA DEL OMEG Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES PARA USUARIAS Y USUARIOS DEL ESPACIO WEB	8.00	0.00	0.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.00	3.60			
4. ADQUISIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OMEG	8.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	5.60			
5. IMPLEMENTACIÓN DE 8 MESAS MUJER PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA CAJA DEHERRAMIENTASPARALAINTEGRACIÓNDELANÁLISISDEINFORMACIÓNCONEENFOQUEDEGENERODIFERENCIALDENTRODELOSPLANES DETRANSVERSALIZACIÓN DE LA PPMYEG	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.00			
6. IDENTIFICACIÓN DEL NUMERO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN CON ACTORES Y/ O SECTORES QUE FAVOREZCAN EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.20			
7. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA LÍNEA BASE DE LA PPMYEG	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20			
8. ELABORACIÓN DE CINCO (5) ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES QUE DEN CUENTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON FUENTE INFORMACIÓN OMEG	29.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	35.00	10.15			
9. DIAGRAMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE CINCO (5) ESTUDIO Y/O INVESTIGACIONES QUE DEN CUENTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON FUENTE INFORMACIÓN OMEG	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	20.00	6.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										37.35	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7671 32 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDAS A LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	5.00	9.00	13.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	2.30
2.	DISEÑAR, IMPLEMENTAR O DIVULGAR HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYAN A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS Y A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS DIRIGIDAS A MUJERES EN SUS DIFERENCIAS Y	2.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.00
3.	FORMULAR UN PLAN DE FORTALECIMIENTO INTERNO PARA LA INCORPORACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, QUE PERMITAN EL ACCESO DE LAS MUJERES EN TODA SU DIVERSIDAD A LOS SERVICIOS QUE PREST	2.50	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	2.13
4.	SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD Y ELABORAR SU MANUAL OPERATIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS ENFOQUES DE DERECHOS DE LAS MUJERES, DE GENERO Y DIFERENCIAL.	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	1.40
5.	SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA PARA INCORPORAR LOS ENFOQUES DE DERECHOS, DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES, A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LAS CONSEJERAS TERRITORIALES POR	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		100.00	60.00	1.20
6.	SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA PARA INCORPORAR LOS ENFOQUES DE DERECHOS, DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES, A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LA SUBCOMISIÓN DE GENÉRO DEL DEC	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		100.00	60.00	1.20
7.	REALIZAR UN DOCUMENTO QUE DÉ CUENTA DE LA INCORPORACIÓN DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS DE LAS MUJERES, DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES EN LAS INSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑAN DESDE LA SUBSECRETARÍA DEL C	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		70.00		100.00	0.00	0.00
8.	REALIZAR SEMILLEROS DE EMPODERAMIENTO DIRIGIDOS A NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES JÓVENES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		20.00		20.00		20.00		20.00		5.00		100.00	10.00	0.20
9.	DESARROLLAR ACCIONES DE EMPODERAMIENTO DIRIGIDAS A NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES JÓVENES.	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	10.00	10.00	4.00	4.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		2.00		100.00	28.00	0.56
10.	FORTALECER REDES PROTECTORAS CON MADRES, PADRES, CUIDADORAS, CUIDADORES Y PROFESIONALES QUE EN EL MARCO DE SUS ACCIONES TRABAJAN CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA LA IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y A	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
11.	DESARROLLAR ESCUELAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL ENFOCADAS EN FORTALECER CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LA SALUD MENTAL DE LAS MUJERES EN SU DIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		100.00	35.00	0.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7671 32 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
12. DESARROLLAR ESPACIOS DE ENCUENTRO DE MUJERES PARA EL CUIDADO EMOCIONAL DENOMINADOS ESPACIOS RESPIRO.	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	7.00	10.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	39.00	0.78
13. DESARROLLAR UN CURSO VIRTUAL FORTALECIMIENTO DE HÁBITOS DE AUTOCUIDADO Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SENSIBLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA EQUIPOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE LOS	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	5.00	0.00	10.00	8.00	10.00		20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	11.00	0.22
14. IMPLEMENTAR LA FASE I Y II DE LA EDCM . ESPACIOS EMAA MUJERES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD; HOMBRES TRANS Y PERSONAS NO BINARIAS. JORNADAS DE DIGNIDAD MENSTRUAL. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	15.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	65.00	1.30
15. DESARROLLAR LA MESA INTERINSTITUCIONAL E IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.90
16. DEFINIR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE LAS FASES III Y IV DE LA ESTRATEGIA DE CUIDADO MENSTRUAL DIRIGIDAS A MUJERES Y PERSONAS CON EXPERIENCIAS MENSTRUALES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD, SEGÚN PRIORIZAC	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00		10.00		10.00		20.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.80
17. DISEÑAR Y PONER EN ACCIÓN EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA EDCM	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	20.00	20.00	20.00		15.00		20.00		15.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.80
18. REALIZAR ATENCIONES EN INTERVENCIÓN SOCIAL QUE COMPRENDEN PLAN DE INTERVENCIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, ENRUTAMIENTO Y SEGUIMIENTO A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	5.20
19. REALIZAR ATENCIONES PSICOSOCIALES (VALORACIÓN, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO) A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS Y SUS FAMILIAS	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	5.20
20. REALIZAR ATENCIONES JURÍDICAS A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS, QUE CONSISTEN EN ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA ESPECIALIZADA Y LLEVAR CASOS DE INTERVENCIÓN O REPR	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	5.20
21. GENERAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN DE LOS SITIOS, DINÁMICAS Y CONTEXTOS DE LAS ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS EN BOGOTÁ	2.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		4.00		100.00	51.00	1.02
22. GENERAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES, CONVENIOS Y ARTICULACIONES CON ENTIDADES NACIONALES Y DISTRITALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS FLEXIBLES CON ENFOQUE DI	2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	47.00	0.94
23. PROMOVER LOS APOYOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LAS PRUEBAS SABER (ICFES), FERIAS UNIVERSITARIAS Y RUTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
24. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SDMUJER Y PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DE MUJERES EN TODA SU DIVERSIDAD A LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (SENA, GOOGLE Y ESCUELA INDIGENA).	2.00	0.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	52.00	1.04
25. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS MUJERES REGISTRADAS EN LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN FLEXIBLE INSCRITAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL.	2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	47.00	0.94
26. DISEÑAR Y SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO.	2.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	10.00	3.00	3.00	3.00		4.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	78.00	1.56
27. REALIZAR UNA IMPLEMENTACIÓN PILOTO DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00		5.00		25.00		25.00		35.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7671 32 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO.																												
28. IMPLEMENTAR EL PROCESO ELECCIONARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES - ESPACIO AUTÓNOMO Y POSESIONAR LAS CONSEJERAS CONSULTIVAS ELECTAS.	2.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	1.70
29. ACOMPAÑAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE EL DESARROLLO DE LA MESA COORDINADORA Y LA PLENARIA DEL ESPACIO AUTÓNOMO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES	0.50	0.00	0.00	9.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	41.00	0.21
30. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO CON LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y HACERLE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EN EL M	0.50	0.00	0.00	8.00	5.00	14.00	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		14.00		8.00		8.00		100.00	43.00	0.22
31. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE COMISIONES DE TRABAJO DEL ESPACIO AUTÓNOMO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	32.00	0.32
32. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ, CON ENFÁSIS EN LAS BANCADAS DE MUJERES DE ESTE ORGANO	1.00	0.00	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	41.00	0.41
33. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA MESA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL DECRETO 563 DE 2015, GESTIONAR Y COORDINAR LAS REUNIONES CON LA SUBCOMISIÓN DE GENERO.	0.50	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.20
34. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) DURANTE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES QUE SE REALICEN Y A LAS CUALES SE CONVOQUE A LA SDMUJER.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	8.00	8.00	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00		10.00		6.00		10.00		15.00		6.00		100.00	43.00	0.22
35. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DISTRITAL CTPD	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
36. PLANEAR, ARTICULAR Y DESARROLLAR LAS DISTINTAS CONMEMORACIONES DE MUJERES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD, QUE PERMITAN VISIBILIZAR SUS LUCHAS Y BIOGRAFÍAS DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL.	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		100.00	35.00	1.75
37. DISEÑAR, ARTICULAR E IMPLEMENTAR JORNADAS DE INFORMACIÓN CON LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CON EL OBJETIVO DE TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL CON LOS SECTORES DE LA AD	2.50	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	50.00	1.25
38. APOYAR Y ARTICULAR ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL, CON DIFERENTES SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, ORGANIZACIONES SOCIALES Y GRUPOS DE MUJERES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD .	2.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		5.00		5.00		0.00		100.00	45.00	1.13

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 46.38

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7672 17 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	BRINDAR LOS SERVCIOS DE ORIENTACION Y/O ASESORIA JURÍDICA AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN ESCENARIOS DE FISCALIA (CAIVAS, CAPIV)	17.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	48.00	8.40
2.	BRINDAR LOS SERVCIOS DE ORIENTACION Y/O ASESORIA JURÍDICA AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN CASAS DE JUSTICIA QUE NO TIENE IMPLEMENTADA LA RUTA INTEGRAL	17.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	48.00	8.40
3.	INICIAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA DE CASOS NUEVOS	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	48.00	19.20
4.	IMPLEMENTAR EN 2 CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE LA SDMUJER	2.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	24.00	0.60
5.	BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACION Y/O ASESORIA JURÍDICA AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	2.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	48.00	1.20
6.	BRINDAR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	2.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	48.00	1.20
7.	BRINDAR LOS SERVICIOS PSICOJURÍDICOS AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	2.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	48.00	1.20
8.	REALIZAR EL ESCALONAMIENTO A LOS CASOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA SDMUJER Y SON ATENDIDOS POR LAS ABOGADAS EN LAS CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	2.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	48.00	1.20
9.	REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA SDMUJER A LOS CASOS ASIGNADOS A LAS ABOGADAS DEL NIVEL DE REPRESENTACIÓN EN CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	2.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	48.00	1.20
10.	BRINDAR LOS SERVCIOS DE ORIENTACION Y/O ASESORIA JURÍDICA AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN URI PUENTE ARANDA	1.25	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	48.00	0.60
11.	BRINDAR LOS SERVCIOS DE ORIENTACION Y/O ASESORIA JURÍDICA AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN URI BOSA	1.25	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	24.00	0.30
12.	BRINDAR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN URI PUENTE ARANDA	1.25	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	48.00	0.60
13.	BRINDAR LOS SERVCIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN URI BOSA	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14.	PRESENTAR 1 INICIATIVA A FAVOR DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7672 17 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec								
PARA LAS MUJERES ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES																																	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:				46.35	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7673 26 Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑAR Y /O ACTUALIZAR CINCO (5) CONTENIDOS PEDAGÓGICOS DE FORMACIÓN: UNO (1) PARA MODALIDAD PRESENCIAL; UNO (1) PARA MODALIDAD VIRTUAL, Y TRES (3) DE LA PLATAFORMA MOODLE	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
2.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA PARA ASEGURAR LA VINCULACIÓN DE MUJERES A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL Y DE LA PLATAFORMA MOODLE	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		0.00		100.00	75.00	3.75
3.	ELABORAR TRES REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO A LAS MUJERES FORMADAS:	5.00	0.00	0.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	45.00	2.25
4.	REALIZAR CUATRO (4) JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES FORMADAS EN LOS CENTROS DE INCLUSIÓN DIGITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	15.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
5.	ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN DIGITAL, APORTANDO A LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	3.75
6.	ACTUALIZAR UNA (1) MEMORIA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DURANTE LA VIGENCIA QUE RECOJA LOS APRENDIZAJES CUALITATIVOS DE LAS MUJERES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7.	ELABORAR, DESARROLLAR Y VIRTUALIZAR CUATRO (4) CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIOEMOCIONALES, TÉCNICAS Y DIGITALES DE LAS MUJERES, EN TODA SU DIVERSIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		25.00		0.00		50.00		0.00		25.00		100.00	10.00	1.00
8.	IMPLEMENTAR LA RUTA DE DIVULGACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y OFERTA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES DISEÑADA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD.	7.00	0.00	0.00	5.00	4.00	10.00	9.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	41.00	2.87
9.	GESTIONAR Y ARTICULAR CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 332 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS AFIRMATIVAS PA	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
10.	PROMOVER ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO PARA LAS MUJERES, CONFORME A LA OFERTA DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL DISTRITO.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
11.	DISEÑAR DOS (2) PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES, EN ESPECIAL CUIDADORAS.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	1.68
12.	GENERAR Y DESARROLLAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD.	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
13.	ESTRUCTURAR LOS INSUMOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA PARA EL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	10.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.33	33.00	33.33	33.00	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	99.00	9.90
14.	ESTRUCTURAR LOS INSUMOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA PARA EL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	10.00	0.00	0.00	33.33	33.00	33.33	33.00	33.34	15.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7673 26 Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
15. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS DE FORMACIÓN Y MENTORÍA PERSONALIZADA Y LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS DE MUJ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	14.00	14.28		14.28		14.28		0.00		0.00		0.00		100.00	14.00	1.40
16. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PILOTO.	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								50.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7675 21 Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 1.069 ORIENTACIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS PSICOSOCIALES A MUJERES	15.00	3.00	7.00	9.00	11.00	9.00	13.00	9.00	14.00	9.00	15.00	9.00	10.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	70.00	10.50
2.	DESARROLLAR UN PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA A ORGANIZACIONES DE MUJERES Y COLMYG/CLM	8.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	48.00	3.84
3.	ADELANTAR UN PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE GRUPOS, REDES Y ORGANIZACIONES DE MUJERES.	12.00	5.00	5.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	10.00	35.00	10.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	8.40
4.	REALIZAR 776 RIENTACIONES Y ASESORÍAS SOCIO JURÍDICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	15.00	3.00	1.00	9.00	15.00	9.00	23.00	9.00	17.00	9.00	32.00	9.00	1.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	89.00	13.35
5.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TEJIENDO MUNDOS DE IGUALDAD CON NIÑAS Y NIÑOS.	7.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	48.00	3.36
6.	IMPLEMENTAR ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL NIVEL LOCAL	7.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	48.00	3.36
7.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL NIVEL LOCAL	7.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	48.00	3.36
8.	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO FÍSICO DE LAS CIOM	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		9.00		9.00		8.00		8.00		100.00	49.00	5.39
9.	IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS TERRITORIALES EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES.	8.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	48.00	3.84
10.	PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION MISIONALES DE LA ENTIDAD	10.00	70.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	98.00	9.80

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 65.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7676 18 Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	OFRECER ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 20 LOCALIDADES A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y/O DE COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PARITARIA.	20.00	0.00	0.00	8.00	11.00	9.00	11.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	11.00	10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		8.00		100.00	53.00	10.60
2.	VINCULAR 1200 MUJERES A LOS PROCESOS FORMATIVOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INCIDENCIA, LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES	40.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	10.00	8.00		9.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	20.80
3.	OFRECER ASISTENCIA TÉCNICA A 18 BANCADAS DE MUJERES DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES PARA SU CONFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN.	20.00	0.00	0.00	9.00	10.00	9.00	11.00	9.00	9.00	9.00	11.00	9.00	11.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	52.00	10.40
4.	CONVOCAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA MESA MULTIPARTIDARIA DE GÉNERO EN EL DISTRITO CAPITAL	10.00	0.00	0.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	8.00	9.00	10.00	9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		9.00		100.00	48.00	4.80
5.	BRINDAR A 20 FDL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3.30	0.00	0.00	6.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00		9.00		9.00		9.00		10.00		10.00		100.00	44.00	1.45
6.	BRINDAR A 20 CPL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3.40	0.00	0.00	6.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	11.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		11.00		100.00	45.00	1.53
7.	BRINDAR A 20 COLMYG/CLM ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3.30	0.00	0.00	6.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00		9.00		9.00		9.00		10.00		10.00		100.00	44.00	1.45

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 51.03

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7718 23 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR EL MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	5.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	48.00	2.40
2. CONSOLIDAR EL DOCUMENTO DE DESARROLLO TÉCNICO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	5.00	6.66		6.66		6.66		6.66		6.66		6.70		100.00	45.00	2.25
3. CONVOCAR Y GESTIONAR LAS SESIONES DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DE CUIDADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 237 DE 2020	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	35.00	1.75
4. HACER SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DE CUIDADO (UTA)	5.00	8.33	8.00	8.33	7.00	8.33	10.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.00	2.45
5. ADELANTAR DOS SESIONES DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DE CUIDADO (DEC. 237 2020)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	20.00	1.00
6. IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMA DE CUIDADO CON CIUDADANOS Y ACTORES TERRITORIALES	5.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	48.00	2.40
7. ARTICULAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE SIETE (7) MANZANAS DEL CUIDADO	5.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	48.00	2.40
8. MONITOREAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES DE 14 MANZANAS DEL CUIDADO	5.00	8.33	0.00	8.33	8.00	8.33	16.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	48.00	2.40
9. IMPLEMENTAR EL COMPONENTE DE FORMACIÓN PARA CUIDADORAS	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.78	10.00	7.78	8.00	7.78	8.00	7.78		7.78		7.78		7.78		7.78		7.76		100.00	56.00	2.80
10. MONITOREAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE RESPIRO PARA CUIDADORAS	5.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	10.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	50.00	2.50
11. PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE RELEVOS DE CUIDADO	5.00	6.11	6.00	6.11	6.00	6.11	6.00	6.11	6.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		6.11		6.11		6.11		6.11		6.12		100.00	54.00	2.70
12. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA VIRTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA VALORACIÓN, RESIGNIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO QUE REALIZAN LAS MUJERES	5.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	15.00	4.44	9.00	4.44	4.00	4.44	4.00	4.44		4.44		4.44		4.44		4.44		4.48		100.00	67.00	3.35
13. DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA Y DE CAMBIO CULTURAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	4.25
14. IMPLEMENTAR LOS TALLERES DE CAMBIO CULTURAL	5.00	8.33	8.00	8.33	4.00	8.33	12.00	8.33	6.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	46.00	2.30
15. PRODUCIR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	5.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	48.00	2.40
16. IMPLEMENTAR EL COMPONENTE DE AMPLIFICACIÓN [RED DE ALIANZAS DEL CUIDADO]	5.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	48.00	2.40
17. MONITOREAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES INTERSECTORIALES	5.00	8.33	0.00	8.33	17.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.00	2.45
18. DEFINIR Y PONER EN MARCHA DOS UNIDADES MÓVILES DE SERVICIOS DE CUIDADO (URBANA Y RURAL)	5.00	8.33	4.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	44.00	2.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7718 23 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
19. ARTICULAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE DOS (2) UNIDADES MOVILES DE SERVICIOS DE CUIDADO (URBANA Y RURAL)	5.00	8.33	0.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	40.00	2.00		
20. MONITOREAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES INTERSECTORIALES DE LAS DOS (2) UNIDADES MÓVILES DE SERVICIOS DE CUIDADO (URBANA Y RURAL)	5.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17		8.17		8.17		16.50		16.50		17.50		100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7734 26 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. BRINDAR ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL Y CON ELEMENTOS SOCIO JURÍDICOS, ASÍ COMO INFORMACIÓN EN LA RUTA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS A TRAVÉS DE LA LÍNEA PÚRPURA MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00
2. OPERAR LOS CANALES DE CONTACTO Y ATENCIÓN DE LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES".	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00
3. FORTALECER LA RESPUESTA DE ATENCIÓN EN EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA MUJ EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER CON EL NUSE	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.00
4. BRINDAR ATENCIÓN PSICO JURÍDICA EN EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA AGENCIA MUJ EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER CON EL NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS - NUSE.	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00
5. REALIZAR SEGUIMIENTOS EFECTIVOS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS CON POSIBLE RIESGO DE FEMINICIDIO A TRAVÉS DE LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES"	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.50
6. REALIZAR LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS CASAS REFUGIO EN OPERACIÓN.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.50
7. BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS A LOS OPERADORES DE LAS CASAS REFUGIO PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	5.00
8. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE CUPO RECIBIDAS EN EL CORREO INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA DE CASAS REFUGIO.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.50
9. BRINDAR ACOGIDA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS PERSONAS A CARGO EN LAS CASA REFUGIO.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.50
10. REALIZAR PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A SERVIDORAS Y SERVIDORES DE ENTIDADES CON PRESENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	45.50	1.37
11. PARTICIPAR O CONVOCAR ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL DISTRITO CAPITAL	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.50
12. DESARROLLAR ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y VISIBILIZACIÓN ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, ASÍ COMO A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN GENERAL	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	45.50	1.37
13. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SOFIA	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7734 26 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
14. HACER SEGUIMIENTO JURÍDICO Y PSICOSOCIAL PERIÓDICO A MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO EN BOGOTÁ, SEGÚN LOS CASOS REMITIDOS POR ENTIDADES COMPETENTES DEL ORDEN NACIONAL, DISTRITAL O LOCAL	2.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	45.50	0.91
15. RTICULAR ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA APORTAR A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, A TRAVÉS DELSAAT	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	45.50	1.37
16. BRINDAR ATENCIÓN SOCIO-JURÍDICA EN CASOS QUE SEAN REPORTADOS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00
17. ARTICULAR ACCIONES CON EL SECTOR SALUD PARA ELIMINAR BARRERAS DE PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES ¿VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS O EN RIESGO DE FEMINICIDIO.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.50
18. ARTICULAR Y COORDINAR CON LAS ALCALDÍAS LOCALES LA AGENDA, FECHAS Y DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES.	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	45.50	1.37
19. DINAMIZAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES LOCALES DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES.	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	45.50	1.37
20. LIDERAR, ARTICULAR Y DINAMIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO, EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ.	4.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	45.50	1.82
21. BRINDAR ATENCIÓN PSICOJURÍDICA EN DUPLA A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS EN EL ESPACIO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO.	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	3.00
22. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL PARA EL IMPULSO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO PUBLICO	9.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	45.50	4.10
23. REALIZAR EL PRIMER CONTACTO EFECTIVO CON LAS MUJERES NUEVAS REMITIDAS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS PARA ATENCIÓN PSICOSOCIAL.	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.00
24. APORTAR A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS A TRAVÉS DE LAS SESIONES DE SEGUIMIENTO.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.50
25. DINAMIZAR LA ACTIVACIÓN DE RUTAS Y SESIONES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.50

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 48.64

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7738 27 Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA DEFINICIÓN DE ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO, DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD DE GENERO Y LOGROS	2.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
2. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO EN ACCIONES PARA LA ADECUACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA INSTITUCIONAL DE LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	12.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	5.40
3. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES , EN EL MARCO DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO EN LA LABOR MISIONAL DE LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		9.00		9.00		9.00		10.00		10.00		100.00	43.00	5.16
4. ELABORAR DOCUMENTOS, MANUALES, LINEAMIENTOS, INFORMES Y GUIAS PARA LA IJIMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO PARA LA ADECUACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA ORG	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.50
5. APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL TPIEG A TRAVÉS DE LA MESA TRIPARTITA ENTRE SDP, SDH Y SD MUJER	5.00	2.00	2.00	6.00	6.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	2.30
6. LLEVAR A CABO EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL SELLO DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO	7.00	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	3.22
7. REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO, A PARTIR	6.00	5.00	5.00	8.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	43.00	2.58
8. REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE	6.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	2.76
9. ELABORAR DOCUMENTO GUÍA METODOLÓGICA SOBRE EL SEGUIMIENTO CON ENFOQUE DE GÉNERO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00	0.00	25.00	25.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	1.05
10. COORDINAR Y ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE 7 DERECHOS DE LA PPMYEG EN LAS ENTIDADES DE LA DMINISTRACIÓN DISTRITAL, ASÍ COMO CON UNIVERSIDADES,	6.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	3.00
11. ELABORAR MATERIAL PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO PARA LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS 15 SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL E IMPLEMENTARLO, CON EL FIN DE INCORPORAR EL ENFOQUE DE	6.00	5.00	5.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		100.00	60.00	3.60
12. 12. ELABORAR MATERIAL PEDAGÓGICO Y DESARROLLAR	4.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	1.88

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7738 27 Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
PROCESOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES Y OTRAS INSTANCIAS Y ACTORES CLAVE EN LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADOS																													
13. REALIZAR ACCIONES PARA LA CONMEMORACIÓN DE FECHAS EMBLEMÁTICAS EN RELACIÓN CON LA GARANTÍA DE LOS 7 DERECHOS DE LA PPMYEG (8 DE MARZO, 28 DE MAYO, 21 DE JUNIO, 22 DE JULIO, 28 DE SEPTIEMBRE	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	2.00	
14. APOYAR TÉCNICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO - PPMYEG-.	9.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		10.00		8.00		8.00		8.00		11.00		100.00	46.00	4.14	
15. APOYAR TÉCNICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA PÚBLICA DE ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS -PPASP-.	9.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		10.00		8.00		8.00		8.00		11.00		100.00	46.00	4.14	
16. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL CICLO DE POLÍTICA PÚBLICA (DE ACUERDO A LA GUÍA DE LA SDP) A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÉCNICOS DE INCLUSIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO	2.00	11.00	11.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	11.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00		7.00		7.00		11.00		7.00		7.00		100.00	50.00	1.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								47.73	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7739 27 Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONFORMAR EL EQUIPO PROFESIONAL QUE PRODUCIRÁ LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS, PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y EL CAMBIO SOCIAL	15.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
2.	DESARROLLAR CONTENIDOS DE CARÁCTER TEMÁTICO QUE DEN CUENTA DE TEMAS ESTRATÉGICOS O MISIONALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	20.00	5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	10.00	5.00	5.00	15.00	20.00	5.00	10.00	5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		15.00		100.00	55.00	11.00
3.	DISEÑAR INSUMOS GRÁFICOS (PIEZAS Y VIDEOS) QUE VISIBILICEN LA MISIONALIDAD Y OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER.	20.00	5.00	4.00	5.00	9.00	15.00	14.00	5.00	8.00	15.00	13.00	5.00	14.00	5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		15.00		100.00	62.00	12.40
4.	DIFUNDIR MASIVAMENTE, MEDIANTE PUBLICACIONES EN LAS CANALES DIGITALES INSTITUCIONALES, LA MISIONALIDAD Y OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS QUE REQUIEREN SER S	20.00	5.00	0.00	5.00	7.00	15.00	8.00	5.00	6.00	15.00	8.00	5.00	8.00	5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		15.00		100.00	37.00	7.40
5.	CONFORMAR EL EQUIPO PROFESIONAL QUE PRODUCIRÁ LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS, PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y EL CAMBIO SOCIAL	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
6.	SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE FACILITEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y LA CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	ALCANCE DE LOS EVENTOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, LOS CUALES SOCIALIZAN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA OFERTA DE SERVICIOS PARA SU GARANTÍA EN BOGOTÁ.	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.00	1.00	5.00	0.00	15.00	2.00	5.00	1.00	5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		15.00		100.00	4.00	0.16
8.	DIFUNDIR A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y OFERTA DE SERVICIOS PARA SU GARANTÍA EN BOGOTÁ, CON MATERIAL PUBLICADO EN LOS CANALES DE	4.00	5.00	2.00	5.00	4.00	15.00	4.00	5.00	3.00	15.00	4.00	5.00	3.00	5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		15.00		100.00	20.00	0.80
9.	DIFUNDIR A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y OFERTA DE SERVICIOS PARA SU GARANTÍA EN BOGOTÁ, CON PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS O ALTERNATIVOS.	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
10.	VISITAS AL SITIO WEB INSTITUCIONAL, EN SECCIONES ESPECIALES O GENERALES CON TEMÁTICAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y OFERTA DE SERVICIOS PARA SU GARANTÍA EN BOGOTÁ.	4.00	5.00	1.00	5.00	3.00	15.00	3.00	5.00	4.00	15.00	2.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		15.00		100.00	18.00	0.72
11.	ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIAL GRÁFICO Y CONTENIDOS EDU PEDAGOGICO QUE MINIMICEN LA ACEPTACIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES	4.00	5.00	0.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	10.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		15.00		100.00	30.00	1.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								50.68		

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7564 Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá

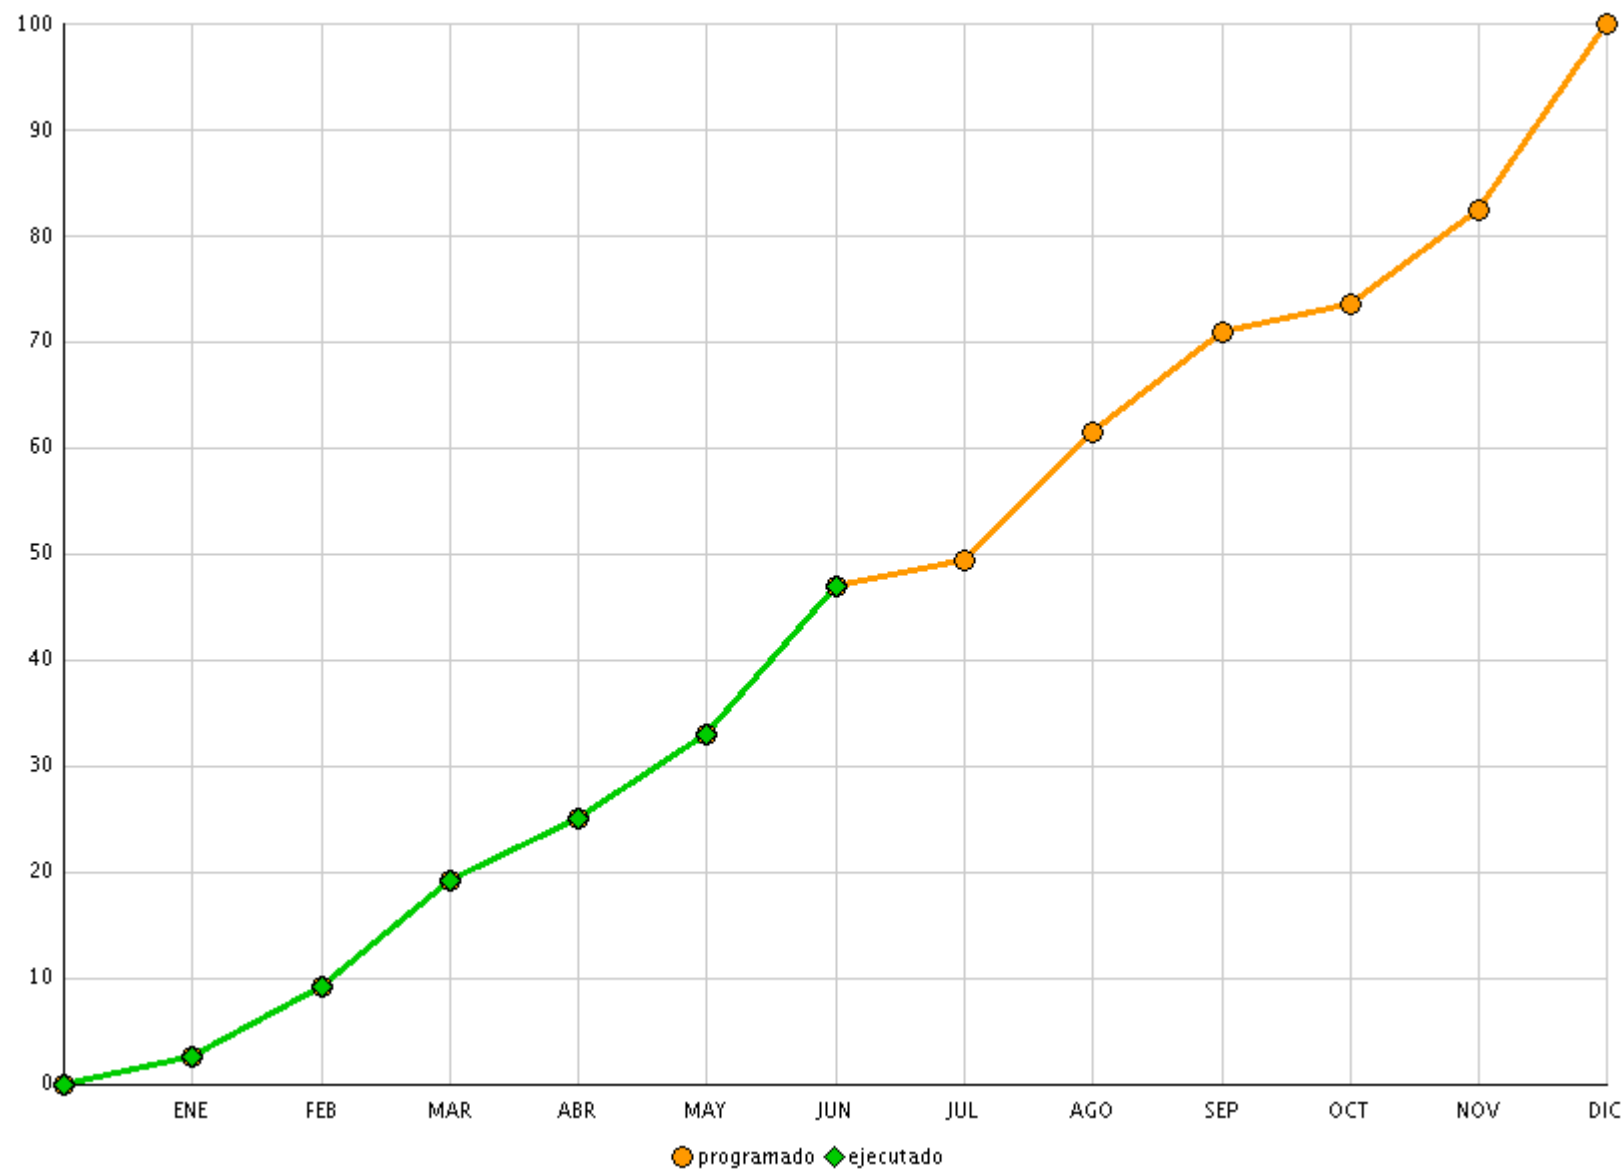


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.60	9.20	19.30	25.10	33.10	46.90	49.50	61.60	70.90	73.50	82.40	100.00
Ejecutado	2.60	9.20	19.30	25.10	33.10	46.90						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7565 Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá

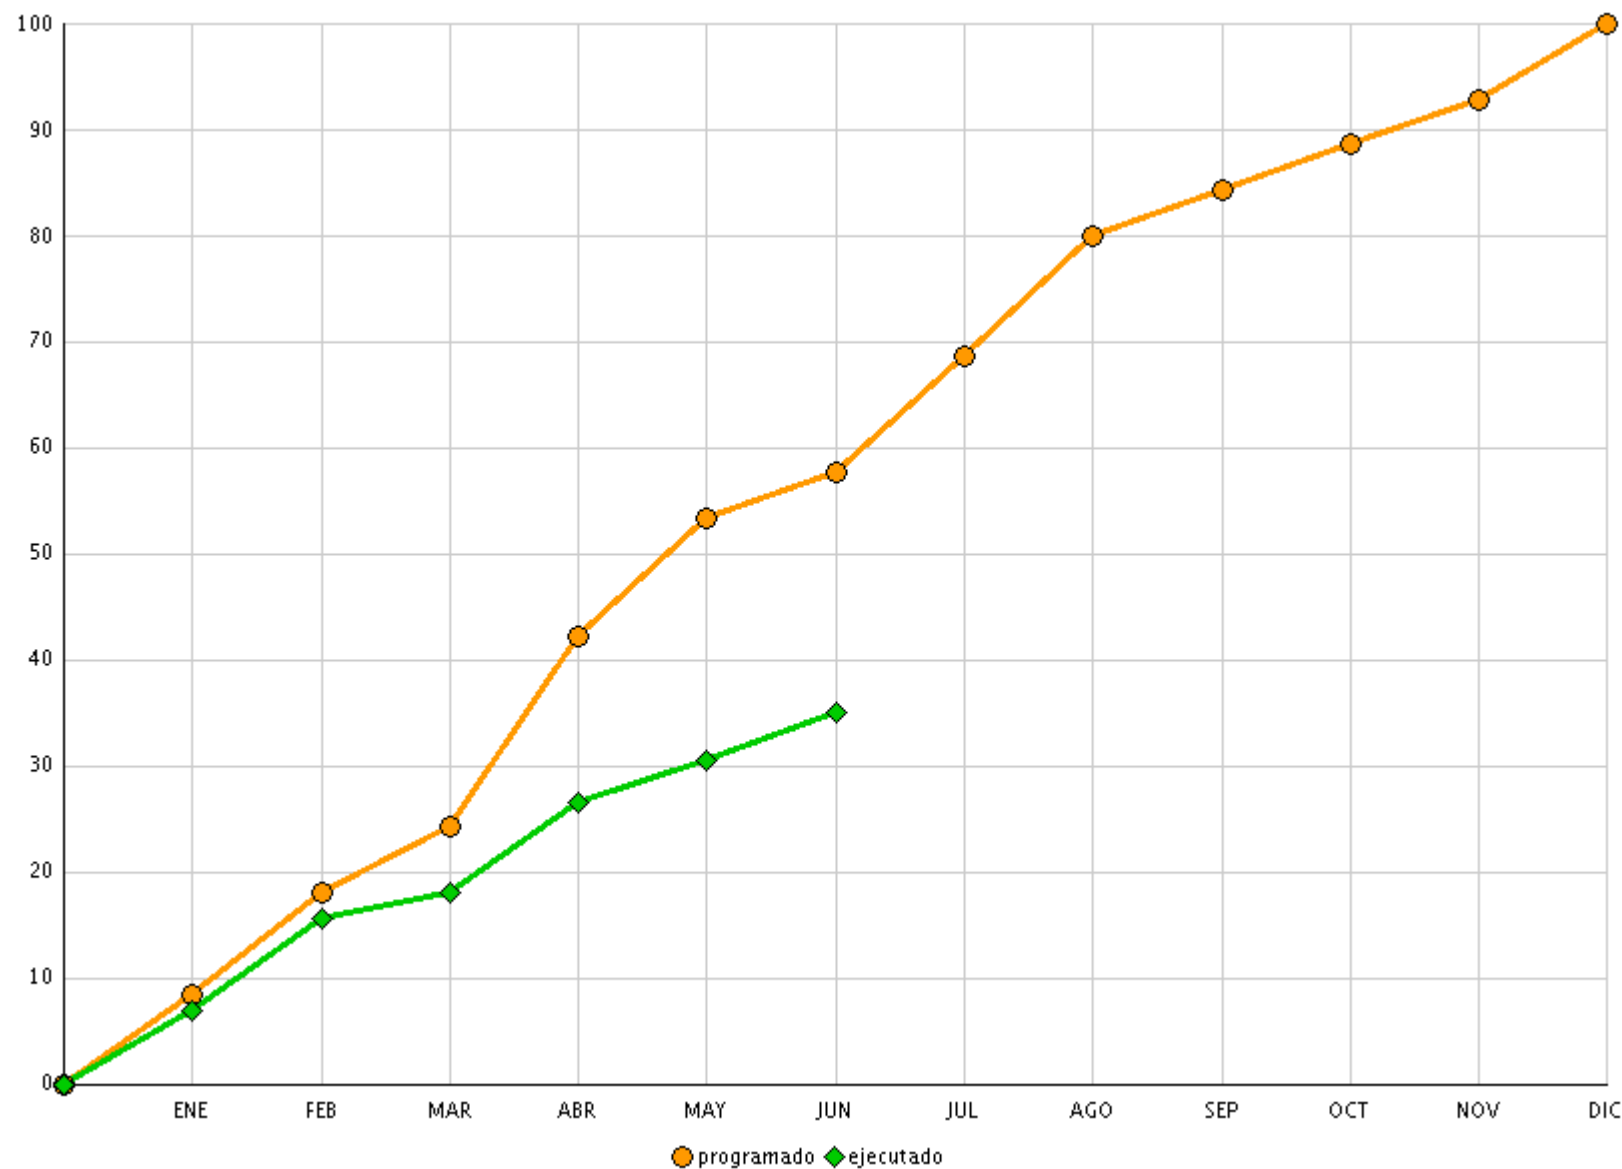


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.57	18.12	24.27	42.26	53.42	57.73	68.77	79.96	84.40	88.59	92.79	100.00
Ejecutado	7.02	15.59	18.17	26.58	30.51	35.15						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7730 Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá

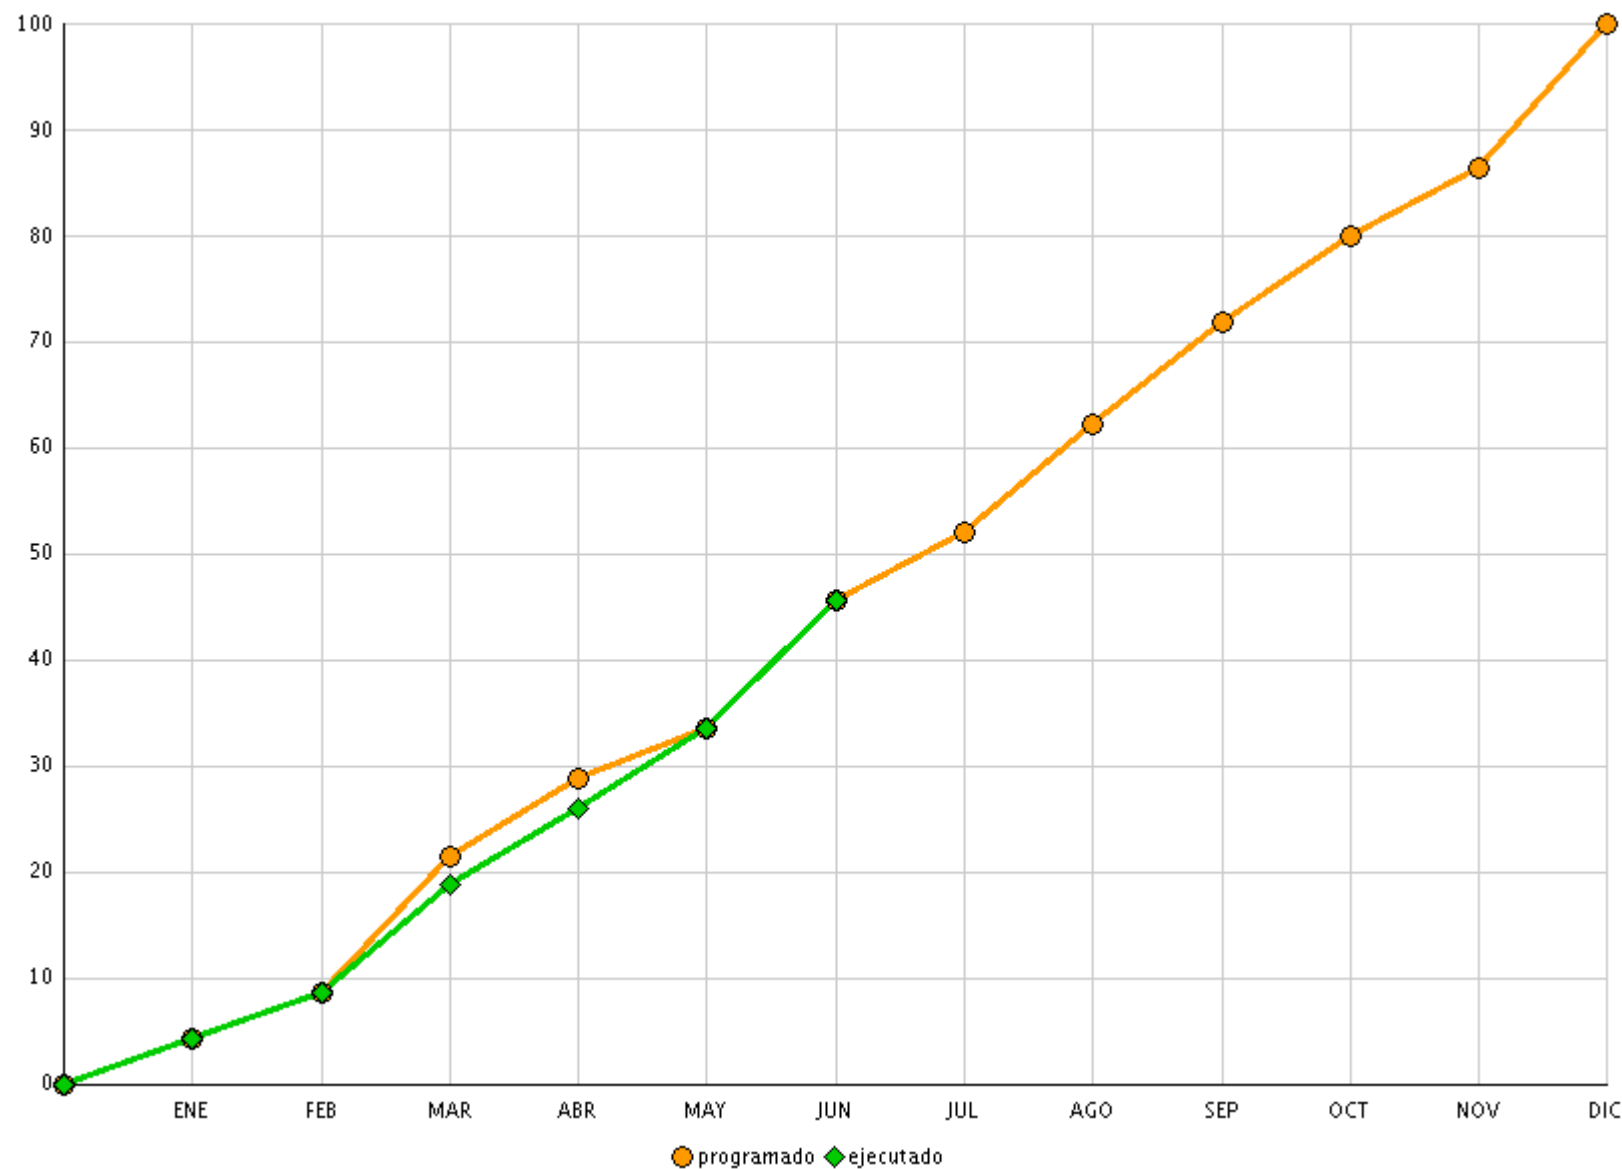


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.32	8.64	21.58	28.84	33.52	45.60	52.14	62.28	71.96	79.94	86.42	100.00
Ejecutado	4.32	8.64	18.78	26.04	33.52	45.60						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7733 Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá

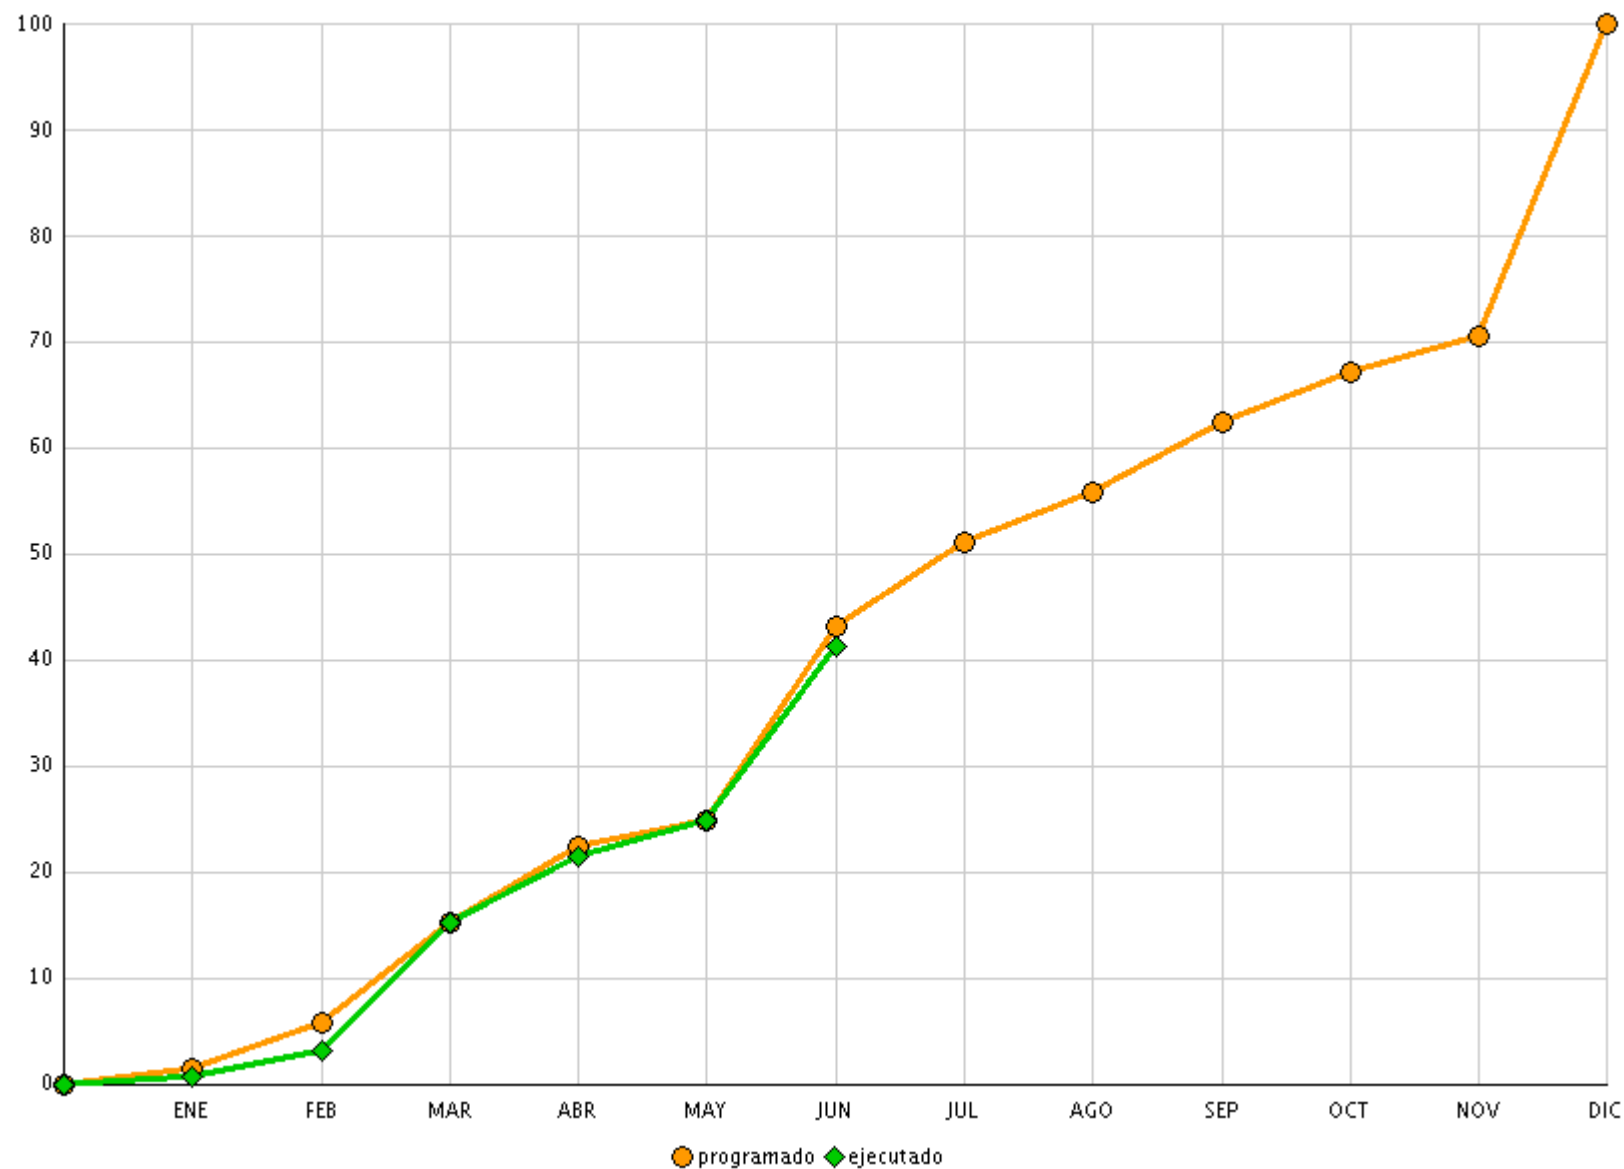


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.57	5.77	15.28	22.41	24.94	43.24	51.14	55.83	62.39	67.16	70.51	100.00
Ejecutado	0.70	3.15	15.28	21.60	24.94	41.29						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7735 Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

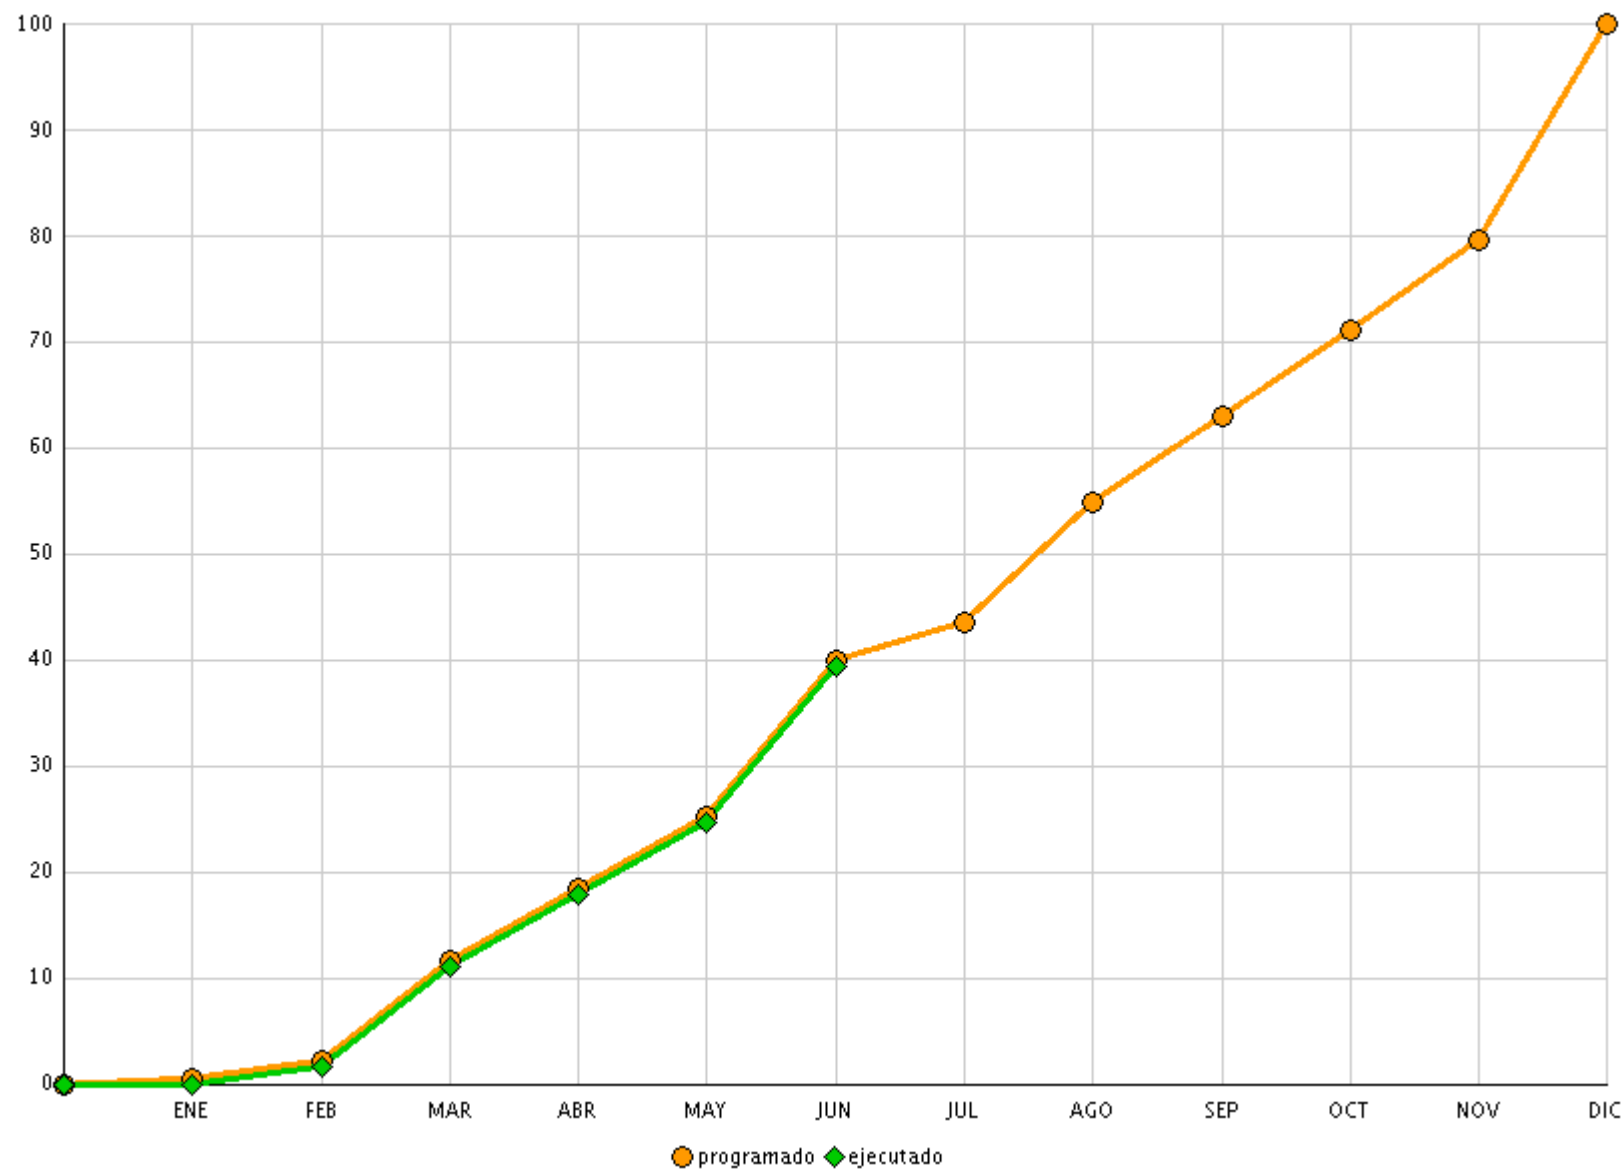


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.58	2.30	11.76	18.56	25.32	39.92	43.67	54.82	62.93	71.13	79.54	100.00
Ejecutado	0.00	1.72	11.18	17.98	24.73	39.34						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7740 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

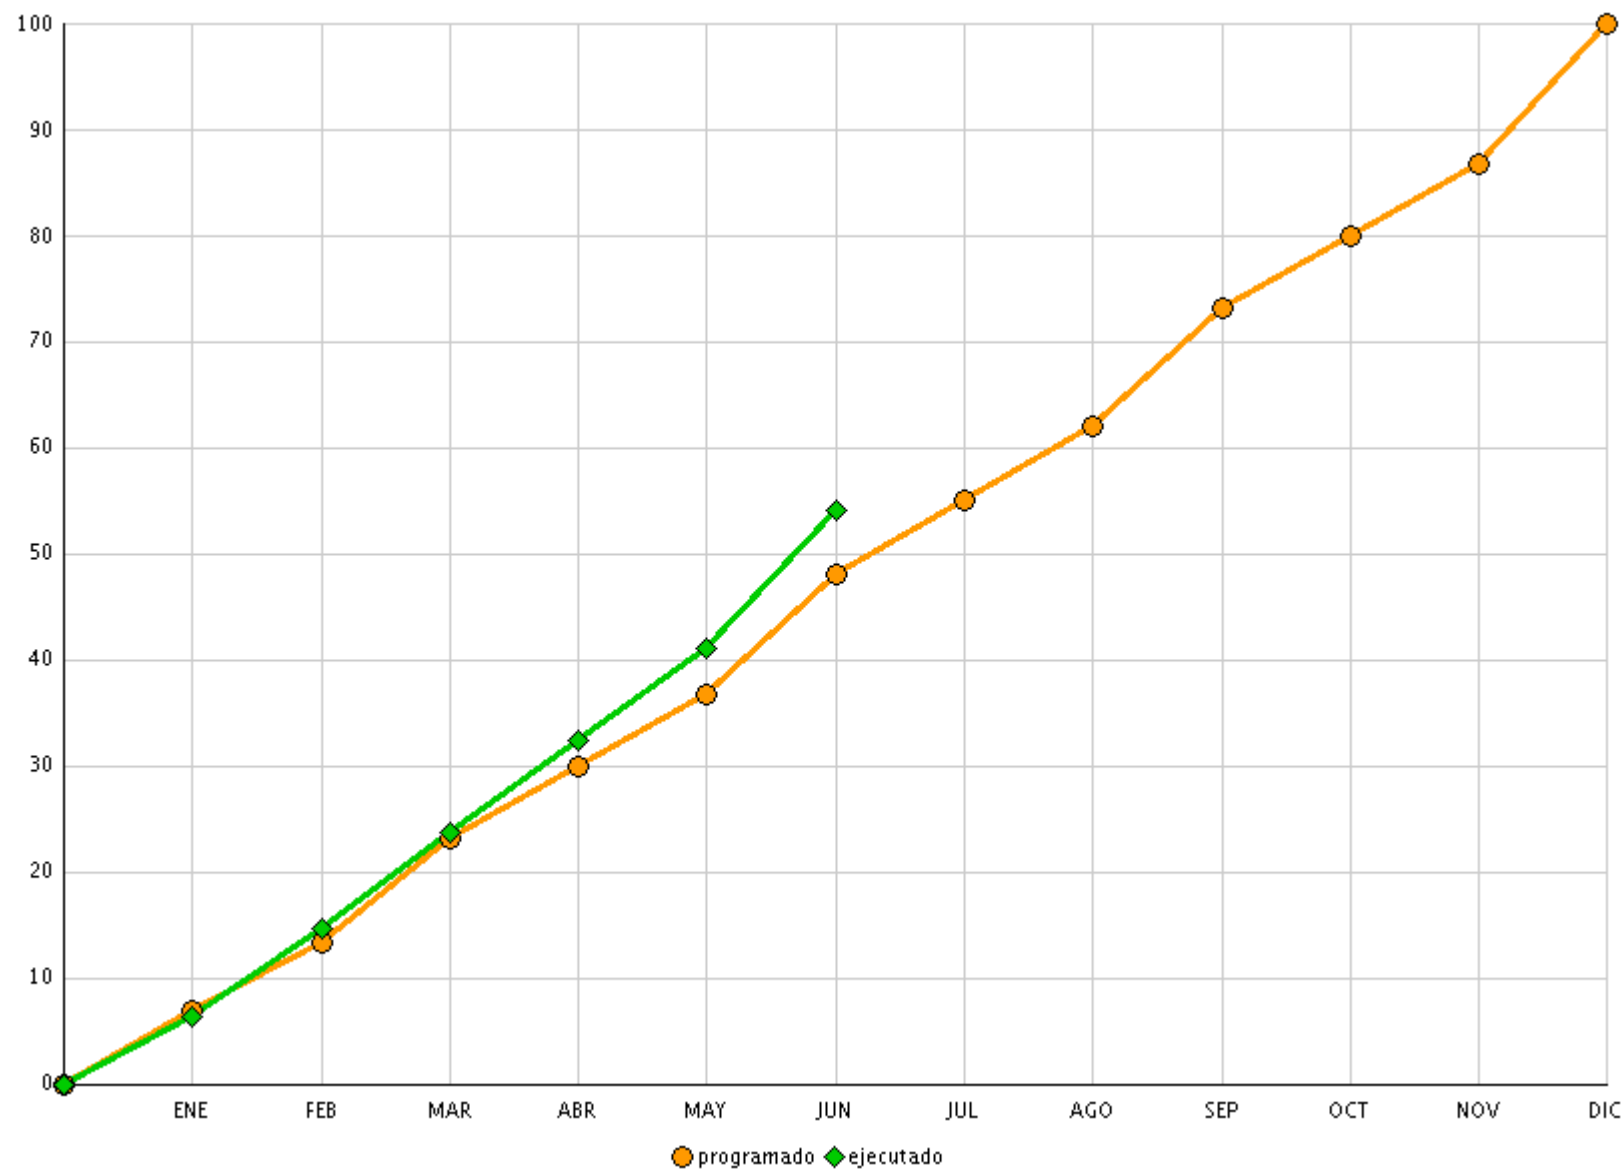


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.00	13.43	23.29	30.08	36.86	48.17	55.03	62.01	73.24	80.09	86.82	100.00
Ejecutado	6.34	14.71	23.76	32.40	41.04	54.09						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7741 Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá

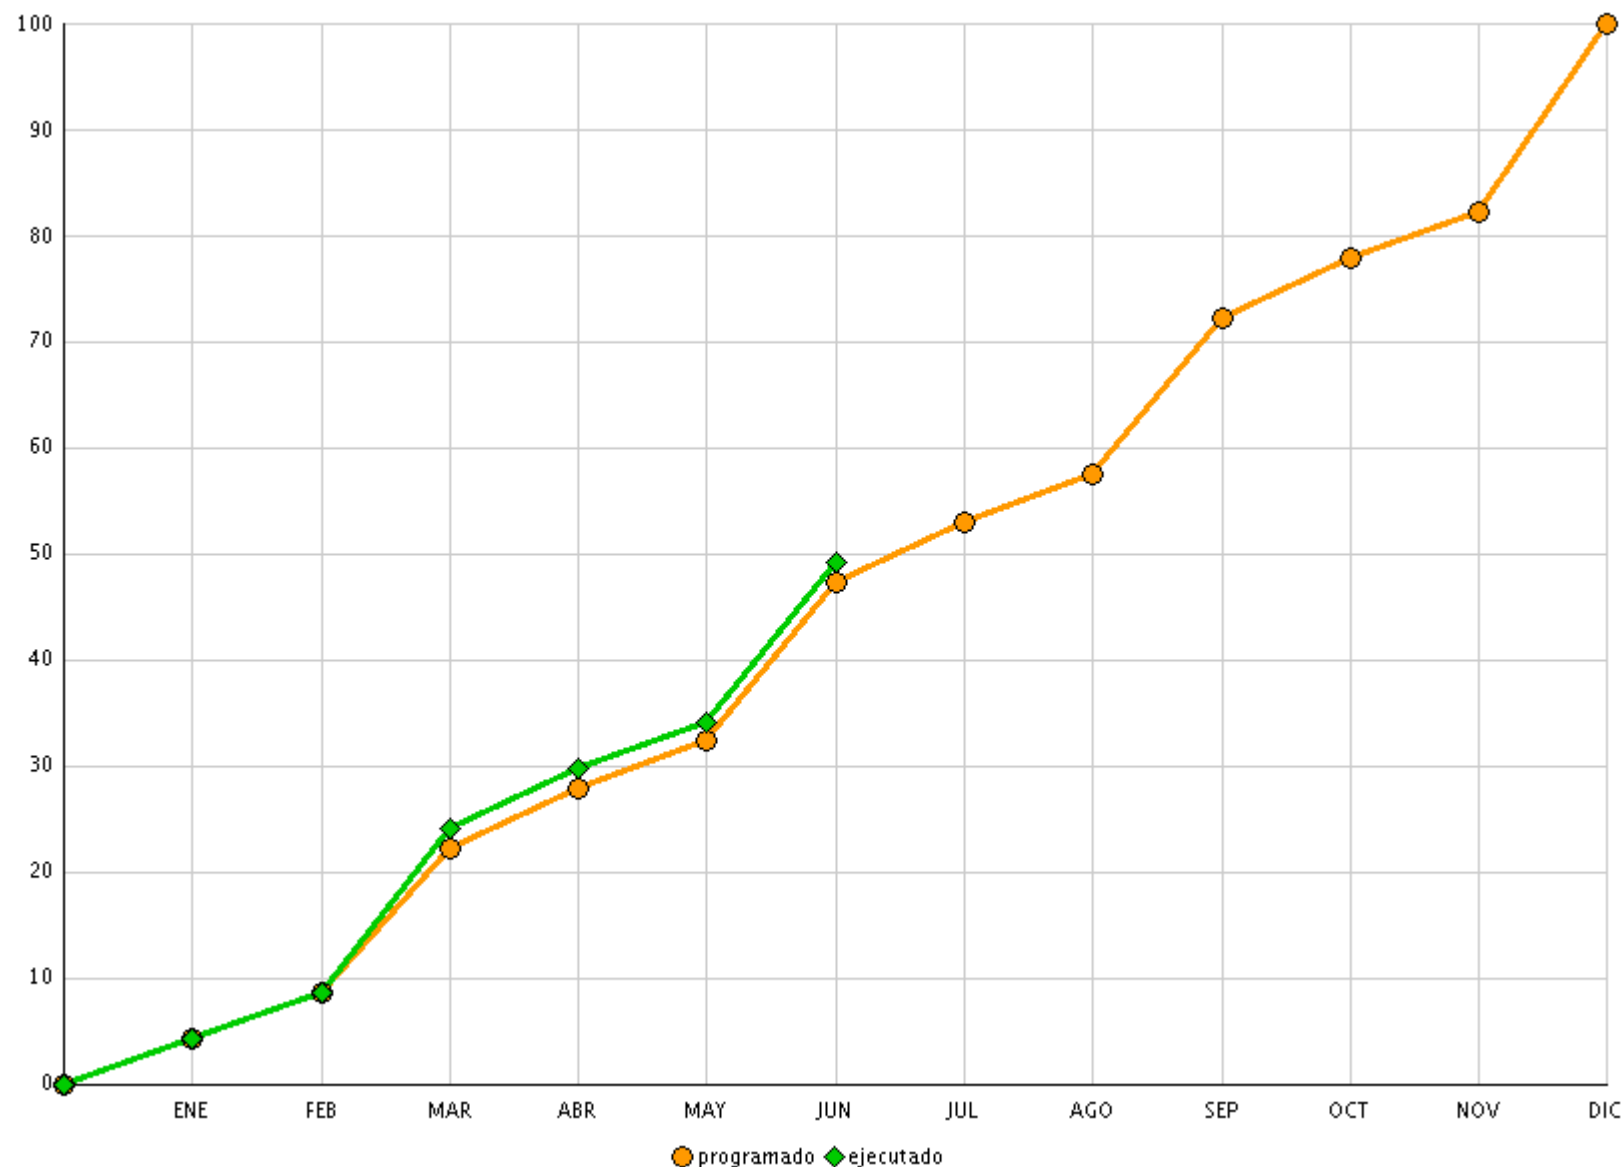


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.37	8.75	22.30	27.99	32.36	47.41	53.11	57.48	72.18	77.92	82.30	100.00
Ejecutado	4.37	8.75	24.12	29.81	34.18	49.23						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

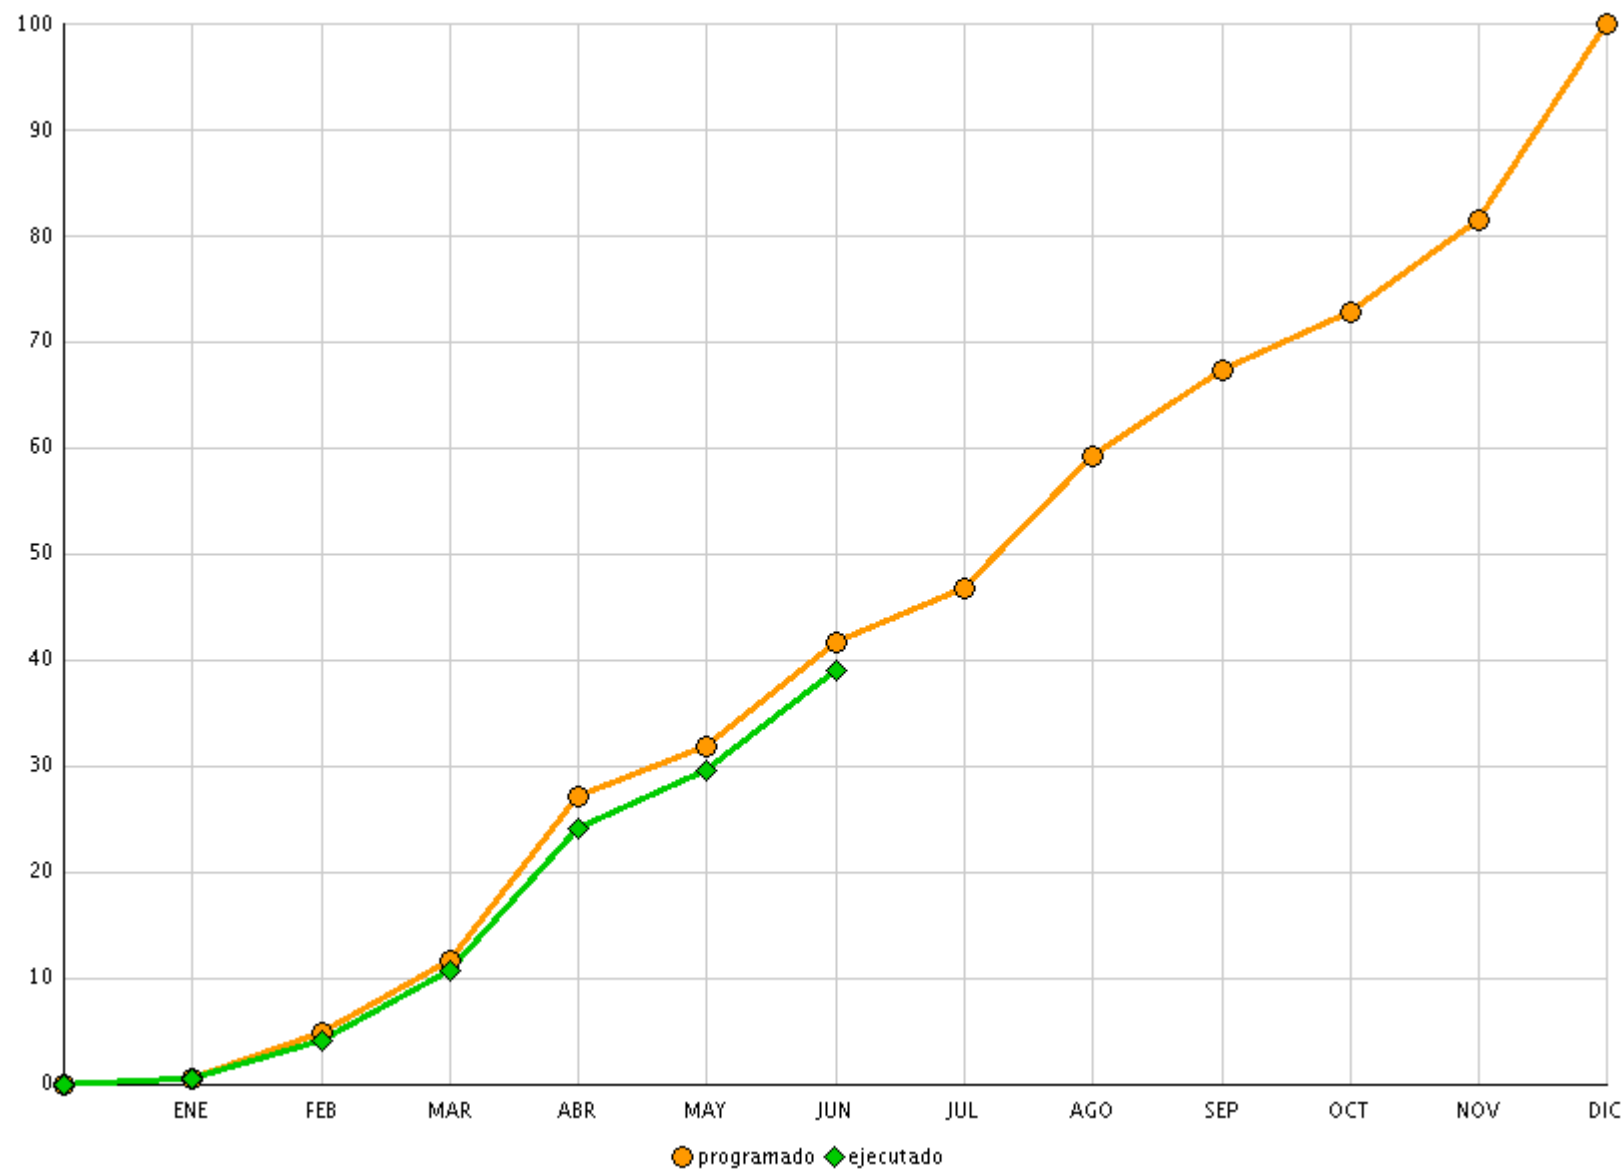


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.60	4.88	11.73	27.09	31.81	41.63	46.78	59.16	67.42	72.87	81.53	100.00
Ejecutado	0.60	4.11	10.80	24.22	29.68	39.03						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

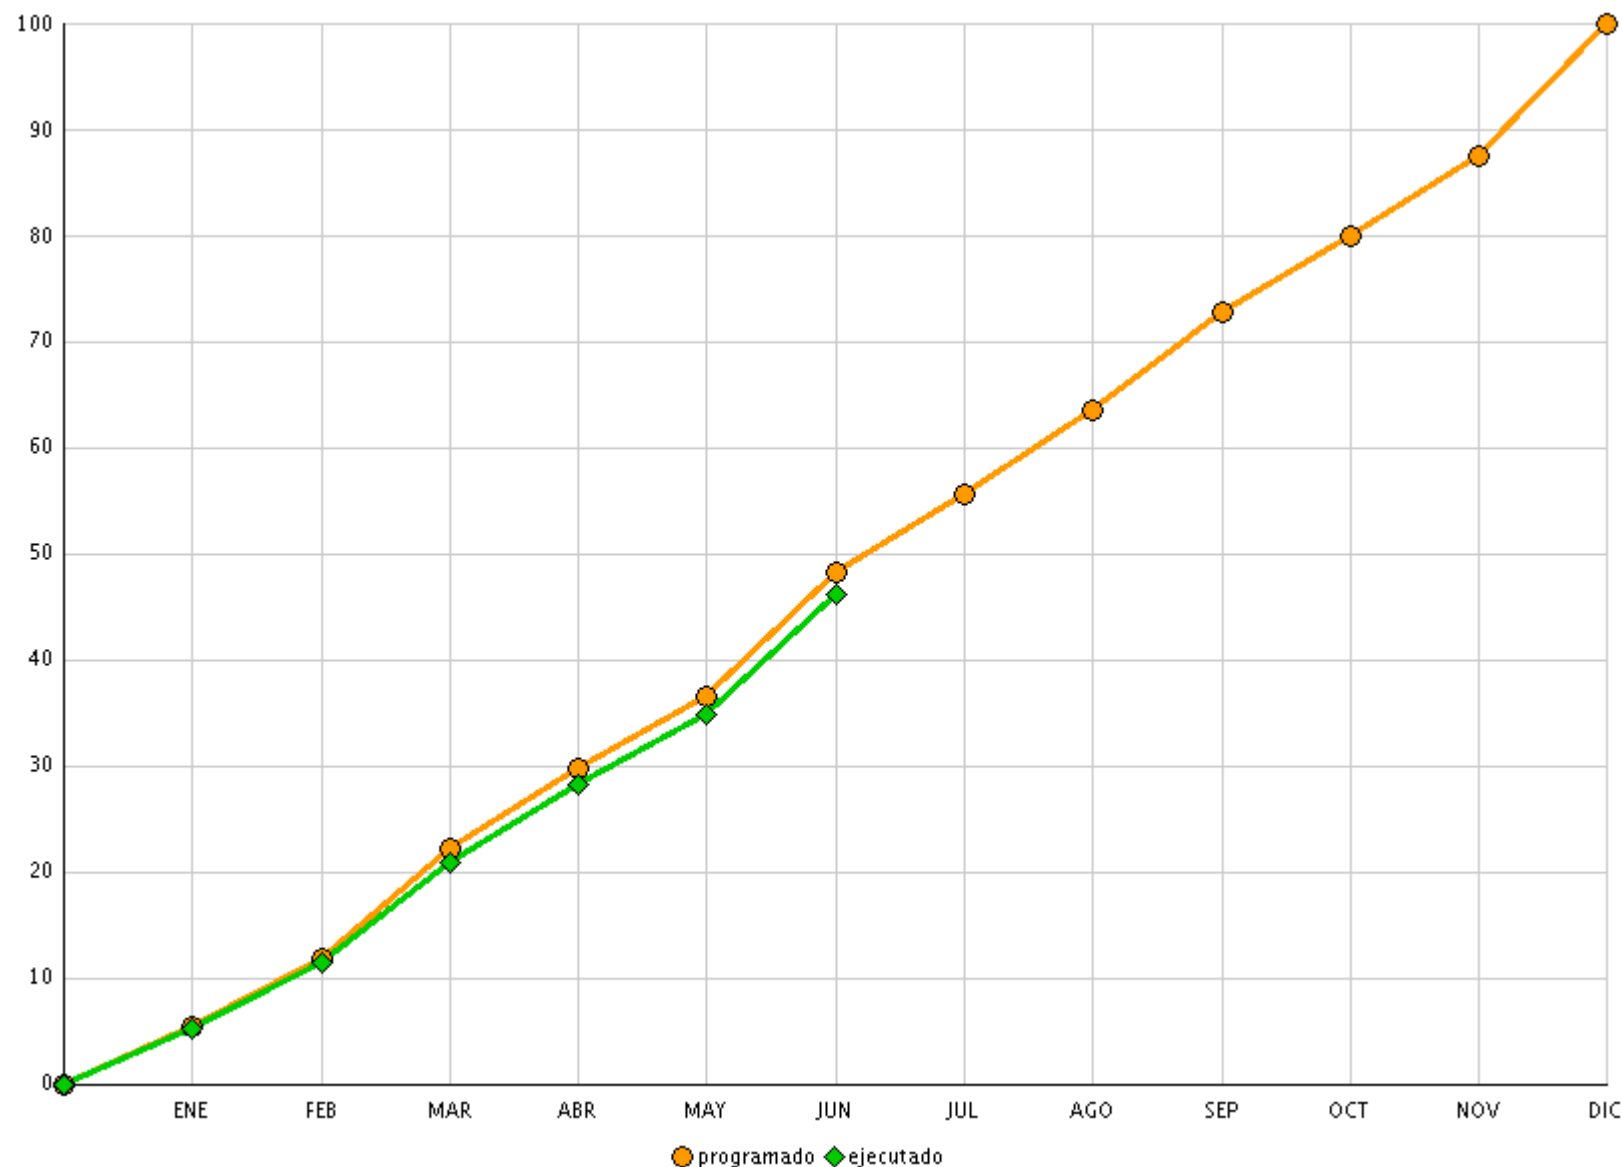


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.45	11.84	22.35	29.71	36.52	48.37	55.71	63.52	72.84	79.99	87.51	100.00
Ejecutado	5.33	11.59	20.93	28.30	34.86	46.16						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7748 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

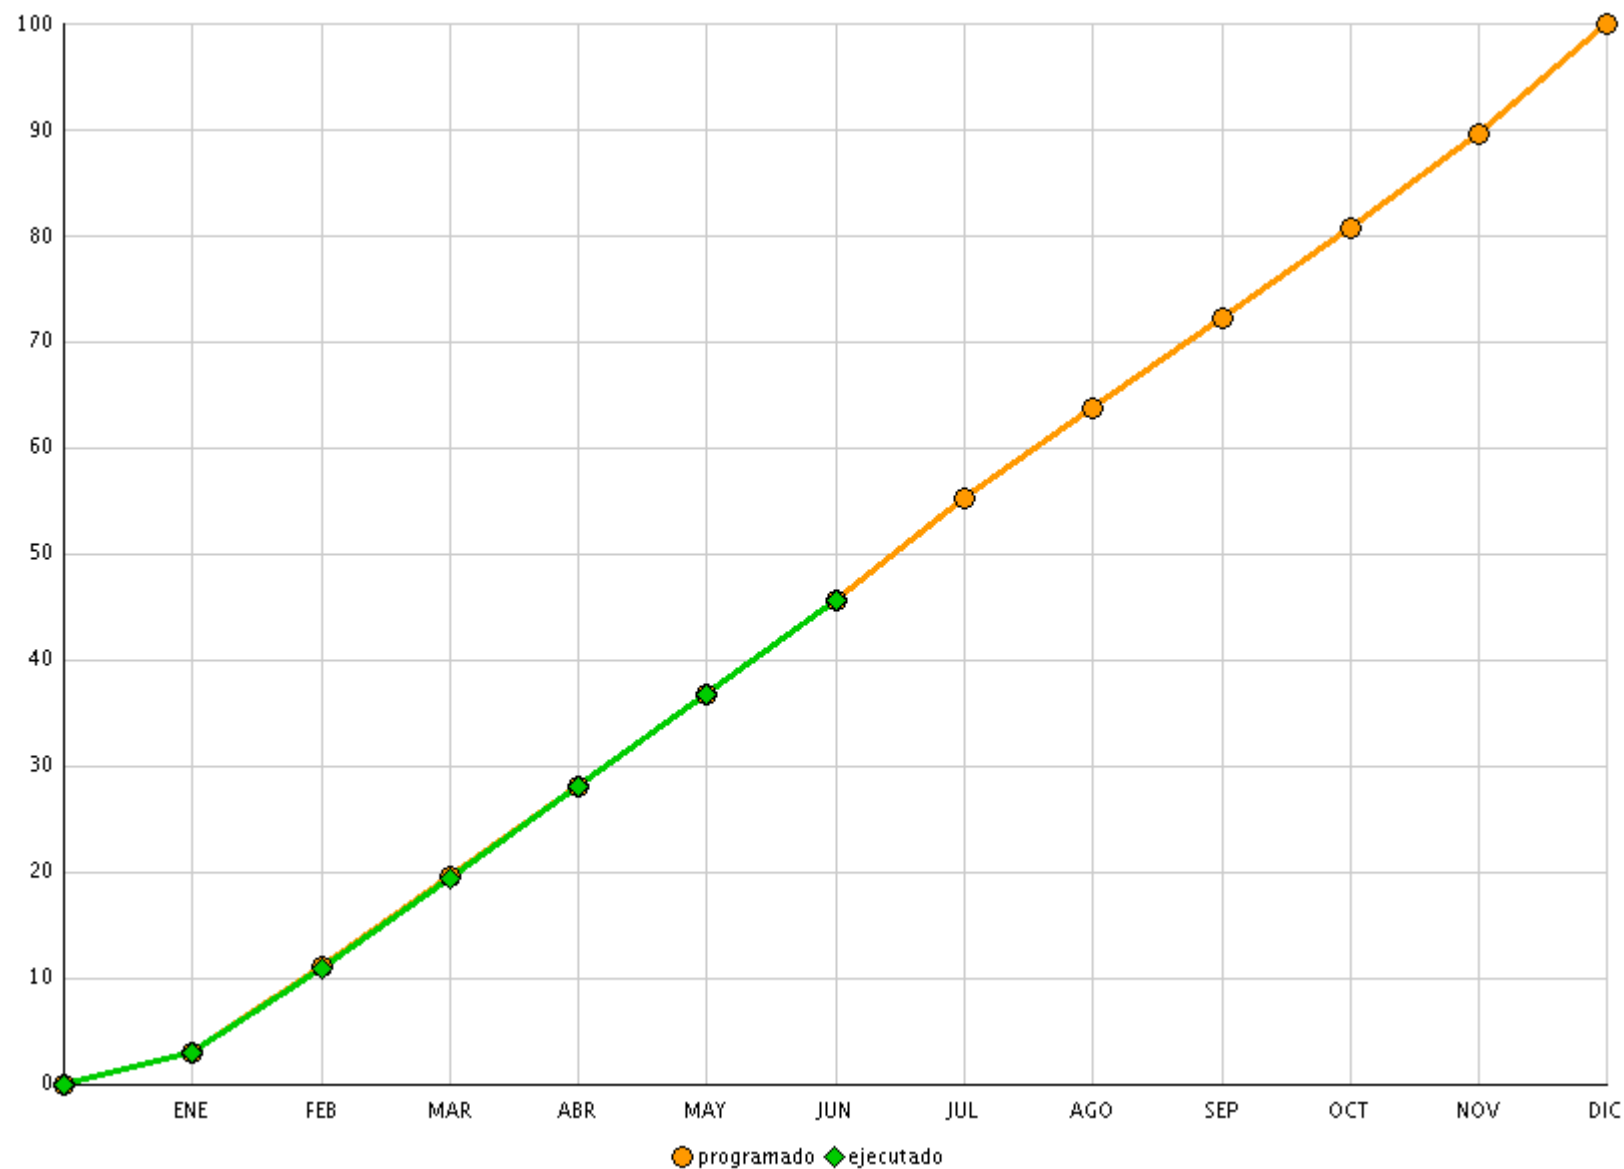


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.04	11.12	19.65	28.18	36.70	45.61	55.29	63.81	72.33	80.77	89.59	100.00
Ejecutado	3.04	11.01	19.45	28.18	36.70	45.61						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7749 Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá

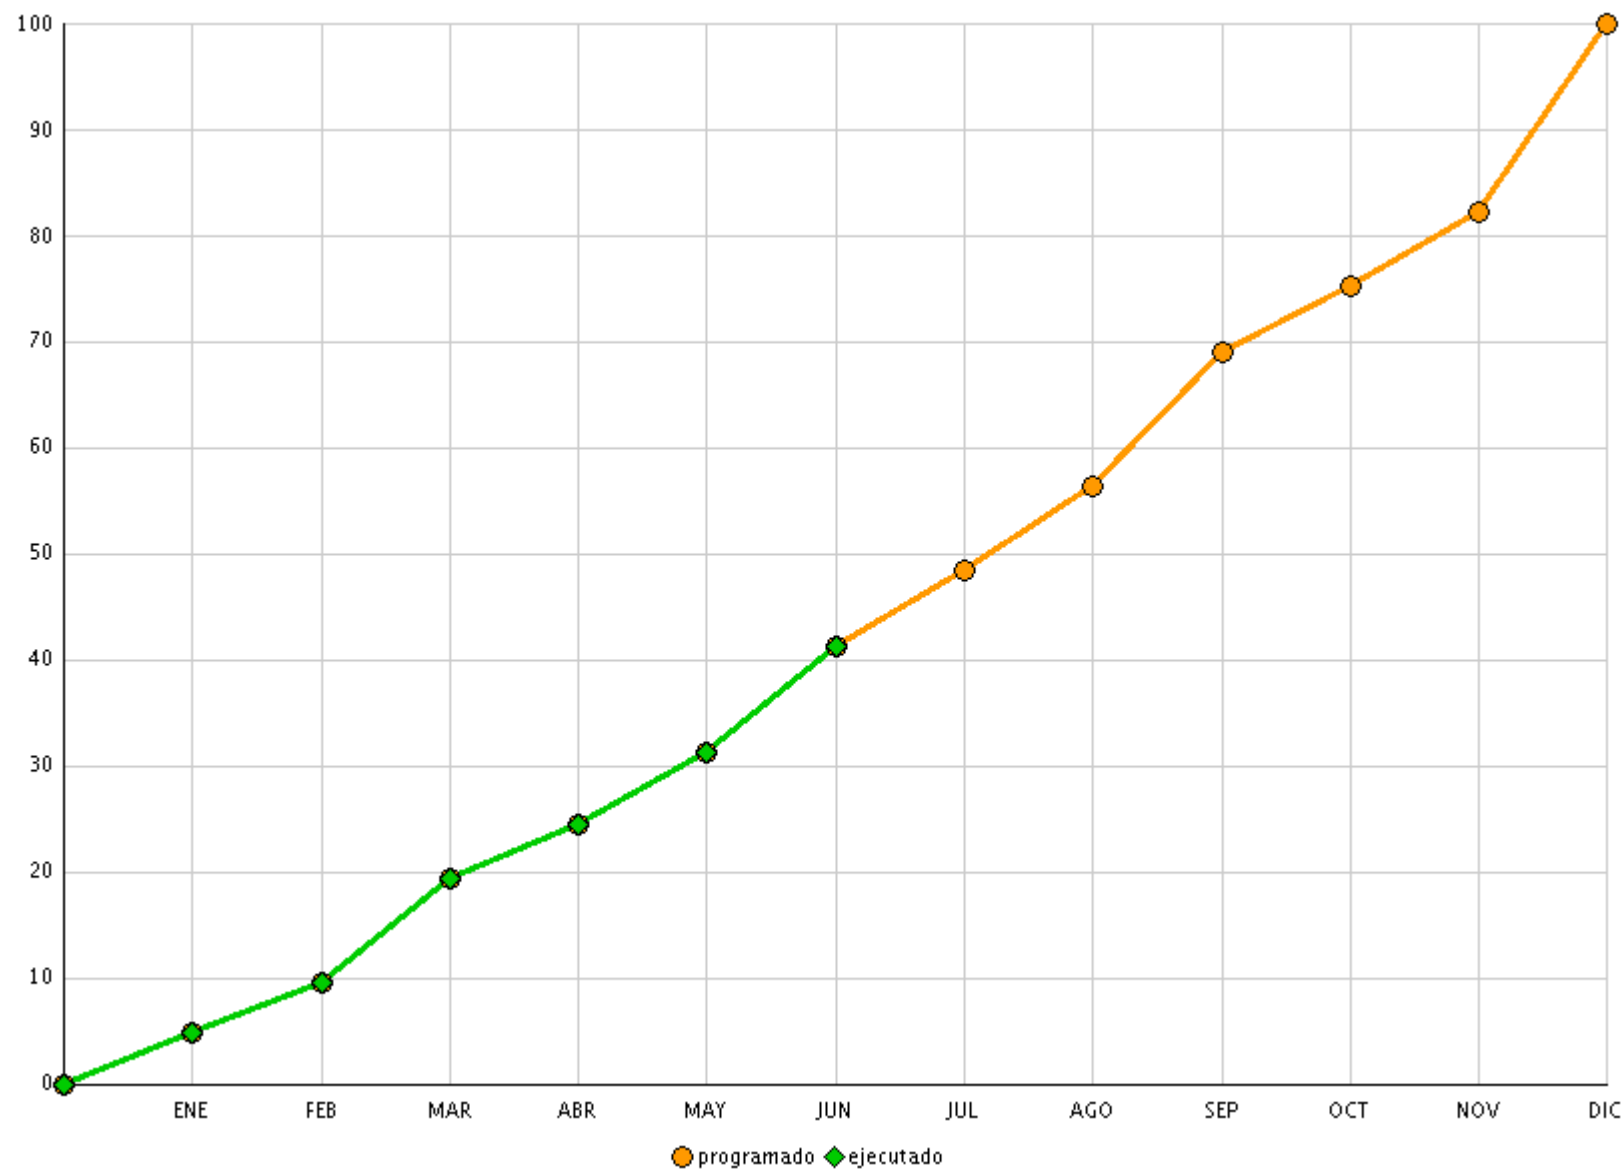


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.89	9.64	19.48	24.51	31.24	41.26	48.46	56.50	68.98	75.23	82.20	100.00
Ejecutado	4.89	9.64	19.48	24.51	31.24	41.26						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7752 Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá

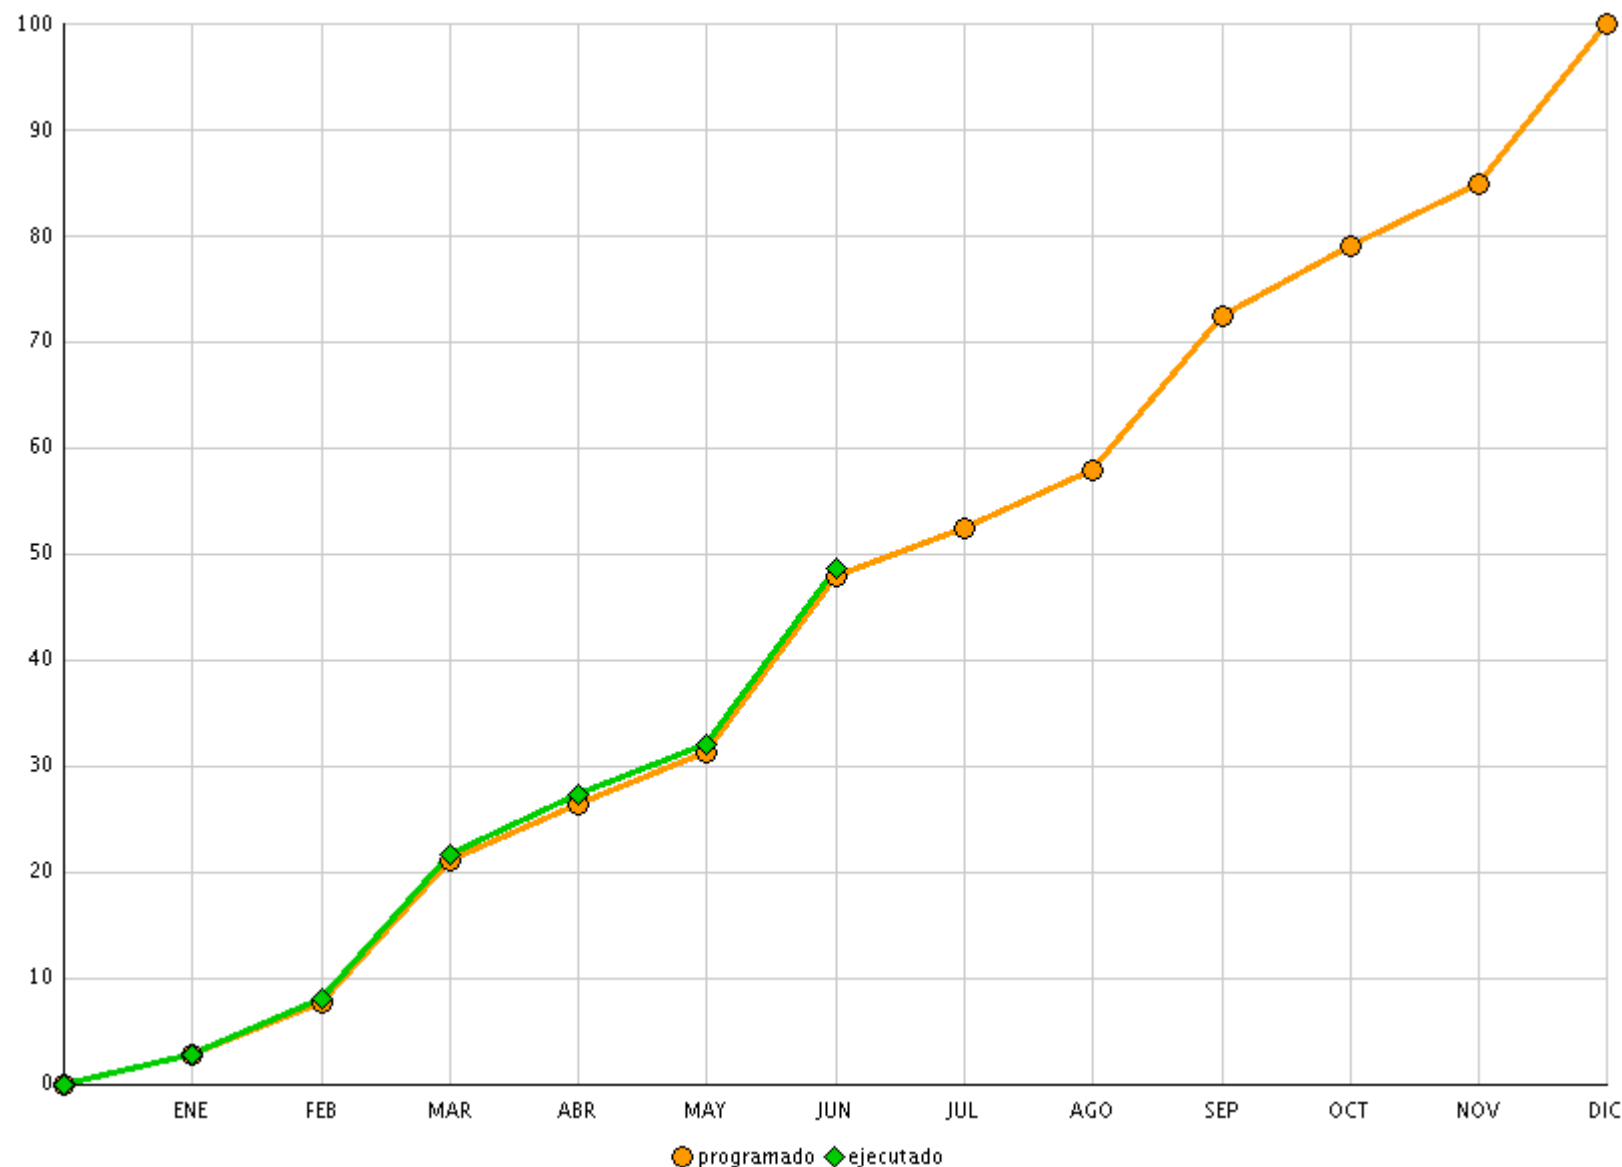


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.88	7.78	21.20	26.49	31.34	47.91	52.53	57.88	72.45	79.04	84.91	100.00
Ejecutado	2.88	8.10	21.76	27.34	32.07	48.66						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7753 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá

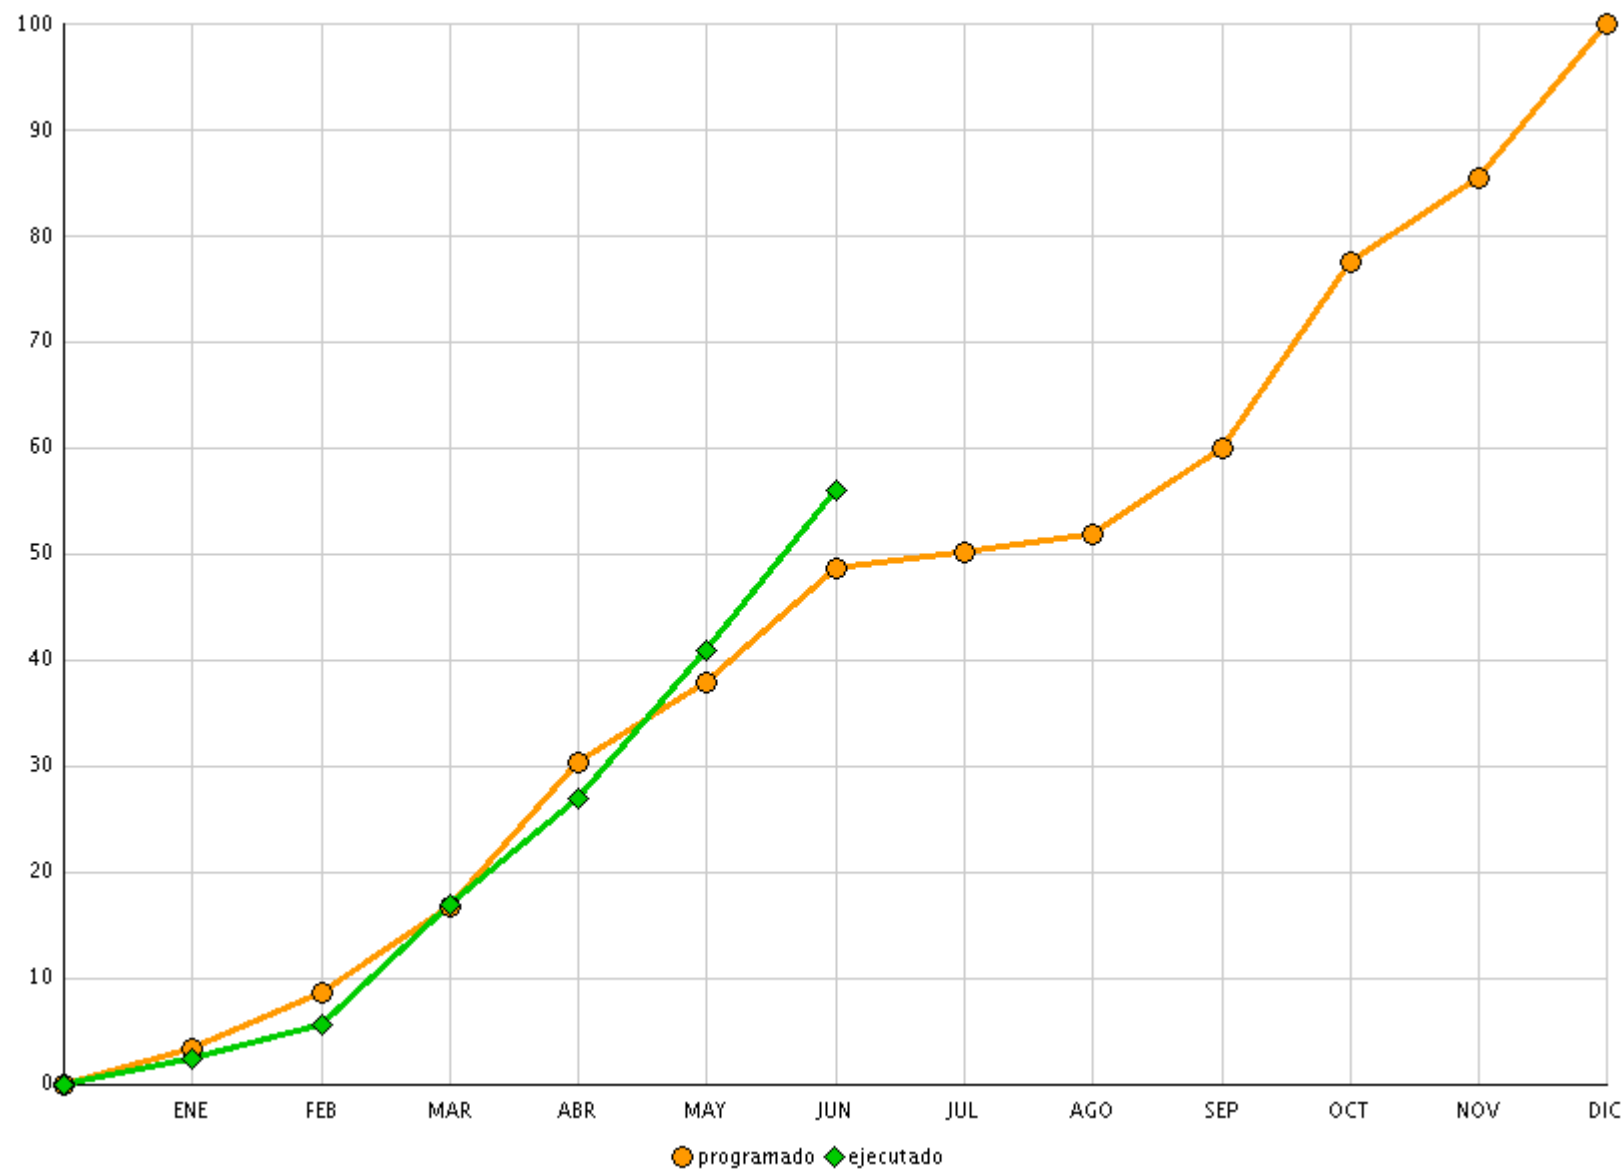


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.48	8.70	16.72	30.32	37.90	48.69	50.24	51.84	60.09	77.50	85.50	100.00
Ejecutado	2.41	5.58	16.95	27.00	40.93	56.04						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7756 Compromiso social por la diversidad en Bogotá

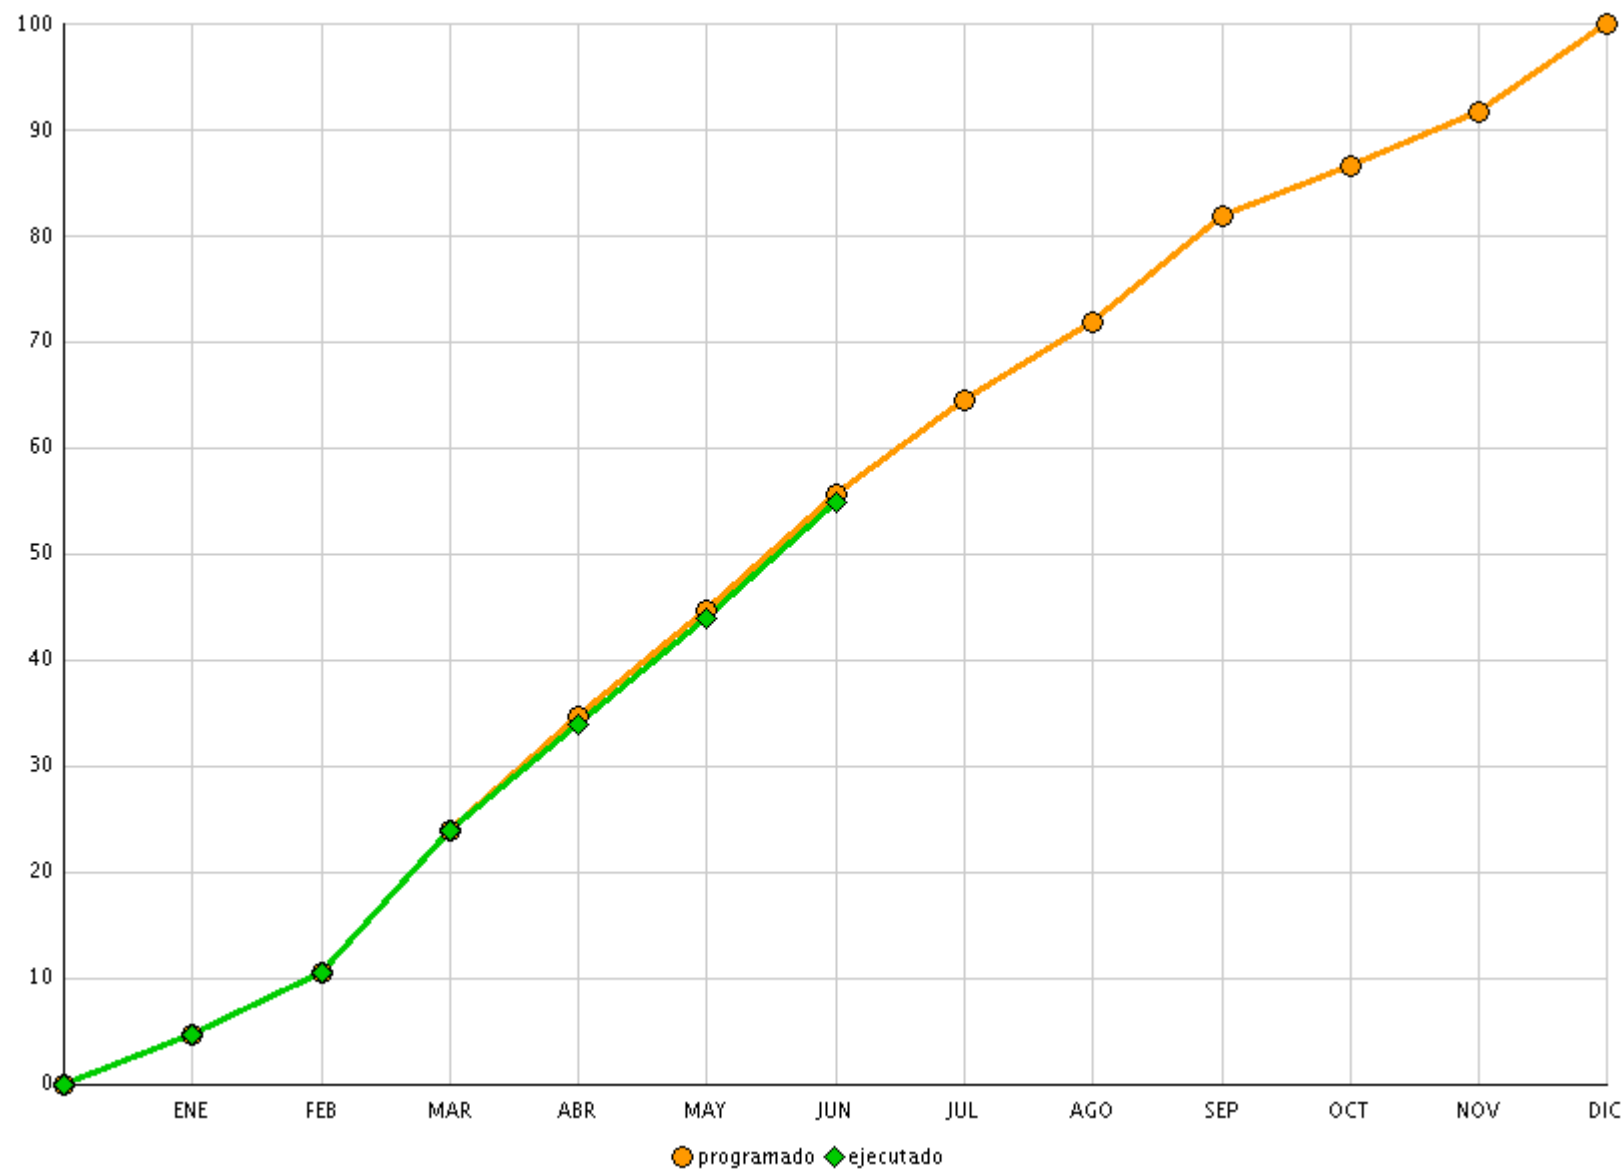


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.62	10.53	24.02	34.69	44.70	55.71	64.46	71.82	81.81	86.63	91.79	100.00
Ejecutado	4.62	10.53	24.02	33.94	43.95	54.96						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7757 Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

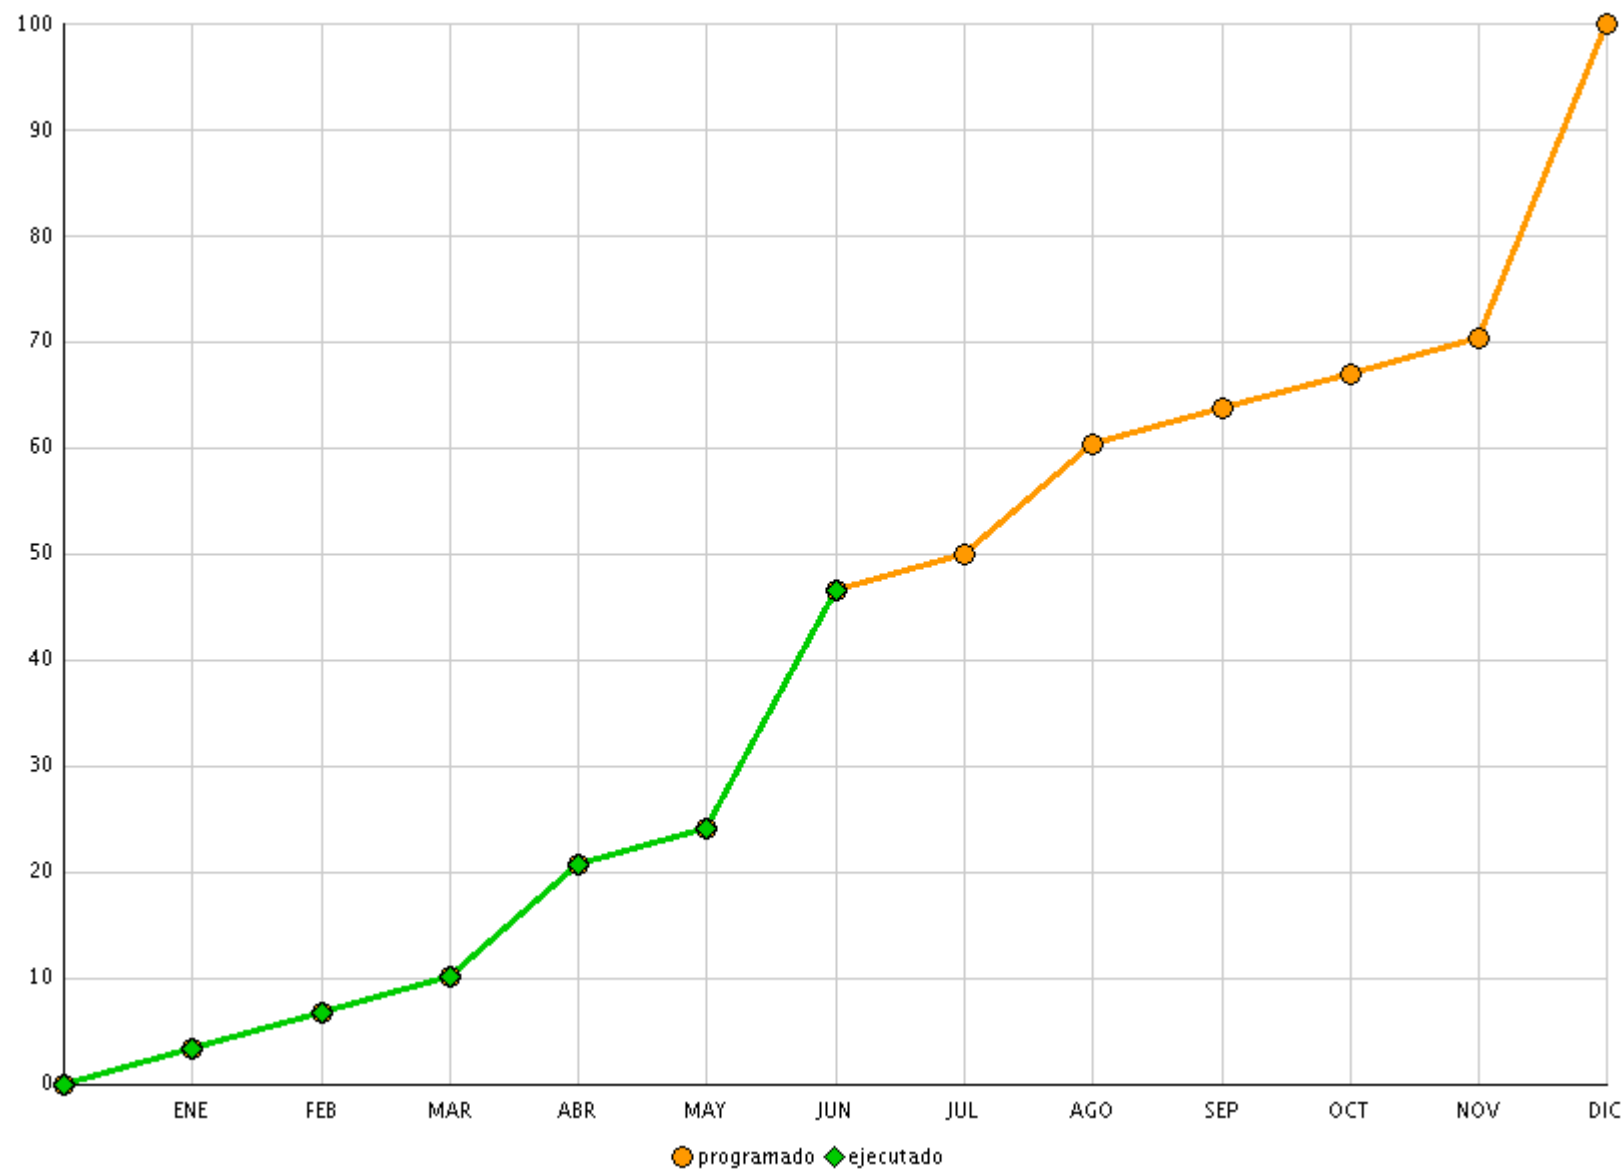


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.48	6.80	10.12	20.75	24.08	46.65	49.97	60.38	63.70	67.03	70.35	100.00
Ejecutado	3.48	6.80	10.12	20.75	24.08	46.65						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7768 Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

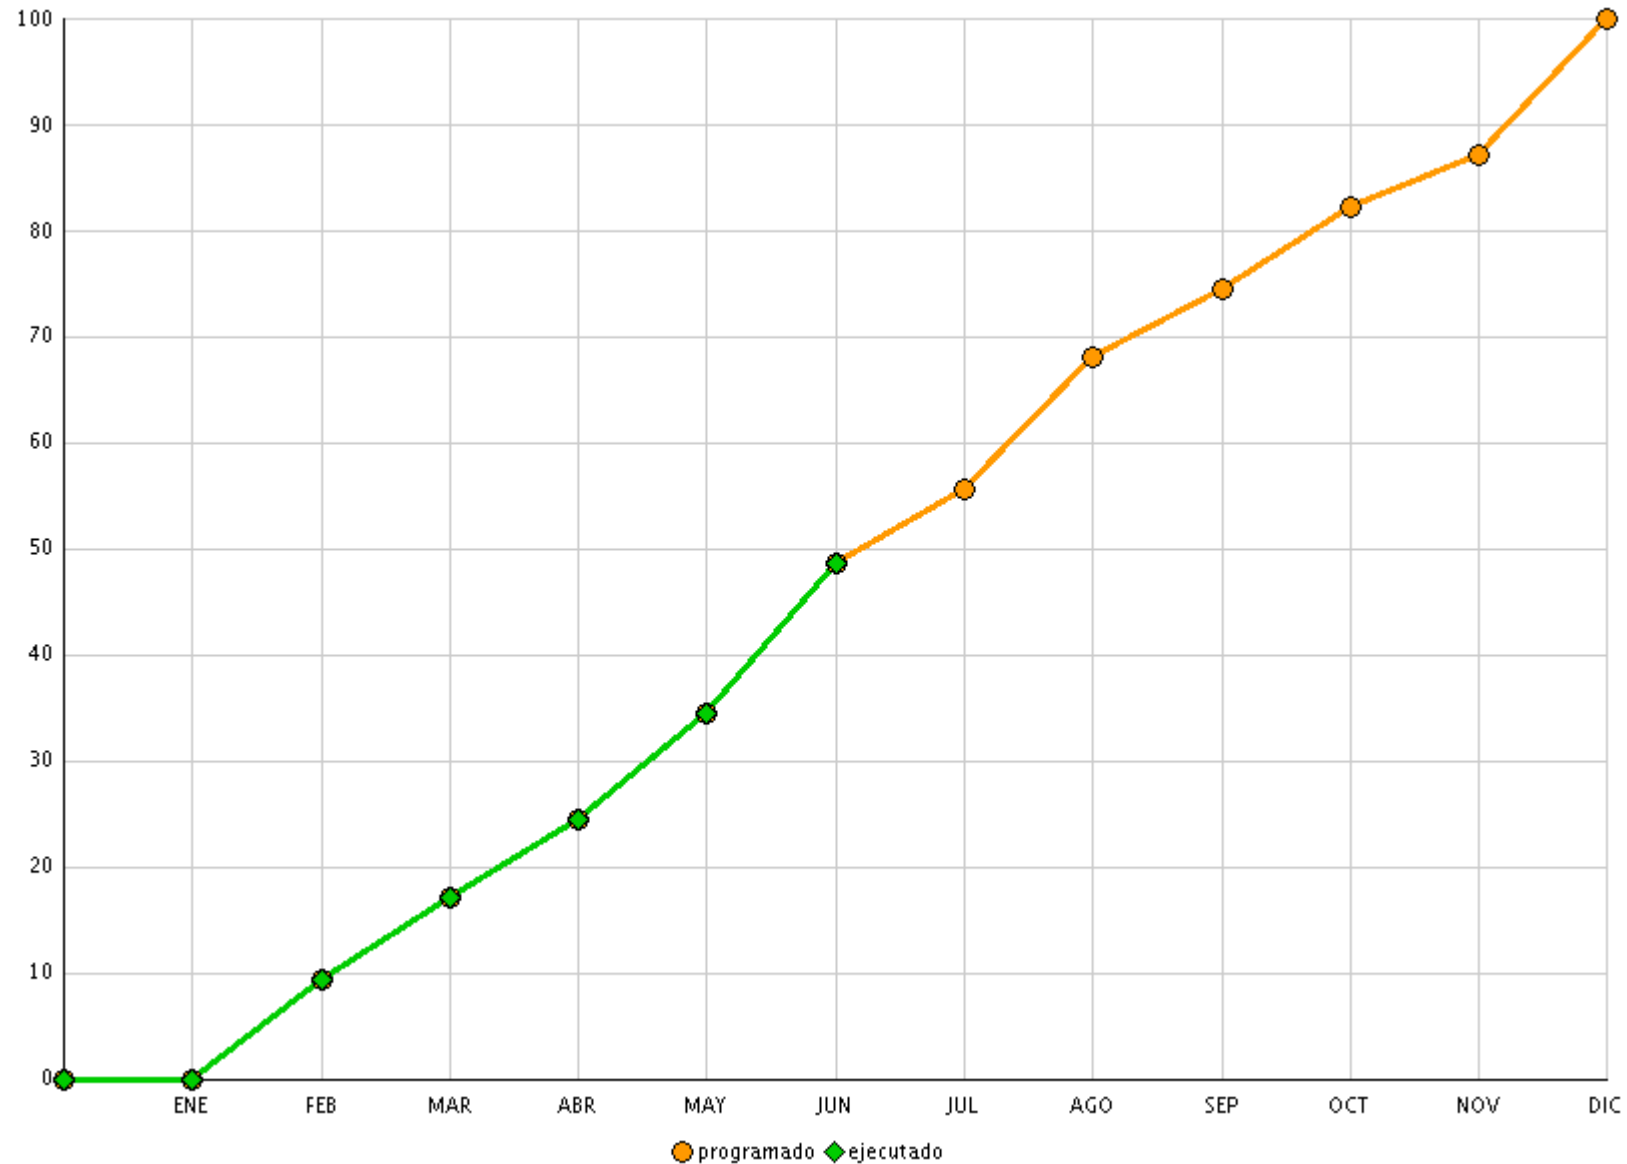


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.35	17.10	24.55	34.55	48.70	55.75	68.15	74.45	82.35	87.15	100.00
Ejecutado	0.00	9.35	17.10	24.55	34.55	48.70						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

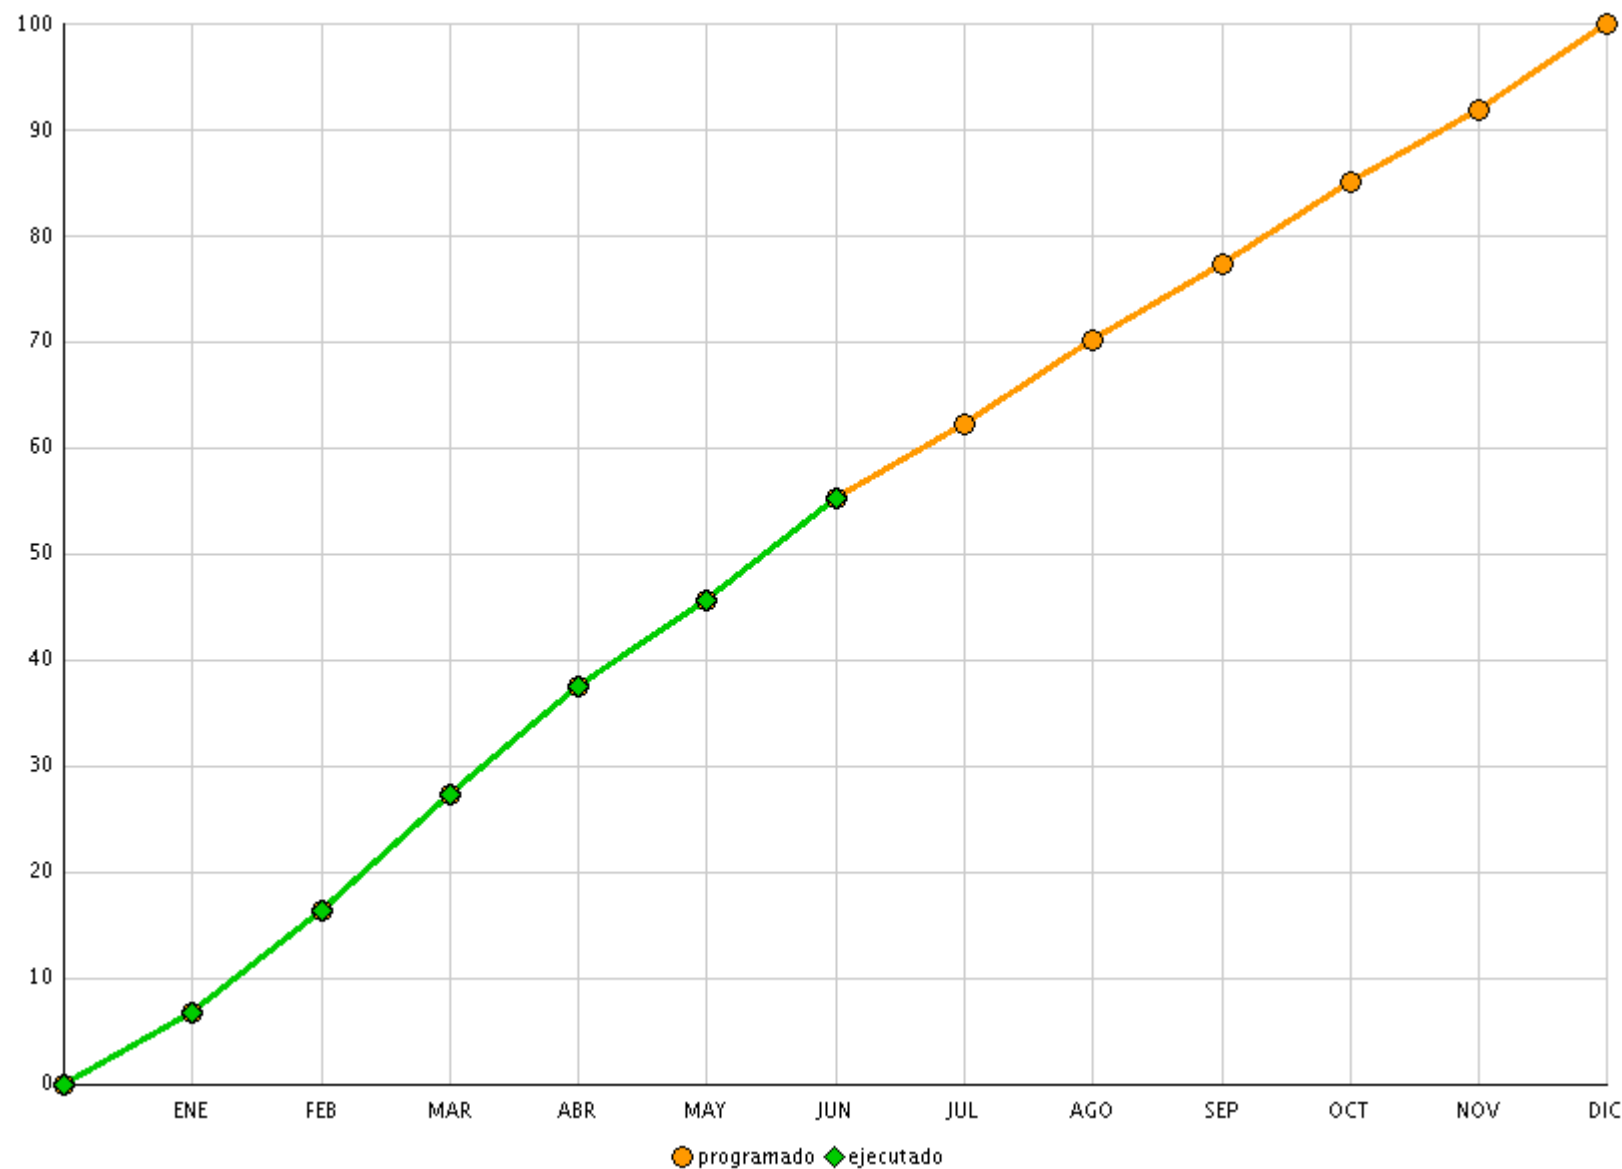


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.72	16.33	27.30	37.60	45.69	55.26	62.31	70.20	77.45	85.19	91.96	100.00
Ejecutado	6.72	16.33	27.30	37.60	45.69	55.26						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7771 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

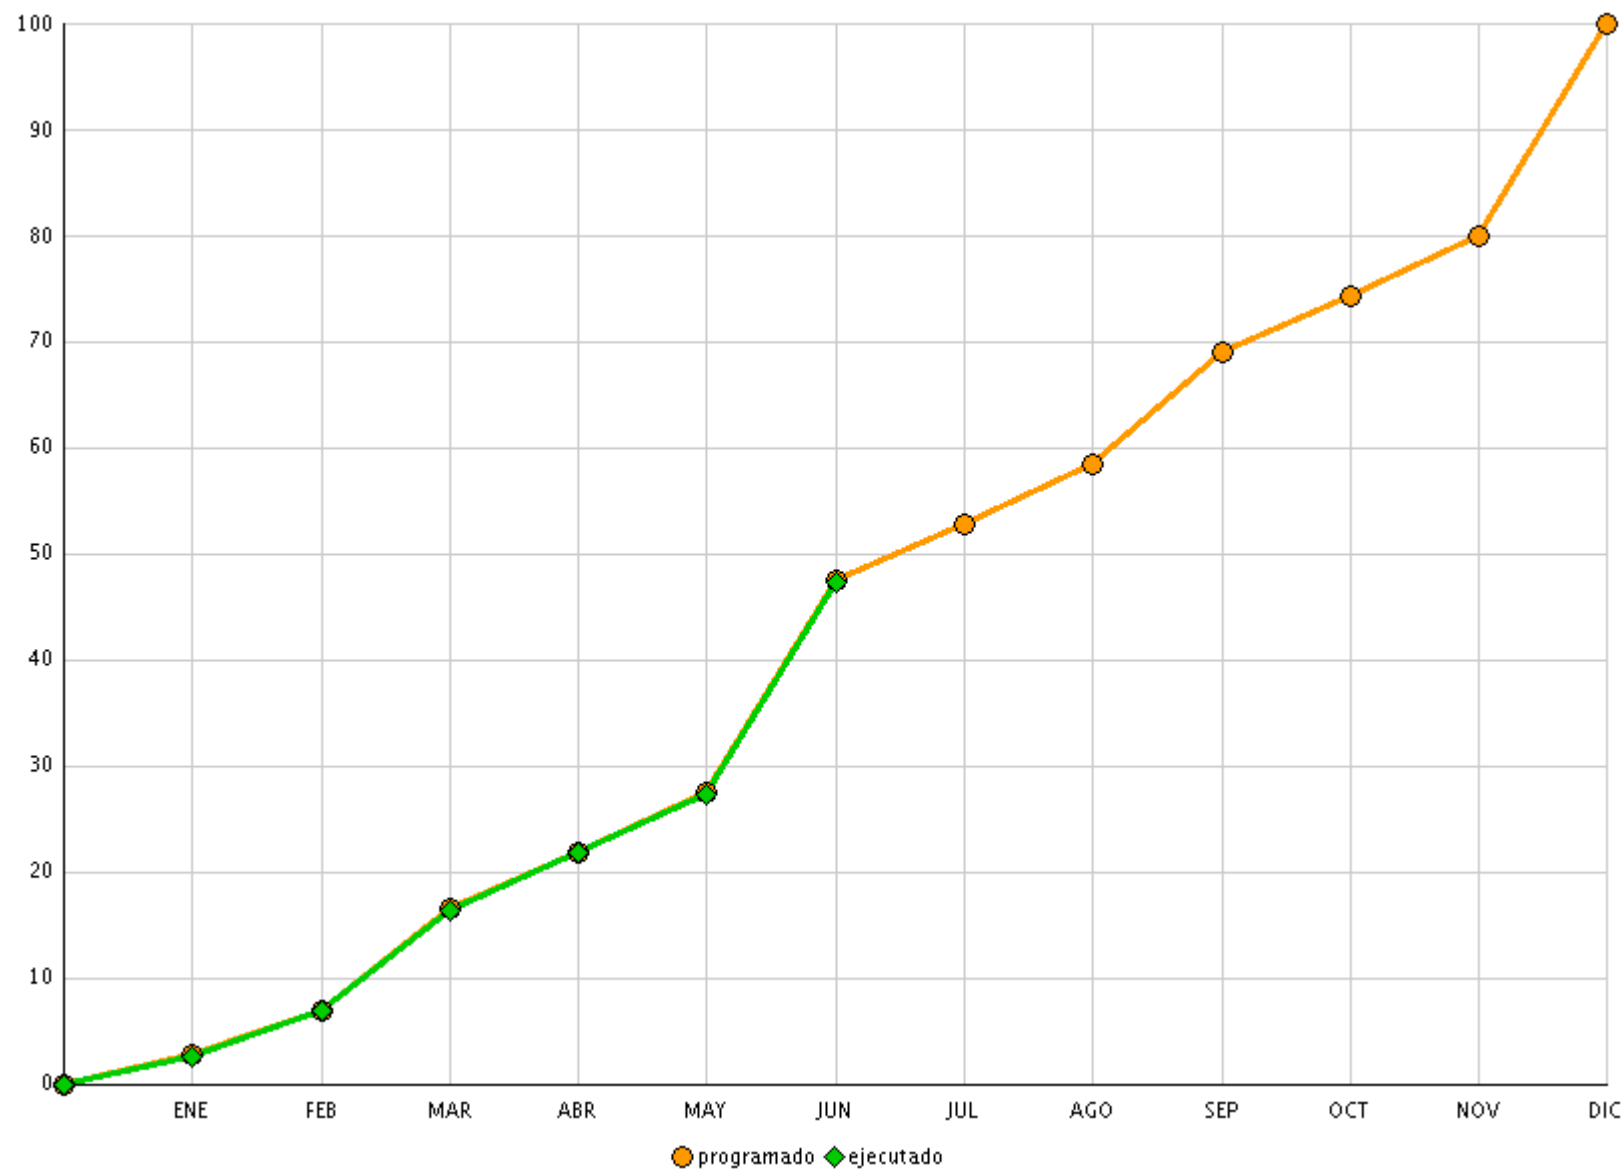

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.84	7.06	16.52	21.96	27.49	47.47	52.88	58.45	68.97	74.40	79.96	100.00
Ejecutado	2.69	6.91	16.37	21.81	27.34	47.32						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7564 25 Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA GARANTÍA DE DERECHOS FRENTE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	30.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	17.00	2.00	2.00	20.00	20.00	2.00	2.00	2.00		23.00		2.00		2.00		23.00		3.00		100.00	45.00	13.50
2.	MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA GARANTIA DE LOS DERECHOS FRENTE A LA VIOL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	5.00
3.	APOYAR A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA.	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	19.00	19.00	4.00	4.00	4.00	4.00	19.00	19.00	4.00		4.00		24.00		4.00		4.00		6.00		100.00	54.00	5.40
4.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO QUE SE PRESENTEN ANTE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA	40.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	12.00	4.00	4.00	12.00	12.00	4.00		12.00		12.00		4.00		4.00		24.00		100.00	40.00	16.00
5.	ACOMPÑAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA.	10.00	0.00	0.00	40.00	40.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		15.00		100.00	70.00	7.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									46.90	

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 3 CENTROS DIA (ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO, PUBLICACION DE PROCESO, ADJUDICACION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA)	1.51	12.33	12.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	0.00		4.00		0.00		0.00		0.00		42.00		100.00	54.00	0.82
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA ADJUDICADOS	3.49	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.74
3.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADECUAR LOS INMUEBLES EN EL MARCO DE EMERGENCIAS SANITARIAS O SOCIALES	0.83	6.66	0.00	26.66	20.00	6.66	0.00	6.66	26.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66		6.66		6.66		6.66		6.66		6.74		100.00	59.98	0.50
4.	GESTIONAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES, PARA ATENDER LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES QUE SEAN EMITIDAS A LA ENTIDAD.	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5.	REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR LAS CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN LOS EQUIPAMIENTOS QUE SE REQUIERAN	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS DE REPARACIONES LOCATIVAS	25.30	6.66	6.66	26.66	26.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66		6.66		6.66		6.66		6.66		6.74		100.00	59.96	15.17
7.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACION PARA OTROS PROCESOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LA SDIS	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	APOYAR LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL	1.50	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		20.00		100.00	40.00	0.60
9.	REALIZAR LAS GESTIÓN CORRESPONDIENTES PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LA SDIS	2.80	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		20.00		100.00	40.00	1.12
10.	REALIZAR VIABILIZACIÓN DE INMUEBLES PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE MANERA TRANSITORIA	15.26	9.00	7.75	5.00	8.12	17.00	3.11	5.00	3.17	5.00	2.45	5.00	7.15	5.00		27.00		5.00		5.00		5.00		7.00		100.00	31.75	4.85
11.	GESTION Y LEGALIZACIÓN DE SUELO, LICENCIAS DE CONSTRUCCION, DELIMITACIONES, INCORPORACIONES, MUTACIONES CATASTRALES, RECOPIACION DE PRUEBAS PARA PROCESOS DE PERTENENCIA.	0.08	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00		0.00		0.00		0.00		92.00		100.00	4.00	0.00
12.	REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL SANEAMIENTO URBANISTICO Y JURIDICO, Y AVALUOS COMERCIALES (RENTA Y COMPRA)	0.25	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.10
13.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ESTUDIOS, DISENOS Y LICENCIAMIENTOS PARA REFORZAR Y O RESTITUIR EQUIPAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA SDIS	4.41	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50		4.00		0.00		0.00		0.00		2.00		100.00	4.00	0.18
14.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CENTROS DE PROTECCION PARA POBLACION VULNERABLE	42.02	7.33	4.00	3.33	0.00	3.33	0.00	28.33	13.33	15.83	3.33	3.33</																

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7730 27 Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		-\$1	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR UN MODELO ITINERANTE E INTERSECTORIAL DISTITAL QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES A LA POBLACIÓN EN FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS	20.00	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	16.80	16.80	4.80	4.80	6.00	6.00	4.80		16.80		4.80		4.80		4.80		22.00		100.00	42.00	8.40
2.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER 16 ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA GENERAR MEDIOS DE VIDA, PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y DE FORTALECIMIENTO A LA POBLACIÓN EN FLUJOS MIGRATORIOS	20.00	2.40	2.40	2.40	2.40	16.40	2.40	2.40	2.40	2.40	16.40	22.00	22.00	2.40		2.40		22.00		2.40		2.40		20.40		100.00	48.00	9.60
3.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A PARTIR DE LA ESTABILIZACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN PROVENIENTE DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS QUE INCLUYAN EJERCICIOS DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN EN PERSPECTI	60.00	4.80	4.80	4.80	4.80	14.50	14.50	5.70	5.70	5.40	5.40	10.80	10.80	8.50		10.50		7.20		10.90		8.40		8.50		100.00	46.00	27.60
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.60	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7733 23 Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LAS ÁREAS PARA FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES Y EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES	5.00	0.00	0.00	15.00	15.00	50.00	50.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.	VERIFICAR CONDICIONES DE OPERACIÓN EN INSTITUCIONES OFICIALES Y PRIVADAS QUE OFRECEN SERVICIOS SOCIALES	35.00	2.50	0.00	5.00	0.00	7.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	7.50		2.50		10.00		0.00		0.00		40.00		100.00	40.00	14.00
3.	ATENCIÓN CIUDADANA QUE GARANTICE RESPUESTAS OPORTUNAS, EFICACES E INTEGRALES A LAS SOLICITUDES CIUDADANAS.	18.00	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	16.78	16.78	0.63	0.63	10.63	10.63	16.78		0.63		0.63		17.08		0.63		34.32		100.00	29.93	5.39
4.	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CONTROL POLÍTICO	10.00	5.85	5.85	5.85	5.85	13.35	13.35	5.85	5.85	5.85	5.85	13.35	13.35	5.85		5.85		13.35		5.85		5.85		13.15		100.00	50.10	5.01
5.	GARANTIZAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN, LA VERIFICACIÓN Y EL CONTROL DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PARA LOS SERVICIOS SOCIALES.	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		25.00		5.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	1.75
6.	REALIZAR ACCIONES QUE APORTEN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	15.50	5.50	5.50	3.50	3.50	23.50	23.50	8.00		3.50		3.50		5.50		3.50		28.00		100.00	48.00	5.28
7.	FORTALECER LA ARTICULACIÓN DE LAS INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	19.60	6.00	0.00	13.60	16.50	9.00	13.20		9.00		7.50		0.00		13.20		13.50		100.00	36.10	2.17
8.	VERIFICAR EL AVANCE DE LAS POLÍTICAS SOCIALES, QUE LIDERA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00	9.45	9.45	27.25	12.25	0.00		9.45		5.25		0.00		9.80		33.55		100.00	26.95	2.70

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 41.29

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE Y MAYOR CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN PUBLICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00		12.00		21.00		0.00		9.00		14.00		100.00	44.00	4.40
2.	RESPUESTAS ARTICULADAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES A LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO.	10.00	0.00	0.00	3.00	3.00	15.00	15.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		0.00		0.00		20.00		20.00		100.00	30.00	3.00
3.	DESARROLLAR UN PROCESO DE COMUNICACIÓN DIALOGANTE Y CERCANO QUE FACILITE INCORPORAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS ORGANIZACIONES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO DISTRITAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		25.00		35.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	4.00
4.	FORTALECER LOS PROCESOS TERRITORIALES EN SU SOSTENIBILIDAD PROGRAMÁTICA, COMUNITARIA Y FINANCIERA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00					20.00		30.00		0.00		100.00	50.00	5.00	
5.	GENERAR AGENDAS QUE ARTICULEN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE Y EL AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		70.00		100.00	30.00	3.00
6.	ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN PROBLEMÁTICAS SOCIALES COMUNES PARA LA BOGOTÁ - REGIÓN.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7.50	7.50	16.50	16.50	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00		0.00		12.50		16.50		12.50		17.00		100.00	41.50	4.15
7.	IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00		20.00		0.00		0.00		0.00		15.00		100.00	40.00	4.00
8.	GENERAR OFERTA, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y RESPUESTAS INTEGRALES DESDE LOS CDC, LA INSTITUCIONALIDAD Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS, PERTINENTES A LAS DEMANDAS DE LA BOGOTÁ REGIÓN.	10.00	5.81	0.00	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	20.81	20.81	5.81		5.81		5.88		5.88		5.88		20.88		100.00	44.05	4.41
9.	TRANSFORMAR LOS CDC FORTALECIÉNDOLOS EN SU DOTACIÓN, MEJORA Y ADECUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CIUDADANÍA ACTIVA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		12.00		0.00		0.00		0.00		41.00		100.00	47.00	4.70
10.	PRESTAR ASESORÍA TÉCNICA EN LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN SOCIAL A LOS FDL PARA GENERAR RESPUESTAS INTEGRALES Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, PERTINENTES A LAS NECESIDADES E INTERESES DE LOS TERRITORIOS	10.00	0.00	0.00	3.35	3.35	3.35	3.35	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70		6.70		6.70		39.70		6.70		6.70		100.00	26.80	2.68

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	39.34

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7740 38 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ARTICULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN	7.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.30		8.30		100.00	50.04	3.50
2.	DIVULGAR Y SOCIALIZAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD	9.00	0.00	0.00	9.00	6.88	14.00	10.03	9.00	8.07	9.00	15.61	9.00	11.21	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	51.80	4.66
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD A CARGO DE SDIS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
4.	ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE (1) PROGRAMA DE TELEVISIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS IDENTIDADES JUVENILES Y EL SER JOVEN.	5.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	50.04	2.50
5.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR MÓDULOS ADICIONALES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA DIFUSIÓN Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES	3.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	50.04	1.50
6.	DESARROLLAR PROGRAMAS RADIALES JUVENILES DIRIGIDOS AL RECONOCIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES Y EL SER JOVEN.	6.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	50.04	3.00
7.	FORMULAR E IMPLEMENTAR UN COMPONENTE TERRITORIAL Y VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN JOVEN.	3.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	50.04	1.50
8.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE OPORTUNIDADES JUVENILES POR MEDIO DE LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS.	10.00	8.34	5.63	8.34	24.51	8.34	0.37	8.34	12.86	8.34	1.31	8.34	10.88	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	55.56	5.56
9.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE OPORTUNIDADES JUVENILES.	10.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	50.04	5.00
10.	ATENDER AL 100% DE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	11.00	0.00	0.00	6.46	7.43	8.21	9.13	9.59	24.69	9.48	26.37	10.52	14.97	10.27		11.33		9.72		10.21		9.09		5.12		100.00	82.59	9.08
11.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EMPLEO E INCLUSIÓN PRODUCTIVA.	7.00	8.34	4.13	8.34	8.57	8.34	8.04	8.34	5.31	8.34	8.17	8.34	9.17	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.26		100.00	43.39	3.04
12.	TENER COBERTURA TERRITORIAL EN EL DISTRITO A TRAVÉS DE CASAS DE JUVENTUD, SEMANAS DE JUVENTUD, ESTRATEGIAS MÓVILES Y EQUIPOS TERRITORIALES, TANTO EN LAS ÁREAS URBANAS COMO RURALES.	7.00	3.50	0.00	6.30	0.00	13.80	15.84	6.30	8.09	6.30	8.92	13.80	17.55	6.30		6.30		13.80		6.30		6.30		11.00		100.00	50.40	3.53
13.	ATENDER CON ENFOQUE PEDAGÓGICO, RESTAURATIVO Y PROTECTOR A JÓVENES VINCULADOS AL SRPA, EN LOS CENTROS FORJAR BAJO LA SANCIÓN DE ASISTENCIA VIGILADA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD.	5.00	50.00	53.00	4.40	21.00	4.56	7.00	4.56	2.67	4.56	3.51	4.56	6.84	4.56		4.56		4.56		4.56		4.56		4.56		100.00	94.02	4.70
14.	INTEGRAR LOS JÓVENES VINCULADOS AL SRPA CON MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD A LOS SERVICIOS SOCIALES DE SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.65
15.	VINCULAR A JÓVENES EN LOS CURSOS DE FORMACION DEL SENA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	11.80	0.35
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		54.09	

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNOLÓGICA Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	21.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	10.50
2.	DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	12.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	6.00
3.	DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA APOYAR EL DESARROLLO EVOLUTIVO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	5.00
4.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SDIS	7.00	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17		4.17		16.67		4.17		4.17		16.63		100.00	50.02	3.50
5.	REALIZAR EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	3.00
6.	DESARROLLAR Y PROMOVER PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACORDE CON LOS SERVICIOS SOCIALES QUE PRESTA LA ENTIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
7.	APOYAR LA REALIZACION DE EVALUACIONES E INVESTIGACIONES EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
8.	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE FOCALIZACIÓN Y EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EGRESO, DE LOS SERVICIOS, MODALIDADES Y ESTRATEGIAS QUE PRESTA LA SECRETARÍA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00		0.00		37.50		0.00		0.00		37.50		100.00	25.00	0.75
9.	ASISTIR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GASTO PÚBLICO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	28.20	13.20	13.20	0.00	0.00	15.00	15.00	13.20		0.00		15.00		13.60		0.00		15.00		100.00	56.40	5.64
10.	ASISTIR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.50
11.	ASISTIR, ASESORAR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS ÁREAS EN LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS POLITICAS DEL GESTIÓN Y DESEMPEÑO Y DEL COMPONENTE AMBIENTAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
12.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO Y TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	100.00	1.00
13.	IMPLEMENTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES A TRAVÉS DE ACCIONES DE DIVULGACION DE INFORMACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	40.00	3.60
14.	FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMUNICACIONES 2022 DE LA ENTIDAD	6.00	0.00																										

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 49.23

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7744 34 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. LIDERAR LA ACTUALIZACIÓN, MOVILIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ (2022-2032)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	39.00	39.00	0.00	0.00	12.25	7.75	0.00		0.00		6.25		15.00		0.00		21.25		100.00	53.00	3.18
2. FORTALECER LOS 20 CONSEJOS CONSULTIVOS LOCALES Y CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE	3.00	0.00	0.00	2.13	2.13	12.30	12.30	11.55	11.55	7.30	7.30	4.80	4.80	6.05		8.30		9.80		11.05		18.30		8.42		100.00	38.08	1.14
3. FORTALECER LOS ENTORNOS HOGAR, EDUCATIVO, COMUNITARIO Y ESPACIO PÚBLICO, COMO PROTECTORES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	3.00	0.00	0.00	16.50	5.75	8.75	2.95	19.00	0.00	2.00	25.55	6.75	6.75	6.00		3.00		7.75		5.00		12.50		12.75		100.00	41.00	1.23
4. FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO Y EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS CONSEJOS TUTELARES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		10.00		0.00		0.00		15.00		30.00		100.00	45.00	0.45
5. FORTALECER A LAS Y LOS AGENTES EDUCATIVOS DE LA PRIMERA INFANCIA EN CUIDADO SENSIBLE Y CALIFICADO PARA UNA ATENCIÓN CON CALIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.98
6. REALIZAR FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA TÉCNICA DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS	6.00	0.00	0.00	8.75	8.75	3.40	3.40	8.40	3.40	13.40	13.40	7.25	12.25	19.40		6.00		1.00		1.00		9.40		22.00		100.00	41.20	2.47
7. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL A LAS NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CRECIENDO JUNTOS	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	30.00	30.00	3.00	3.00	5.00	5.00	13.00	13.00	5.00		5.00		13.00		5.00		5.00		14.00		100.00	53.00	3.18
8. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS PERTINENTES, ADECUADOS Y OPORTUNOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DEL LAS MODALIDADES DE JARDINES	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	11.00	11.00	11.00	1.00	1.00	21.00	21.00	1.00		11.00		11.00		11.00		1.00		21.00		100.00	44.00	2.64
9. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS PERTINENTES, ADECUADOS Y OPORTUNOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DE LAS MODALIDADES JARDIN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.98
10. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS PERTINENTES, ADECUADOS Y A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DE LAS MODALIDADES JARDINES INFANTILES - SOCIALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.98
11. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL A LAS NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CRECEMOS EN LA RURALIDAD	6.00	0.00	0.00	3.50	3.50	14.25	14.25	6.00	6.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00		15.50		7.00		7.00		18.25		6.50		100.00	38.75	2.33
12. IMPLEMENTAR Y FLEXIBILIZAR LA ESTRATEGIA DE SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE,	6.00	0.00	0.00	2.75	2.75	6.25	6.25	0.00	0.00	2.75	2.75	6.25	6.25	0.00		0.00		35.38		0.00		0.00		46.62		100.00	18.00	1.08
13. TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	3.00	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	3.30	14.52	3.30	3.30	3.30	20.98	20.98	3.30		3.30		14.52		3.30		3.30		26.88		100.00	34.18	1.03
14. FORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS CON DISCAPACIDAD, ALTERACIONES EN EL DESARROLLO Y RESTRICCIONES MEDICAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD	3.00	0.00	0.00	5.76	5.76	5.76	5.76	19.86	19.86	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76		19.46		5.76		5.76		17.96		2.40		100.00	42.90	1.29
15. FORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES A GRUPOS	3.00	1.70	1.70	8.53	8.53	5.83	5.83	12.83	12.83	8.23	8.23	8.33	8.33	8.03		15.23		5.83		5.83		14.23		5.40		100.00	45.45	1.36

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7744 34 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
ÉTNICOS, GARANTIZANDO QUE SEAN INCLUYENTES PARA EL GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS																														
16. FORTALECER LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS POR EL CONFLICTO ARMADO	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	14.00	14.00	6.00	6.00	14.00	14.00	6.00		14.00		6.00		6.00		22.00		0.00		100.00	46.00	1.38		
17. FORTALECER, ARTICULAR Y MOVILIZAR LA GESTIÓN DISTRITAL Y LOCAL PARA LA VALORACIÓN DE LAS ATENCIONES DEFINIDAS EN LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	26.00	26.00	6.00		6.00		26.00		6.00		6.00		6.00		100.00	44.00	1.32		
18. FORTALECER LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO EFECTIVO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DEL SSNN,	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		16.67		0.00		0.00		41.66		0.00		100.00	16.67	0.50		
19. ATENDER MEDIANTE PROCESOS FLEXIBLES Y DIFERENCIALES A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL	2.00	0.00	0.00	8.10	8.70	8.10	8.10	0.60	0.60	0.60	0.60	17.40	17.40	0.60		15.60		0.60		0.60		30.60		17.20		100.00	35.40	0.71		
20. ATENDER MEDIANTE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES Y FLEXIBLES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE POBLACIÓN MIGRANTE,	2.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	30.45	30.45	19.05		1.05		1.05		13.05		1.05		30.10		100.00	34.65	0.69		
21. IMPLEMENTAR EL CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA APOYO PSICOLÓGICO Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, PEDAGÓGICO Y LÚDICO;	2.00	25.00	25.00	10.00	0.00	12.50	10.00	10.00	7.50	7.50	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		6.25		6.25		6.25		6.25		100.00	42.50	0.85		
22. IMPLEMENTAR EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO, ESPACIOS DE MODALIDAD FLEXIBLE DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,	2.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	2.10	2.10	21.00	21.00	2.10		20.10		2.10		2.10		14.10		30.10		100.00	27.30	0.55		
23. ACOMPAÑAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA, GENERACIÓN DE CAPACIDADES Y REALIZACIÓN DE SUS PROYECTOS DE VIDA,	2.00	2.50	2.50	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	12.50	0.00	15.00	0.00	7.50		7.50		6.25		6.25		6.25		6.25		100.00	12.50	0.25		
24. CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y	11.00	0.00	0.00	10.83	10.83	5.31	5.31	13.00	9.00	11.60	15.60	9.00	9.00	5.75		5.75		11.35		11.35		11.35		4.71		100.00	49.74	5.47		
Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												39.03

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7745 23 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORAR LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00		70.00		7.50		0.00		0.00		7.50		100.00	15.00	0.15
2. REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS QUE CONTRIBUYAN AL ACCESO Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	5.83	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	47.48	4.75
3. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS.	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	0.50
4. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS.	2.00	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	1.00
5. REALIZAR LA ENTREGA DE RACIONES DE COMIDA CALIENTE EN UNIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS	8.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	4.00
6. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS	3.00	4.17	4.17	11.77	11.77	9.07	9.07	11.77	11.77	4.17	4.17	9.07	9.07	11.77		11.77		9.07		4.17		4.17		9.03		100.00	50.02	1.50
7. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA PARA LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	5.00	6.66	6.66	6.66	6.66	16.66	16.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66		16.66		6.66		6.66		6.66		6.74		100.00	49.96	2.50
8. REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	6.68	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	48.33	4.83
9. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	5.00	2.80	2.80	9.05	9.05	13.05	13.05	9.05	9.05	2.85	2.85	13.10	13.10	9.10		9.10		13.10		2.85		2.85		13.10		100.00	49.90	2.50
10. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA, LOGÍSTICA, EL SEGUIMIENTO Y CONTRACTUAL Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS HUMANITARIOS PARA ATENDER NECESIDADES POBLACIONALES Y TERRITORIALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL A LA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS HUMANITARIOS PARA ATENDER NECESIDADES POBLACIONALES Y TERRITORIALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR LA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS HUMANITARIOS PARA ATENDER NECESIDADES TERRITORIALES	4.00	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	10.12	0.00	10.12		10.12		10.12		10.12		10.12		10.13		100.00	29.15	1.17
13. REALIZAR LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA ATENDER EMERGENCIAS SOCIALES	4.00	5.60	5.60	5.60	5.60	13.60	13.60	5.60	5.60	5.70	5.70	13.70	13.70	5.70		5.70		13.70		5.70		5.70		13.70		100.00	49.80	1.99
14. ENTREGAR EL 100% DE AYUDAS HUMANITARIAS DIRIGIDAS A ATENDER EMERGENCIAS SOCIALES	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.50
15. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA NUTRICIONAL REGULAR EN LOS DIFERENTES SERVICIO SOCIALES	10.00	2.75	1.50	5.25	4.00	16.50	16.50	7.25	7.25	2.75	2.75	15.50	15.50	2.75		5.25		16.50		7.25		2.75		15.50		100.00	47.50	4.75
16. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ORIENTACIONES EN PROMOCIÓN	10.00	2.08	2.08	2.08	2.08	8.33	8.33	8.33	8.33	2.08	2.08	20.83	20.83	8.33		2.08		8.33		8.33		2.10		27.10		100.00	43.73	4.37

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7745 23 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE																															
17. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	9.00	5.42	5.42	5.42	5.42	7.92	7.92	5.42	5.42	5.42	5.42	20.42	20.42	5.42		5.42		7.92		5.42		5.42		20.38		100.00	50.02	4.50			
18. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE AGRICULTURA URBANA ORGANICA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00		15.00		7.50		0.00		0.00		20.00		100.00	57.50	1.15			
19. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.	2.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50		0.00		0.00		12.50		50.00		0.00		100.00	25.00	0.50			
20. DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y SALUD BASADA EN "1000 DÍAS DE OPORTUNIDADES PARA LA VIDA¿	5.00	1.50	1.50	1.50	1.50	9.00	9.00	7.50	7.50	21.50	21.50	9.00	9.00	1.50		1.50		9.00		7.50		21.50		9.00		100.00	50.00	2.50			
21. REALIZAR LA ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "1000 DÍAS DE OPORTUNIDADES PARA LA VIDA¿	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.00			
22. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "1000 DÍAS DE OPORTUNIDADES PARA LA VIDA¿	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.16	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7748 17 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
2.	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, LAVANDERÍA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
3.	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y/O USUARIOS, EN EL AMBITO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
4.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O EMERGENCIAS O ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL SOPOR	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
5.	REALIZAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA CON AUSTERIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS ORIGINADAS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.25
6.	PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON EFICIENCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
7.	ATENDER LAS NECESIDADES EN MATERIA DE CAJA MENOR DE LAS LOCALIDADES Y SUS UNIDADES OPERATIVAS.	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.45
8.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRTATIVAS	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
9.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE APOYO PRESTADOS.	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.35
10.	ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.90
11.	RECEPCIONAR Y DISTRIBUIR LAS COMUNICACIONES OFICIALES E INTERNAS	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.45
12.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	9.00	8.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.90
13.	GARANTIZAR EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS PROPIAS Y ACTIVAS DE LA SDIS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
14.	REALIZAR LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL A LAS UNIDADES	2.00																									100.00	21.76	0.44

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7748 17 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
OPERATIVAS ACTIVAS DE LA SDIS, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES DE LAS UNIDADE		0.00	0.00	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.08	4.08	37.08		4.08		4.08		0.00		0.00		33.00				
15. DISPONER DE LOS SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES, COMPETENTES E IDONEOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	1.44
16. PRESTAR LA ASESORÍA ESPECIALIZADA A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES EN EL ÁMBITO JURÍDICO, CONTRACTUAL Y TÉCNICO, ENTRE OTROS, REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	0.96
17. DISPONER DE LOS SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES, COMPETENTES E IDONEOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	1.44
18. FINANCIAR LOS EMPLEOS REQUERIDOS EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA SDIS GARANTIZANDO EL PAGO DE LOS FACTORES SALARIALES Y PRESTACIONALES, Y DE LOS APORTES PATRONALES Y PARAFISACALES	19.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	50.00	9.50
19. IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO INSTITUCIONAL QUE PERMITA AJUSTAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL, ASÍ COMO LA CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO EXISTENTE	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	1.92
20. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SDIS	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	3.36
21. IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS INSTITUCIONALES	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
22. REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y EL FORTALEICMIENTO DE LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
23. FORMULAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO DE LA SDIS	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																						45.61		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7749 29 Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TERRITORIOS CUIDADORES	10.00	7.30	7.30	3.30	3.30	8.40	8.40	3.30	3.30	15.30	15.30	8.40	8.40	3.30		15.30		8.40		3.30		15.30		8.40		100.00	46.00	4.60
2.	IMPLEMENTACIÓN DE LAS LECTURAS SOCIALES MEDIANTE DIÁLOGOS SOCIALES TERRITORIALES QUE ORIENTEN LAS RESPUESTAS A SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL, ANTRÓPICA Y DE VULNERABILIDAD INMINENTE EN	20.00	2.10	2.10	2.10	2.10	15.80	15.80	3.50	3.50	3.50	3.50	17.00	17.00	3.50		3.50		21.00		3.50		3.50		21.00		100.00	44.00	8.80
3.	DISEÑAR SERVICIOS INNOVADORES QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES VITALES DE LOS HOGARES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19, SOCIAL, NATURAL, ANTRÓPICA Y DE VULNERABILIDAD INM	30.00	7.60	7.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.00	6.00	6.80	6.80	8.00	8.00	13.20		11.20		8.80		9.20		7.60		8.00		100.00	42.00	12.60
4.	REALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	20.00	4.80	4.80	4.80	4.80	14.00	14.00	6.00	6.00	4.80	4.80	14.40	14.40	4.80		6.00		14.00		4.80		4.80		16.80		100.00	48.80	9.76
5.	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS DE CUIDADO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN TERRITORIOS	20.00	2.50	2.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.50	7.50	2.50	2.50	6.25		6.25		10.00		7.50		7.50		35.00		100.00	27.50	5.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										41.26

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7752 35 Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS PROTEGER FUNDAMENTADO EN LAS DIRECTRICES DEL CUIDADO ALTERNATIVO	8.00	0.00	0.00	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	12.20	12.20	7.20		7.20		10.20		7.20		7.20		12.00		100.00	49.00	3.92
2.	ATENDER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CENTROS PROTEGER	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
3.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS PROTEGER FUNDAMENTADO EN LAS DIRECTRICES DEL CUIDADO ALTERNATIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		16.50		16.50		17.00		100.00	0.00	0.00
4.	ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA PPPF, DE CONFORMIDAD CON EL CONPES DISTRITAL EN LA SDP	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
5.	EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ OPERATIVO DISTRITAL PARA LAS FAMILIAS,	12.00	0.00	0.00	6.40	6.40	15.00	15.00	6.40	6.40	0.00	0.00	21.80	21.80	0.00		6.80		15.00		6.80		0.00		21.80		100.00	49.60	5.95
6.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS.	10.00	4.80	4.80	4.80	4.80	14.80	14.80	4.80	4.80	4.80	4.80	14.80	14.80	4.80		4.80		15.40		5.40		5.40		15.40		100.00	48.80	4.88
7.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS (MAIF) O ALGUNOS DE SUS ELEMENTOS, EN OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SDIS QUE PRESTAN SERVICIOS.	8.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.50	6.50	6.50	6.50	25.00	25.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	50.00	4.00
8.	FORMULAR EL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN ARTICULACIÓN INTRA, INTER Y TRANSECTORIAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
9.	IMPLEMENTAR EL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN ARTICULACIÓN INTRA, INTER Y TRANSECTORIAL	12.00	0.00	0.00	0.27	3.00	12.69	14.69	3.28	5.65	5.94	4.89	17.47	17.63	4.40		3.58		17.31		4.12		4.94		26.00		100.00	45.86	5.50
10.	MONITORERAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 48.66

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

Programa General : 08 Prevención y atención de maternidad temprana

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. DEFINIR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN ENFOCADAS EN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA MTERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRENA, EL EMBARAZO EN NIÑ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	38.00	38.00	0.00	0.00	5.20	5.20	8.00		0.00		0.00		35.60		8.00		0.00		100.00	48.40	4.84
2. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN ENFOCADAS EN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA	25.00	0.00	0.00	10.00	5.11	10.00	13.99	10.00	11.67	10.00	16.02	10.00	11.60	3.00		3.00		17.00		17.00		10.00		0.00		100.00	58.39	14.60
3. DEFINIR E IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AGENTES DE CAMBIO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA,	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	24.00	24.00	6.00	6.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		28.00		20.00		8.00		100.00	42.00	4.20
4. SENSIBILIZAR Y/O INFORMAR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS EN DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANAS	15.00	8.00	0.90	8.00	2.42	8.00	23.68	8.00	6.56	8.00	41.68	8.00	9.14	0.00		0.00		16.00		8.00		8.00		20.00		100.00	84.38	12.66
5. DISEÑAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y ALIANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.	5.00	1.50	1.50	1.50	1.50	28.00	28.00	6.00	6.00	1.50	1.50	27.50	27.50	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		14.00		100.00	66.00	3.30
6. IMPLEMENTAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y ALIANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.	10.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		9.00		55.00		100.00	36.00	3.60
7. DISEÑAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA Y EL EMBARAZO EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS.	10.00		0.00	14.50	14.50	0.00	0.00	14.50	14.50	10.00	10.00	14.50	14.50	0.00		8.50		6.00		18.50		6.00		7.50		100.00	53.50	5.35
8. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA Y EL EMBARAZO EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	50.00	7.50

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 56.04

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7756 24 Compromiso social por la diversidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MODELO DE INCLUSIÓN SOCIAL TENIENDO EN CUENTA LA ESTRATEGIA DE INCLUSIN INDIVIDUAL, PROCESOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	5.00	0.00	0.00	21.00	21.00	30.00	30.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	24.00	24.00	0.00		6.67		6.67		6.66		0.00		0.00		100.00	80.00	1.60
3.	ENTREGAR TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A 6.864 PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI IDENTIFICADAS, PARA SU SOSTENIBILIDAD EN PROCESOS DE DESARROLLO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA APOYA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58	15.58	11.83	11.83	11.83	11.83	15.58	15.58	11.83		11.85		7.25		3.50		3.50		7.25		100.00	54.82	10.96
4.	ACOMPAÑAR A 680 PERSONAS TRANSGÉNERO IDENTIFICADAS, PARA LOS TRÁMITES DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD CONFORME A SUS CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS Y QUE APORTEN A LA DISMINUCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	14.00	14.00	21.50	21.50	14.00		14.00		21.50		0.00		0.00		7.50		100.00	43.00	4.30
5.	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRASNSVERSALIZACIÓN DE LA PPLGBTI DESDE EL SECTOR SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	14.17	6.67	16.66	16.66	0.00	0.00	17.50		0.00		10.00		7.50		10.00		7.50		100.00	40.00	4.00
6.	REALIZAR ACCIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECONOCIENDO LAS INTERSECCIONALIDADES DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI	3.00	0.00	0.00	7.50	7.50	17.50	17.50	0.00	0.00	7.50	7.50	17.50	17.50	0.00		7.50		17.50		0.00		7.50		17.50		100.00	50.00	1.50
7.	PONER EN MARCHA UN CENTRO COMUNITARIO MULTICOLOR PARA PERSONAS LGBTI	10.00	3.33	3.33	3.33	3.33	18.33	18.33	3.33	3.33	3.33	3.33	18.33	18.33	3.33		3.33		18.33		3.33		3.33		18.37		100.00	49.98	5.00
8.	PONER EN MARCHA UN CENTRO COMUNITARIO "AÑOS DORADOS" PARA PERSONAS LGBTI	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	16.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		100.00	76.00	7.60
9.	VINCULAR AL 100% DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SUBDIRECIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, DESDE SUS UNIDADES OPERATIVAS.	20.00	8.48	8.48	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	50.08	10.02
10.	REFERENCIAR AL 100% DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS Y OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	10.00	7.93	7.93	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37		8.37		8.37		8.37		8.37		8.37		100.00	49.78	4.98
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										54.96

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7757 20 Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE HABITAR LA CALLE QUE INCLUYA ACCIONES AFIRMATIVAS Y PEDAGÓGICAS VINCULANDO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	20.00	3.48	3.48	3.32	3.32	3.32	3.32	13.52	13.52	3.32	3.32	18.32	18.32	3.32		13.22		3.32		3.32		3.32		28.22		100.00	45.28	9.06
2.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIA DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE QUE INCENTIVE LOS DIALOGOS COMUNITARIOS Y VEEDURIAS CIUDADANAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE REDES Y LA TRANSFORM	15.00	5.22	5.22	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	24.98	24.98	4.98		4.98		4.98		4.98		4.98		24.98		100.00	50.12	7.52
3.	DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MÓVIL DE ABORDAJE EN CALLE QUE ACERQUE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS CIUDADANAS Y CIUDADANOS HABITANTES DE CALLE EN TODAS LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD PARA LA MITIGACIÓN	25.00	3.48	3.48	3.32	3.32	3.32	3.32	13.52	13.52	3.32	3.32	18.32	18.32	3.32		13.22		3.32		3.32		3.32		28.22		100.00	45.28	11.32
4.	ATENDER DE MANERA INTEGRAL EN SERVICIOS INSTITUCIONALES A LAS Y LOS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN RIESGO Y HABITANTES DE CALLE PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL FENÓMENO.	20.00	2.61	2.61	2.49	2.49	2.49	2.49	16.09	16.09	2.49	2.49	17.49	17.49	2.49		15.69		2.49		2.49		2.49		30.69		100.00	43.66	8.73
5.	DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PARTIR DE LOS INSTRUMENTOS CONSTRUIDOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL PARA LA HABITABILIDAD EN CALLE QUE CONTRIBUY	20.00	3.05	3.05	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	35.41	35.41	2.91		2.91		2.91		2.91		2.91		35.35		100.00	50.10	10.02
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									46.65	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7768 32 Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	RECONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS DE LOS TERRITORIOS CON POBREZAS, SEGREGACIÓN SOCIO ESPACIAL Y ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA DE LA SDIS	10.00	0.00	0.00	2.00	2.00	17.00	17.00	4.00	4.00	4.00	4.00	19.00	19.00	4.00		4.00		19.00		4.00		4.00		19.00		100.00	46.00	4.60
2.	IDENTIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A HOGARES CON POBREZA HISTÓRICA Y EMERGENTE EN BOGOTÁ.	30.00	0.00	0.00	12.50	12.50	7.50	7.50	7.50	7.50	20.00	20.00	7.50	7.50	7.50		20.00		0.00		5.00		0.00		12.50		100.00	55.00	16.50
3.	MONITOREAR EN LOS HOGARES ACOMPAÑADOS POR LA ESTRATEGIA EN SU LOGROS, AVANCES Y DIFICULTADES DEL PLAN "CONTRATO SOCIAL FAMILIAR PARA LA MOVILIDAD SOCIAL."	20.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	26.00	26.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		26.00		100.00	44.00	8.80
4.	APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE PERSONAS ADULTAS Y SUS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA OCULTA	40.00	0.00	0.00	12.00	12.00	8.00	8.00	9.00	9.00	6.00	6.00	12.00	12.00	8.00		12.00		8.00		12.00		8.00		5.00		100.00	47.00	18.80
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										48.70

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA LA DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA ENTREGA DE LOS APOYOS ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	5.00
2.	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYOS ECONÓMICOS	9.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	4.50
3.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL LINEAMIENTO TÉCNICO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL CENTRO DÍA	9.00	5.84	5.84	10.84	10.84	5.84	5.84	10.84	10.84	5.84	5.84	10.84	10.84	5.84		10.84		5.82		10.82		5.82		10.82		100.00	50.04	4.50
4.	IMPLEMENTAR EL SERVICIO SOCIAL CENTRO DÍA CON LOS ENFOQUES DE DERECHOS, TERRITORIAL, POBLACIONAL, GÉNERO, DESARROLLO HUMANO, DIFERENCIAL, PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA.	9.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	50.04	4.50
5.	IMPLEMENTAR SERVICIOS SOCIALES CON ENFOQUES DE DERECHOS, TERRITORIAL, POBLACIONAL, GÉNERO, DESARROLLO HUMANO, DIFERENCIAL, PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA.	9.00	0.00	0.00	18.66	18.66	12.00	12.00	18.66	18.66	12.00	12.00	18.66	18.66	0.00		6.66		0.00		6.66		0.00		6.70		100.00	79.98	7.20
6.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	9.00	4.98	4.98	6.36	6.36	11.34	11.34	6.36	6.36	11.37	11.37	6.36	6.36	11.37		6.36		11.37		6.36		11.37		6.40		100.00	46.77	4.21
7.	IMPLEMENTAR SERVICIOS SOCIALES CON ENFOQUESDERECHOS, TERRITORIAL, POBLACIONAL, GÉNERO, DESARROLLO HUMANO, DIFERENCIAL, PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA.	9.00	15.00	15.00	21.66	21.66	15.00	15.00	21.66	21.66	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00		6.66		0.00		6.66		0.00		6.70		100.00	79.98	7.20
8.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	9.00	8.30	8.30	4.55	4.55	12.85	12.85	4.55	4.55	12.90	12.90	4.55	4.55	12.90		4.55		12.90		4.55		12.90		4.50		100.00	47.70	4.29
9.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE REDES DE CUIDADO COMUNITARIO EN VEINTE (20) LOCALIDADES DE LA CIUDAD	9.00	6.80	6.80	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	10.71	10.71	8.16		8.16		8.16		10.71		7.57		7.09		100.00	50.15	4.51
10.	IMPLEMENTAREL SERVICIO DE APOYO JURÍDICO Y PSICOSOCIAL (BOGOTÁ TE ACOMPAÑA EN LA VEJEZ) PARA LA PREVENCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS MAYORES EN RIESGO O VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO	4.00	6.66	6.66	10.00	10.00	6.66	6.66	10.00	10.00	6.66	6.66	10.00	10.00	6.66		10.00		6.66		10.00		6.66		10.04		100.00	49.98	2.00
11.	TRANSVERSALIZAR LA PPSEV A NIVEL INTERSECTORIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	4.00	4.66	4.66	4.66	4.66	9.66	9.66	8.66	8.66	4.66	4.66	15.66	15.66	4.66		8.66		9.66		4.66		4.66		19.74		100.00	47.96	1.92
12.	FORTALECER LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA PPSEV	4.00	6.40	6.40	9.07	9.07	8.00	8.00	10.67	10.67	8.00	8.00	13.47	13.47	8.80		11.47		8.80		5.87		3.20		6.25		100.00	55.61	2.22
13.	GENERAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DE LA PPSEV.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78		7.78		7.78		7.78		7.78		7.76		100.00	53.34	3.20

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	55.26

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7771 20 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE TERRITORIAL (MÓVIL), DIFERENCIAL Y DE GÉNERO, PARA CUIDADORES Y CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12.00	2.56	2.56	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.80	12.80	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.64		100.00	47.36	5.68
2.	ENTREGAR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS A CUIDADORES-AS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PROCESOS ARTICULADOS DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES TÉCNICAS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
3.	DESARROLLAR ACCIONES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES DE RESPIRO EN CUIDADORES-AS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.00	4.80	4.80	4.80	4.80	10.60	10.60	5.60	5.60	6.40	6.40	11.40	11.40	7.20		7.20		13.00		8.00		8.00		13.00		100.00	43.60	2.18
4.	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS, CUIDADORES- AS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN	21.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	10.08
5.	PROMOVER ACCIONES TRANSECTORIAL Y CONCERTADAS CON DIFERENTES SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, QUE LE PERMITA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y CUIDADORES-AS EL GOCE PLENO DE SUS DERECHOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
6.	ADELANTAR EL REGISTRO DE CUIDADORAS Y CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE BOGOTÁ	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
7.	BRINDAR ATENCIÓN MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LA INCLUSIÓN SOCIAL EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES-AS Y SUS FAMILIAS	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	2.40
8.	IDENTIFICAR LOS ENTORNOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS EN EL TERRITORIO Y CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS, CUIDADORES - AS PARA ACCEDER A ESTOS	5.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00	17.00	17.00	17.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
9.	DESARROLLAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN TRANSECTORIAL EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACI	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	4.00
10.	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS Y CUIDADORES-AS	6.00	3.50	1.00	3.50	3.50	3.50	3.50	6.62	6.62	7.41	7.41	7.90	7.90	10.66		13.31		13.31		10.36		12.33		7.60		100.00	29.93	1.80
11.	DISEÑAR Y DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA REFORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD PARA EL DISTRITO CAPITAL Y SU INTERSECCIONALIDAD CON OTRAS	8.00	0.00	0.00	2.50	2.50	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	25.00	5.00		5.00		10.00		5.00		5.00		22.50		100.00	47.50	3.80
12.	DESARROLLAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN TRANSECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACIÓN	7.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	38.00	38.00	3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		35.00		100.00	50.00	3.50
13.	PROMOVER ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE	6.00																								100.00	47.95	2.88	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social


7771 20 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
COMPETENCIAS ORIENTADAS A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES-AS		0.00	0.00	2.96	2.96	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	31.76	31.76	4.41		4.41		4.41		4.41		4.41		30.00				
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								47.32

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Proyecto de inversión

7567 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

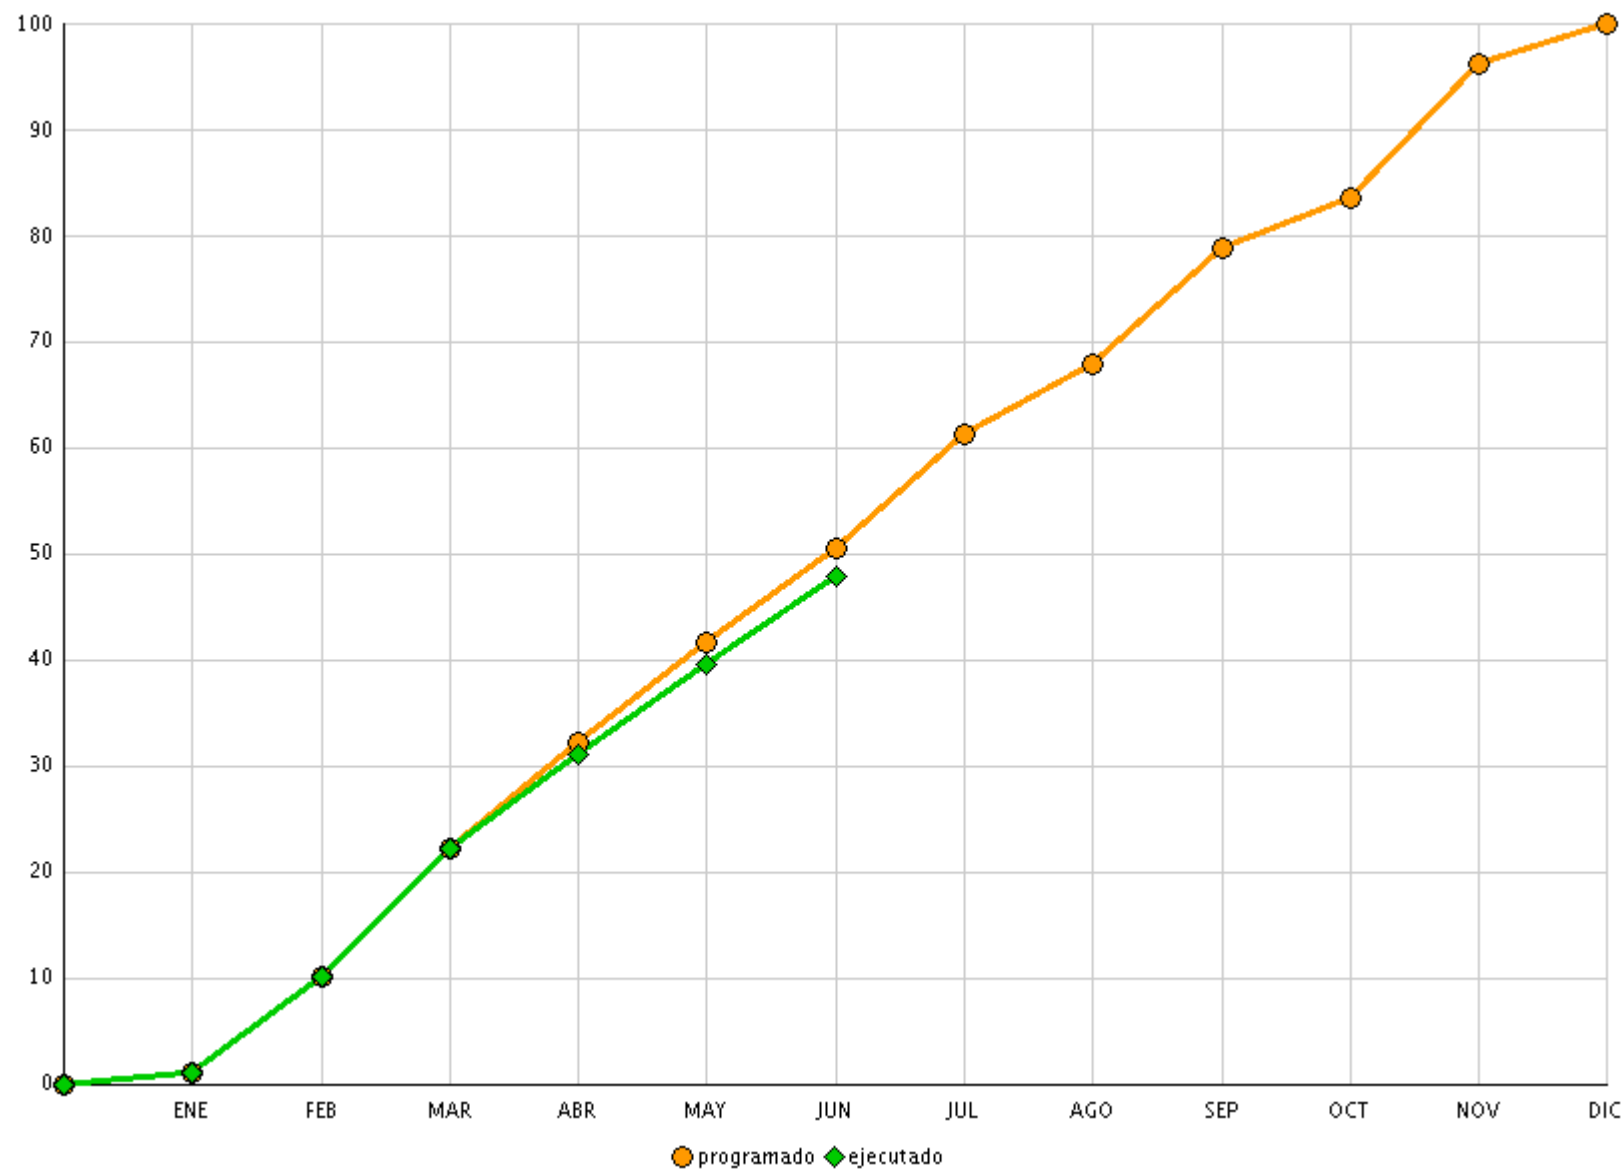


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.09	10.11	22.33	32.20	41.62	50.48	61.40	67.85	78.95	83.66	96.15	100.00
Ejecutado	1.10	10.09	22.27	31.20	39.58	47.92						

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Proyecto de inversión

7670 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

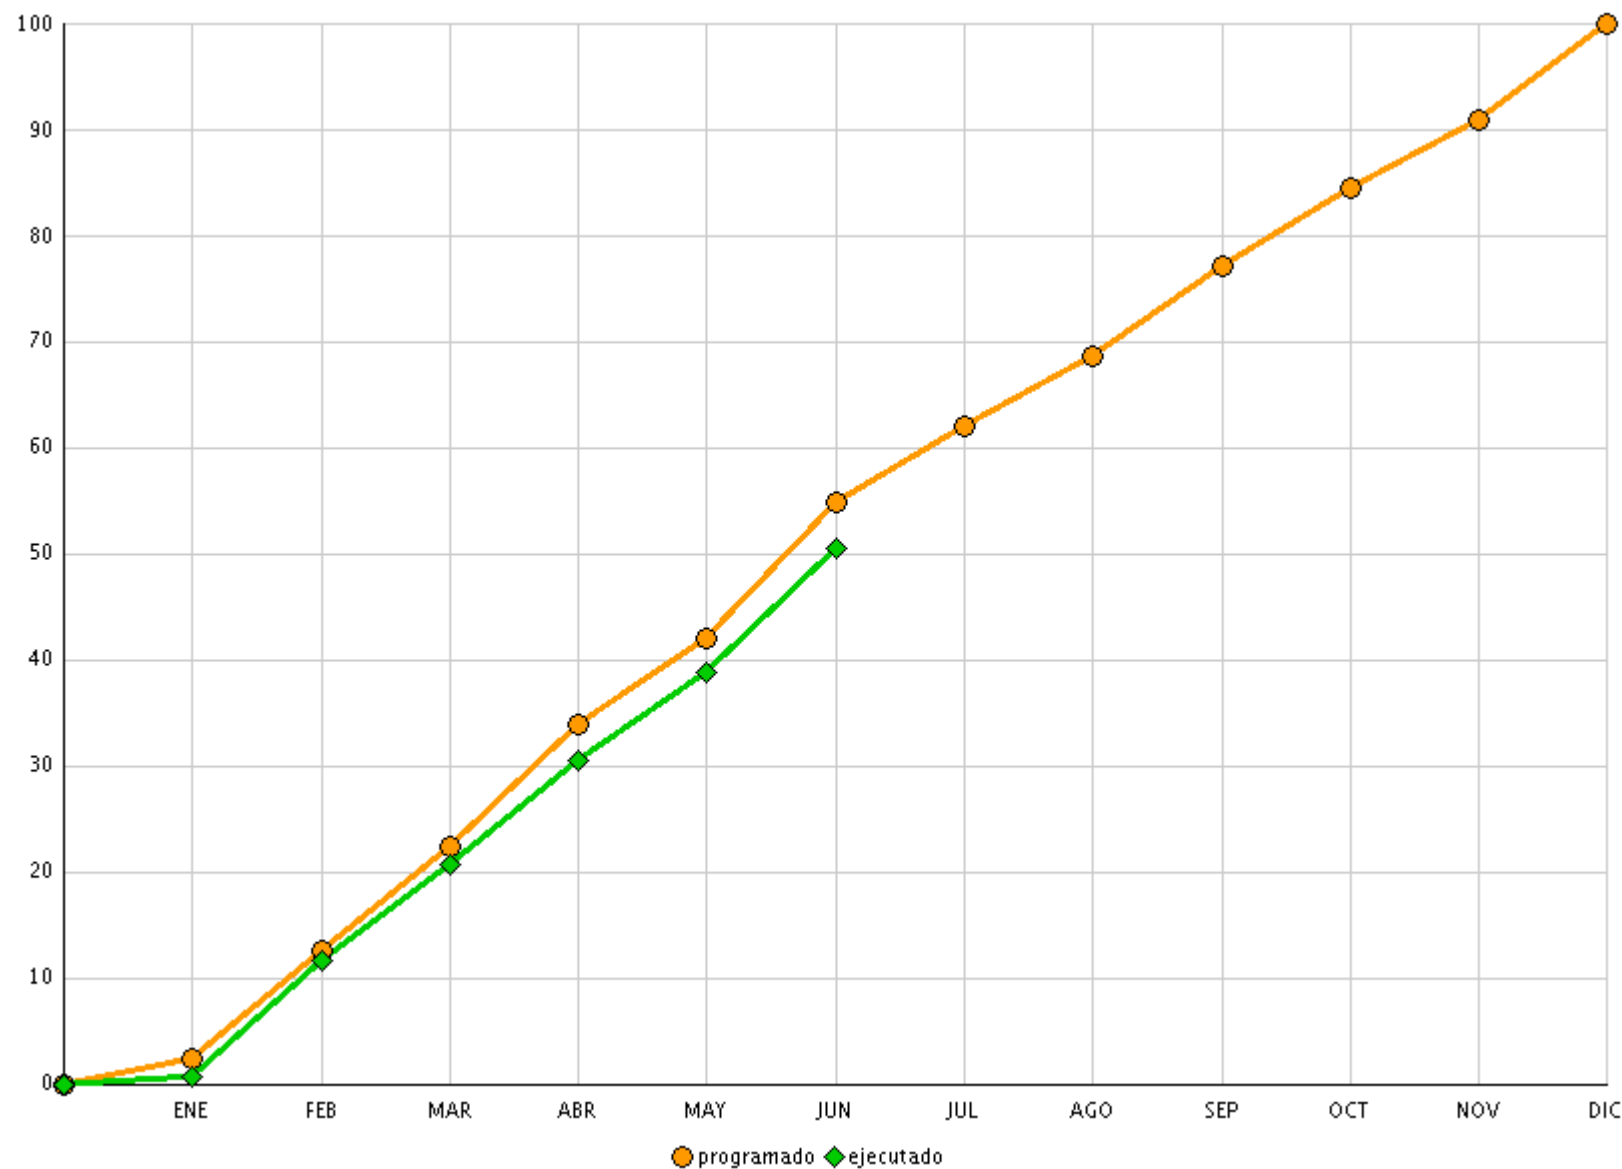

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.50	12.68	22.46	34.05	42.03	54.90	62.12	68.66	77.12	84.56	90.95	100.00
Ejecutado	0.74	11.68	20.72	30.64	38.90	50.51						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
7567 35 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	RACIONALIZAR 16 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD.	0.00																											
1.1	EJECUTAR EL CRONOGRAMA PAI "RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL DASCD"	11.00	0.00	0.00	10.00	10.00	7.00	7.00	1.00	1.00	8.00	8.00	1.00	1.00	8.00		0.00		8.00		0.00		57.00		0.00		100.00	27.00	2.97
2.	EJECUTAR Y HACER 4 SEGUIMIENTOS ANUALES A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS.	0.00																											
2.1	EJECUTAR EL CRONOGRAMA PAI "SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MIPG"	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	26.00	26.00	1.00	2.00	2.00	1.25	20.00	19.75	17.00		1.00		6.00		1.00		9.00		7.00		100.00	59.00	2.36
2.2	EJECUTAR EL CRONOGRAMA PAI " PIGA" EN EL DASCD	3.00	5.00	4.50	9.00	7.82	10.00	9.95	10.00	10.07	8.00	9.16	9.00	9.12	5.00		14.00		7.00		7.00		10.00		6.00		100.00	50.62	1.52
2.3	EJECUTAR EL CRONOGRAMA PAI "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	4.00	4.00	3.77	6.00	5.94	11.00	10.95	15.00	13.31	11.00	11.45	8.00	8.51	8.00		7.00		12.00		6.00		6.00		6.00		100.00	53.93	2.16
3.	ADELANTAR 2 ACCIONES ANUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00																											
3.1	EJECUTAR EL CRONOGRAMA PAI "ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL DASCD"	4.00	0.00	0.00	7.00	6.67	12.00	11.61	12.00	11.62	10.00	10.05	5.00	4.95	17.00		12.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	44.90	1.80
3.2	EJECUTAR EL CRONOGRAMA PAI "PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR"	8.00	7.00	7.00	3.00	2.65	9.00	8.50	8.00	7.28	7.00	7.77	7.00	6.77	5.00		7.00		17.00		6.00		6.00		18.00		100.00	39.97	3.20
4.	IMPLEMENTAR 1 MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA INCORPORANDO EL ENFOQUE POBLACIONAL, DIFERENCIAL.	0.00																											
4.1	EJECUTAR EL CRONOGRAMA PAI "RELACIONAMIENTO CIUDADANO"	11.00	2.00	2.31	0.00	0.45	25.00	24.95	8.00	7.25	9.00	10.03	8.00	8.45	0.00		4.00		23.00		2.00		12.00		7.00		100.00	53.44	5.88
5.	DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA EN EL DASCD.	0.00																											
5.1	EJECUTAR EL CRONOGRAMA PAI "PLAN DE COMUNICACIONES"	11.00	0.00	0.00	9.00	8.57	12.00	12.22	9.00	9.17	8.00	8.32	9.00	8.92	9.00		9.00		9.00		11.00		11.00		4.00		100.00	47.20	5.19
6.	REALIZAR 3 ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES PARA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0.00																											
6.1	EJECUTAR EL CRONOGRAMA PAI "IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SIGA PARA EL DASCD"	11.00	0.00	0.00	35.00	35.45	10.00	9.95	22.00	22.45	6.00	5.95	10.00	9.95	12.00		0.45		2.00		0.00		0.00		2.55		100.00	83.75	9.21
7.	OPTIMIZAR 8 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	0.00																											
7.1	EJECUTAR EL CRONOGRAMA PAI "OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD"	11.00	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00	25.00	17.00	10.00	13.00	3.00	10.00	10.00	9.00		8.00		8.00		0.00		0.00		0.00		100.00	58.00	6.38
8.	REALIZAR LAS MEJORAS LOCATIVAS A 2 SEDES PARA ASEGURAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASEGURANDO UN ENFOQUE POBLACIONAL, DIFERENCIAL.	0.00																											
8.1	REALIZAR LAS MEJORAS LOCATIVAS A 2 SEDES PARA ASEGURAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASEGURANDO UN ENFOQUE POBLACIONAL, DIFERENCIAL.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	ACTUALIZAR EL SOFTWARE Y HARDWARE QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TIC DE LA ENTIDAD.	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

7567 35 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog
9.1	EJECUTAR	EL	CRONOGRAMA	PAI	11.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	14.00	13.50	26.00	24.50	23.00	18.00	21.00		1.00		1.00		1.00		1.00		2.00		100.00	66.00	7.26
Total ponderación vertical					100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.92

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
7670 20 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REDISEÑO Y ESTANDARIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES	0.00																											
1.1 PROGRAMA DISTRICTAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y ACTUALIZACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.	2.70	0.00	0.00	5.00	20.00	21.25	5.00	20.00	18.00	0.00	3.25	11.25	11.25	10.00		0.00		11.25		0.00		0.00		21.25		100.00	57.50	1.55
2. ASISTIR TÉCNICAMENTE A ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES EN LA GETH	0.00																											
2.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75	16.75	0.00	0.00	0.00	37.00	28.75	3.75	0.00		0.00		21.25		0.00		0.00		21.25		100.00	57.50	1.55
2.2 LINEAMIENTO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO EN ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL DISTRITO	2.70	5.00	0.00	0.00	0.00	12.50	13.75	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	12.50	7.50		0.00		10.00		7.50		15.00		17.50		100.00	26.25	0.71
2.3 PROGRAMA DE MOVILIDAD LABORAL	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	6.21	31.60	31.60	0.00	0.00	27.50	27.50	4.95		6.60		2.50		0.00		5.10		14.30		100.00	65.31	1.76
2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO LABORAL DISTRITO CAPITAL.	2.70	10.00	0.00	15.00	15.00	7.50	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	2.50	5.00	20.00		0.00		12.50		0.00		10.00		2.50		100.00	50.00	1.35
3. ESTRATEGIA DE FORMALIZACIÓN, DIGNIFICACIÓN Y ACCESO PÚBLICO Y MERITOCRÁTICO	0.00																											
3.1 PROPUESTA NORMATIVA PARA IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE EMPLEOS DE GERENTES TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DISTRICTAL	2.70	0.00	0.00	5.00	12.50	12.50	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	17.50	17.50	0.00		7.50		30.00		0.00		0.00		12.50		100.00	50.00	1.35
3.2 ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA PARA PARA REGULARIZAR EL RÉGIMEN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL	2.70	0.00	0.00	10.00	10.00	7.50	7.50	10.00	10.00	0.00	0.00	35.00	28.75	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		17.50		100.00	56.25	1.52
3.3 PROPUESTA NORMATIVA SOBRE LICENCIAS DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS CUYA VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD SEA MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.	2.70	0.00	0.00	20.00	20.00	2.00	2.00	0.00	0.00	23.00	8.00	43.00	17.00	0.00		0.00		2.00		0.00		0.00		10.00		100.00	47.00	1.27
3.4 PROPUESTA NORMATIVA SOBRE LICENCIAS DE MATERNIDAD DE LAS MUJERES GESTANTES CUYA VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD SEA MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.	2.70	0.00	0.00	10.00	10.00	22.00	15.20	47.00	1.80	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00		0.00		2.00		0.00		0.00		17.00		100.00	29.00	0.78
3.5 PROPUESTA NORMATIVA PARA REGULAR LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS VINCULADAS CON CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	2.70	15.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	10.00	3.00	10.00	0.00	9.00	17.00	20.00		0.00		2.00		0.00		0.00		12.00		100.00	42.00	1.13
3.6 PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE TALENTOS	2.70	15.00	0.00	0.00	15.00	2.50	1.88	34.95	24.95	0.00	0.00	12.50	12.50	4.95		0.00		2.50		15.10		0.00		12.50		100.00	54.33	1.47
3.7 BANCO DE PROVEEDORES ¿TALENTO NO PALANCA¿	2.70	0.00	0.00	39.90	29.93	7.50	7.50	0.00	0.00	10.00	10.00	7.50	17.48	0.00		9.90		7.50		0.00		0.00		17.70		100.00	64.91	1.75
4. CAPACITAR A COLABORADORES Y COLABORADORAS VINCULADOS AL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO A COMPETENCIAS DEL DASC	0.00																											
4.1 BANCO DISTRICTAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN INNOVACIÓN PÚBLICA	2.70	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.65	7.65	3.00	3.00	0.00	0.00	1.65		15.00		0.00		21.70		30.00		5.00		100.00	26.65	0.72

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

7670 20 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
4.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES	2.70	5.00	5.00	42.50	42.50	7.00	7.00	2.90	2.90	2.00	2.00	5.00	5.00	12.40		5.00		2.00		2.95		2.00		11.25		100.00	64.40	1.74
4.3 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC EN LÍNEA	2.70	0.00	0.00	12.00	12.00	14.50	14.50	2.00	2.00	5.00	5.00	14.50	14.50	2.00		5.00		14.50		2.00		18.50		10.00		100.00	48.00	1.30
4.4 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INNOVACIÓN PÚBLICA DISTRITAL	2.70	5.00	5.00	7.50	7.50	0.00	0.00	3.25	3.25	13.50	13.50	2.00	2.00	17.25		2.00		18.00		21.25		9.00		1.25		100.00	31.25	0.84
4.5 AULA DEL SABER DISTRITAL - LABORATORIO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL TALENTO HUMANO VINCULADO AL DISTRITO.	2.70	0.80	0.80	12.86	12.86	1.40	1.40	11.86	11.86	9.40	9.40	17.16	17.16	1.80		11.16		4.80		11.66		1.30		15.80		100.00	53.48	1.44
5. ASISTIR, APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 2 SISTEMAS: DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD DISTRITAL Y DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN JEFES TALENTO HUMANO DC	0.00																											
5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD DISTRITAL	2.70	0.00	0.00	6.00	6.00	4.00	4.00	11.25	7.25	11.00	15.00	10.00	10.00	5.25		14.00		12.00		25.25		0.00		1.25		100.00	42.25	1.14
5.2 SEVCOM	2.70	22.00	7.00	7.00	22.00	2.00	2.00	7.00	7.00	9.50	14.50	17.00	7.00	2.00		12.00		2.00		12.00		2.00		5.50		100.00	59.50	1.61
5.3 PROGRAMA DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE JEFES O RESPONSABLES DE TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO CAPITAL	2.70	0.00	0.00	15.00	15.00	16.25	16.25	1.25	1.25	7.50	7.50	21.25	21.25	3.75		8.75		2.50		6.25		16.25		1.25		100.00	61.25	1.65
6. PROGRAMAS DE BIENESTAR DESARROLLADOS, QUE GENEREN SENTIDO DE PERTENENCIA EN COLABORADORES Y COLABORADORAS Y EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL	0.00																											
6.1 PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO CAPITAL	2.70	0.00	0.00	5.50	5.50	11.80	11.80	17.00	17.00	4.00	4.00	15.75	15.75	7.50		0.00		10.85		7.50		0.00		20.10		100.00	54.05	1.46
6.2 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO	2.70	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	8.00	8.00	7.00	7.00	12.95		7.95		5.10		22.00		3.00		3.00		100.00	46.00	1.24
6.3 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE TALENTOS (ARTÍSTICOS Y CULTURALES) PARA COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	2.70	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00	5.00	9.25	9.25	16.00	16.00	9.00	9.00	10.40		0.00		6.65		14.25		21.20		4.25		100.00	43.25	1.17
6.4 PROGRAMA DE APOYO EMOCIONAL DISTRITAL	2.70	0.00	0.00	5.41	5.41	5.97	5.97	8.48	8.48	9.57	9.57	10.83	10.83	16.28		12.38		10.14		9.57		7.25		4.12		100.00	40.26	1.09
6.5 VII CONGRESO DE TALENTO HUMANO	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00		25.00		15.00		20.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.81
6.6 JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES	2.70	4.00	4.00	22.00	21.40	13.20	14.40	3.00	3.00	3.00	3.00	1.20	1.20	4.60		12.80		7.80		4.80		3.80		19.80		100.00	47.00	1.27
6.7 CLIMA LABORAL	2.70	0.00	0.00	14.00	14.00	12.50	12.50	21.00	21.00	3.50	3.50	3.50	3.50	8.50		3.50		3.75		8.75		8.00		13.00		100.00	54.50	1.47
6.8 IDENTIFICACIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL	2.70	0.00	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	3.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	57.00	1.54
6.9 METODOLOGÍA DE IMPACTO	2.70	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	5.00	12.00	12.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00		10.00		12.50		22.50		0.00		100.00	41.00	1.11
6.10 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS BIPARTITAS Y DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE APOYO DE TALENTO HUMANO	2.70	0.00	0.00	22.00	22.00	5.33	5.33	11.58	11.58	5.33	5.33	12.83	12.83	6.58		5.33		5.33		6.58		15.33		3.78		100.00	57.07	1.54
6.11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL DISTRITO	2.80	0.00	0.00	12.50	12.50	13.74	13.74	9.52	9.52	2.67	2.67	11.95	11.95	12.24		1.95		3.67		1.95		19.81		10.00		100.00	50.38	1.41

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital


7670 20 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
7. ASISTIR, APOYAR A ENTIDADES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES LABORALES DIVERSOS, AMOROSOS Y SEGUROS EN LAS ENTIDADES DISTRITALES	0.00																														
7.1 PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES LABORALES DIVERSOS, AMOROSOS Y SEGUROS.	2.70	0.00	0.00	5.29	5.29	14.04	14.04	10.07	10.07	11.05	11.05	17.05	17.05	10.30		11.30		4.30		5.30		4.30		7.00		100.00	57.50	1.55			
7.2 PLAN DE COMUNICACIÓN CON LENGUAJE INCLUYENTE	2.70	5.00	0.00	0.00	5.00	22.50	18.75	24.50	28.25	25.50	25.50	12.75	12.75	3.00		3.00		0.00		3.75		0.00		0.00		100.00	90.25	2.44			
7.3 DISEÑO DE VIDA	2.70	0.00	0.00	21.00	6.00	6.00	21.00	23.50	23.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		6.00		6.00		6.00		6.00		0.00		100.00	67.50	1.82			
8. ACTUALIZAR CON NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SIDEAP), QUE PERMITAN CONSOLIDAR UNA CULTURA DE ANÁLITICA DE DATOS GTH	0.00																														
8.1 FORTALECIMIENTO SIDEAP 2022	2.70	0.73	0.73	10.24	6.70	13.07	14.86	12.25	15.01	13.14	7.59	12.34	14.94	12.01		8.64		8.50		4.62		1.94		2.52		100.00	59.83	1.62			
9. TABLERO DE CONTROL DEL TALENTO HUMANO EN EL TERRITORIO DE BOGOTÁ D.C.	0.00																														
9.1 TABLERO DE CONTROL DEL TALENTO HUMANO EN EL TERRITORIO LOCAL DISTRITAL	2.70	0.00	0.00	2.75	2.20	17.55	16.75	9.55	9.55	16.55	17.90	8.80	8.80	11.80		6.80		9.20		5.00		5.00		7.00		100.00	55.20	1.49			
10. BATERIA DE INDICADORES DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO DE BOGOTÁ	0.00																														
10.1 SISTEMA DE INDICADORES DE TALENTO HUMANO	2.70	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	7.50	7.50	10.00	10.00	11.25	11.25	8.75		13.50		7.50		17.50		8.38		13.12		100.00	31.25	0.84			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.51	

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7657 Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá

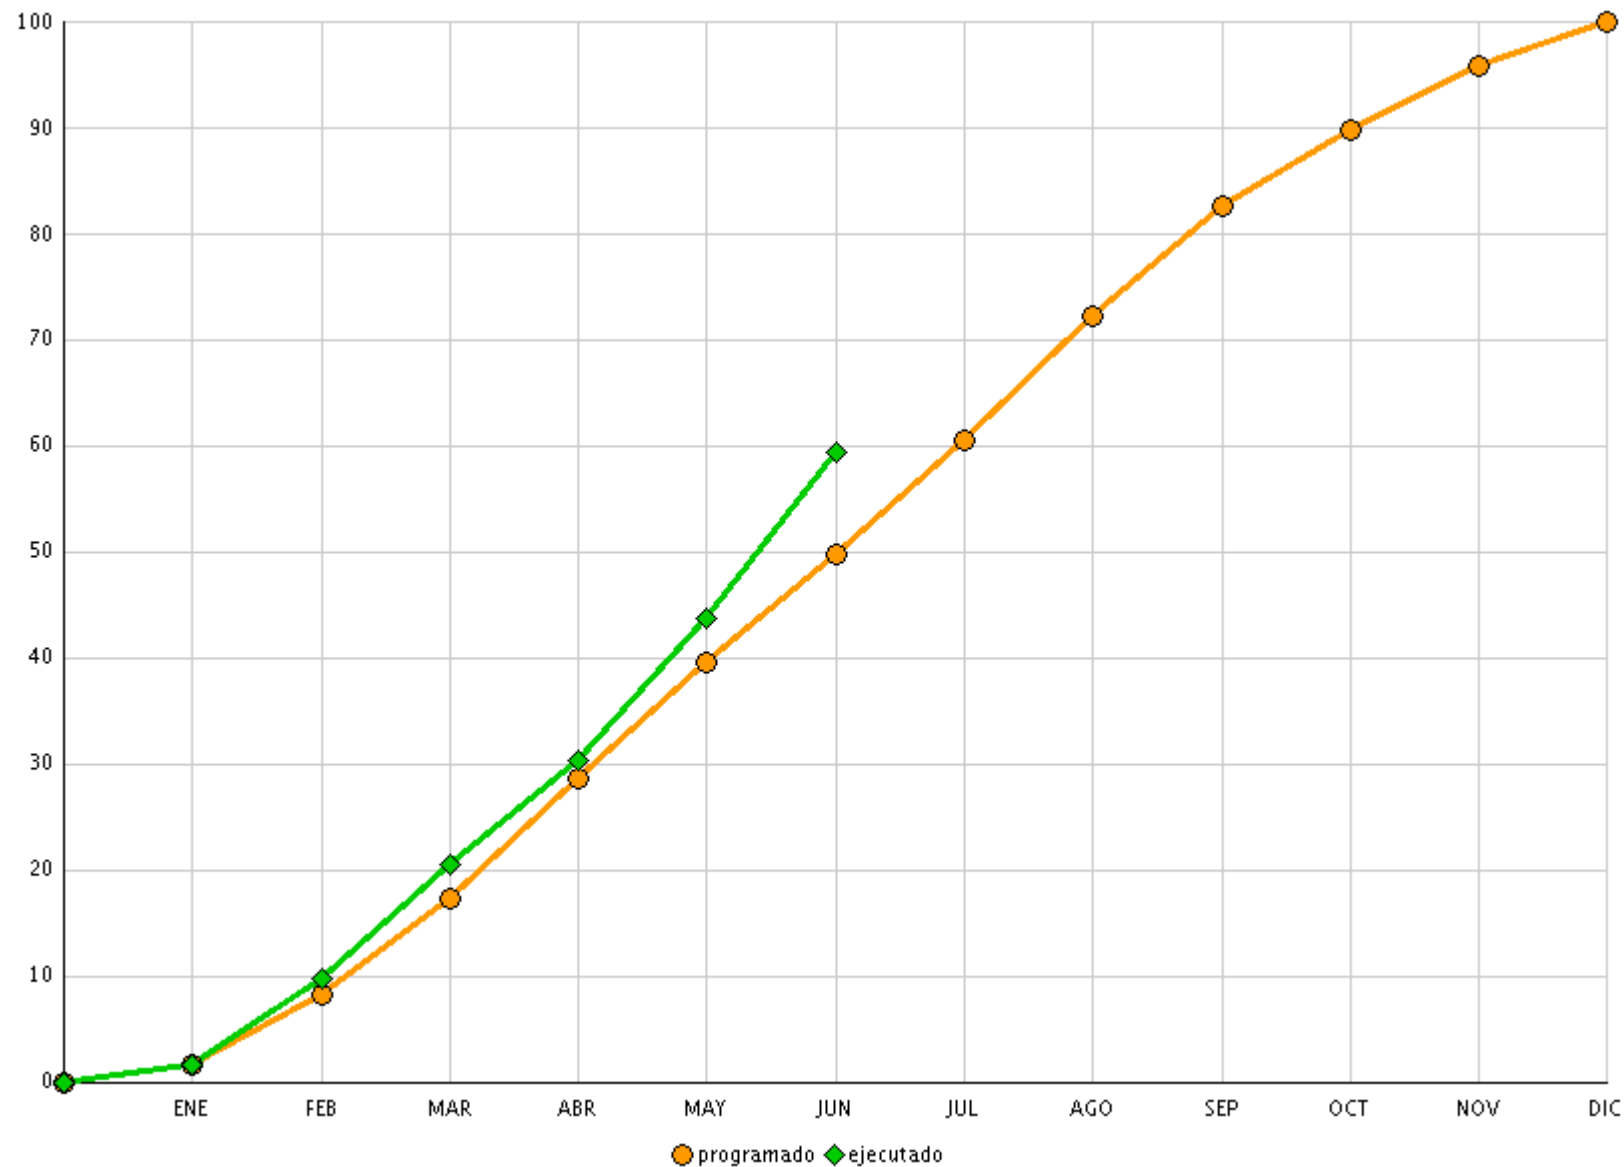


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.78	8.23	17.39	28.72	39.54	49.81	60.51	72.27	82.63	89.75	95.81	100.00
Ejecutado	1.78	9.82	20.56	30.41	43.71	59.38						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7699 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

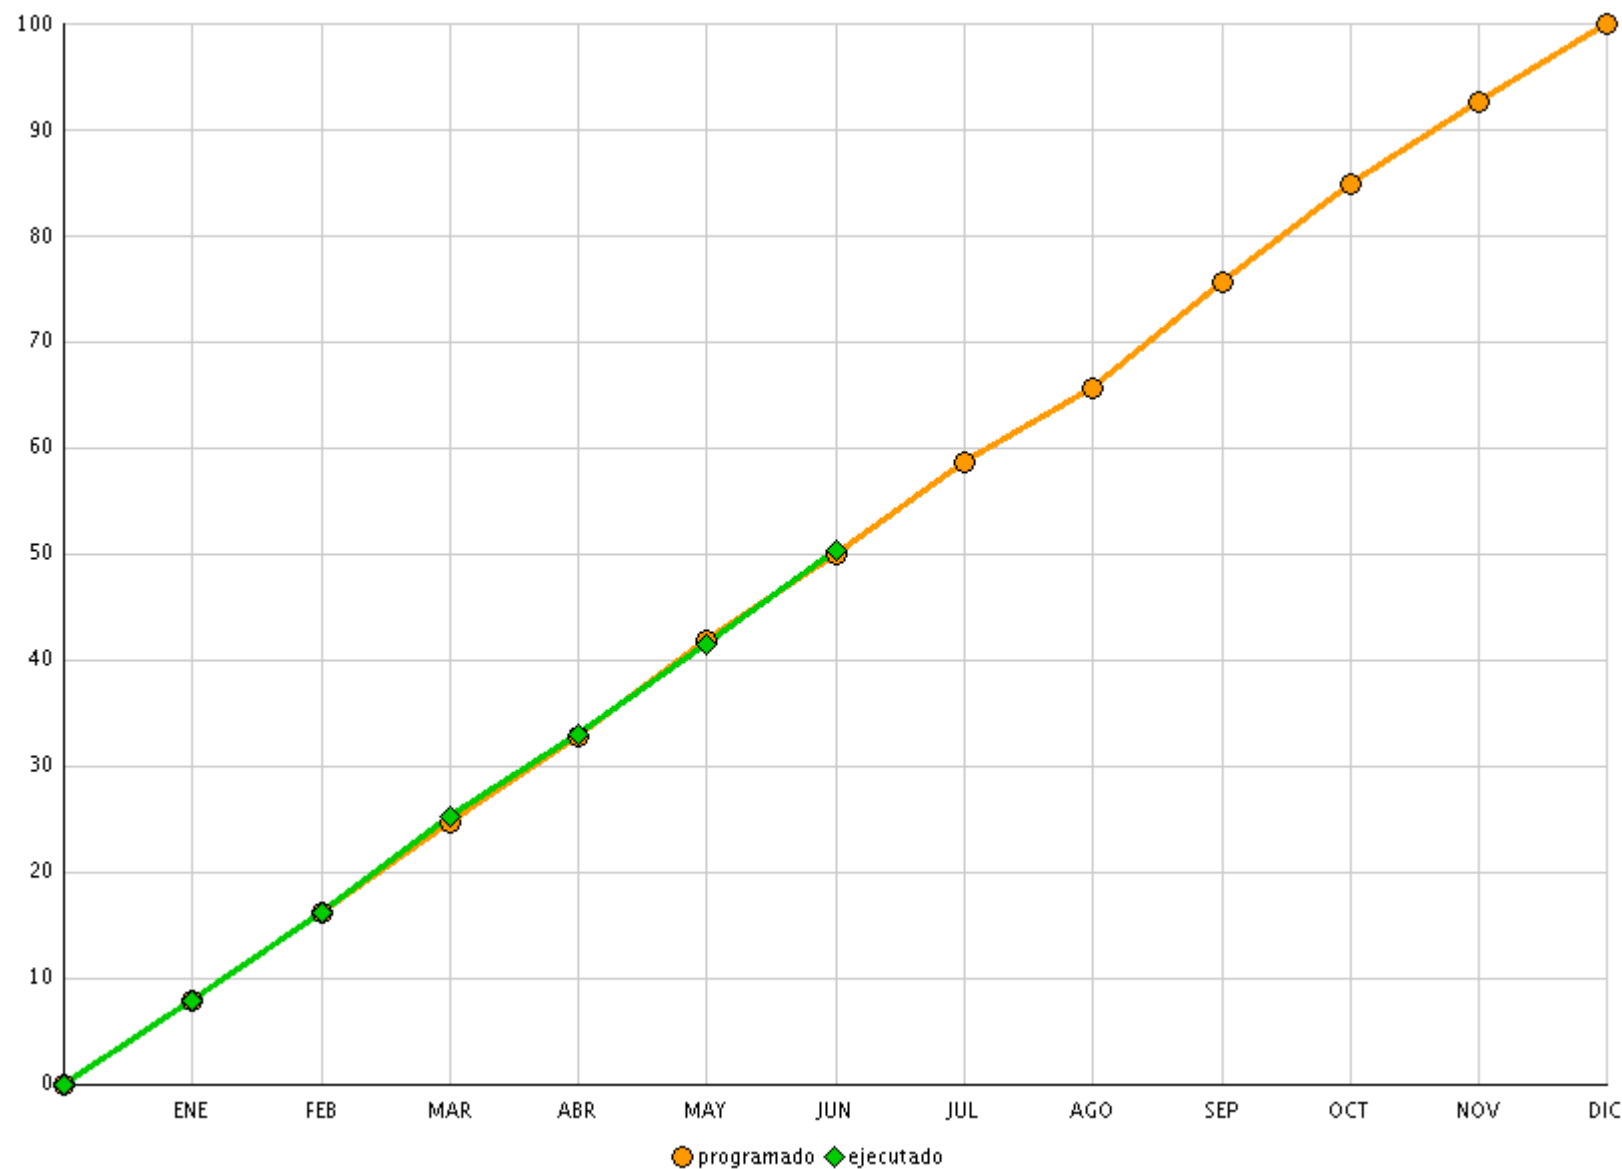


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.99	16.14	24.67	32.75	41.88	50.09	58.72	65.63	75.74	84.92	92.73	100.00
Ejecutado	7.99	16.14	25.29	33.02	41.55	50.37						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7702 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá

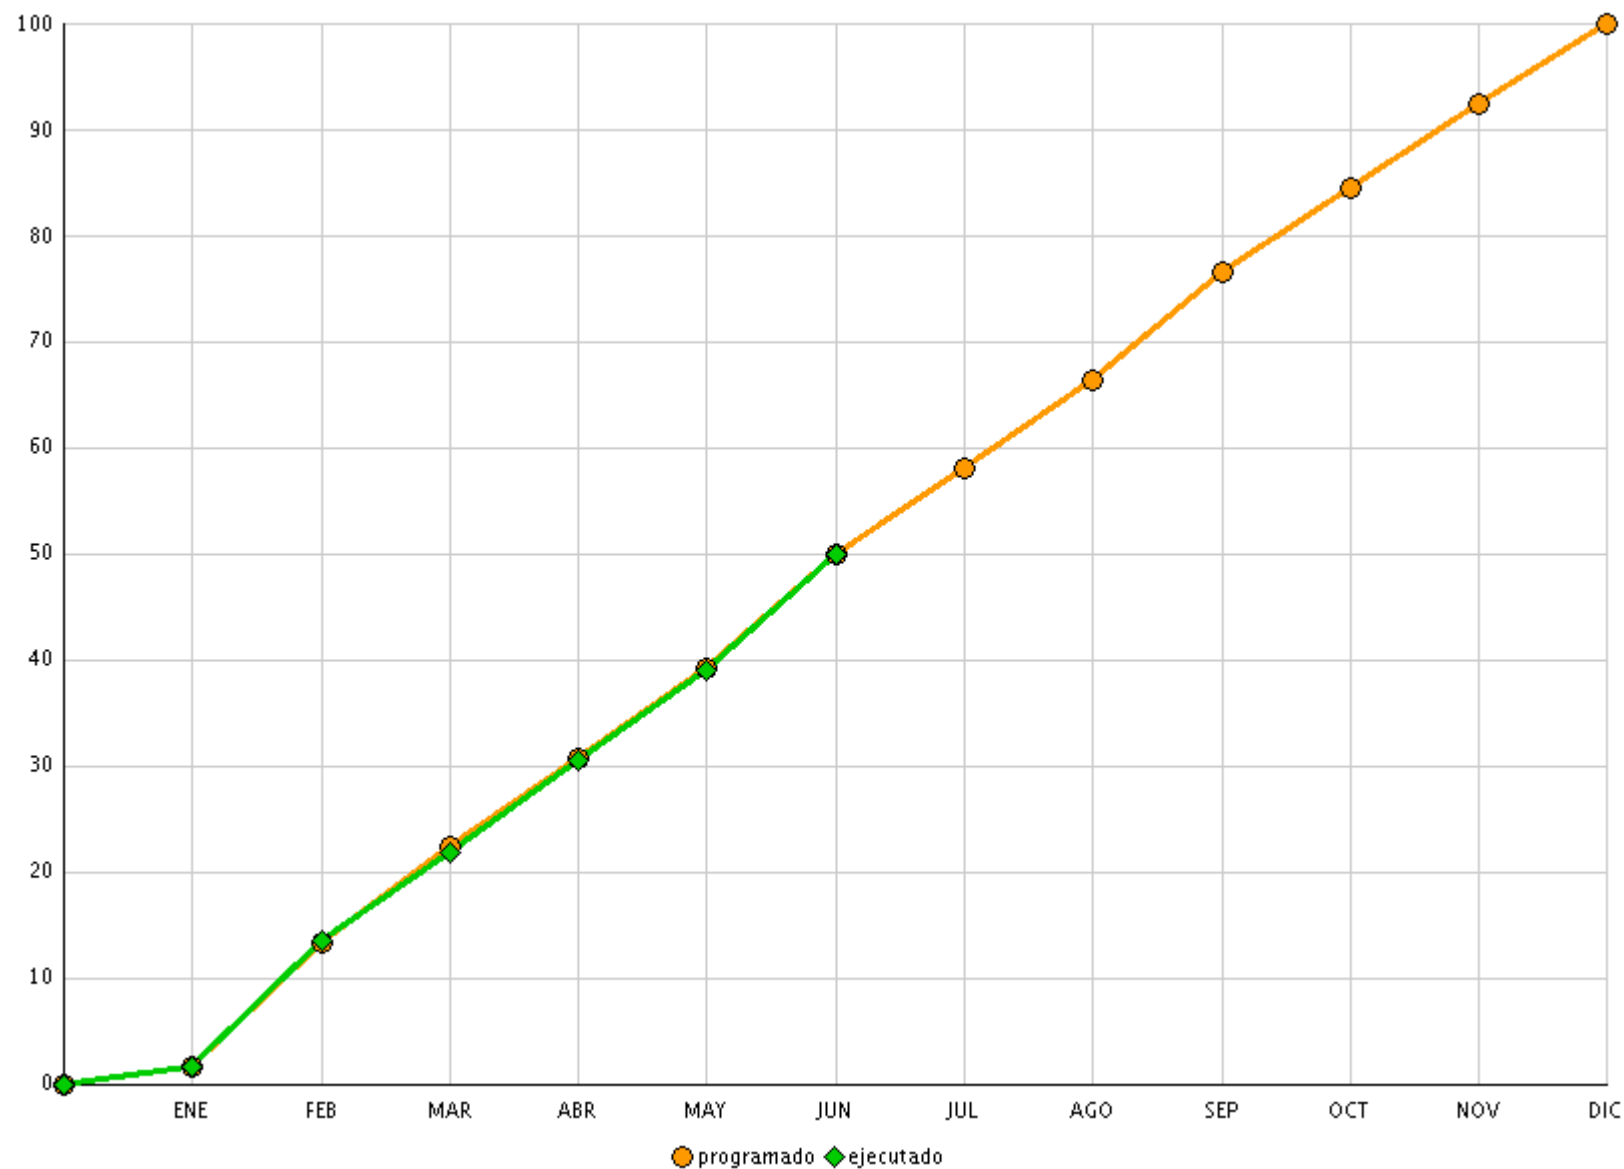


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.73	13.34	22.36	30.77	39.23	49.91	58.17	66.42	76.57	84.45	92.40	100.00
Ejecutado	1.73	13.63	21.89	30.61	38.98	49.98						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7710 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá

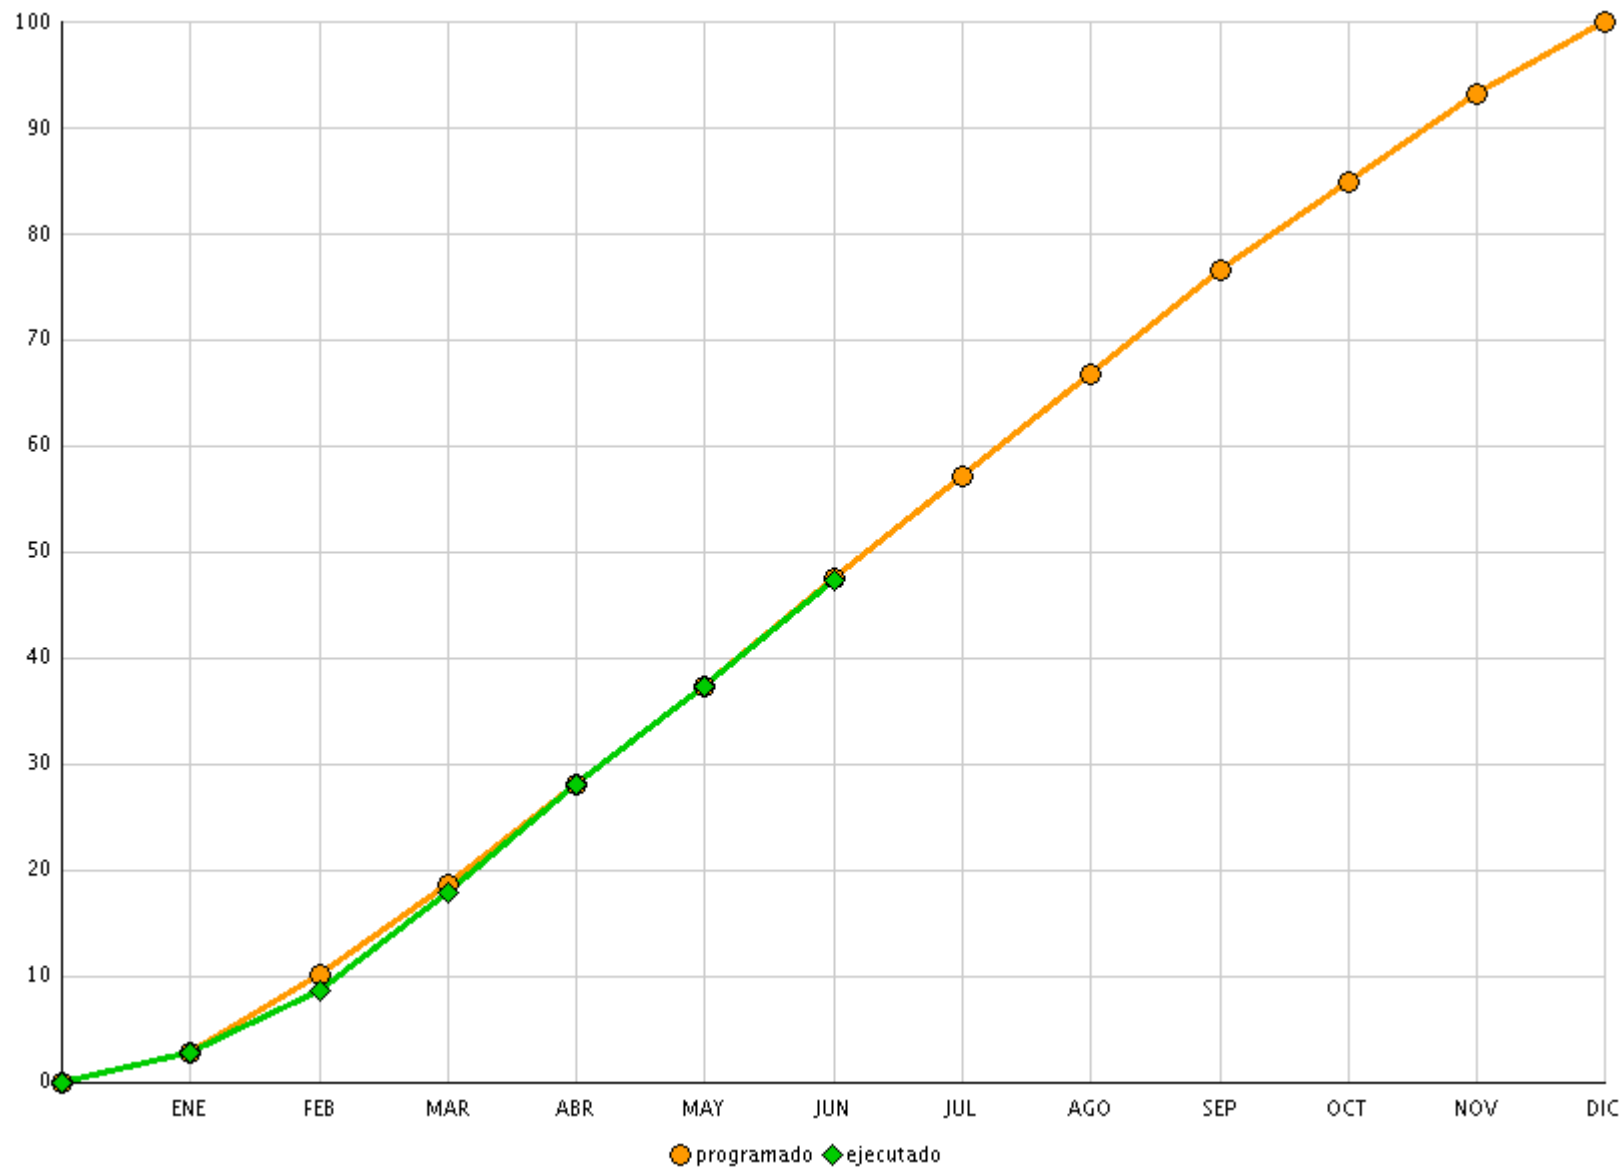


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.83	10.18	18.69	28.04	37.40	47.62	57.23	66.84	76.54	84.88	93.22	100.00
Ejecutado	2.83	8.63	17.94	28.04	37.40	47.39						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7711 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

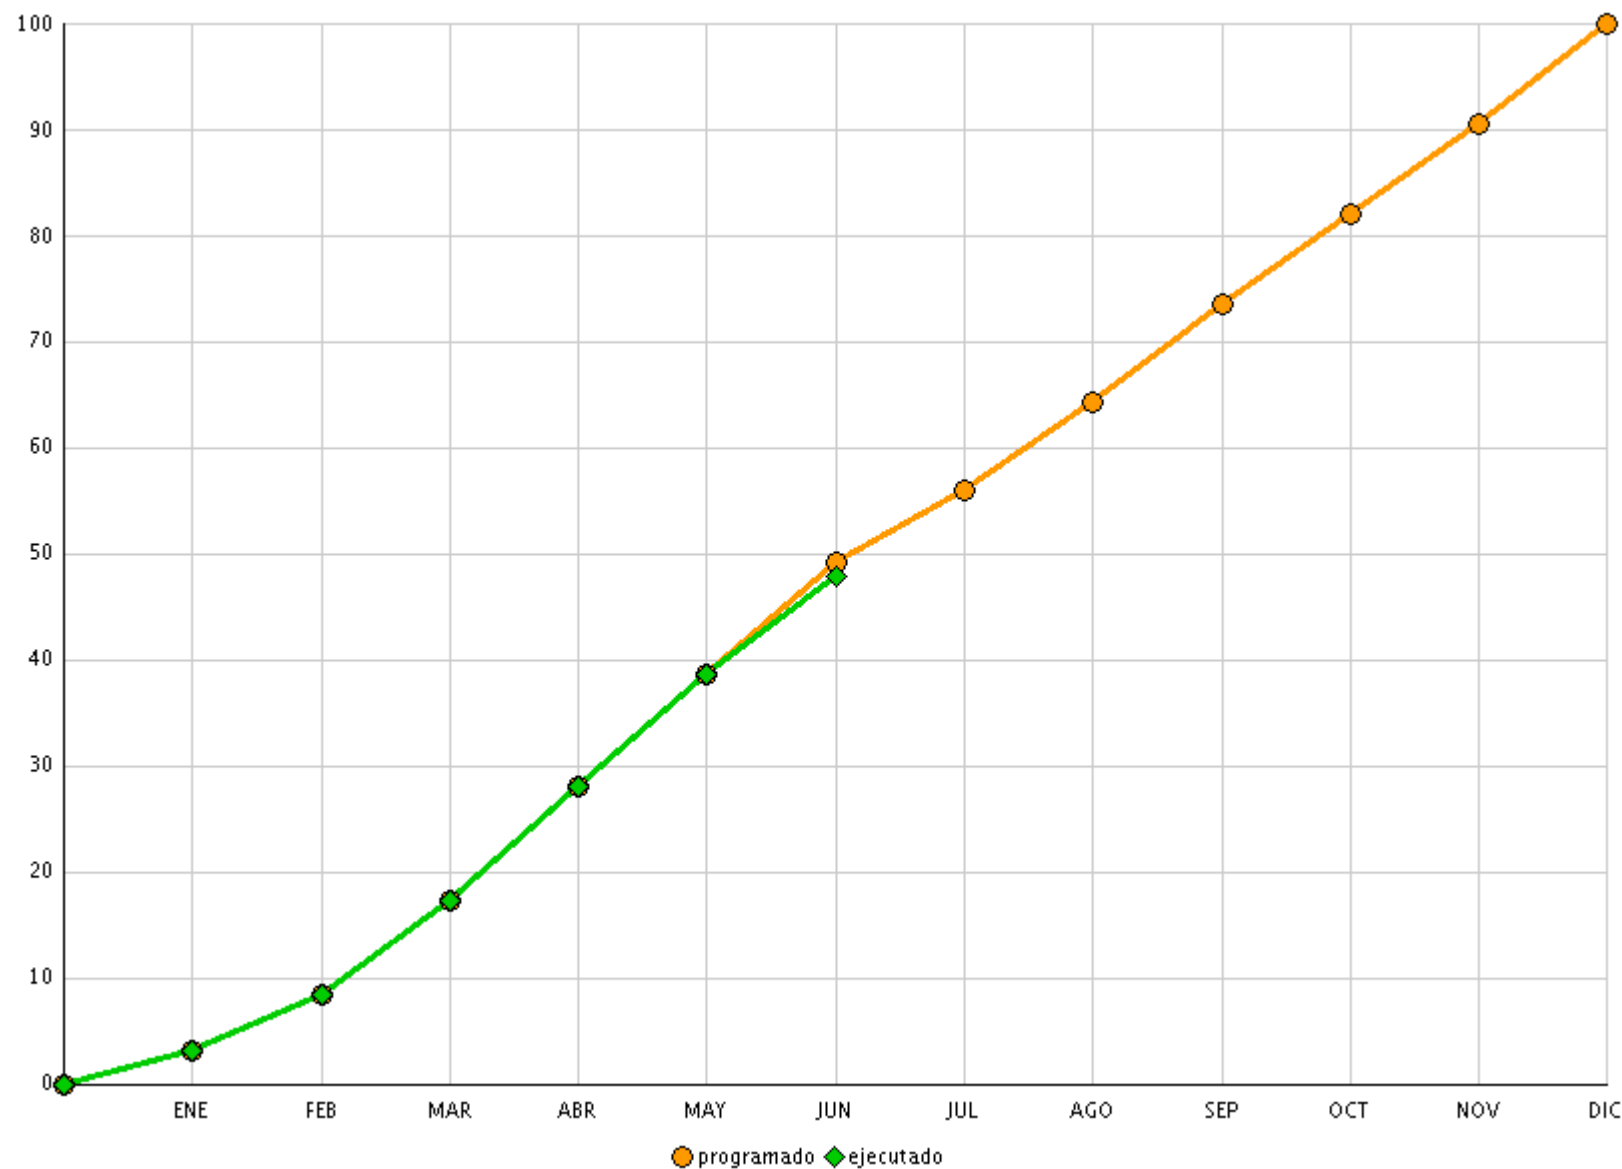


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.14	8.48	17.41	28.02	38.62	49.23	56.06	64.37	73.68	82.00	90.64	100.00
Ejecutado	3.14	8.43	17.39	28.02	38.62	47.85						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7725 Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá

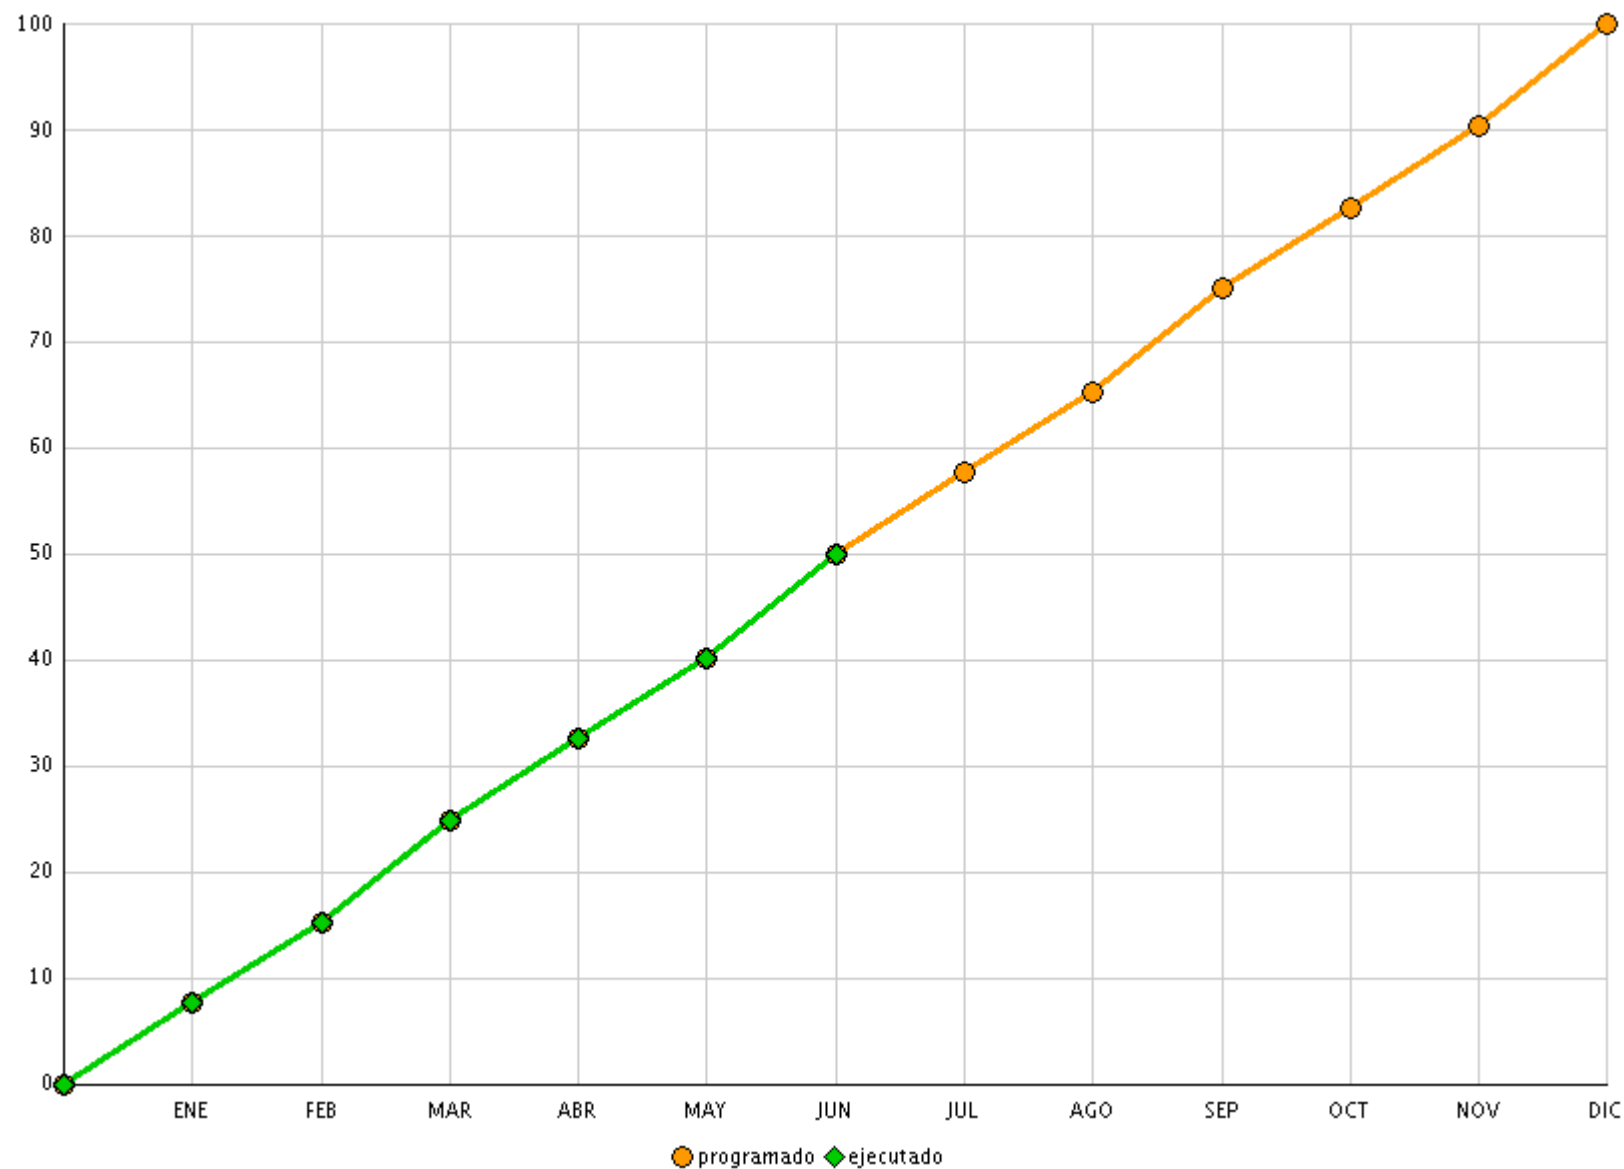


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.65	15.30	24.95	32.60	40.25	49.94	57.64	65.34	75.04	82.69	90.34	100.00
Ejecutado	7.65	15.30	24.95	32.60	40.25	49.94						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7743 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá

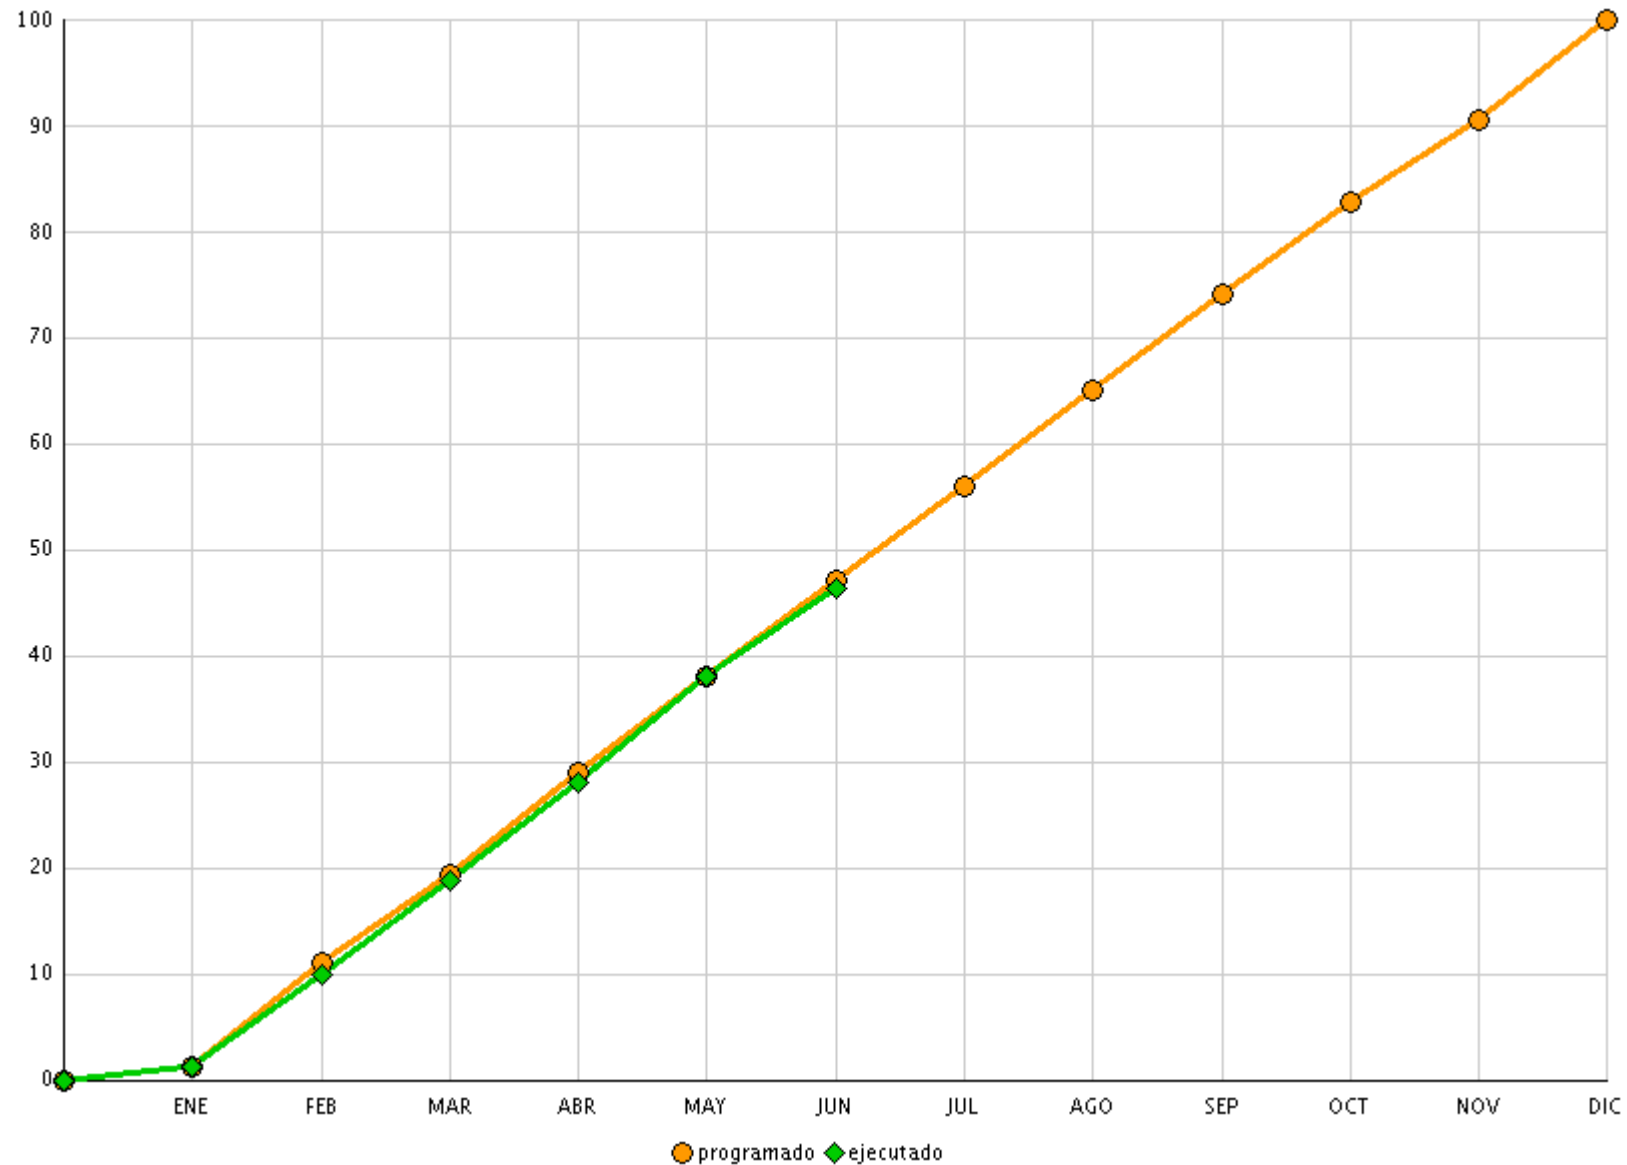


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.26	11.04	19.40	29.14	38.04	47.17	56.08	65.14	74.20	82.75	90.61	100.00
Ejecutado	1.26	9.95	18.95	28.08	38.17	46.37						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

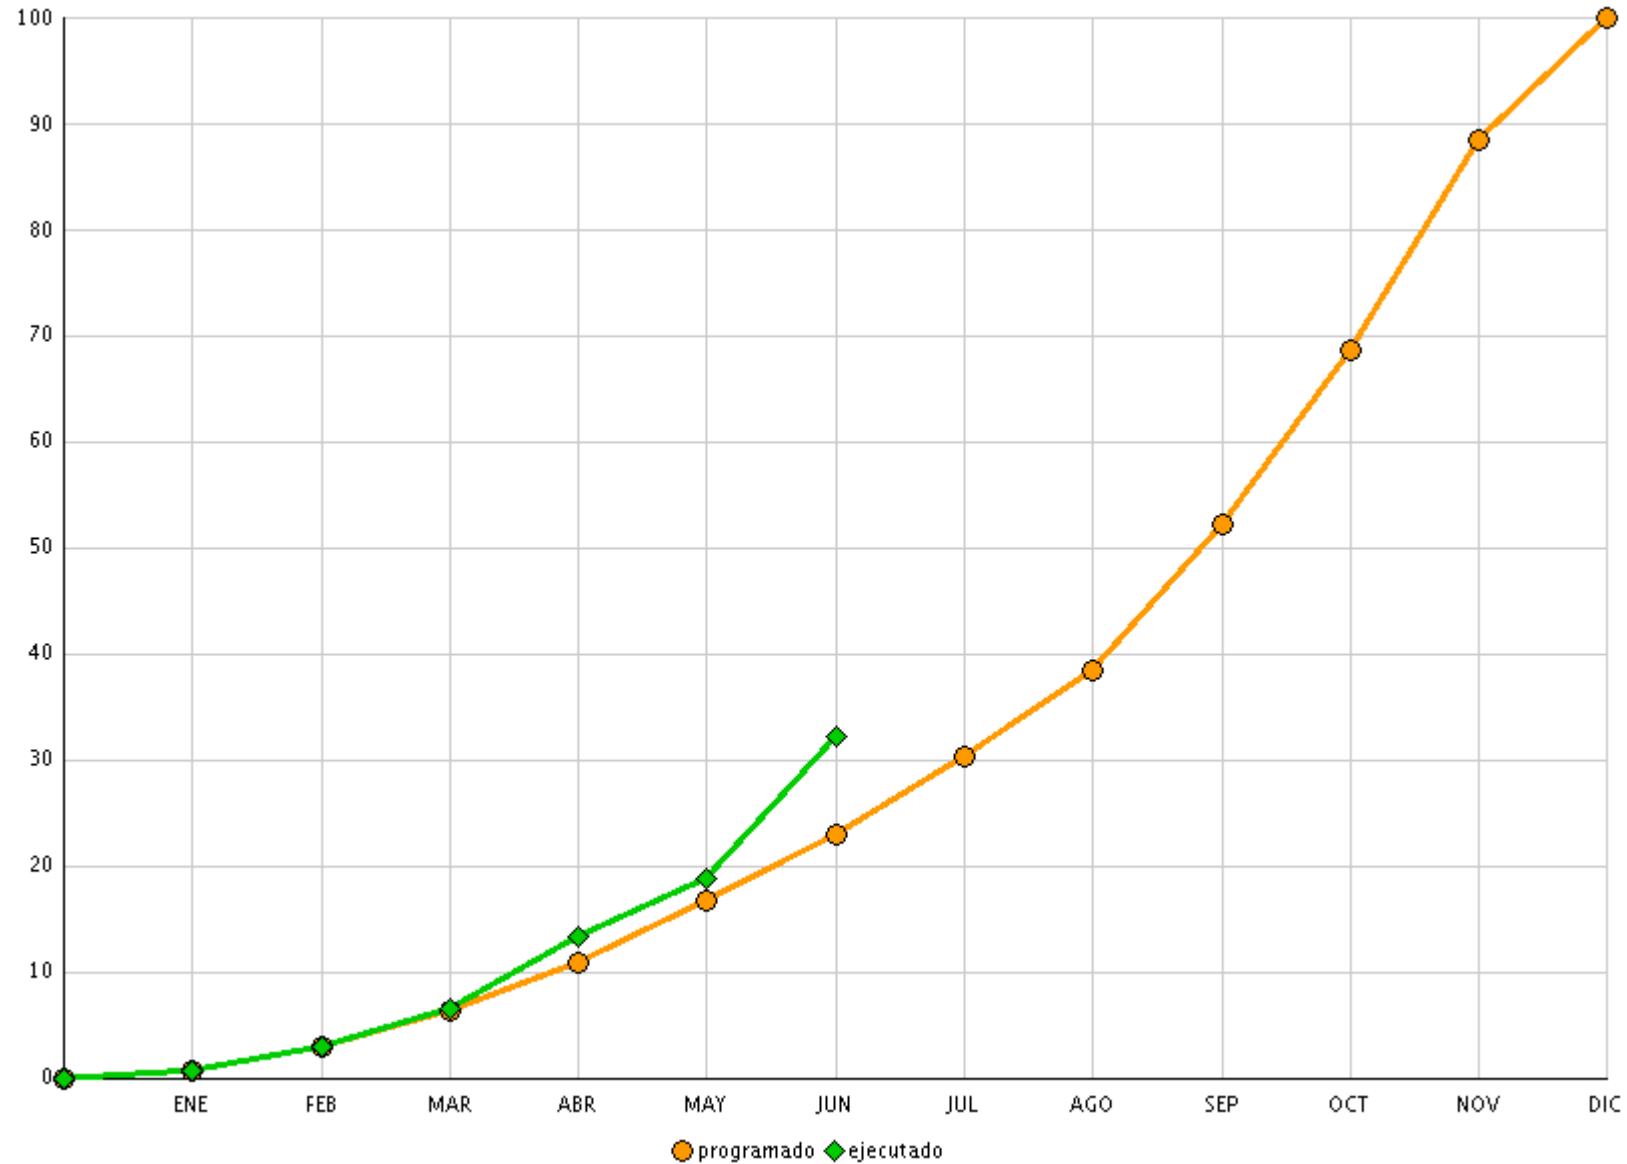


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.69	3.03	6.48	11.02	16.71	23.05	30.45	38.51	52.27	68.59	88.45	100.00
Ejecutado	0.69	3.03	6.61	13.35	18.91	32.27						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7778 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

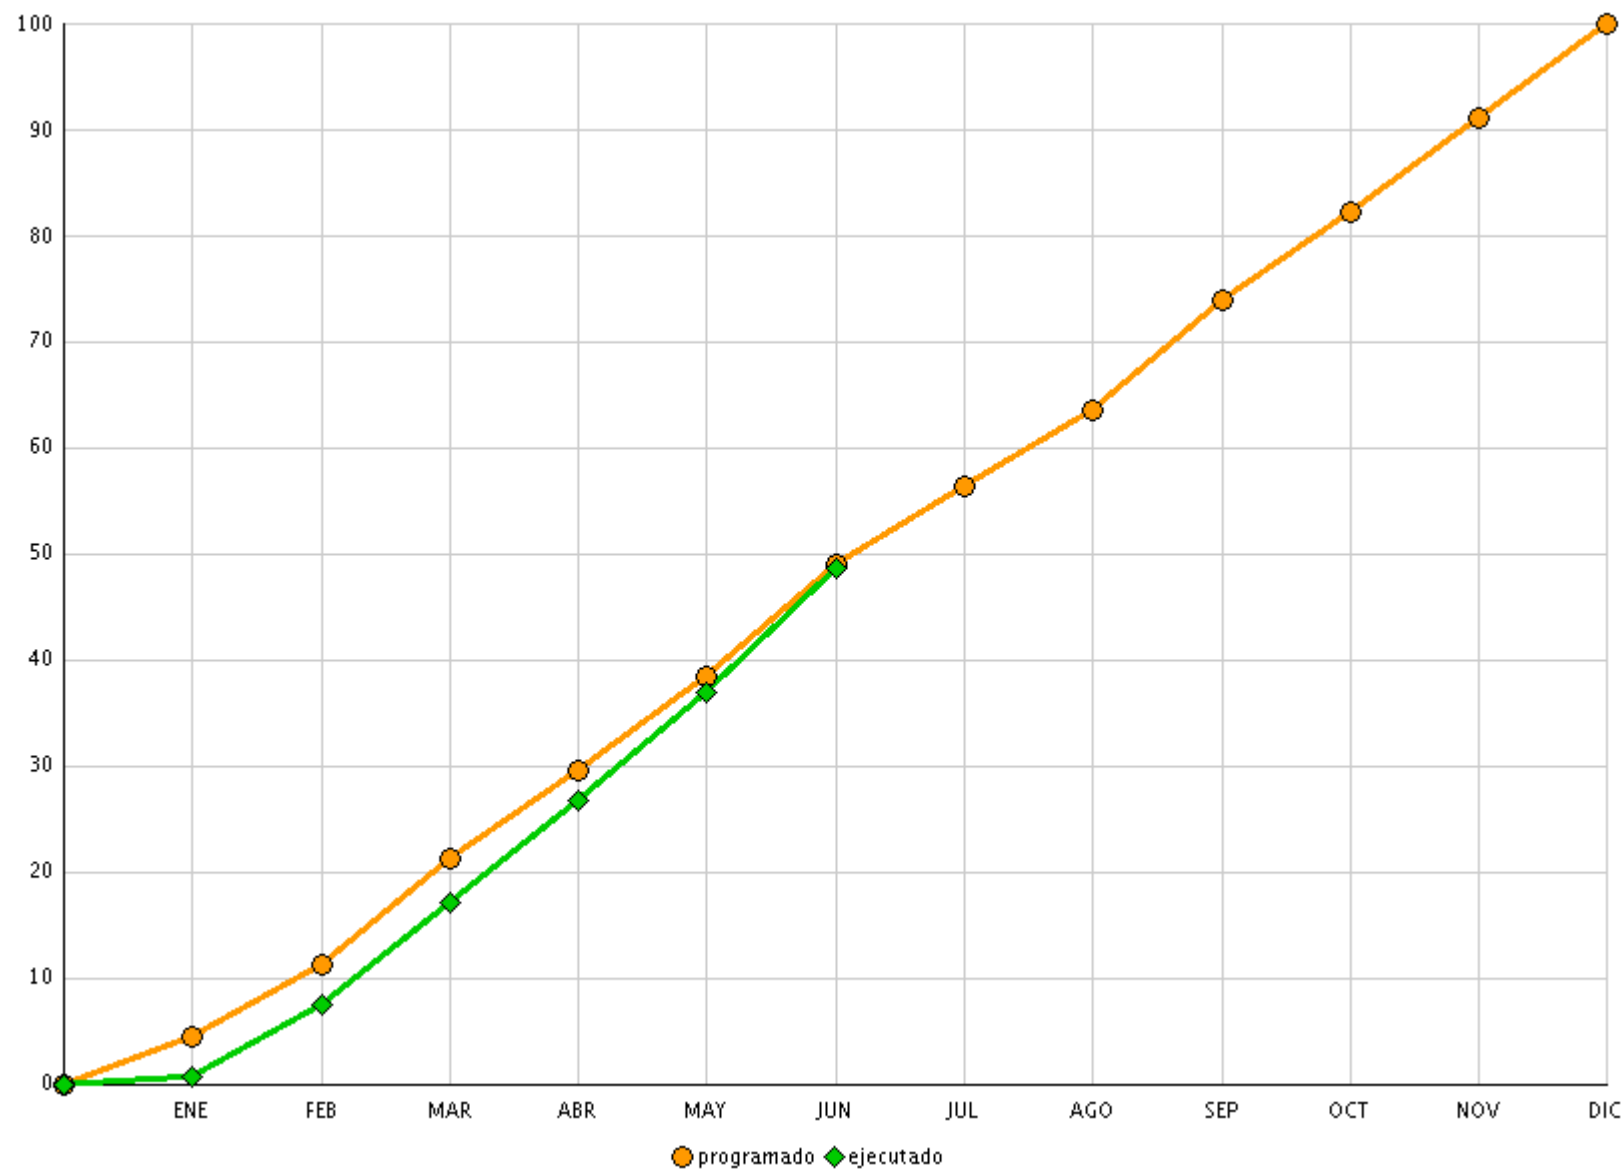


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.56	11.35	21.37	29.71	38.46	49.12	56.38	63.64	73.94	82.33	91.08	100.00
Ejecutado	0.78	7.48	17.21	26.75	36.93	48.76						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7780 Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá

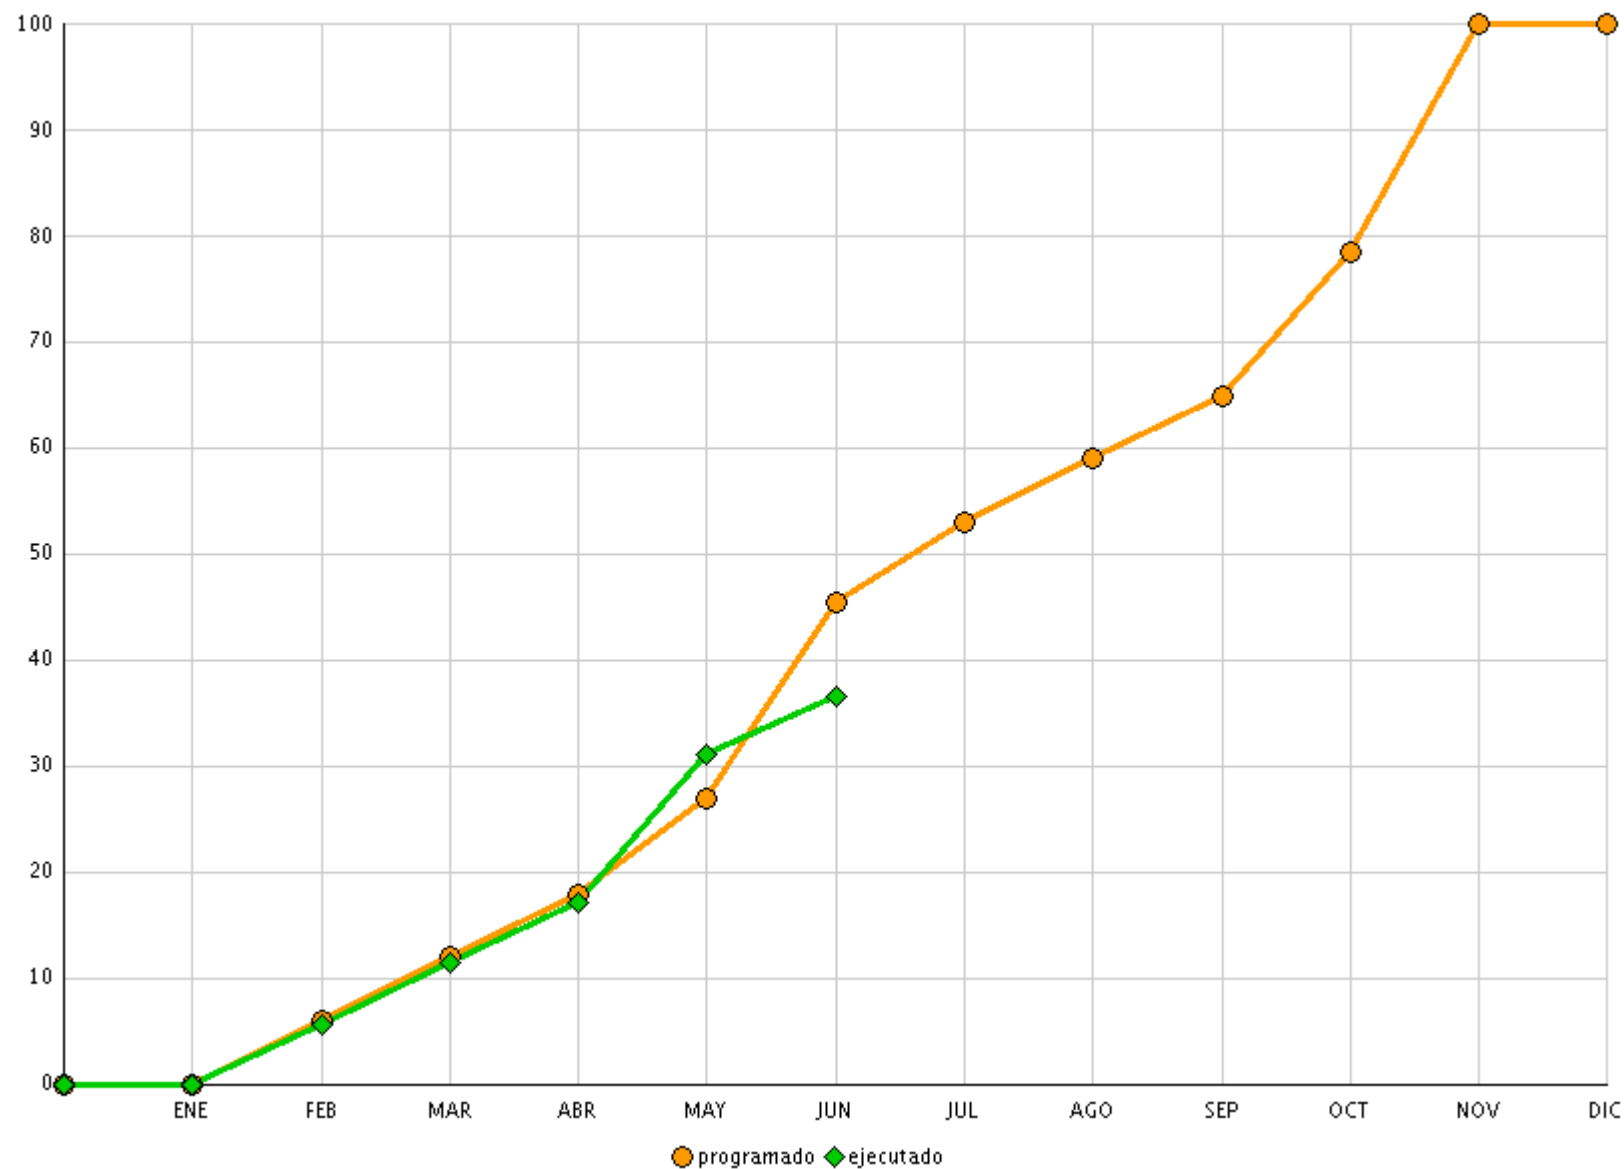


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	6.00	12.00	18.00	27.00	45.50	53.00	59.00	65.00	78.50	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	5.70	11.49	17.19	31.19	36.69						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7789 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

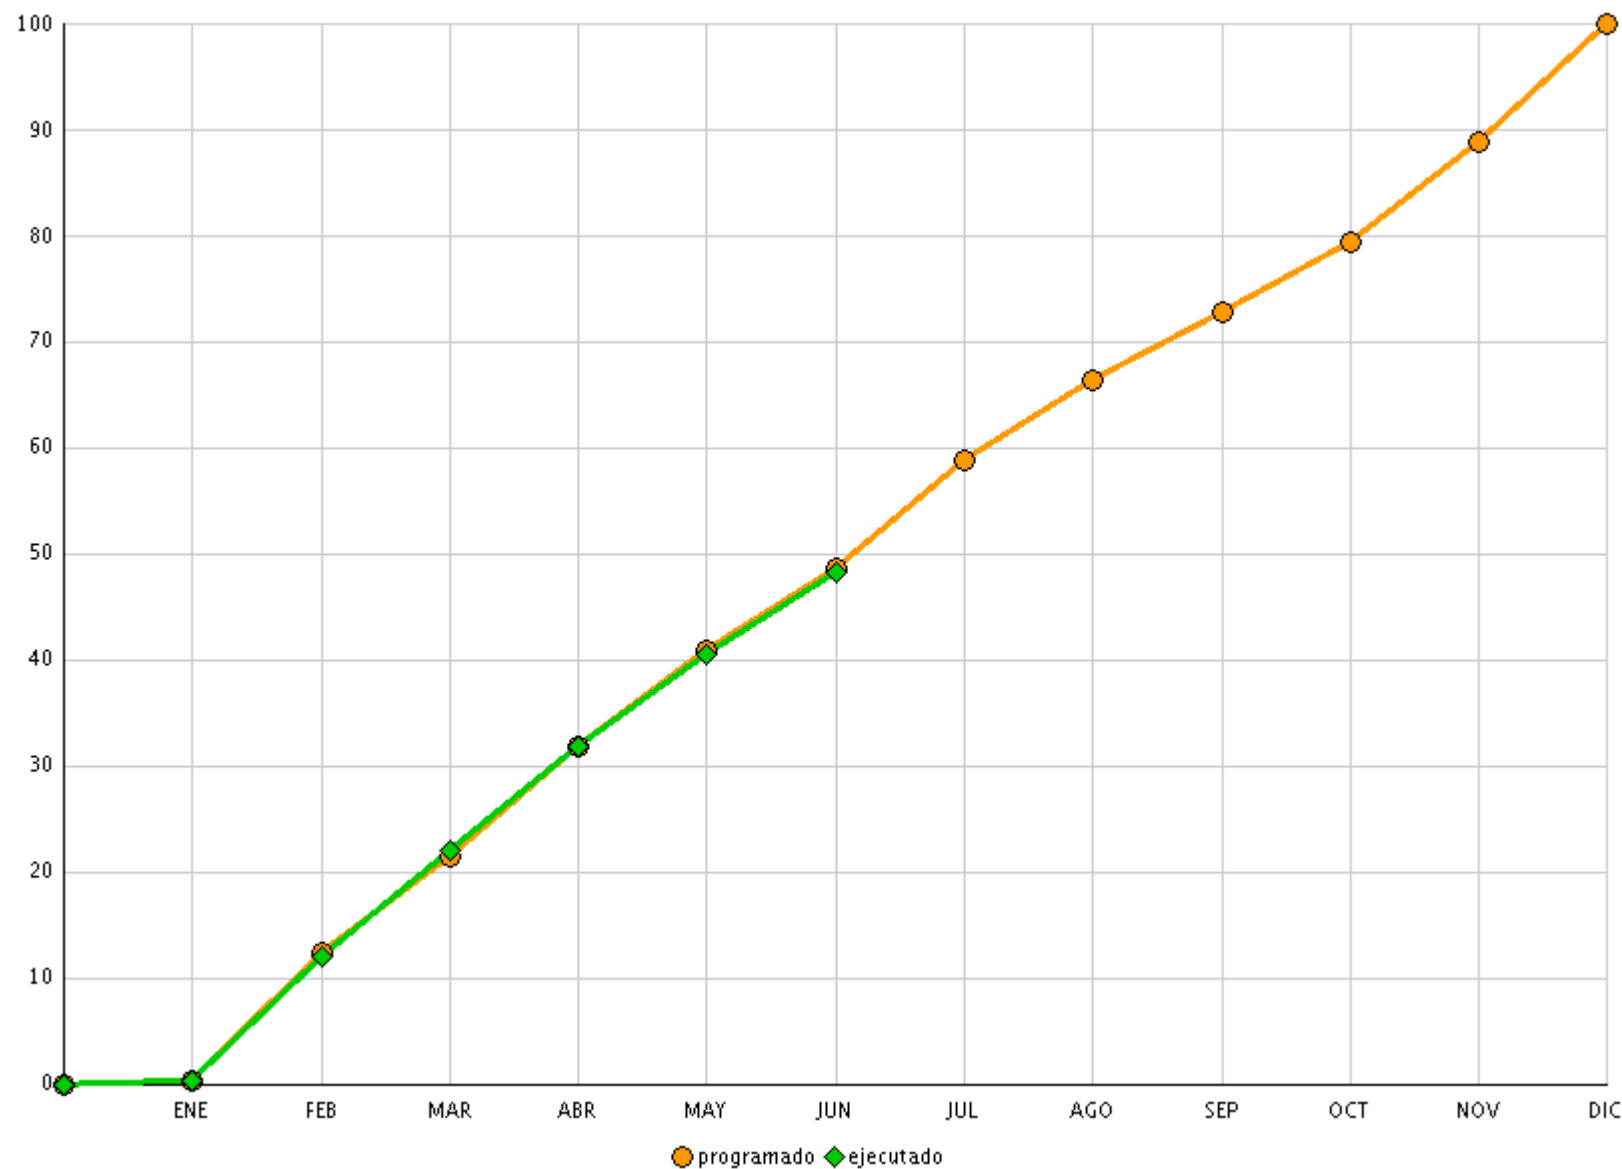


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.43	12.36	21.50	31.86	40.85	48.61	58.82	66.36	72.74	79.48	88.85	100.00
Ejecutado	0.43	12.04	22.01	31.91	40.56	48.24						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7794 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecurbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

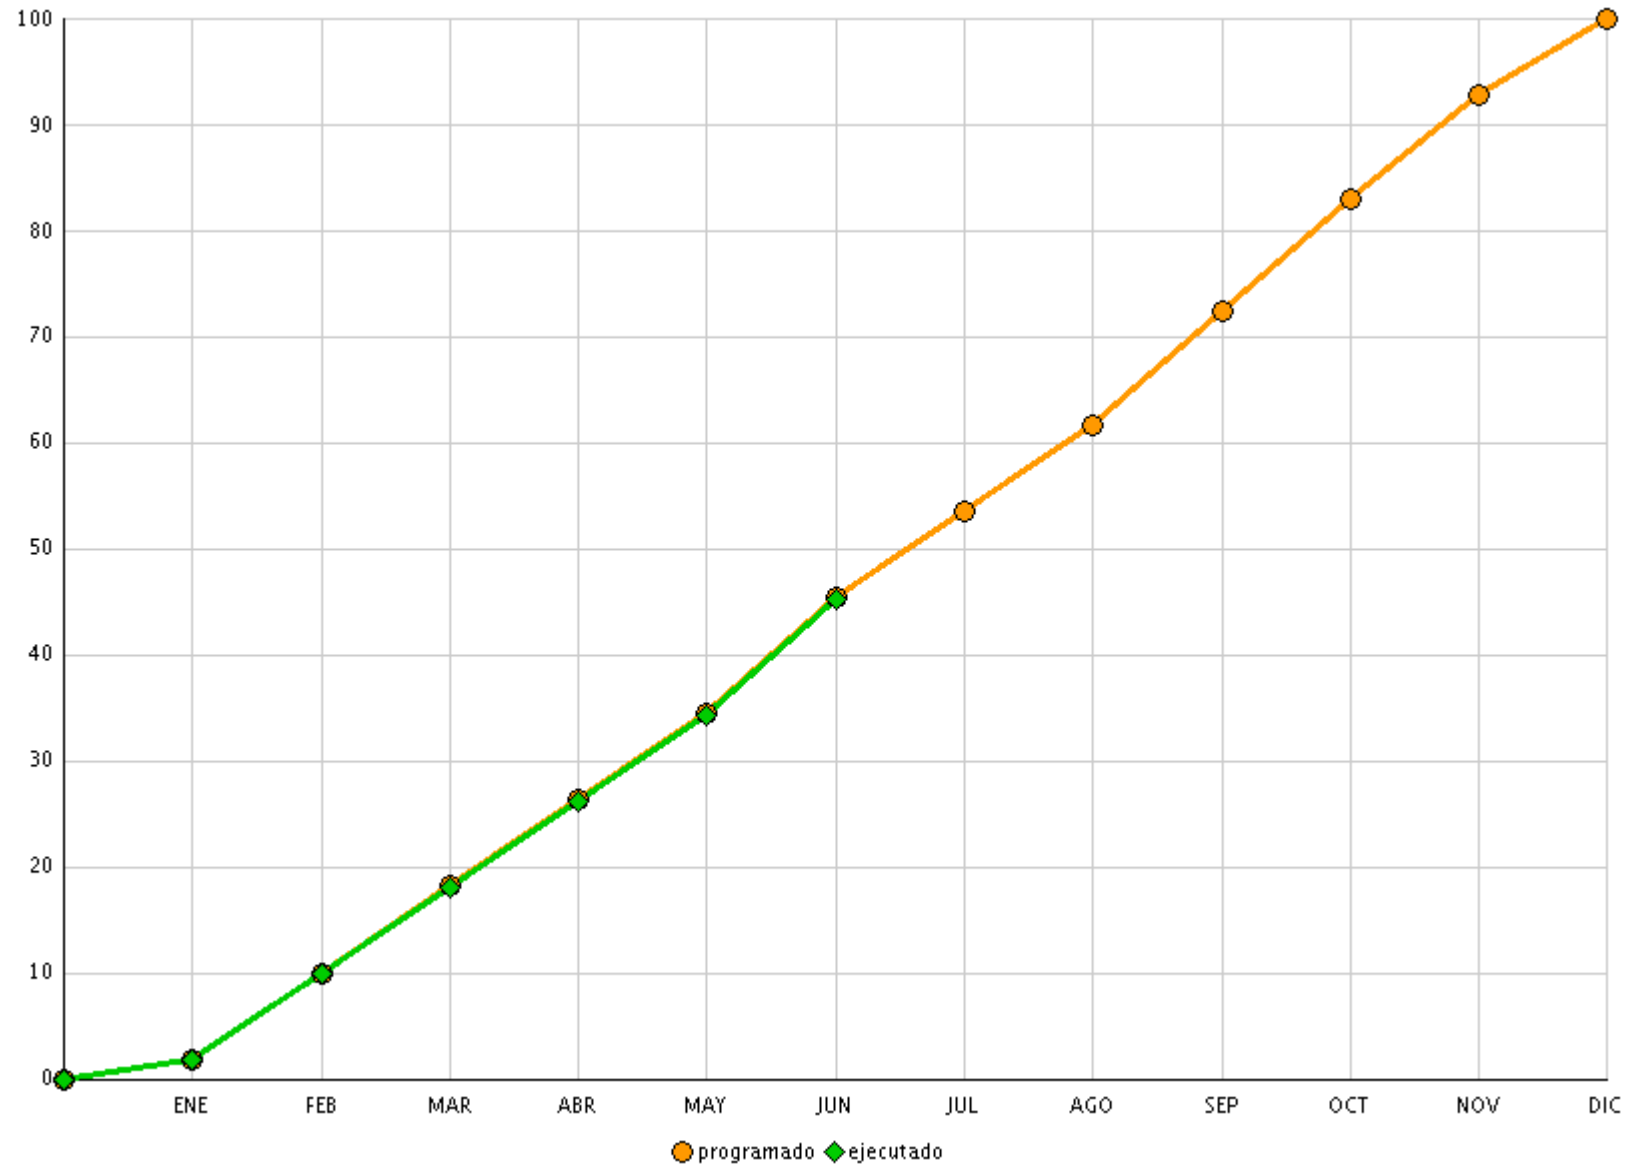


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.96	9.91	18.33	26.33	34.52	45.41	53.56	61.77	72.53	83.11	92.84	100.00
Ejecutado	1.96	9.91	18.14	26.14	34.33	45.22						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7804 Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá

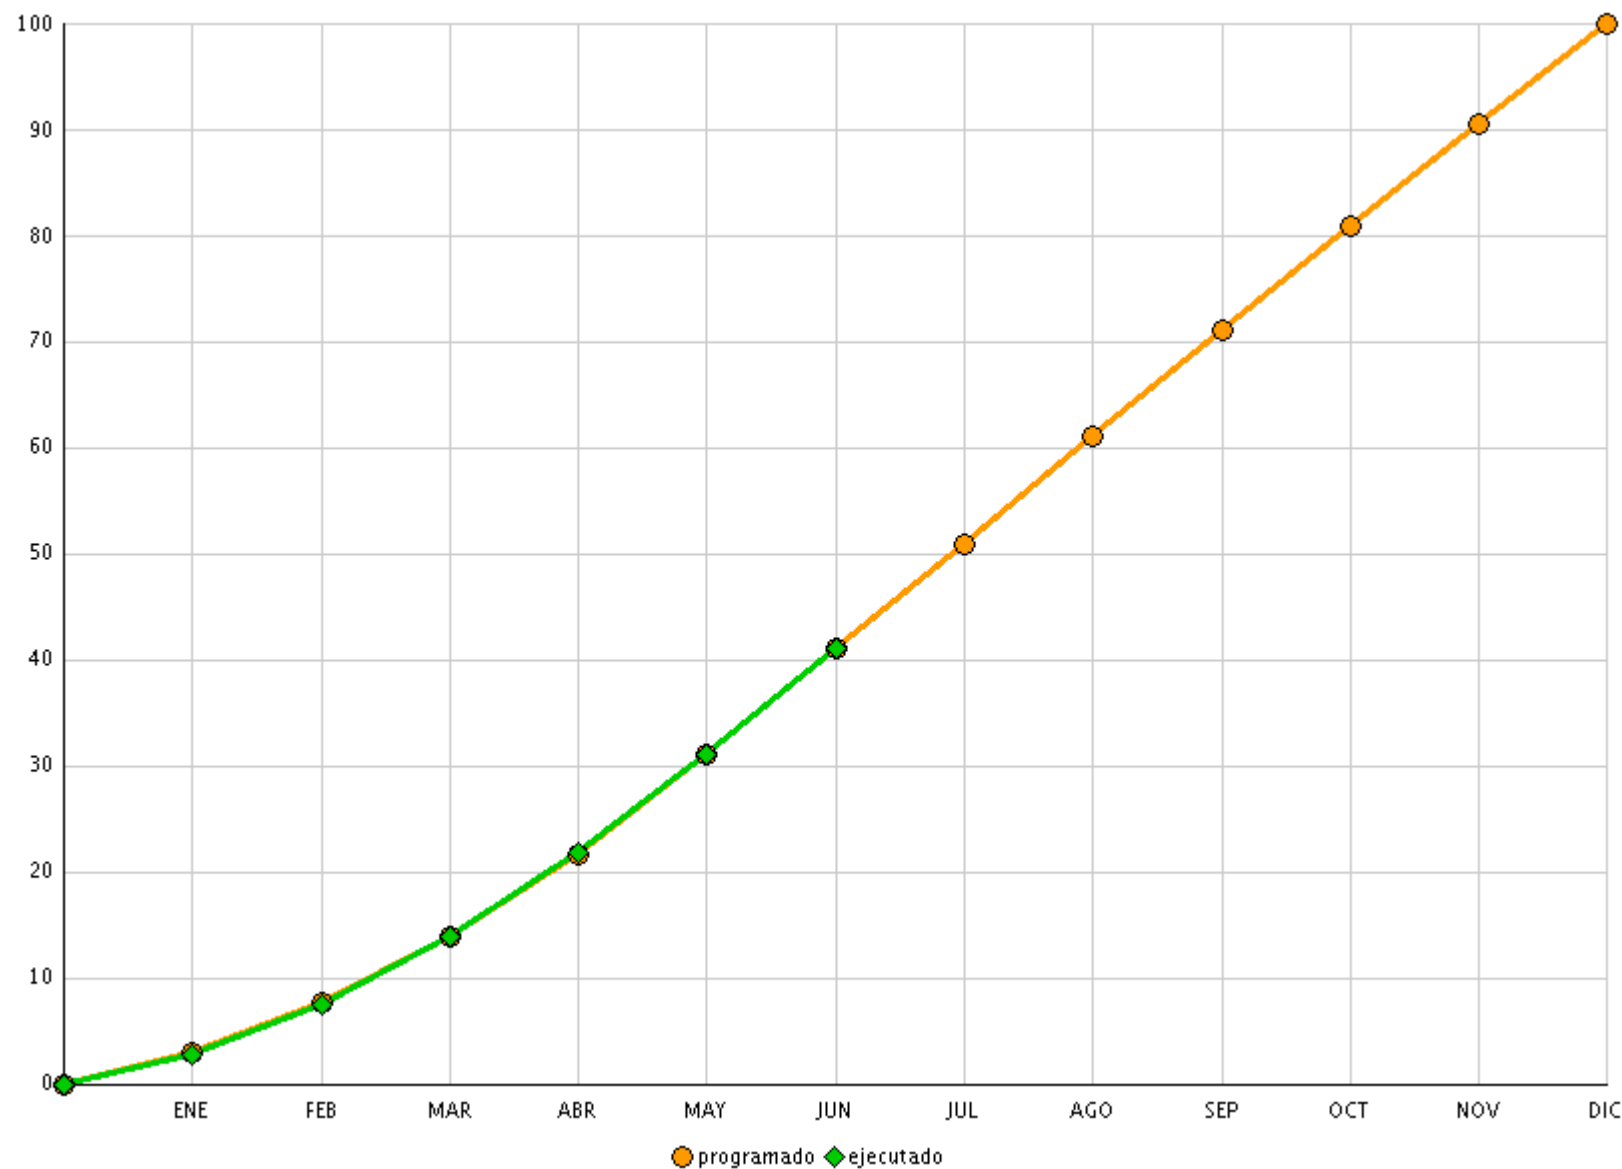


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	7.74	13.99	21.75	31.17	41.08	51.03	61.07	71.08	80.95	90.55	100.00
Ejecutado	2.88	7.62	13.87	21.93	31.20	41.11						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7805 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

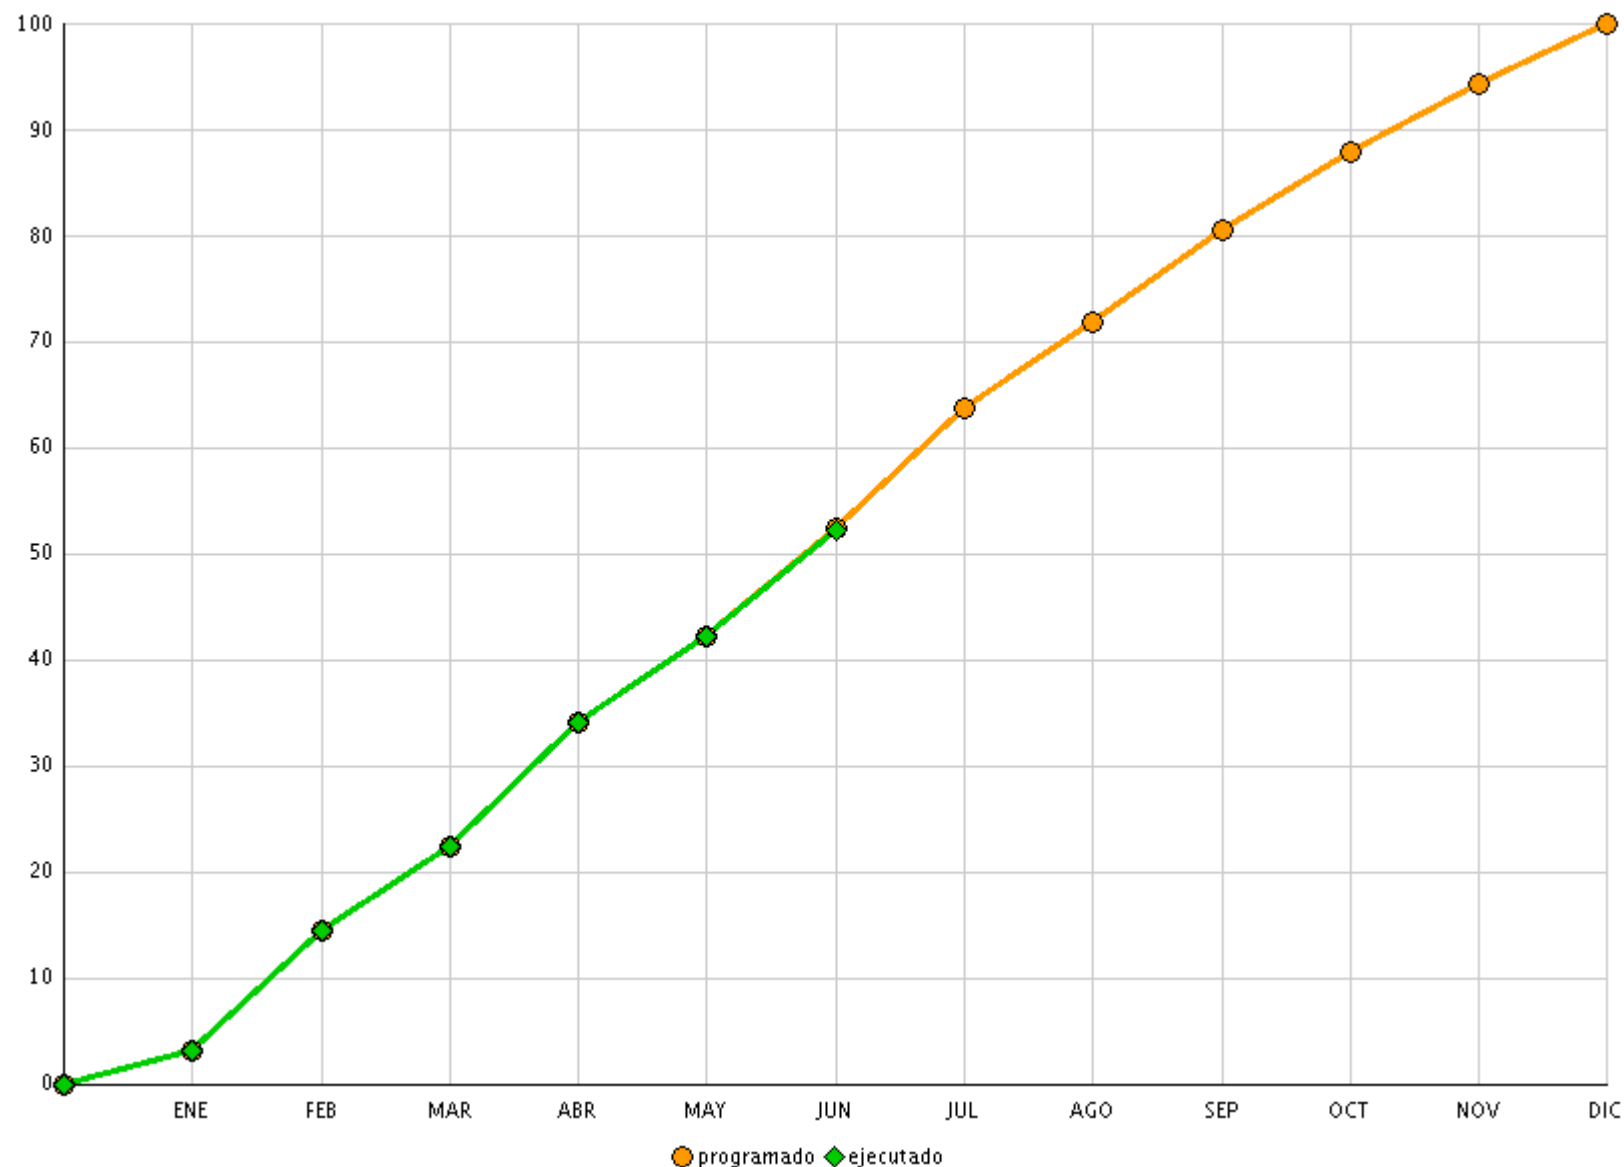


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.14	14.62	22.39	34.19	42.27	52.47	63.75	71.83	80.49	87.94	94.34	100.00
Ejecutado	3.14	14.56	22.43	34.15	42.19	52.28						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7806 Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá

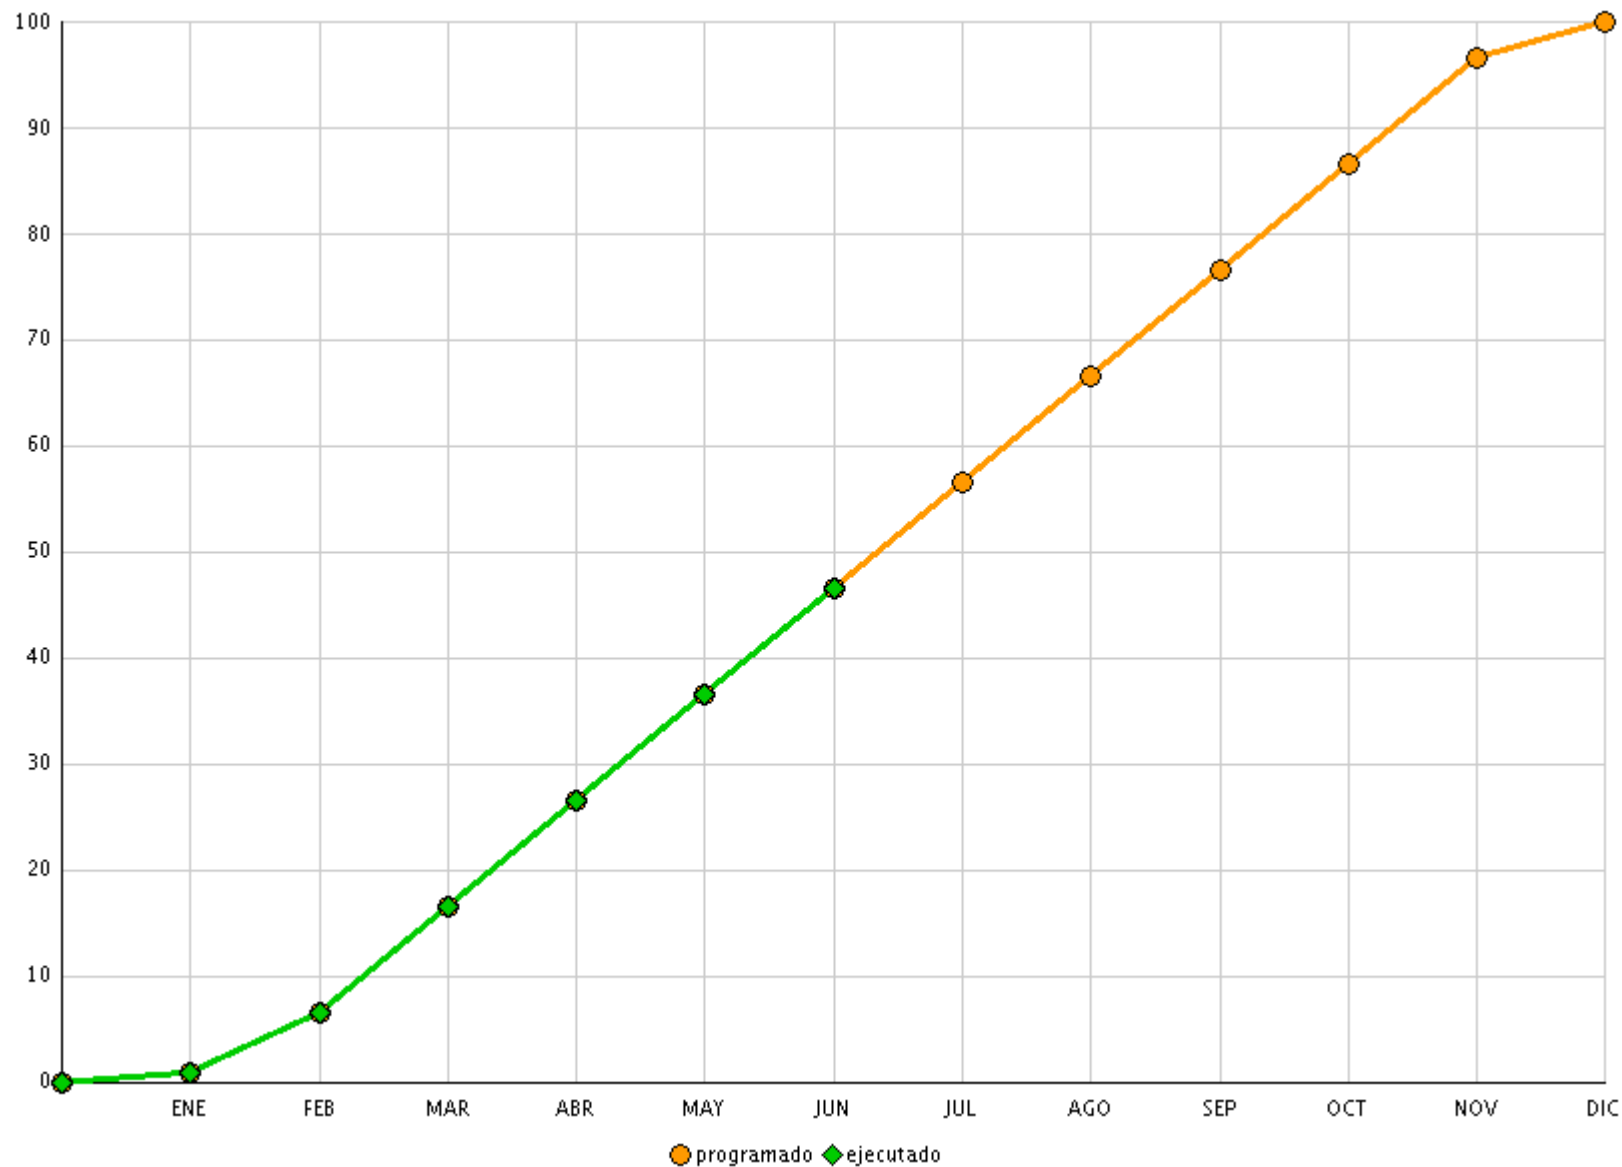


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.00	6.67	16.67	26.67	36.67	46.67	56.67	66.67	76.67	86.67	96.67	100.00
Ejecutado	1.00	6.67	16.67	26.67	36.67	46.67						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7811 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

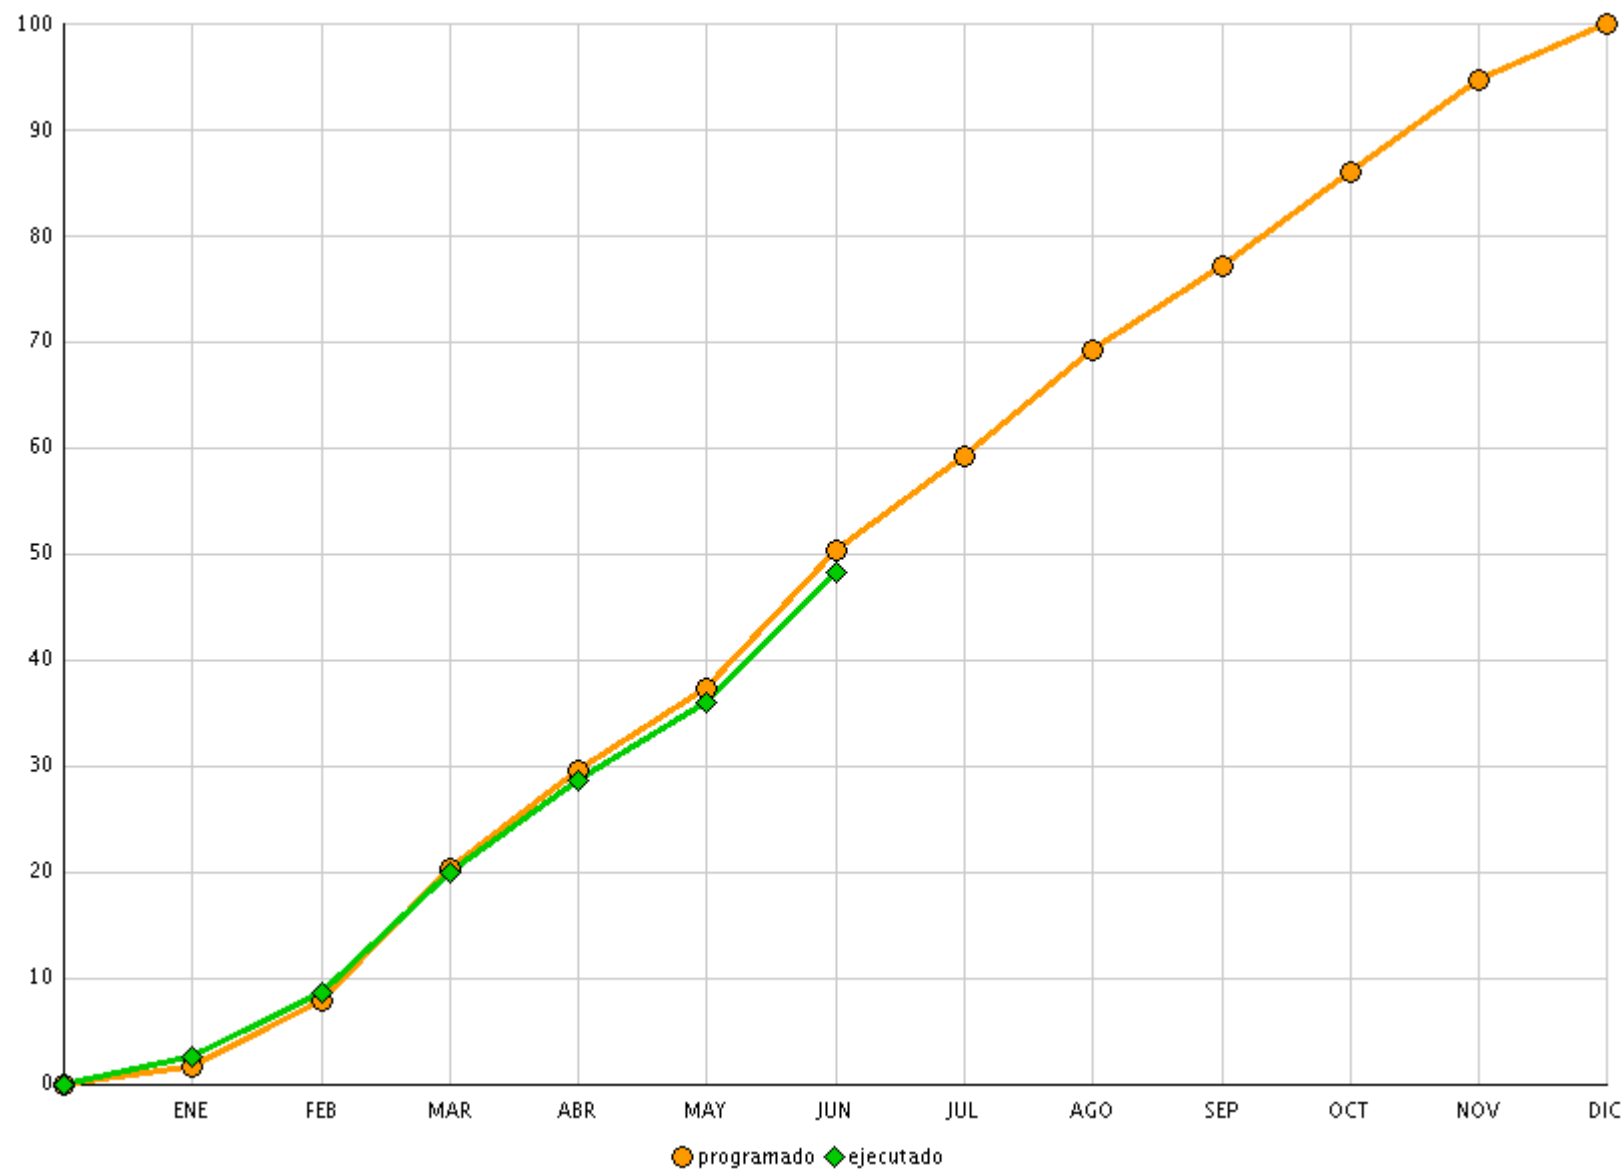


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.75	7.84	20.41	29.63	37.29	50.45	59.23	69.32	77.22	86.00	94.78	100.00
Ejecutado	2.63	8.72	19.97	28.75	35.98	48.26						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7814 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá

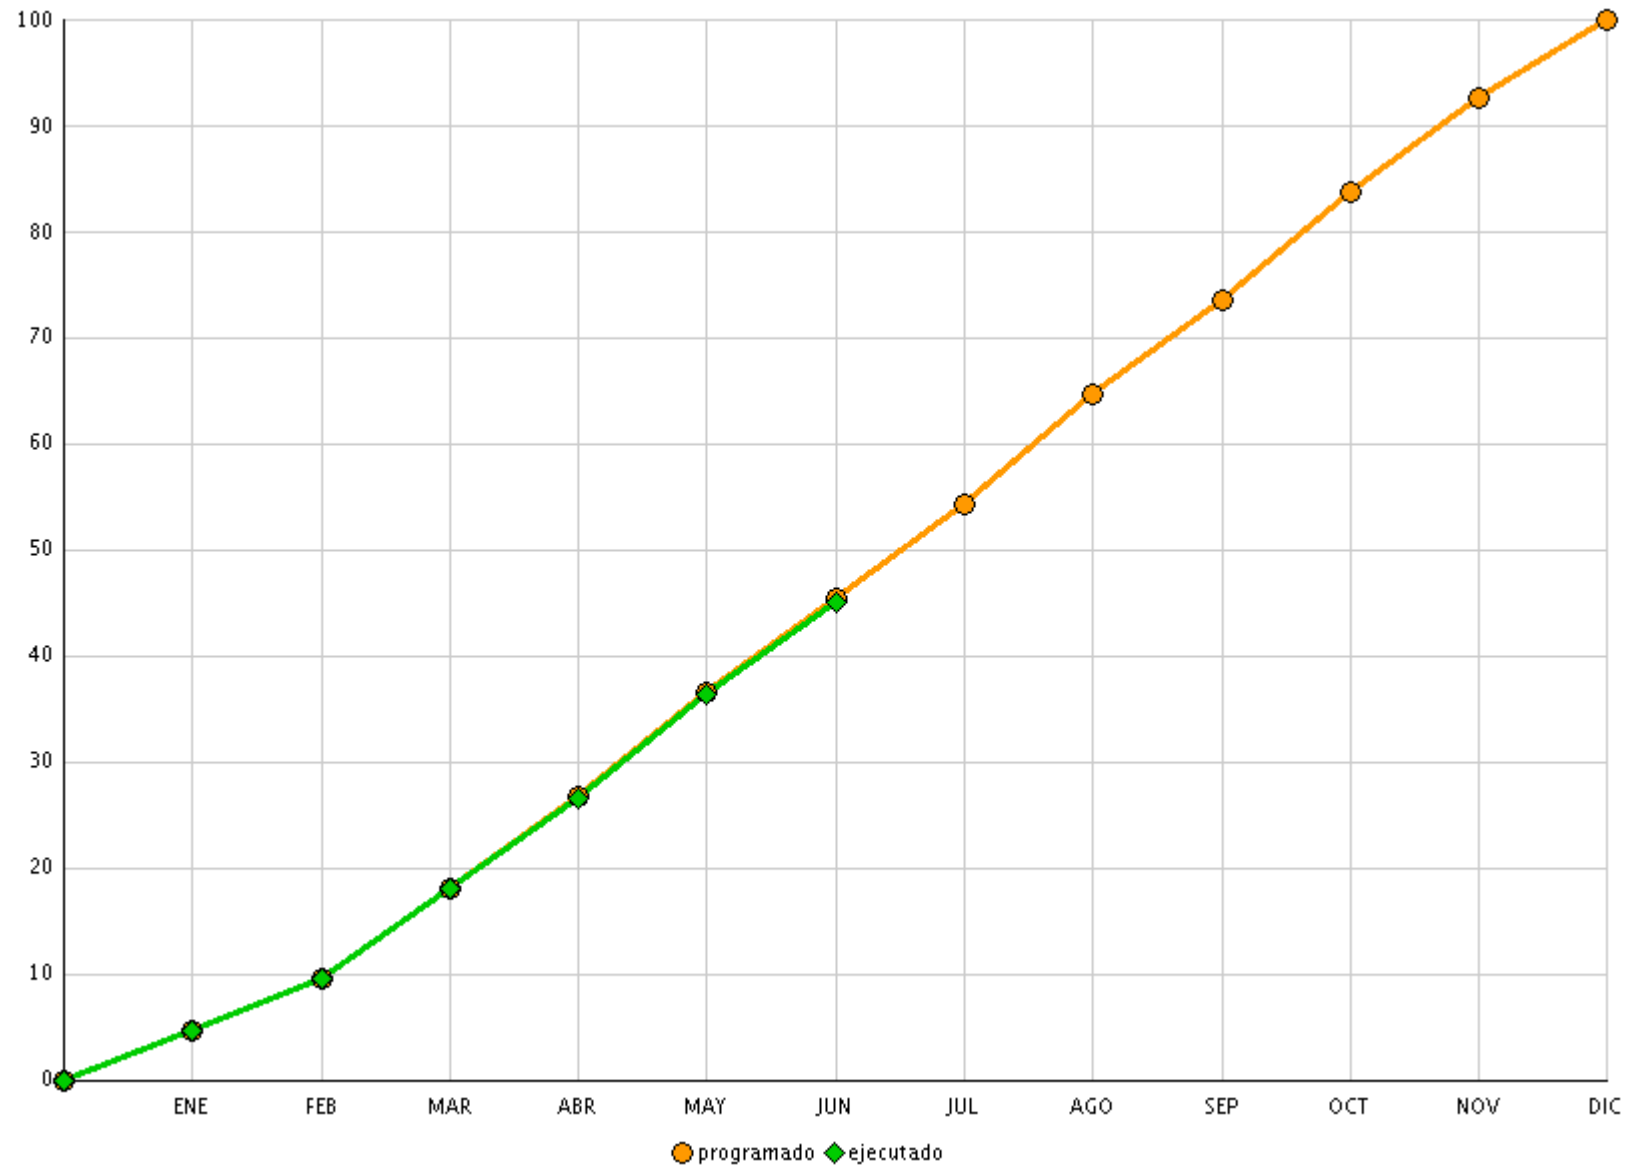


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.78	9.56	18.13	26.71	36.60	45.51	54.43	64.67	73.58	83.82	92.74	100.00
Ejecutado	4.78	9.56	18.04	26.54	36.43	45.17						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7816 Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá

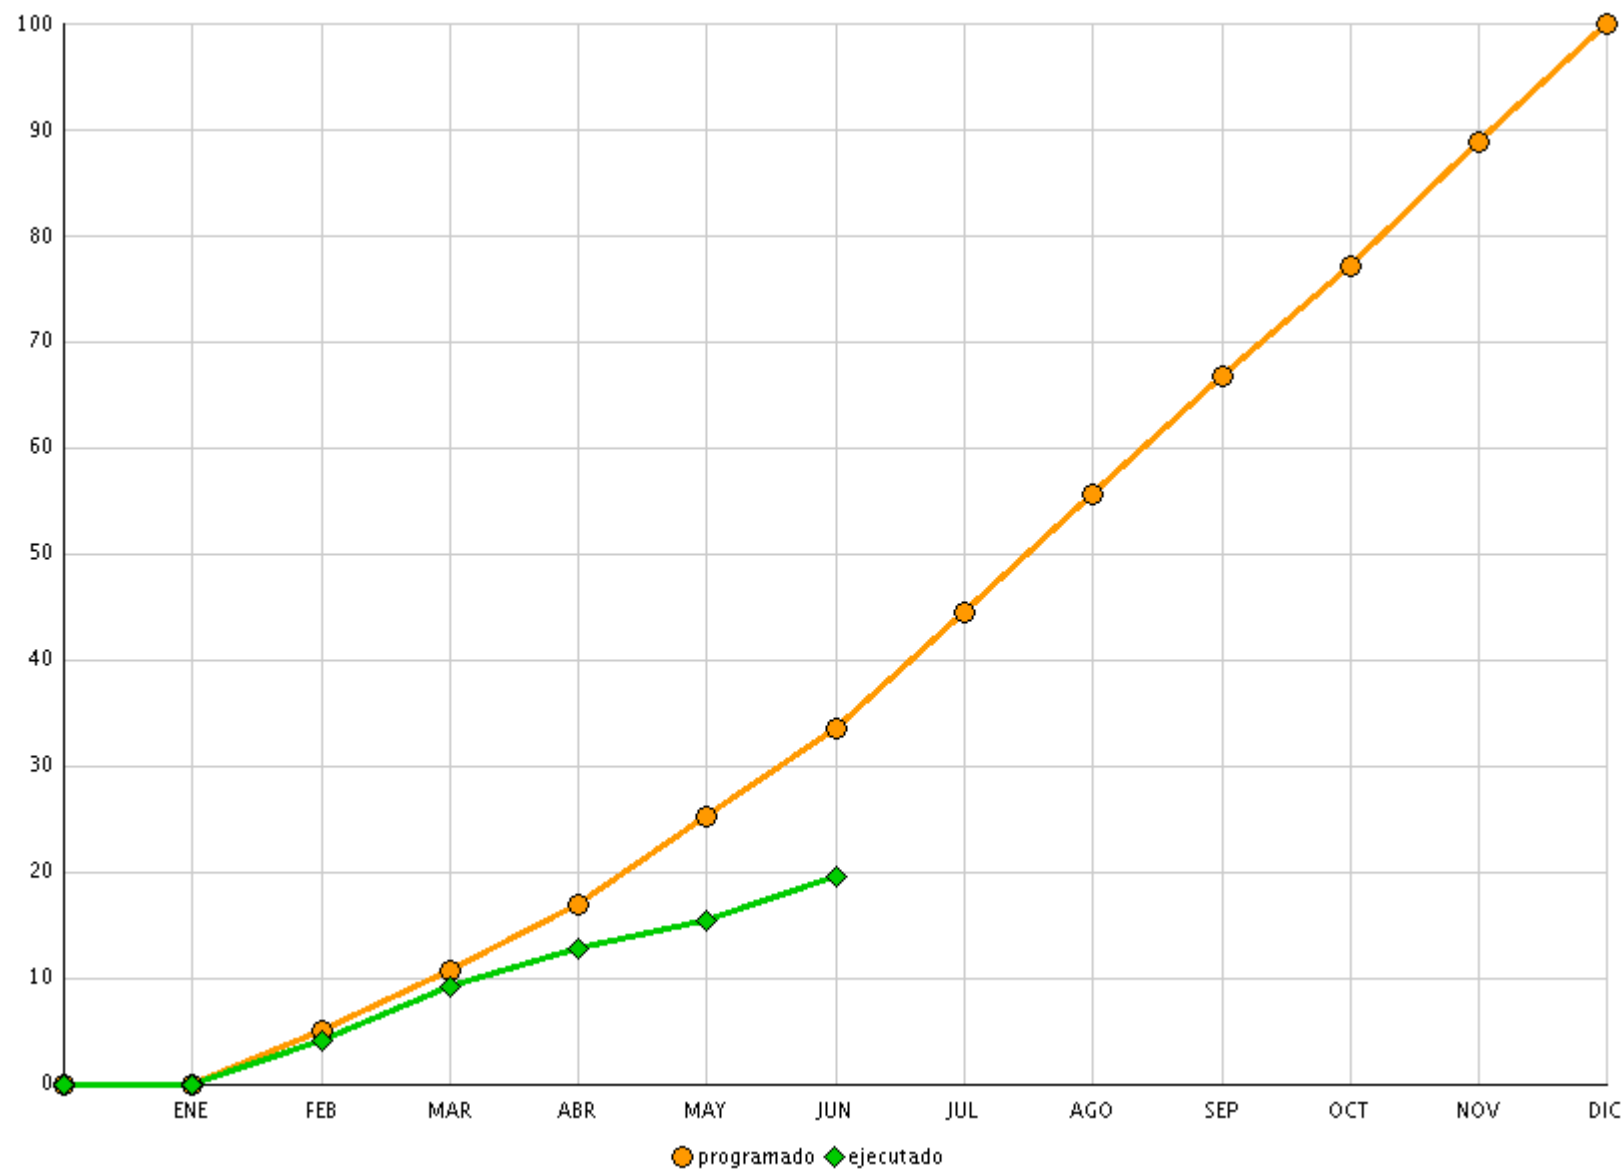


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.03	10.68	17.06	25.29	33.52	44.61	55.71	66.81	77.12	88.96	100.00
Ejecutado	0.00	4.16	9.20	12.87	15.44	19.64						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7817 Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá

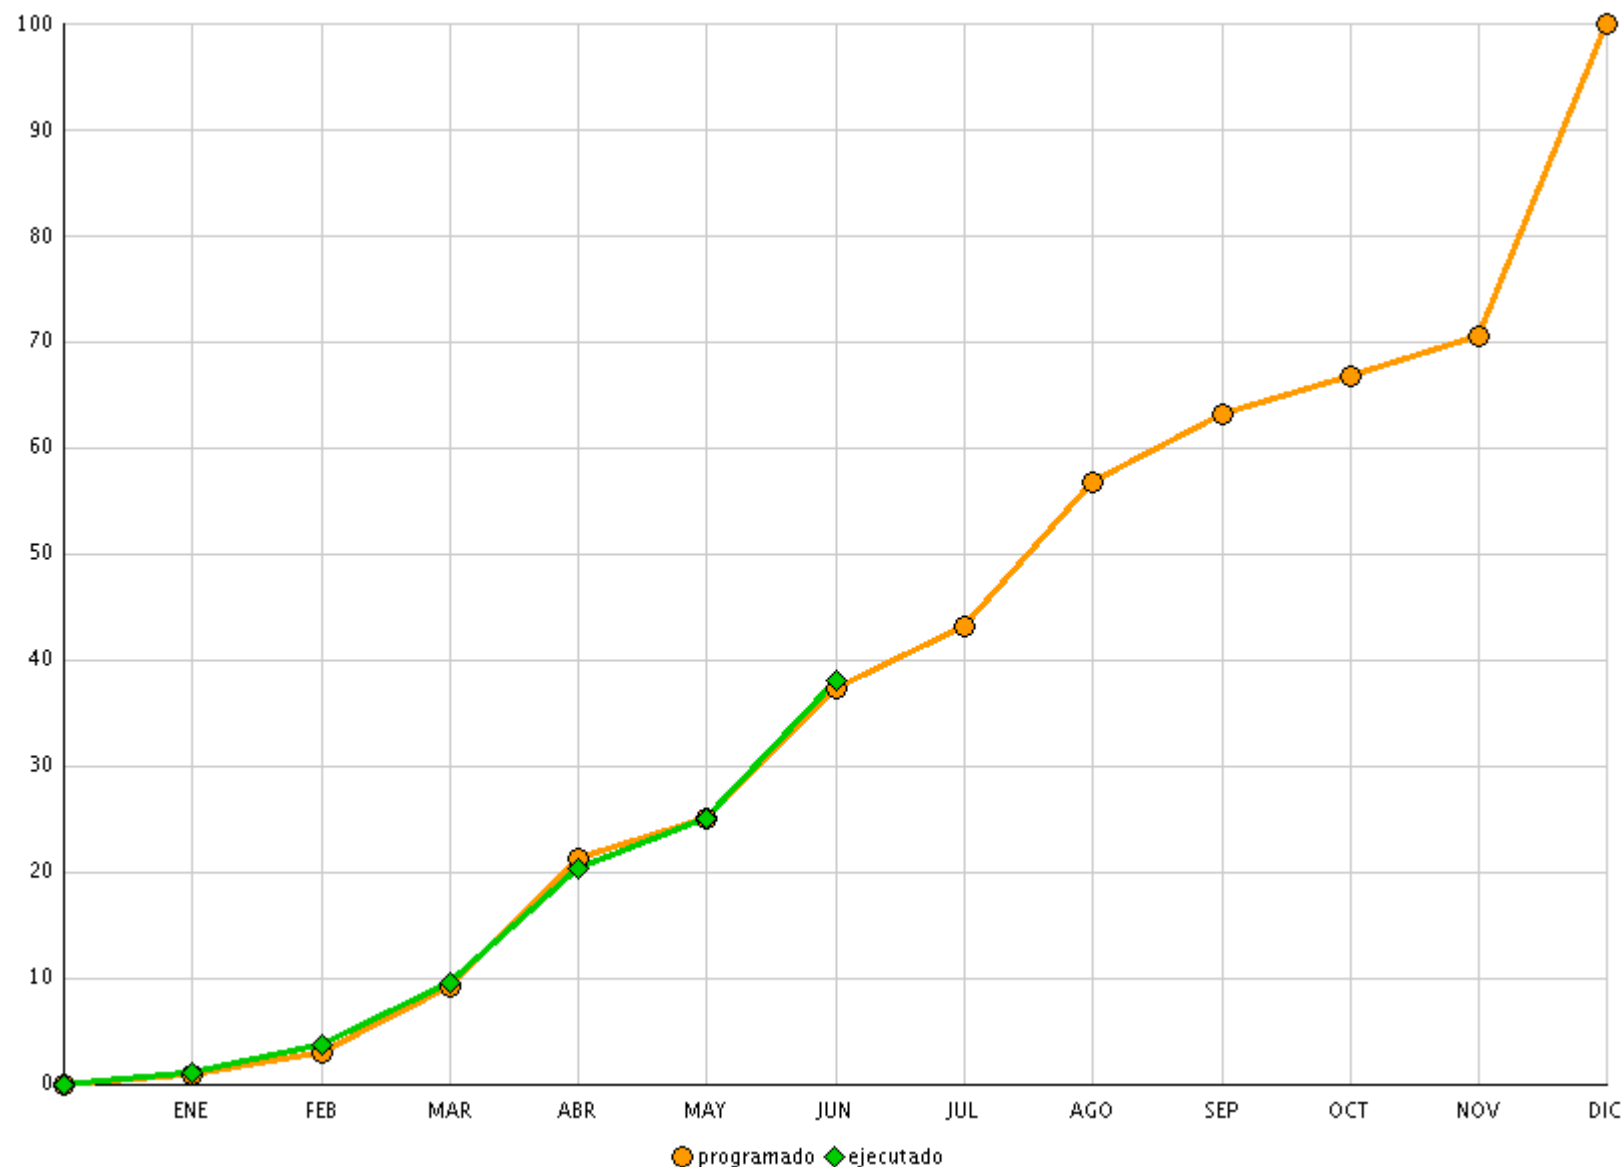


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.00	3.09	9.32	21.36	25.13	37.40	43.17	56.74	63.21	66.78	70.55	100.00
Ejecutado	1.06	3.83	9.62	20.30	25.07	38.19						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7820 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá

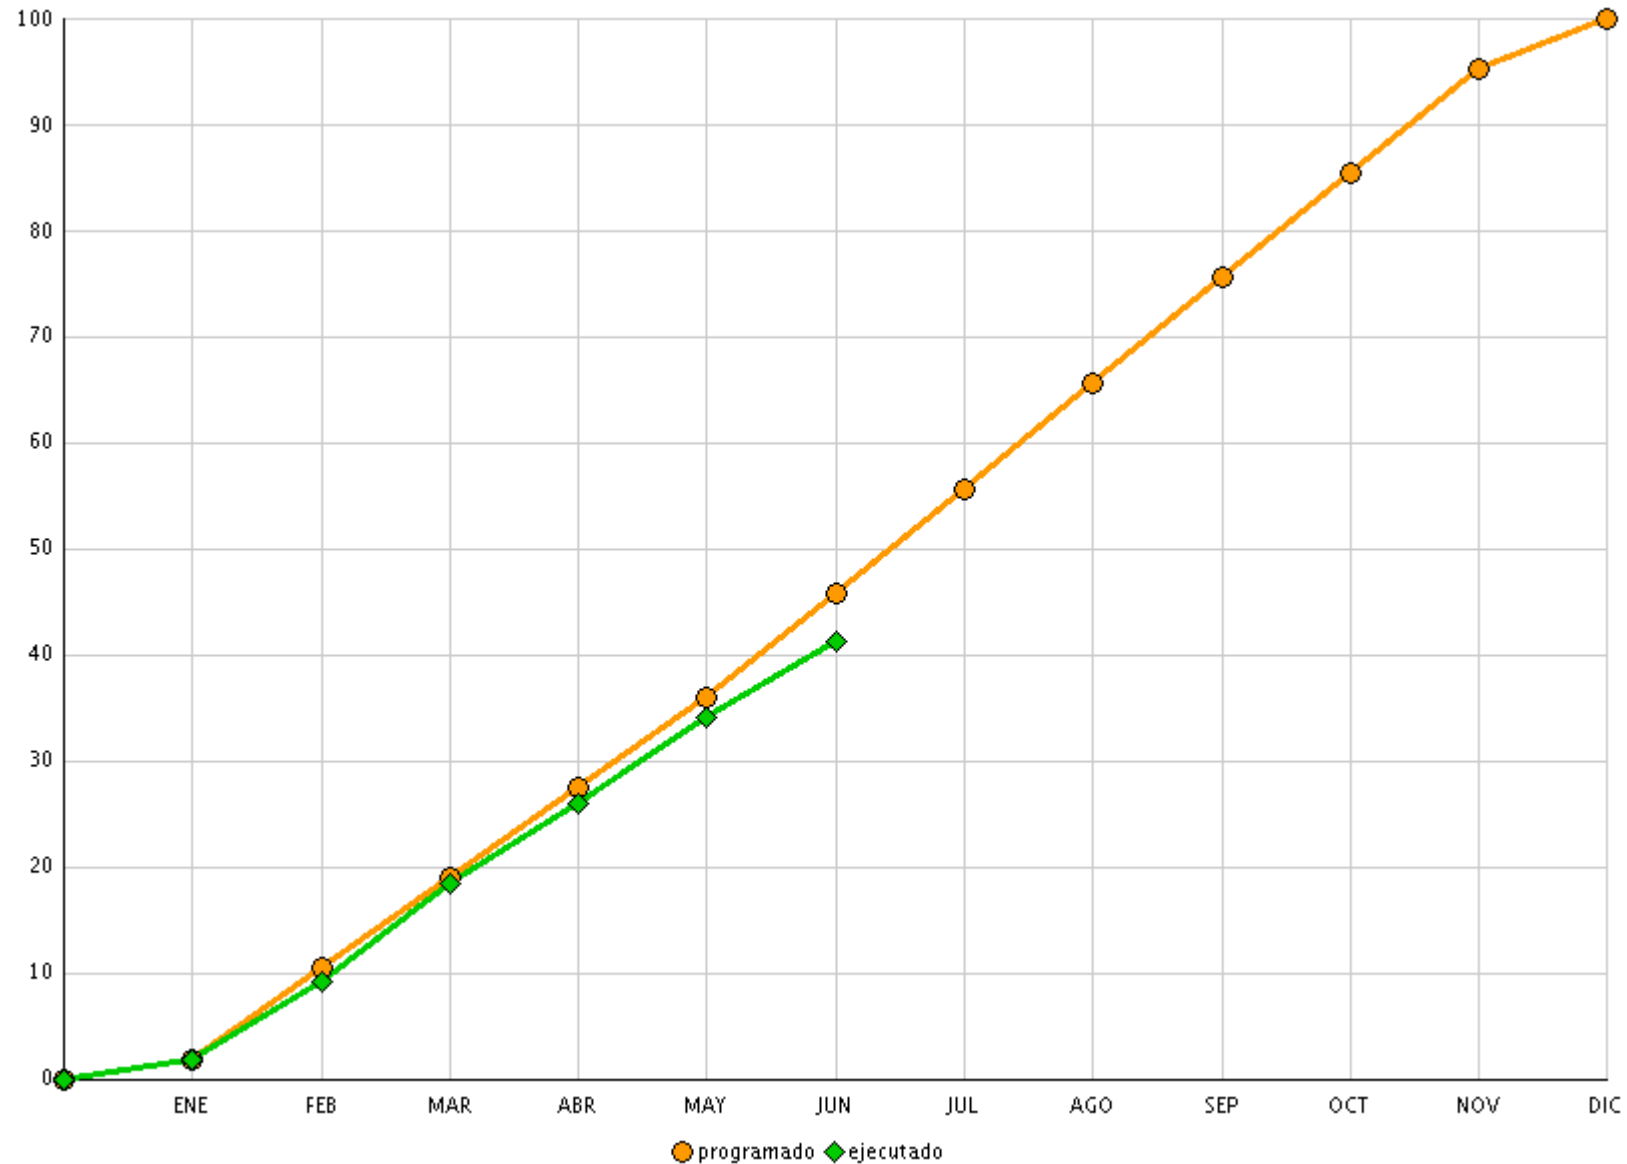

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.96	10.51	19.00	27.49	35.98	45.79	55.72	65.65	75.58	85.51	95.23	100.00
Ejecutado	1.96	9.31	18.52	26.11	34.15	41.35						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7657 16 Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL AULAS AMBIENTALES	18.00	1.00	1.00	4.00	8.00	11.00	16.00	10.00	14.00	12.00	17.00	13.00	16.00	12.00		12.00		13.00		6.00		5.00		1.00		100.00	72.00	12.96
2.	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	17.00	1.00	1.00	6.00	6.00	9.00	12.00	10.00	7.00	9.00	16.00	9.00	19.00	12.00		11.00		11.00		11.00		7.00		4.00		100.00	61.00	10.37
3.	EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMINATAS ECOLÓGICAS	2.00	0.00	0.00	6.00	18.00	9.00	16.00	10.00	9.00	7.00	19.00	11.00	12.00	12.00		11.00		12.00		9.00		9.00		4.00		100.00	74.00	1.48
4.	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC	8.00	1.00	1.00	5.00	5.00	9.00	5.00	10.00	11.00	7.00	15.00	11.00	10.00	12.00		11.00		12.00		9.00		9.00		4.00		100.00	47.00	3.76
5.	PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA	7.00	1.00	1.00	9.00	14.00	9.00	14.00	9.00	12.00	9.00	14.00	10.00	12.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	67.00	4.69
6.	VINCULACIÓN DE PERSONAS DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL EN ACCIONES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS 20 LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	28.00	1.00	1.00	7.00	8.00	9.00	9.00	15.00	8.00	15.00	12.00	10.00	21.00	10.00		15.00		9.00		3.00		3.00		3.00		100.00	59.00	16.52
7.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD.	20.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		100.00	48.00	9.60
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										59.38

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7699 15 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos		IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
Año														
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CON: AUDITORÍAS INTERNAS, INFORMES DE LEY, SEGUIMIENTOS A TEMAS ESPECIALES, PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y PLAN SUSCRITO ANTE ENTES DE CONTROL.	15.00	7.69	7.69	15.38	15.38	7.69	7.68	7.69	7.70	5.13	5.13	2.56	2.56	10.26		7.69		5.13		17.95		12.83		0.00		100.00	46.14	6.92
2. EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.	5.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	3.30
3. EJERCER EL ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN, INCLUYE LAS ASESORÍAS REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022, FOMENTANDO LA CULTURA DEL CONTROL.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.25
4. EJERCER EL ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO CON LAS REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO-CICCI.	1.25	16.70	16.70	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00	0.00	16.70		0.00		16.70		0.00		0.00		16.70		100.00	49.90	0.62
5. EJERCER EL ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL DANDO APOYO EN EL MARCO DE LAS AUDITORÍAS DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS A ENTES EXTERNOS DE CONTROL.	2.50	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08		8.08		8.08		8.08		8.08		8.09		100.00	51.51	1.29
6. SOSTENER LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A ASESORÍA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES MISIONALES DE LA SECRETARÍA.	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.00
7. REALIZAR LA OPERACIÓN DEL CANAL VIRTUAL, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A TIEMPO, CLARIDAD, CALIDEZ, COHERENCIA Y OPORTUNIDAD, DE RESPUESTAS A PQRSF Y FORMULAR ACCIONES DE MEJORA.	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.13
8. REALIZAR LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CANAL TELEFÓNICO	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.13
9. GESTIONAR CON LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD LOS AJUSTES EN LA GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES ¿ SUIT, Y SOCIALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS.	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.00
10. DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y AL MODELO DE SERVICIO Y AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.13
11. DESARROLLAR EL 100% DE LA GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y ENVIADA EN LA SDA	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.13
12. APOYAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SDA DESDE LOS ASPECTOS OPERATIVOS, TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA DEPENDENCIA	3.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	1.80
13. ASESORAR Y APOYAR COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA A LOS PROCESOS DE LA SDA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y	7.95	0.00	0.00	6.38	6.38	21.77	21.77	0.00	3.50	7.62	7.62	33.38	33.38	15.38		0.00		7.85		0.00		0.00		7.62		100.00	72.65	5.78

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7699 15 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG																													
14.	MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	1.83	0.00	0.00	14.00	14.00	25.67	25.67	25.00	25.00	14.00	14.00	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.33		100.00	81.67	1.49
15.	IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO A CARGO DEL PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		20.00		100.00	20.00	0.61
16.	REVISAR Y ACTUALIZAR DEL MAPA Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	2.45	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		9.00		8.00		25.00		12.50		100.00	12.50	0.31
17.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS.	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	8.25	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00	0.00	8.50		0.00		25.50		0.00		8.25		24.75		100.00	33.00	0.81
18.	ASESORAR Y APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE LA SDA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MIPG Y SIG	3.66	15.42	15.40	5.77	5.77	5.77	5.77	9.93	9.93	5.77	5.77	5.77	5.77	9.93		5.77		5.80		18.30		5.80		5.97		100.00	48.41	1.77
19.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD.	7.29	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		9.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	3.65
20.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA DE DIULGACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y POLITICAS DE TRASNPARENCIA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y GOBIERNO ABIERTO.	4.17	0.75	0.75	9.00	9.00	9.00	9.00	11.83	11.83	0.67	0.67	17.33	17.33	0.75		11.75		17.42		9.00		0.67		11.83		100.00	48.58	2.03
21.	PLANEAR Y DESARROLLAR LA SEMANA DE LA INTEGRIDAD EN LA ENTIDAD.	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
22.	APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	12.50	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		9.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	6.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.37

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7702 14 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y USUARIOS A CONTROLAR ENTRE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO Y LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	8.60	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.60
2.	EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE CONTROL A LA DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	35.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.50	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	44.50	15.58
3.	EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICOADMINISTRATIVAS DE CONTROL A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	15.00	0.00	0.00	4.50	4.50	9.50	6.00	4.50	4.50	4.50	4.50	19.50	21.00	4.50		4.50		19.50		4.50		20.00				100.00	40.50	6.08
4.	CONTROLAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Y DE MANEJO DIFERENCIADO A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	8.00	0.00	0.00	5.00	4.17	10.00	11.51	8.00	11.02	10.00	10.24	10.00	10.22	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		7.00		100.00	47.16	3.77
5.	CONTROLAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS PROGRAMADAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	3.40	0.00	0.00	5.00	13.67	12.00	6.09	12.00	9.68	12.00	13.37	12.00	11.83	12.00		8.00		8.00		8.00		8.00		3.00		100.00	54.64	1.86
6.	CONTROLAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES, LLANTAS USADAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	4.00	5.50	10.00	8.57	10.00	10.44	10.00	10.58	10.00	10.45	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		100.00	45.54	4.55
7.	REALIZAR EL REPORTE Y CONSOLIDACIÓN DE EFICIENCIA DE ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	6.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.50	9.00	9.50	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		11.00		100.00	44.00	2.64
8.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	2.50	0.00	0.00	9.00	7.36	9.00	10.30	9.00	9.34	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.13
9.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	0.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.23
10.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	2.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.13
11.	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO Y/O DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	0.50	1.00	1.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.23
12.	IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	4.14	0.00	0.00	4.00	4.00	10.00	10.00	15.00	15.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00		12.00		7.00		7.00		7.00		4.00		100.00	53.00	2.19
13.	DESARROLLAR PROYECTOS DE PROCESAMIENTO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	1.76	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		12.00		10.00		9.00		7.00		5.00		100.00	47.00	0.83
14.	DESARROLLAR PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE 800 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO	2.10	0.00	0.00	4.00	4.00	12.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		10.00		4.00		100.00	56.00	1.18

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 49.98

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7710 12 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.	75.08	3.45	3.45	7.64	5.59	8.61	9.68	9.34	10.32	9.34	9.34	10.36	10.36	9.68		9.68		9.68		7.98		7.98		6.26		100.00	48.74	36.59
2.	REALIZAR JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL ARBOLADO URBANO POR PARTE DE LA COMUNIDAD.	0.05	0.00	0.00	5.56	5.60	11.11	11.10	11.11	11.08	11.11	11.11	5.56	5.56	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		0.00		100.00	44.45	0.02
3.	ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN PERMISIVO Y RESIDUAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.	3.95	0.00	0.00	3.23	3.20	9.68	9.70	9.68	9.69	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68		9.68		9.68		9.68		9.68		9.65		100.00	41.95	1.66
4.	REALIZAR EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN, TENENCIA, USO O COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA.	14.88	1.38	1.38	6.35	6.35	7.45	7.45	9.47	9.47	9.52	9.52	10.15	8.61	9.52		9.47		10.10		9.52		9.52		7.55		100.00	42.78	6.37
5.	REALIZAR JORNADAS PEDAGÓGICAS TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL RECURSO FLORA Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	0.04	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	0.02
6.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	2.23	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.00
7.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	0.77	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	0.36
8.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	2.23	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.00
9.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.77	2.00	2.00	9.00	7.36	9.00	9.34	9.00	10.30	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	0.36

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 47.39

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7711 12 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR ACCIONES DE RESCATE Y DE CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE, Y REALIZAR SU DISPOSICIÓN FINAL ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.	20.76	7.24	7.24	7.16	7.16	7.60	7.60	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	6.90		6.90		11.67		6.90		8.49		11.67		100.00	47.47	9.85
2.	REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE Y AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO.	1.45	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	0.66
3.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO TENDIENTE A PROTEGER EL RECURSO FAUNA SILVESTRE Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	0.86	0.00	0.00	3.80	3.80	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62		9.62		9.62		9.62		9.62		9.62		100.00	42.28	0.36
4.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	3.04	5.00	5.00	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64		8.64		8.64		8.64		8.64		8.60		100.00	48.20	1.47
5.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	0.96	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.43
6.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.04	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.37
7.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.96	0.00	0.00	9.00	3.27	9.00	12.82	9.00	10.91	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.43
8.	REALIZAR ACTUALIZACIÓN AL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE.	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	12.41
9.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE.	55.14	2.69	2.69	5.41	5.41	5.41	5.41	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11		10.81		10.81		10.81		10.81		10.81		100.00	37.84	20.86

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 47.85

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7725 14 Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y CONTEXTUALIZAR LA RED CIUDADANA Y EL MODELO DE GESTION DE LA INFORMACIÓN A PARTIR DE LOS MICROSENSORES DE BAJO COSTO EN EL CONTEXTO DE CIENCIA CIUDADANA.	30.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	14.99
2.	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO EN MARCO DE REDES CIUDADANAS	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	50.00	5.00
3.	IDENTIFICAR, CONCEPTUALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR PROYECTOS DE GESTIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL.	50.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40		8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		100.00	49.90	24.95
4.	IDENTIFICAR Y EVALUAR NUEVOS PROYECTOS DE GESTIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE INTERÉS PARA EL CIMAB.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	50.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.94	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7743 11 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENDER LAS SOLICITUDES DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS SEGÚN TRÁMITES DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO O EN ATENCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS POR AFECTACIÓN DEL SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS.	16.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	8.00
2. DESARROLLAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS, PASIVOS AMBIENTALES E INSTALACIONES EN DESMANTELAMIENTO REQUERIDAS.	17.00	0.00	0.00	16.67	16.67	6.25	6.25	10.41	8.33	10.41	16.67	10.42	4.17	10.42		10.42		10.42		8.33		6.25		0.00		100.00	52.09	8.86
3. ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON EVALUACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL DISTRITO CAPITAL.	10.00	3.33	3.33	9.52	3.81	9.52	9.05	9.52	9.52	9.52	11.60	9.52	10.80	9.52		9.52		9.52		9.52		6.19		4.80		100.00	48.11	4.81
4. REALIZAR CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A 567 PREDIOS DE USUARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL.	10.00	8.66	8.66	9.45	4.72	9.45	11.81	9.45	9.45	7.87	8.66	8.66	8.66	7.87		9.45		9.45		7.87		7.87		3.95		100.00	51.96	5.20
5. GARANTIZAR LAS ACCIONES EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE PRESENTAN EL INSTRUMENTO AMBIENTAL Y A LOS ESTABLECIDOS U OTORGADOS.	15.00	0.00	0.00	6.82	6.82	9.09	13.64	13.64	9.09	9.09	9.00	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		6.82		100.00	47.64	7.15
6. GARANTIZAR LAS ACCIONES DE CONTROL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTOS AMBIENTALES O CON SOLICITUDES, SEGÚN TRÁMITES ESTABLECIDOS.	15.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	8.00	10.00	10.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	6.90
7. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	3.00	0.00	0.00	9.00	7.50	9.00	10.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.35
8. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	3.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	1.41
9. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.35
10. REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO, Y/O DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.35
11. CAPTURA DE INFORMACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical

100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:

46.37

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaria Distrital de Ambiente

7769 16 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS: SELECCIÓN DE PREDIOS Y DETERMINACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		15.00		20.00		20.00		100.00	15.00	0.15
2.	IMPLEMENTACIÓN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA GENERAR CORREDORES DE BOSQUE Y AGUA PARA LOS BOGOTANOS: INTERVENCIÓN DE 19HA	5.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00		20.00		20.00		15.00		12.00		2.00		100.00	26.00	1.30
3.	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS EXISTENTES: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONVENIOS, ARTICULACIÓN, PLANIFICACIÓN DE ACCIONES EN NUEVOS SENDEROS Y OPERACIÓN SENDERO GUADALUPE AGUANOSO	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
4.	ADECUACIÓN DE 1 ZONA DE CANTERA PARA PARQUES Y EQUIPAMENTOS: ACCIONES DE PLANIFICACIÓN E INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		8.00		100.00	27.00	1.62
5.	IMPLEMENTACIÓN DE HITOS DE AMOJONAMIENTO SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO A INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL.	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	8.00	15.00	13.00	20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		100.00	30.00	1.50
6.	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS Y ACUERDOS DE CONSERVACIÓN	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	15.00		15.00		15.00		20.00		18.00		3.00		100.00	14.00	0.56
7.	IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE ÁREAS Y ELABORACIÓN DE LOS RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ZONAS A INTERVENIR.	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.25	10.00		10.00		10.00		25.00		25.00		5.00		100.00	15.25	1.78
8.	ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS A LAS ÁREAS PRIORIZADAS, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO.	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.25	0.00		0.00		25.00		30.00		30.00		15.00		100.00	15.25	1.78
9.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.13	2.69	2.20	8.07	2.84	8.51	14.06	5.38		5.38		0.25		0.27		32.29		36.16		100.00	21.23	2.48
10.	PRIORIZAR ÁREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICAS DE FERTILIZACIÓN, PODA, RIEGO, REPLANTE, ENTRE OTRAS. ASÍ COMO LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA INDUCCIÓN DE TRAYECTORIAS ECOLÓGICAS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	5.00	5.00	75.00	5.00		10.00		25.00		25.00		25.00		0.00		100.00	100.00	8.33
11.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, CON LA REVISIÓN FITOSANITARIA, ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICA, PLATEO Y REPLANTE DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS.	8.34	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50		0.50		22.50		25.00		25.00		24.00		100.00	2.50	0.21
12.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS METAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	4.16
13.	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE LOS CUATRO CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA URBANO-RURAL ENTRE ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.C.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
14.	APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR Y	5.00																									100.00	45.00	2.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaria Distrital de Ambiente

7769 16 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO A CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN BOGOTÁ D.C.		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00						
15. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES EN EL DIAGNÓSTICO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORREDORES ECOLÓGICOS.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	2.10		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		32.27	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7778 15 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE LA RMCAB	5.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.66	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
2.	REALIZAR LA VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS PROVENIENTES DE LAS ESTACIONES DE LA RMCAB	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.50
3.	ELABORAR Y PUBLICAR EN LA PÁGINA DE LA RMCAB 17 INFORMES PERIÓDICOS DE CALIDAD DEL AIRE	3.00	5.88	0.00	5.88	11.76	11.76	11.76	5.88	5.88	5.88	5.88	17.64	17.64	5.88		5.88		11.76		5.88		5.88		11.80		100.00	52.92	1.59
4.	REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA INTEGRACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CAR Y DE LA RMCAB.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
5.	APOYAR TÉCNICAMENTE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SENSORES DE BAJO COSTO, ÚTILES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE MONITOREO DE EXPOSICIÓN A LA CONTAMINACIÓN.	2.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	16.66	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.00
6.	AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOS (02) DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN AIRE 2030 (I, II - 2022).	5.00	2.50	0.00	2.50	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50		2.50		10.00		10.00		12.50		12.50		100.00	50.00	2.50
7.	AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOS (02) DOCUMENTOS TÉCNICOS, ASÍ; 1. INFORME DE MODELACIÓN DE CALIDAD DE AIRE SOBRE BOGOTÁ DEL 2022.	5.00	2.50	0.00	2.50	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50		2.50		10.00		10.00		12.50		12.50		100.00	50.00	2.50
8.	AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOS (02) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN DEL SATAB (I - II - 2022).	5.00	2.50	0.00	2.50	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50		2.50		10.00		10.00		12.50		12.50		100.00	50.00	2.50
9.	REALIZAR LA INTERVENCIÓN A LAS FUENTES FIJAS UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	4.50	5.00	0.00	10.00	13.89	5.00	10.28	10.00	13.19	10.00	12.71	5.00	9.58	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	59.65	2.68
10.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE QUEJAS, DERECHOS DE PETICIÓN, ENTES DE CONTROL Y RADICADOS ALLEGADAS A LA ENTIDAD A TRAVÉS DE VISTAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	3.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.66	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.50
11.	REALIZAR LAS MEDICIONES A LOS VEHÍCULOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES MÓVILES.	4.50	8.33	0.00	8.33	3.48	8.33	8.41	8.33	10.57	8.33	9.08	8.33	11.82	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	43.36	1.95
12.	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS VISITAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA A LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL.	1.50	4.29	0.00	4.29	4.62	5.71	9.23	7.14	9.23	10.00	10.00	10.00	8.33	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.57		100.00	41.41	0.62
13.	ESTRUCTURAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A FUENTES MÓVILES	1.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	16.66	8.33	8.33	8.33	16.66	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	0.75
14.	DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMISIÓN DE RUIDO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO, GENERADOS POR VISITAS CON MEDICIÓN/SIN MEDICIÓN Y NO EFECTIVAS.	12.75	0.00	0.37	7.30	9.89	10.30	8.02	10.30	8.86	10.30	16.32	10.30	10.54	10.30		10.30		10.30		10.30		10.30		0.00		100.00	54.00	6.89
15.	REALIZAR DOCUMENTOS TÉCNICOS: OFICIOS EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE EMISIÓN DE RUIDO CONCEPTOS TÉCNICOS ACLARATORIO Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS QUE NO	2.25	0.00	3.50	10.00	11.50	10.00	11.50	10.00	10.00	10.00	9.50	10.00	7.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	53.00	1.19

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7778 15 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
REQUIEREN VISITA TÉCNICA.																												
16. ASEGURAR LA CONTINUA OPERACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO QUE CONFORMAN LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DEL DISTRITO	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
17. GESTIONAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA ACREDITACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL ISO 1996 LLEVADO A CABO POR LA SDA ANTE EL IDEAM	3.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.66	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.50
18. ACTUALIZAR LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE TODAS LAS LOCALIDADES URBANAS DEL DISTRITO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
19. ELABORAR UN INFORME TÉCNICO SEMESTRAL DE RUIDO AMBIENTAL QUE SIRVA COMO INSUMO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE URBANO DE AFECTADOS POR RUIDO (%PUAR)	3.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.66	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.50
20. AVANCE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL - PEV. POR MEDIO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN.	4.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.25
21. AVANCE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL - PEV. POR MEDIO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN.	3.00	8.33	0.00	8.33	7.92	8.33	3.33	8.33	9.58	8.33	8.33	8.33	12.09	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	41.25	1.24
22. AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL ADECUADO PROCESO INTERNO DE LOS ELEMENTOS PEV ILEGALES EN EL DCL CON LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE OPERATIVOS DE CONTROL.	3.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	16.66	0.50
23. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - SIIPEV PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 610/2015.	1.50	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	41.65	0.62
24. EVALUACIÓN TÉCNICA A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. - PEV, DE ACUERDO CON LAS PETICIONES Y QUEJAS QUE ALLEGUEN A GRUPO.	3.00	7.57	0.00	8.40	1.42	8.40	5.33	8.40	9.59	8.40	25.21	9.23	5.21	8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		7.60		100.00	46.76	1.40
25. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO.	3.75	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	1.76
26. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS.	1.25	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.56
27. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.75	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.69
28. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	1.25	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.56

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 48.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7780 13 Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 23 Bogotá rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADELANTAR GESTIÓN QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO RURAL DISTRITAL.	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	45.00	4.50
2.	ADELANTAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ALIANZAS SUSCRITAS PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO RURAL	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
3.	REALIZAR CAPACITACIONES EN FORTALECIMIENTO AMBIENTAL A LA COMUNIDAD RURAL	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50
4.	INCORPORAR NUEVOS PREDIOS MEDIANTE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS PARA FORMALIZAR ACUERDOS DE USO DEL SUELO CON BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE USO DEL SUELO CON BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES SUSCRITOS PREVIAMENTE EN PREDIOS RURALES CON ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
6.	COMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA PREFACTIBILIDAD DE LAS ÁREAS IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.00
7.	CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL CON LOS HABITANTES RURALES DEL D.C.	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.50
8.	IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD, SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA PREDIO RURAL	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	23.00	0.69
9.	FORMALIZAR LOS ACUERDOS DEL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	20.00	5.00
10.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN INCLUIDAS EN LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS SUSCRITOS PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00		0.00		0.00		50.00		20.00		0.00		100.00	20.00	3.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										36.69

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7789 15 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos											

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO HÍDRICO PARA LA VIGENCIA 2021.	1.90	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.90
2.	IDENTIFICAR LOS PRESUNTOS INFRACTORES DE LA NORMA DE VERTIMIENTOS A RED DE ALCANTARILLADO Y EMISIÓN DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.	9.50	2.00	2.00	0.50	0.50	16.00	9.92	10.00	10.53	10.00	12.15	10.00	9.11	10.00		9.00		9.50		9.00		7.00		7.00		100.00	44.21	4.20
3.	ATENDER LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y OTROS DE CARÁCTER PRIORITARIO DE USUARIOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD.	3.80	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.75
4.	IMPULSAR JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS EN LOS CUALES SE EVIDENCIÓ UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO NORMATIVO.	3.80	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	7.00	10.00	14.00	10.00	21.30	10.00	0.00	10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	51.30	1.95
5.	REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO HÍDRICO PARA LA VIGENCIA 2021.	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
6.	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.00	7.50	7.50	7.50		7.50		7.50		7.50		20.00		12.50		100.00	37.00	2.78
7.	REALIZAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICA ASOCIADAS AL SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES OTORGADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	10.50	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	5.00	25.00		5.00		5.00		5.00		20.00		15.00		100.00	29.00	3.05
8.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL TANTO TÉCNICAS COMO JURÍDICAS A PRESUNTOS INFRACTORES QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO.	12.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12.00	3.00	3.00	7.00	7.00	13.00		3.00		3.00		3.00		13.00		37.00		100.00	28.00	3.36
9.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	4.80	2.00	2.00	9.00	6.80	9.00	11.20	9.00	8.82	9.00	9.18	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	2.26
10.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	1.80	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	0.85
11.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.60	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.62
12.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	1.80	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	1.29	9.00	13.18	9.00	11.42	9.00	7.88	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	44.77	0.81
13.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO DE BOGOTÁ Y SUS FACTORES DE IMPACTO. (RCHB - PMAE - RMAS)	20.00	0.00	0.00	18.30	19.82	10.39	10.49	10.65	10.26	12.41	9.81	9.44	10.07	9.11		10.64		6.92		7.17		2.94		2.03		100.00	60.45	12.09
14.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y CONTROL DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD.	5.00	0.00	0.00	4.96	5.04	12.80	10.73	13.82	12.30	12.32	16.39	8.64	5.38	4.72		6.47		9.23		11.26		8.68		7.10		100.00	49.84	2.49
15.	REDEFINIR Y REFORMULAR EL PROGRAMA DE MONITOREO DEL	3.00																									100.00	95.00	2.85

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaria Distrital de Ambiente

7789 15 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hidrico del Distrito Capital Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
DC CON BASE EN LAS CANTIDADES Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL CPS NO. SDA-20211379 CELEBRADO CON LA UT PSL-ANQ PARA EL 2022		0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	30.00	35.00	30.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
16. REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS EN LA MATRIZ AGUA DE MANERA AUTÓNOMA.	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	11.00	11.60	17.30	15.60	15.50	14.40	9.00	11.10	7.00		11.40		4.60		8.60		6.60		4.00		100.00	57.70	3.46
17. ANALIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DEL DISTRITO Y/O LA DERIVADA DE LOS PROCESOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	30.00	0.45
18. ELABORAR DOCUMENTOS CON DIRECTRICES EN EL MANEJO Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	0.90	0.00	0.00	8.07	8.07	5.70	5.00	10.74	10.00	10.01	11.00	8.40	9.00	8.40		16.80		4.32		4.84		5.68		17.04		100.00	43.07	0.39
19. REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		80.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		48.24		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7794 12 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	11.11	0.00	0.00	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33		9.33		9.33		9.33		9.33		6.70		100.00	46.65	5.18
2.	VERIFICAR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	11.11	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	5.11
3.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES EN LA CIUDAD.	11.11	0.80	0.80	9.20	9.20	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	5.11
4.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES Y OTROS ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.	5.56	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	5.00		5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		100.00	60.00	3.34
5.	FORMULAR, PRIORIZAR Y DESARROLLAR PROYECTOS CONJUNTOS	5.55	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	5.00		5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		100.00	60.00	3.33
6.	DESARROLLAR PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS VOLUNTARIOS OFRECIDOS POR LA SEGAE.	5.56	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	35.00	1.95
7.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA AMBIENTAL DISTRITAL - PREAD.	5.55	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	35.00	1.94
8.	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS O ESCENARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES.	3.71	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		28.00		5.00		30.00		2.00		100.00	25.00	0.93
9.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES	3.71	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		25.00		7.00		5.00		7.00		100.00	36.00	1.34
10.	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES.	3.70	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	45.00	1.67
11.	MESAS DE ARTICULACIÓN CON ACTORES GREMIALES, ACADÉMICOS E INTERINSTITUCIONALES.	3.71	1.00	1.00	4.00	4.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		12.00		12.00		9.00		100.00	40.00	1.48
12.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS.	3.70	0.00	0.00	5.00	5.00	9.00	9.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.85
13.	PRESENTACIÓN DE AVANCES O BOLETINES DE LOS PROYECTOS.	3.70	0.00	0.00	3.00	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	11.00	9.00		9.00		10.00		13.00		13.00		8.00		100.00	38.00	1.41
14.	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LOS SECTORES DE CURTIEMBRES Y METALURGIA (GALVANOPLASTIA), QUE INCLUYA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES.	5.56	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	48.00	2.67
15.	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE APOYO TÉCNICO Y BUENAS PRÁCTICAS A EXPLOTACIONES MINERAS.	5.55	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.50
16.	REALIZAR ACCIONES GENERALES Y ORIENTADORAS PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	2.23	5.00	5.00	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70		8.70		8.70		8.70		8.70		8.00		100.00	48.50	1.08
17.	EJECUTAR ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL O DE LA COBERTURA VEGETAL.	2.22	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.11
18.	ACTIVAR LA RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS DE LOS	2.22																									100.00	49.98	1.11

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7794 12 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
SERVICIOS BÁSICOS EN LOS QUE LA SDA ACTÚA COMO RESPONSABLE EJECUTOR.		8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37				
19. PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA Y PACA EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.	2.22	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.11
20. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIM/TO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EXISTENTES Y ORIENTADOS A RECUPERAR Y MANEJAR AMBIENTALMENTE LOS ¿SUELOS DE PROTECCIÓN POR RIESGO NO MITIGABLE¿	2.22	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.02
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.22		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7804 14 Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	REALIZAR LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA: DIRECTORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	12.00	1.00	1.00	3.00	3.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00		11.00		10.00		10.00		9.00		9.00		100.00	39.00	4.68	
2.	REALIZAR LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA: ARQUITECTURAS DE REFERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	8.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.20	
3.	REALIZAR AJUSTES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN: RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN)	20.00	1.00	1.00	4.00	4.00	6.00	6.00	9.00	9.00	11.00	11.00	12.00	12.00	10.00		10.00		10.00		10.00		9.00		8.00		100.00	43.00	8.60	
4.	GESTIONAR Y CONSOLIDAR (03) DOCUMENTOS PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA, QUE REFLEJEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON GOBIERNO TI .	15.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	11.00		12.00		12.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	4.95	
5.	ACTUALIZAR LOS (07) DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS VIGENCIAS ANTERIORES.	5.00	3.00	3.00	4.00	4.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	7.00	8.00	8.00	8.00		9.00		11.00		11.00		12.00		10.00		100.00	36.00	1.80	
6.	INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE TI EN LA IPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SDA.	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	10.00	
7.	ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO A LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	12.00	2.00	1.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	39.00	4.68	
8.	DOCUMENTAR LA GESTIÓN DE INICIATIVAS Y PROYECTOS DE TI EN LA ENTIDAD	8.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.20	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		41.11

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7805 12 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	30.00	0.00	0.00	9.00	8.83	11.00	11.32	11.00	10.73	11.00	11.53	12.00	11.63	12.00		11.00		10.00		7.00		3.00		3.00		100.00	54.04	16.21
2.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	36.00	3.60
3.	REALIZAR LA GESTIÓN A LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DISTRITALES Y REGIONALES Y REALIZAR UNA PROPUESTA DE OPERATIVIZACIÓN Y/O RACIONALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS DISTRITALE	5.00	2.00	2.00	36.00	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		3.00		3.00		3.00		3.00		2.00		100.00	50.00	2.50
4.	GESTIONAR PROYECTOS (ACUERDOS, INSTRUMENTOS, INICIATIVAS, AGENDAS, MEMORANDOS, PLANES,INDICADORES) DE ARTICULACIÓN REGIONAL, CON BASE EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL.	5.00	2.00	2.00	35.00	35.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	3.00	7.00	7.00	7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		2.00		100.00	59.00	2.95
5.	ARTICULACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DISTRITALES Y REGIONALES, INVESTIGACIÓN AMBIENTAL, INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES, ASUNTOS Y VISIÓN REGIONAL POT CON EL PGA.	5.00	2.00	2.00	10.00	10.00	2.00	2.00	19.00	19.00	3.00	3.00	36.00	36.00	14.00		3.00		3.00		3.00		3.00		2.00		100.00	72.00	3.60
6.	GESTIONAR UN PROYECTO, ACUERDO O INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN REGIONAL ORIENTADO A PROTEGER LOS CERROS ORIENTALES, SEGUIMIENTO Y REPORTE DE COMPROMISOS DE LAS SENTENCIAS DE COMPETENCIA DE LA DPSIA.	5.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		2.00		100.00	50.00	2.50
7.	GESTIONAR ACCIONES DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA SDA	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	1.50
8.	IDENTIFICAR Y GESTIONAR LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y/O FINANCIEROS DE COOPERACIÓN PARA LA SDA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.00
9.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL VIGENTES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	1.50
10.	REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO	3.75	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.73
11.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL RÍO BOGOTÁ Y EL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL.	3.75	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.00	1.69
12.	PROPUESTA Y DESARROLLO DE UNA LÍNEA ESTRATEGICA DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL ARTICULADA AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	3.75	2.00	2.00	15.00	15.00	2.00	2.00	43.00	43.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00		4.00		4.00		4.00		4.00		2.00		100.00	66.00	2.48
13.	GESTIONAR UN MODELO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES	3.75	2.00	2.00	16.00	16.00	3.00	3.00	44.00	44.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00		16.00		3.00		3.00		1.00		100.00	71.00	2.66

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7805 12 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
14. REALIZAR LAS ACCIONES DE REPROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	7.00	11.00	11.00	8.00	8.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		11.00		7.00		9.00		100.00	49.00	3.43
15. ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y PRESUPUESTAL.	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	49.00	2.94
16. FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO PARA ACOMPAÑAR LA ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADOS Y CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS.	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	8.00	8.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		8.00		7.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		52.28		

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	HACER LA REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA	5.56	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
2.	ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	5.56	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
3.	FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	5.56	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
4.	EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS.	5.56	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
5.	ASESORAR JURÍDICAMENTE EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	5.55	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
6.	HACER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL.	5.55	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
7.	REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL.	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		4.00		100.00	46.00	5.11
8.	ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		4.00		100.00	46.00	5.11
9.	HACER ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		4.00		100.00	46.00	5.11
10.	ATENDER PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	11.11	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	5.22
11.	INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	11.11	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	5.22
12.	UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	11.11	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	5.22

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	46.67

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7811 15 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR OCUPACIONES INFORMALES QUE SEAN PRIORIZADAS PARA LOS PROGRAMAS DE REASENTAMIENTOS.	10.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	4.60
2. ELABORAR INSUMOS TECNICOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES GENERADAS POR PROCESOS DE OCUPACIÓN INFORMAL.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	4.50
3. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS O SUSCEPTIBLES A SER AFECTADAS POR PROCESOS DE OCUPACIÓN INFORMAL	10.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	4.60
4. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO.	8.75	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		0.00		100.00	65.00	5.69
5. ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, BASADAS EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD.	8.75	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	6.13
6. ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PRIORIZADAS.	8.75	0.00	0.00	8.33	8.33	16.66	16.66	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	4.37
7. ELABORAR E IMPLEMENTAR PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN (EN SUS TRES DIMENSIONES) Y USO SOSTENIBLE	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00		15.00		15.00		20.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL, Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO.	8.75	10.00	10.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.75
9. ELABORAR PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN (EN SUS 3 DIMENSIONES)Y USO SOSTENIBLE DE LA RESERVA RFPNTVDH	8.75	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		10.00		10.00		0.00		100.00	60.00	5.25
10. SUSCRIBIR E IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	8.75	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	4.38
11. REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C. PRIORIZADAS, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 48.26

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaria Distrital de Ambiente

7814 19 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRADAS POR LA SDA, PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA.	8.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.50	6.00	6.00	10.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	37.50	3.19
2.	EJECUTAR ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL EN 19 ÁREAS PROTEGIDAS PRIORIZADAS, PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL, PED DE MONTAÑA Y OTRAS ÁREAS DE INTERESES AMBIENTAL	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		8.33		100.00	49.98	4.25
3.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PEDH	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		8.33		100.00	49.98	4.25
4.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GOBERNANZA Y GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LOS PEDH	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		8.33		100.00	49.98	4.25
5.	GENERAR PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LAS AFECTACIONES A LOS ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL.	14.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.30
6.	GENERAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL ALINDERAMIENTO O ACOTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL.	14.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.30
7.	GENERAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL DISTRITO CAPITAL.	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
8.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MONITOREO PARA C/UNO DE LOS COMPONENTES:FLORA Y FAUNA, GENERANDO UN INFORME FINAL DE ANÁLISIS Y AVANZAR EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO	33.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	7.73	8.00	7.88	12.00	12.00	8.00	8.00	8.00		12.00		8.00		12.00		8.00		8.00		100.00	43.61	14.39
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										45.17

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaria Distrital de Ambiente

7816 14 Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA	13.00	0.00	0.00	10.00	5.00	12.00	1.50	12.00	0.31	12.00	6.30	12.00	0.00	12.00		12.00		12.00		6.00		0.00		0.00		100.00	13.11	1.70
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CRRFFS	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADM/TRACIÓN DE RECURSOS PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS	20.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	36.00	7.20
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA DE LA FASE DOS DEL CAVFFS.	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	10.00	0.00	0.00	3.09	0.90	3.10	6.50	10.42	1.10	10.42	5.60	10.42	12.13	10.42		10.42		10.42		10.42		10.42		10.45		100.00	26.23	2.62
7.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA	23.00	0.00	0.00	2.26	2.26	2.30	4.10	2.30	1.20	2.30	0.80	2.28	0.84	14.76		14.76		14.76		14.76		14.76		14.76		100.00	9.20	2.12
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										19.64

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7817 11 Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	12.00	8.33	8.38	8.33	6.55	8.33	0.00	8.33	18.39	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	6.00
2.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		40.00		100.00	12.00	1.44
3.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRESERVACIÓN EN CAPACITACION DE CONSERVACION DOCUMENTAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		40.00		100.00	30.00	3.60
4.	REALIZAR Y GESTIONAR ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ORIENTADAS A LA TRANSFERENCIA SECUNDARIA ANTE EL ARCHIVO CENTRAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	6.00
5.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL DEL PRIMER PERIODO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBEINTE	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	40.00	5.40
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	13.50	0.00	0.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	5.40
7.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIENTADOS A LA OPTIMIZACION DE LOS TRÁMITES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE INTERNO DE LA SDA.	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
8.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL LA ESTRUCTURACIÓN ORGANICA Y FUNCIONAL DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA	7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		40.00		100.00	35.00	2.45
9.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA.	8.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.60
10.	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.	4.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	45.00	1.80
11.	EJECUTAR ACTVIDADES QUE GARANTICEN LA GESTION DE TRANSPORTE DE LA SDA.	1.00	0.00	5.00	0.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	50.00	0.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										38.19

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7820 8 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN JURÍDICA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA A TRAVÉS DE LA PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES Y/O ACTOS ADM/TIVOS AMBIENTALES A QUE HAYA LUGA	30.00	1.00	1.00	9.50	5.50	9.30	11.70	9.30	6.30	9.30	7.80	9.30	5.00	10.50		10.50		10.50		10.50		9.80		0.50		100.00	37.30	11.19
2.	IMPULSAR Y RESOLVER DE FONDO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO QUE SE ORIGINEN EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA SDA	30.00	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	13.80
3.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL	8.00	4.50	4.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.50		100.00	49.50	3.96
4.	ADELANTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LA DCA EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	12.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	15.00	4.00	13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		4.00		100.00	20.00	2.40
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL	20.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							41.35			

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7838 Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

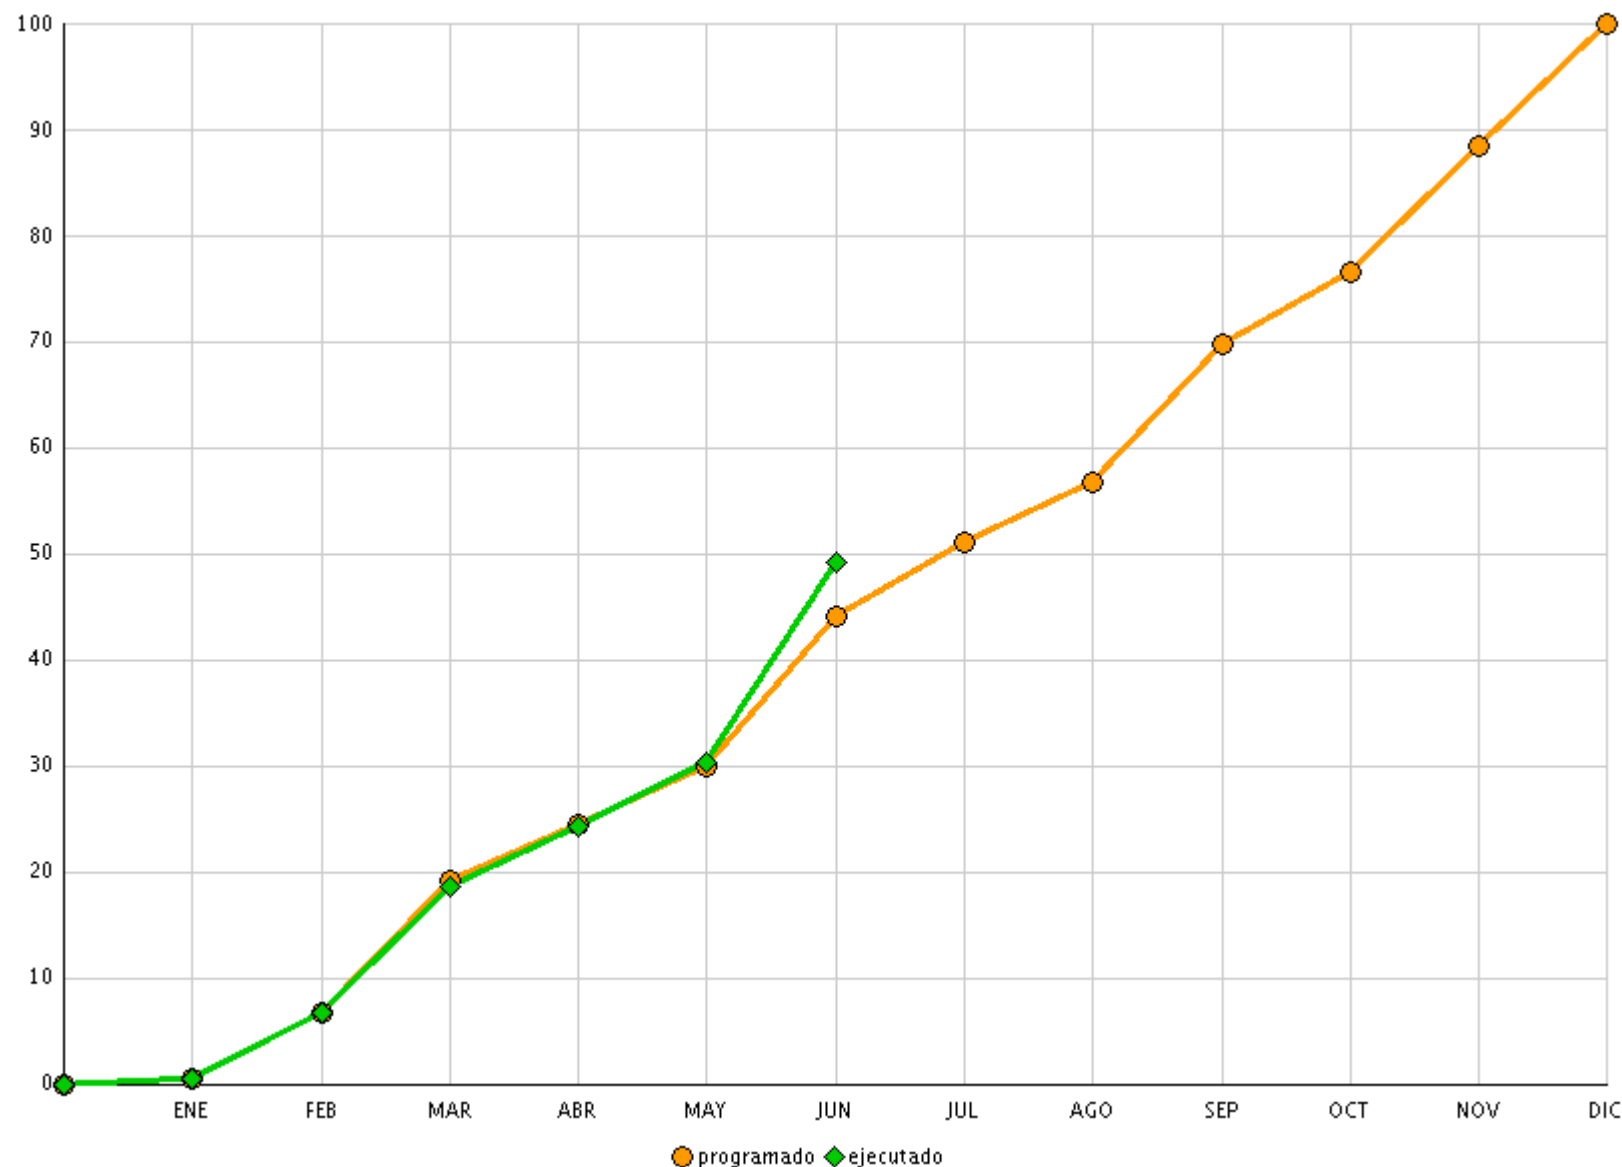


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.50	6.76	19.18	24.46	29.94	44.23	51.08	56.74	69.76	76.61	88.47	100.00
Ejecutado	0.50	6.76	18.61	24.29	30.33	49.16						

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7861 Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

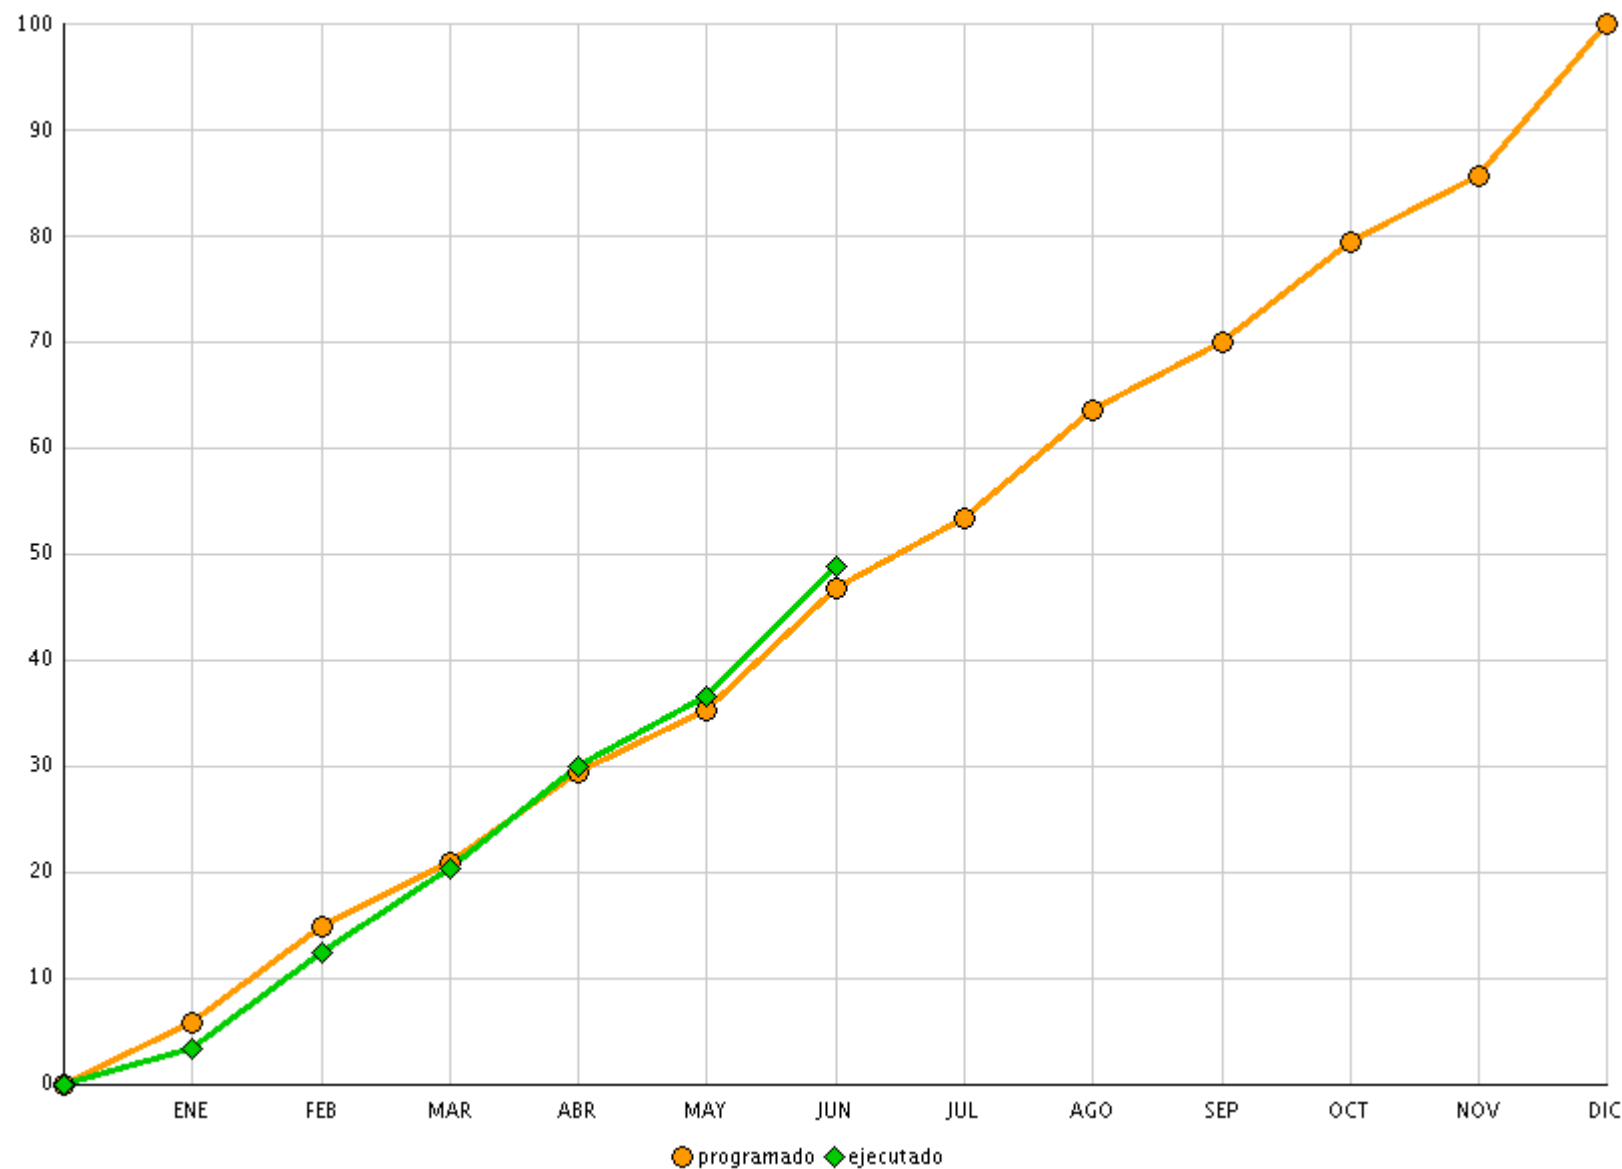


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.83	14.89	20.96	29.34	35.34	46.88	53.35	63.58	70.07	79.38	85.75	100.00
Ejecutado	3.43	12.49	20.39	30.03	36.63	48.89						

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7862 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá

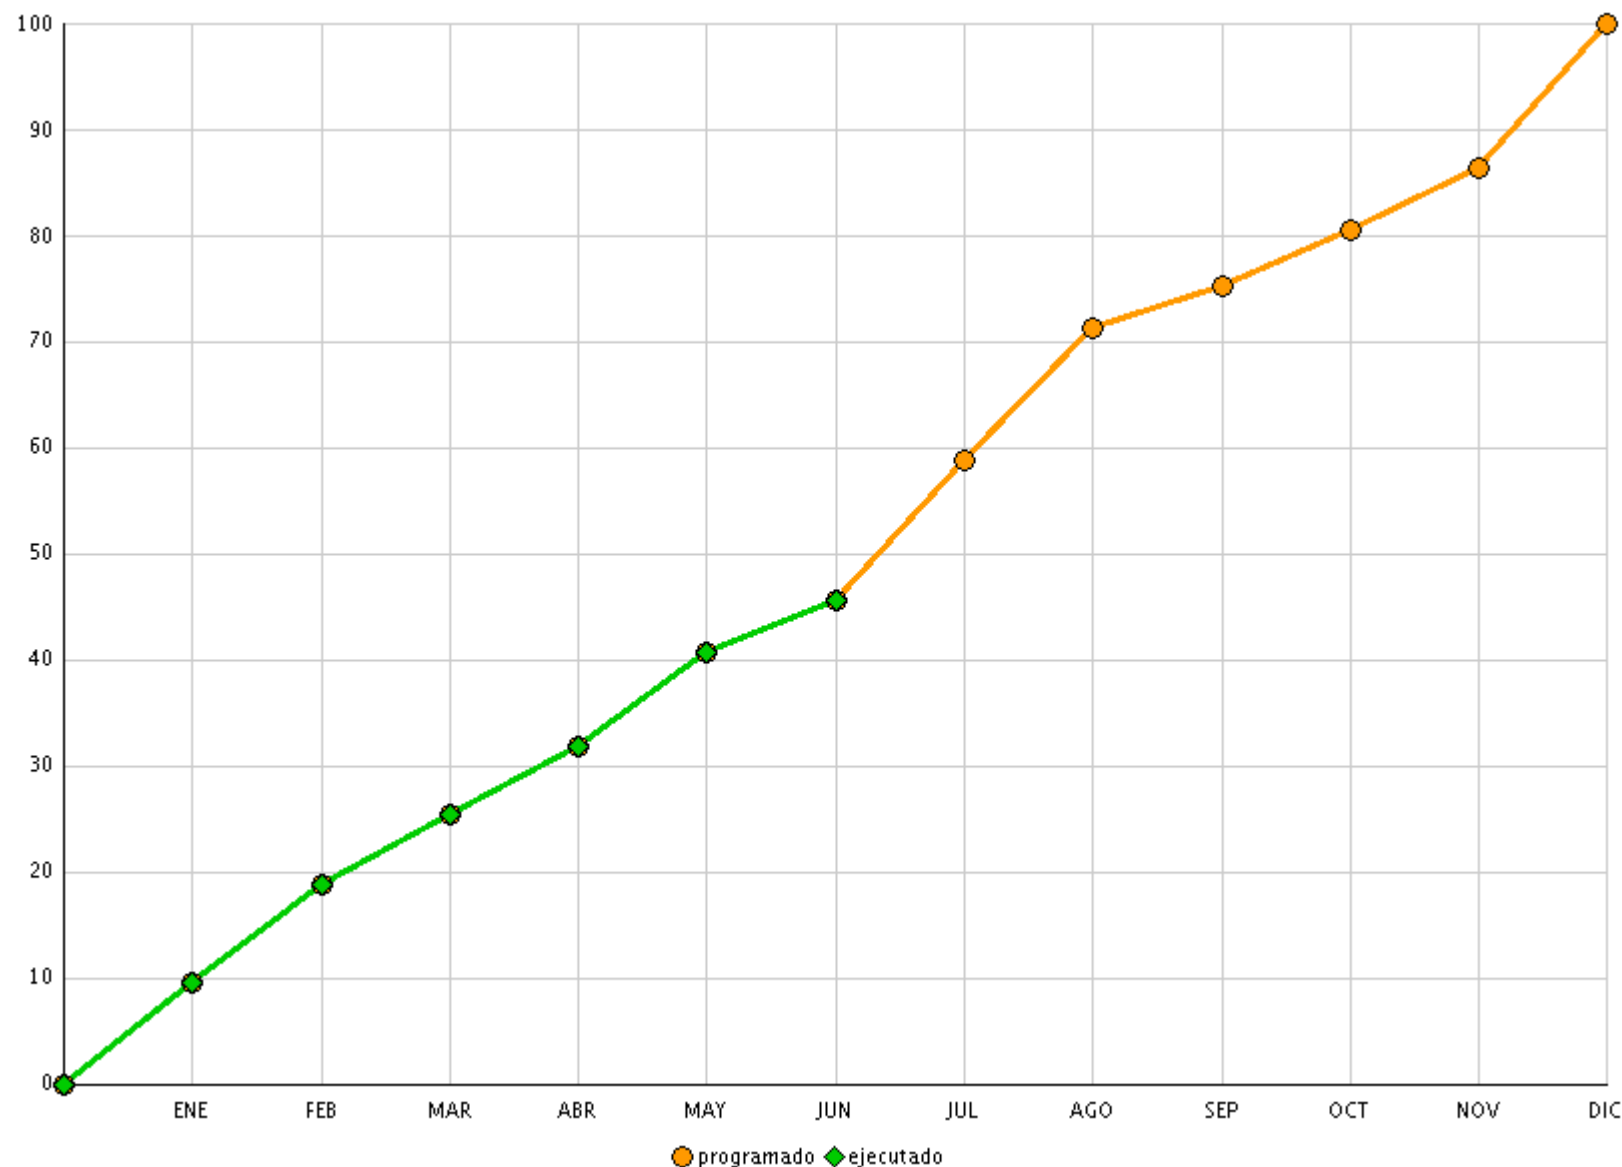


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.66	18.79	25.53	31.95	40.74	45.73	58.82	71.39	75.31	80.58	86.33	100.00
Ejecutado	9.66	18.79	25.53	31.95	40.74	45.73						

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7876 Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá

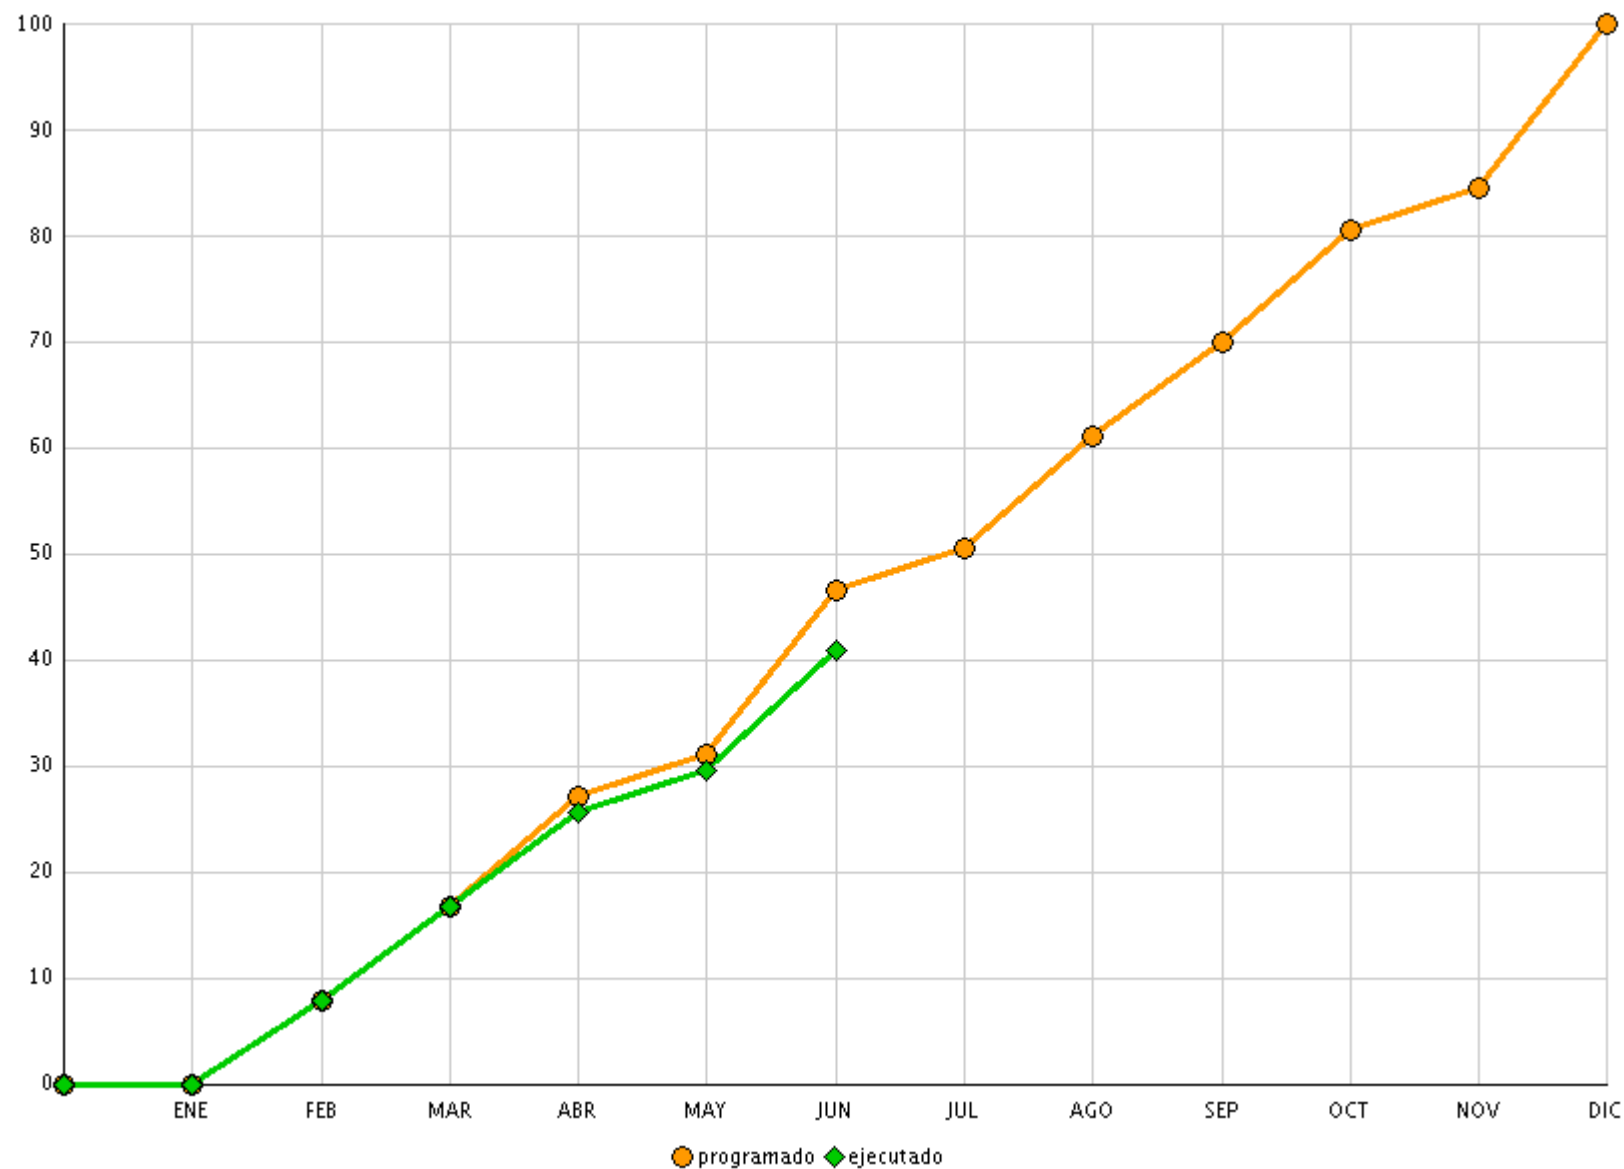


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	7.83	16.76	27.26	31.20	46.69	50.63	61.12	70.06	80.55	84.49	100.00
Ejecutado	0.00	7.83	16.76	25.59	29.53	40.86						

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7877 Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá

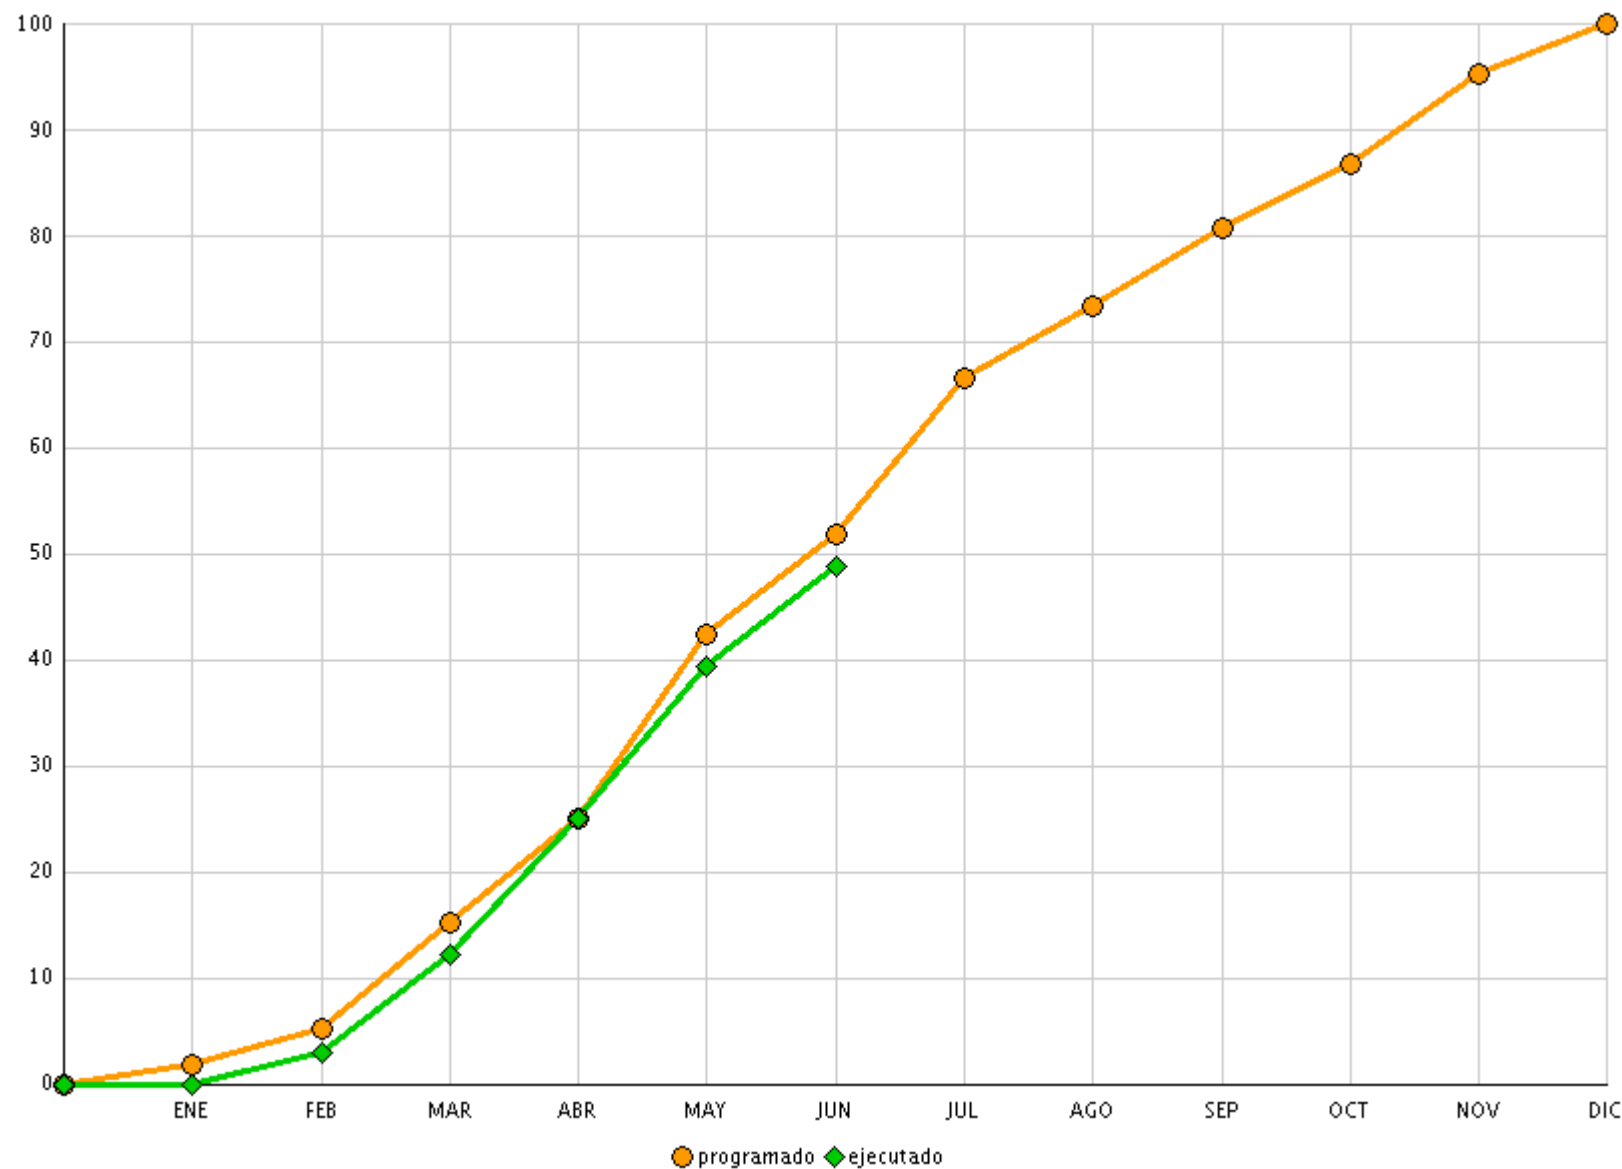

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.95	5.31	15.24	25.10	42.53	51.90	66.64	73.48	80.85	86.82	95.21	100.00
Ejecutado	0.00	3.03	12.22	25.10	39.50	48.87						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7838 26 Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DEL ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33	15.00	6.67	6.67	0.00	0.00	23.33	25.00	0.00		0.00		23.33		0.00		0.00		23.34		100.00	46.67	4.67
2.	GENERAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL SIG	10.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	15.00		0.00		15.00		20.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
3.	INTERVENCIONES Y ACCIONES INTERINSTITUCIONALES DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO OCUPADO INDEBIDAMENTE	12.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	5.40
4.	OPERACIÓN DEL PORTAL INMOBILIARIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.00
5.	ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA RELACIONADA CON SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRACIONES DE P.H., MANTENIMIENTOS, ENTRE OTROS	11.00	4.50	4.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		9.00		100.00	48.50	5.34
6.	REALIZAR DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL ESTADO DE AVANCE LAS VIABILIZACIONES DE LOS INSTRUMENTOS A CELEBRAR Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS VIGENTES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.00
7.	REALIZAR UNA VERSIÓN PRELIMINAR DEL MARCO REGULATORIO DEL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA BOGOTÁ A CIELO ABIERTO - BACA	6.00	0.00	0.00	3.33	3.33	6.33	3.00	6.33	9.67	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33		16.33		6.33		16.33		6.33		19.70		100.00	28.66	1.72
9.	REALIZAR LIQUIDACIONES REQUERIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE ENTREGA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	25.00	11.00	11.00	11.00	4.00	11.00	4.00	11.00		11.00		10.00		10.00		7.00		7.00		100.00	44.00	2.64
10.	REALIZAR Y FORMALIZAR EL EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	10.00	0.00	3.33	15.41	31.67	6.67	3.33	13.33		8.33		3.33		3.33		33.35		0.00		100.00	48.33	2.90
11.	REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS PREDIALES PROGRAMADOS Y LOS DEMANDADOS PARA LA VIABILIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ENTREGA	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		7.00		7.00		6.00		100.00	50.00	7.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										49.16

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

7861 22 Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PRESENTAR UN INFORME CONSOLIDADO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIDEP-SIGDEP	30.00	4.00	4.00	12.50	12.50	4.50	4.50	12.00	12.00	4.00	4.00	13.00	13.00	4.00		12.50		4.50		12.00		4.00		13.00		100.00	50.00	15.00
2.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS	30.00	8.00	0.00	8.00	8.00	9.00	15.08	5.00	9.23	6.00	8.00	6.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		12.00		13.00		100.00	49.31	14.79
3.	GENERAR PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO MEDIANTE EL OBSERVATORIO DE ESPACIO PÚBLICO	15.00	10.00	10.00	7.75	7.75	11.25	11.25	2.75	2.75	17.75	17.75	11.25	11.25	0.00		2.75		14.00		2.75		2.75		17.00		100.00	60.75	9.11
4.	RELIZAR LA DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO REALIZADOS POR EL OBSERVATORIO DEL ESPACIO PÚBLICO	15.00	4.88	4.88	11.63	11.63	2.25	2.25	11.75	11.75	2.25	2.25	5.50	4.24	11.75		2.25		2.25		11.75		7.74		26.00		100.00	37.00	5.55
5.	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DISTRITAL DE ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	33.33	33.33	11.00		33.33		0.00		11.34		0.00		0.00		100.00	44.33	4.43
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										48.89

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7862 16 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD BAJO EL ENFOQUE DEL MODELO MIPG	10.00	38.33	38.33	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.67		19.00		2.00		2.00		2.00		2.00		100.00	51.33	5.13
2.	REALIZAR EL REPORTE EN EL FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN- FURAG	10.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	5.00
3.	FORMULAR Y EJECUTAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES PARA LA VIGENCIA.	6.00	60.00	60.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		10.00		100.00	80.00	4.80
4.	ADELANTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA POR PROCESO, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5.00	0.00	0.00	41.67	41.67	3.33	3.33	3.33	3.33	11.67	11.67	3.33	3.33	3.33		3.33		3.33		3.33		11.67		11.68		100.00	63.33	3.17
5.	EVALUAR Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PUBLICO	2.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
6.	GESTIONAR LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL DADEP	18.00	6.75	6.75	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00		11.00		11.75		21.75		6.75		100.00	36.75	6.62
7.	ADELANTAR LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN A CARGO DE LA SAF, CONFORME AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	5.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		100.00	49.00	2.45
8.	DESARROLLAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE ENMARCADAS EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIETAL CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	37.50		0.00		0.00		12.50		0.00		12.50		100.00	37.50	2.25
9.	DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DISTRITAL Y NACIONAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL	6.00	4.50	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	24.75	24.75	4.00	4.00	4.00	4.00	12.25		4.00		4.00		13.00		4.50		17.00		100.00	45.25	2.72
10.	FORTALECER LA PREVENCIÓN DISCIPLINARIA Y REALIZAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.98
11.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00		33.33		0.00		0.00		0.00		33.34		100.00	33.33	6.00
12.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.50	12.50	12.50	12.50	4.00	4.00	12.50	12.50	4.00		12.50		4.50		12.50		4.50		12.50		100.00	49.50	2.97
13.	IDENTIFICAR LAS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DOTACIONAL Y ADMINISTRATIVA	2.00	2.67	2.67	69.33	69.33	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.66	2.67		2.67		3.00		3.00		3.00		2.98		100.00	82.67	1.65
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							45.73			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7876 15 Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LOS SEGUIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PETI APLICANDO LOS LINEAMIENTOS, PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS-PMO.	30.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	13.64	
2.	MANTENER ACTUALIZADOS LOS PROCESOS, POLITICAS Y GUIAS QUE RIGEN LA GOBERNABILIDAD DE LAS TIC BASADOS EN BUENAS PRÁCTICAS.	20.00	0.00	0.00	8.33	8.33	12.50	12.50	8.33	0.00	0.00	0.00	20.83	0.00	0.00		8.33		12.50		8.33		0.00		20.85		100.00	20.83	4.17
3.	APOYAR EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DE BACKUPS DE LA ENTIDAD.	40.00	0.00	0.00	8.58	8.58	3.03	3.03	15.25	15.25	3.03	3.03	15.25	15.25	3.03		15.25		3.03		15.25		3.03		15.27		100.00	45.14	18.06
4.	BRINDAR ASESORÍA Y CONSULTORIA A LOS DIFERENTES PROYECTOS CON COMPONENTE TECNOLÓGICO DE LA ENTIDAD.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								40.86		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

7877 13 Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE ACTUAIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DIVULGACIÓN, Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO, DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	15.00	15.00	11.00	11.00	0.00	0.00	15.00		11.00		8.33		6.67		11.33		8.34		100.00	39.33	9.83
2.	FORTALECER LA GESTIÓN CONTRACTUAL INSTITUCIONAL	10.00	19.50	0.00	3.33	22.83	10.00	10.00	2.77	2.77	13.33	13.33	2.77	2.77	16.10		0.00		13.33		0.00		16.10		2.77		100.00	51.70	5.17
3.	ESTABLECER UN ESQUEMA INTEGRAL QUE PERMITA LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL DADEP	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00		10.00		0.00		22.50		0.00		10.00		100.00	32.50	4.88
4.	DEFINIR UNA VERSIÓN PRELIMINAR DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	25.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	6.07	9.10	21.21	36.38	24.24	0.00	0.00	12.13		0.00		12.13		0.00		12.08		0.00		100.00	51.52	12.88
5.	PONER EN OPERACION LA MESA DE AYUDA JURÍDICA DEL DADEP	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	3.70	3.70	17.03	17.03	30.37	30.37	10.37		10.37		3.70		3.70		3.70		3.73		100.00	64.43	16.11
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		48.87	

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Proyecto de inversión

7637 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá

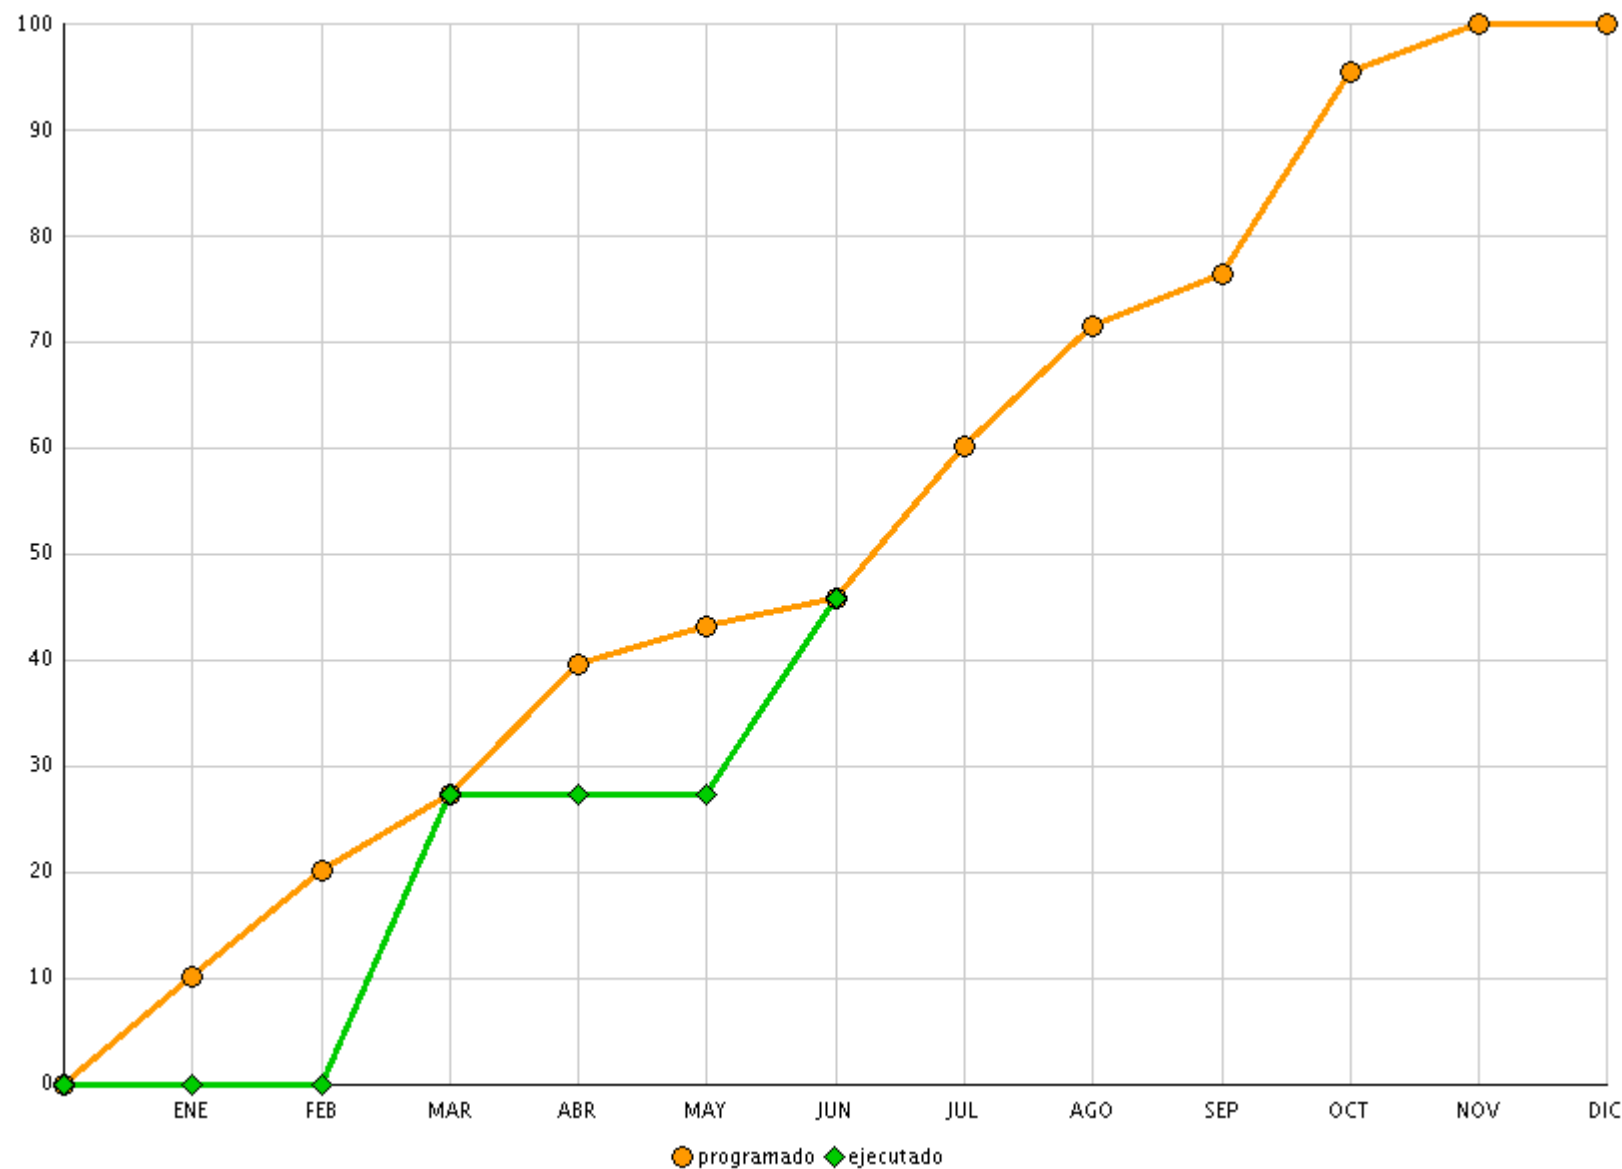


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	10.20	20.20	27.34	39.66	43.18	45.82	60.28	71.48	76.38	95.48	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	27.34	27.34	27.34	45.82						

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Proyecto de inversión

7655 Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá

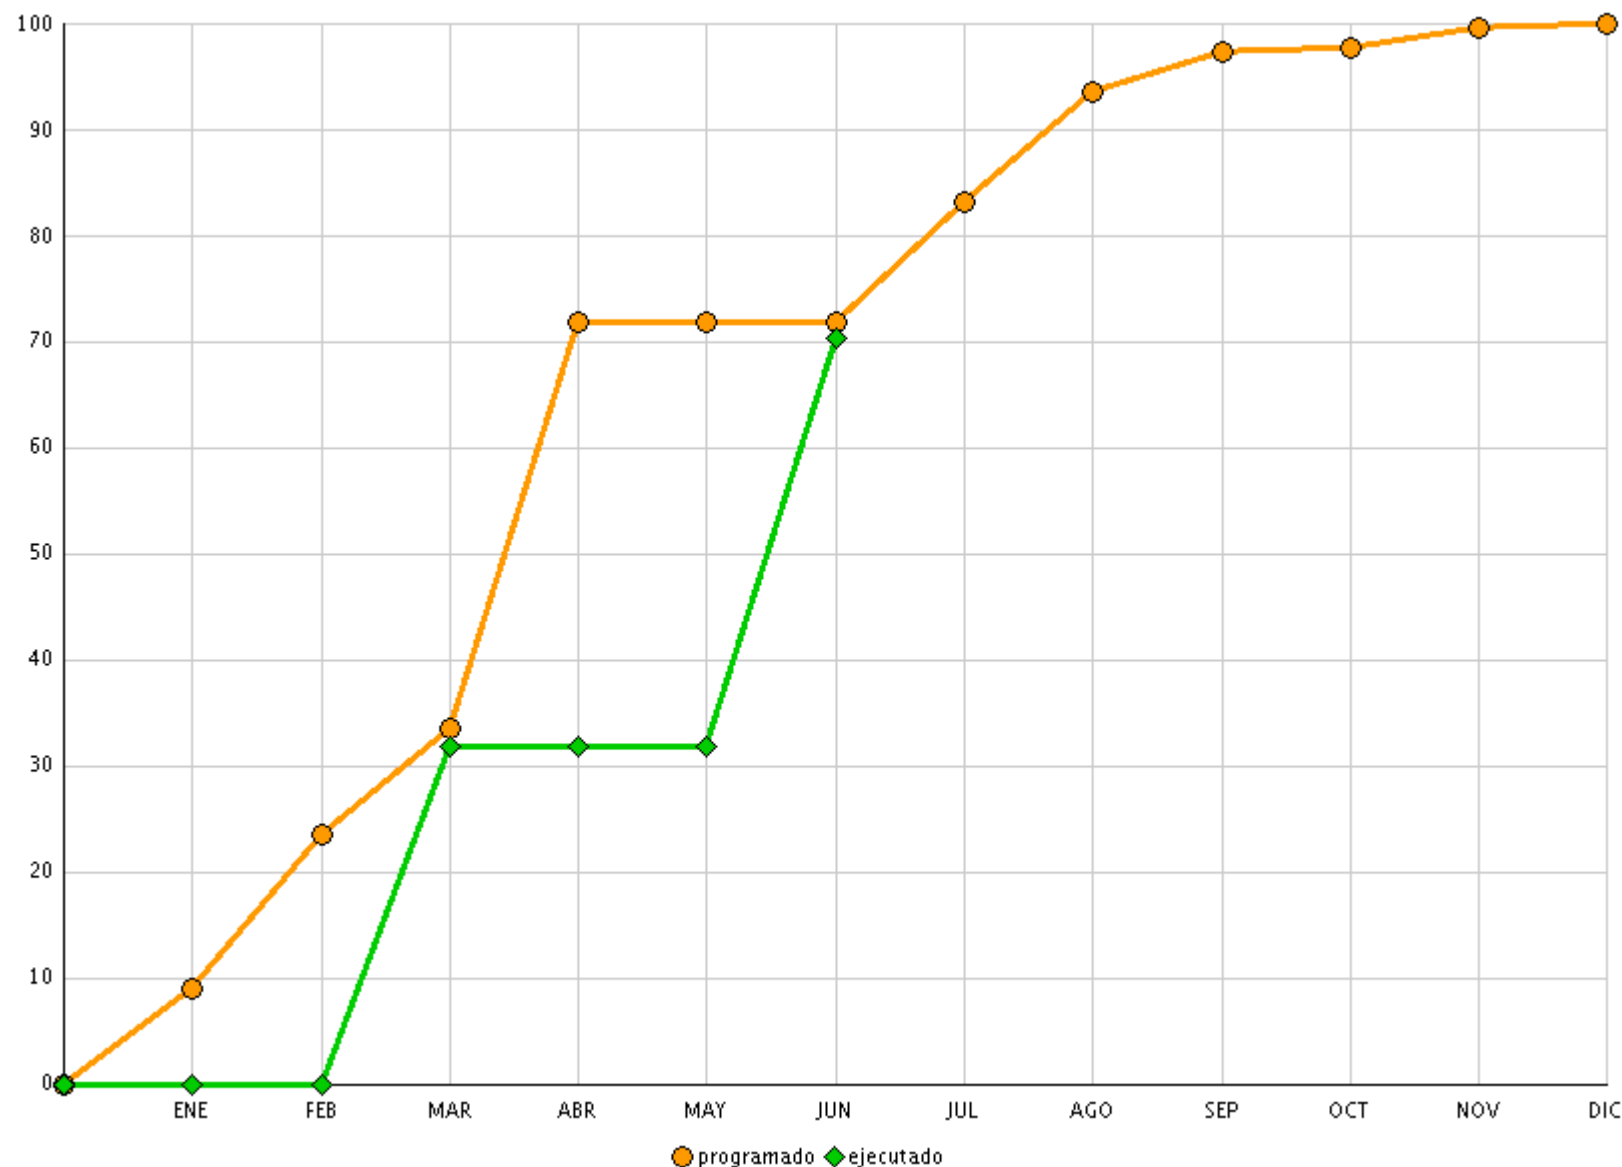


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.10	23.65	33.65	71.87	71.87	71.87	83.22	93.67	97.30	97.75	99.55	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	31.85	31.85	31.85	70.43						

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Proyecto de inversión

7658 Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

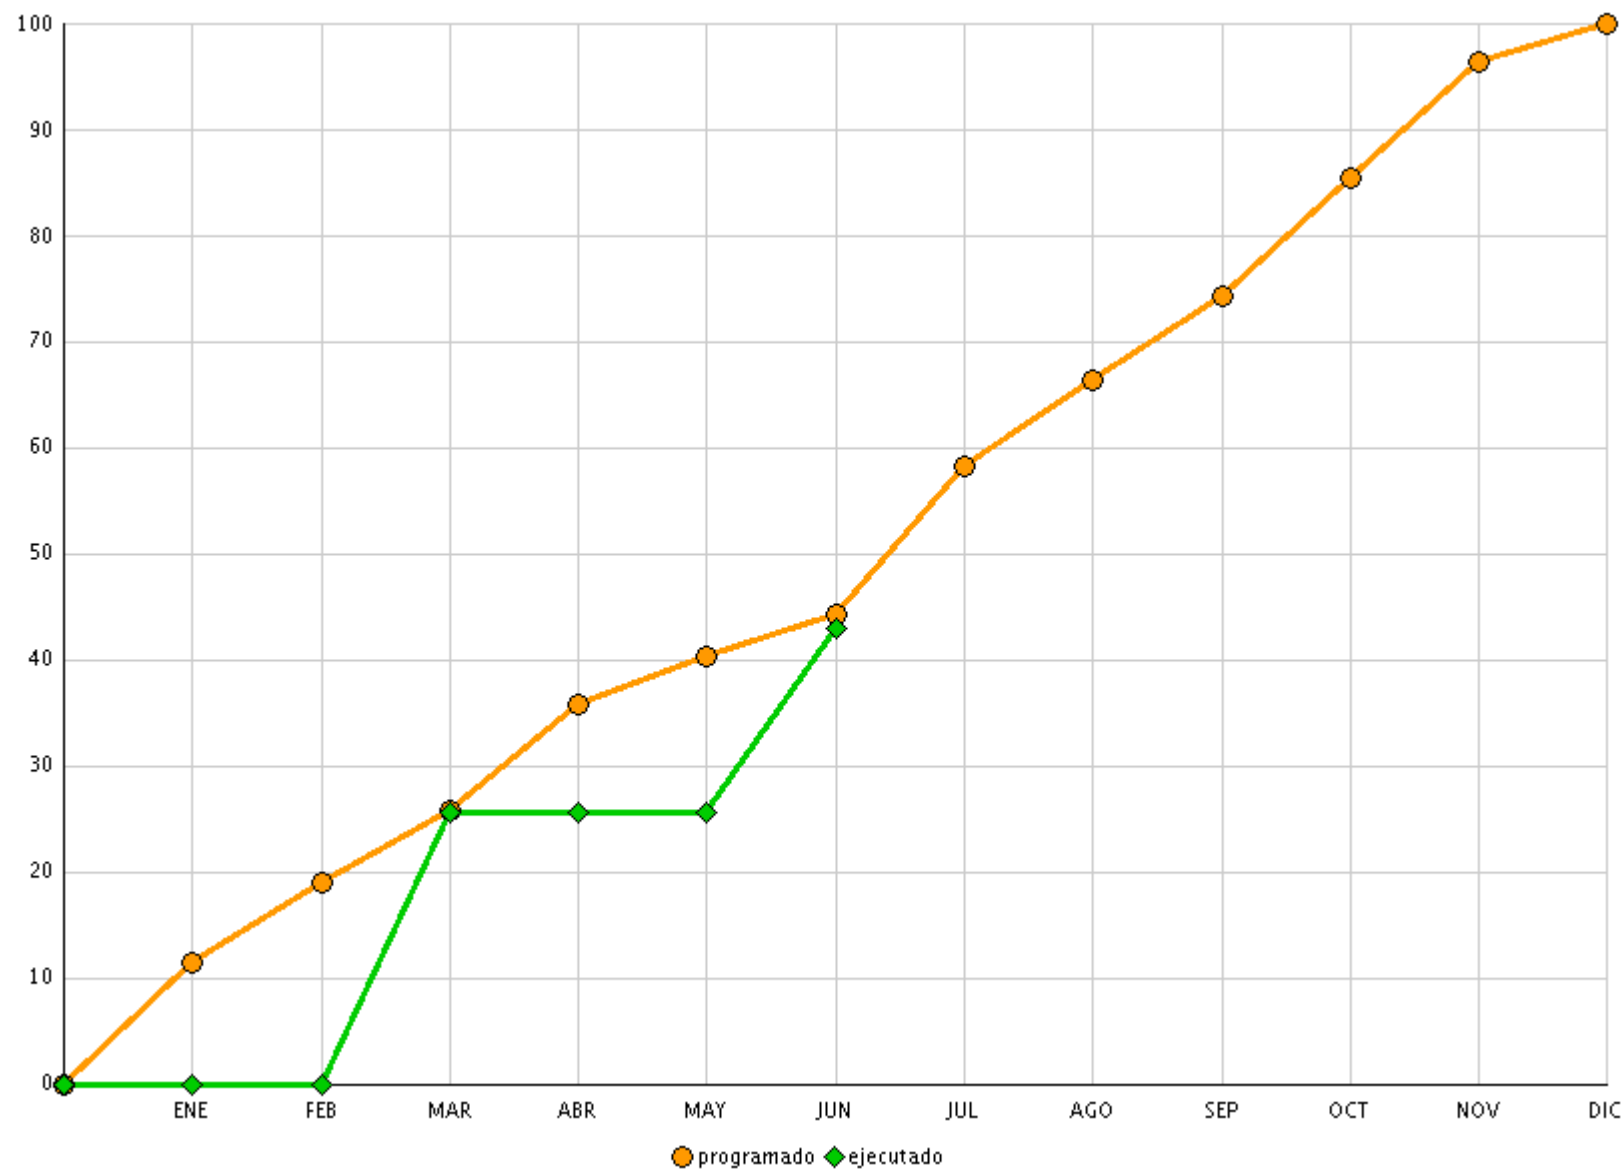

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	11.56	19.05	25.86	35.86	40.32	44.32	58.26	66.48	74.38	85.48	96.38	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.66	25.66	25.66	42.96						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

7637 22 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA UAECOB ALINEADO A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		22.00		5.00		15.00		10.00		0.00		100.00	28.00	2.80
2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA TI CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA UAECOB	88.00	10.00	0.00	10.00	0.00	7.00	27.00	14.00	0.00	4.00	0.00	2.00	20.00	14.00		10.00		5.00		20.00		4.00		0.00		100.00	47.00	41.36
3. HABILITAR 1 SERVICIO CIUDADANO DIGITAL BÁSICO EN LA UAECOB	2.00	20.00	0.00	10.00	0.00	9.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	7.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.00	1.66
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.82		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

7655 28 Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG EN LA UAECOB	91.00	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00	35.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	10.00		10.00		3.00		0.00		0.00		0.00		100.00	77.00	70.07
2.	AVANZAR CON EL PLAN DE PREPARATIVOS Y DAR CONTINUIDAD DEL SERVICIO PARA LA UAECOB ANTE LA EVENTUAL OCURRENCIA DE UN DESASTRE EN EL DISTRITO CAPITAL	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	25.00		15.00		10.00		5.00		20.00		5.00		100.00	4.00	0.36	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							70.43			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
7658 27 Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 30 Eficiencia en la atención de emergencias

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2022.	4.00	0.00	0.00	10.00	0.00	8.00	18.00	7.00	0.00	9.00	0.00	7.00	21.00	19.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	39.00	1.56
2.	FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL.	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.00
3.	ESCENARIOS PARA LA ESCUELA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	35.00	20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	0.80
4.	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA CAPACITACIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	0.00	10.00	0.00	5.00	30.00	20.00		15.00		20.00		10.00		0.00		0.00		100.00	35.00	0.70
5.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN EN INCENDIOS, INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS Y ESCENARIOS DE RIESGO	16.00	28.00	0.00	10.00	0.00	0.00	38.00	7.00	0.00	8.00	0.00	8.00	17.00	9.00		0.00		5.00		10.00		10.00		5.00		100.00	55.00	8.80
6.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE EQUIPO MENOR, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA UAECOB	14.00	0.00	0.00	27.00	0.00	10.00	37.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	37.00	5.18
7.	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN VEHICULAR DE LA UAECOB	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8.	REALIZAR LA ENTREGA CONTINUA DE LOS DIFERENTES SUMINISTROS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN BOMBERIL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	16.00	0.00	16.00	0.00	2.00	34.00	14.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	86.00	1.72
9.	APOYAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES SUMINISTROS ENTREGADOS	2.00	50.00	0.00	10.00	0.00	8.00	58.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	13.00	19.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	71.00	1.42
10.	ATENDER LAS SOLICITUDES QUE GARANTICEN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, HEA¿S DE LA UAECOB	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	13.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	5.00	23.00	19.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	41.00	4.51
11.	APOYAR Y BRINDAR SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PARQUE AUTOMOTOR.	11.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	23.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	67.00	7.37
12.	MANTENIMIENTO A LAS 17 ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAECOB	13.00	0.00	0.00	7.00	0.00	11.00	18.00	25.00	0.00	4.00	0.00	4.00	33.00	9.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	51.00	6.63
13.	AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN MARICHUELA Y LA ARTICULACIÓN INTITUCIONAL PARA LA HABILITACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA BOMBERIL	1.00	3.00	0.00	5.00	0.00	5.00	13.00	15.00	0.00	3.00	0.00	1.00	19.00	18.00		20.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	32.00	0.32
14.	ADECUACIÓN DE LAS ESTACIONES DE VENECIA, CENTRAL Y FONTIBÓN	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	7.00	12.00	13.00	0.00	4.00	0.00	11.00	28.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60
15.	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTACIONES FERIAS Y CAOBOS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	15.00	16.00	0.00	4.00	0.00	10.00	30.00	15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	45.00	1.35


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 42.96

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7562 Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá

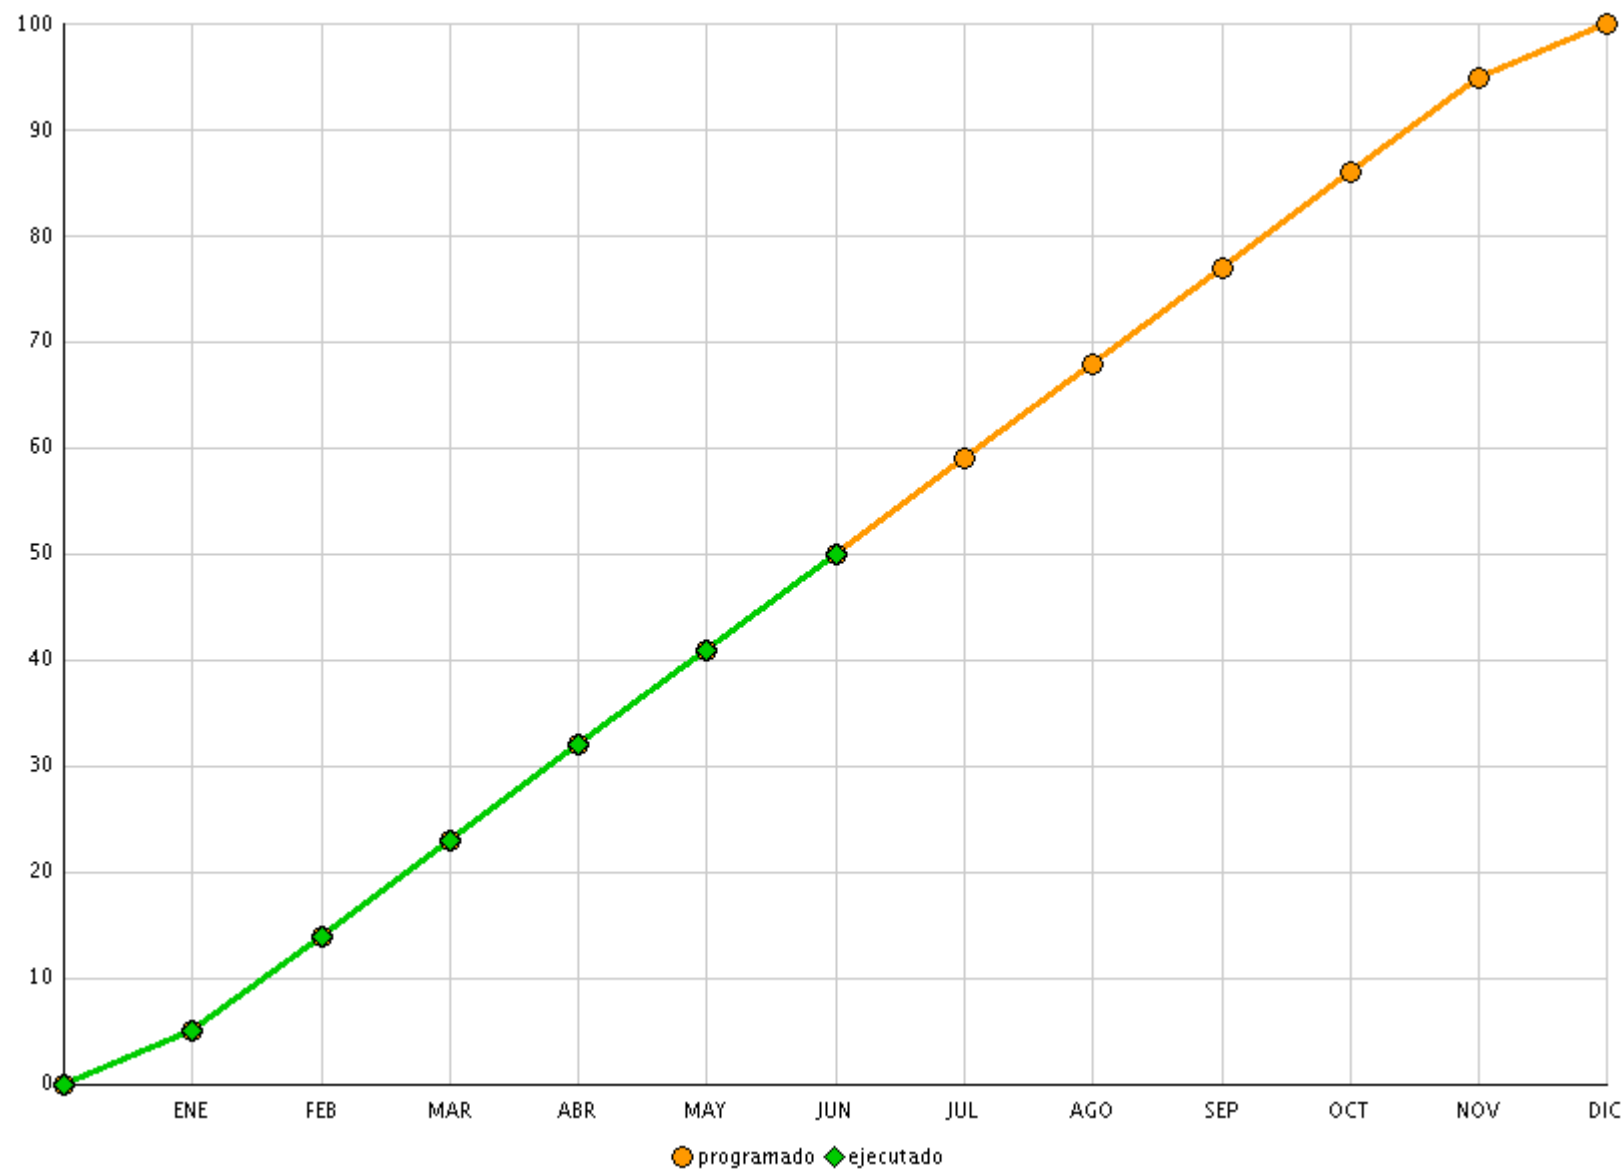


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	14.00	23.00	32.00	41.00	50.00	59.00	68.00	77.00	86.00	95.00	100.00
Ejecutado	5.00	14.00	23.00	32.00	41.00	50.00						

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7608 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

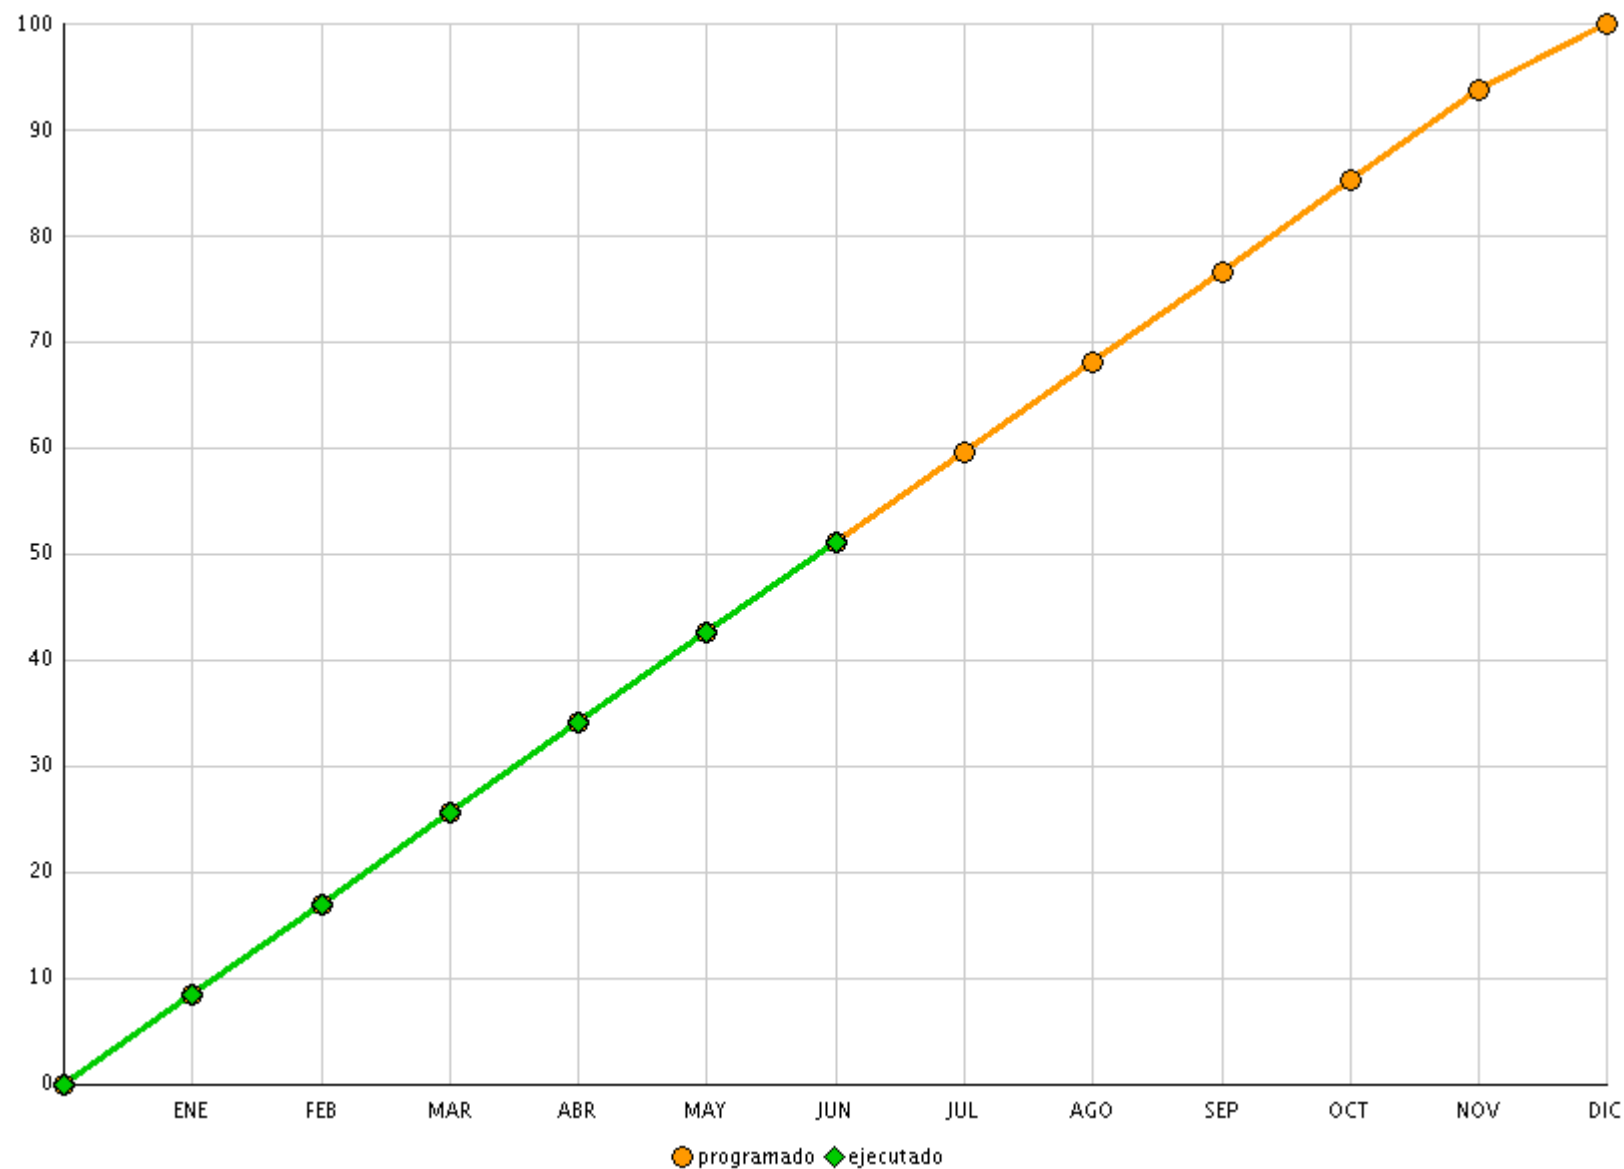


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.52	17.04	25.56	34.08	42.60	51.12	59.64	68.16	76.69	85.22	93.75	100.00
Ejecutado	8.52	17.04	25.56	34.08	42.60	51.12						

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7621 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

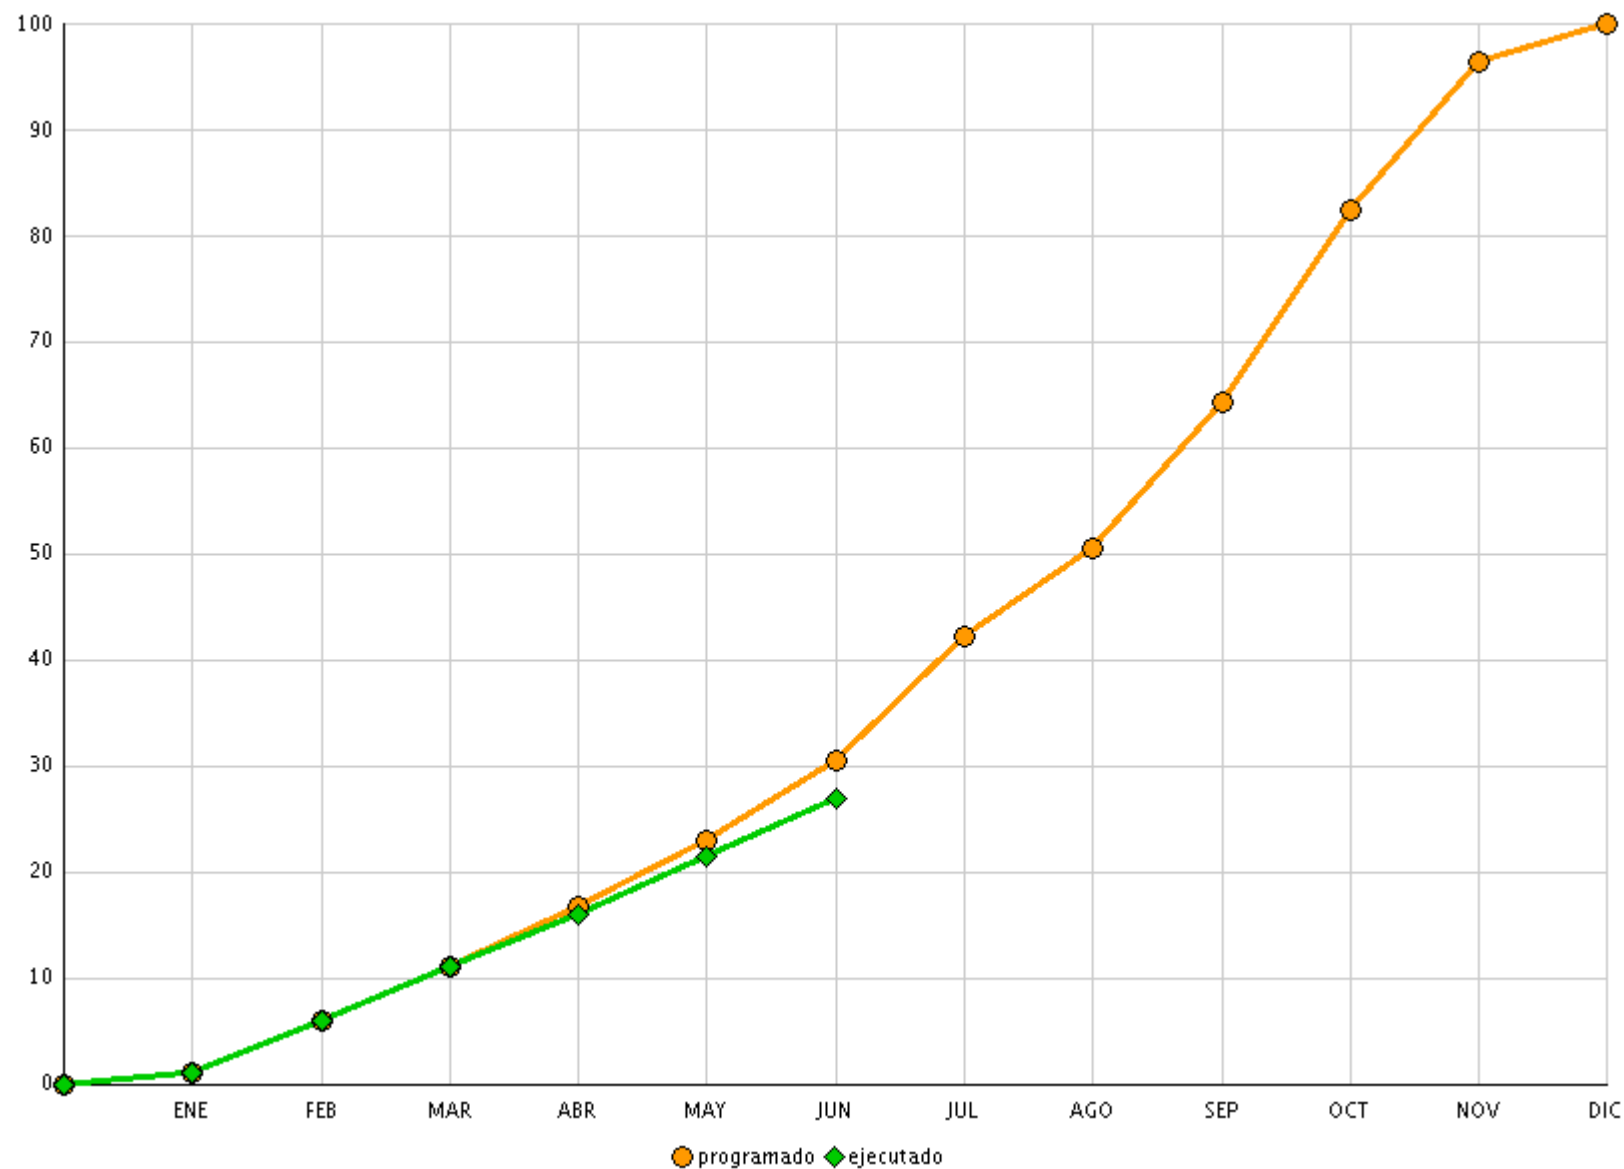


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.18	5.95	11.09	16.86	23.09	30.59	42.18	50.59	64.36	82.50	96.36	100.00
Ejecutado	1.18	5.95	11.09	16.04	21.51	26.93						

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7632 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

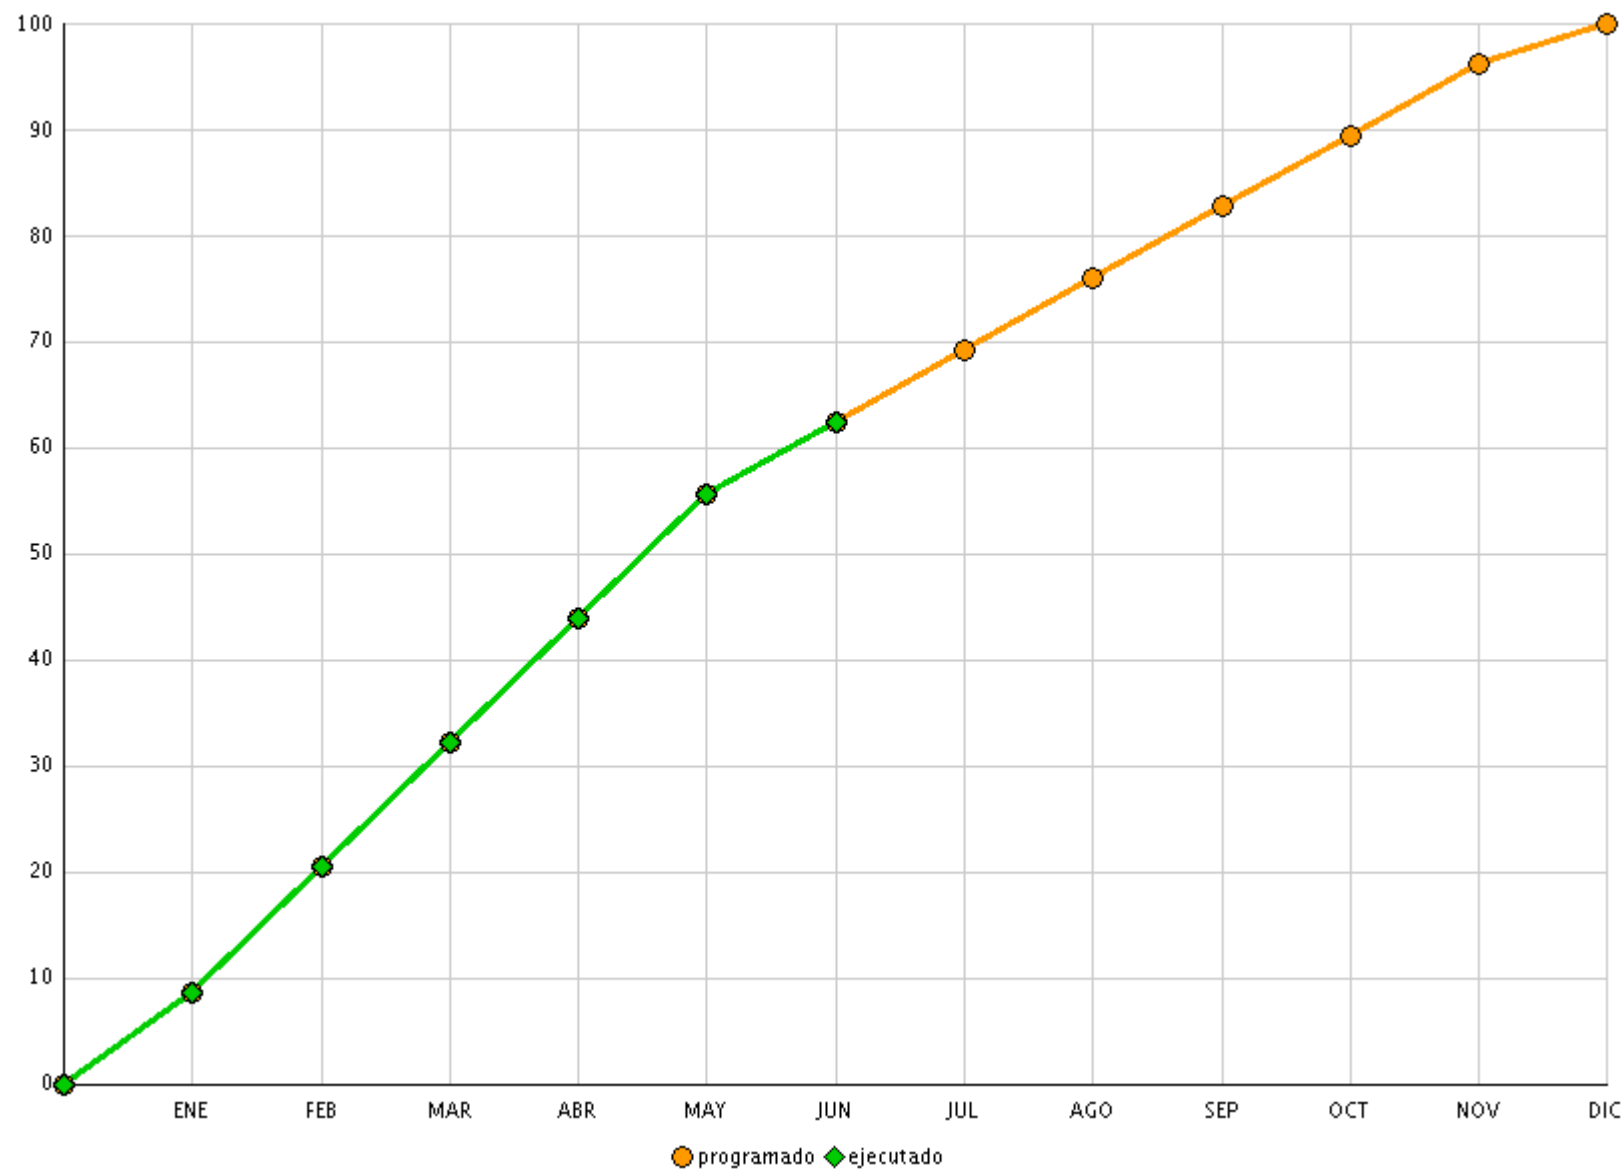

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.75	20.50	32.25	44.00	55.75	62.50	69.25	76.00	82.75	89.50	96.25	100.00
Ejecutado	8.75	20.50	32.25	44.00	55.75	62.50						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7562 13 Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADELANTAR ESTRATEGIAS CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES FRENTE A LOS PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DISTRITALES.	50.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	25.00
2.	DESPLEGAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, QUE CONLLEVEN A EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LOS PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7608 26 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ARTICULAR Y MEJORAR EL MIPG DE LA SJD CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	12.50	
2.	ARTICULAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE INCREMENTE LA SATISFACCION DE LOS GRUPOS DE VALOR	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	12.50	
3.	GENERAR INSTRUMENTOS DE APROPIACIÓN PARA LOS SERVIDORES EN TEMAS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	12.50	
4.	DESARROLLAR LAS GESTIONES ENCAMINADAS A FORTALECER LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MARCO DE MIPG	25.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		0.00		100.00	54.54	13.64	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		51.12	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7621 20 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS E INSUMOS EN MATERIA JURÍDICA, CONFORME A MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA.	9.09	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	4.27
2. AVANZAR EN UN 25 % EN LA CREACIÓN DE UN MODELO PARA DEFINIR LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE CORRUPCIÓN	9.09	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	21.00	21.00	20.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	67.00	6.09
3. ADELANTAR EL ANÁLISIS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO	9.09	1.00	1.00	5.00	5.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		20.00		8.00		5.00		100.00	42.00	3.82
4. ELABORAR 2 DOCUMENTOS DE ANÁLISIS JURÍDICOS EN TEMAS DE ALTO IMPACTO EN EL DISTRITO CAPITAL	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00		25.00		30.00		40.00		3.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LA ADOPCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBERNANZA REGULATORIA	9.09	3.00	3.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	6.00	10.00	6.60	10.00	6.60	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	44.20	4.02
6. ADELANTAR UN 25% DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL MECANISMO PARA INCENTIVAR Y RECONOCER EL TRABAJO ADELANTADO POR LAS ENTIDADES Y EL CUERPO DE ABOGADOS EN LA GESTION JURÍDICA DISTRITAL	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	13.00	0.00	20.00		10.00		10.00		17.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE 2.400 ESAL RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES, CONTABLES Y FINANCIERAS CON LA ENTIDAD.	9.09	2.00	2.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.54	9.50	7.98	9.50		9.50		9.50		9.50		5.50		7.00		100.00	48.02	4.37
8. ORIENTAR A 1000 CIUDADANOS EN DERECHOS, OBLIGACIONES Y CONTROL DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	28.00		5.00		28.00		24.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
9. FORTALECER LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS DEL ALTO IMPACTO PARA EL DISTRITO CAPITAL	9.09	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	48.00	4.36
10. DIRECTRICES ORIENTADAS A LA PREVENCION DE PRACTICAS IRREGULARES EN EL DISTRITO Y COMISION DE FALTAS DISCIPLINARIAS	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00		30.00		20.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
11. ORIENTAR A 2.500 SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE PREVENCION DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		50.00		35.00		5.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 26.93

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7632 21 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA APLICACIÓN MOVIL PAEA USO DE LA CIUDADANIA	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	25.00
2.	ADQUIRIR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE NECESARIO PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN TECNOLÓGICA	25.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	12.50
3.	RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE CONFIDENCIALIDAD, DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS POR LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	25.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	12.50
4.	CREAR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL QUE SE ALINEE CON LOS REQUERIMIENTOS DE MIPG Y EL MINISTERIO TIC	25.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							62.50			

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7640 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

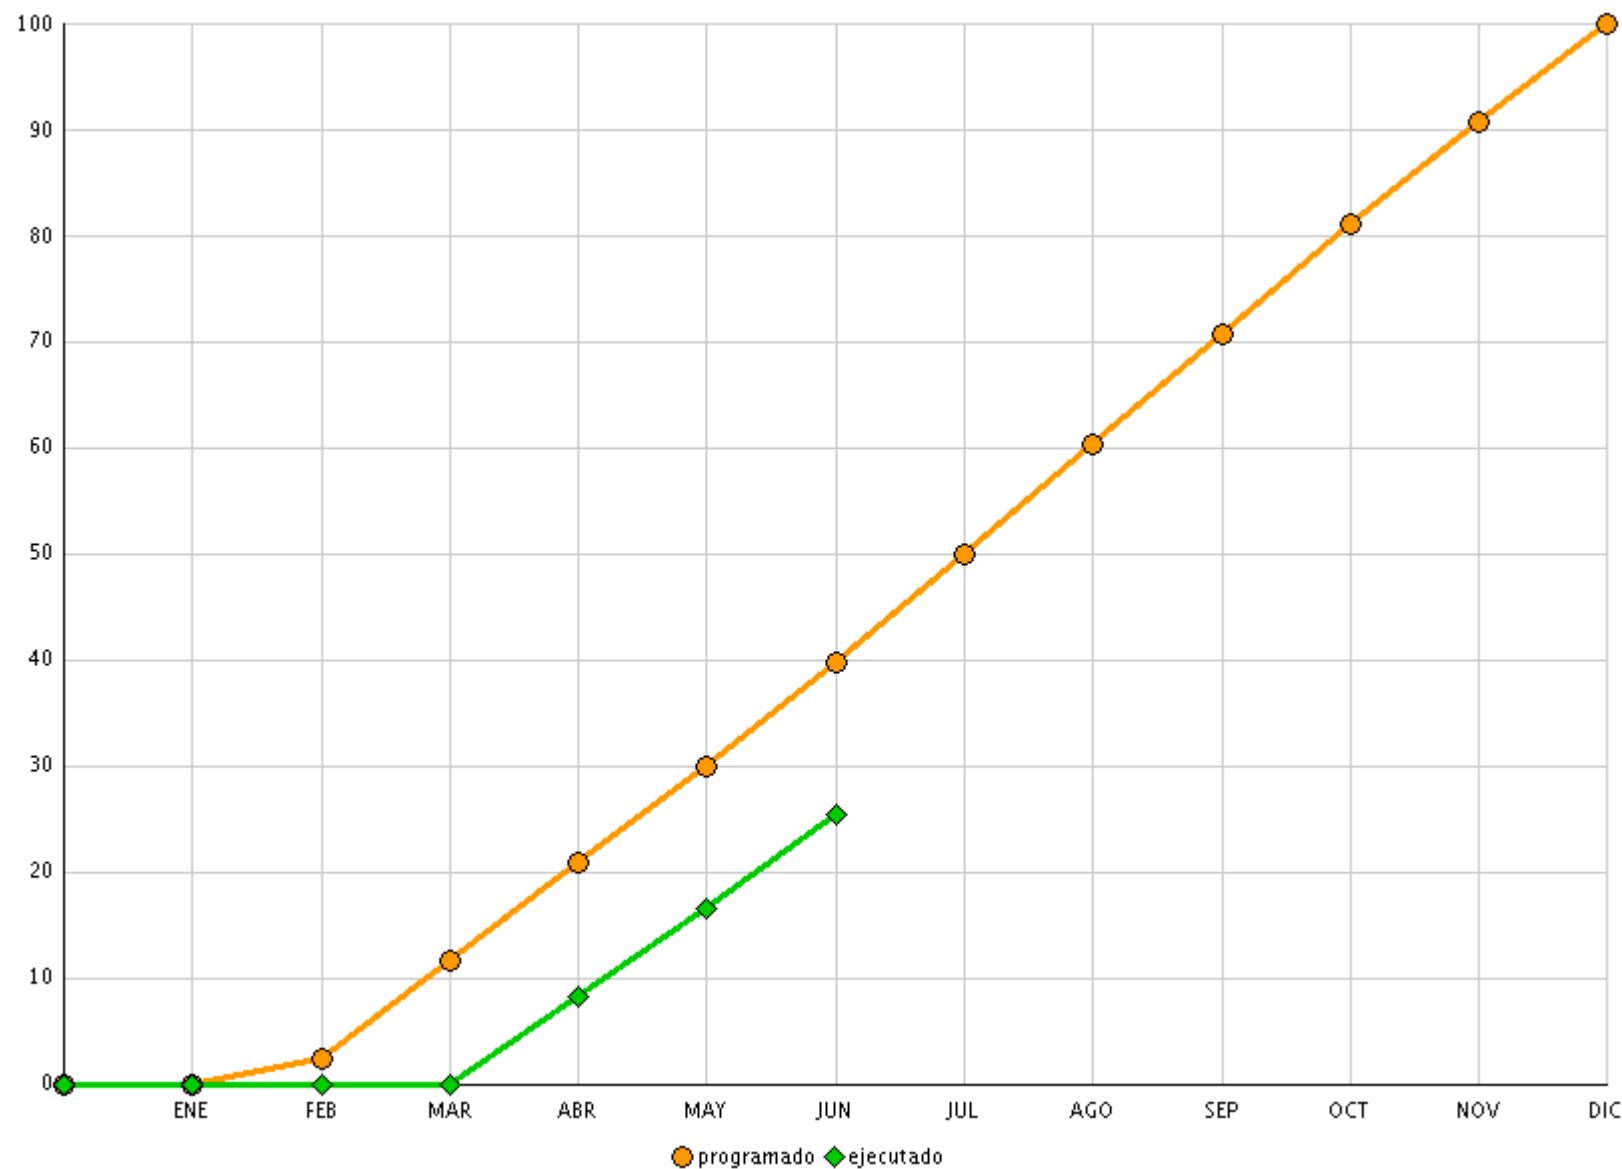


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.52	11.70	20.88	30.06	39.78	50.04	60.30	70.84	81.10	90.82	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	8.25	16.52	25.49						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7692 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

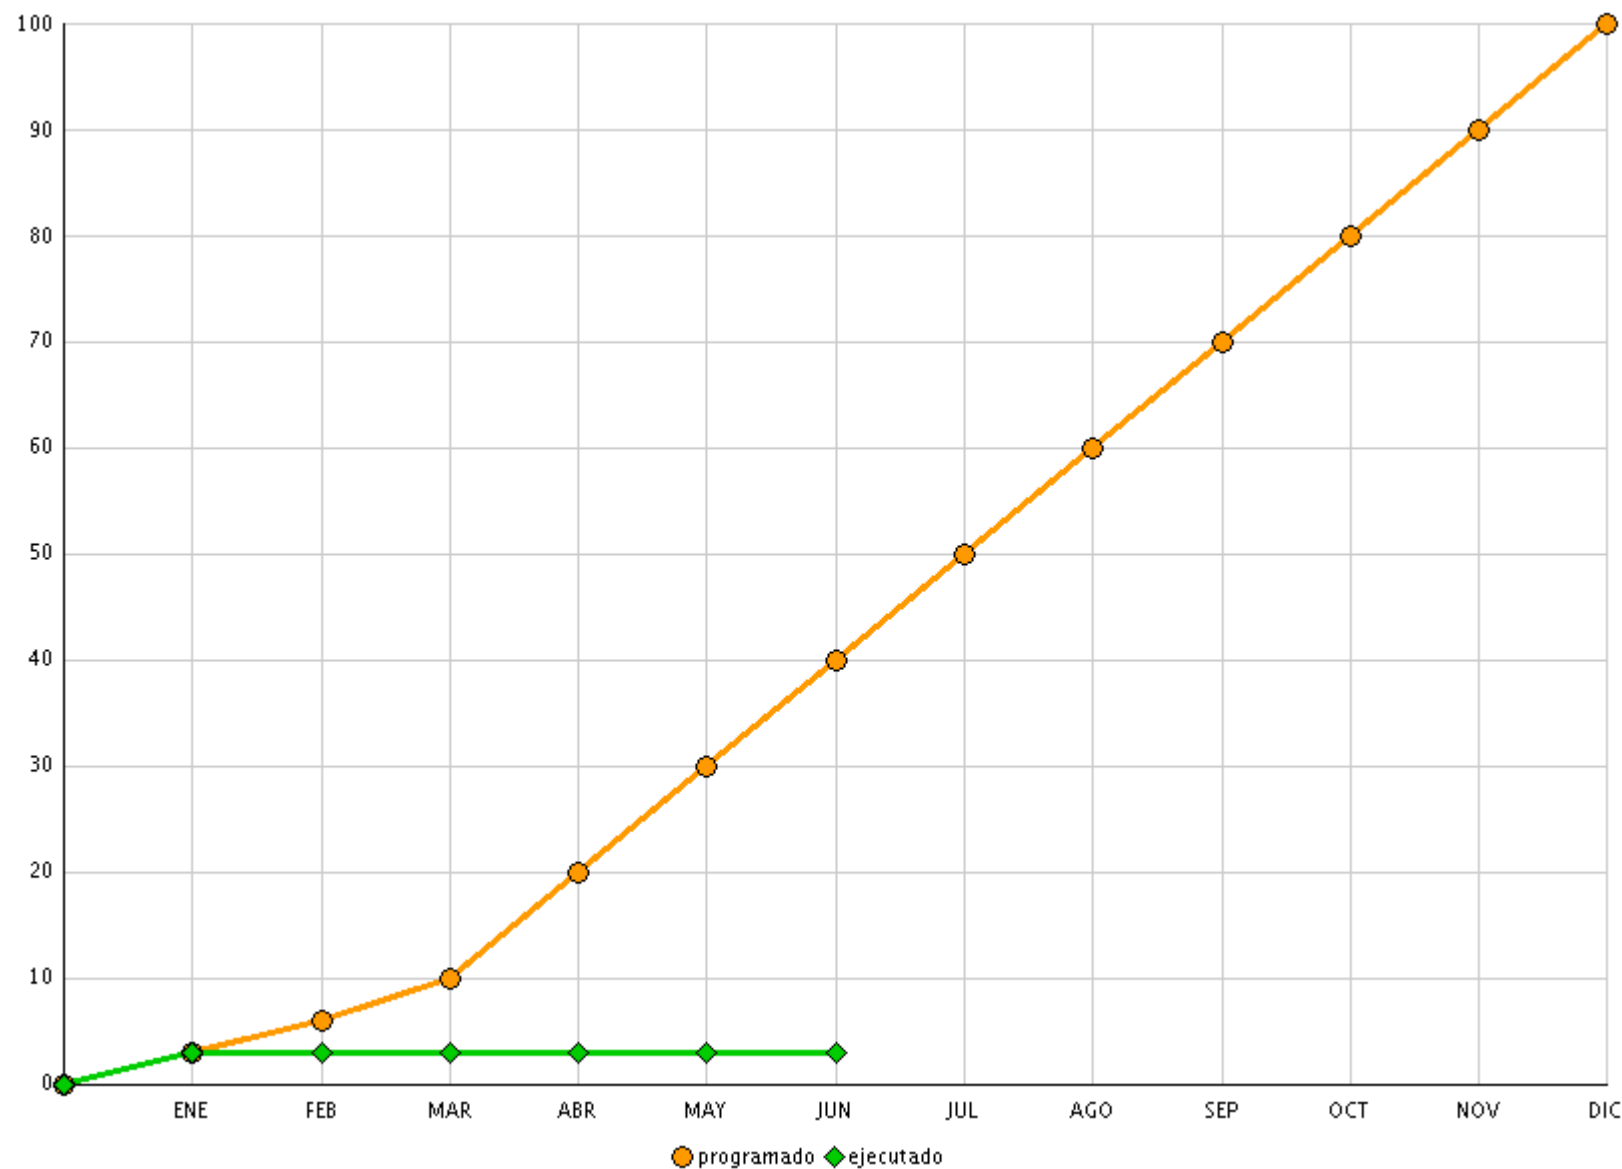


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	6.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7695 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

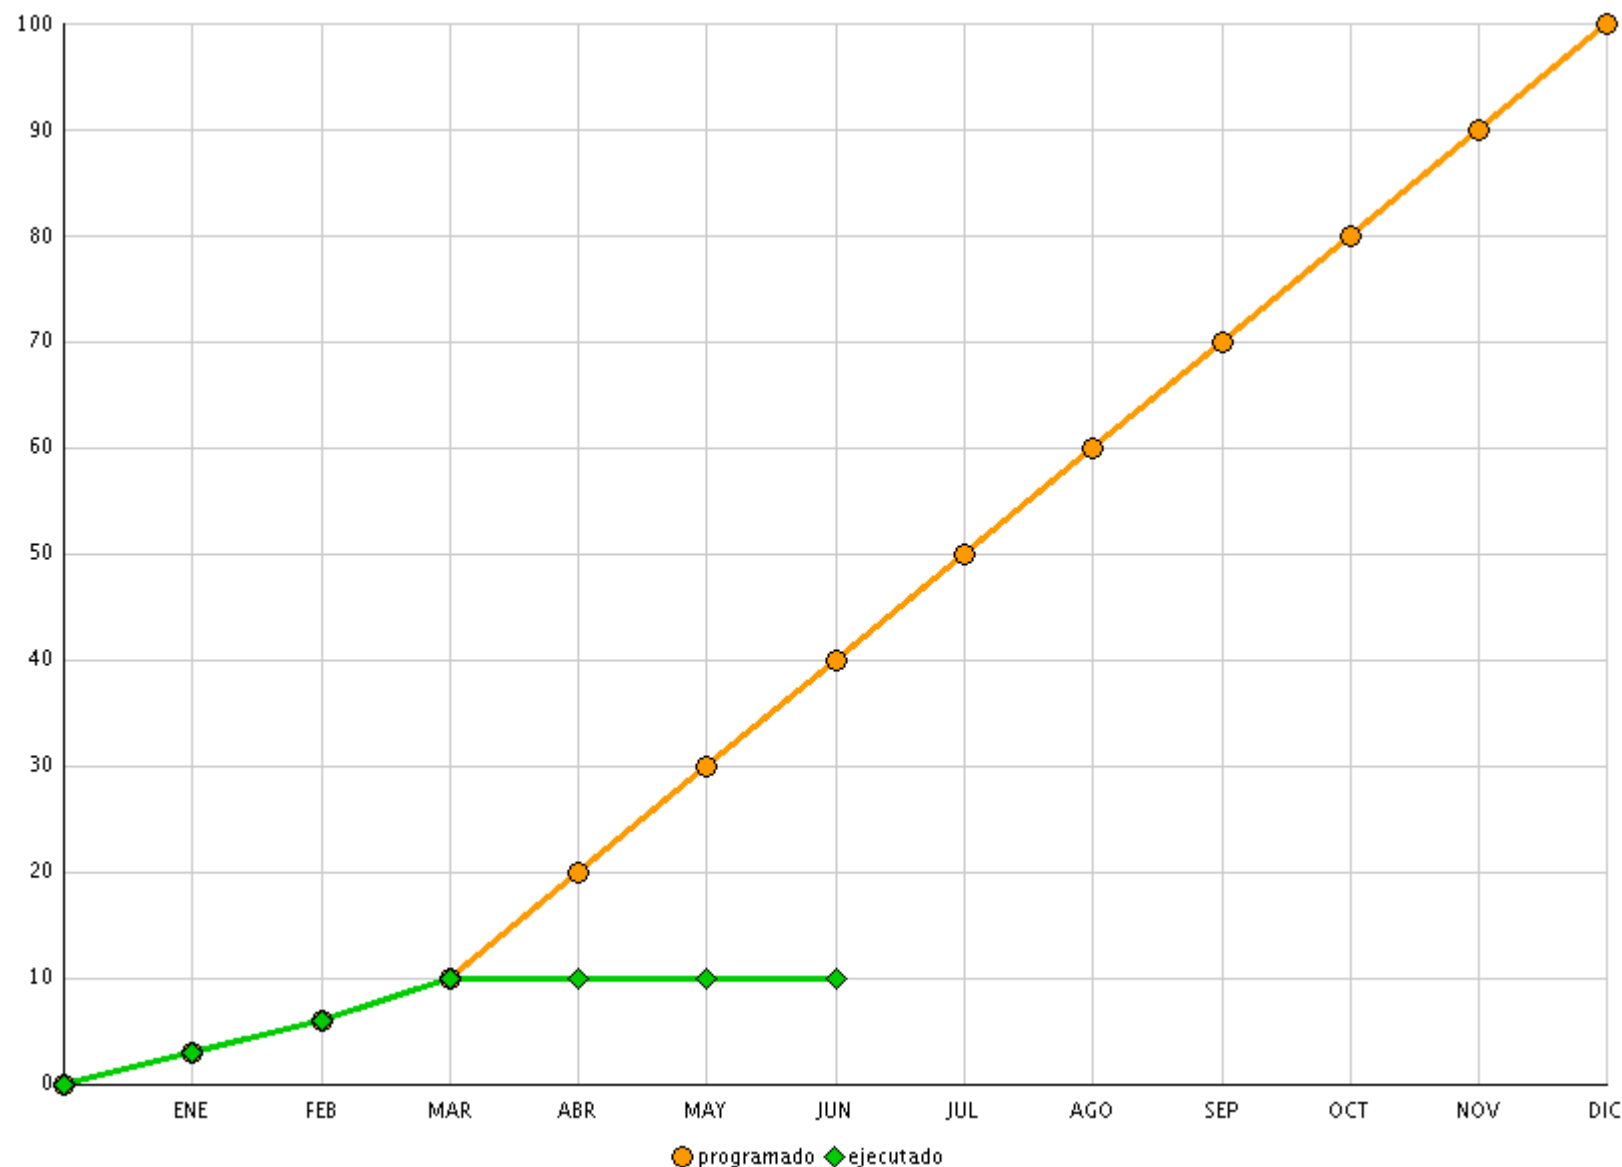


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	6.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	3.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7765 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

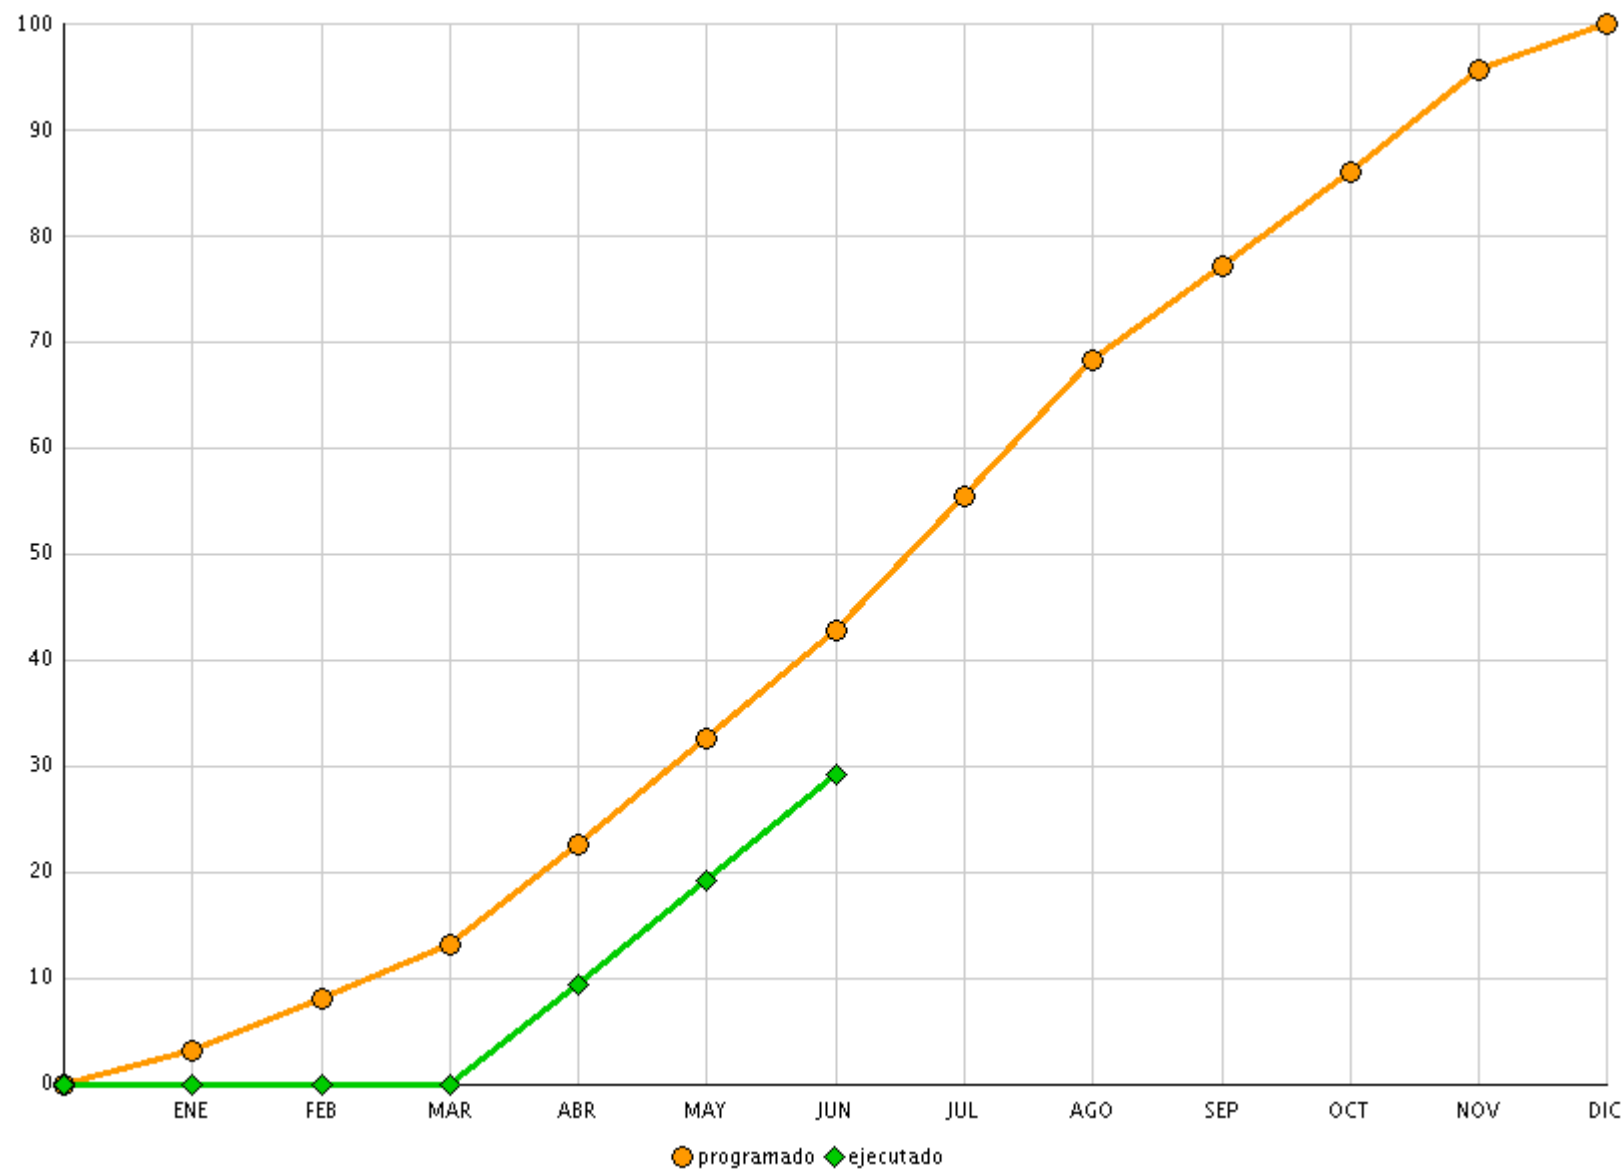


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.20	8.10	13.22	22.67	32.67	42.89	55.51	68.35	77.19	86.03	95.67	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	9.37	19.23	29.29						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7767 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá

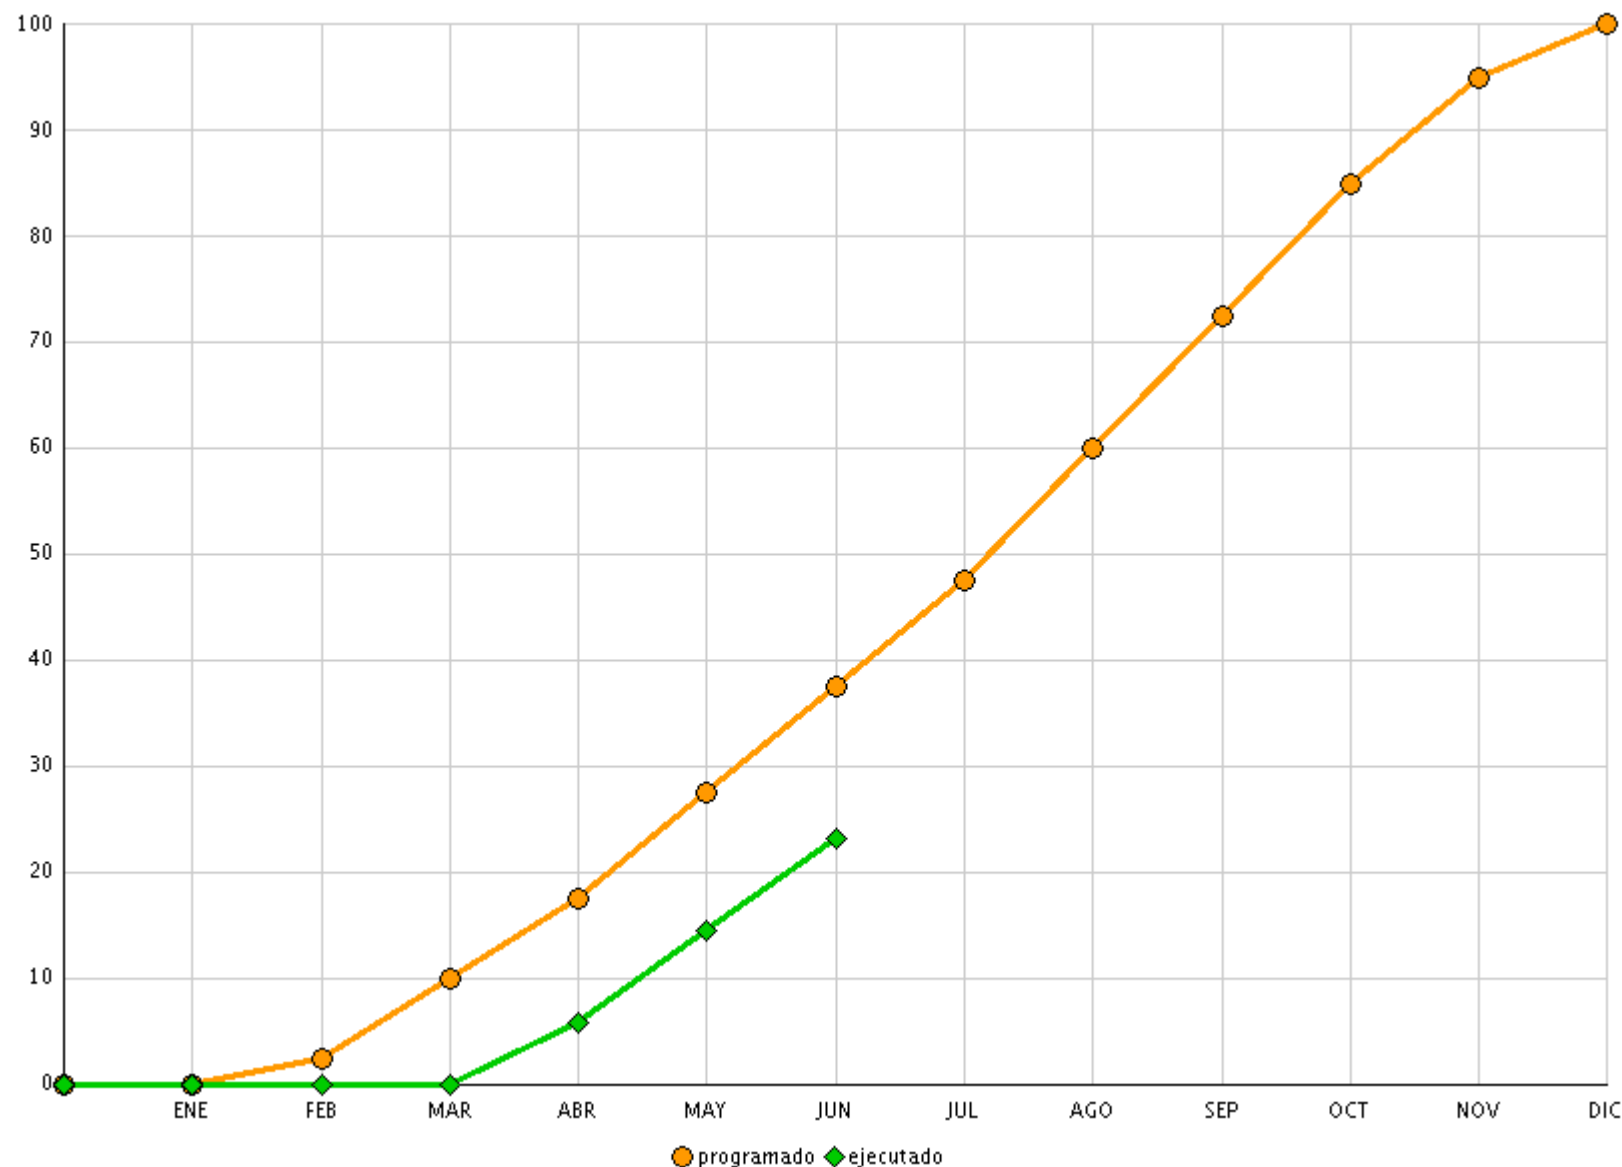


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.50	10.00	17.50	27.50	37.50	47.50	60.00	72.50	85.00	95.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	5.78	14.58	23.15						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7776 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

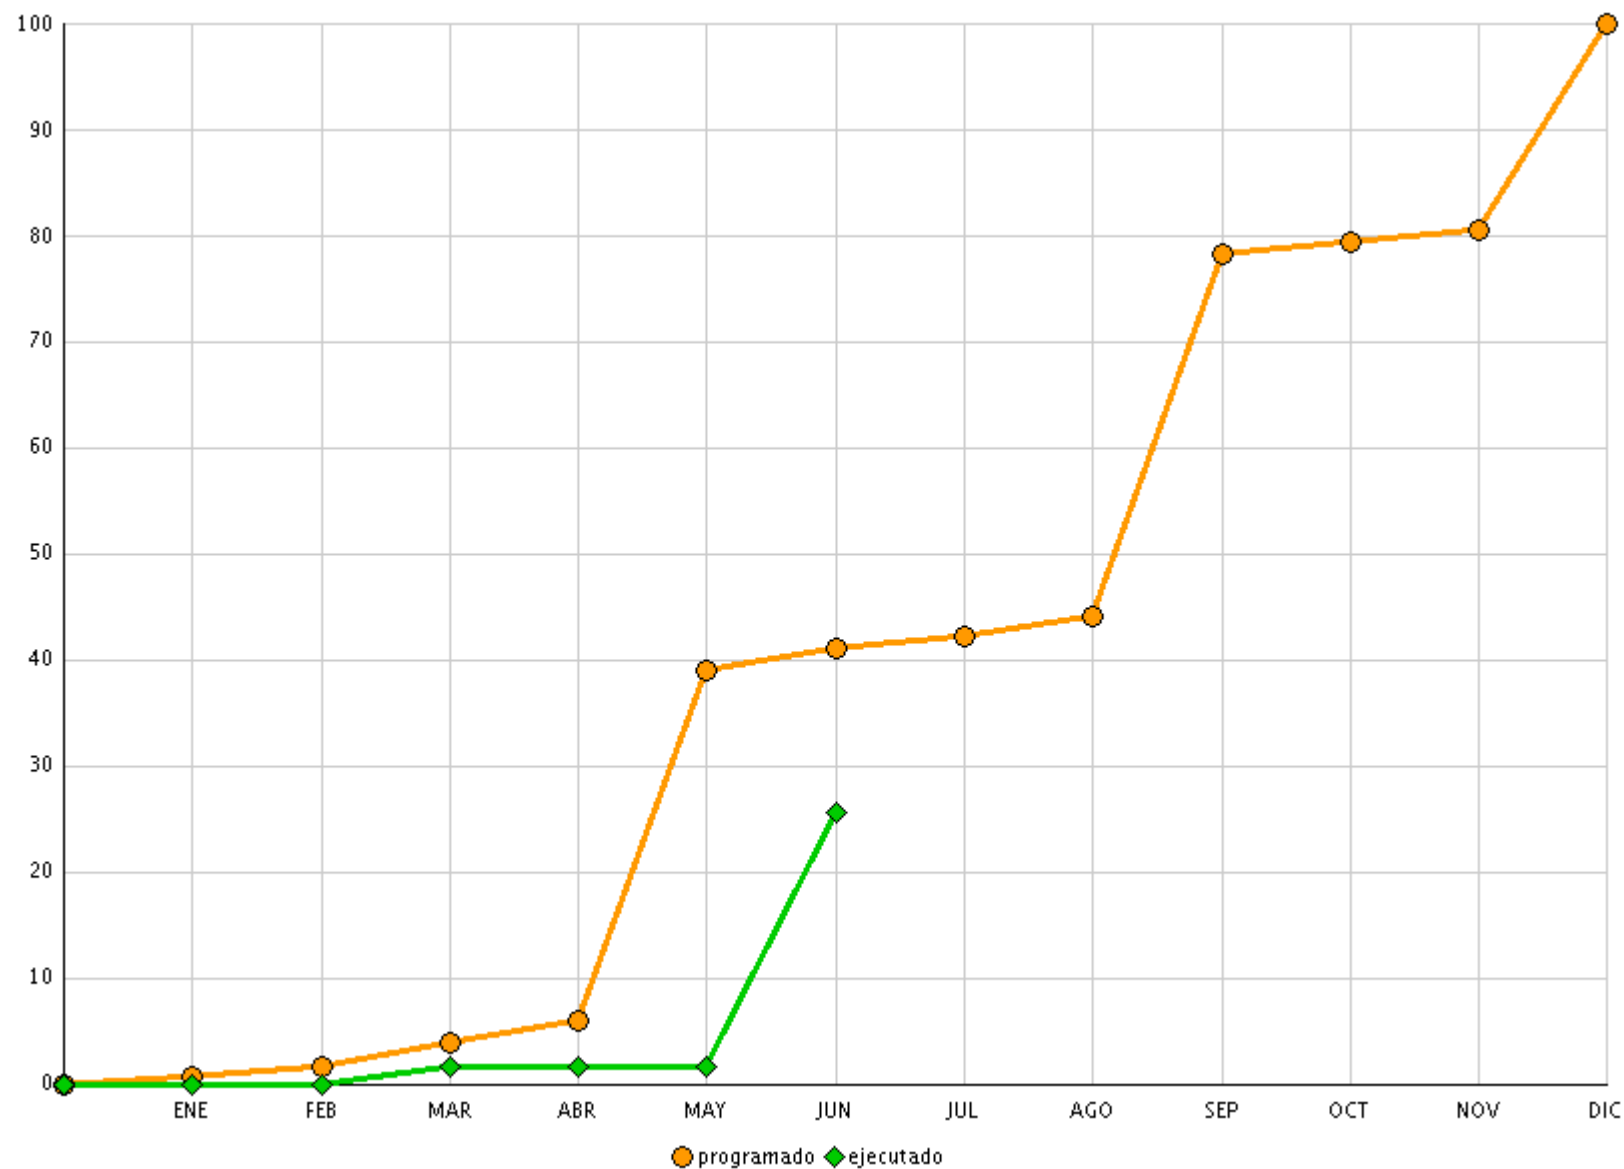


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.80	1.78	4.01	5.98	38.96	41.19	42.17	44.14	78.37	79.35	80.53	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	1.61	1.61	1.61	25.61						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7777 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

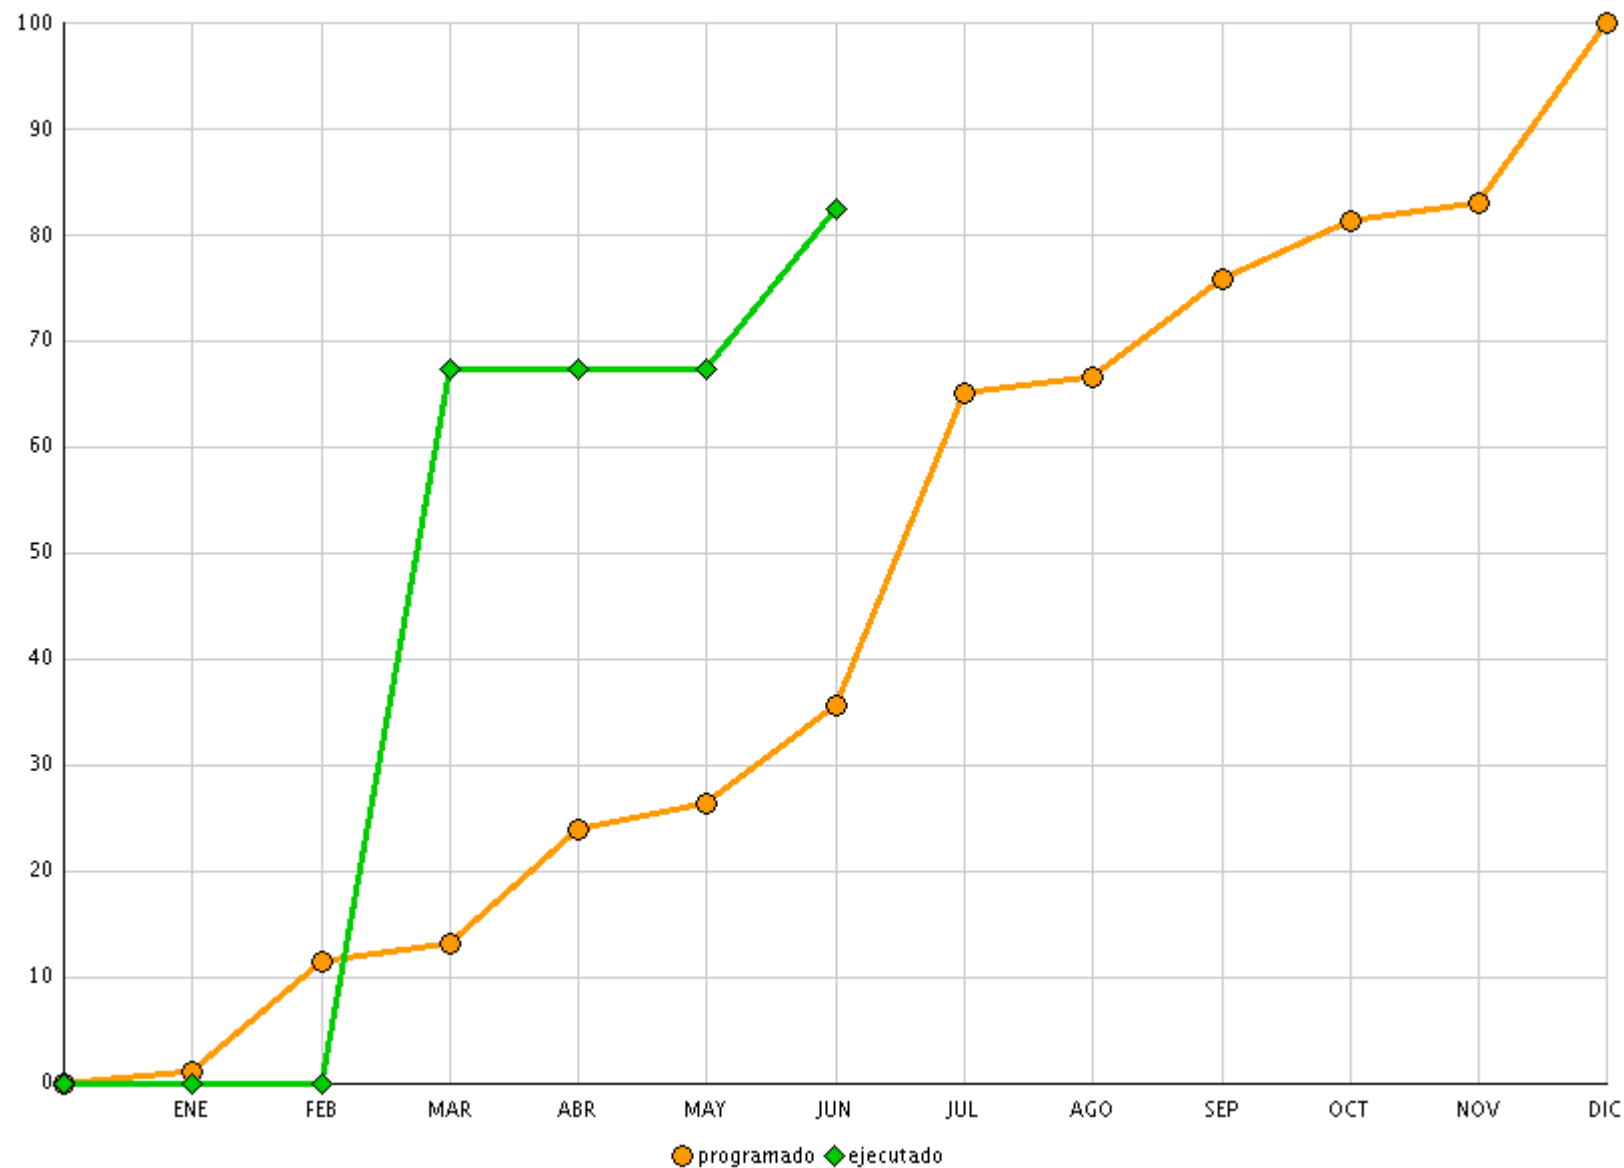


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.20	11.58	13.28	23.99	26.38	35.68	65.04	66.64	75.82	81.36	83.07	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	67.40	67.40	67.40	82.39						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7781 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

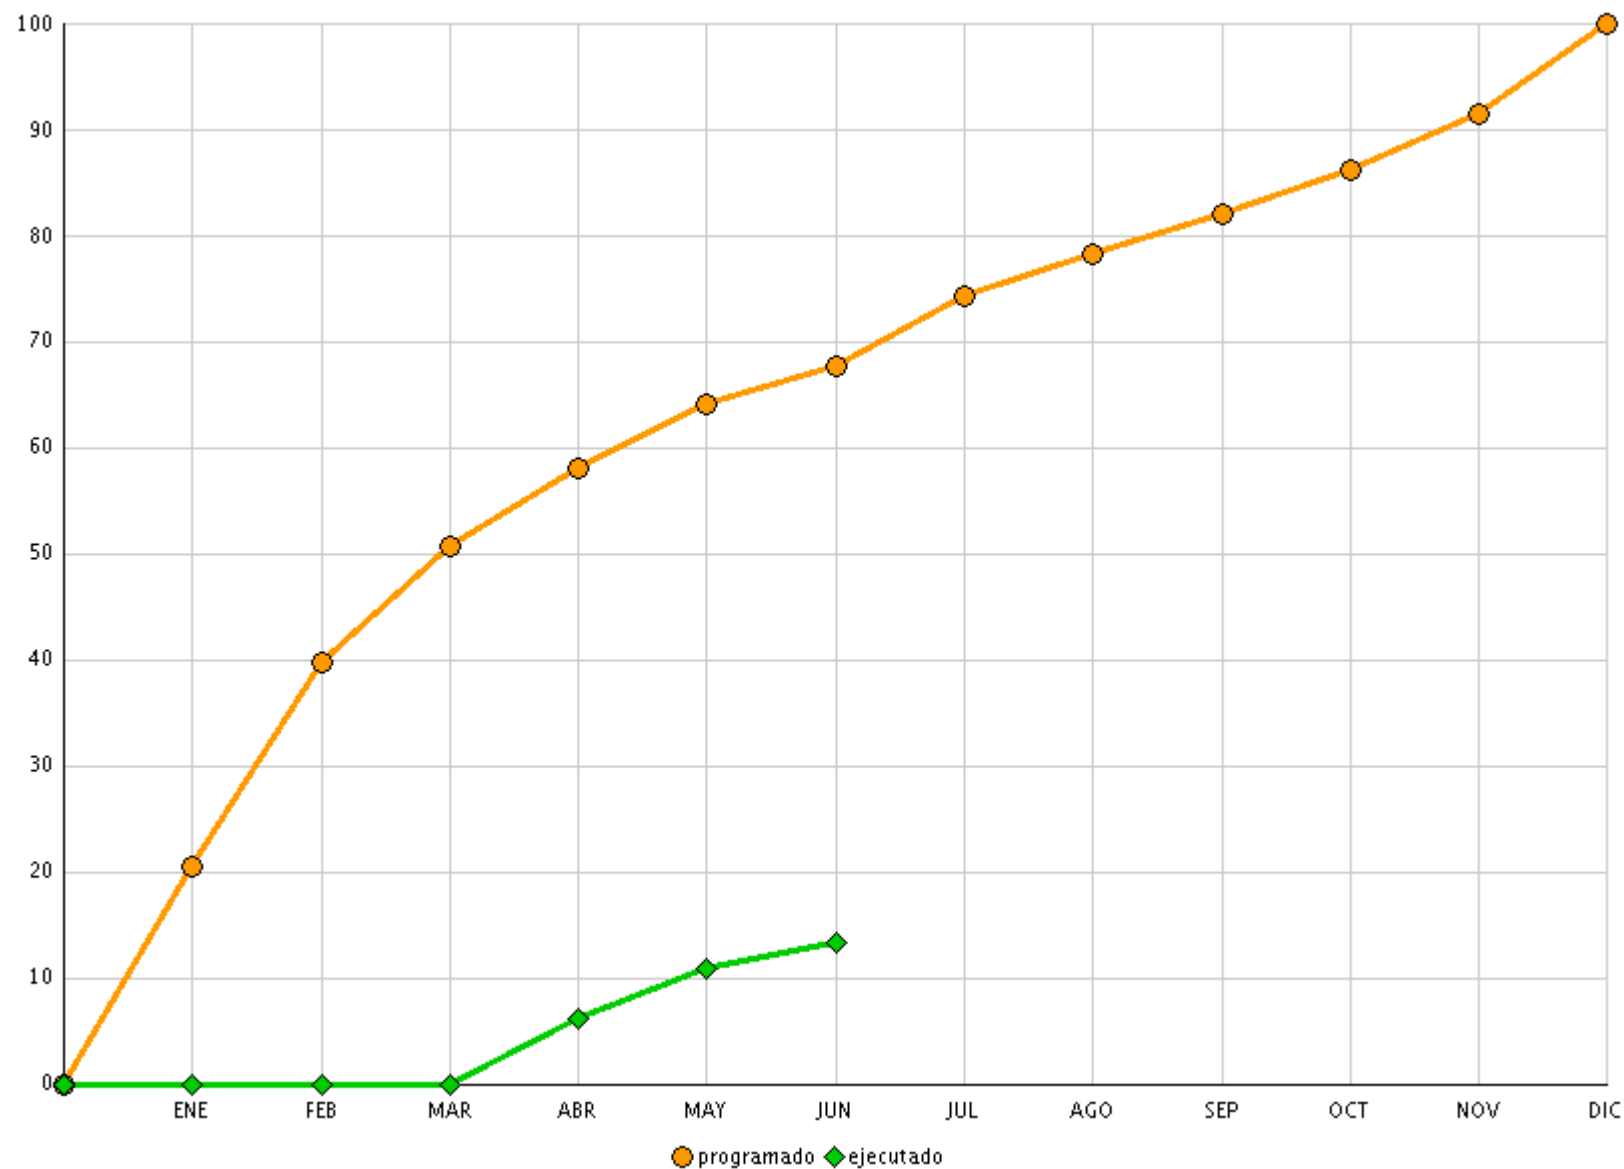


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	20.50	39.75	50.80	58.10	64.15	67.70	74.25	78.30	82.10	86.15	91.45	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	6.30	10.95	13.35						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7783 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

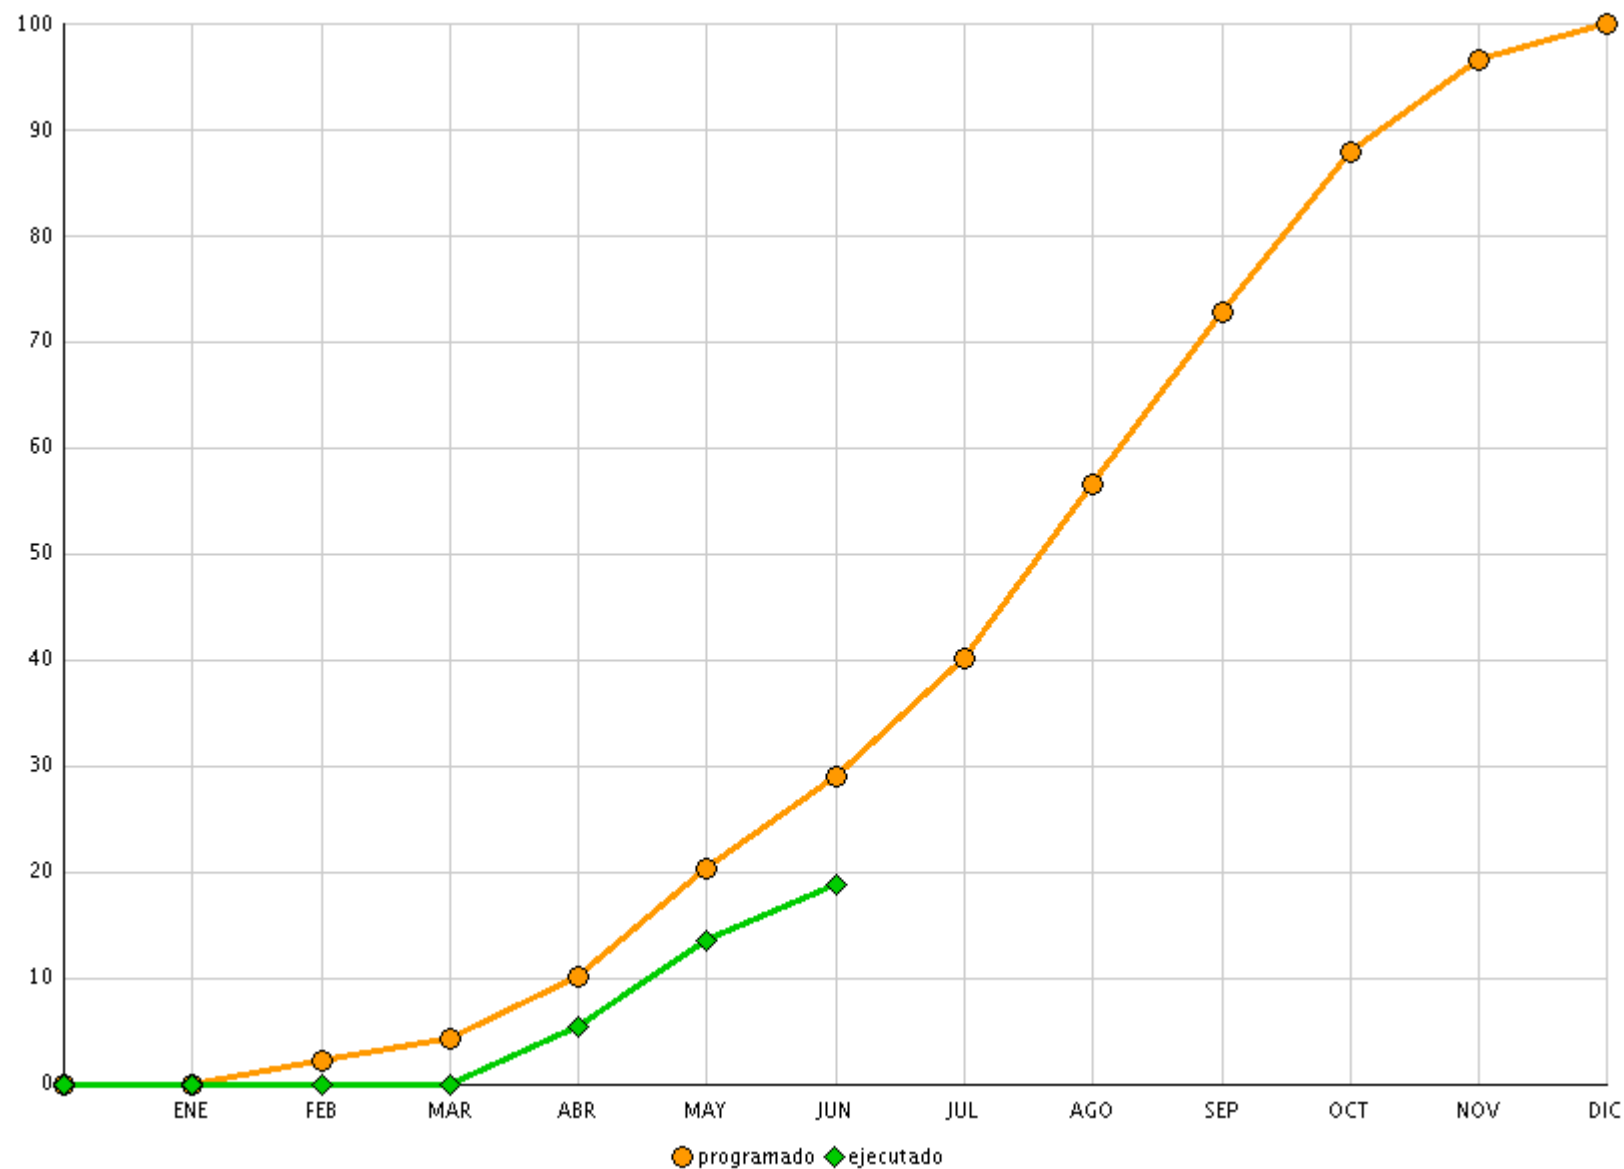


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.20	4.40	10.15	20.30	29.10	40.10	56.60	72.80	87.90	96.70	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	5.53	13.54	18.92						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7792 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

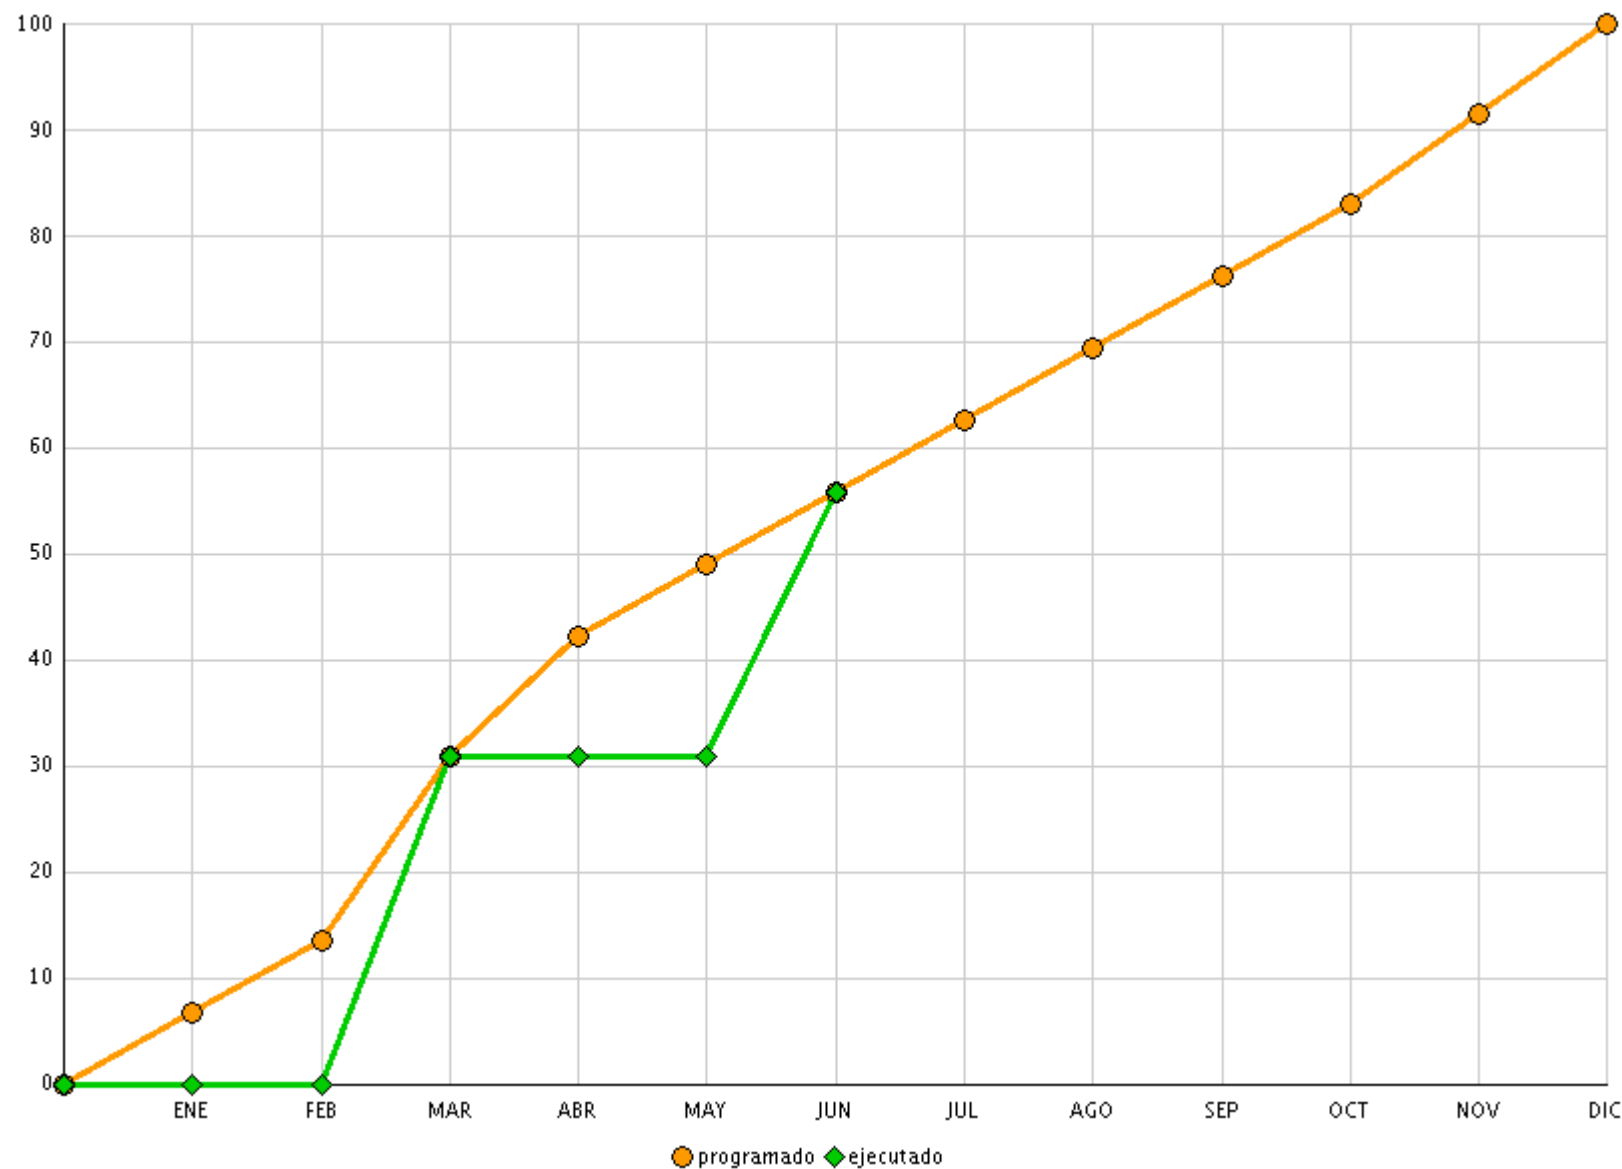


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.80	13.60	30.90	42.20	49.00	55.80	62.60	69.40	76.20	83.00	91.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	30.90	30.90	30.90	55.80						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7797 Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

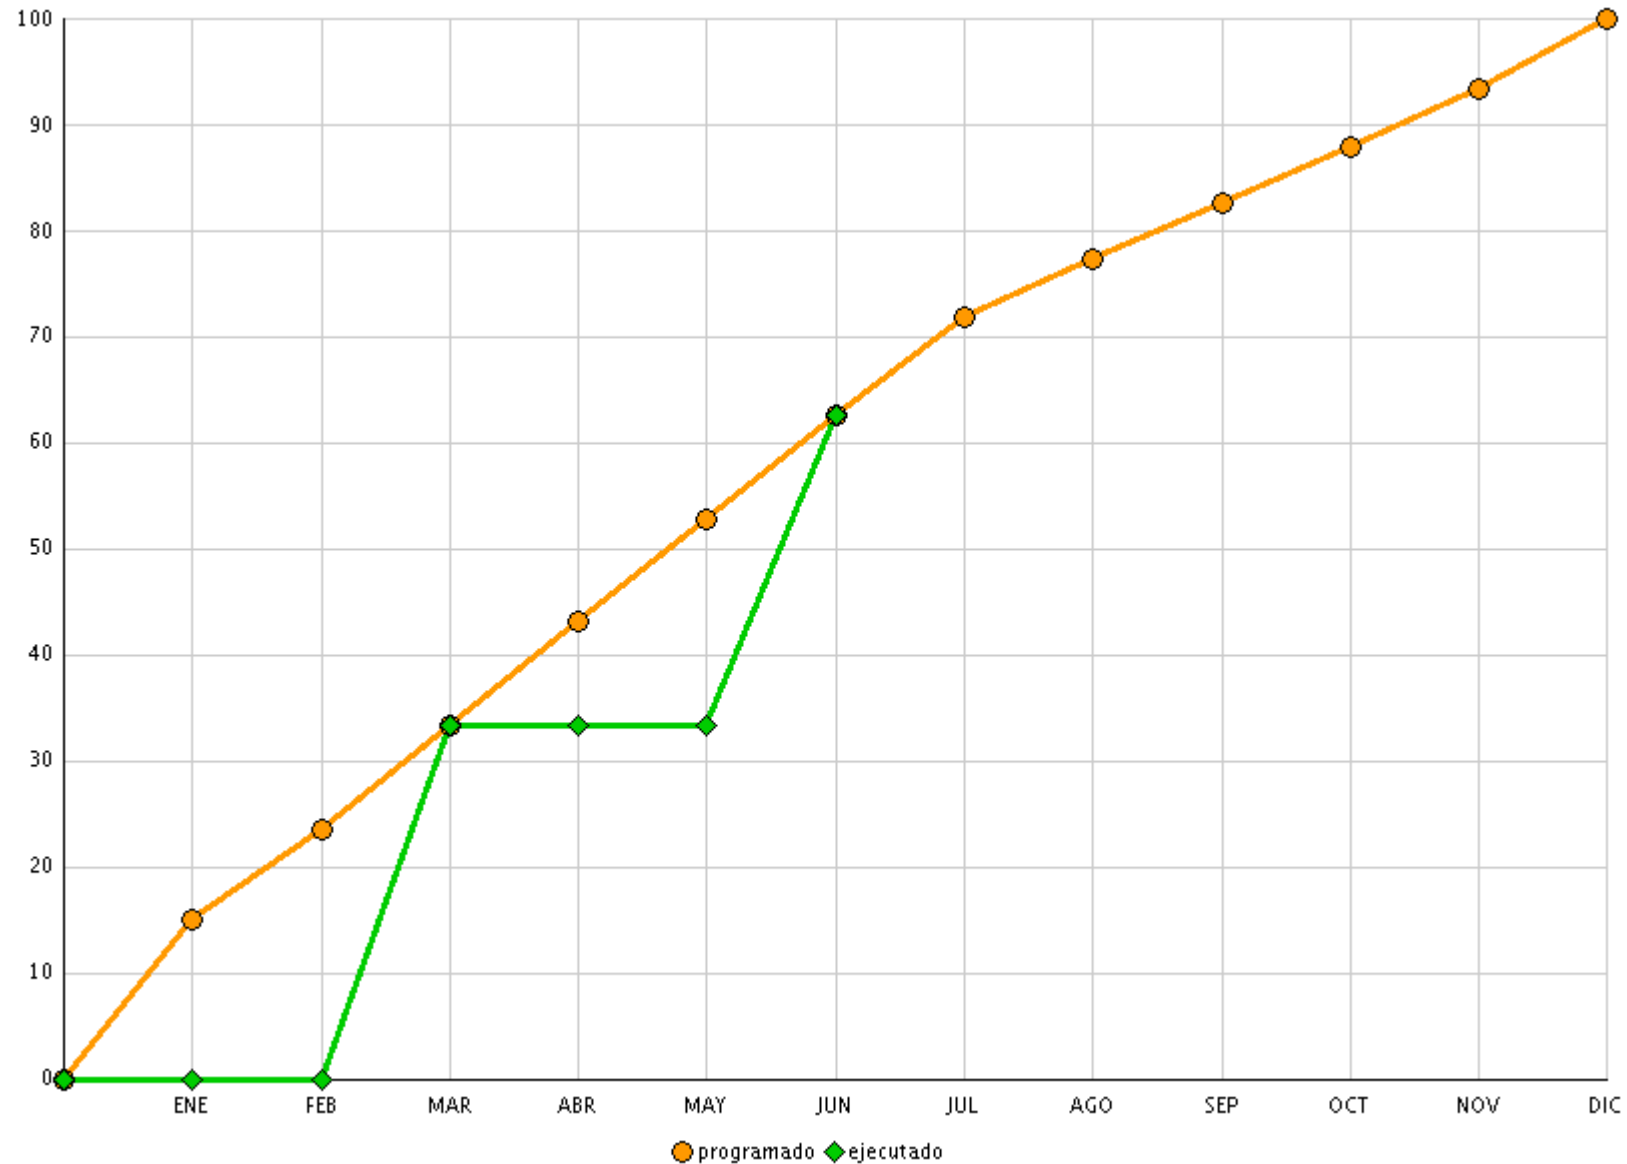

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	15.08	23.56	33.34	43.12	52.90	62.68	71.94	77.30	82.66	88.02	93.38	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	33.34	33.34	33.34	62.68						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7640 30 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA QUE ESTÁN FORMALIZADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (PROGRAMA, METODOLOGÍAS, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS).	28.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00		9.00		10.00		9.00		9.00		9.00		100.00	24.00	6.72
2.	DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO Y DIAGRAMAR LAS RUTAS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO JUDICIAL AL TRATAMIENTO DE DROGAS PARA LAS LÍNEAS PRINCIPIO DE OPORTUNIDADY ADOLESCENTES EN EJECUCIÓN DE SANCIÓN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.00	10.00	9.50	10.00	9.50	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	28.00	1.12
3.	DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL Y DELITOS	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.50	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	27.50	13.59
4.	DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA EL CAE NUEVO REDENTOR	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	8.00	0.22
5.	DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA CAE CAMPO VERDE.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.80	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	7.80	0.21
6.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA LA POBLACION POSPENADA EN BOGOTÁ	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	2.82
7.	REALIZAR ALIANZA CON EL INPEC PARA EL REPORTE DE LAS CIFRAS DE REINCIDENCIA DE LA POBLACION ATENDIDA EN BOGOTÁ A TRAVES DE CASA LIBERTAD	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	7.00	10.00	7.00	10.00	7.50	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	21.50	0.82
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							25.49			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7692 34 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco		Proyectos		Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE CIUDADANOS VINCULADOS A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.	20.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	3.00	0.60	
2.	FORMACIÓN DE JÓVENES EN HABILIDADES DE MEDIACION, TOLERANCIA, EMPATÍA, AUTOCONTROL Y MANEJO DE EMOCIONES.	20.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	3.00	0.60	
3.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA CIUDADCON ÉNFASIS EN LAS POBLACIONES EN ALTO	15.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	3.00	0.45	
4.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y EL MACHISMO	15.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	3.00	0.45	
5.	DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MEDIACION ESCOLAR Y COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA DE JUSTICIA PARA GENERAR CULTURA CIUDADANA EN LA CIUDAD	15.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	3.00	0.45	
6.	REALIZACIÓN DE CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL EN TODAS LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD (UNO POR CADA LOCALIDAD)	15.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	3.00	0.45	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7695 25 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES TERRITORIALES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	2.00
2.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA ESTRUCTURAS CRIMINALES DELINCUENCIALES	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	2.00
3.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	2.00
4.	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA PARA BOGOTA D.C.	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	2.00
5.	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN INVENTARIO UNIFICADO DE ESTRUCTURAS CRIMINALES	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									10.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7765 29 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Y URI PUENTE ARANDA	17.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	28.50	4.85
2.	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO CARCELARIO.	20.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	24.00	4.80
3.	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN SU TIEMPO LIBRE	20.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.90	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	23.90	4.78
4.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO E IMPLEMENTACIÓN EN CÁRCEL DISTRITAL	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	5.00	10.00	9.50	12.00	11.50	12.00		14.00		14.00		14.00		14.00		3.00		100.00	26.00	2.86
5.	GESTIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE SUELO DEL NUEVO CENTRO CARCELARIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE KIT DE ASEO Y COLCHONETAS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	12.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									29.29	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

7767 24 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DOCUMENTO DE PLANEACION E IMPLEMENTACION DE JORNADAS DE DIFISIÓN Y PEDAGOGIA DEL CÓDIGO	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.50	10.00	9.00	10.00	9.30	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	26.80	6.70
2.	IDENTIFICACION DE LAS 5 INICIATIVAS Y EJEEUCTAR LAS ACCIONES PLANTEADAS EN LAS LOCALIDADES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	19.00	4.75
3.	DOCUMENTO CON PROPUESTA DE RUTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CNSCC	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	7.00	10.00	7.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	19.00	4.75
4.	REALIZAR PROTOCOLO DE MATERIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y PROGRAMA COMUNITARIO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.60	10.00	9.20	10.00	9.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	27.80	6.95
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										23.15

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7776 20 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INMERSAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
2.	REALIZAR LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LAS PQRS CIUDADANAS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.50
3.	REALIZAR LA CUALIFICACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA Y ACTUALIZAR Y PUBLICAR VIDEOS EN LENGUAJE DE SEÑAS	2.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	36.00	0.72
4.	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SDSCJ	10.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	18.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	18.00	1.80
5.	REALIZAR EL MONITOREO PERIÓDICO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL BOTÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.99
6.	SUMINISTRAR, ADECUAR E INSTALAR EL MOBILIARIO Y DESARROLAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		20.00		100.00	40.00	0.80
7.	IMPLEMENTAR EL COMPONENTE DE INTEGRIDAD DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		20.00		100.00	40.00	3.60
8.	EJECUTAR EL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE MIPG	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		20.00		100.00	40.00	7.60
9.	DESARROLLO DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		20.00		100.00	40.00	7.60
10.	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11.	ACTUALIZAR EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA ENTIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12.	REALIZAR AUDITORÍAS Y PROCESOS DE VERIFICACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										25.61

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7777 24 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADQUIRIR BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	69.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	90.00	12.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00	40.00		0.00		6.00		6.00		0.00		18.00		100.00	99.00	68.31
2. EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ACTUALIZAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES QUE OPTIMICEN LA PRODUCTIVIDAD DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	14.00	11.00	0.00	13.00	0.00	25.00	27.00	2.00		10.00		11.00		0.00		7.00		11.00		100.00	41.00	1.23
3. EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES NUEVOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	27.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		100.00	30.00	1.80
4. EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ACTUALIZAR DOCUMENTOS Y/O ELABORAR DOCUMENTOS ASOCIADOS CON EL DOMINIO DE GOBIERNO DE TI	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	9.00	0.00	9.00	0.00	10.00	28.00	9.00		9.00		10.00		9.00		9.00		11.00		100.00	43.00	4.30
5. EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ACTUALIZAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES E IMPLENTAR UNO NUEVO , CON EL FIN DE MEJORAR SU FUNCIONALIDAD, ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD	10.00	7.00	0.00	14.00	0.00	10.00	31.00	11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	32.00	7.00		3.00		13.00		4.00		5.00		6.00		100.00	63.00	6.30
6. EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ADELANTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
7. EJECUTAR ACCIONES PLANIFICADAS PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS, PARA FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	35.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	0.45
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		82.39

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

7781 18 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO PARA LA ELABORAR DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	PLANEACIÓN DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA A REALIZAR DURANTE LA VIGENCIA 2021	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	REVISIÓN DE LOS DOS PRIMEROS DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE SERÁN ENTREGADOS.	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y REPORTE DEL TERCER Y CUARTO DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y REPORTE DEL QUINTO Y SEXTO DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO PARA GENERAR ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	REDACCIÓN ESTADO DEL ARTE EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.50
8.	DISEÑO MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.50
9.	DISEÑO METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA	5.00	0.00	0.00	25.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	RECOLECCIÓN, NORMALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	30.00	1.50
11.	ANÁLISIS FINAL DE ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	42.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	42.00	2.10
12.	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, REVISIÓN FINAL DE ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	22.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		100.00	47.00	2.35
13.	DIVULGACIÓN DE ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
14.	CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO PARA MANTENER BODEGA DE DATOS	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15.	ASEGURAR Y GARANTIZAR EL CARGUE DE DATOS EN LA BODEGA VALIDANDO PARA ELLO LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN Y FUNCIONABILIDAD DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS.	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	24.00	1.20
16.	CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO PARA LA ELABORAR DOCUMENTOS POLICY BRIEF	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
17.	PLANEACIÓN DE DOCUMENTOS POLICY BRIEF A REALIZAR DURANTE LA VIGENCIA 2021	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
18.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS POLICY BRIEF	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	24.00	1.20
19.	DEFINICIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS EVENTO DE DIVULGACIÓN PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		35.00		30.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
20.	COORDINACIÓN DE TAREAS, DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE EVENTO DE DIVULGACIÓN PARA LA GENERACION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		35.00		35.00		30.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

7781 18 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		13.35

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7783 17 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS URIS EN BOGOTÁ	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.00	10.00	9.00	10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	17.00	1.87
2.	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8.50	10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	18.50	2.04
3.	MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL DISEÑADO Y APROBADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS CASAS DE JUSTICIA	11.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	26.00	2.86
4.	REALIZAR PILOTO DEL MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	9.00	15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	19.00	2.09
5.	MANTENER LOS EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA, EN SU INFRAESTRUCTURA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE	11.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	7.45	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	23.45	2.58
6.	DISEÑAR EL MANUAL OPERATIVO Y PROCEDIMENTAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7.	IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN EN CUATRO CASAS DE JUSTICIA EN BOGOTÁ	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		0.00		0.00		100.00	45.00	5.40
8.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECEPCION DE DEMANDAS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00		40.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	ADECUACIÓN DE DOS SEDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTES	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	9.00	10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	19.00	2.09
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		18.92	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7792 38 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	INCENTIVOS PERSONAL UNIFORMADO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO CAPITAL	10.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	4.80
2.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	12.00
3.	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
4.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REVISION TECNICO MECANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MEBOG	10.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	4.80
5.	AVANZAR EN LA CONTRUCCIÓN DEL NUEVO COMANDO DE LA SEDE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	40.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	19.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									55.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7797 34 Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	DISEÑAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS AGENCIAS / ORGANISMOS DE SEGURIDAD	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	5.20		
2.	REALIZAR LAS DOTACIONES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DE LA CIUDAD	13.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	6.24		
3.	FINALIZAR LA FORMULACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL C4, EN LOS COMPONENTES DE GESTIÓN Y CALIDAD	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	13.00		
4.	SOSTENIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE 123, CON EL SOSTENIMIENTO NIVEL TECNOLÓGICO Y OPERATIVO	13.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	5.85		
5.	FINALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DEL C4	13.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	34.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	51.00	15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	11.05		
6.	ADELANTAR LOS ANALISIS DE 1.1.CN. ANÁLISIS IMPACTO AL NEGOCIO	13.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	34.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	51.00	15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	11.05		
7.	IMPLEMENTAR LA PLANTA TELEFÓNICA NG911 EN EL C4 E AVANZAR HACIA LA IMPLEMENTACION DE ANALÍTICA PARA LA SEGURIDAD	13.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	6.24		
8.	IMPLEMENTAR LA PLANTA TELEFÓNICA NG911 EN EL C4 E AVANZAR HACIA LA IMPLEMENTACION DE ANALÍTICA PARA LA SEGURIDAD	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.05		
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		62.68	

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7548 Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado

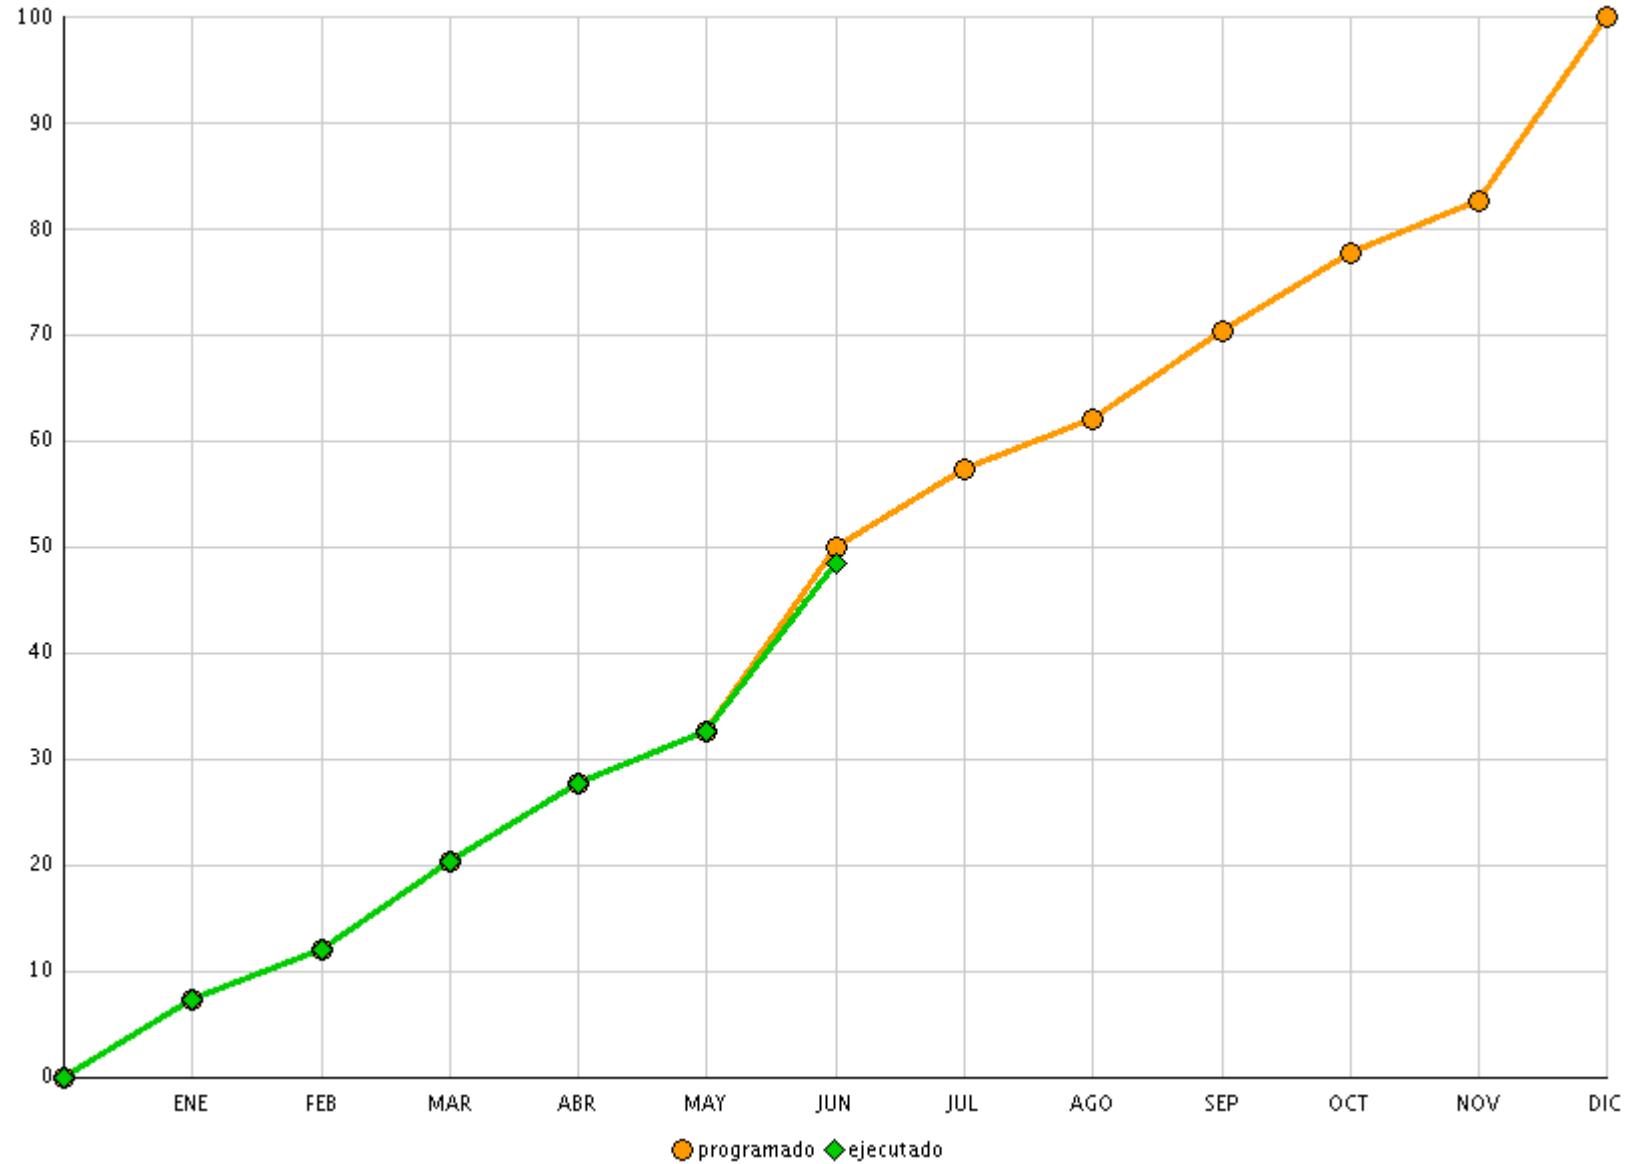


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.32	12.13	20.45	27.76	32.58	50.00	57.31	62.13	70.44	77.76	82.58	100.00
Ejecutado	7.32	12.13	20.45	27.76	32.58	48.50						

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7722 Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia

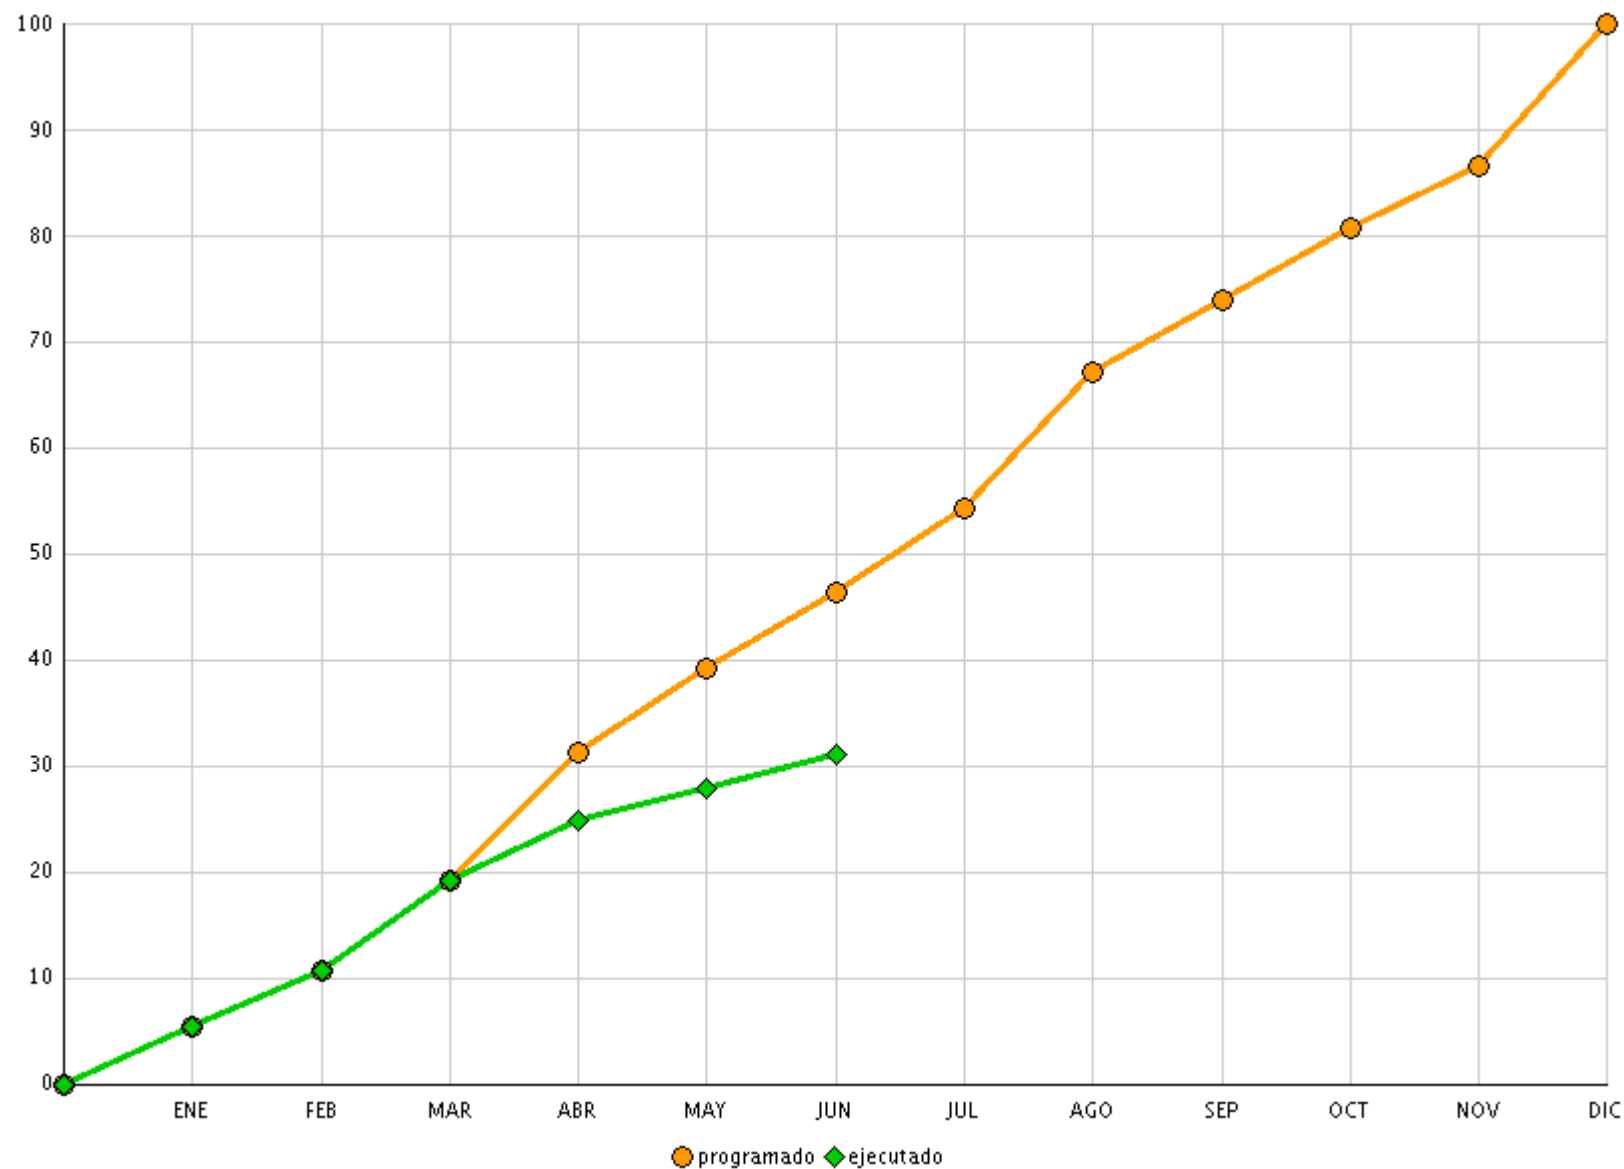


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.40	10.80	19.30	31.40	39.30	46.40	54.35	67.25	74.05	80.80	86.70	100.00
Ejecutado	5.40	10.80	19.30	24.90	28.00	31.15						

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7764 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

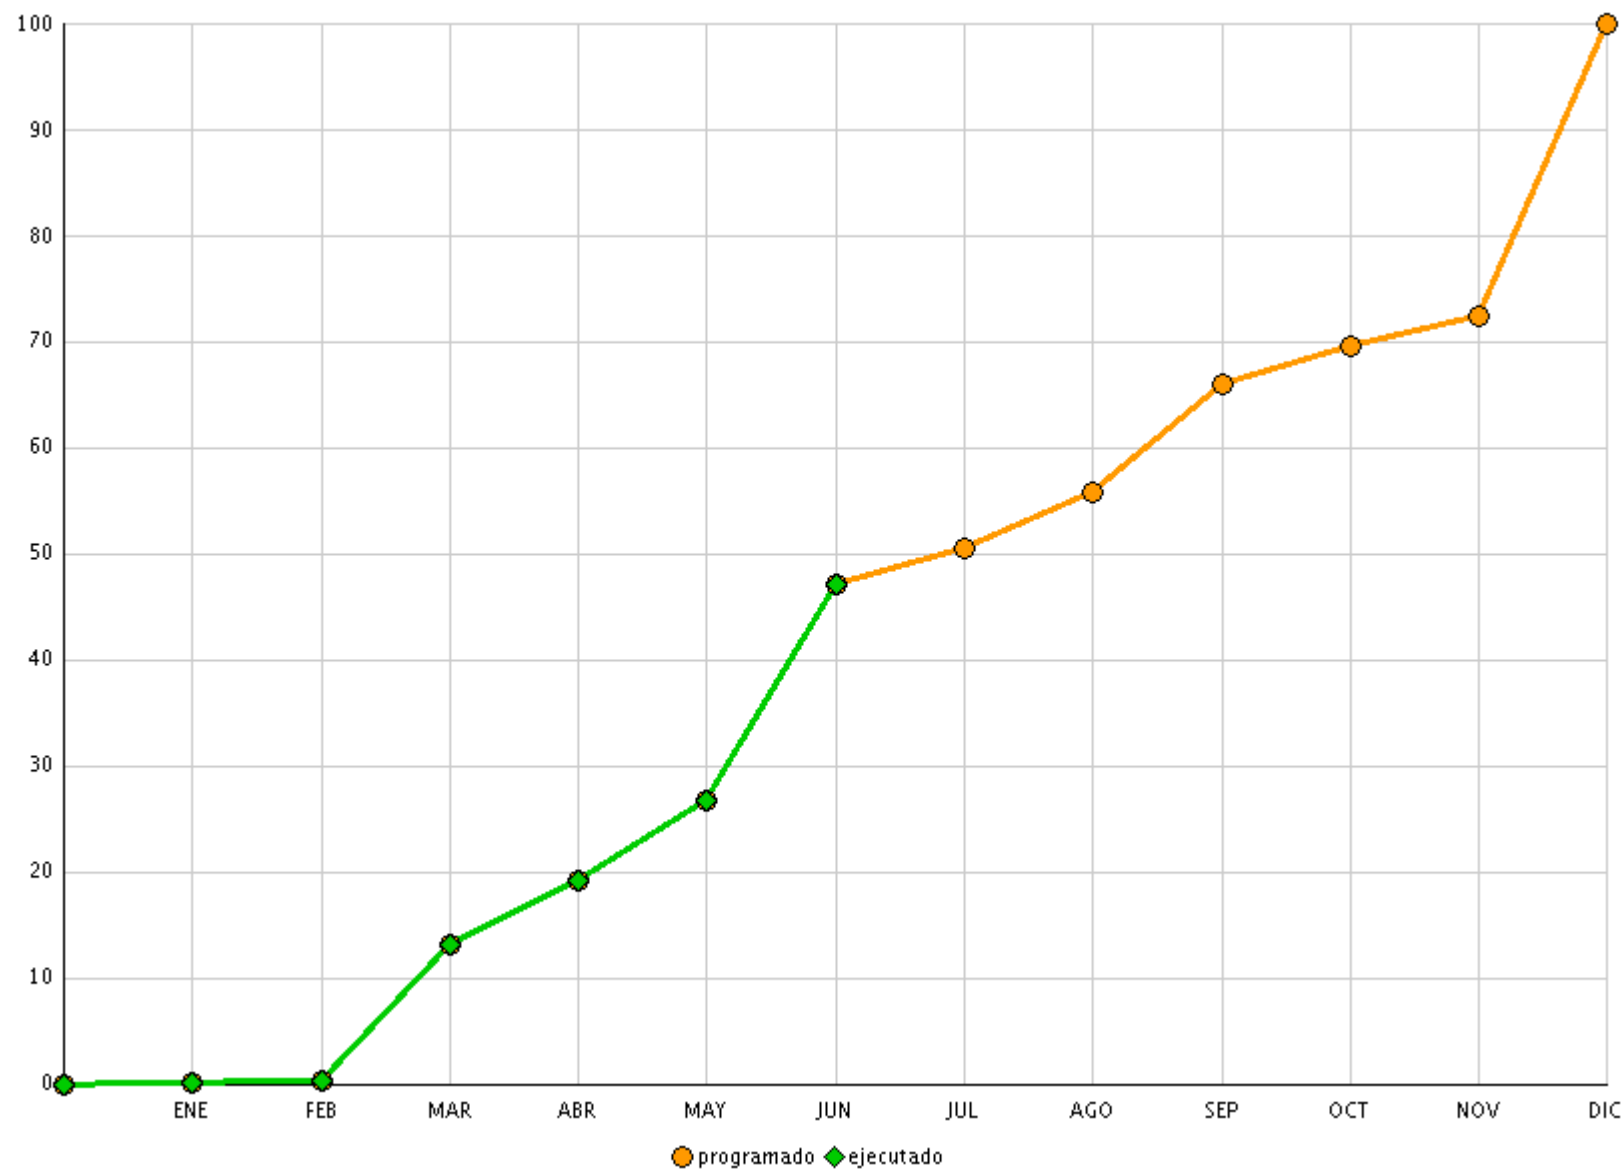


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.21	0.42	13.13	19.16	26.87	47.14	50.65	55.88	66.09	69.70	72.41	100.00
Ejecutado	0.21	0.42	13.13	19.16	26.87	47.14						

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7772 Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá

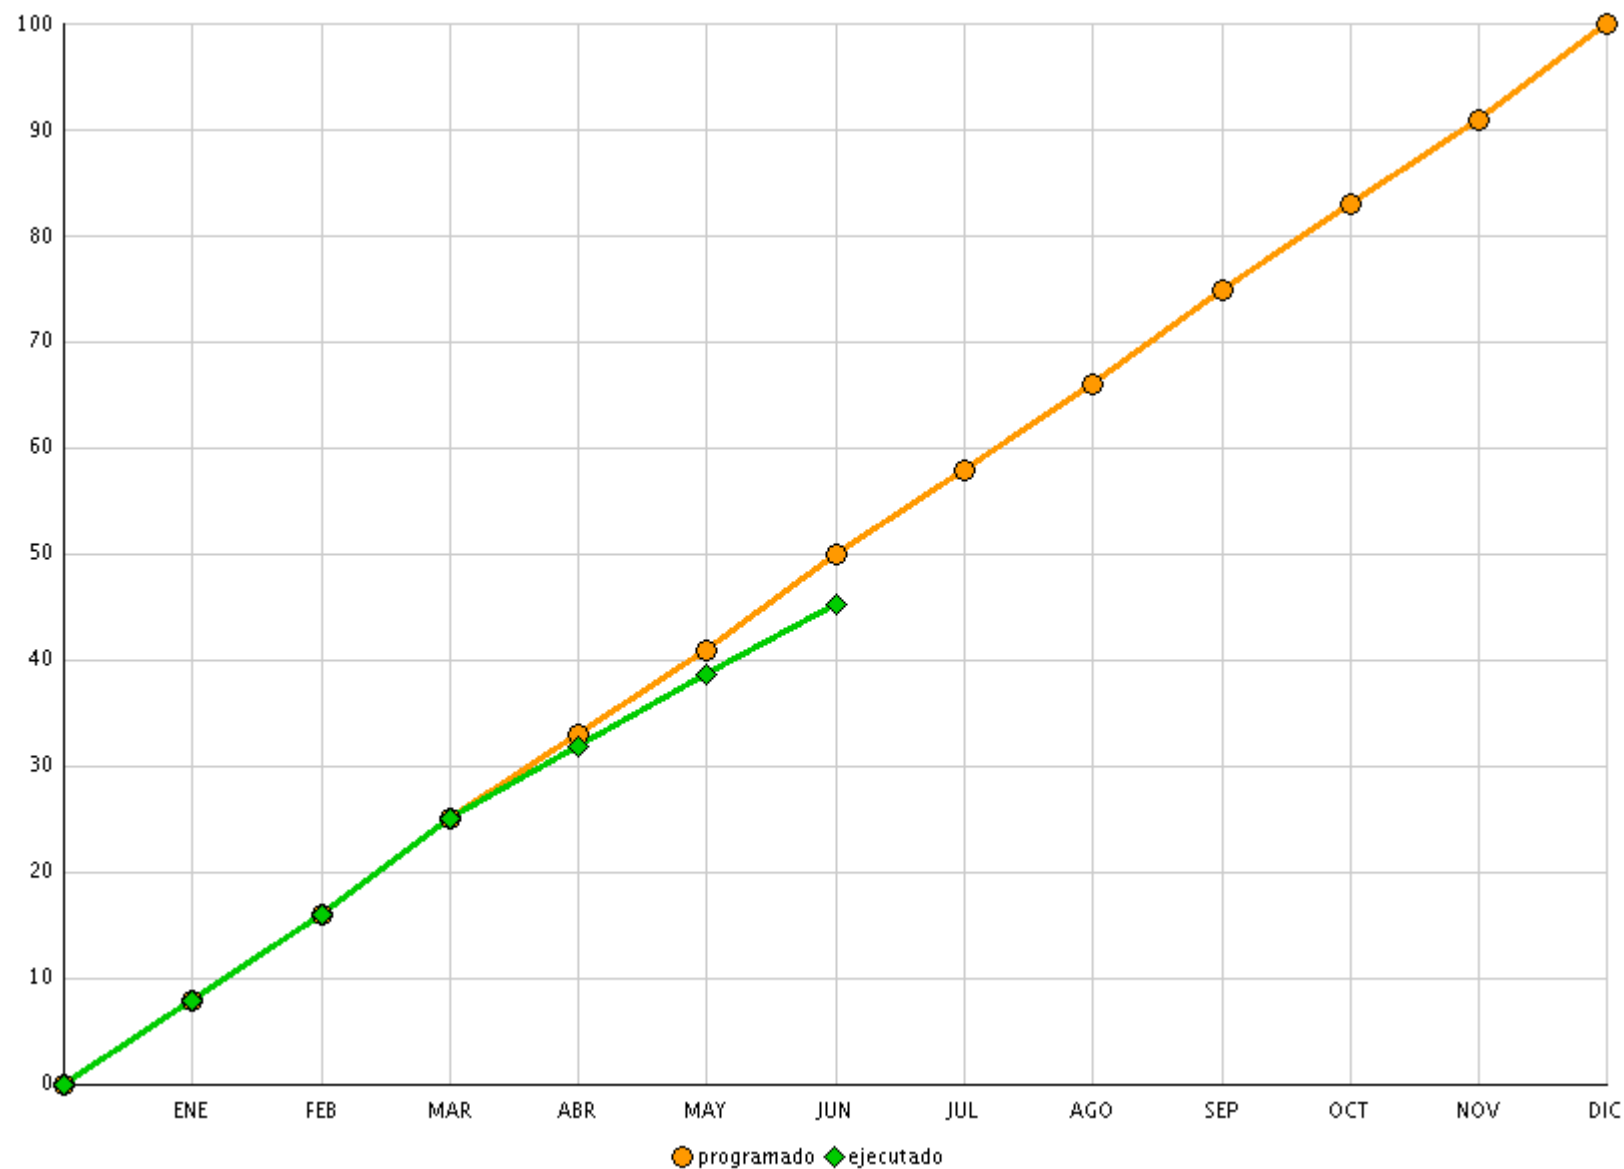


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	25.00	33.00	41.00	50.00	58.00	66.00	75.00	83.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	25.00	31.80	38.60	45.35						

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7773 Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá

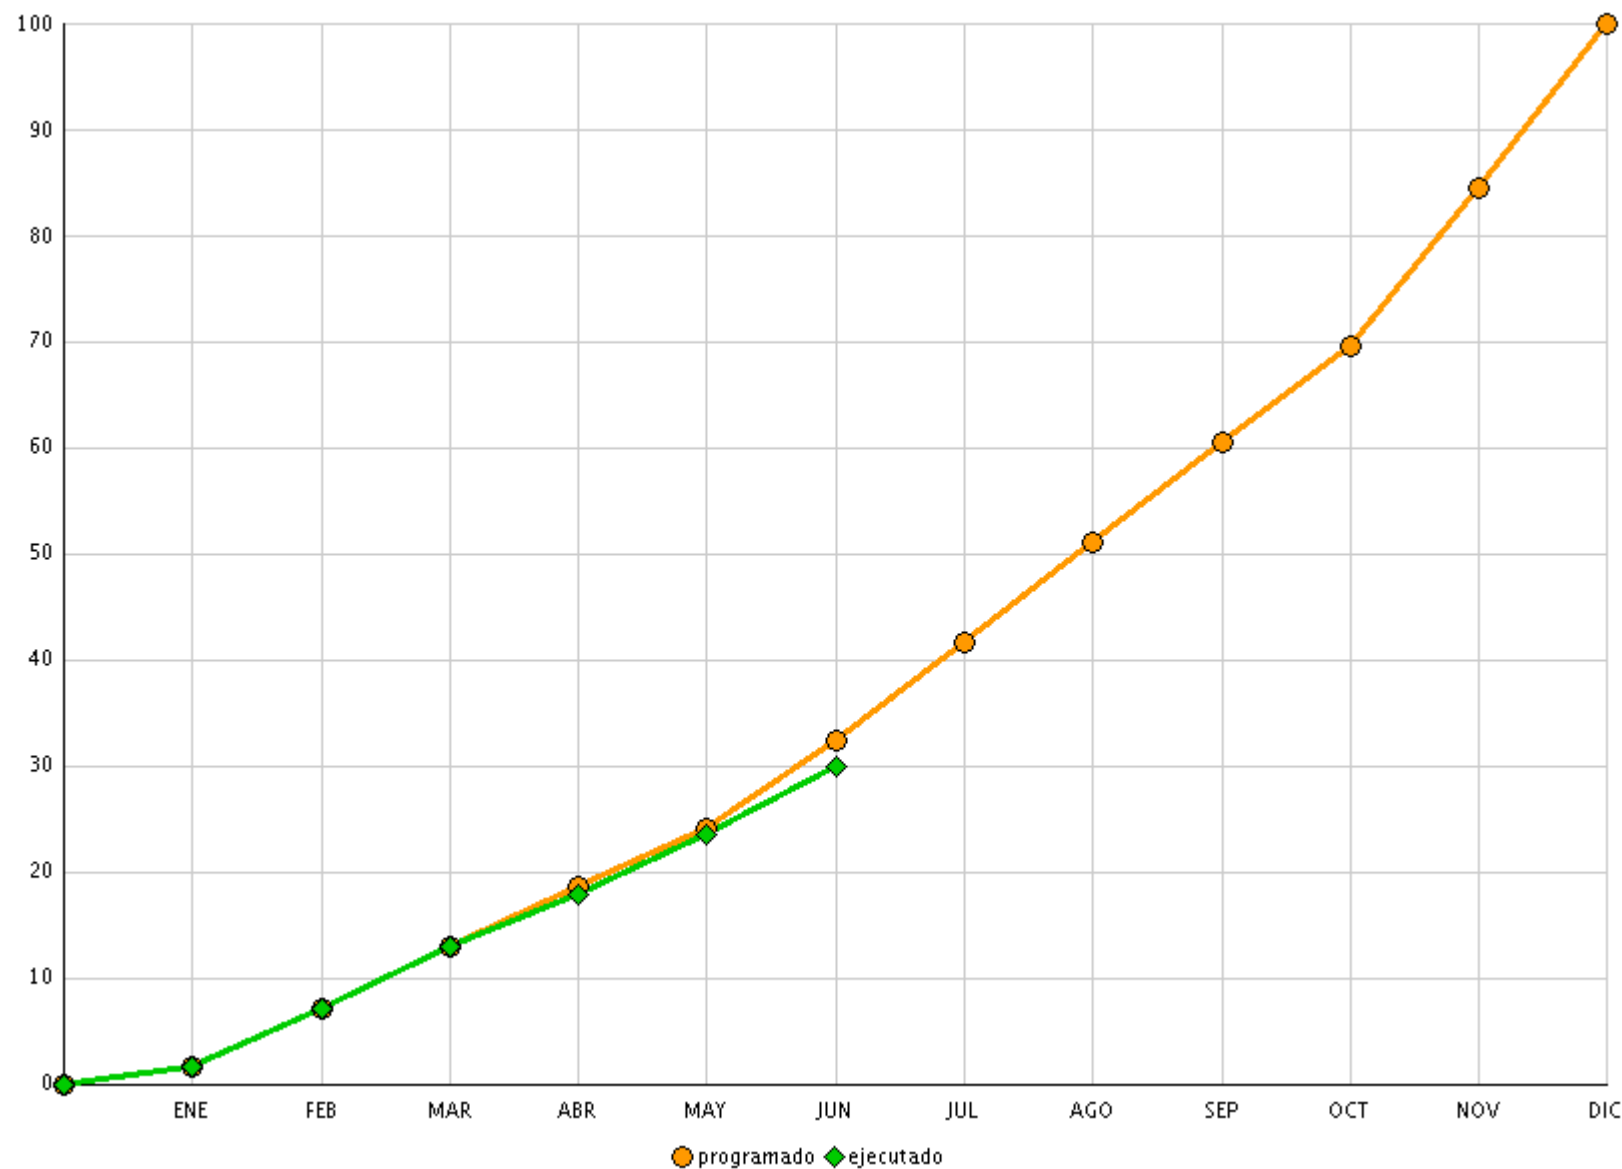

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.60	7.20	13.00	18.60	24.20	32.40	41.60	51.10	60.50	69.70	84.60	100.00
Ejecutado	1.60	7.20	13.00	18.00	23.60	30.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7548 29 Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADMINISTRAR LAS 19 PLAZAS DE MERCADO GARANTIZANDO EL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	10.00
2.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES ACTORES PARA CONSEGUIR LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE ESTOS Y LOS COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MERCADO	15.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	30.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		30.00		100.00	50.00	7.50
3.	PLANEAR Y REALIZAR LAS MEDICIONES EN LAS PLAZAS DE MERCADO CON RESPECTO A LA OFERTA PUBLICA DE ABASTECIMIENTO Y COMPARACIÓN DE PRECIOS.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	50.00	10.00
4.	IMPULSAR 2 DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS CON EL FIN DE FORTALECER LAS PLAZAS DE MERCADO EN ABASTECIMIENTO Y TURISMO.	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	30.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		30.00		100.00	50.00	5.00
5.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE 2 PLAZAS DE MERCADO EN DIFERENTES PLATAFORMAS DE CONECTIVIDAD	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	30.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		30.00		100.00	50.00	5.00
6.	REALIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MERCADO SEGÚN LA VOCACIÓN DEFINIDA PARA CADA PLAZA	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	40.00	6.00
7.	TRAMITE A LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO	10.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	50.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									48.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
200 Instituto para la Economía Social
7722 24 Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS EMPRENDEDORES ACORDE A SUS NECECIDADES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	6.00	
2.	REALIZAR ASESORIA TECNICA O EMPRESARIAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES A LOS EMPRENDEDORES	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	24.00	4.80
3.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LOS EMPRENDEDORES ACORDE A SUS NECESIDADES	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	24.00	4.80
4.	REALIZAR RUEDAS DE SERVICIOS FINACIEROS	5.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	17.00	17.00		0.00		0.00		17.00		0.00		18.00		100.00	49.00	2.45
5.	GESTIONAR CON DIFERENTES ENTIDADES ESPACIOS PARA LA FORMACION FINANCIERA DE LOS EMPRENDEDORES	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00	20.00	4.00	20.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		20.00		4.00		4.00		4.00		24.00		100.00	56.00	2.80
6.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ALISTAMIENTO DE LOS EMPRNDEDORES PARA EL ACCESO AL CREDITO	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00	21.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00		20.00		4.00		4.00		4.00		24.00		100.00	38.00	3.80
7.	OFRECER LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE LA ENTIDAD A LOS EMPRENDEDORES	10.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00		8.00		8.00		9.00		9.00		10.00		100.00	41.00	4.10
8.	FORTALECER A LOS EMPRENDIMIENTOS EN CAPACIDADES Y CANALES DE COMERCIALIZACION SEGÚN SUS NECESIDADES	20.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00		21.00		4.00		4.00		4.00		22.00		100.00	12.00	2.40
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										31.15

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
200 Instituto para la Economía Social
7764 19 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022		
Año	Banco	Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. OPTIMIZAR EL 100% DE EFICIENCIA DE LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTENTES E INCORPORACIÓN DE NUEVAS	0.00																											
1.1 ADMINISTRAR, MANTENER Y MEJORAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IPES A TRAVÉS DEL DISEÑO, ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN, AFINAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
1.2 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		15.00		15.00		0.00		0.00		25.00		100.00	45.00	2.25
1.3 FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PARA EL APOYO A LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		30.00		100.00	50.00	2.50
2. OPTIMIZAR EL 100% DE LA IDENTIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE LA ENTIDAD	0.00																											
2.1 COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA ESTABLECER MODIFICACIONES EN LOS TRÁMITES Y OPAS O CREACIÓN DE NUEVOS, SI DA LUGAR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
2.2 SISTEMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES Y OPAS PRIORITARIOS EN LA PÁGINA WEB (IPES Y GUÍA DE TRÁMITES) Y SUIT.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.65
2.3 MONITOREO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS TRÁMITES Y OPAS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
2.4 CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.5 REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA EL PAAC	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.50
3. GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RENDICIÓN DE CUENTAS Y SEGUNDOS ESPACIOS) Y REALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR Y GRUPOS DE INTERÉS	0.00																											
3.1 REALIZACIÓN DE UNA (1) RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.2 DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE TRES (3) SEGUNDOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		100.00	33.00	1.65
3.3 TRES (3) SESIONES DE LOS COMITÉS DISTRITALES DE VENDEDORES INFORMALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		100.00	33.00	1.65
3.4 REALIMENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES, SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS ESTABLECIDOS POR EL IPES EN LOS COMITÉS DIRECTIVOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		25.00		100.00	25.00	1.25
3.5 PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB Y SEGUIMIENTO A LAS CONCLUSIONES DE LAS REALIMENTACIONES CONSIDERADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		25.00		100.00	25.00	1.25
4. IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) EN LA ENTIDAD.	0.00																											
4.1 ACTUALIZACIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO	5.00																									100.00	50.00	2.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7764 19 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
ESTRATÉGICO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN LA ENTIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00					
4.2 MAPA DE CONOCIMIENTO CONSTRUIDO Y SOCIALIZADO DESDE LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00	
4.3 CAMPAÑAS Y/O CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACIÓN DE I+D+I EN LA ENTIDAD Y DIVULGACIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.50	
4.4 PROYECTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.50	
4.5 DESARROLLAR DOCUMENTOS, ANÁLISIS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00	
5. FORTALECER EL 100% DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA EN LA ENTIDAD	0.00																												
5.1 SOCIALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS (MOP) Y CARACTERIZACIONES DE PROCEDIMIENTOS BASADOS EN LOS PROCESOS DEFINIDOS EN EL MOP.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00	
5.2 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.00	
5.3 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN (DECRETO 612 DE 2018 Y PAI)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00	
5.4 PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE MIPG (GESTIÓN MIPG, FURAG, RIESGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO)	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	11.00	7.00	7.00	9.00	9.00	7.00		11.00		7.00		7.00		7.00		13.00		100.00	48.00	1.44	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		47.14	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7772 29 Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 44 Autoconciencia, respeto y cuidado en el espacio publico

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. REALIZAR A VENDEDORES INFORMALES QUE EJERCEN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ESPACIO PUBLICO PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO	0.00																												
1.1 REALIZAR INFORMES EJECUTIVOS DE LAS JORNADAS DE IDENTIFICACION EN EL ESPACIO PUBLICO.	7.50	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	3.75	
1.2 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO.	7.50	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	3.75	
2. REALIZAR PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN A PERSONAS QUE EJERCEN BICITAXIMO EN EL ESPACIO PÚBLICO	0.00																												
2.1 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO.	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	5.00	
3. EJECUTAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS 10 ZONAS	0.00																												
3.1 EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS DE AGLOMERACIÓN.	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	0.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	25.00	3.75	
3.2 REALIZAR JORNADAS DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DE AGLOMERACIÓN.	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	7.50	
4. OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTENTES E INCORPORACIÓN DE NUEVAS, FORTALECIENDO EL PROCESO DE REGISTRO, CAPTURA DE INFORMACIÓN	0.00																												
4.1 FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL EN EL MANEJO DE LAS TECNOLOGIAS.	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	10.00	
4.2 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA PARA LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	7.50	
4.3 REALIZAR FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE VENDEDORES	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	0.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	41.00	4.10	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								45.35	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7773 21 Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022


AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES TRANSITORIAS	0.00																											
1.1 MANTENER Y FORTALECER LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	8.00		8.00		8.00		8.00		30.00		30.00		100.00	4.00	0.60
1.2 ASIGNAR ALTERNATIVAS COMERCIALES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		18.00		16.00		16.00		16.00		18.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR AL SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES QUIOSCOS.	0.00																											
2.1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES DE LA SGRSI.	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	10.00
3. REALIZAR FERIAS CON ACCIONES DE LOGÍSTICA, OPERACIÓN Y TRANSPORTE.	0.00																											
3.1 REALIZAR FERIAS TEMPORALES.	15.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		14.00		14.00		100.00	40.00	6.00
3.2 ASIGNAR ALTERNATIVA COMERCIAL DE FERIAS TEMPORALES A VENDEDORES INFORMALES.	20.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		14.00		14.00		100.00	40.00	8.00
4. REALIZAR PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CARACTERIZACIÓN A VENDEDORES INFORMALES	0.00																											
4.1 REALIZAR JORNADAS IDENTIFICACION A VENDEDORES	15.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	36.00	5.40
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		30.00

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7750 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá

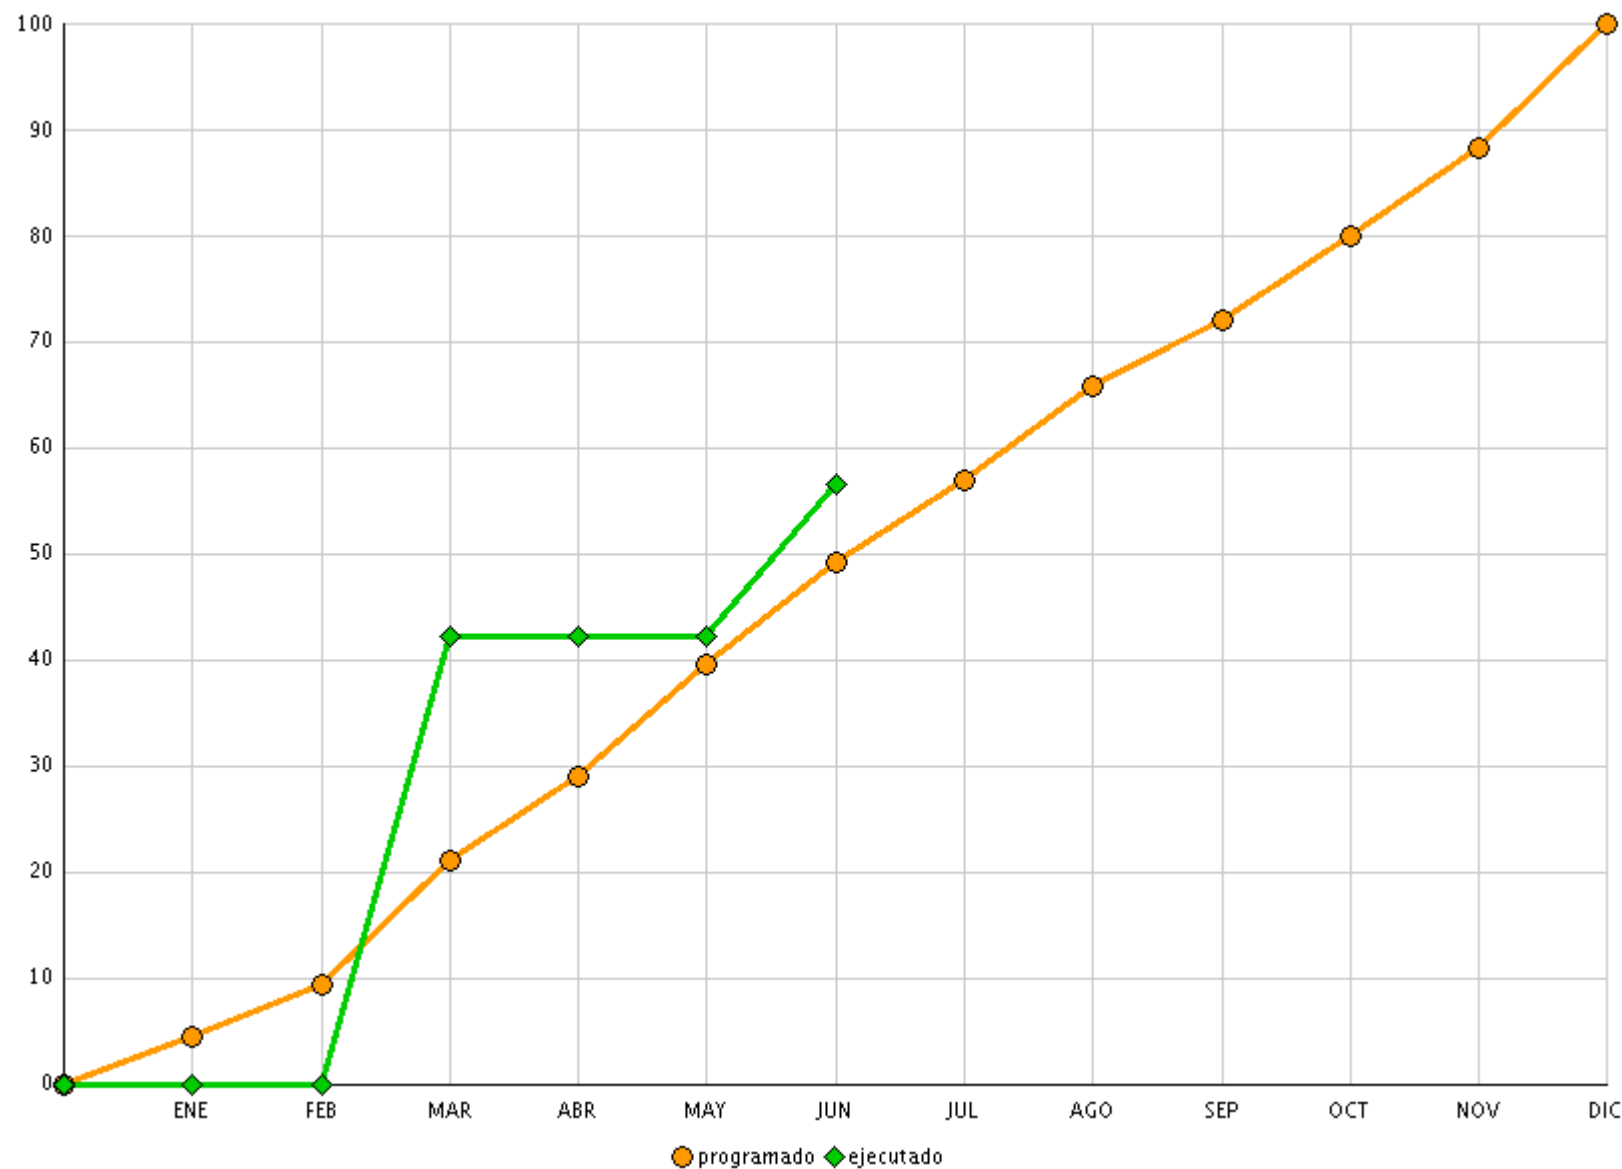


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.59	9.47	21.20	29.03	39.66	49.21	56.92	65.78	72.05	80.01	88.29	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	42.17	42.17	42.17	56.51						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7785 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

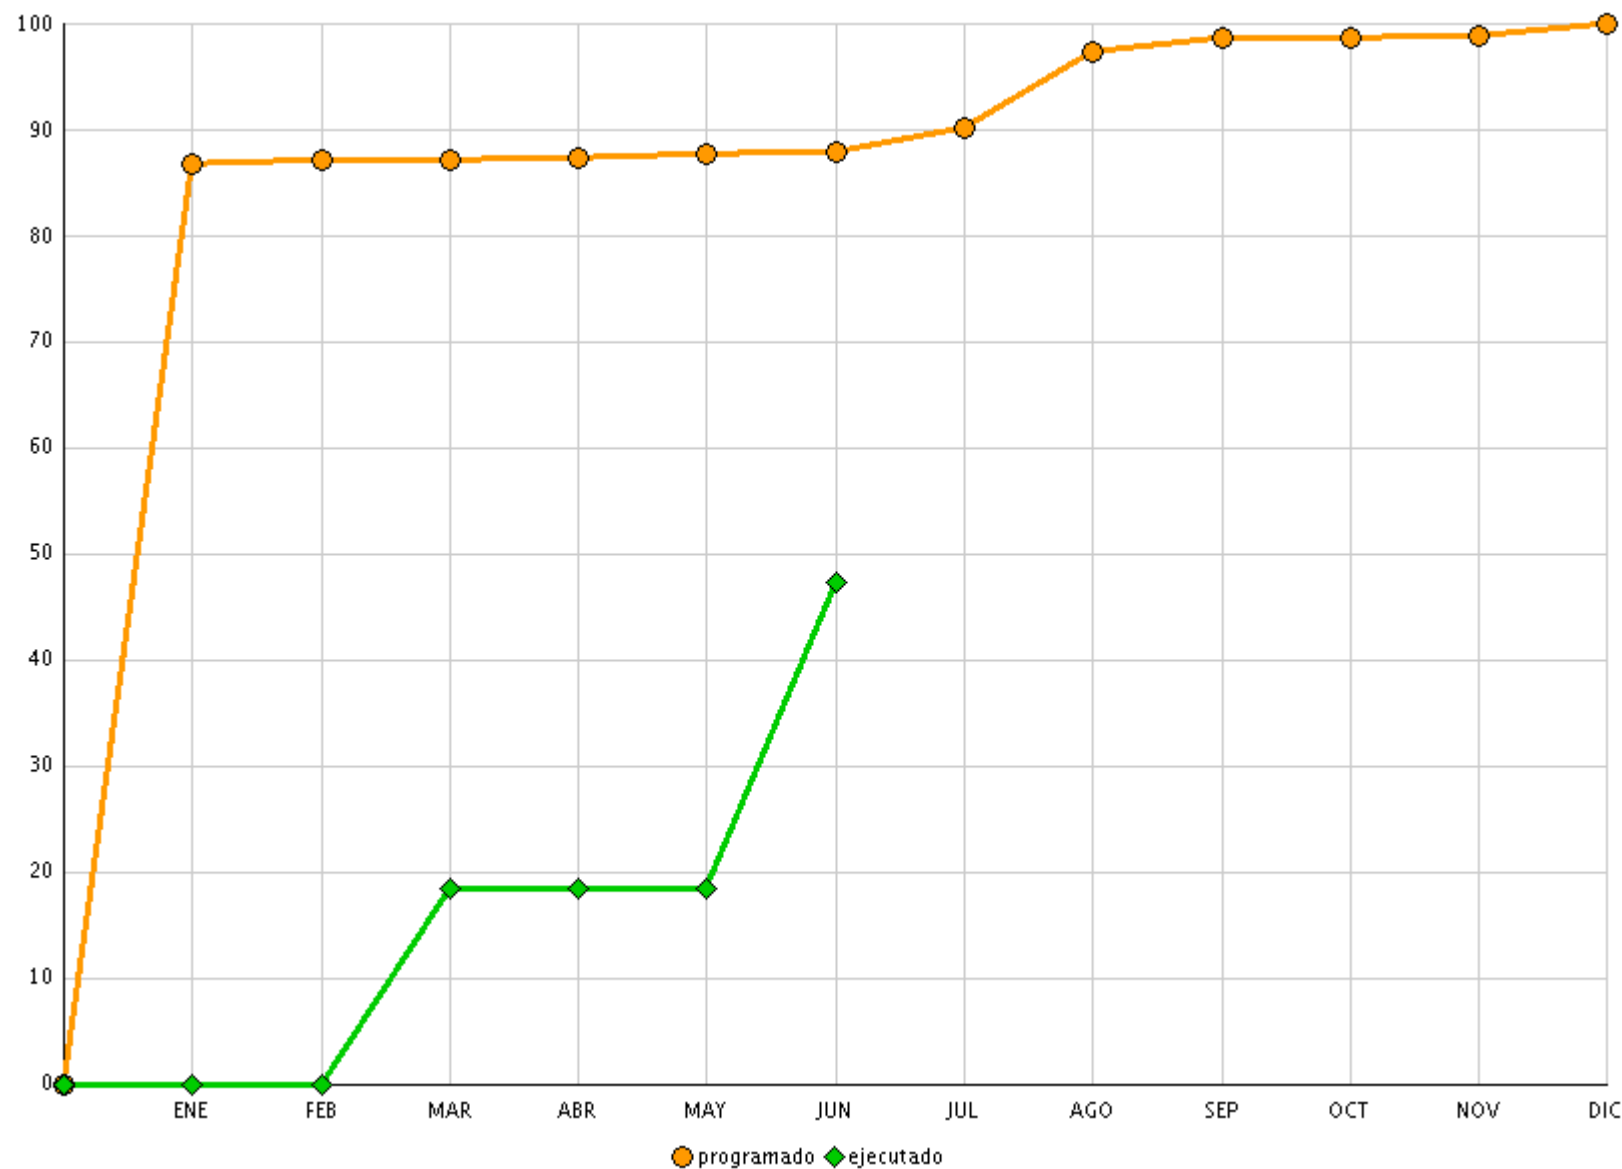


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	86.87	87.19	87.19	87.27	87.69	87.97	90.10	97.40	98.61	98.61	98.79	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.44	18.44	18.44	47.29						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7788 Transformación digital en salud Bogotá

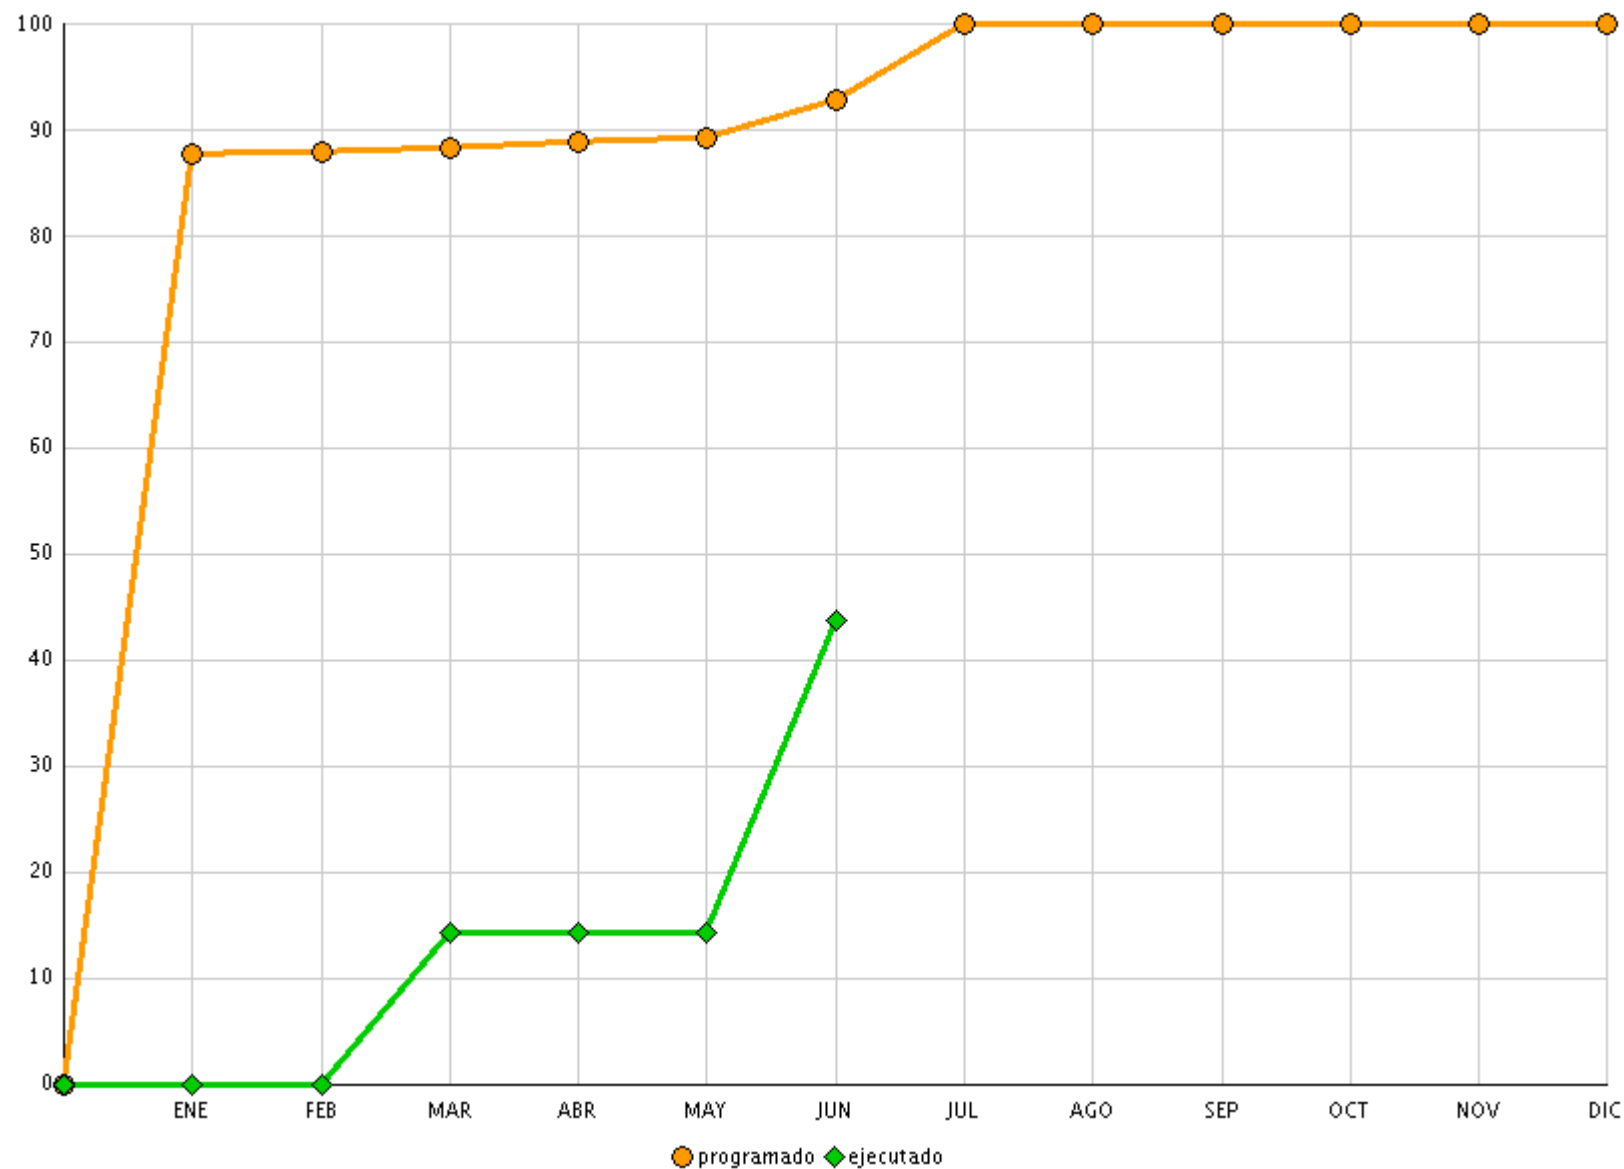


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	87.79	87.95	88.21	88.81	89.19	92.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	14.32	14.32	14.32	43.75						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7790 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

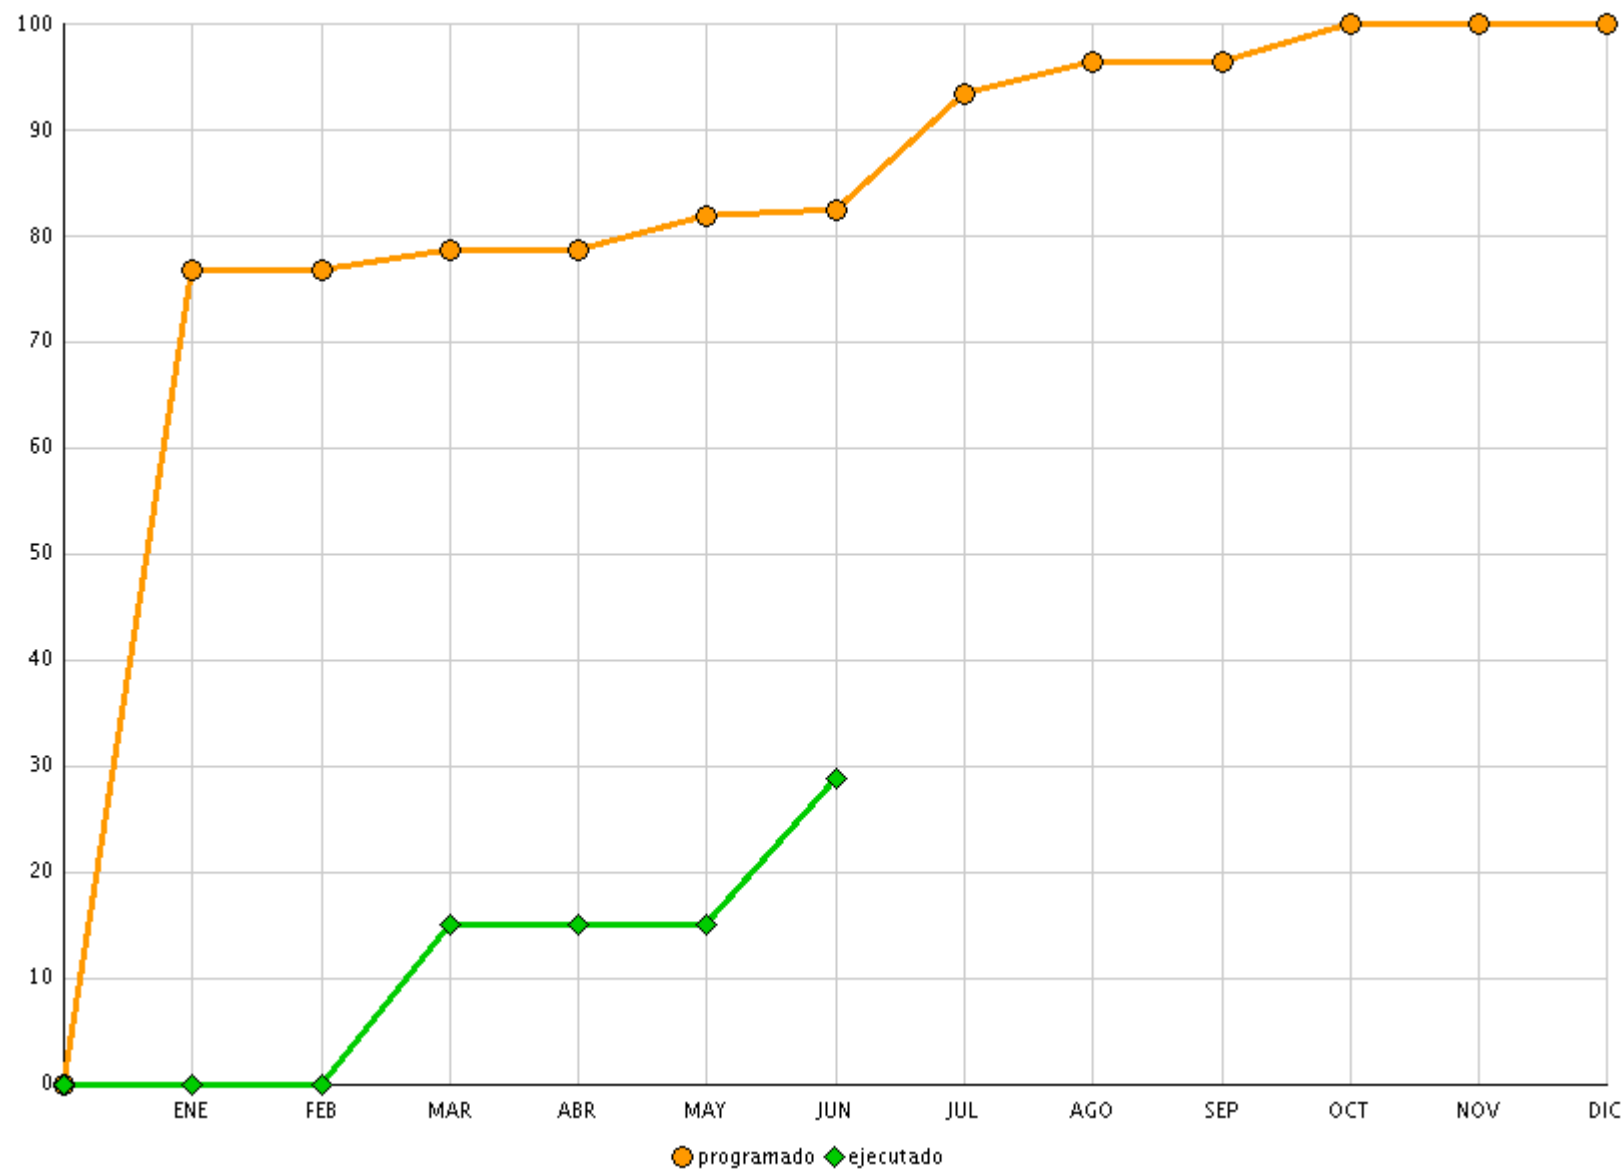


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	76.78	76.78	78.72	78.77	81.92	82.50	93.45	96.43	96.47	99.97	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	15.02	15.02	15.02	28.79						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7791 Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá

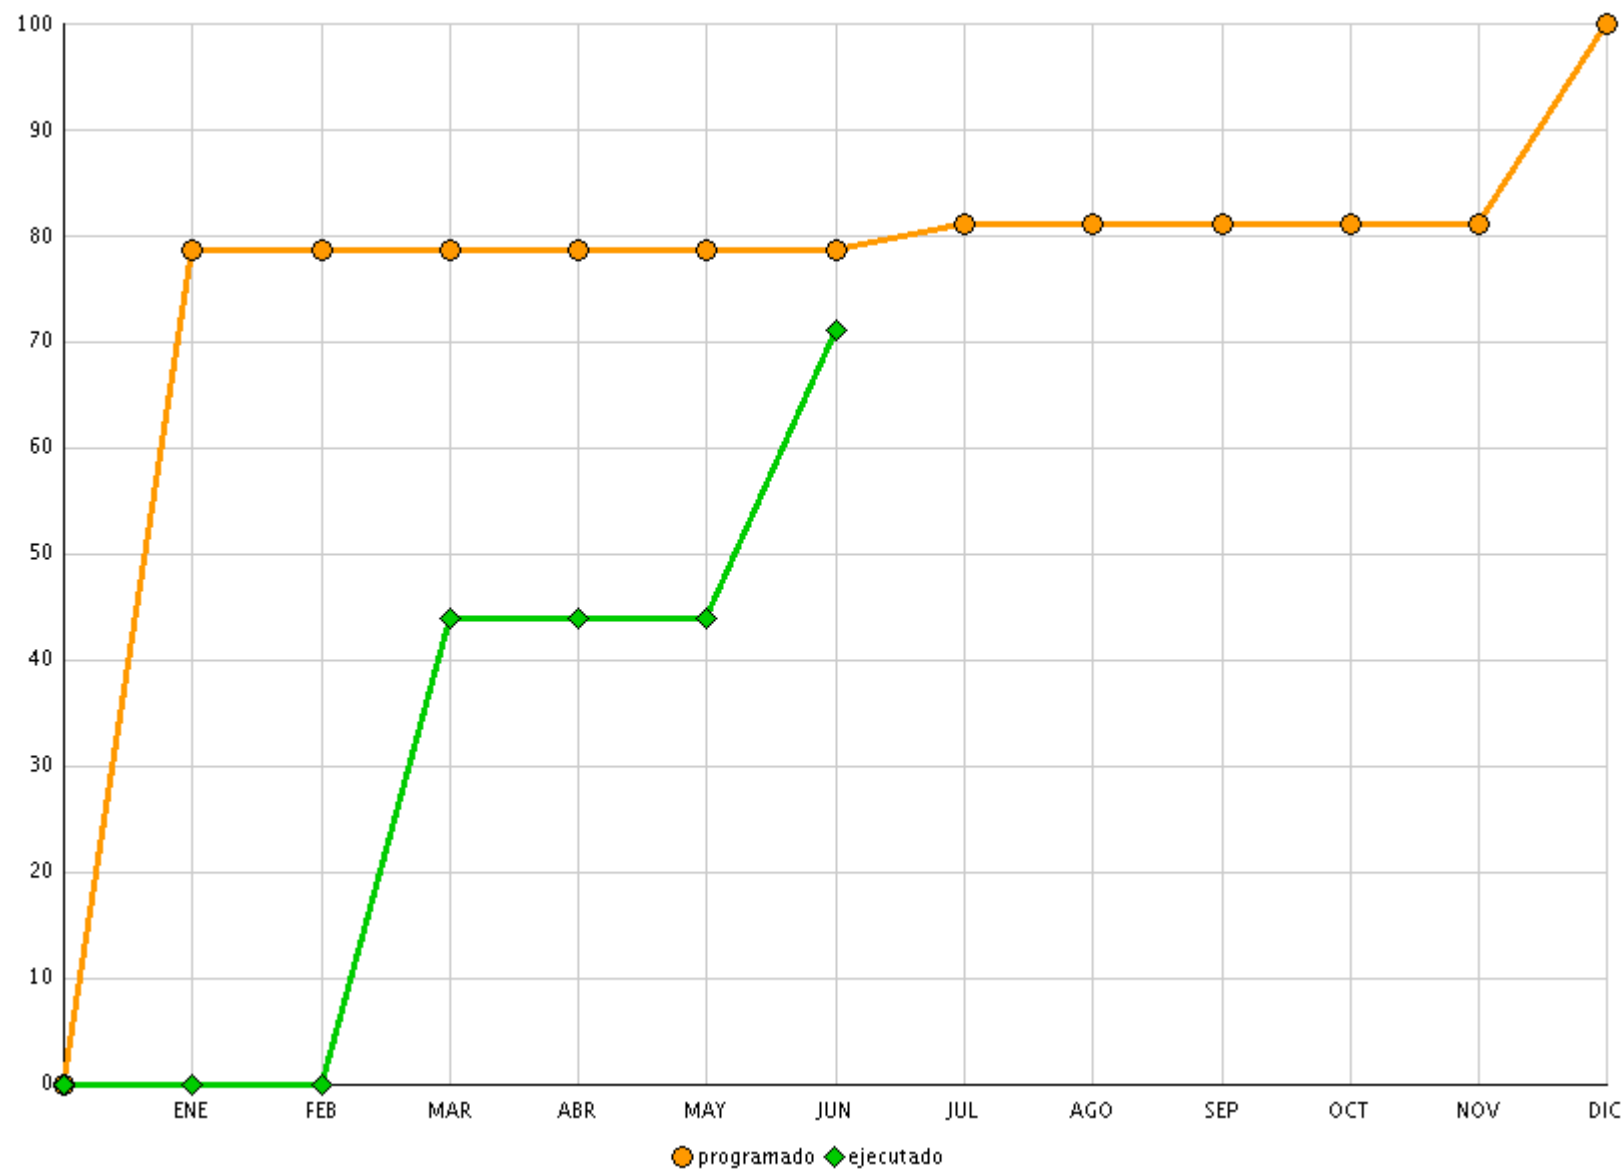


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	78.72	78.72	78.72	78.72	78.72	78.72	81.11	81.11	81.11	81.11	81.11	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	44.05	44.05	44.05	71.09						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7822 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

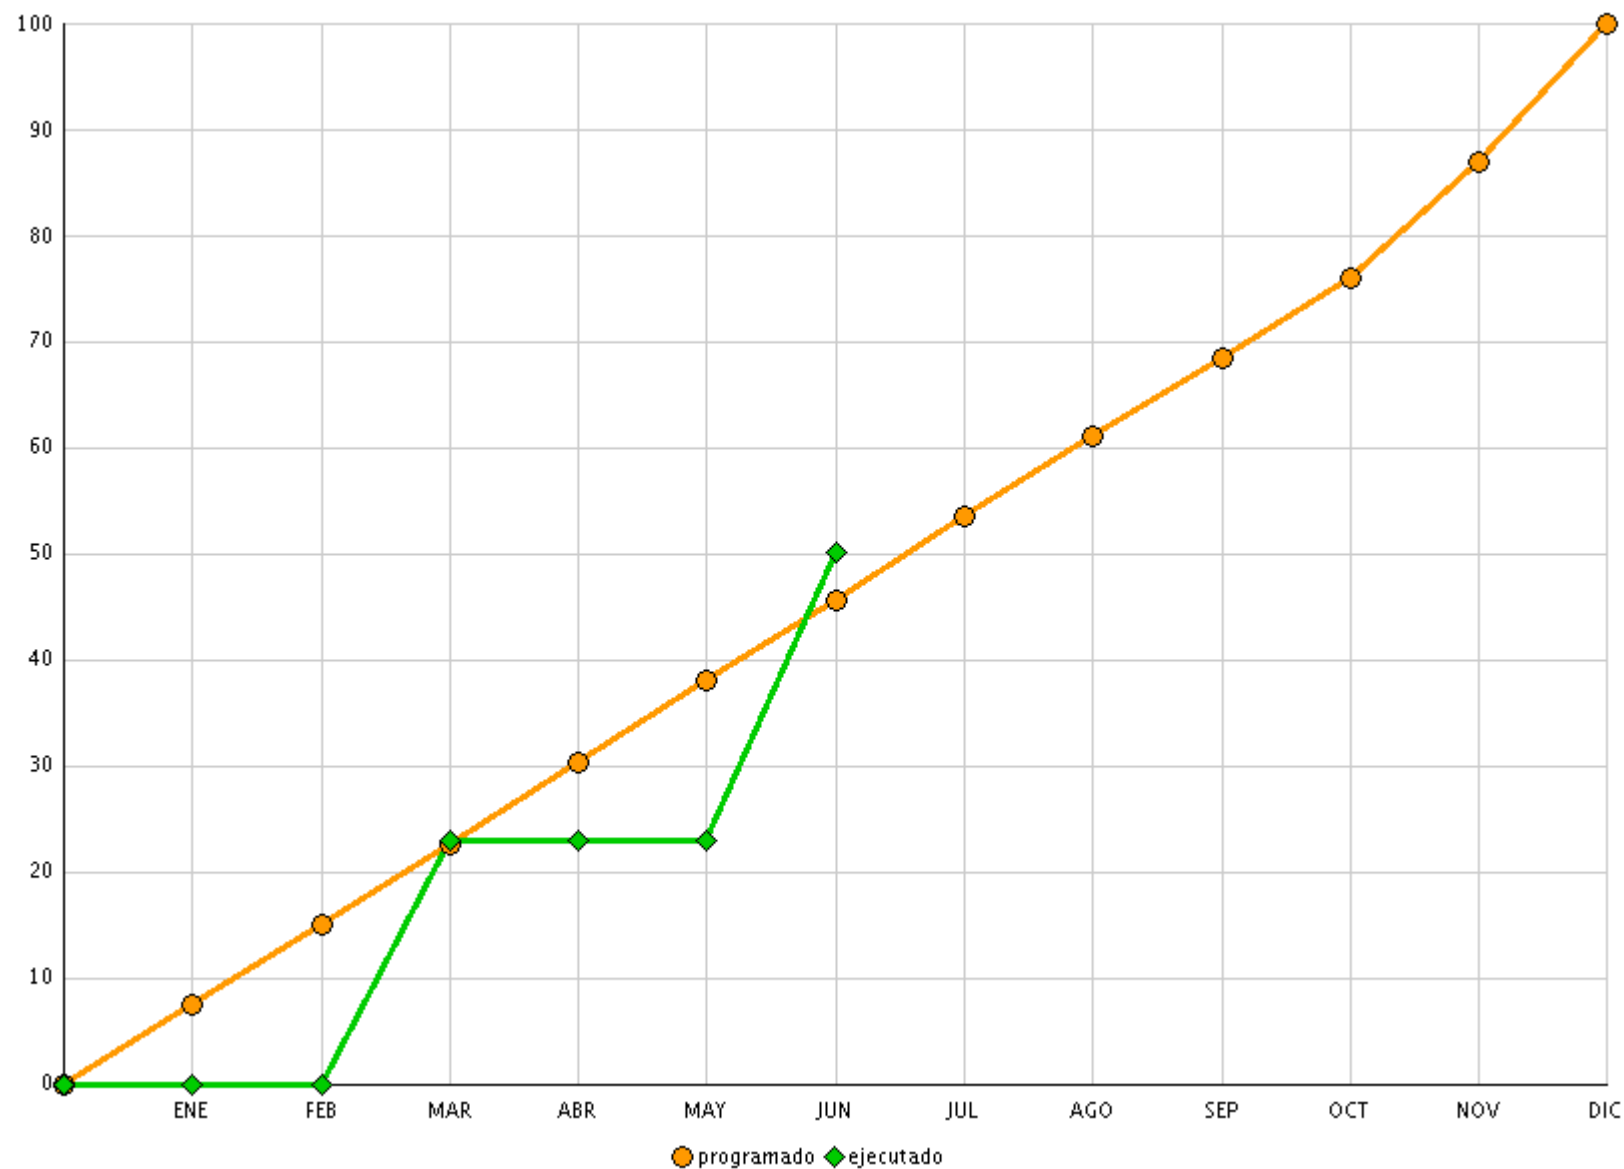


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.54	15.02	22.68	30.46	38.10	45.70	53.63	61.13	68.46	76.07	87.07	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	23.08	23.08	23.08	50.26						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7824 Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá

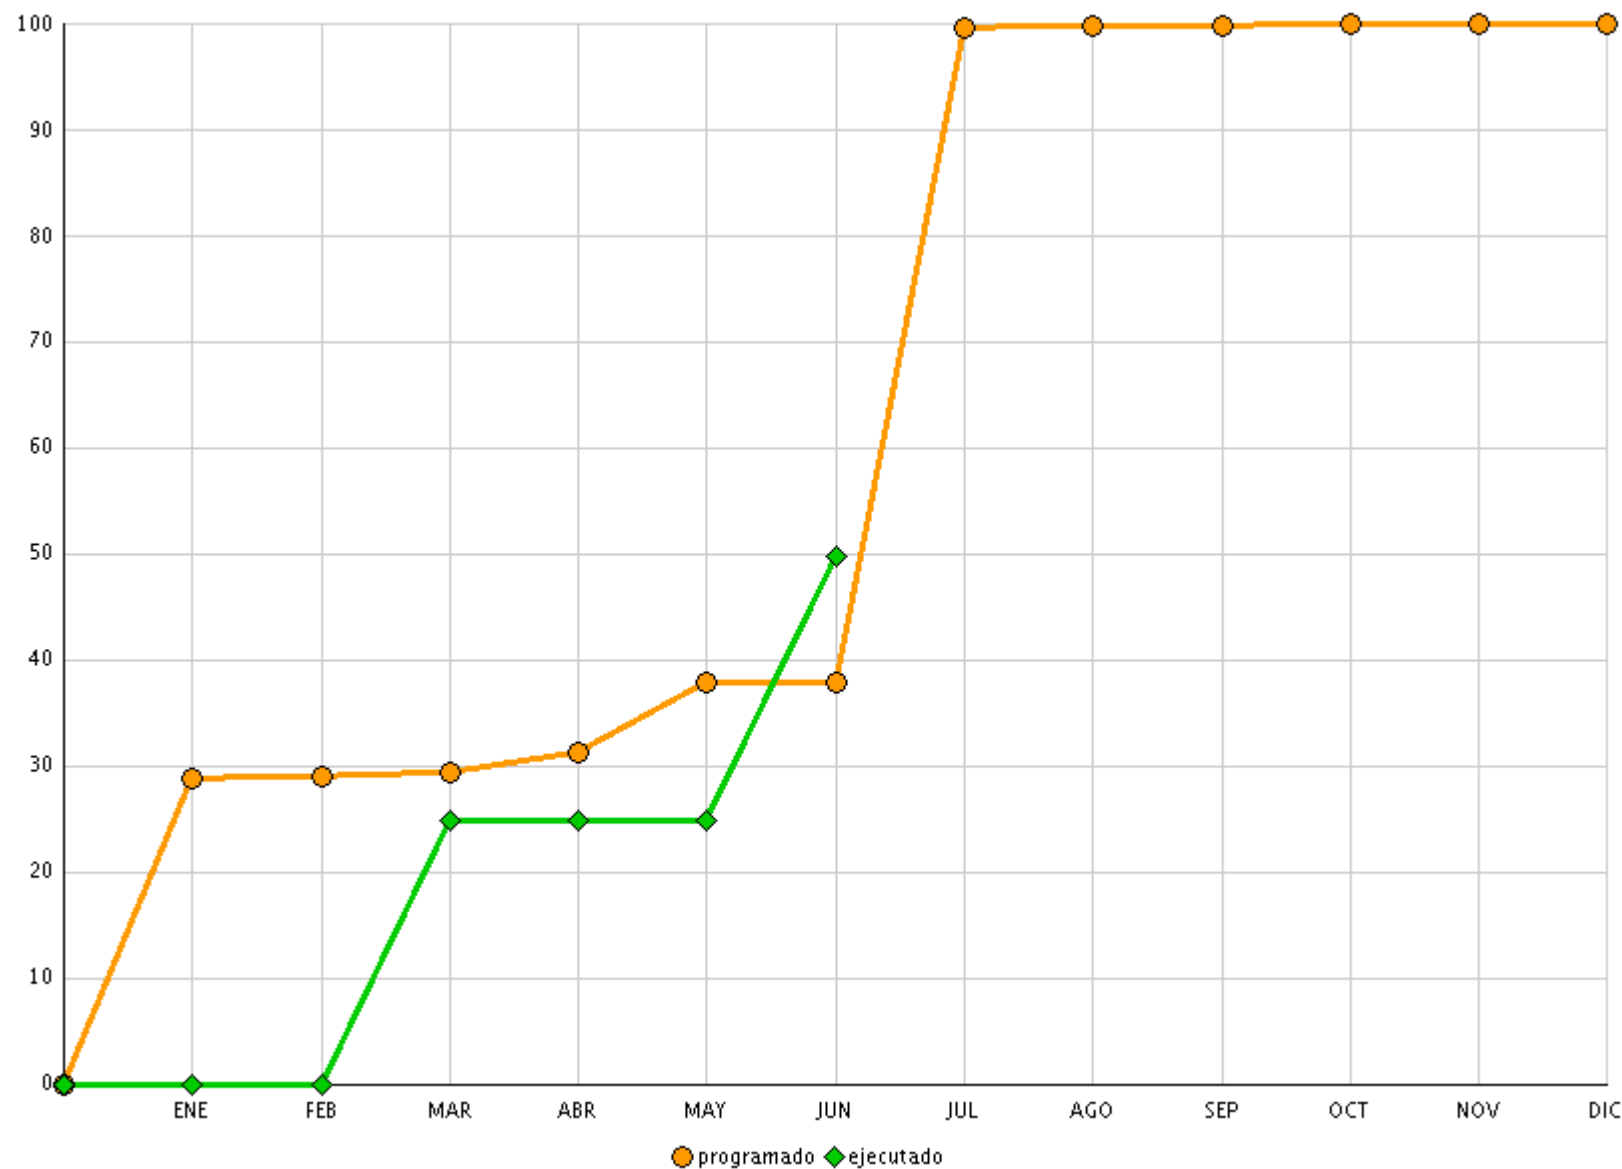


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	28.85	29.04	29.34	31.32	37.88	37.95	99.53	99.83	99.83	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	24.86	24.86	24.86	49.73						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7826 Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá

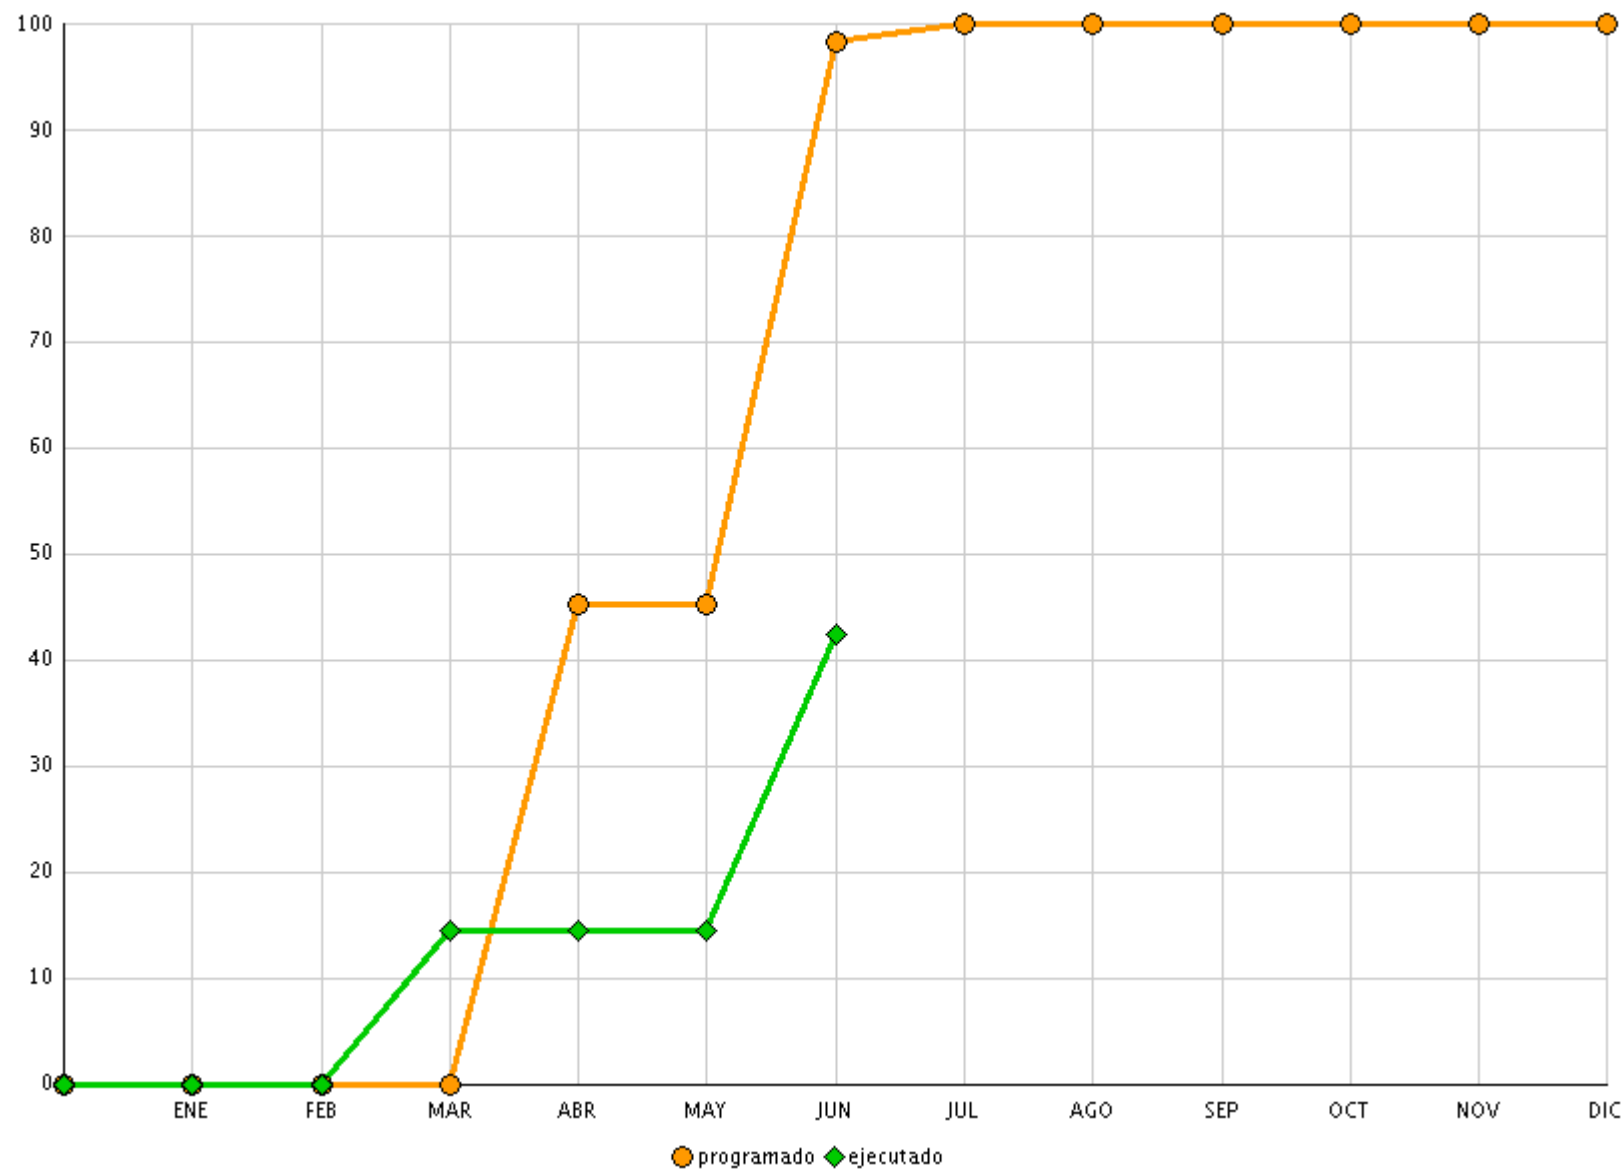


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	45.20	45.20	98.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	14.50	14.50	14.50	42.43						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7827 Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

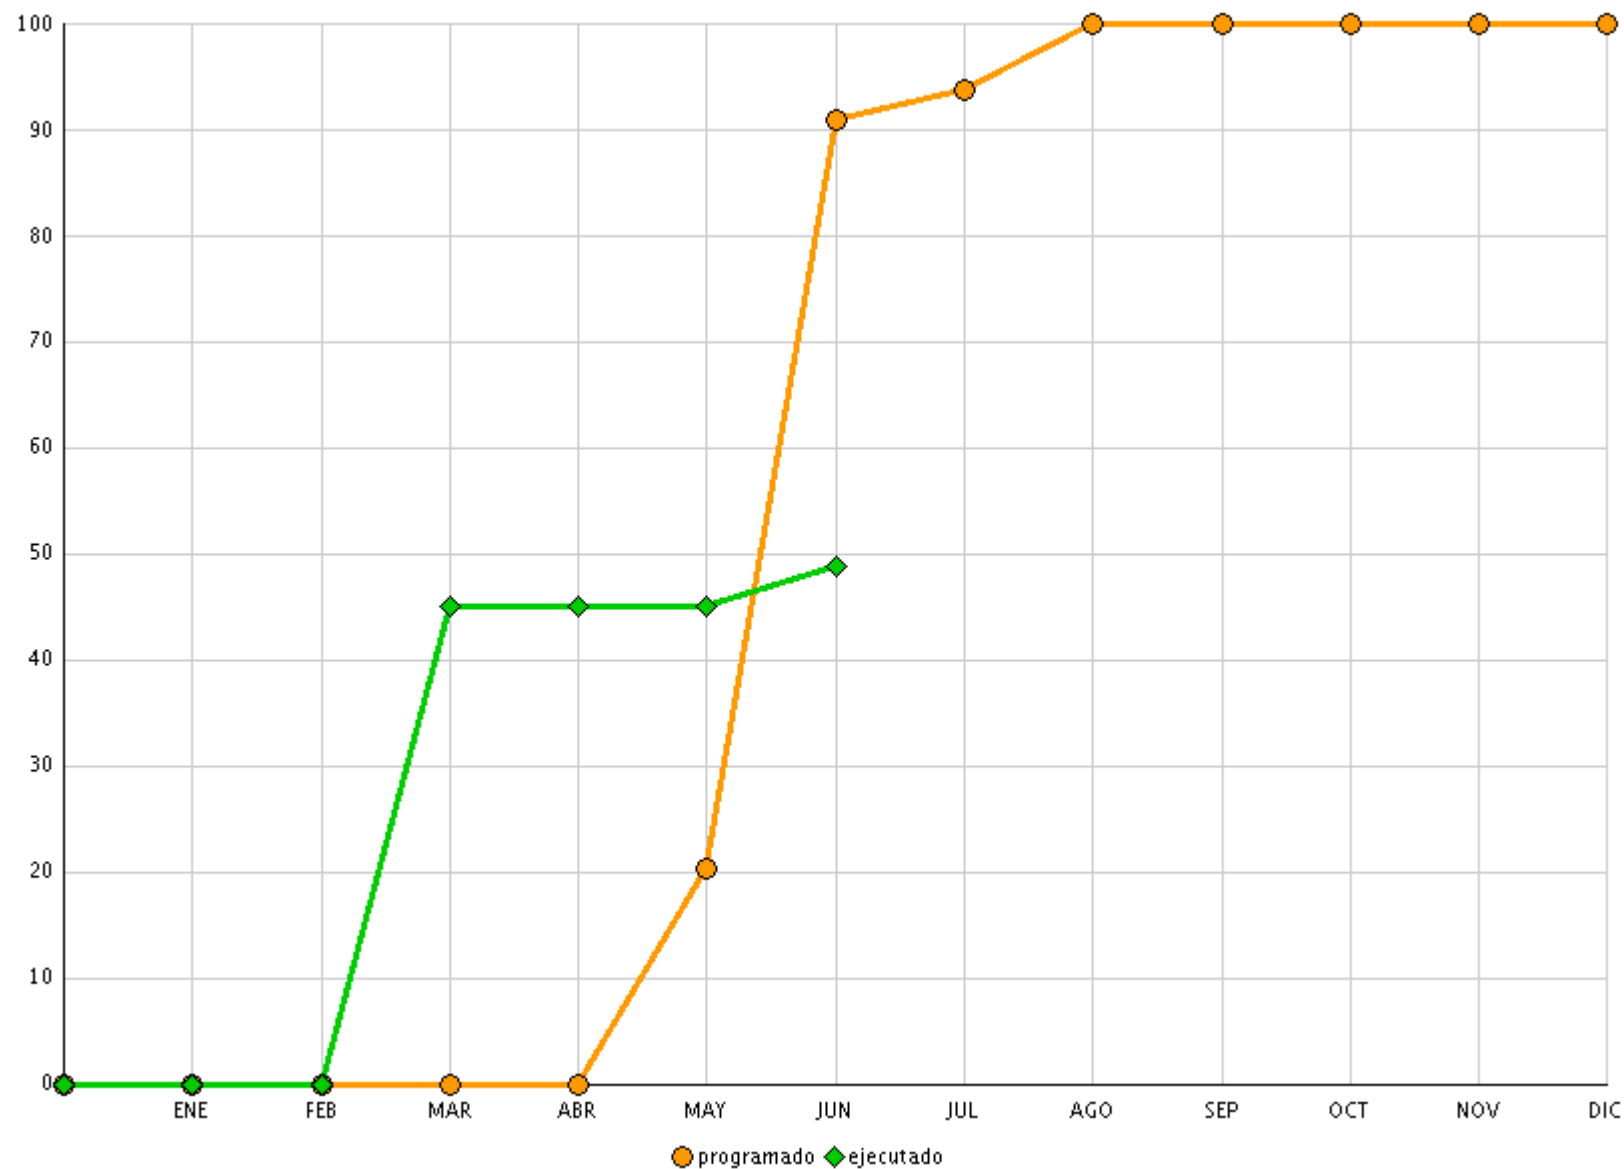


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.45	91.04	93.74	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	45.02	45.02	45.02	48.96						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7828 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

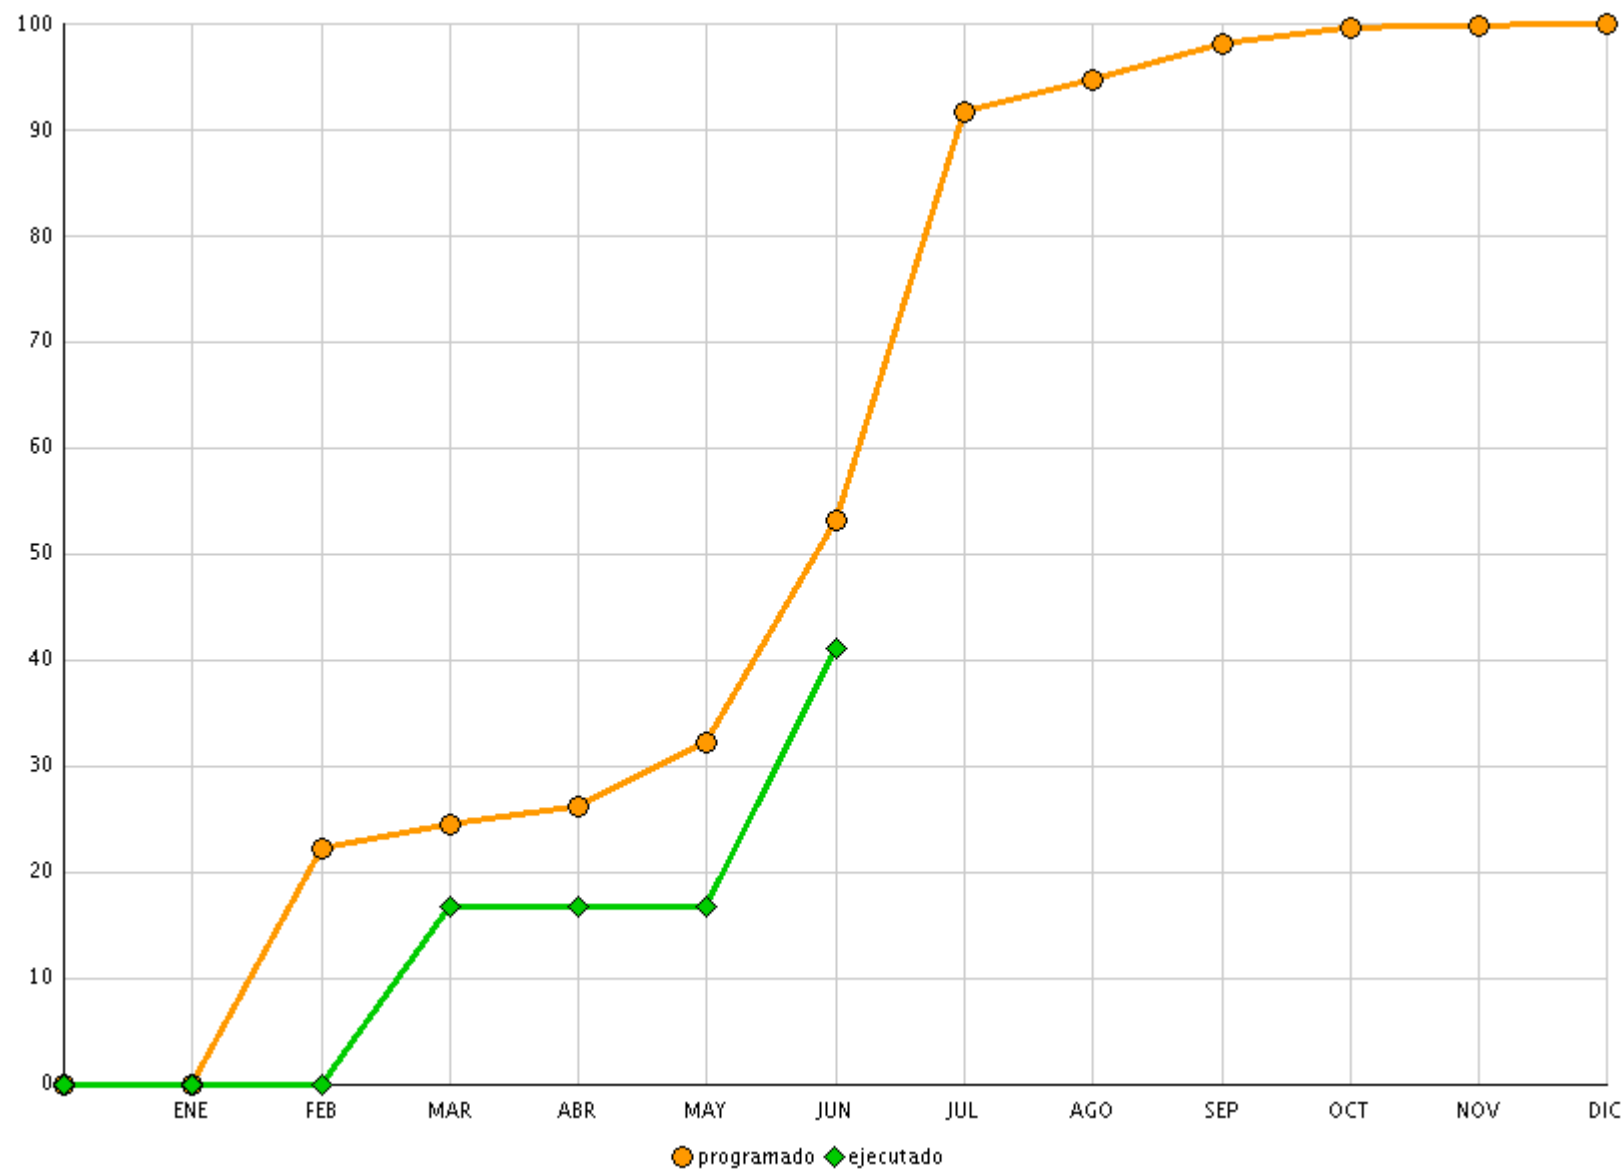


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.01	22.22	24.50	26.29	32.31	53.20	91.62	94.64	98.12	99.58	99.89	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	16.86	16.86	16.86	41.18						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7829 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá

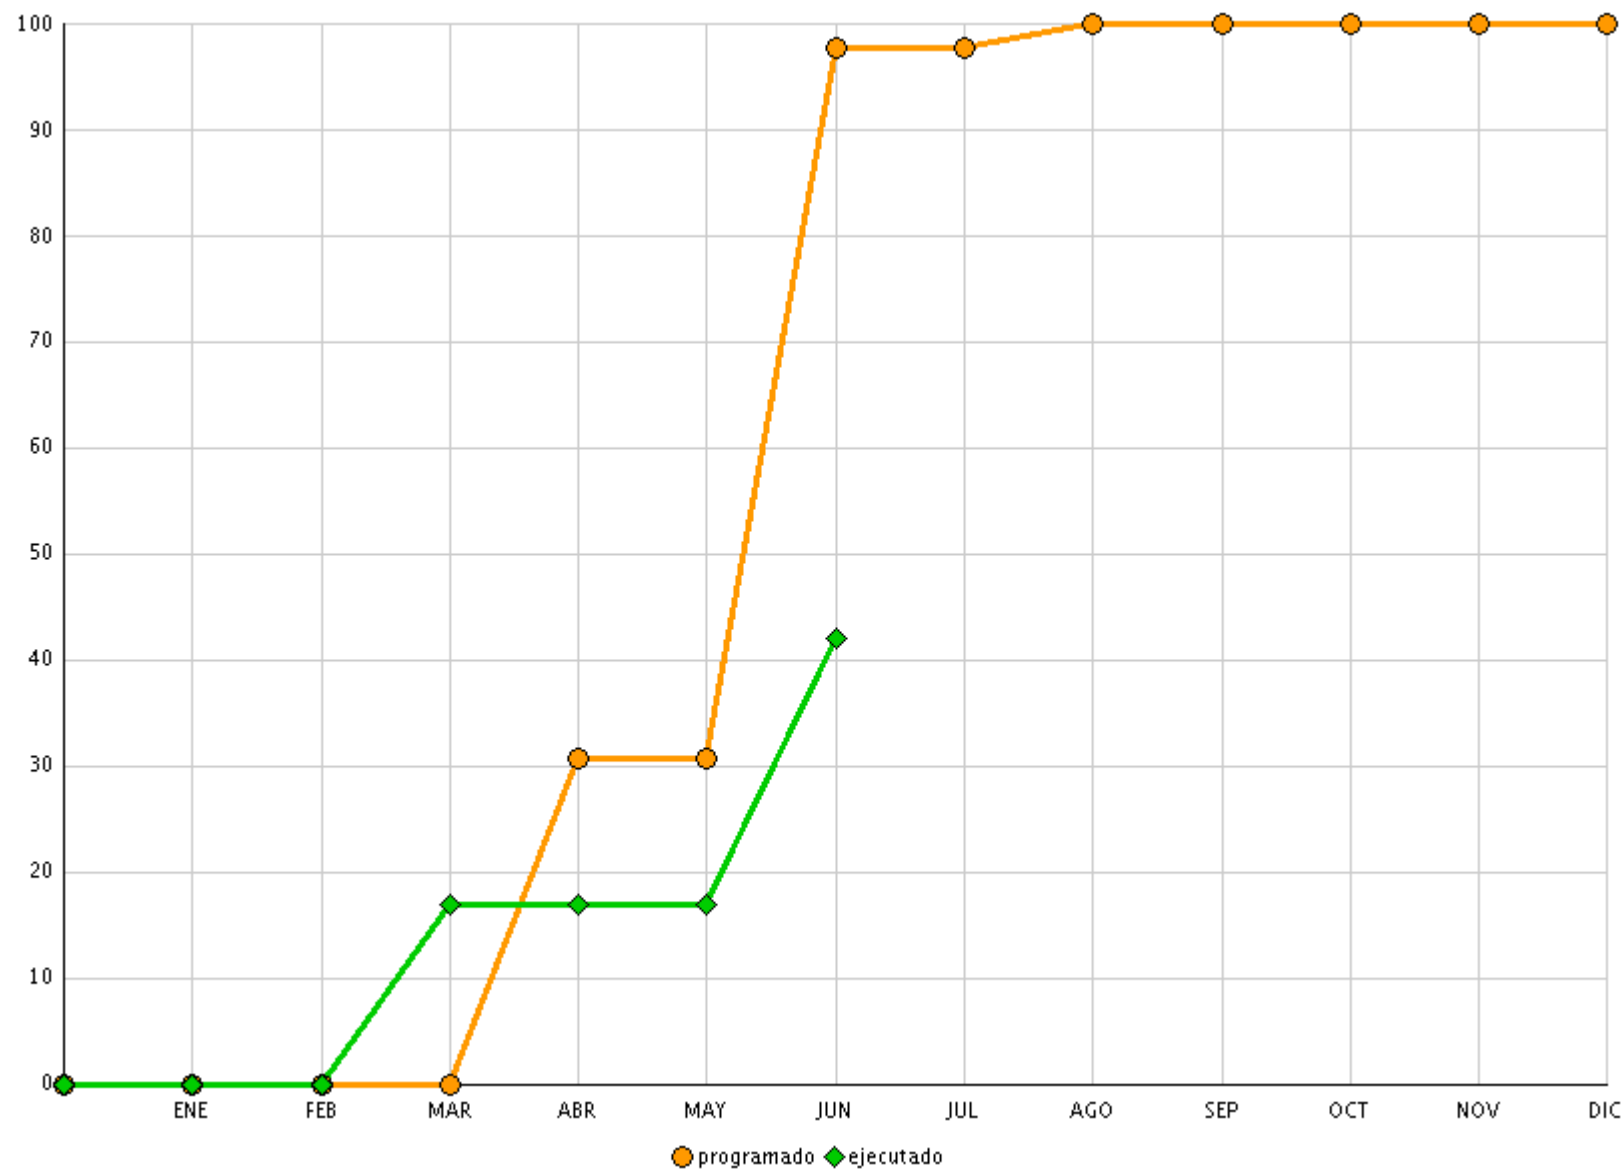


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	30.71	30.71	97.78	97.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	42.00						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7830 Asistencia: Infancia imparable Bogotá

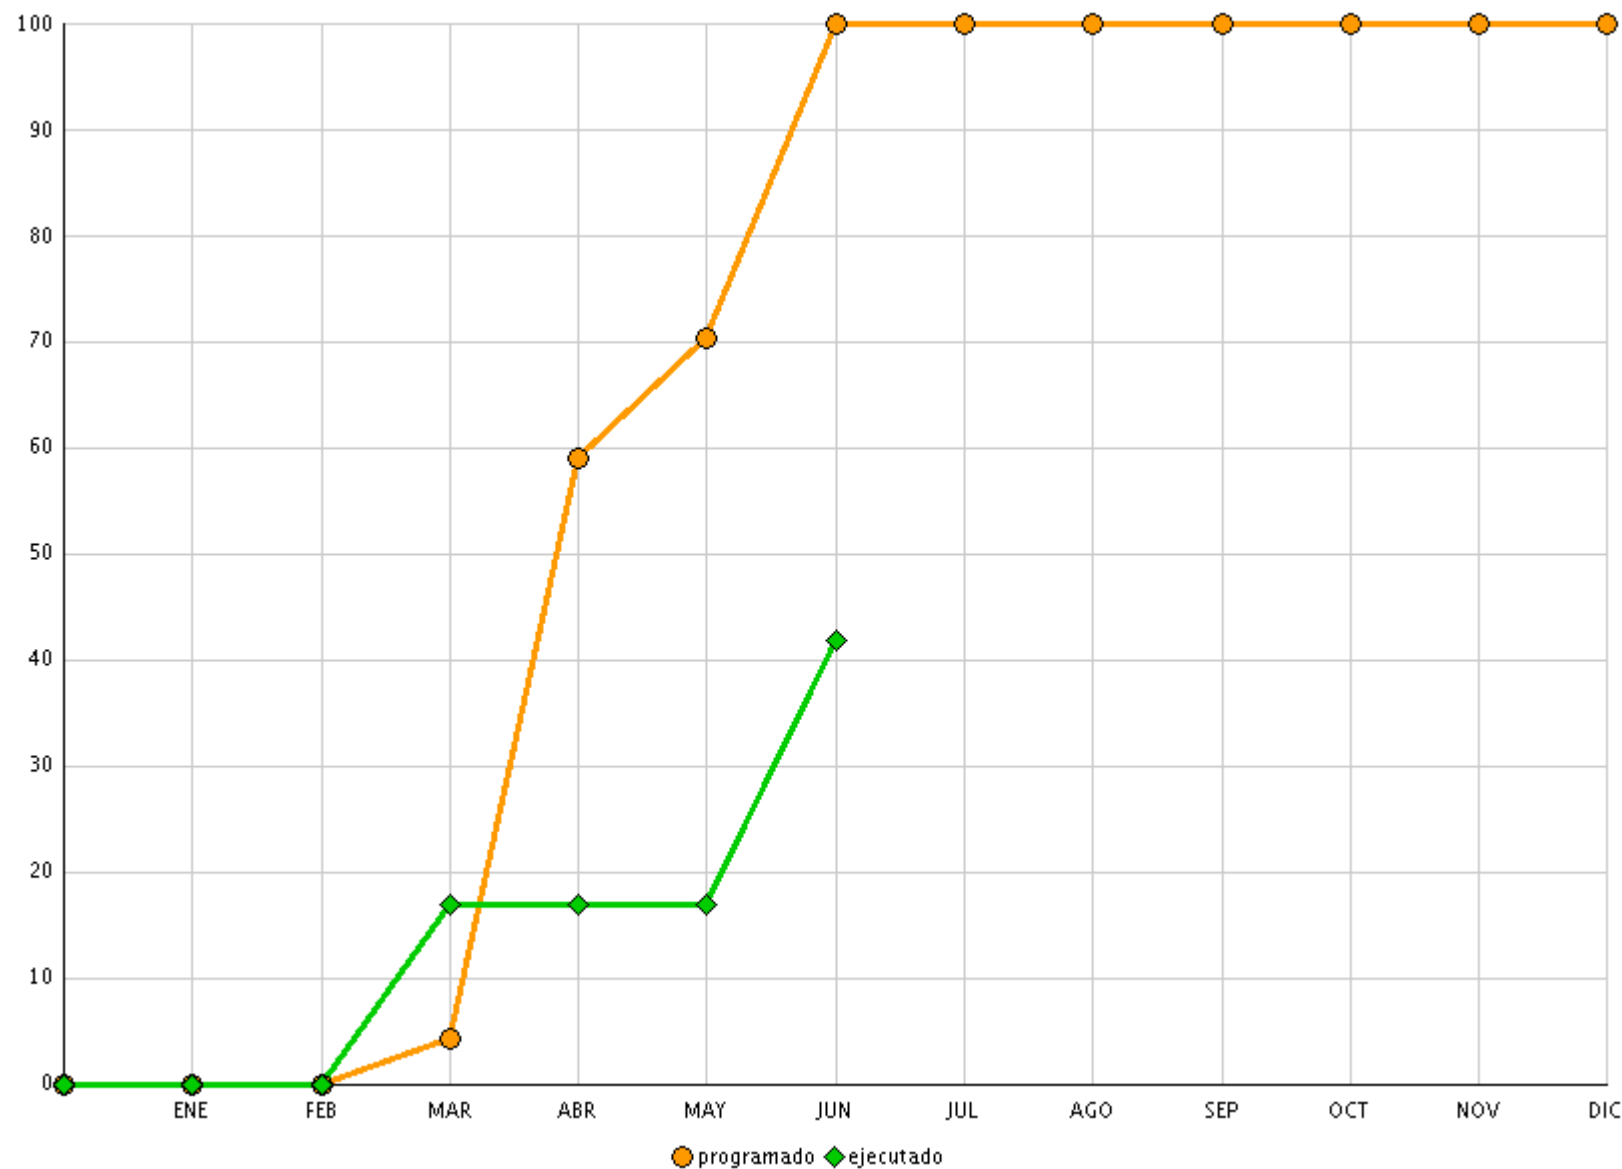


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	4.30	58.98	70.35	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	41.79						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7831 Saneamiento salud ambiental Bogotá

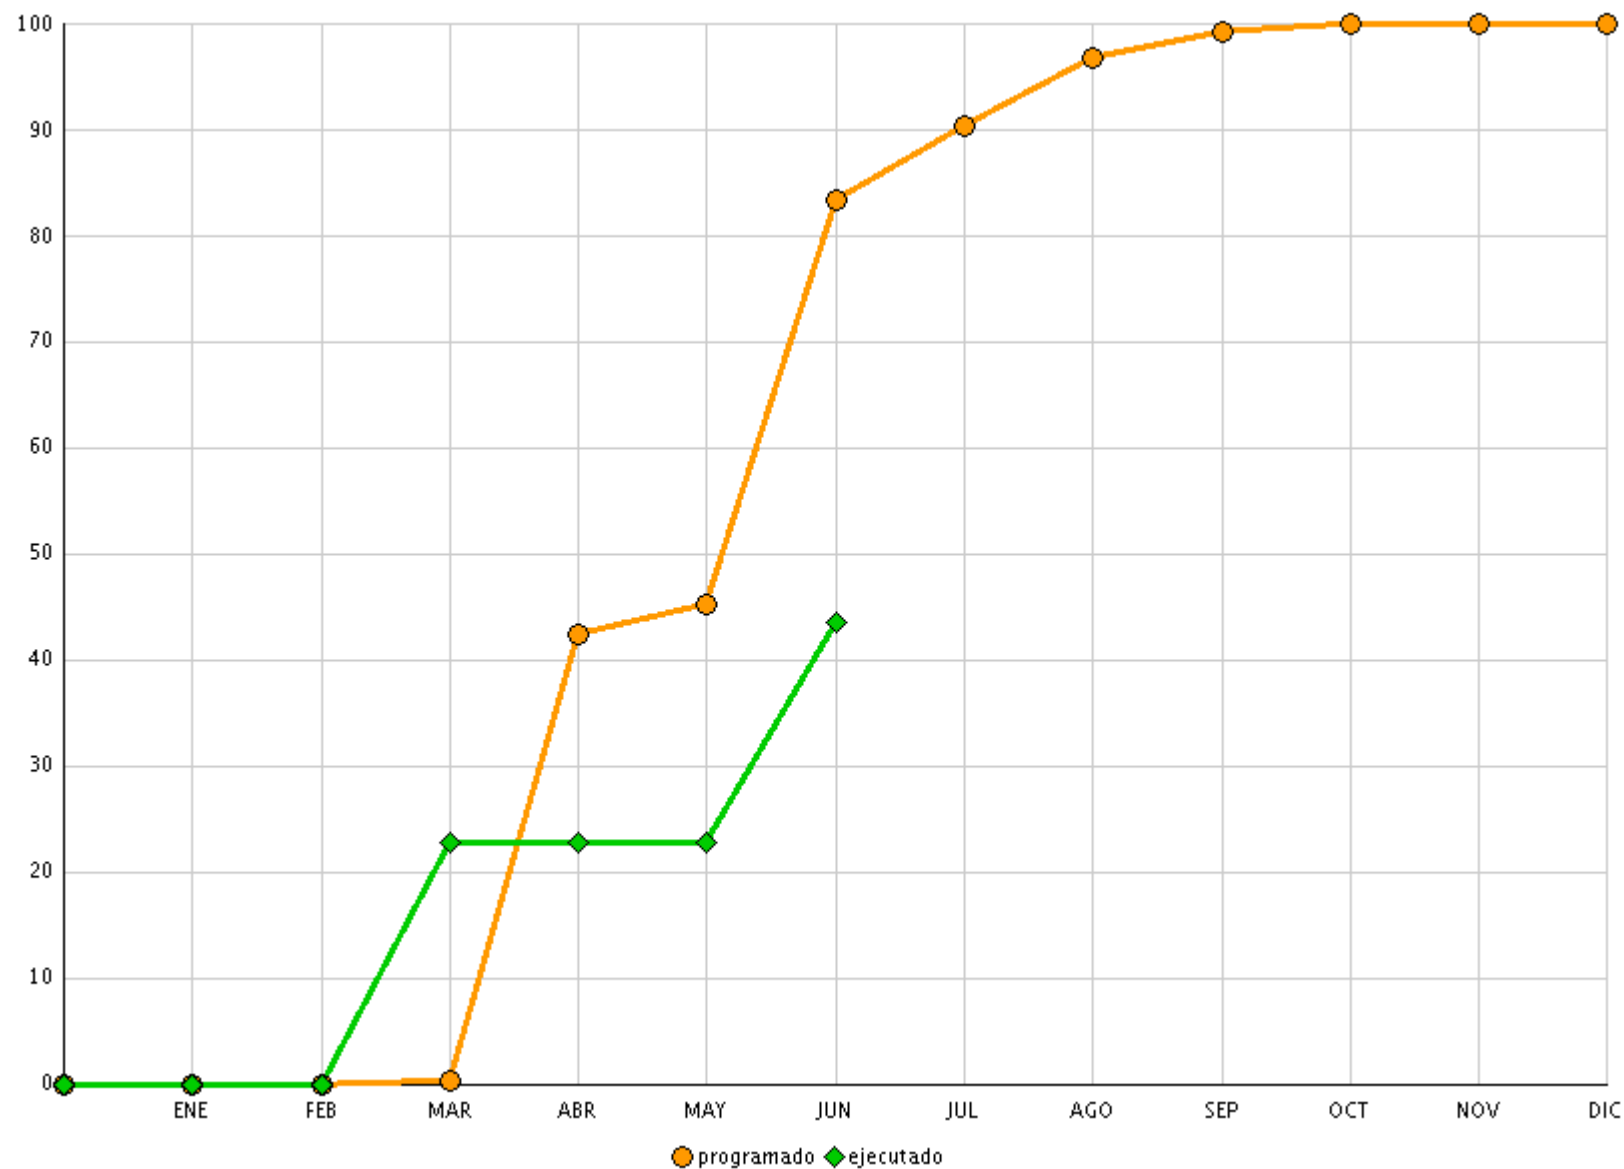


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.40	42.41	45.34	83.41	90.37	96.72	99.24	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	22.79	22.79	22.79	43.64						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7832 Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá

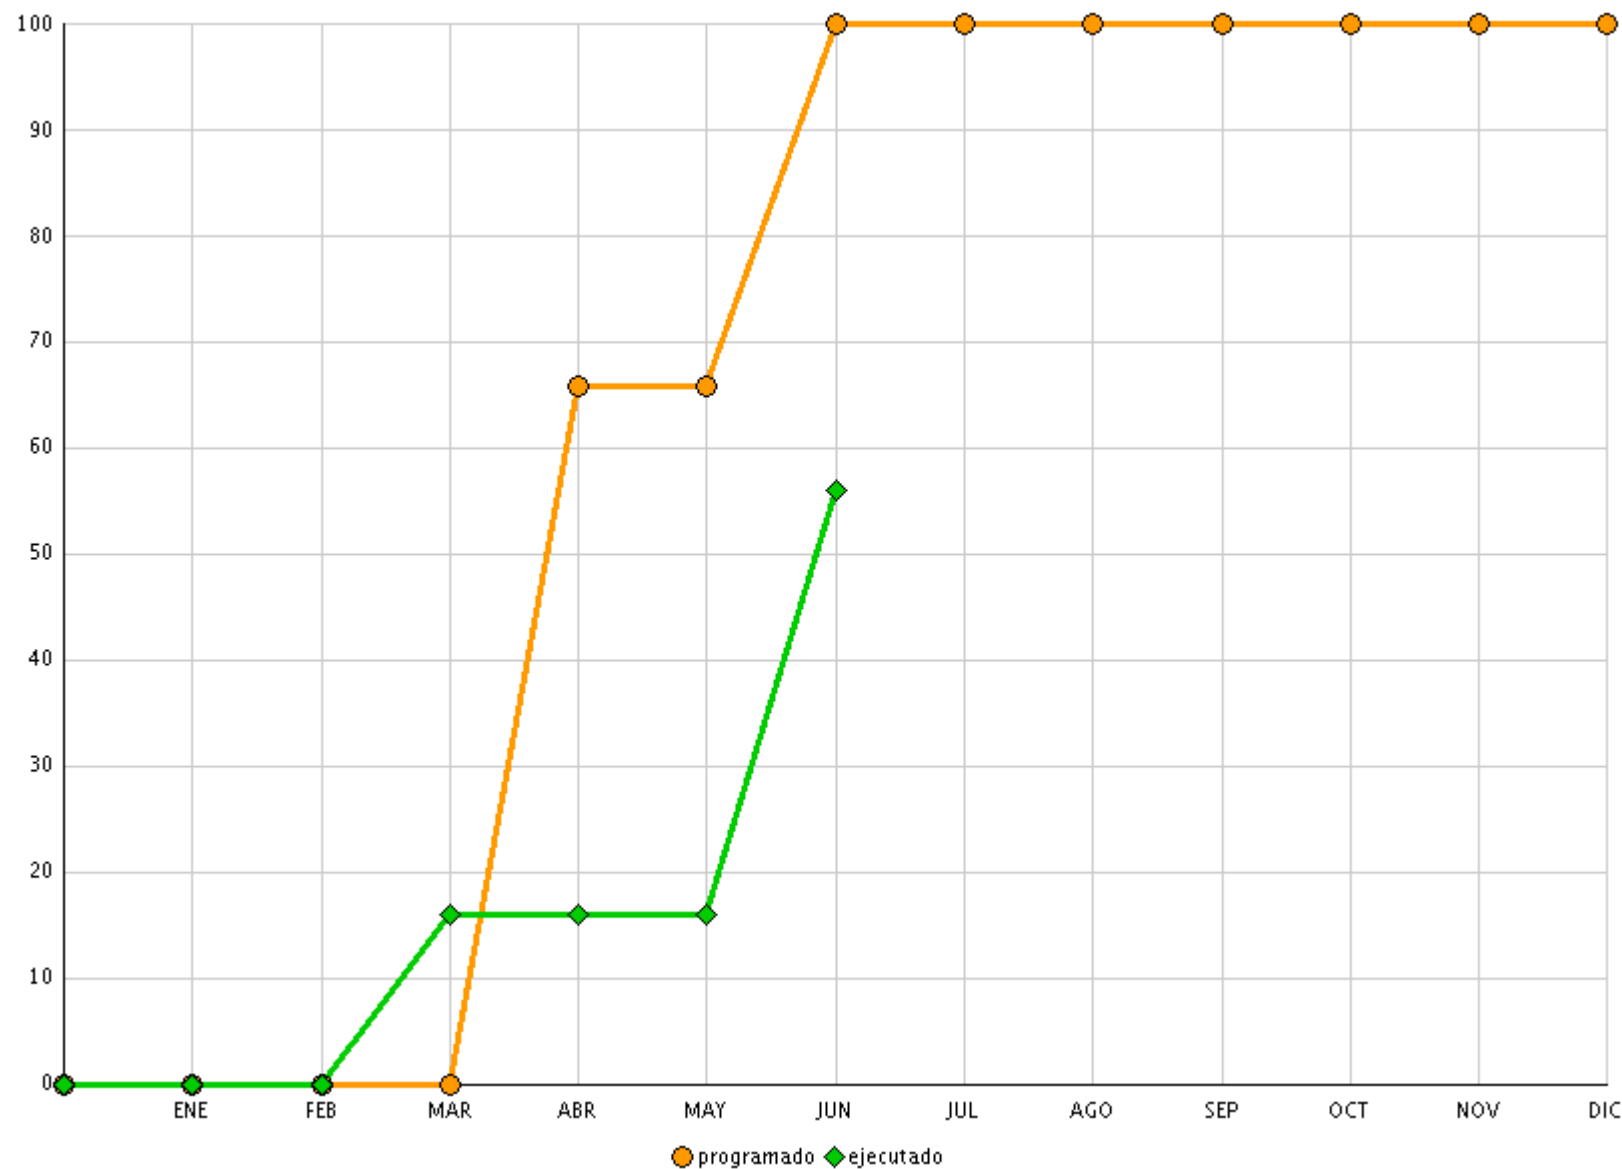


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	65.92	65.92	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	16.05	16.05	16.05	56.02						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7833 Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá

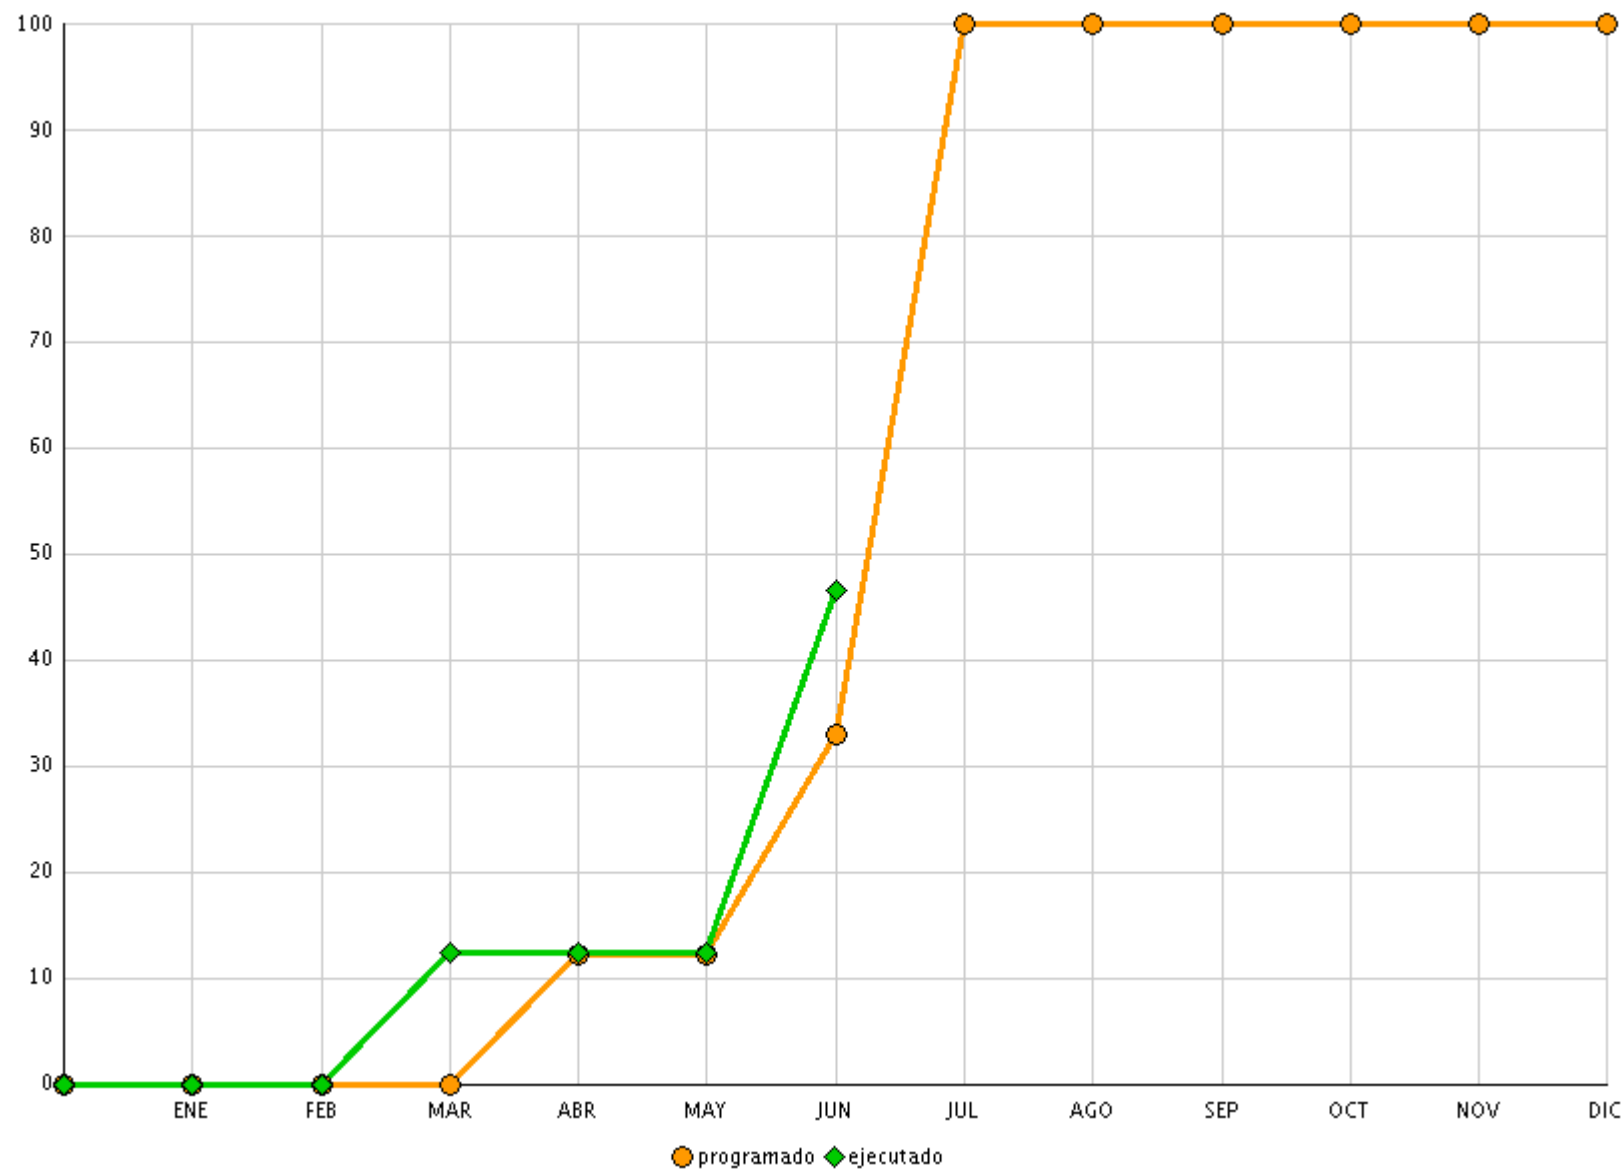


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	12.29	12.29	33.07	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	12.38	12.38	12.38	46.65						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7834 Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá

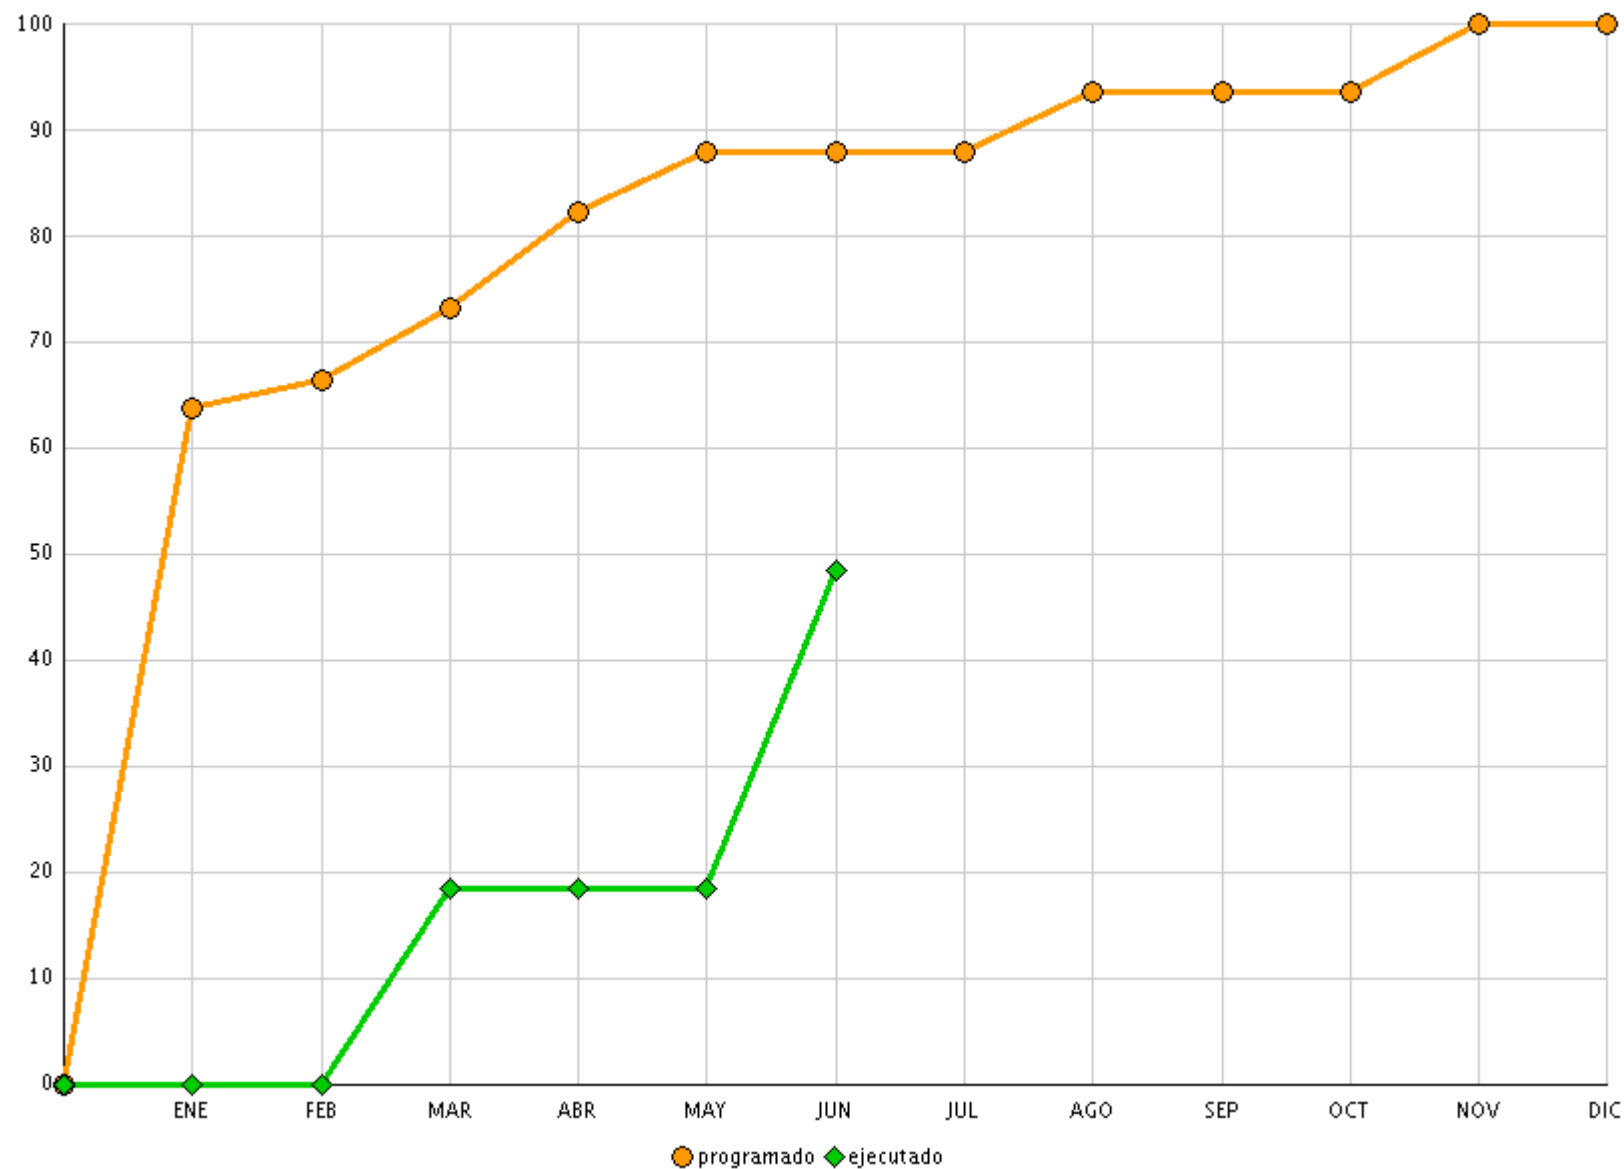


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	63.80	66.50	73.21	82.21	87.91	87.91	87.91	93.60	93.60	93.60	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.54	18.54	18.54	48.58						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7835 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá

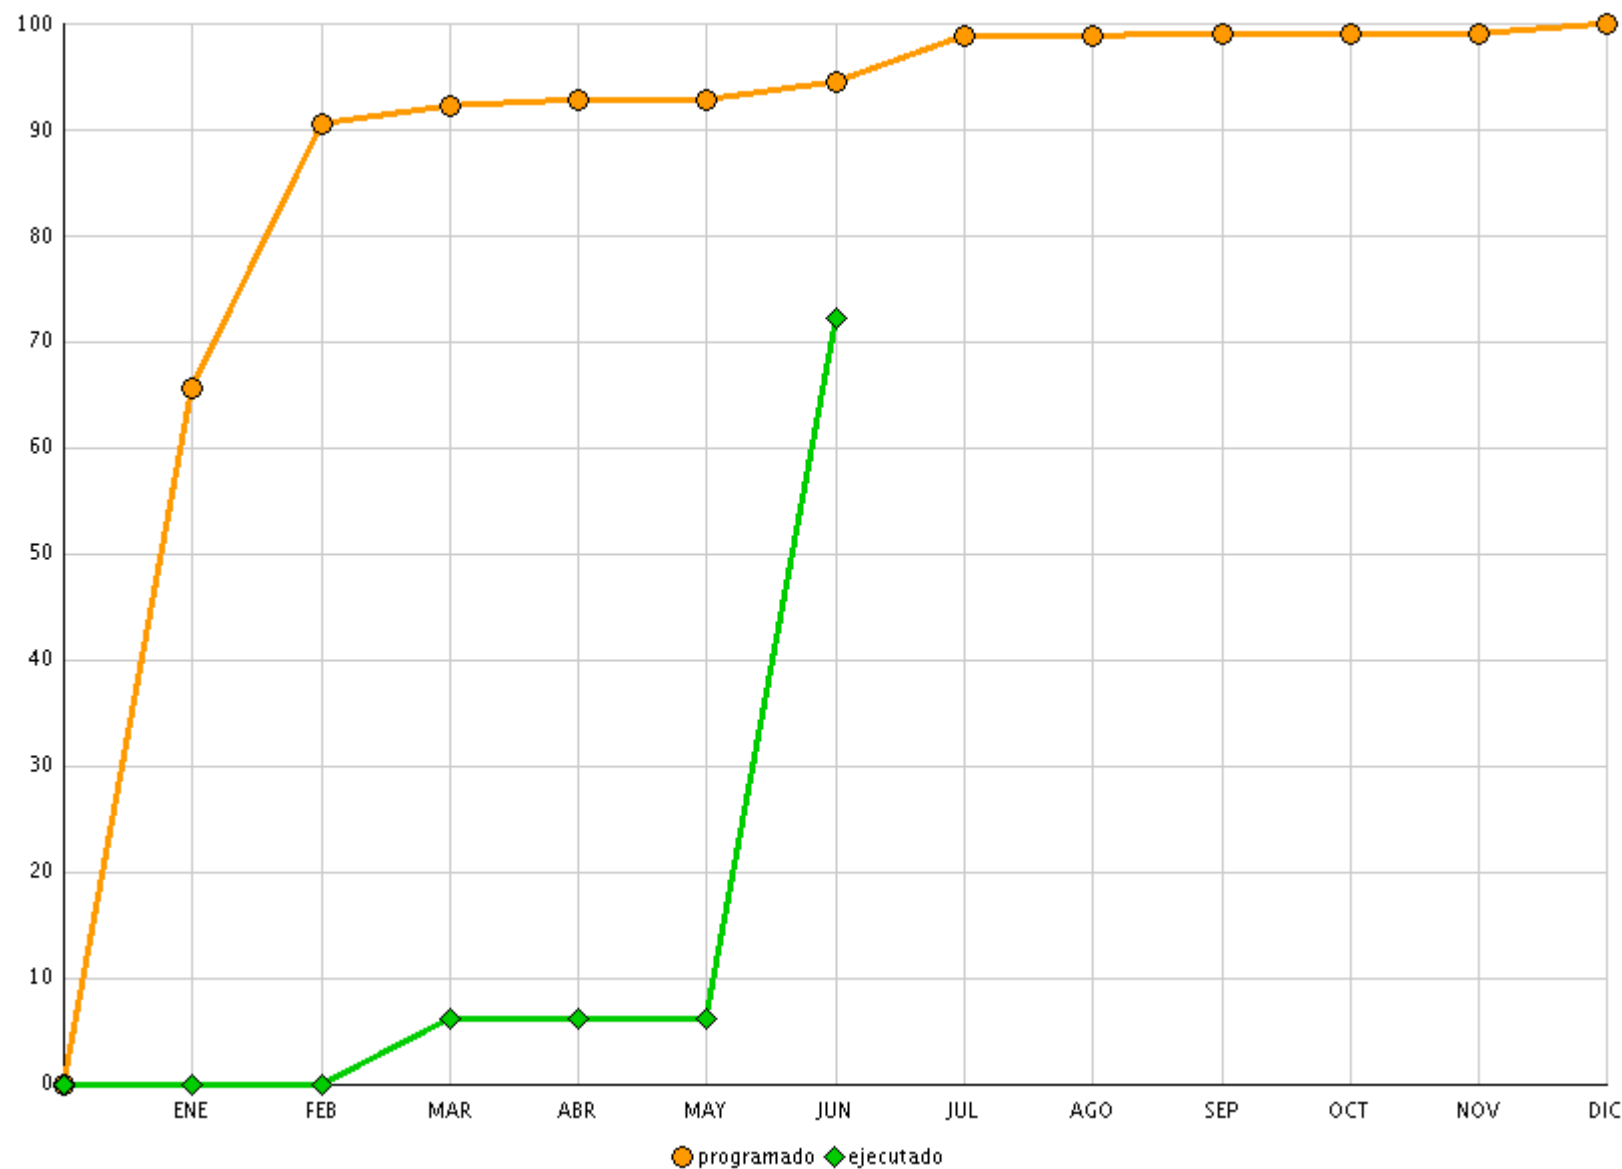


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	65.74	90.60	92.28	92.89	92.89	94.47	98.95	98.95	98.99	98.99	98.99	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.16	6.16	6.16	72.25						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7904 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

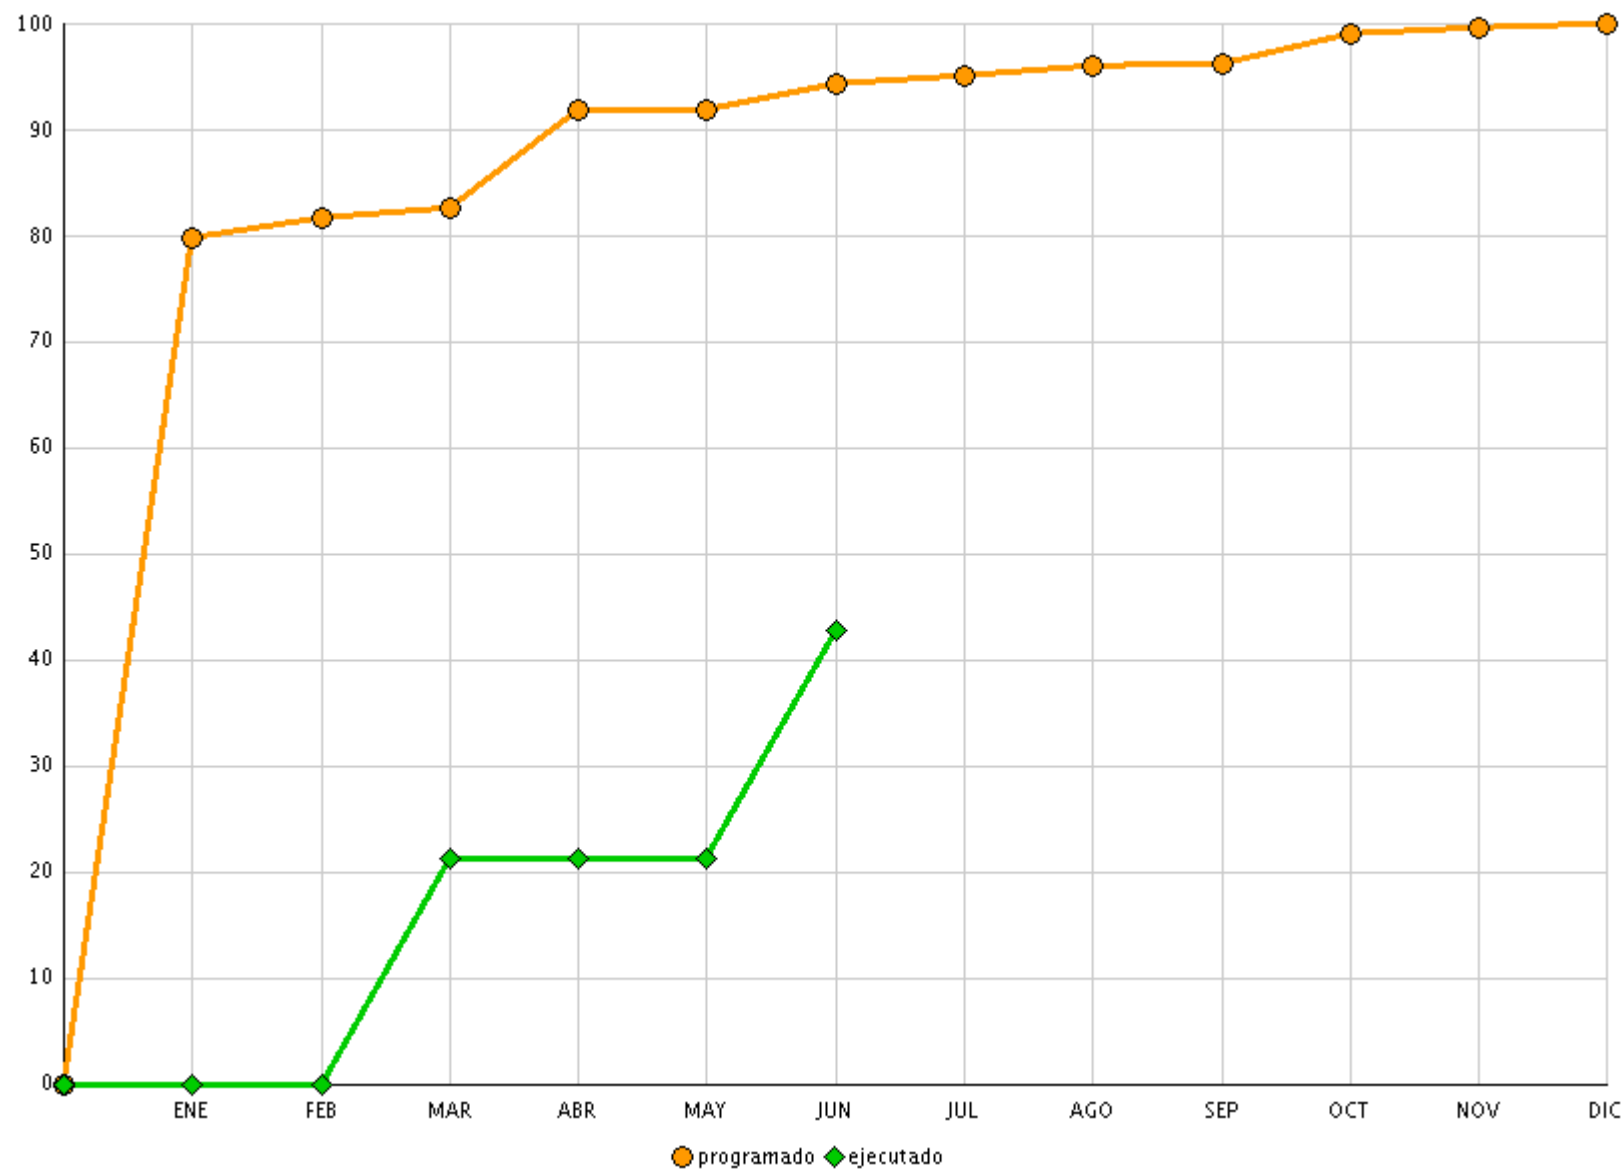


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	79.76	81.66	82.58	91.88	91.96	94.27	95.02	96.12	96.24	99.10	99.65	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	21.23	21.23	21.23	42.79						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7911 Recuperación y puesta en funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios CHSJD Bogotá

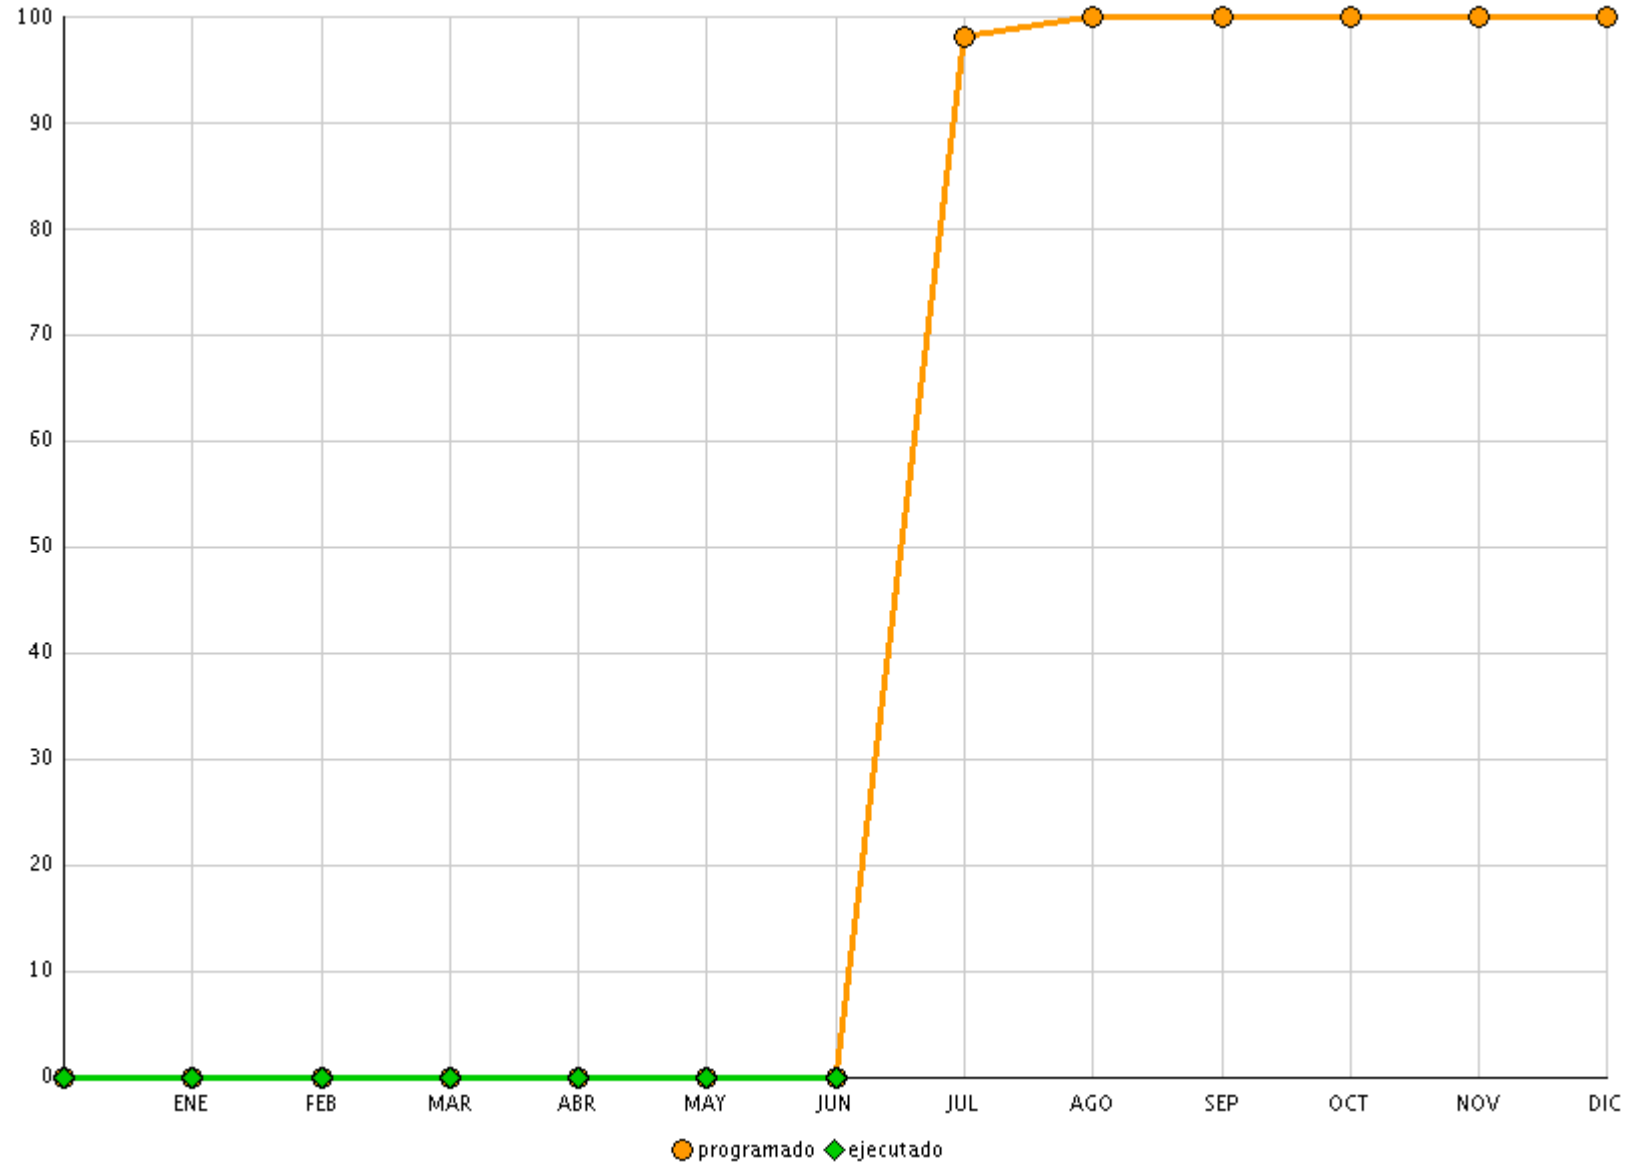

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7750 16 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	2.1. FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL , PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, A NIVEL DISTRITAL Y TERRITORIAL.	15.66	7.33	0.00	7.33	0.00	7.33	24.00	7.33	0.00	7.33	0.00	7.33	24.00	7.33		7.33		7.33		7.33		7.33		19.37		100.00	48.00	7.52
2.	2.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA CIUDADANÍA PARA HACER EFECTIVO EL GOCE DE SUS DERECHOS, DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN A LA C	6.43	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	24.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	24.00	7.60		7.60		7.60		7.60		7.60		16.40		100.00	48.00	3.09
3.	1.1 OPERAR EL OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ CON EL MÓDULO BOGOTÁ REGIÓN E INCLUSIÓN DEL COMPONENTE ANALÍTICO EN SALUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	8.96	3.04	0.00	4.71	0.00	5.29	58.00	5.29	0.00	6.93	0.00	6.93	14.00	9.55		9.55		10.15		11.36		13.36		13.84		100.00	72.00	6.45
4.	1.3. ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS COMUNITARIAS EN SALUD, GENERADAS EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES.	4.66	7.37	0.00	7.37	0.00	7.37	24.00	7.37	0.00	7.37	0.00	7.37	24.00	7.37		7.37		7.37		7.37		9.03		17.27		100.00	48.00	2.24
5.	1.4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS EN SALUD, ANÁLOGAS Y DIGITALES	2.26	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	24.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	24.00	7.40		7.40		7.40		7.40		7.40		18.60		100.00	48.00	1.08
6.	1.6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA, DENTRO EL MARCO ESTRATÉGICO Y OPERACIONAL DE LAS POLÍTICAS DE S	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	27.27	0.00	0.00	0.00	22.73	22.00	0.00		27.27		0.00		22.73		0.00		0.00		100.00	80.00	5.22
7.	1.7. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA EN SALUD, GENERADAS EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES.	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	3.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD.	8.94	5.27	0.00	5.80	0.00	5.80	71.00	6.72	0.00	7.78	0.00	7.78	10.00	8.47		8.47		8.47		8.47		13.47		13.50		100.00	81.00	7.24
9.	3.3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: ESCUELA DE PARTICIPACIÓN POR EL DERECHO DE SALUD.	17.92	5.98	0.00	6.51	0.00	7.08	77.00	7.08	0.00	7.08	0.00	7.59	0.00	7.59		7.74		8.21		8.52		12.46		14.16		100.00	77.00	13.80
10.	3.4. CONSTRUCCIÓN, CON BASE COMUNITARIA, DE PROYECTOS CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA INCLUSIÓN, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE LABORATO	10.95	5.72	0.00	5.72	0.00	6.59	20.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.66	27.00	7.66		8.18		8.96		9.47		12.91		12.93		100.00	47.00	5.15
11.	3.5. REALIZAR EL ALISTAMIENTO LOGÍSTICO Y DIGITAL PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.11	71.00	0.00	0.00	38.11	0.00	0.00	10.00	23.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	81.00	4.44
12.	3.7. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CICLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13.	3.9. DISEÑAR Y DIVULGAR LOS CONTENIDOS DIGITALES PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL.	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7750 16 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		56.51		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7785 23 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	2.07. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS 4 SUBREDES	22.02	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	10.79
2.	2.11. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR 4000 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA PARA REDES DE SALUD	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.63		0.00		38.70		0.00		0.00		38.67		100.00	49.00	1.54
3.	1.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	3.01
4.	1.17. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA SDS	5.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	2.87
5.	1.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	14.43		85.57		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	0.90
6.	1.03. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MÓVILES PARA: RIAS, MIAS MAITE	1.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.70
7.	2.01. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DEL MODELO DE ARQUITECTURA DE INTEROPERABILIDAD DE LA HCE, ACORDE A DECRETO DE MINSALUD	5.28	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	2.59
8.	2.03. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA FACTURA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA EN LAS 4 SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD	2.58	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	1.26
9.	2.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR HIS ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES EN LAS 4 REDES DE SERVICIOS DE SALUD	2.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	1.14
10.	2.09. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DASHBOARD DE ANALÍTICA PREDICTIVA SOBRE HCE	4.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	2.08
11.	2.11. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR 4000 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA PARA REDES DE SALUD	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	49.00	0.17
12.	1.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	6.32	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	3.35
13.	1.21. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTAS PARA HABEAS DATA	0.36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	32.00	0.12
14.	1.01. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS	2.99																									100.00	49.00	1.47

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7785 23 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
15. 1.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	11.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	6.06
16. 1.07. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN LA SDS Y 4 SUBREDES	5.39	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
17. 1.11. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (CERO PAPEL)	7.79	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	3.82
18. 2.02. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DEL MODELO DE ARQUITECTURA DE INTEROPERABILIDAD DE LA HCE	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.25
19. 2.04. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA FACTURA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA EN LAS 4 SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD	0.51	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.25
20. 2.06. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL HIS ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES EN LAS 4 REDES DE SERVICIOS DE SALUD	0.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.21
21. 2.08. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS 4 SUBREDES	0.49	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.24
22. 2.10. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DASHBOARD DE ANALÍTICA PREDICTIVA SOBRE HCE	0.58	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.28
23. 2.12. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 4000 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA PARA REDES DE SALUD	0.63	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.31
24. 2.14. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LAS 4 SUBREDES	0.22	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.11
25. 1.02. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00	25.00	66.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.18
26. "1.04. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MÓVILES PARA:	0.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.26
27. 1.06. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	0.84	90.50	0.00	3.30	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	48.00	0.40
28. 1.08. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN LA SDS Y 4 SUBREDES	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.05
29. 1.10. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ERP SAP HANA/S4 A NIVEL CLOUD	1.49	86.78	0.00	6.04	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	7.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.73
30. 1.12. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (CERO PAPEL)	0.60	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	3.45	0.00	15.00	0.00	8.05	25.00	15.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.29
31. 1.14. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ESTABLECIMIENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA Y AUTENTICACIÓN DIGITAL	0.36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.18
32. 1.16. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDS Y 4 SUBREDES	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	30.00	0.00	70.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.04
33. 1.18. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA SDS	1.37	43.56	0.00	6.57	0.00	0.00	24.00	3.94	0.00	7.88	0.00	9.20	25.00	28.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.67

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7785 23 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
34.	1.20. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA AMPLIACIÓN 800 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA DE LA SDS.	0.35	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	25.00	65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.17
35.	1.22. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTAS PARA HABEAS DATA	1.68	88.93	0.00	4.29	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.82
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									47.29	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7788 20 Transformación digital en salud Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.03. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE LA SDS	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	33.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	1.47
2.	1.11. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INTEROPERABILIDAD DE AL MENOS DOCE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ESTRATÉGICOS	3.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	1.82
3.	1.01. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE TI	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	2.01. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE CIUDAD REGIÓN	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	1.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO VIRTUALIZADOS	39.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	18.52
6.	1.07. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	12.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	6.00
7.	1.13. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA PLATAFORMAS BSE OPEN SOURCE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	7.04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	3.29
8.	1.03. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE LA SDS	2.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	1.00
9.	1.09. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ESTÁNDAR DE INTEROPERABILIDAD DE LA SDS	11.64	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	5.43
10.	2.02. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE CIUDAD REGIÓN	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	0.09
11.	1.02. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE TI	3.50	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	3.44	0.00	7.35	0.00	0.00	33.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	1.63
12.	1.04. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE LA SDS	0.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	0.24
13.	1.06. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO VIRTUALIZADOS	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	66.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	0.34
14.	1.08. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	0.64	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	0.30
15.	1.10. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ESTÁNDAR DE INTEROPERABILIDAD DE LA SDS	0.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	0.11
16.	1.12. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INTEROPERABILIDAD DE AL MENOS DOCE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ESTRATÉGICOS	0.96	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	0.45
17.	1.13. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA PLATAFORMAS BSE OPEN SOURCE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	0.06
18.	1.14. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA	6.29																								100.00	46.67	2.94	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7788 20 Transformación digital en salud Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
PLATAFORMAS BSE OPEN SOURCE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS		94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	26.67	3.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
19. 2.02. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE CIUDAD REGIÓN	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.67	0.06		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		43.75	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7790 19 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1-ADJUDICACIÓN, DISEÑO FINAL, LICENCIA Y OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR	28.84	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	7.21
2.	2.2-CONTRATAR OBRA E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O REORDENAMIENTO DE LOS CAPS	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	31.00	82.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	61.00	2.91
3.	4.2-CONTRATAR OBRA E INTERVENTORÍA PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. Y LOS COMPROMIS	33.30	69.41	0.00	0.00	0.00	3.01	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	19.00	18.74		8.56		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	11.66
4.	4.7-CONTRATAR OBRAS E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	0.77	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	81.90	0.00	0.00	23.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	48.00	0.37
5.	4.8-ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LAS INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	0.57	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.23	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	1.00	0.01
6.	1.2-ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	18.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	2.3-ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LOS CAPS	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66	10.00	75.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.18
8.	4.3-ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	11.39	52.20	0.00	0.00	0.00	1.63	41.00	0.00	0.00	17.74	0.00	0.00	9.00	0.00		0.00		0.00		28.43		0.00		0.00		100.00	50.00	5.70
9.	2.3-ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LOS CAPS	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.02
10.	4.3-ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	0.50	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	16.47	0.00	0.00	9.00	0.00		0.00		0.00		32.95		0.00		0.00		100.00	50.00	0.25
11.	2.1-CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS Y LICENCIAS E INTERVENTORÍAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O REORDENAMIENTO DE LOS CAPS	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12.	4.1-CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS Y LICENCIAS E INTERVENTORÍAS NECESARIAS PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARIA DI	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29	67.00	68.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	86.00	0.26
13.	1.3-APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	24.00	10.13	0.00	8.53	0.00	23.44	23.00	0.00		32.52		13.21		3.65		0.00		0.00		100.00	47.00	0.07
14.	2.4-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS CAPS	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	33.00	10.79	0.00	5.42	0.00	5.42	26.00	13.64		32.86		11.19		16.62		0.00		0.00		100.00	59.00	0.07

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7790 19 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
15.	3.2-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		59.05		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16.	4.4-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DOTACIÓN PARA PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SDS	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	40.95	0.00	0.00	31.00	0.00		25.31		0.00		0.00		33.74		0.00		100.00	46.00	0.03
17.	4.9-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRIT	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86	21.00	12.11	0.00	14.10	0.00	12.44	24.00	8.52		14.53		3.10		19.29		6.05		0.00		100.00	45.00	0.07
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										28.79

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7791 19 Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.04 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS COMISIONES VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES DEL SOGCS	8.64	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		19.11		100.00	0.00	0.00
2.	1.07 REALIZAR LOS EVENTOS Y LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.25	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.63
3.	1.06 REALIZAR LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ÁREA	0.69	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.35
4.	1.01 REALIZAR LOS TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS PARA EXPEDIR LAS RESOLUCIONES QUE OTORGUEN LOS PERMISOS, LICENCIAS, RECONOCIMIENTO O DOCUMENTO DE ACUERDO CON LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL DISTRITO CAPI	2.76	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		19.68		100.00	60.00	1.66
5.	1.02 REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA INDIVIDUAL Y GRUPAL EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SOGCS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN BOGOTÁ	4.53	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		17.21		100.00	61.00	2.76
6.	1.03 ADELANTAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SOGCS	45.65	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.08		100.00	64.00	29.22
7.	1.05 ADELANTAR LA GESTIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR LAS FALLAS DERIVADAS DE LA INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD DEL SOGCS POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN BOGOTÁ	36.48	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18.50		100.00	100.00	36.48

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 71.09

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7822 18 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.3 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PARA LA INTERVENTORÍA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (LEY 1438/2011 - ART. 119).	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	279.00	1.03
2.	1.4 EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS QUE VIABILICEN EL ACCESO EFECTIVO DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ D.C. AL SGSSS Y FORTALEZCAN EL EJERCICIO DE RECTORIA A LAS EAPB .	0.25	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	25.00	4.00		0.00		8.00		8.00		0.00		12.00		100.00	50.00	0.13
3.	2.5 ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POB	1.12	0.00	0.00	4.46	0.00	8.93	0.00	12.50	0.00	2.68	0.00	4.46	11.00	6.25		5.36		2.68		4.46		4.46		43.76		100.00	11.00	0.12
4.	2.5 ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POB	0.03	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	11.00	0.00
5.	2.6 REALIZAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL.	0.24	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.17		4.17		4.17		12.50		0.00		8.32		100.00	50.00	0.12
6.	2.2 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA RED COMPLEMENTARIA, EN EL MARCO DEL MODELO DE S	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		75.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	24.00	0.01
7.	2.5 ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POB	0.04	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	11.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	11.00	0.00
8.	2.1 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DISTRITAL, EN EL MARCO DEL MODELO D	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	88.89		0.00		0.00		11.11		0.00		0.00		100.00	28.00	0.10
9.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS,	0.23	0.00	0.00	30.43	0.00	17.39	3.00	30.43	0.00	17.39	0.00	4.36	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	0.12
10.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS,	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	3.00	48.00	0.00	16.00	0.00	29.55	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	0.16

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7822 18 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
11.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS,	0.10	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	0.05	
12.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS,	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	14.29	0.00	0.00	0.00	14.29	50.00	0.00		14.29		14.29		14.29		14.29		14.26		100.00	53.00	0.04	
13.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS,	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	3.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	50.00	9.35		9.35		9.35		9.35		9.35		15.85		100.00	53.00	0.57	
14.	2.4 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O MIXTAS, CON LRECURSOS ASIGNADOS POR EL MSPS	0.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14	3.00	7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	36.00	7.14		7.14		7.14		7.14		7.14		28.60		100.00	39.00	0.05	
15.	2.4 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O MIXTAS, CON LRECURSOS ASIGNADOS POR EL MSPS	0.36	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	3.00	8.33	0.00	11.11	0.00	13.89	36.00	27.78		13.89		8.34		0.00		0.00		0.00		100.00	39.00	0.14	
16.	3.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ABORDAJE EN SALUD PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.01	
17.	1.1 PRESUPUESTACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO A LA LMA (LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS)	94.16	7.69	0.00	7.73	0.00	7.77	24.00	7.66	0.00	7.68	0.00	7.66	26.00	7.69		7.63		7.53		7.76		11.09		12.11		100.00	50.00	47.08	
18.	1.1 PRESUPUESTACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO A LA LMA (LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS)	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	50.00	0.36	
19.	1.2 LEGALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (LEY 1438/2011 - ART. 119).	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11	0.00	32.43	0.00	8.11	41.00	8.11		8.11		8.11		8.11		8.11		10.80		100.00	41.00	0.15	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		50.26	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7824 22 Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	3.01 REALIZAR CONTROL Y VIGILANCIA JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTRAN CONTRA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y/O EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, EN EL TERRITORIO NACIONAL.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.05
2.	3.07 DESARROLLAR HABILIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	3.02 DESARROLLAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ALINEADAS CON LAS NECESIDADES O SOLICITUDES RECIBIDAS, USANDO CANALES Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN, PARA CONTRIBUIR AL EJERCICIO MISIONAL DE LA	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.65
4.	3.03 EJECUTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS COLABORADORES DE LA SDS	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.93
5.	3.05 REALIZAR LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD A LA VERSIÓN 2015 DE LA NORMA ISO 9001, POR PARTE DEL ENTE CERTIFICADOR	0.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.90		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	3.08 REALIZAR AUDITORÍAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	3.04 DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO CENTRAL.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	4.50
8.	3.06 ASISTIR TÉCNICAMENTE AL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DELEGADAS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN LOS PROCESOS DE APOYO CONFORME LA NORMATIVIDAD QUE LA REGULA.	85.60	33.21	0.00	0.13	0.00	0.34	25.00	2.32	0.00	7.15	0.00	0.08	25.00	56.64		0.00		0.00		0.13		0.00		0.00		100.00	50.00	42.80
9.	1.01 ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN LA DIGNIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	29.92	0.00	0.00	25.00	70.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.40
10.	4.01 REVISAR Y ACTUALIZAR LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ENTIDAD, ACORDE CON EL NUEVO MODELO DE SALUD INCLUYENTE, SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO Y DIFERENCIAL.	0.80	46.35	0.00	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00		6.00		0.00		7.65		0.00		0.00		100.00	50.00	0.40

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 49.73

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7826 19 Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1. DESARROLLAR ACCIONES DE COORDINACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	44.53	0.00	0.00	0.00	47.90	27.00	7.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	9.65
2.	2.1. IMPLEMENTAR ACCIONES DE RBC PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, AUTONOMÍA Y SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIODAD EN EL TERITORIO.	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	41.66	0.00	0.00	0.00	58.34	29.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	44.00	12.80
3.	3.1. IMPLEMENTAR ACCIONES DE RBC EN GRUPOS Y REDES DE CUIDADORAS/ES, COMO GESTORES DE PRACTICAS DE SALUD Y CUIDADO.	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	41.66	0.00	0.00	0.00	58.34	27.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	34.00	12.39
4.	4.1. DESARROLLAR ACCIONES DE RBC PARA CUIDADORAS/ES DE PERSONAS EN DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA Y SEVERA.	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	66.69	0.00	0.00	0.00	33.31	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	7.58
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		42.43	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7827 19 Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.3. ESTRUCTURAR PROCEDIMIENTOS Y PONER EN OPERACIÓN LOS EQUIPOS TERRITORIALES EN EL MARCO DE LAS REDES INTEGRALES Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	2.00	0.00		46.40		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.37
2.	1.3. ESTRUCTURAR PROCEDIMIENTOS Y PONER EN OPERACIÓN LOS EQUIPOS TERRITORIALES EN EL MARCO DE LAS REDES INTEGRALES Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	21.16	0.00	78.84	2.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	42.25
3.	1. 2. IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE EL MODELO DE SALUD A TRAVÉS DE COORDINACIONES LOCALES A PARTIR DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20		85.80		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	1.93
4.	1.4. (T.H.) DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN EN EL AJUSTE DEL MODELO DE SALUD EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	4.40
5.	2.2. MEDIR ANUALMENTE LOS RESULTADOS DEL MODELO DE SALUD TERRITORIAL BASADO EN ATENCIÓN PRIMARIA CON BASE EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO CONVENIDOS Y DE CARA A SU MEJORA CONTINUA.	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									48.96	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7828 32 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 09 Prevención y cambios para mejorar la salud de la población

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1. DESARROLLO DE ACCIONES SECTORIALES Y COMUNITARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR O MINIMIZAR LA APARICIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y SUS CONSECUENTES EFECTOS NEGATIVOS EN LA POBLACIÓN, DE AC	0.01	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	41.00	0.00
2.	1.2. DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL DC, EN ARTICULACIÓN CON LOS AGENTES DEL SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES TENDIENTES A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA PREVENCIÓ	0.60	0.00	0.00	9.77	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	24.00	85.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	41.00	0.25
3.	1.3. DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL DC, EN ARTICULACIÓN CON LOS AGENTES DEL SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES TENDIENTES A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA PREVENCIÓ	0.09	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.04
4.	2.1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD INFANTIL, EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS Y NIÑAS	0.47	0.00	0.00	59.64	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	32.40	0.00	7.96	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.20
5.	2.2. IMPLEMENTAR DE ACCIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE OTROS SECTORES, LA SOCIEDAD, LOS TERRITORIOS Y LA CIUDADANÍA EN TORN0 A LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS	0.01	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.00
6.	3.1. DESARROLLAR ACCIONES EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS; EN ESPECIAL LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE TIPO PANDÉMICO COMO COVID-19	4.32	0.00	0.00	57.66	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	4.22	0.00	33.28	25.00	0.00		4.84		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	1.81
7.	4.1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y TRATAMIENTO EN VIH CON LOS DEMÁS ACTORES DEL SGSSS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN POBLACIÓ	0.38	0.00	0.00	33.52	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	25.76	0.00	40.72	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.16
8.	4.2. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y TRATAMIENTO EN VIH CON LOS DEMÁS ACTORES DEL SGSSS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES COLECTIVAS EN POBLACIÓN GENERAL CON	0.37	0.00	0.00	27.62	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	26.06	0.00	46.32	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.16
9.	5.1. DESARROLLAR PROCESOS Y ACCIONES COLECTIVAS, COMPLEMENTARIAS A LAS ATENCIONES INDIVIDUALES Y POBLACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y LA ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS.	0.47	0.00	0.00	21.63	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77	25.00	62.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.20
10.	5.2. DESARROLLAR PROCESOS Y ACCIONES DE ARTICULACIÓN CON LOS AGENTES DEL SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES TENDIENTES A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA	0.47	0.00	0.00	24.94	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47	25.00	62.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7828 32 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
TUBERCULOSI																												
11. 6.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN.	1.55	0.00	0.00	44.45	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.55	23.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.47
12. 7.1. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN SALUD MENTAL.	2.05	0.00	0.00	51.61	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.39	31.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.03
13. 8.1. IMPLEMENTAR INTERVENCIONES PROMOCIONALES Y DE GESTIÓN DEL RIESGO EN RELACIÓN CON EL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1.22	0.00	0.00	42.44	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.56	18.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	56.00	0.68
14. 11.1. DESARROLLAR EL ESTUDIO DISTRITAL DE SALUD MENTAL, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACCIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	39.00	1.17
15. 12.1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE HáBITOS SALUDABLES, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA PARA ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, DIABETES MELLITUS, CÁNCER, ENFERMEDADES DE VÍAS RESPIRATORIAS IN	1.51	0.00	0.00	26.34	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.43	25.00	1.46		15.77		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.63
16. 13.1. GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN HOJA DE RUTA EN LAS FASES DE ALISTAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EXPUESTA Y/O AFECTADA POR CONDIC	1.91	0.00	0.00	48.58	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	15.55	0.00	35.87	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.80
17. 14.1. DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA OPORTUNIDAD MENOR O IGUAL A DOS DÍAS EN EL INICIO DE TRATAMIENTO EN CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	0.19	0.00	0.00	65.56	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.08
18. 15.1. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE ACCIONES SECTORIALES, INTERSECTORIALES Y COMUNITARIAS QUE PROMUEVAN EL ABORDAJE INTEGRAL DE LOS ENT	0.77	0.00	0.00	44.86	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14	17.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	41.00	0.32
19. 15.2. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A EVIDENCIAR LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES, PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROMOCIÓN DEL	0.42	0.00	0.00	46.04	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.96	13.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.14
20. 16.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE AMBIENTES OBESO-GÉNICOS.	0.46	0.00	0.00	47.82	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.18	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	39.00	0.18
21. 16.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN ESCOLARES DE 5 A 17 AÑOS	0.96	0.00	0.00	38.64	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	39.83	0.00	21.53	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	39.00	0.37
22. 17.1. DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA OPORTUNIDAD EN EL INICIO DE TRATAMIENTO PARA CÁNCER CERVICAL Y CÁNCER DE SENO DE LAS MUJERES.	0.14	0.00	0.00	59.79	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	15.34	0.00	24.87	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.06
23. 18.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL CENTRO DISTRITAL DE ENLACE Y SU RED EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA.	1.41	0.00	0.00	11.47	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.53	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.59
24. 18.2. GENERAR CAPACIDADES EN EL SECTOR, OTROS SECTORES Y LA COMUNIDAD PARA GESTIÓN DEL RIESGO EN BROTES Y EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA.	0.55	0.00	0.00	53.05	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31	25.00	12.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.23
25. 18.3. ADQUIRIR Y DISPONER DE INSUMOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.15
26. 19.1. IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y ORIENTAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES EN EL NIVEL LOCAL QUE APORTEN DE MANERA POSITIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALE	3.99	0.00	0.00	36.68	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.96	26.00	0.58		10.78		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	43.00	1.72
27. 19.2. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN	2.00																									100.00	42.00	0.84

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7828 32 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
DE LOS RECURSOS DEL PSPIC		0.00	0.00	58.55	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00							
28. 19.2. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PSPIC	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.68	25.00	0.00		0.00		67.32		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.89			
29. 19.3. DESARROLLAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	17.00	12.13	0.00	2.52	0.00	4.03	25.00	30.15		7.33		16.35		12.28		3.14		0.00		100.00	42.00	4.20			
30. 20.1. MANTENER LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN BOGOTÁ D.C.	14.80	0.00	0.00	69.99	0.00	0.00	17.00	0.12	0.00	0.00	0.00	28.28	25.00	0.00		1.61		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	6.22			
31. 20.2. DESARROLLAR EL PROCESO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA ACCIÓN EN LAS DIFERENTES ESCALAS DEL TERRITORIO	1.04	0.00	0.00	47.54	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77	25.00	0.00		28.69		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.44			
32. 21.1 BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.21			
33. 22.1. REALIZAR ANÁLISIS DE LABORATORIO EN APOYO A LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA SANITARIA	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	17.00	3.87	0.00	0.49	0.00	42.87	25.00	50.85		1.25		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	3.03			
34. 22.2 DESARROLLAR UN PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD A LOS INTEGRANTES DE LA RED DE LABORATORIOS	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21.27	25.00	11.20	0.00	2.42	0.00	1.57	25.00	32.71		0.79		16.76		8.97		0.00		4.31		100.00	50.00	1.26			
35. 22.3. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE PERMITAN MANTENER LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
36. 22.3. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE PERMITAN MANTENER LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.65	0.00	0.00		30.96		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
37. 22.4 MANTENER E INCORPORAR NUEVAS METODOLOGÍAS EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN, FORTALECIENDO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
38. 23.1 DESARROLLAR LAS ACCIONES QUE PROPENDAN POR UNA PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	12.47			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		41.18	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7829 17 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 10 Salud para la vida y el bienestar

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA EL CUIDADO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL, EL PARTO, PUERPERIO Y DE NEONATOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA, POBLACIONA	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	66.67	0.00	0.00	0.00	33.33	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.00
2.	2.2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA EL CUIDADO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL, EL PARTO, PUERPERIO Y DE NEONATOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA, POBLACIONA	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	66.67	0.00	0.00	0.00	33.33	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.00
3.	4.2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PARTICIPATIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES BAJO UN ENFOQUE DE DERECHOS, POBLACIONAL DIFERENC	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	66.67	0.00	0.00	0.00	33.33	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.07
4.	5.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD PARA EL CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CON ÉNFASIS EN PREVENCIÓN	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	60.11	0.00	0.00	0.00	39.89	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	1.15
5.	6.1. DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCION PARA INCREMENTAR EN UN 33% LA ATENCIÓN A LAS POBLACIONES DIFERENCIALES (ETNIAS, LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, PERSONAS TRANS, INTERSEXUALES, HABITANTES D	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	18.57	0.00	0.00	0.00	81.43	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	28.09
6.	7.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE FAVOREZCA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE COMPONENTE PRIMARIO PARA LA POBLACIÓN INSTITUCIONALIZADA A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL (SECTORES SOCIALE	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	66.67	0.00	0.00	0.00	33.33	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	5.16
7.	1.1. PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA,	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	61.45	0.00	0.00	0.00	38.55	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	2.52
8.	2.1. PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA,	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	65.09	0.00	0.00	0.00	34.91	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.87
9.	3.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL, LA PROTECCIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA PREVENCIÓN DEL ABUSO Y LA VIOLENCIA SEXUAL, EN EL MARCO DE LOS D	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	23.75	0.00	0.00	0.00	30.14	25.00	0.00		46.11		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	2.02
10.	4.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN, APROPIACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DIRIGIDAS A POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JOVEN, EN EL MARCO DEL DESA	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	41.58	0.00	0.00	0.00	58.42	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7829 17 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																													
Total ponderación vertical		100.00																													

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7830 16 Asistencia: Infancia imparable Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 11 Salud y bienestar para niñas y niños

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	7.1. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COBERTURAS DE LOS INMUNOBIOLOGICOS INCLUIDOS EN EL ESQUEMA REGULAR DE VACUNACIÓN PARA MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SIS	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	43.05	0.00	19.08	0.00	37.87	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	25.04
2.	7.2. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍA Y ATENCIÓN DE EVENTOS DE SALUD SUCEPTIBLES DE INMUNIZACIÓN CON LOS ACTORES DE SALUD EN BOGOTÁ.	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	42.82	17.00	29.89	0.00	0.00	0.00	27.29	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	2.49
3.	6.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD INFANTIL Y GESTIÓN DEL RIESGO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL Y POSTNATAL.	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	63.35	0.00	0.00	0.00	36.65	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	1.24
4.	8.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGILANCIA, EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE DEFECTOS CONGÉNITOS EN LAS ETAPAS PRECONCEPCIONAL, PRENATAL	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	64.96	0.00	0.00	0.00	35.04	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.37
5.	2.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS MUERTES POR DESNUTRICIÓN AGUDA COMO CAUSA BÁSICA EN MENORES DE CINCO AÑOS	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	64.20	0.00	0.00	0.00	35.80	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	3.43
6.	3.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE ALTERACIONES NUTRICIONALES EN GESTANTES Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	64.65	0.00	0.00	0.00	35.35	16.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.62
7.	6.2. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE OTRO SECTORES, LA SOCIEDAD, LOS TERRITORIOS Y LA CIUDADANÍA EN TORNO A LA SALUD Y EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.42
8.	1.1. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE SÍFILIS EN CONJUNTO CON LOS DEMAS CON ACTORES DEL SGSSS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES INDI	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	3.48
9.	3.1. ACCIONES COLECTIVAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN BASADA EN CONSEJERÍA Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE INFANTIL, DE MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	63.63	0.00	0.00	0.00	36.37	16.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.15
10.	4.1. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN EXTERNA EN IPS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS DE	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	2.91
11.	4.2. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO QUE FAVOREZCAN LA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES MÁS ALLÁ DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, CON EL FIN DE FAVORECER LA SALUD Y LA NUTRI	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	91.25	17.00	5.82	0.00	0.00	0.00	2.93	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.81
12.	5.1. ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA.	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.53

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7830 16 Asistencia: Infancia imparable Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
13.	5.2. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE (SAFL) DEL ENTORNO LABORAL.	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	35.33	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.31
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									41.79		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7831 17 Saneamiento salud ambiental Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	2.2. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TERRITORIO URBANO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA LOS	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	42.74	0.00	0.00	0.00	57.26	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	41.00	2.47
2.	2.3. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TERRITORIO RURAL PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA LOS E	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	44.20	0.00	0.00	0.00	55.80	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	34.00	0.56
3.	3.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO DE IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD.	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	54.14	0.00	0.00	0.00	45.86	17.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	28.00	0.02
4.	3.2. EJECUTAR LAS ACCIONES DEL CENTRO DE ZONOSIS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS DE IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD.	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	52.00	0.00	0.00	0.00	48.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.04
5.	3.3. DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ZONOSIS EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS.	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	35.56	0.00	0.00	0.00	15.16	25.00	0.00		0.00		49.28		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.11
6.	3.4. ACCIONES PARA LA VIGILANCIA INTEGRADA DE LA RABIA.	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	62.39	0.00	0.00	0.00	37.61	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.79
7.	4.1.APLICAR VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA EN EL DISTRITO CAPITAL PARA ALCANZAR LA COBERTURA DEL 80%.	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	58.23	0.00	0.00	0.00	41.77	29.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	51.00	1.74
8.	4.2. GESTIONAR EL TRATAMIENTO ANTIRRÁBICO HUMANO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN EXPUESTA A LA RABIA EN EL DISTRITO CAPITAL.	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	41.00	0.53
9.	7.1. IMPLEMENTAR LA LÍNEA DE AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA, PARA APORTAR EN LA REDUCCIÓN LA MORTALIDAD POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO PM2.5.	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	60.08	0.00	0.00	0.00	39.92	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	1.47
10.	8.1. IMPLEMENTAR UNA VIGILANCIA CENTINELA DE EVENTOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES PARA MONITOREAR EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA CIUDAD EN EL MARCO DE UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	67.01	0.00	0.00	0.00	32.99	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.11
11.	6.1 REALIZAR LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	56.19	0.00	0.00	0.00	43.81	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.64
12.	5. 1. PLANEAR, EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS SOBRE LOS CUALES SE VERI	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	52.58	0.00	1.67	0.00	39.41	19.00	0.93		5.41		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	41.00	22.92
13.	5.2. FACILITAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A MEDIDAS SANITARIAS, DURANTE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.21

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7831 17 Saneamiento salud ambiental Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
LOS ESTABLECIMIENTOS DEL D.C .																														
14.	5.3. DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL, ASÍ COMO PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	17.00	7.60	0.00	9.27	0.00	21.15	25.00	29.96		15.48		11.13		3.54		0.00		0.00		100.00	42.00	9.02	
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	43.64

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7832 17 Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1. IMPLEMENTAR PROCESOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LAS DIFERENTES MODALIDADES PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO.	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	86.28	0.00	0.00	0.00	13.72	43.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	19.75
2.	1.2. REALIZAR PROCESOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIOS QUE PERMITAN LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS VÍNCULOS, EL TEJIDO SOCIAL Y LA COHESIÓN SOCIOCULTURAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	53.99	0.00	0.00	0.00	46.01	53.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	54.00	20.91
3.	1.3. FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO Y COMO APUESTA PARA LA RECONCILIACI	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	61.23	0.00	0.00	0.00	38.77	21.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	15.37
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		56.02	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7833 20 Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 41 Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	1.1. ACCIONES COLECTIVAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN, PARA LA GARANTÍA DE LA SALUD DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES EN LOS 20 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL.	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	48.29	0.00	0.00	0.00	51.71	34.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	8.86	
2.	1.2. IMPLEMENTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA MUJERES EN TODAS SUS DIVERSIDADES.	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	44.00	29.45	
3.	2.1. ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL BORDAJE INTEGRAL EN SALUD A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL.	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00	33.27	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.58	
4.	3.1. DESARROLLAR ACCIONES PSICOSOCIALES EN SALUD Y GESTIÓN INTERSECTORIAL, A TRAVÉS DE CANALES NO PRESENCIALES (LÍNEAS Y PLATAFORMAS) A LAS VIOLENCIAS.	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	10.14	0.00	0.00	0.00	89.86	33.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	6.76	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.65	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7834 18 Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	3.1 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA HOSPITALES UNIVERSITARIOS	9.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	73.00	7.08
2.	2.2 DISEÑAR UN LINEAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD A TRAVÉS DE UN ESTUDIO PARA IDENTIFICAR COMO SE GESTIONA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA INSTITUCIÓN Y CREAR	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	1.9 PRESTAR LA ASESORÍA PROFESIONAL, TÉCNICA Y OPERATIVA REQUERIDA PARA DESARROLLAR LAS OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN, PRODUCCIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO ENFOCADO A LA TRANSFORMACIÓN D	36.65	44.09	0.00	7.36	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00	13.00	0.00		15.55		0.00		0.00		17.45		0.00		100.00	23.00	8.43
4.	1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DE INNOVACIONES EN SALUD, EN LA CIUDAD.	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	1.5 CREAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA INSTITUCIONAL. PUBLICAR DOS REVISTAS (INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y REVISTA DEL BANCO DE SANGRE) Y DOS BOLETINES DE	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	1.6 FOMENTAR LAS INVESTIGACIONES DE INTERÉS DE LA CIUDAD, SEGÚN LA AGENDA DEL PLAN DE DESARROLLO (PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, DISCRIMINAR ENTRE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA SDS O INVESTIGACIONES	37.94	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	84.00	31.87
7.	1.8 RENOVAR Y FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD EN LA CIUDAD.	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	61.00	1.20
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		48.58	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7835 19 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL SEM A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS NUSE 123 Y OTRAS VÍAS DE ACCESO	5.81	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	71.00	4.13
2.	FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS INCIDENTES EN SALUD Y LA COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD FRENTE A SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES REPORTADAS POR LA COMUNIDAD O LAS AUTOR	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	FORTALECER LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA, A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTRAS MODALIDADES DE SELECCIÓN CON	55.38	71.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	55.38
4.	FORTALECER LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA, A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTRAS MODALIDADES DE SELECCIÓN CON	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.58
5.	FORTALECER LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA, A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTRAS MODALIDADES DE SELECCIÓN CON	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	FORTALECER LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE AGLOMERACIÓN MASIVA DE PÚBLICO DESDE LAS COMPETENCIAS DE SALUD Y LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.02
7.	FORTALECER ACTIVIDADES QUE PERMITAN CREAR EL CENTRO LOGÍSTICO Y DE RESERVA DEL SECTOR SALUD PARA LA RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO CAPITAL, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 507 DE	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	16.00	0.21
8.	OPERAR Y GESTIONAR LA TOTALIDAD DE LOS INCIDENTES EN SALUD REPORTADOS AL CENTRO OPERATIVO DEL CRUE A TRAVÉS DE LA LÍNEA 123 U OTRAS VÍAS DE ACCESO AL SEM	13.09	5.00	0.00	65.00	0.00	11.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	9.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.00		100.00	37.00	4.84
9.	OPERAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS Y ACCIONES EN SALUD A NIVEL DISTRITAL PARA LA RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE EN EL DISTRITO CAPITAL	0.15	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00		0.00		28.00		0.00		0.00		4.00		100.00	85.00	0.13
10.	OPERAR Y GESTIONAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	72.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	14.00	0.01
11.	OPERAR Y GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	0.33	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		13.00		100.00	37.00	0.12

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7835 19 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	DE FORMACIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE PARA EL PERSONAL DE SALUD Y LA COMUNIDAD EN GENERAL, INCLUYENDO EL COMPONENTE DE SALUD MENTAL.																												
12.	OPERAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.	0.17	42.00	0.00	16.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	37.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00		100.00	58.00	0.10	
13.	OPERAR Y GESTIONAR LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN A CADA INTEGRANTE DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM	0.13	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		17.00		100.00	83.00	0.11	
14.	OPERAR Y GESTIONAR EL PROYECTO EN SUS DIFERENTES COMPONENTES GARANTIZANDO EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD, LA OBTENCIÓN DE LOS PRO	0.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.05	
15.	OPERAR Y GESTIONAR EL PROYECTO EN SUS DIFERENTES COMPONENTES GARANTIZANDO EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD, LA OBTENCIÓN DE LOS PRO	0.69	0.00	0.00	27.00	0.00	28.00	9.00	12.00	0.00	0.00	0.00	58.00	21.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.00		100.00	67.00	0.46	
16.	OPERAR Y GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO Y RESPUESTA DEL SECTOR SALUD INCLUYENDO EL COMPONENTE DE SALUD MENTAL.	0.14	0.00	0.00	29.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	46.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8.00		100.00	48.00	0.07	
17.	OPERAR Y GESTIONAR LA ASESORÍA, PREPARACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO (GRDCH)A LAS	0.15	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	43.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00		100.00	49.00	0.07	
18.	OPERAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISIÓN MÉDICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.03	
19.	OPERAR Y GESTIONAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN AGLOMERACIONES DE PÚBLICO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DISTRITAL VIGENTE.	0.14	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.00		100.00	46.00	0.06	
20.	OPERAR Y GESTIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA	0.05	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00		100.00	46.00	0.02	
21.	OPERAR Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE AGLOMERACIÓN MASIVA DE PÚBLICO DESDE LAS COMPETENCIAS DE SALUD Y LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0.06	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32.00		100.00	54.00	0.03	
22.	OPERAR EL VEHÍCULO DE EMERGENCIA ASIGNADO, REALIZANDO DE MANERA OPORTUNA EFICIENTE Y SEGURA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS O CONTRATISTAS O ELEMENTOS QUE REQUIERAN SER TRASLADADOS PARA APOY	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	22.00	0.05	
23.	FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL SEM, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 793 DE 2018	19.09	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	4.77	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										72.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7904 14 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.5 (DOTACIÓN) IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA "HOSPITAL GENERADOR DE VIDA" Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.28
2.	1.10. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL	5.96	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.98
3.	1.1 (T.H.) DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISITRATIVA Y TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE SALUD AJUSTADO EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN LAS EAPB AUT	3.96	29.51	0.00	5.16	0.00	13.52	25.00	1.94	0.00	0.97	0.00	31.81	25.00	0.00		0.00		0.00		17.09		0.00		0.00		100.00	50.00	1.98
4.	1.3 (T.H.) REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS REDES INTEGRALES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS EPS HABILITADAS Y A LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	0.56	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	25.00	0.00		0.00		0.00		41.83		0.00		0.00		100.00	50.00	0.28
5.	1.4 (T.H.) REALIZAR ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE LA RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTES Y LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTES, EN EL MARCO	0.59	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	25.00	0.00		0.00		0.00		38.70		0.00		0.00		100.00	50.00	0.30
6.	1.6 (T.H.) REALIZAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE LA RED DISTRITAL DE SANGRE EN LOS BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRASFUSIÓN SANGUIA EN EL D.C EN EL MARCO DEL MODELO DE	0.67	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	25.00	0.00		0.00		0.00		37.59		0.00		0.00		100.00	50.00	0.34
7.	1.8. DESARROLLAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE CONTRIBUYEN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN SALUD EN BOGOTÁ, Y AL FORTALECIMIENTO DE LOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA RED INTEGRAD	6.93	55.08	0.00	1.78	0.00	2.19	25.00	0.70	0.00	0.00	0.00	5.34	25.00	10.90		6.22		1.67		3.20		7.85		5.07		100.00	50.00	3.47
8.	1.11. REALIZAR ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE REMUNERACIÓN -PAGO POR DESEMPEÑO PRESUPUESTO GLOBAL PROSPECTIVO POR ACTIVIDAD FINAL (PPPD-PGA) EN LA RED DISTRITAL DE SERVICIO	0.10	66.12	0.00	0.00	0.00	31.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.05
9.	1.9. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CALL CENTER COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.	26.45	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	13.23
10.	1.12. DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD, EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LA RED DISTRITAL DE SERVICIOS DE	8.12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	4.06

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7904 14 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
11. 1.13 DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO DE SALUD	0.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.12
12. 1.2 (DOTACIÓN) REALIZAR ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LAS EAP	1.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	67.00	0.96
13. 2.1 (T.H) DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RIAS, EN EL CONTEXTO DEL MODELO DE SALUD EN LAS EAPB AUTORIZADAS PARA OPERAR EN BOGOTÁ Y EN	4.13	48.47	0.00	0.00	0.00	4.86	25.00	0.00	0.00	0.93	0.00	15.34	25.00	0.00		0.00		0.00		30.40		0.00		0.00		100.00	50.00	2.07
14. 2.2. (T.H) EN EL MARCO DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, IMPLEMENTAR CON EL 100% DE LAS EAPB UNA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	0.19	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. 3.1. DEFINIR Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES A LAS MUJERES EN EDAD FERTIL, GESTANTES Y RECIÉN NACIDOS DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DE LAS R	2.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.27
16. 3.2. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS DE: PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y EL HITO 1 DE LA	4.17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.09
17. 3.3. DISEÑAR, IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL EVENTO ASMA Y DAR CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL EVENTO EPOC, EN LA RUTA INTEGRAL DE ATENC	1.42	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.71
18. 3.4. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS CARDIO CEREBRO VASCULAR Y METABOLICO EN LAS 4 SUBREDES INTEG	1.96	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.98
19. 3.5. MONITOREAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA ADHERENCIA A LA RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y GUIAS DE MANEJO Y PROTOCOLOS CLÍNICOS SEGÚN EL TIPO DE VIOLENCIA Y PATOLOGÍA DE LA V	3.19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.60
20. 3.6. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCION DE PROBLEMAS MENTALES Y TRA	5.81	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.91
21. 3.7. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCION DE TRASTORNOS DEL COMPORTAM	1.29	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.65
22. 3.8. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS DE NUTRICIÓN, QUE INCLUYA FACTORES DE RIESGO NUT	1.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.85
23. 2.3 (DOTACIÓN) REALIZAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO	1.51	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		7.74		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7904 14 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	DE LAS EAPB AUTORIZADAS PARA OPERAR EN BOGOTÁ Y DE LAS IPS PRIORIZADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN																												
24.	4.1 IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN MEDICINA TRANSFUSIONAL, MEDIC	14.72	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
25.	5.2. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA ARTICULACIÓN, COMPLEMENTARIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA RED DISTRITAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL MODELO DE SALUD	1.82	92.52	0.00	7.48	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.91	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									42.79	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7911 9 Recuperación y puesta en funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios CHSJD Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADMINISTRAR EL CHSJD DE ACUERDO AL PEPM Y DEMÁS INSTRUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RESTAURACIONES Y NUEVAS OBRAS	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.36		3.64		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CHSJD, DE ACUERDO CON EL PLAN DE INTERVENCIÓN, ACTUALZIACIÓN, OBRA NUEVA, RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									0.00	

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7557 Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

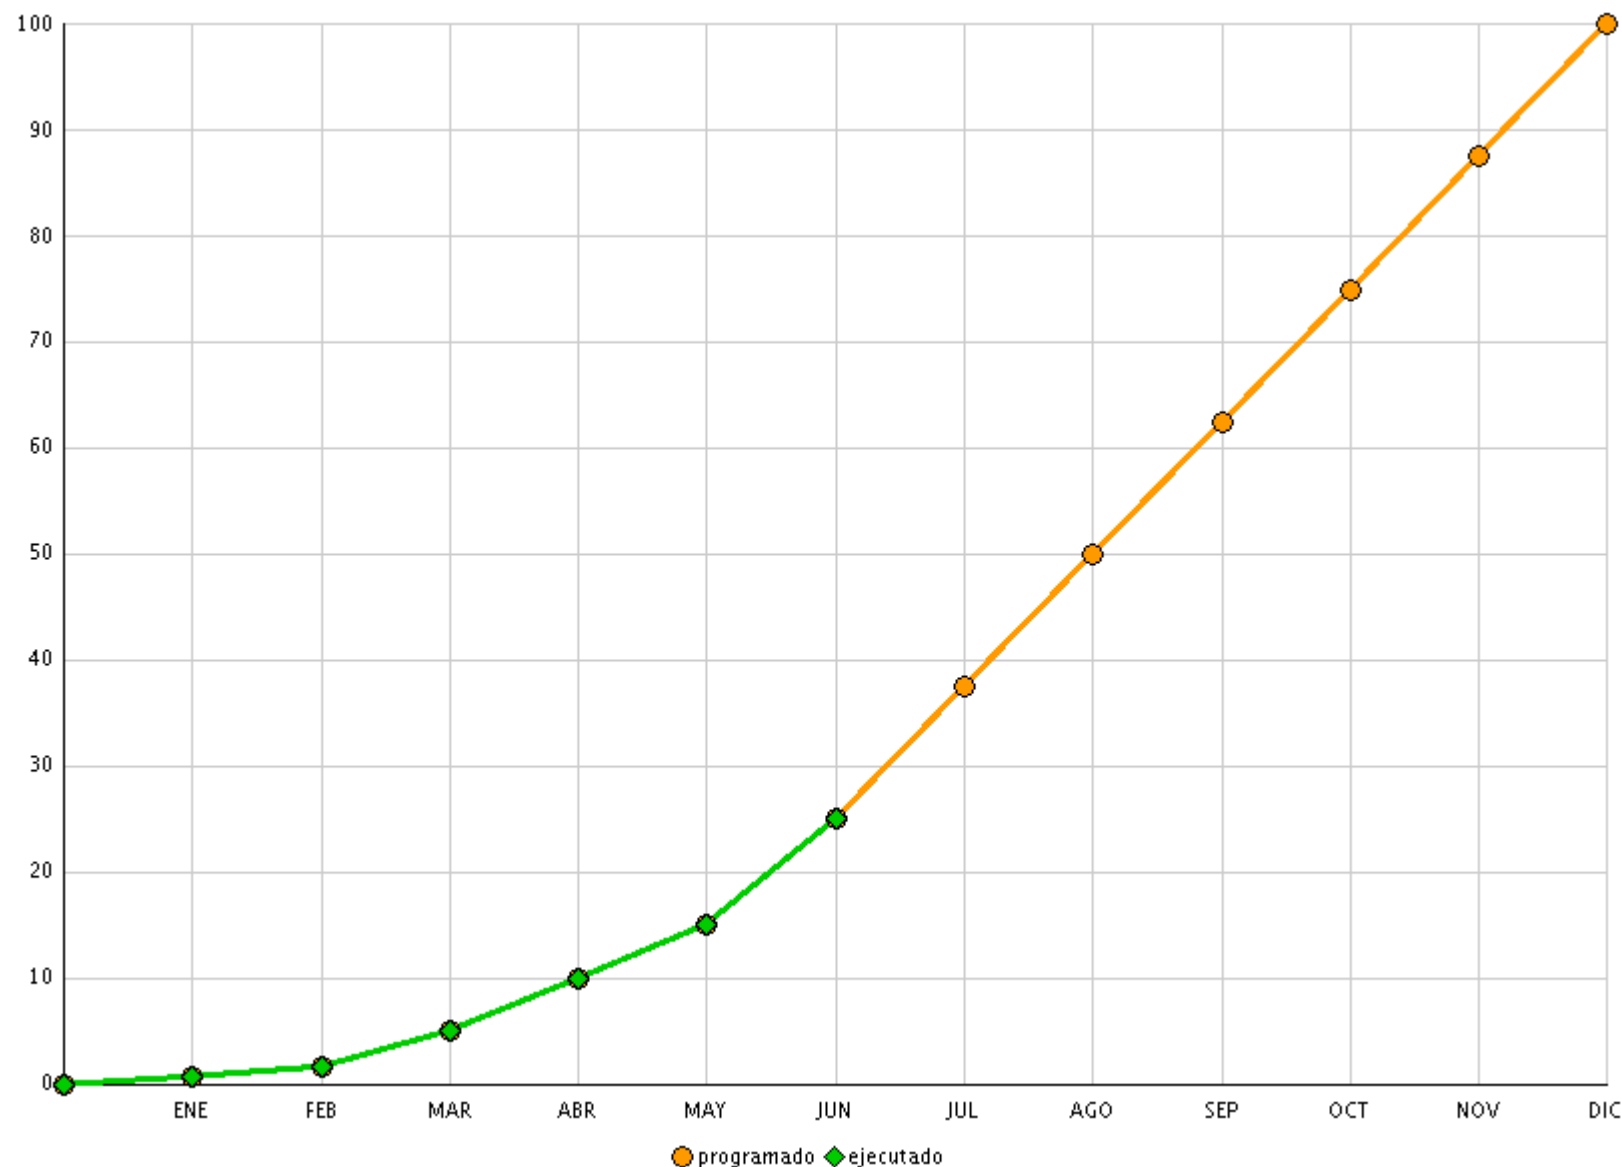


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.70	1.75	5.00	10.00	15.00	25.00	37.50	50.00	62.50	75.00	87.50	100.00
Ejecutado	0.70	1.75	5.00	10.00	15.00	25.00						

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7558 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

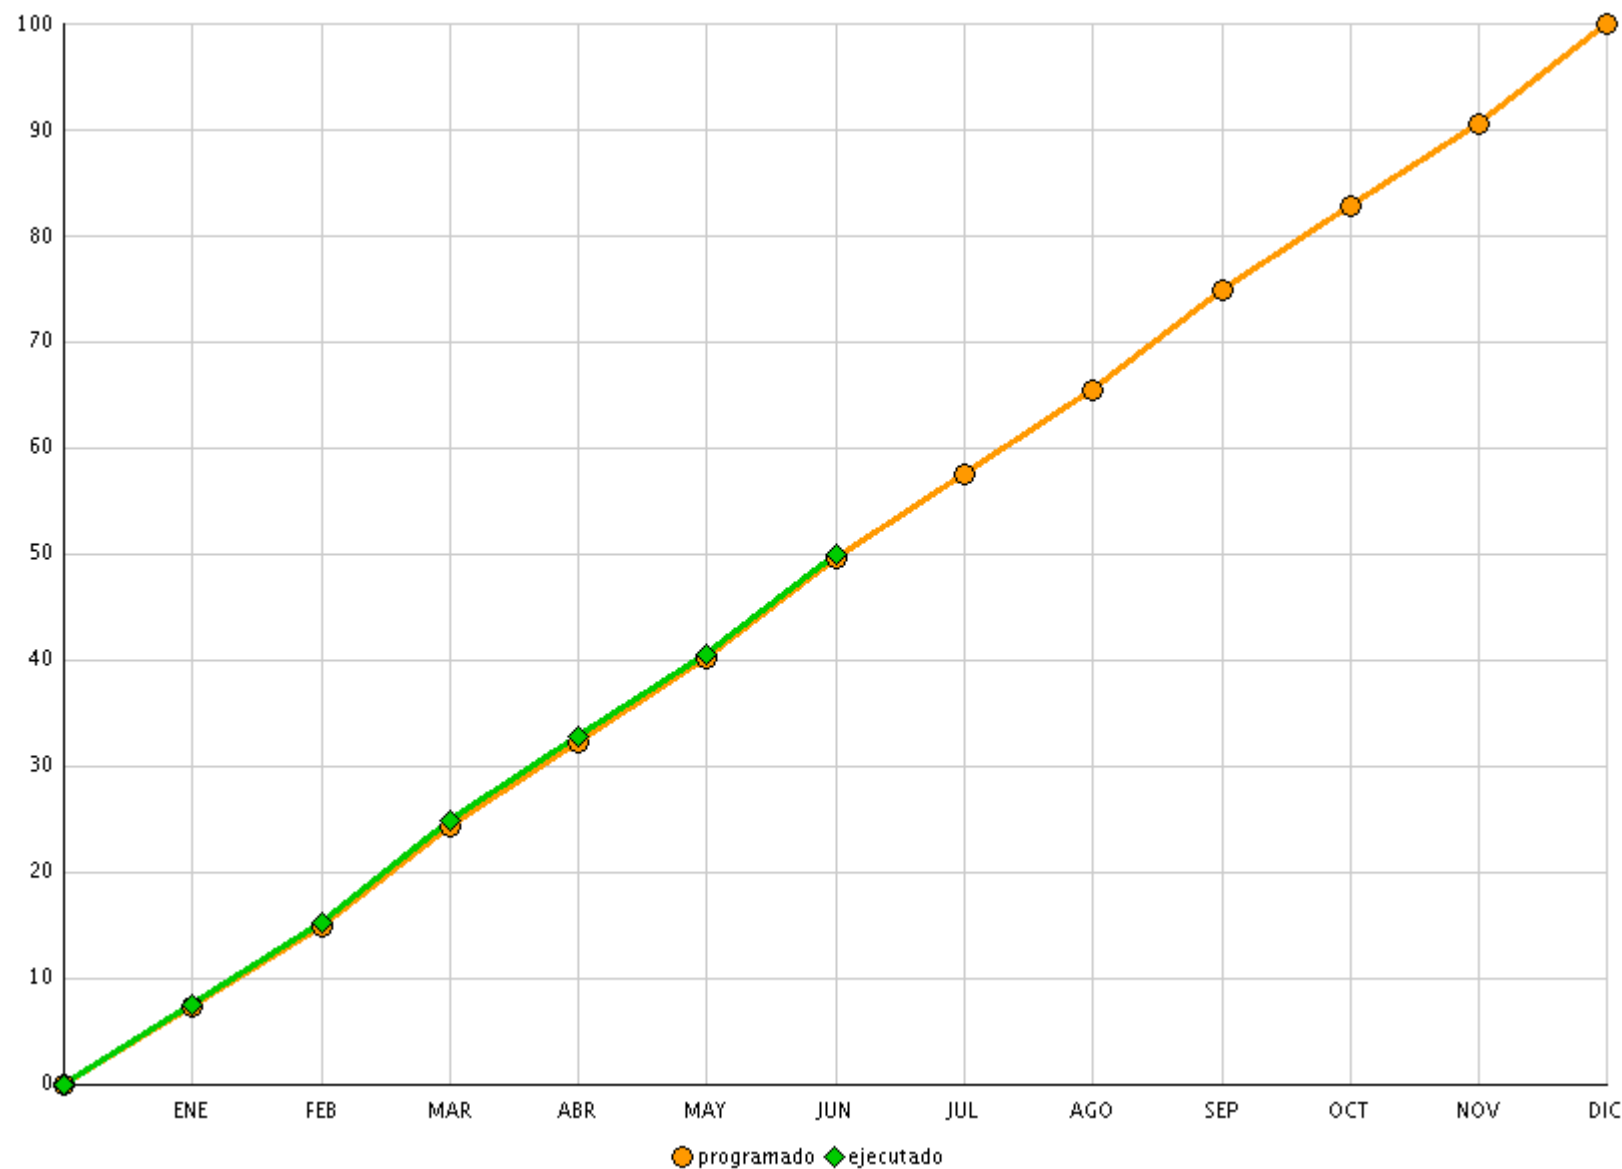


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.26	14.93	24.39	32.17	40.14	49.65	57.48	65.46	74.93	82.84	90.62	100.00
Ejecutado	7.51	15.33	24.99	32.77	40.55	49.98						

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7559 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá

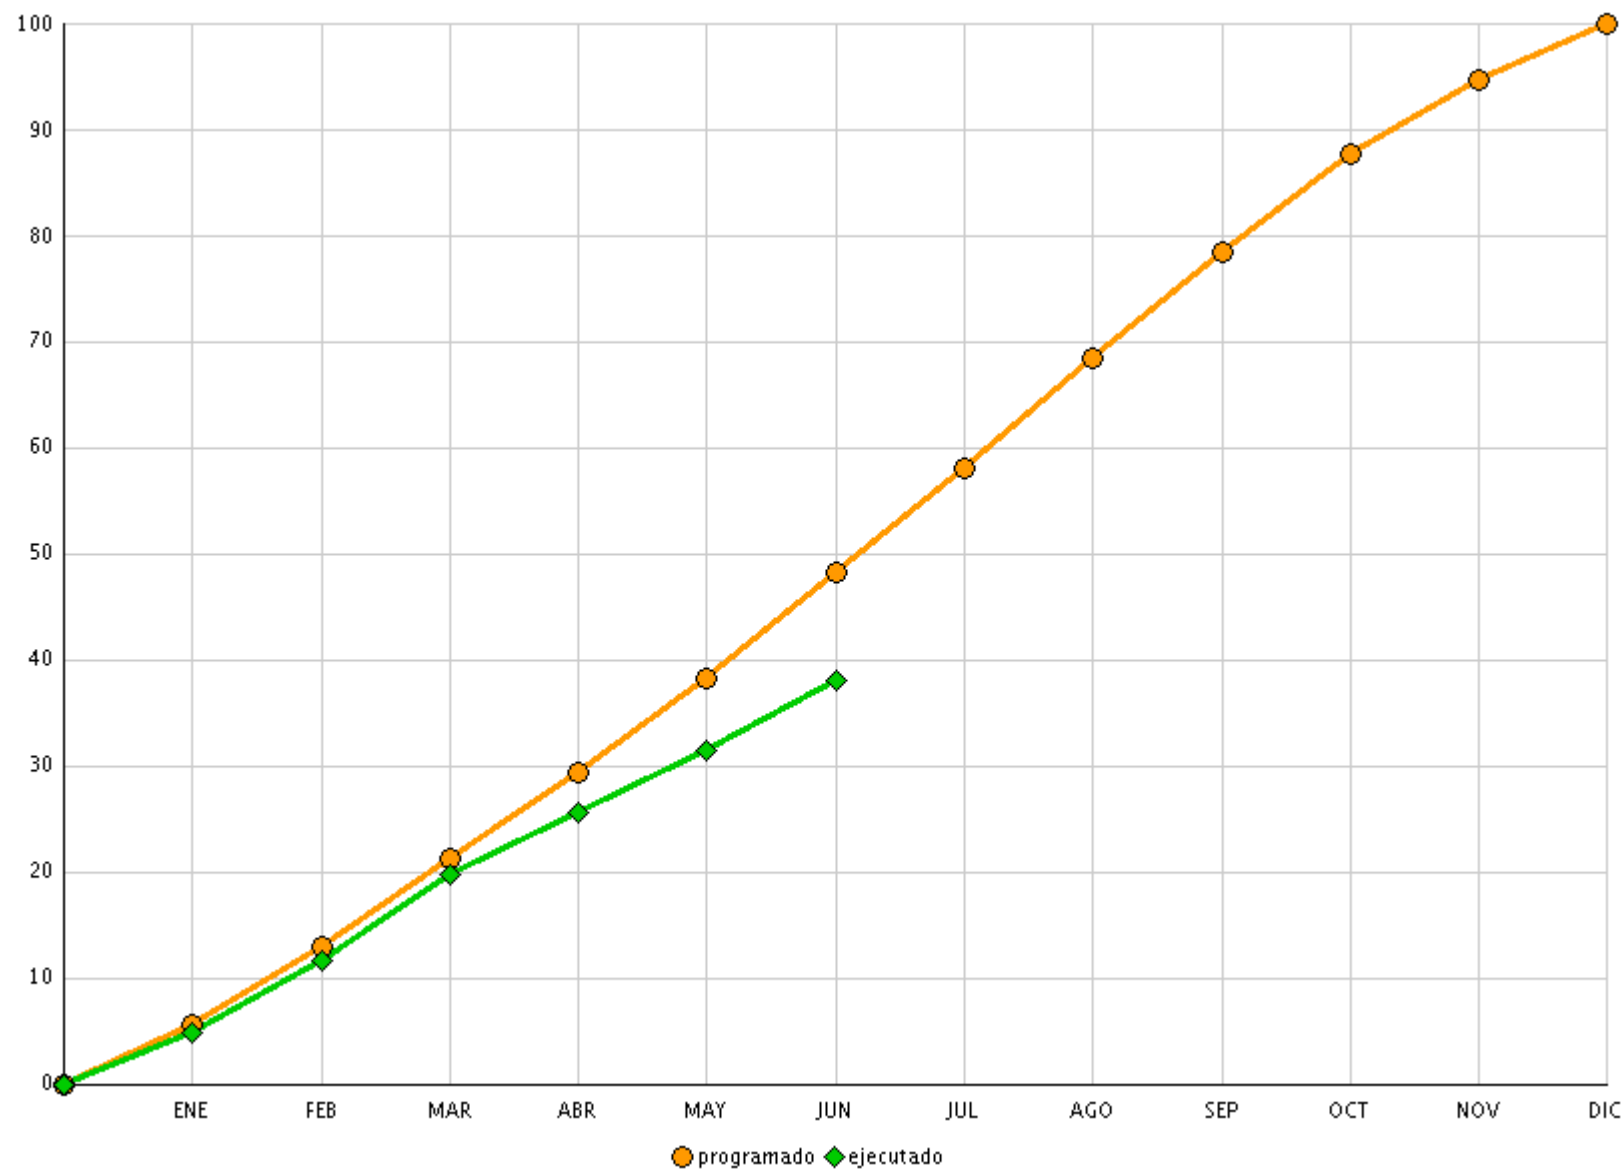


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.61	13.06	21.35	29.48	38.34	48.28	58.15	68.54	78.41	87.83	94.72	100.00
Ejecutado	4.93	11.76	19.82	25.66	31.56	38.15						

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7566 Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

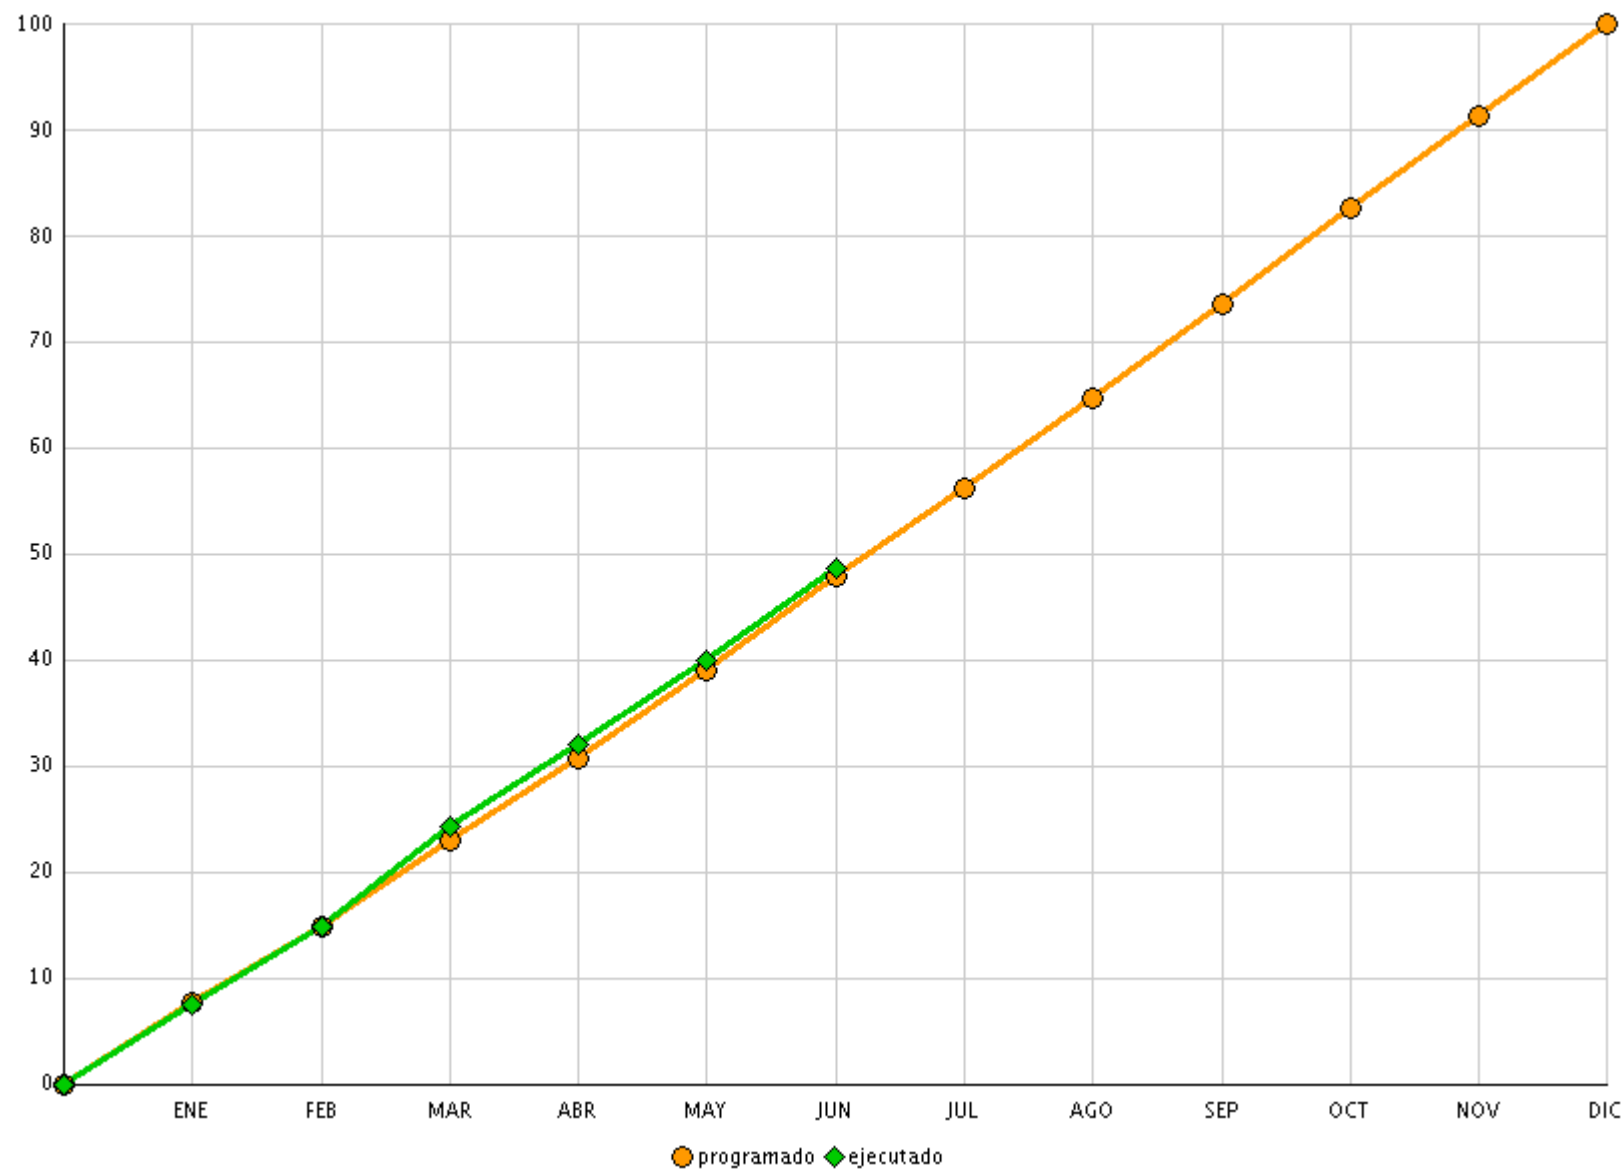

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.73	14.89	23.05	30.82	39.02	47.89	56.23	64.78	73.57	82.62	91.34	100.00
Ejecutado	7.62	14.99	24.36	32.03	40.06	48.76						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

7557 39 Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
2.	DESARROLLAR SOFTWARE Y SOPORTE PARA EL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO ESCOLAR -SURE- (OPS)	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
3.	REALIZAR LA ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO CON LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
4.	PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL IDIGER QUE PERMITA LA EFECTIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES	6.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
5.	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
6.	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN.	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
7.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	10.00	3.00
8.	INTERVENTORÍA PARA OBRAS DE MITIGACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	10.00	2.00
9.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA EL REASENTAMIENTO DE FAMILIAS.	6.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
10.	COMPRA DE PREDIOS A FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00
11.	DISEÑAR UN INSTRUMENTO FINANCIERO DE RETENCIÓN INTENCIONAL O TRANSFERENCIA DEL RIESGO, PARA CADA UNO DE LOS ESCENARIOS DEL RIESGO PRIORIZADOS EN BOGOTÁ D.C	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
12.	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LA NACIONALIDAD DEL IDIGER.	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60
13.	REALIZAR JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORIENTADAS A EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAMBIOS CULTURALES ORGANIZACIONALES	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
14.	PROPICIAR ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EN SEGUIMIENTO	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										25.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7558 26 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADQUIRIR BIENES Y DE SERVICIOS CON OPERADORES	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	5.00
2.	REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
3.	REALIZAR AJUSTES RAZONABLES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ENTIDAD	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
4.	ADMINISTRAR, SOPORTAR, GESTIONAR Y MANTENER LOS SERVICIOS DEL COMPUTO Y HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN POR DEMANDA.	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	3.50
5.	BRINDAR Y MANTENER EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y CONECTIVIDAD.	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	3.50
6.	ADMINISTRAR, SOPORTAR, GESTIONAR Y MANTENER LA MESA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	3.00
7.	ADELANTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANTA DE PERSONAL Y DEMÁS NOVEDADES DE TALENTO HUMANO.	5.00	6.00	9.00	6.00	7.00	7.00	9.00	8.33	8.33	12.00	8.33	12.00	8.33	9.33		8.33		7.00		7.00		8.33		8.68		100.00	49.99	2.50
8.	ASESGURAR EL PAGO DE RIESGOS PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTREN EN LOS NIVELES DE RIESGO IV Y V PARA GARANTIZAR SU COBERTURA ANTE ALGÚN ACCIDENTE LABORAL.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
9.	ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL MIPG	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	3.00
10.	MONITOREO A PLANES DE ACCIÓN Y PLANES ESTRATÉGICOS DECRETO 612 DE 2018 Y PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.00
11.	CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCIÓN DENTRO DEL MARCO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, PREDIAL Y DE DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD.	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
12.	EVALUAR DE MANERA INDEPENDIENTE Y OBJETIVA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL MIPG Y LOS ROLES DESIGNADOS POR LEY.	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
13.	RECEPCIONAR, RADICAR Y TRAMITAR LAS COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS Y EXTERNAS ENVIADAS DE LA ENTIDAD	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
14.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES PGD Y PINAR	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.50
15.	PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL IDIGER.	5.00	4.00	5.00	8.00	9.00	10.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00		10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		100.00	50.00	2.50
16.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ACERCA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS CLIMÁTICA.	5.00	4.00	5.00	8.00	9.00	10.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00		10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		100.00	50.00	2.50
17.	DISEÑAR Y PROMOVER ACCCIONES DE MEJORA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ASOCIADOS AL BUEN	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7558 26 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
SERVICIO A LA CIUDADANIA Q CUMPLAN CON LA EXPECTATICA Y EXPERIENCIA DEL SERVICIO																															
18.	MANTENER INFORMADO A LOS COLABORADORES SOBRE LO RELACIONADO CON LA POLÍTICA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA (CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PQRS, RESULTADOS DE PERCEPCIÓN, DE LA ENTIDAD, ENTRE OTROS.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.98

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7559 21 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 30 Eficiencia en la atención de emergencias

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PROMOVER LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE RESPUESTA-EIR EN 15 ENTIDADES DEL SDGR-CC	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	6.67	6.00	6.67	6.00	13.33	6.00	13.33		20.00		13.33		6.67		6.67		6.66		100.00	18.00	1.44
2.	BRINDAR ASESORÍA A LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC FRENTE ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (POR DEMANDA)	5.00	8.33	0.00	8.33	12.33	8.33	12.66	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
3.	INCORPORACIÓN DE PROTOCOLOS, GUÍAS, PLANES, MANUALES, ENTRE OTROS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE RESPUESTA EN DESARROLLO DELA ACTUALIZACIÓN DE LA EDRE	6.00	0.00	0.00	11.00	5.00	11.00	11.00	11.00	5.00	11.00	4.00	11.00	4.00	11.00		11.00		11.00		11.00		1.00		0.00		100.00	29.00	1.74
4.	PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE CASO EN LA MESAS DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES MENSUALES.	2.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	0.80
5.	DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	3.00	0.00	0.00	11.00	5.00	11.00	10.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		1.00		0.00		100.00	37.00	1.11
6.	FORMULAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y DE ACTIVIDADES SOCIALE	5.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	5.00	16.67	16.67	0.00		16.67		0.00		0.00		16.65		0.00		100.00	71.68	3.58
7.	ELABORACIÓN DE GUÍAS, METODOLOGÍAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	8.00	0.00	8.00	20.00		0.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	26.00	0.78
8.	ELABORAR UN DOCUMENTO - GUIA DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN.	3.00	0.00	0.00	11.00	6.00	11.00	11.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		1.00		0.00		100.00	32.00	0.96
9.	ELABORAR DOCUMENTO QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SDGR-CC	3.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		1.00		0.00		100.00	37.00	1.11
10.	ELABORAR DOCUMENTOS QUE APORTEN ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA.	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.00
11.	CAPACITAR EN PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y COMUNIDAD	5.00	4.00	3.72	6.00	7.90	6.70	10.20	8.33	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.52		14.30		16.70		4.80		2.65		100.00	21.82	1.09
12.	REALIZAR UN ENCUENTRO DE BRIGADAS DE EMERGENCIA DE CAM BOGOTÁ	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	0.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13.	REALIZAR UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN GESTIÓN DEL RIESGO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14.	REALIZAR UN SIMULACRO DISTRITAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	1.00	0.02
15.	DISEÑAR Y/O ACTUALIZAR CONTENIDOS DE TRES HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA CAPACITAR Y ENTRENAR PERSONAS, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES	3.00	8.33	0.00	8.33	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	2.00	0.06
16.	PROMOVER LA CREACIÓN TRES NUEVOS CAM Y FORTALECER LOS EXISTENTES	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.50
17.	REVISAR Y EVALUAR PLANES DE EMERGENCIA Y	4.00																								100.00	49.98	2.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

7559 21 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
CONTINGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO		8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37				
18. REVISAR Y EVALUAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS PARQUES DE DIVERSIONES, ATRACCIONES Y DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
19. REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL Y PUERTAS ELÉCTRICAS	4.00	1.23	1.23	8.33	8.19	10.00	13.56	10.00	19.00	10.00	14.10	5.10	11.70	9.33		10.00		10.00		9.33		10.00		6.68		100.00	67.78	2.71
20. GARANTIZAR INMUEBLE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE RESERVA	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		100.00	50.00	2.00
21. GARANTIZAR LA RESPUESTA A EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y/O DESATRES DE MANERA ARTICULADAY COORDINADA, APLICANDO LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE RESPUESTA REQUERIDOS.	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		100.00	50.00	3.00
22. OPERAR LA CITEL DE IDIGER, LOS 365 DIAS DEL AÑO, LAS 24 HORAS DEL DIA, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED DISTRITAL DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		100.00	50.00	2.00
23. ENTREGAR SUMINISTROS Y/O APOYO CON SERVICIOS Y PRESTAR EQUIPOS A LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS, CALAMIDAD O DESASTRE O ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
24. CARACTERIZAR A LAS FAMILIAS AFECTADAS EN LOS EVENTOS DE EMERGENCIA QUE ASÍ SE REQUIERAN Y LA VISITA SOCIAL DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL TRASLADO.	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
25. ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS DE CARÁCTER PECUNIARIO- AHCP, SEGÚN LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
26. ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE A LAS FAMILIAS AFECTADAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CALAMIDAD Y/O DESASTRE.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	1.25
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		38.15		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7566 29 Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR, COMPILAR Y PUBLICAR LA INFORMACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A LOS FENÓMENOS AMENAZANTES CON INFORMACIÓN A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	3.22
2. ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CORRECTA DOCUMENTACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD.	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	6.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	36.00	1.08
3. DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN VISIBILIZAR ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA GEOGRÁFICA A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD.	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	1.44
4. ACTUALIZAR LOS COMPONENTES DE ESCENARIOS DE RIESGO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO -SIRE.	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	1.44
5. LEVANTAR LA INFORMACIÓN, ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA DE LAS CAPAS GEOGRÁFICAS (SI ESTA ES REQUERIDA), INGRESAR LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICOS Y PUBLICAR LA INFORMACIÓN.	4.00	3.00	3.00	5.00	5.00	15.00	15.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00		7.00		15.00		10.00		10.00		100.00	44.00	1.76
6. REALIZAR ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO PARA DIFERENTES FENÓMENOS AMENAZANTES.	15.00	11.00	10.00	9.00	10.00	10.00	9.30	10.00	2.00	7.00	2.00	10.00	1.70	7.00		6.00		8.00		8.00		6.00		8.00		100.00	35.00	5.25
7. FORMULAR, CONTRATAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y CONVENIOS, REALIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	10.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	51.00	5.10
8. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN.	3.00	6.00	6.00	10.00	16.00	10.00	2.00	8.00	5.00	8.00	9.00	9.00	13.00	8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		8.00		100.00	51.00	1.53
9. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE ACTUALIZACIÓN.	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	24.00	9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		9.00		100.00	33.00	0.33
10. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE PLANES PARCIALES.	1.00	0.00	0.00	16.00	8.00	9.00	18.00	8.00	0.00	9.00	7.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	33.00	0.33
11. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS PARA PROYECTOS URBANÍSTICOS	2.00	8.00	3.00	8.00	8.00	8.00	11.00	8.00	11.00	8.00	6.00	8.00	11.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	50.00	1.00
12. ELABORAR DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS PARA EVALUACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, CALAMIDAD, DESASTRE Y POR PETICIONES PARTICULARES.	12.00	6.00	6.00	5.00	5.00	7.00	4.50	7.00	6.00	8.00	8.00	9.00	3.50	8.00		11.00		10.00		10.00		11.00		8.00		100.00	33.00	3.96
13. ELABORAR CERTIFICACIONES DE RIESGO A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL IDIGER Y DE LA INFORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES.	14.00	12.00	13.00	8.00	6.00	8.00	13.00	8.00	11.00	8.00	13.00	8.00	16.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	72.00	10.08
14. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS PARA PROYECTOS PÚBLICOS Y DE PRONUNCIAMIENTOS PARA LOS MISMOS.	4.00	13.00	13.00	8.00	12.00	8.00	30.00	8.00	18.00	8.00	8.00	8.00	27.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		7.00		100.00	108.00	4.32
15. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE AMENAZA RUINA.	3.00	0.00	0.00	2.00	11.00	9.00	13.00	9.00	4.00	9.00	9.00	11.00	2.00	11.00		11.00		11.00		9.00		9.00		9.00		100.00	39.00	1.17
16. PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES CON INFORMACIÓN OPORTUNA, ESTRUCTURADA Y CONSOLIDADA QUE CUENTE CON LA CONFIABILIDAD	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	6.75

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático


7566 29 Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
NECESARIA PARA LA PUBLICACIÓN DE REPORTES EN LOS APP SAB																															
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		48.76	

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7716 Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU

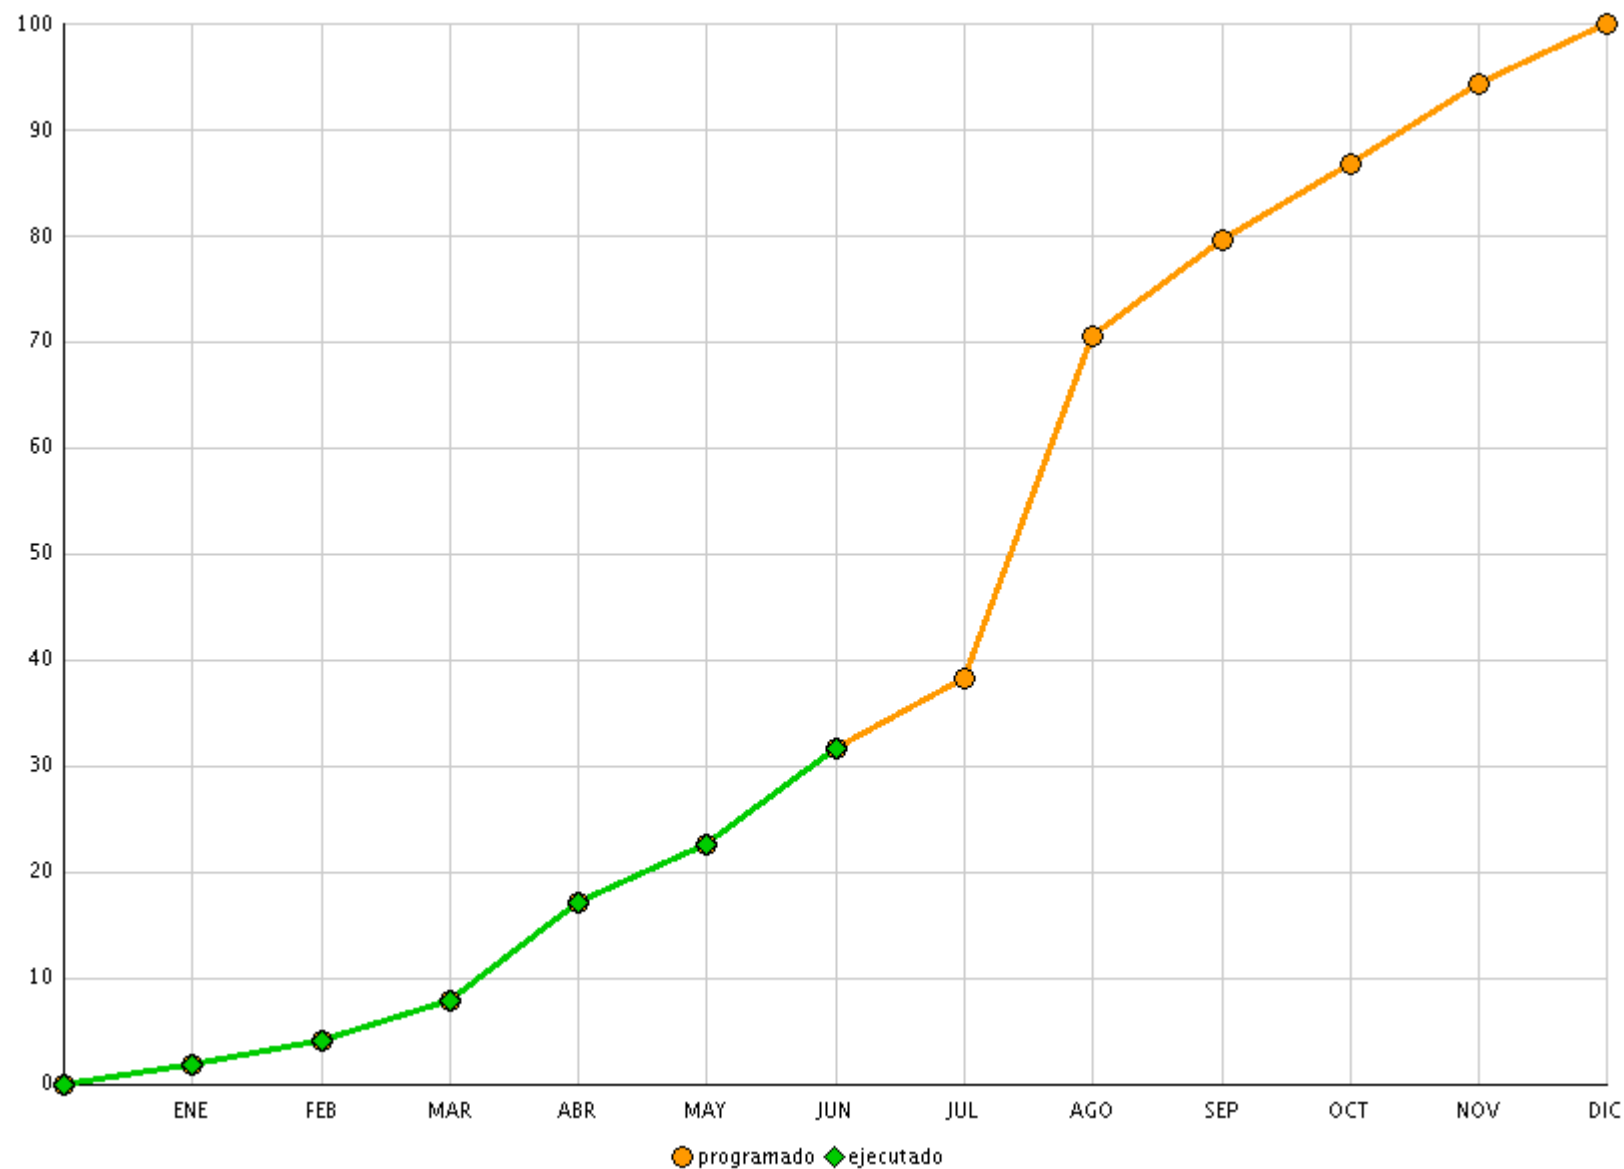


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.95	4.16	7.95	17.19	22.67	31.76	38.26	70.49	79.60	86.73	94.37	100.00
Ejecutado	1.95	4.16	7.95	17.19	22.67	31.76						

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7761 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

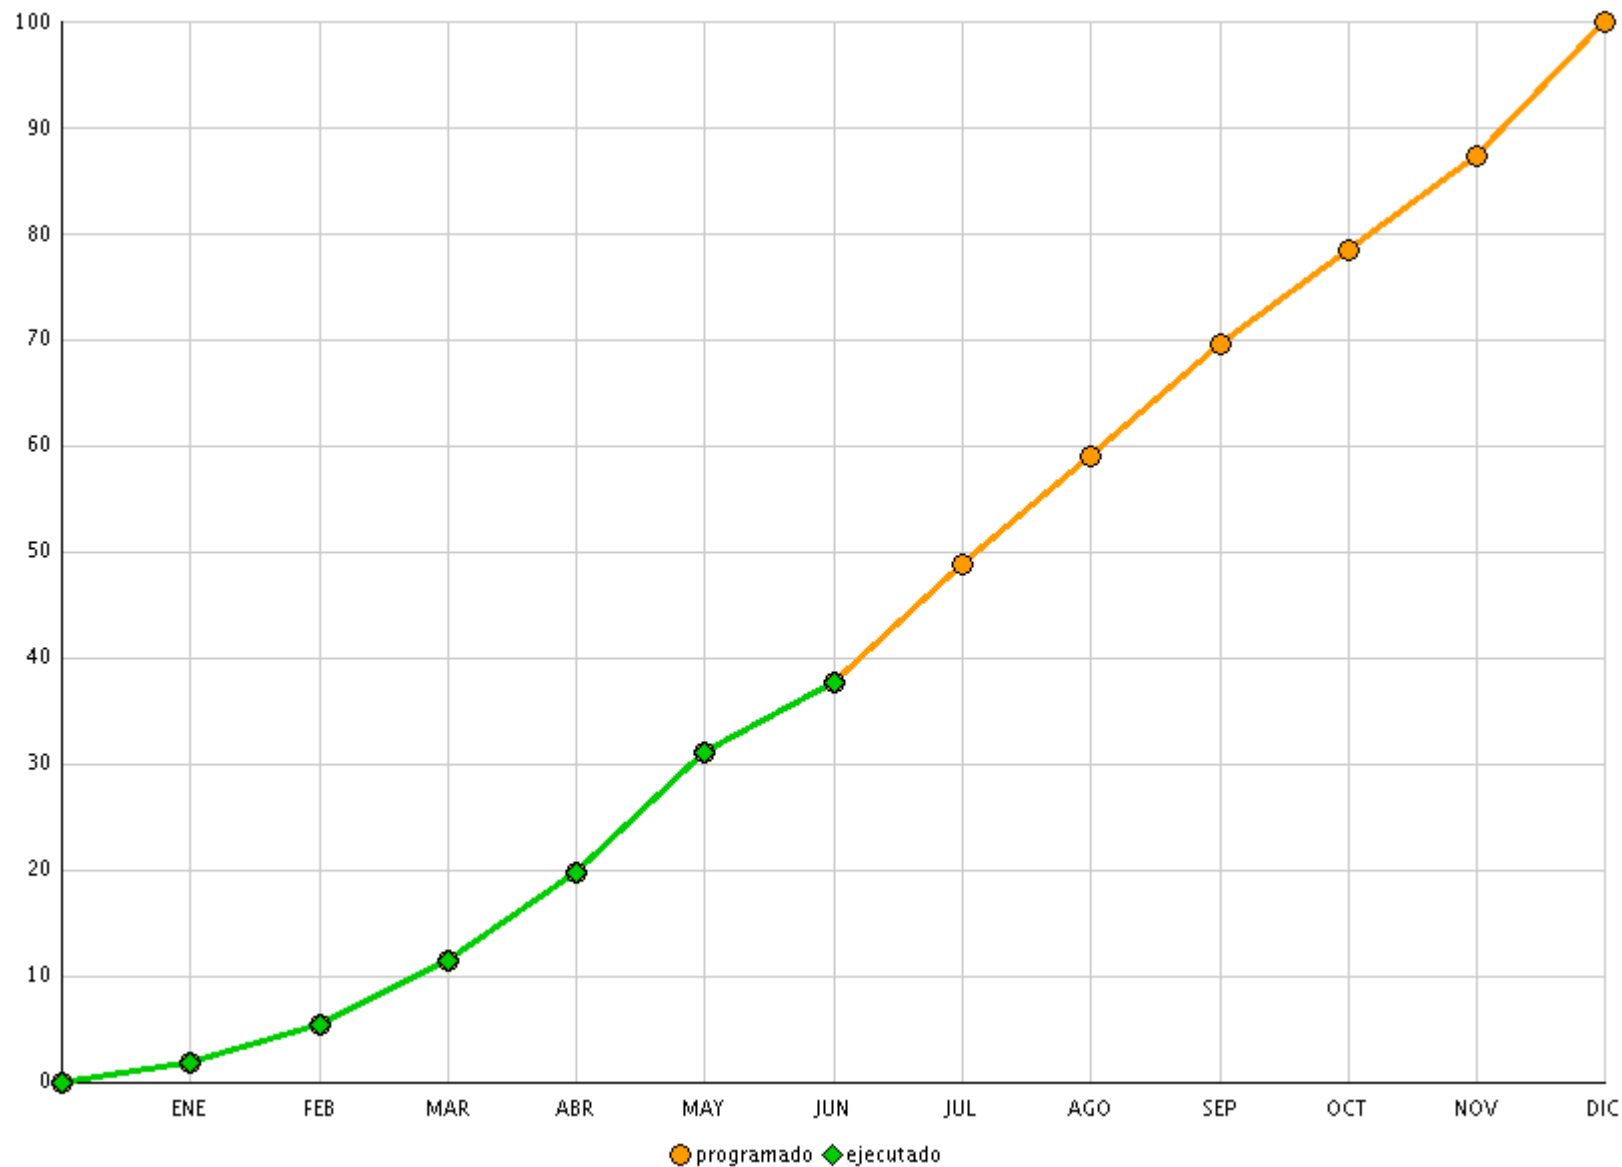


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.80	5.40	11.55	19.85	31.10	37.75	48.85	59.10	69.55	78.50	87.35	100.00
Ejecutado	1.80	5.40	11.55	19.85	31.10	37.75						

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7763 Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

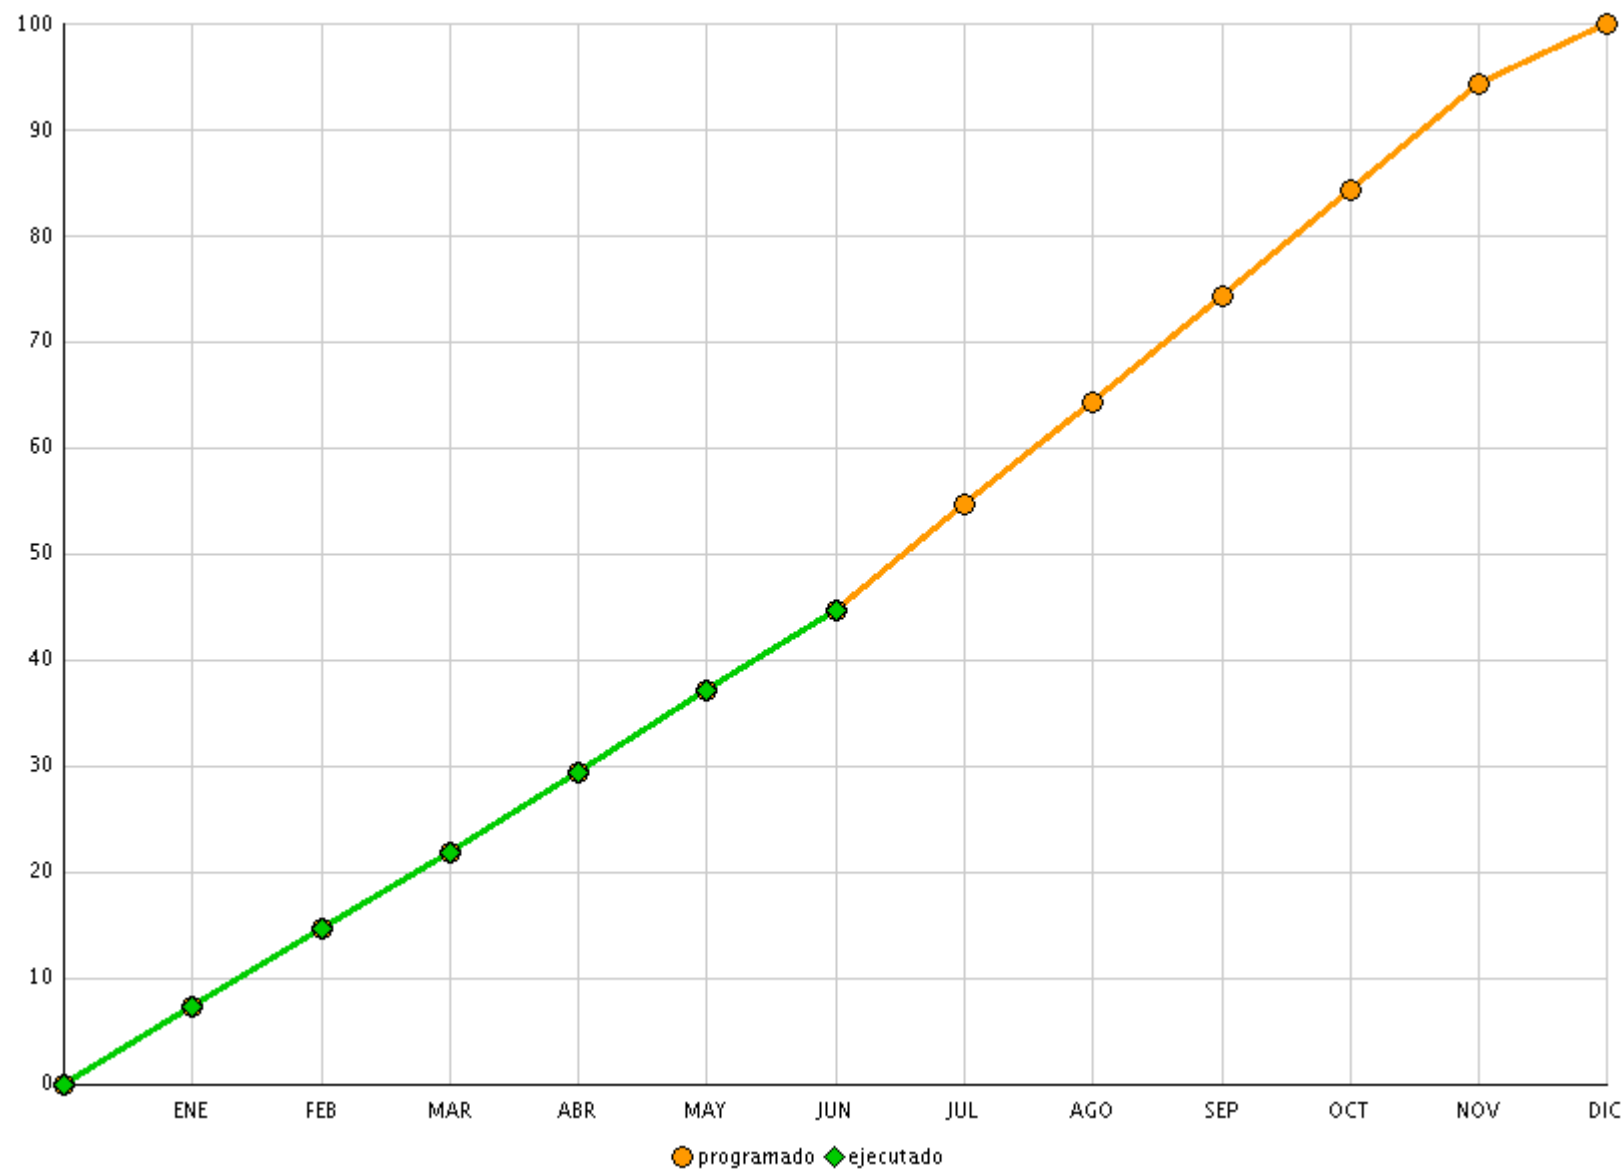


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.30	14.65	21.95	29.50	37.10	44.80	54.75	64.40	74.40	84.40	94.40	100.00
Ejecutado	7.30	14.65	21.95	29.50	37.10	44.80						

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7779 Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

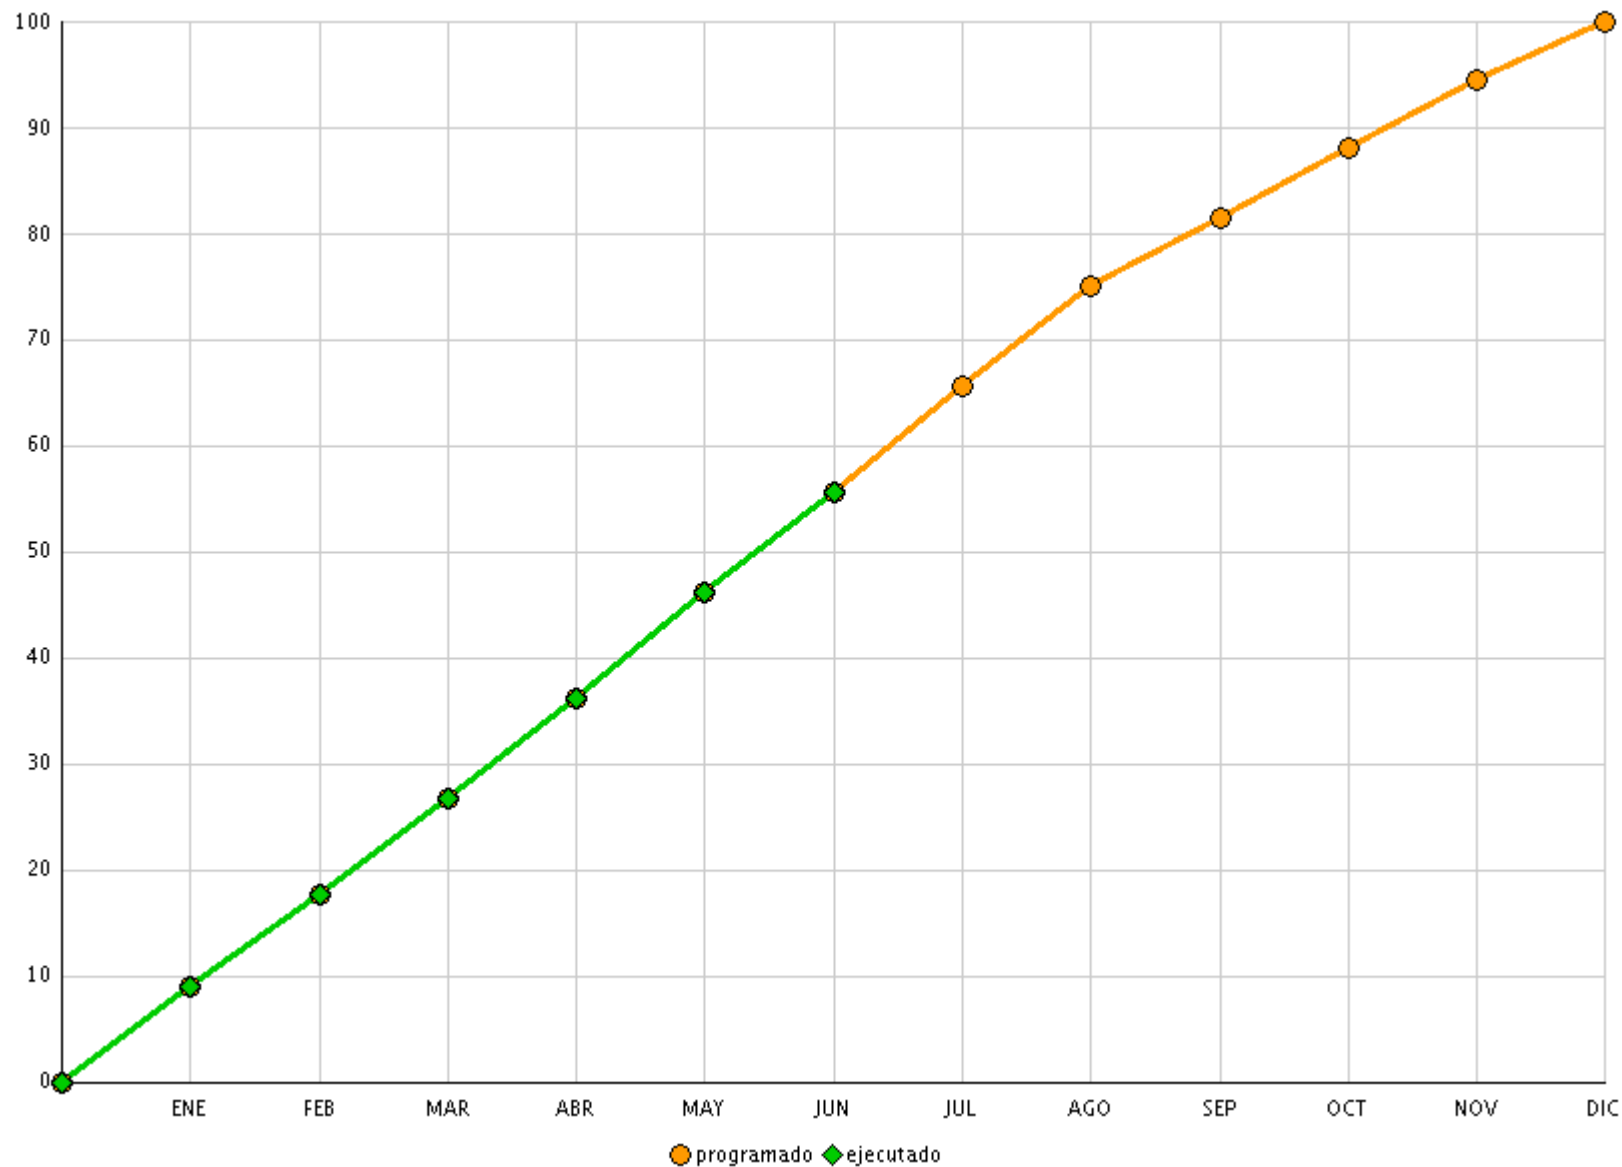


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.10	17.70	26.80	36.30	46.20	55.60	65.60	75.10	81.60	88.10	94.50	100.00
Ejecutado	9.10	17.70	26.80	36.30	46.20	55.60						

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7782 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

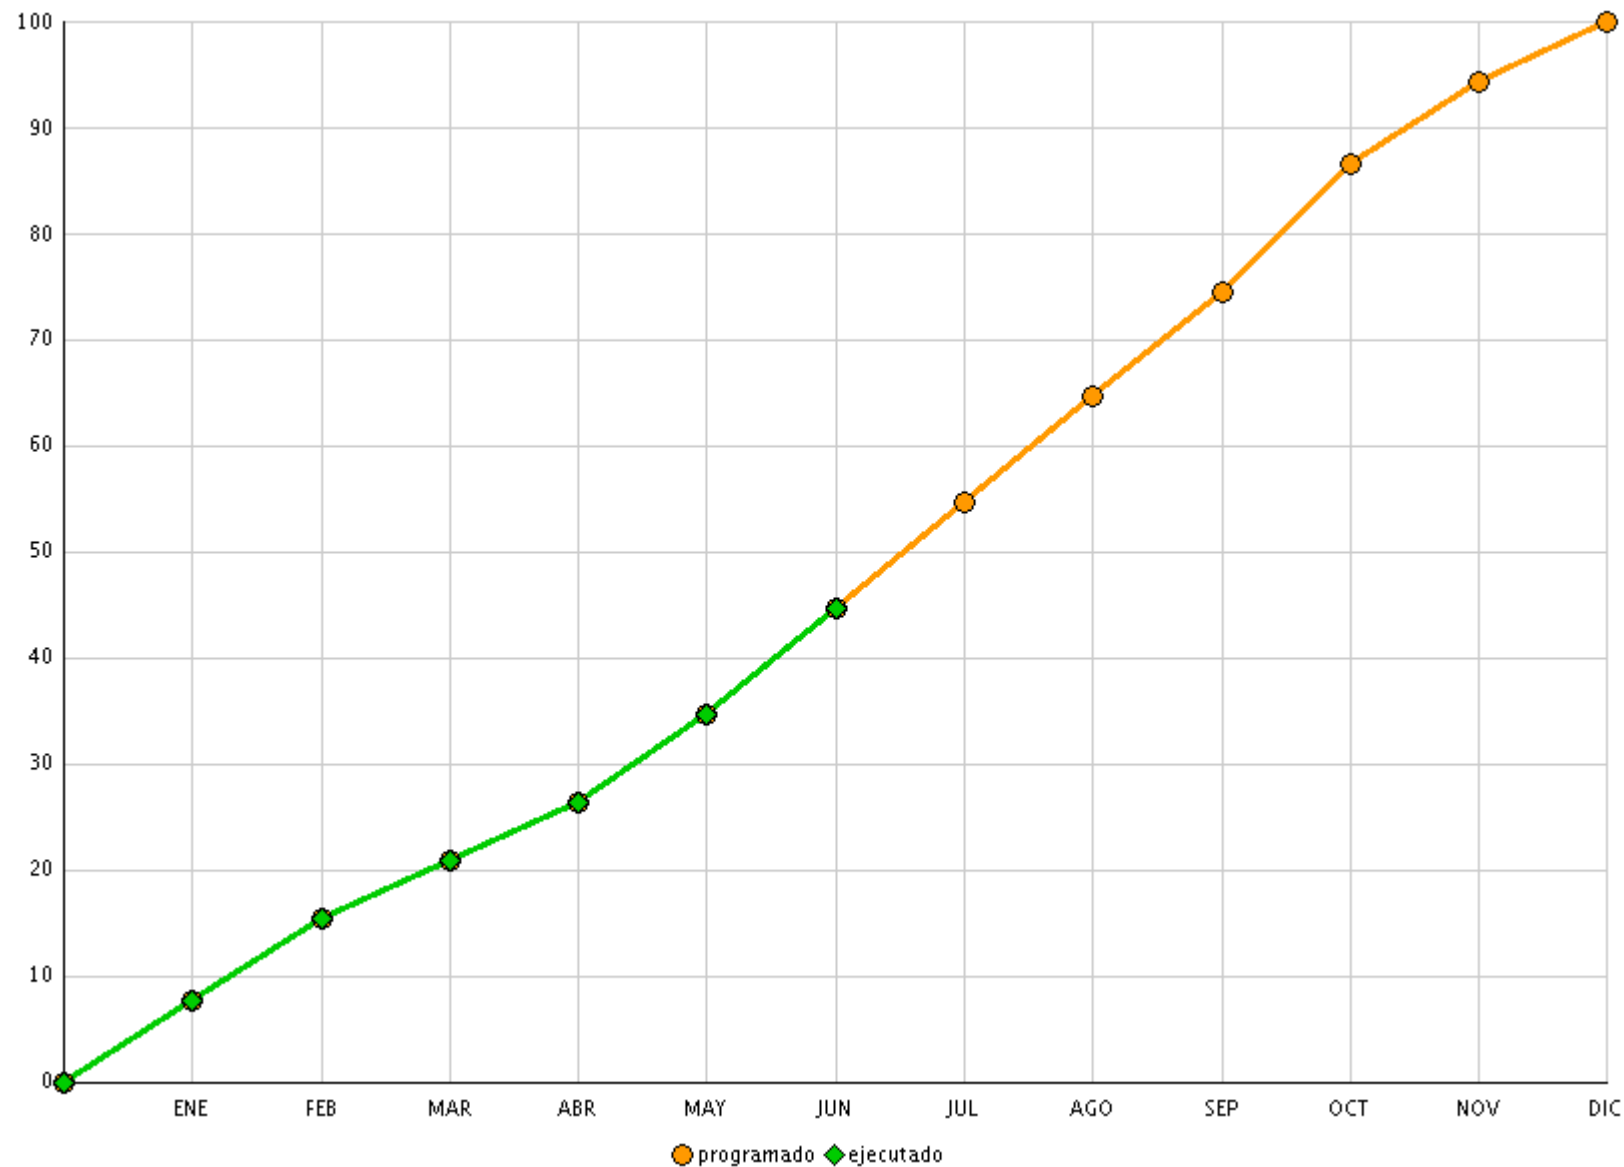


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.75	15.55	20.90	26.45	34.70	44.70	54.70	64.65	74.60	86.55	94.25	100.00
Ejecutado	7.75	15.55	20.90	26.45	34.70	44.70						

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7786 Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad

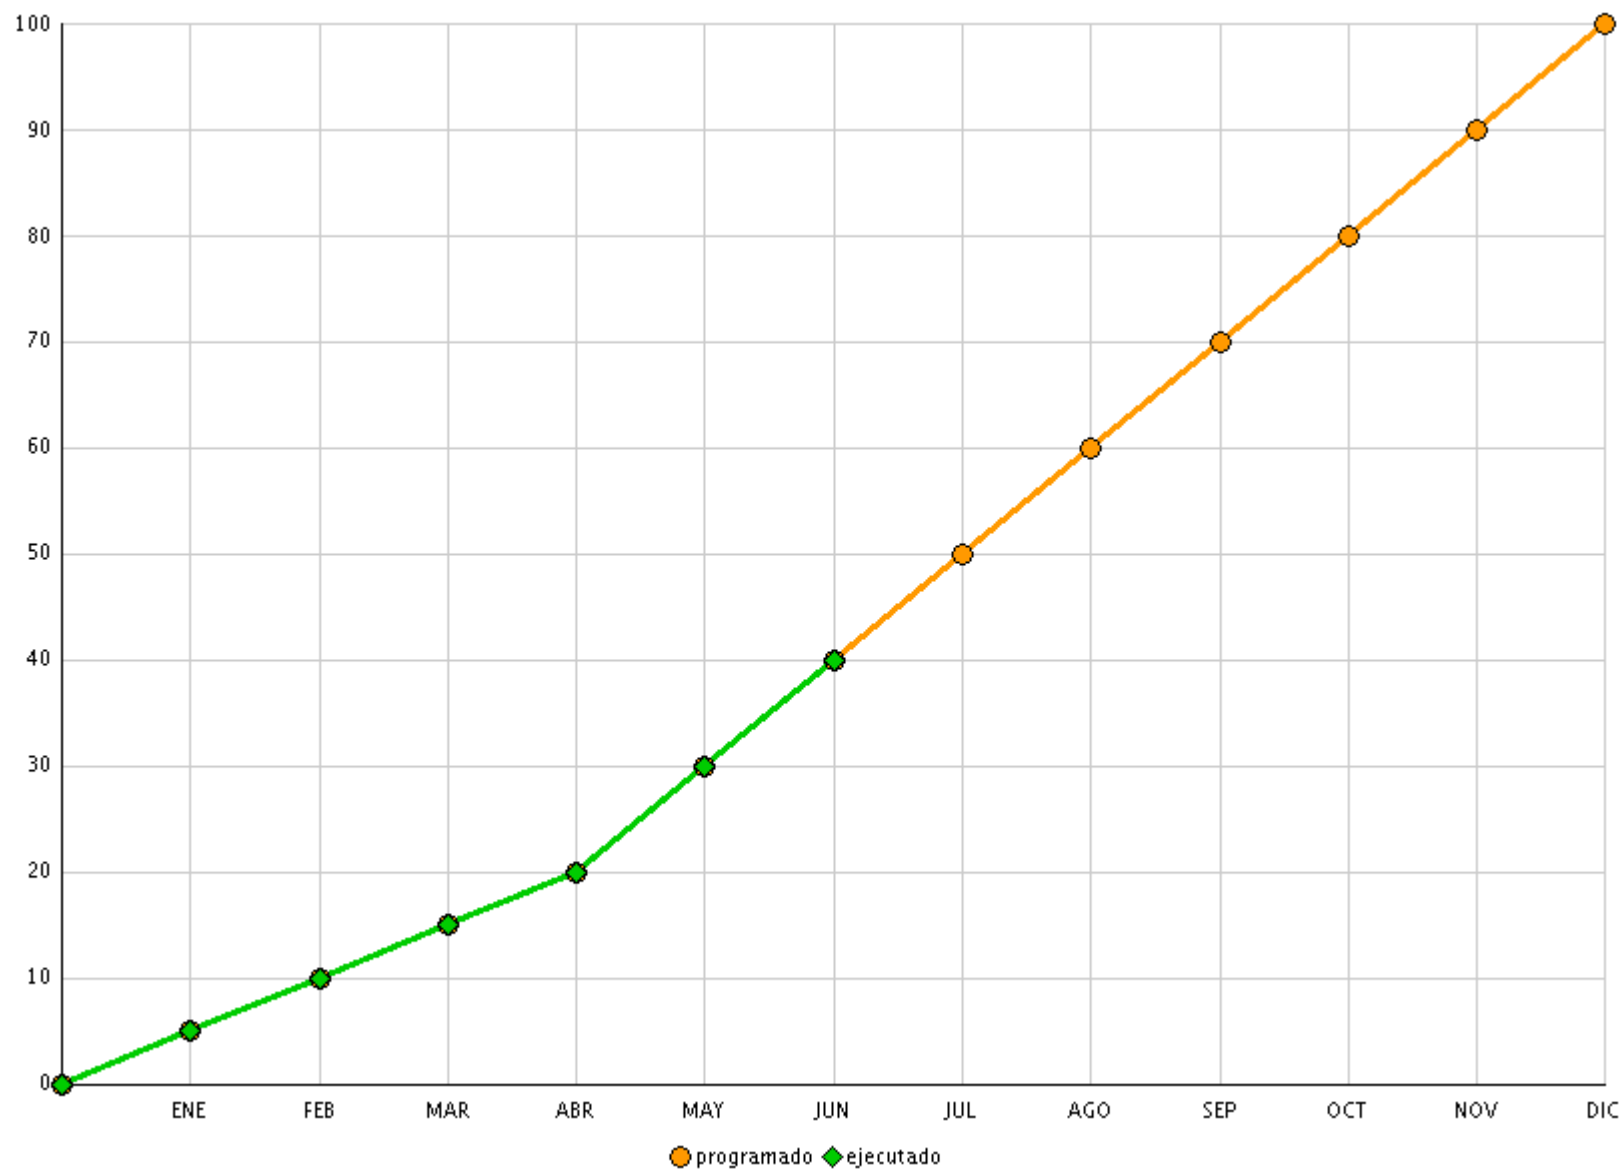

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00						

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	31.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7761 61 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO, PUENTES PEATONALES ETC	0.00																											
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		25.00		100.00	20.00	1.00
1.2 EJECUCIÓN	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		25.00		100.00	25.00	7.50
1.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		15.00		100.00	40.00	0.40
2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO, PUENTES PEATONALES ETC	0.00																											
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		100.00	25.00	1.00
2.2 EJECUCIÓN	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	15.40
2.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.50
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																											
3.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	0.60
3.2 EJECUCIÓN	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	30.00	4.50
3.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		20.00		10.00		10.00		100.00	35.00	0.35
4. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																											
4.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALÚOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.20
4.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00		5.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	5.25
4.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00		5.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	1.05
Total ponderación vertical		100.00																							TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		37.75	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7763 66 Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, INTERSECCIONES, PUENTES VEHICULARES Y CICLOINFRAESTRUCTURA	0.00																												
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25	
1.2 EJECUCIÓN	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	18.00	
1.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.50	
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																												
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60	
2.2 EJECUCIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	9.00	
2.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40	
3. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																												
3.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALÚOS	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35	
3.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	18.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	8.10	
3.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	6.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	2.70	
4. PAGO DE SENTENCIAS E INDEMNIZACIONES	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.90	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		44.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7779 28 Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. CONSERVACIÓN DE VÍAS, INTERSECCIONES, PUENTES VEHICULARES Y CICLOINFRAESTRUCTURA	0.00																												
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	4.50	
1.2 EJECUCIÓN	70.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	42.00	
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																												
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.00	
2.2 EJECUCIÓN	16.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	7.20	
2.3 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.90	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								55.60	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7782 60 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00																											
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
1.2 EJECUCIÓN	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	20.00
1.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		5.00		5.00		5.00		10.00		10.00		100.00	55.00	0.55
2. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																											
2.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALUOS	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.00
2.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.75
2.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																											
3.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	2.00
3.2 EJECUCIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		20.00		10.00		5.00		100.00	35.00	7.00
3.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
4. APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		44.70		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7786 31 Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022


AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad					
1. CONSTRUCCIÓN	0.00																																
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60					
1.2 EJECUCIÓN	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	16.00					
1.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40					
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																																
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60					
2.2 EJECUCIÓN	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	16.00					
2.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40					
3. APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00					
Total ponderación vertical		100.00																												TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		40.00	

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Proyecto de inversión

7592 Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá

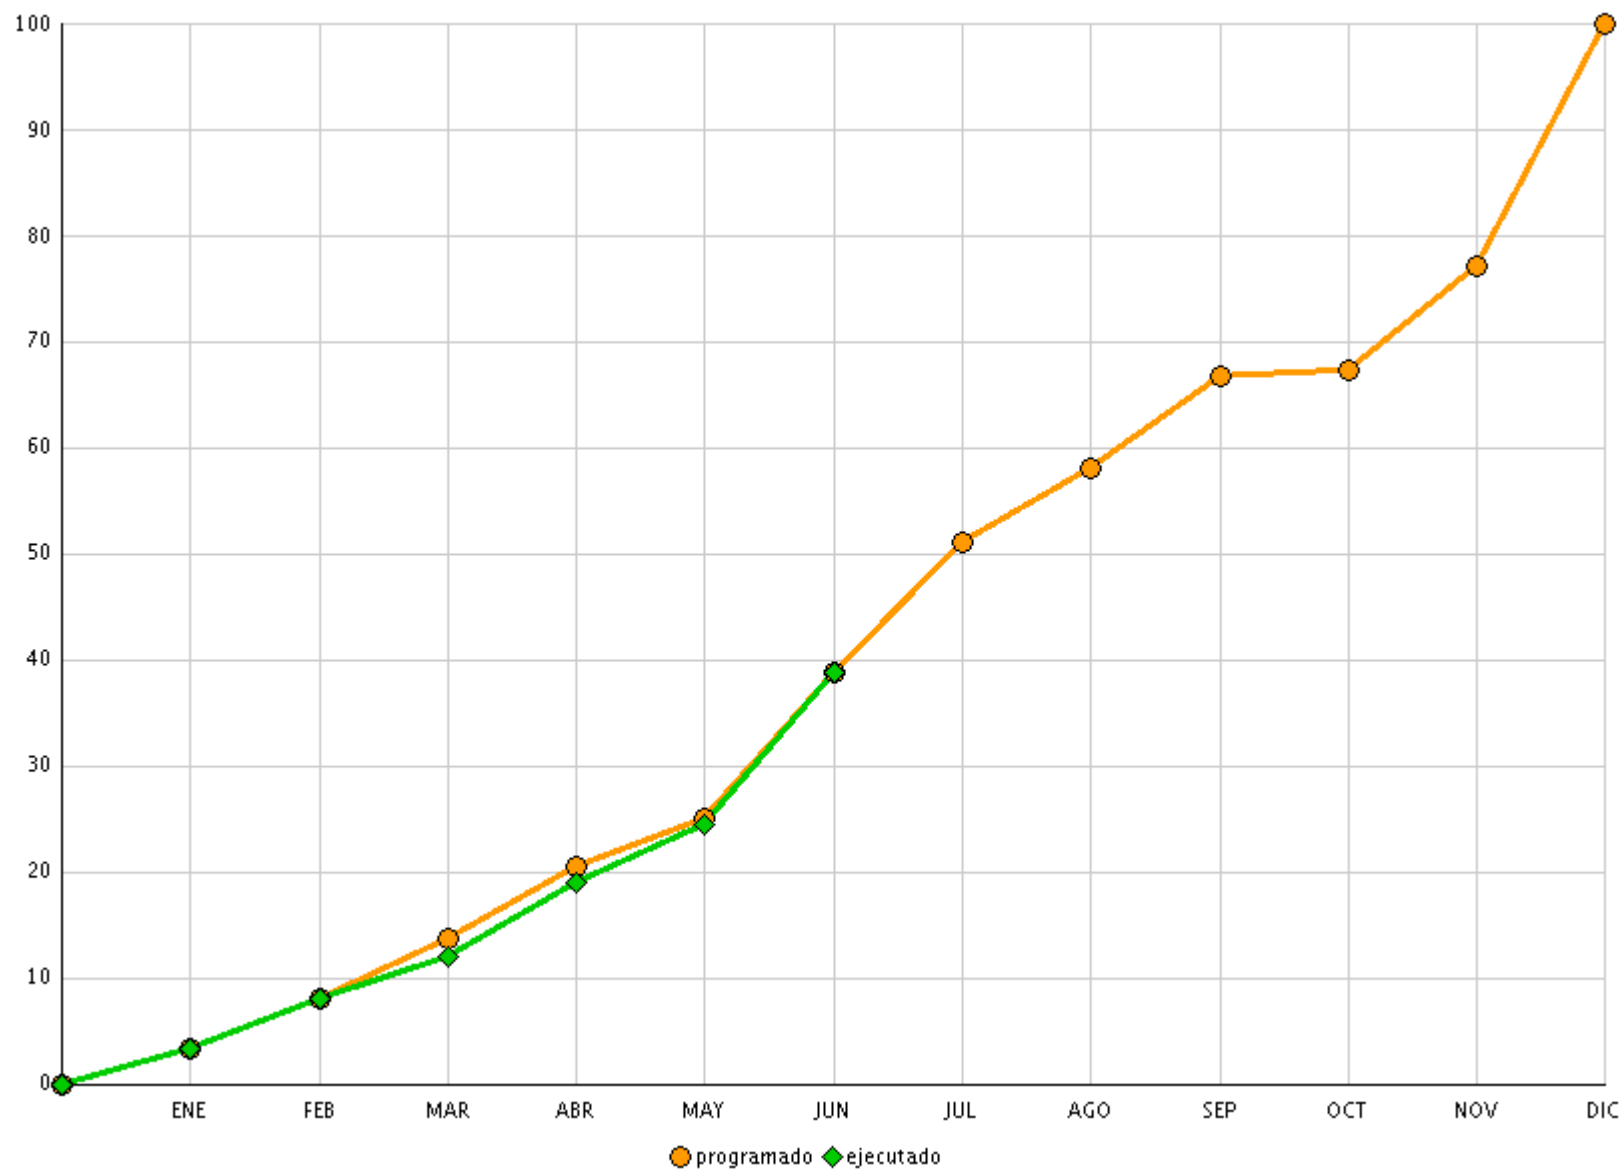

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.34	8.18	13.83	20.48	25.15	38.90	51.06	58.10	66.88	67.38	77.14	100.00
Ejecutado	3.34	8.18	12.05	19.05	24.43	38.89						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
206 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
7592 39 Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	9 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% DEL MODELO DE PLANEACIÓN ORIENTADO A RESULTADOS BASADO EN LA CADENA DE VALOR PÚBLICO	7.14	18.18	18.18	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	18.18	18.18	0.00		0.00		18.18		0.00		9.09		18.19		100.00	54.54	3.89
2.	10 - REALIZAR EL 100% DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LOS MODELOS DE PROCESOS RIESGOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66		0.00		8.33		0.00		16.66		25.03		100.00	33.32	2.38
3.	13 - EJECUTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE ESTABILIZACIÓN DE PROCESOS DE LA GESTIÓN MISIONAL	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	2.00	2.00	15.00		4.00		4.00		7.00		11.00		48.00		100.00	11.00	0.79
4.	14 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS	7.14	0.00	0.00	28.57	28.57	0.00	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	14.29	14.29	0.00		28.57		0.00		0.00		0.00		14.28		100.00	57.15	4.08
5.	15 - LOGRAR EL 100% DE LA ORGANIZACIÓN E INTERVENCIÓN DOCUMENTAL	7.14	28.56	28.56	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56		0.00		0.00		0.00		0.00		28.60		100.00	42.84	3.06
6.	16 - IMPLEMENTAR EL 100% DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	22.22	11.11	11.00	0.00	0.00	22.22		11.11		0.00		0.00		11.11		22.23		100.00	33.22	2.37
7.	18 - DETERMINAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LA HOJA DE RUTA PARA LA ARTICULACIÓN PENSIONAL	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	14.29	14.29	28.57	28.57	0.00		0.00		14.29		0.00		0.00		28.56		100.00	57.15	4.08
8.	19 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33		25.00		8.33		0.00		0.00		25.01		100.00	33.33	2.38
9.	23 - DESARROLLAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL	7.14	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		50.00		100.00	25.00	1.79
10.	26-IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00		20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	2.86
11.	27-IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	4.17	5.19	10.11	0.00	0.00	42.86	42.86	9.52		0.00		9.52		0.00		23.82		0.00		100.00	57.14	4.08
12.	28-IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00		10.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	2.86
13.	29-IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA GENERAR VALOR EN LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	20.00	40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	4.28
14.	30-EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES ASOCIADAS A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DIRIGIDA AL PENSIONADO	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		60.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										38.89

208 - Caja de Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7680 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

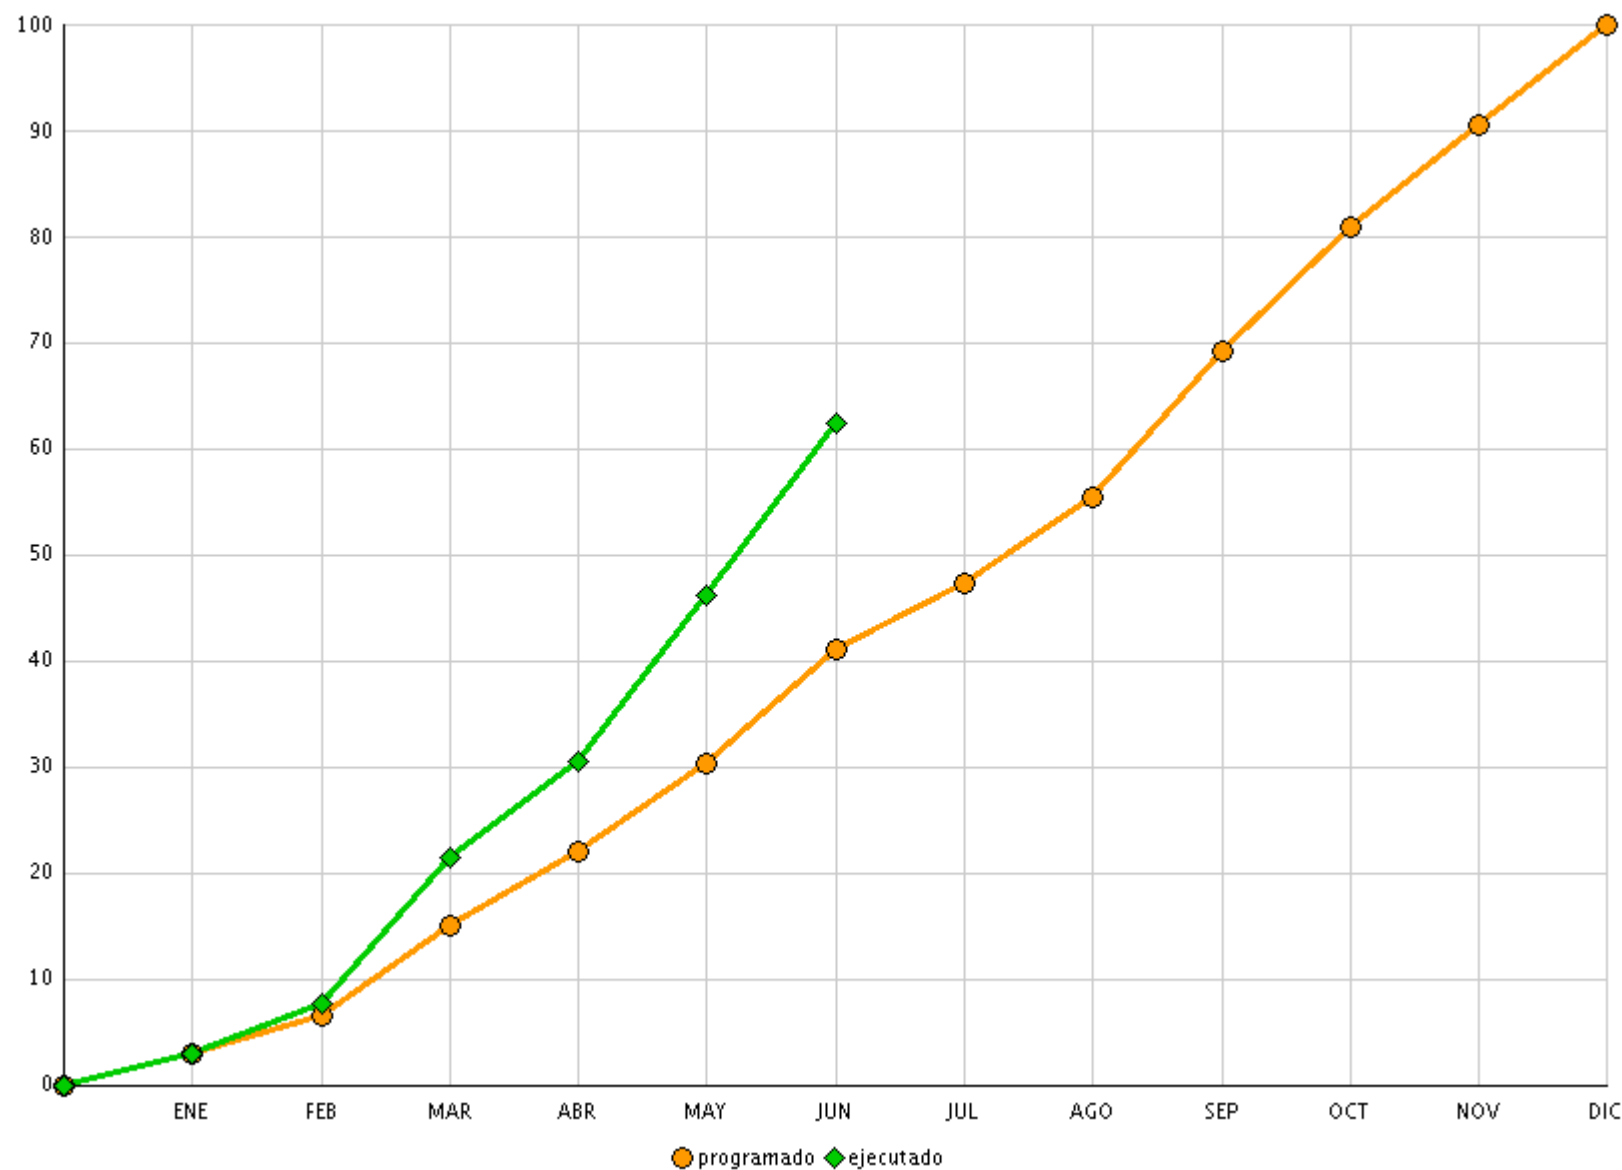


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.08	6.64	15.00	22.00	30.44	41.18	47.32	55.48	69.24	80.86	90.62	100.00
Ejecutado	2.98	7.74	21.48	30.48	46.26	62.38						

208 - Caja de Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7684 Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C

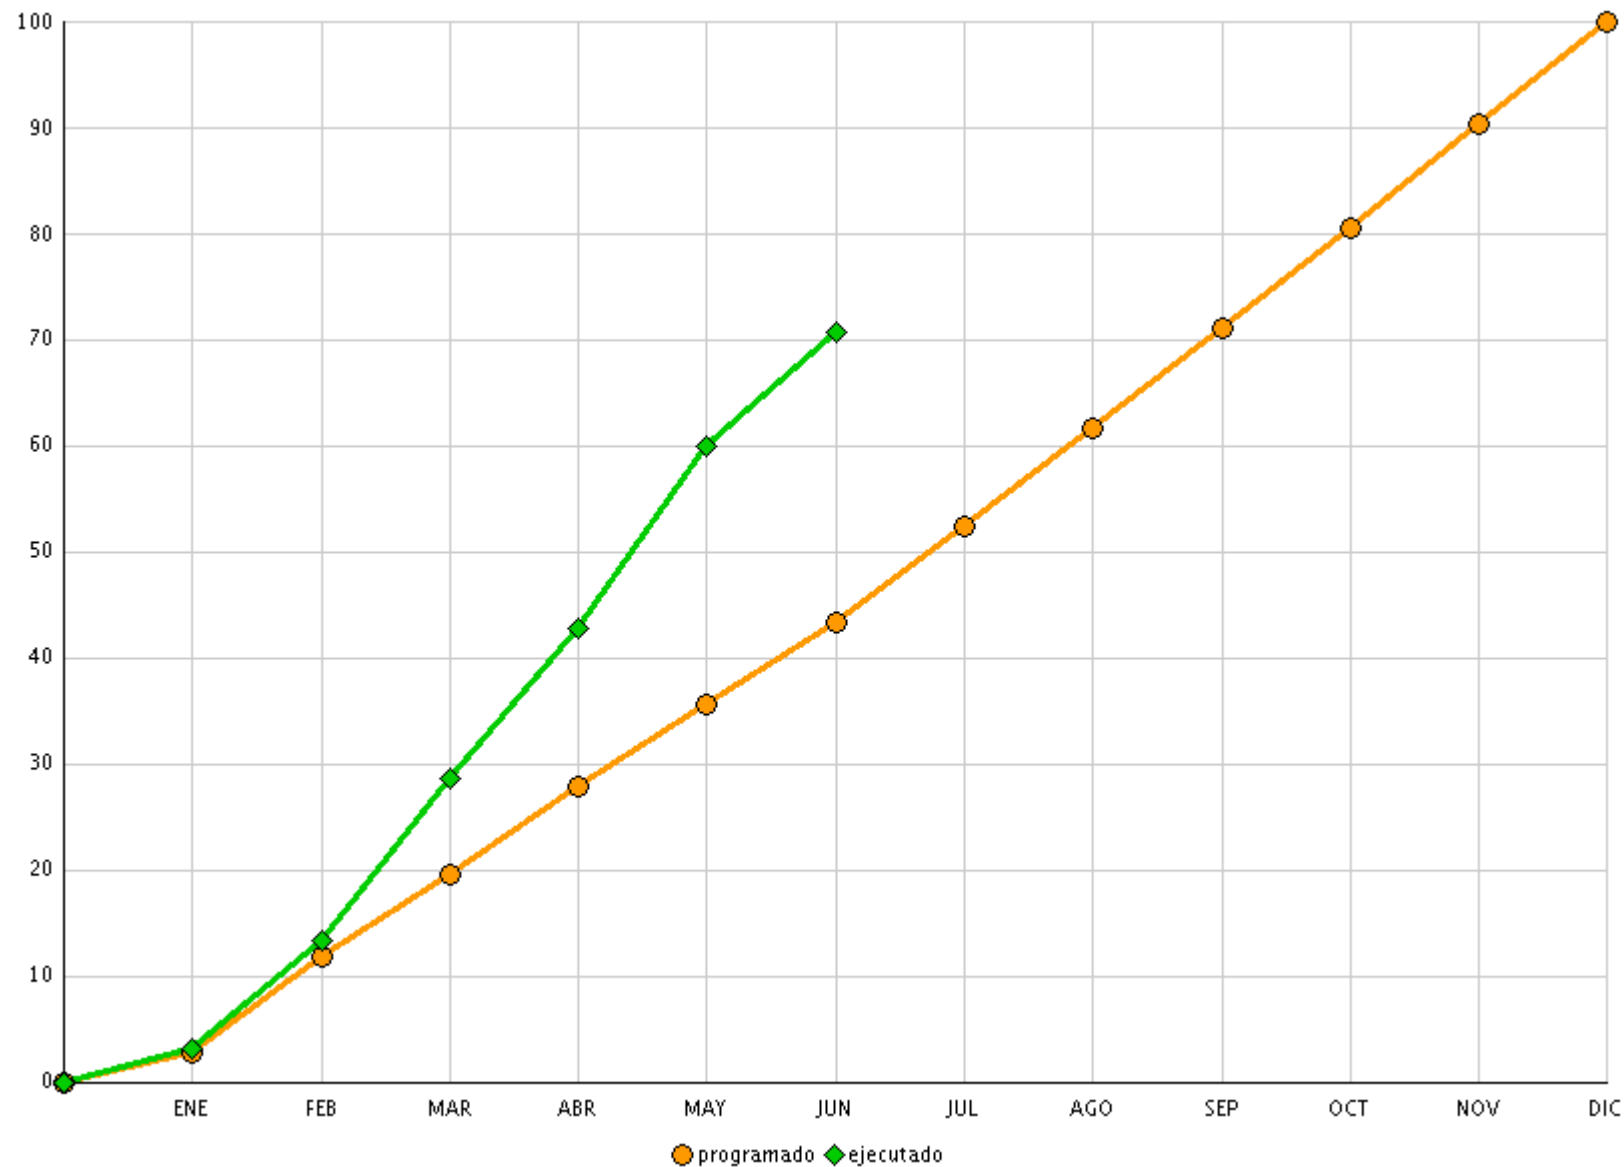


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.84	11.92	19.59	27.97	35.70	43.31	52.52	61.72	71.19	80.66	90.33	100.00
Ejecutado	3.24	13.45	28.67	42.89	60.01	70.78						

208 - Caja de Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

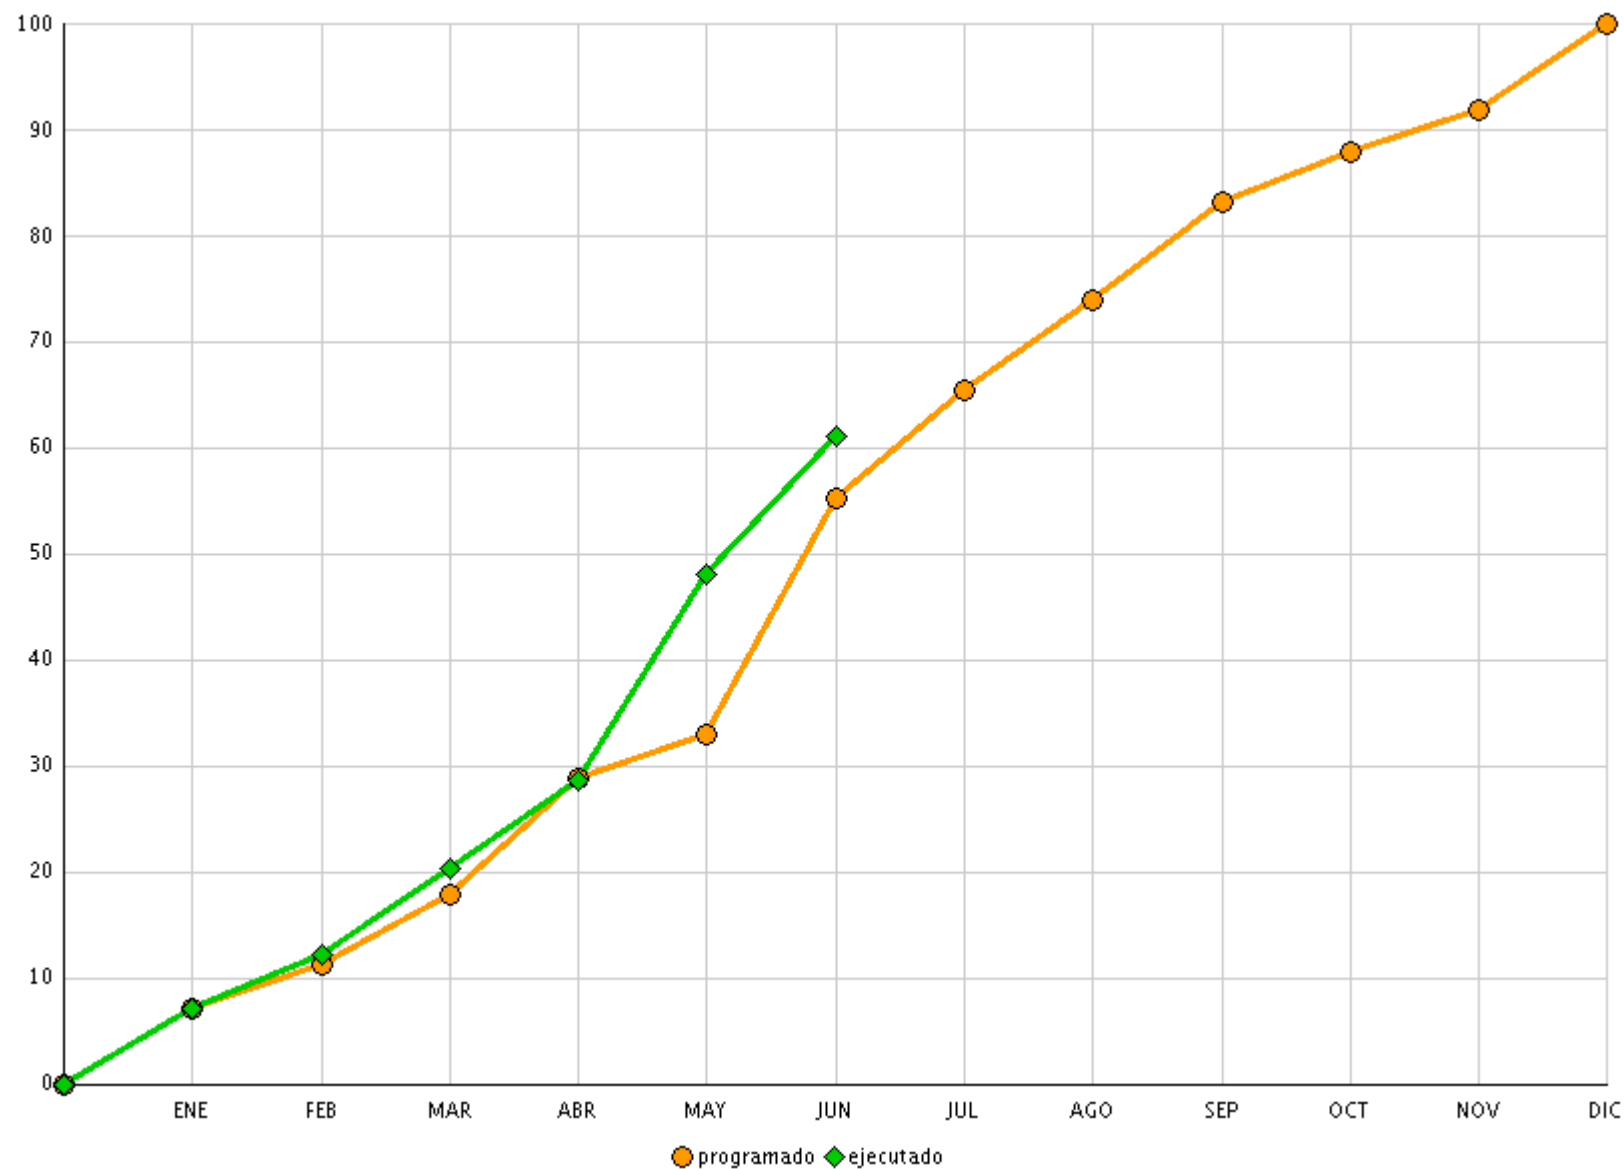


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.12	11.23	17.95	28.81	33.10	55.27	65.49	73.88	83.23	87.92	91.86	100.00
Ejecutado	7.12	12.30	20.32	28.67	48.17	61.06						

208 - Caja de Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7698 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

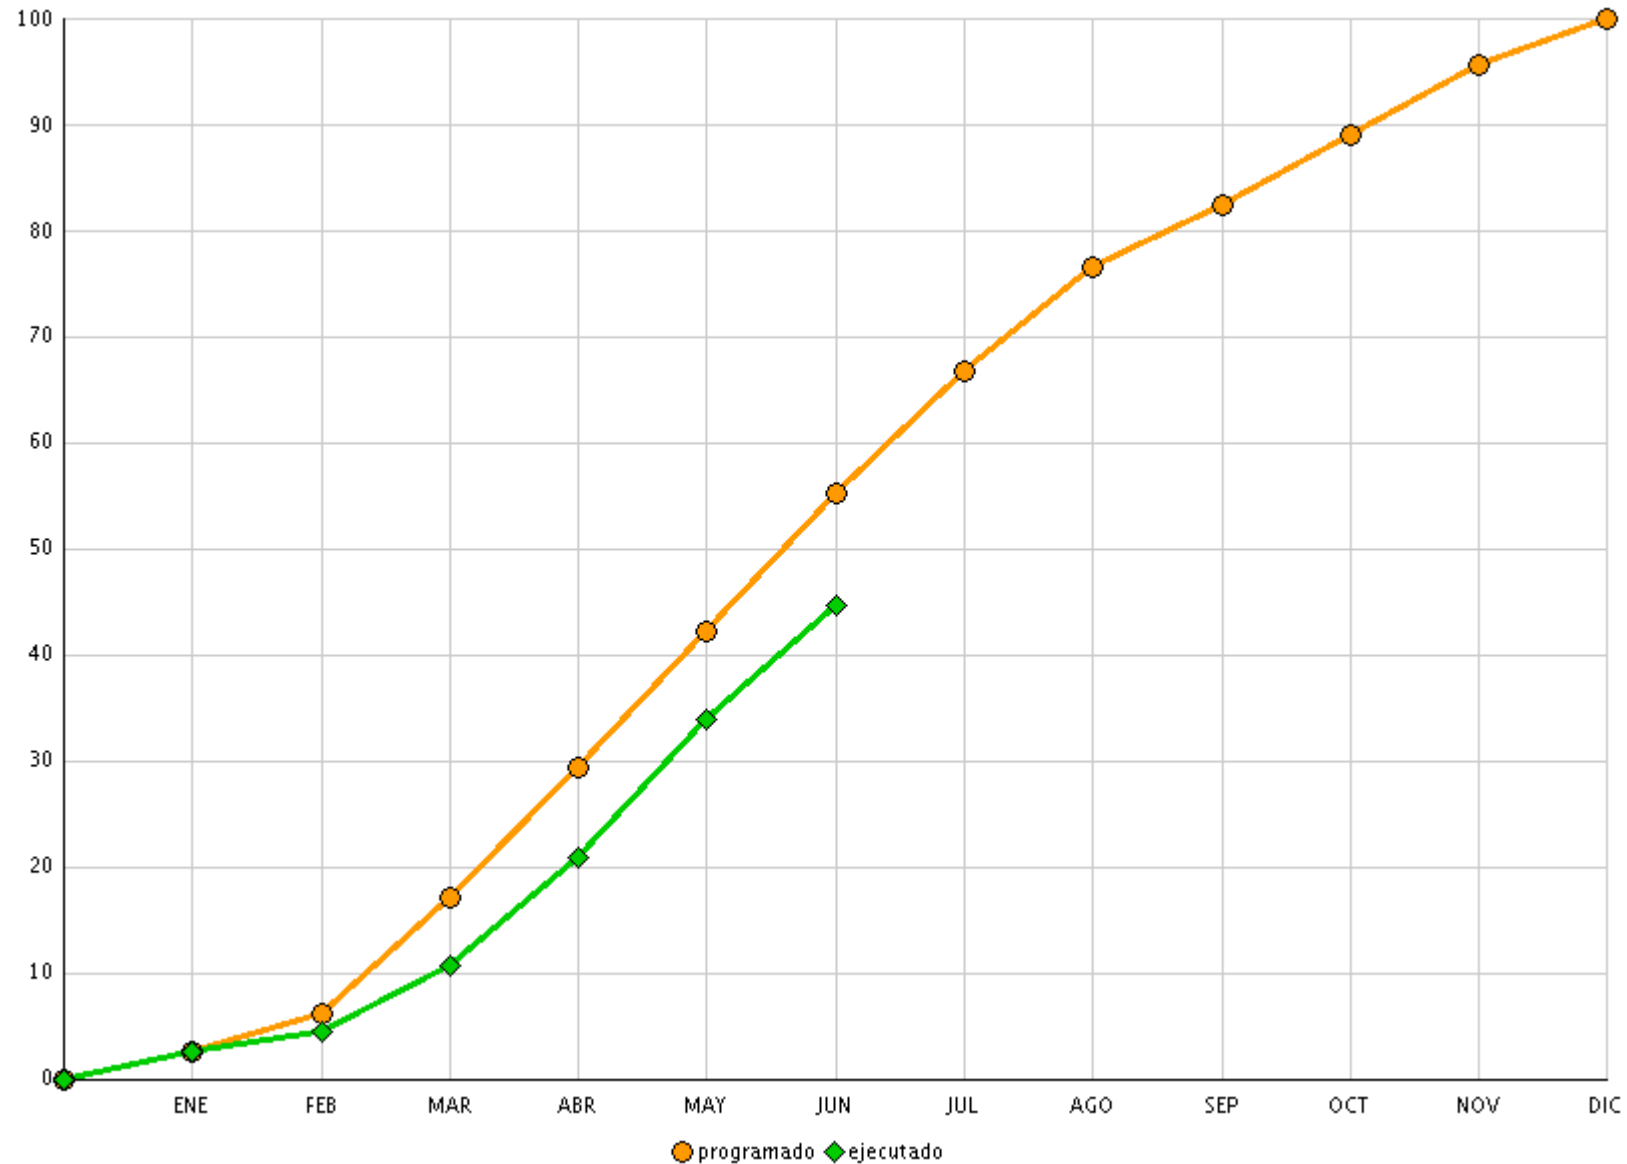


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.61	6.22	17.08	29.42	42.23	55.23	66.79	76.64	82.48	89.05	95.59	100.00
Ejecutado	2.61	4.53	10.70	20.91	33.97	44.72						

208 - Caja de Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7703 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

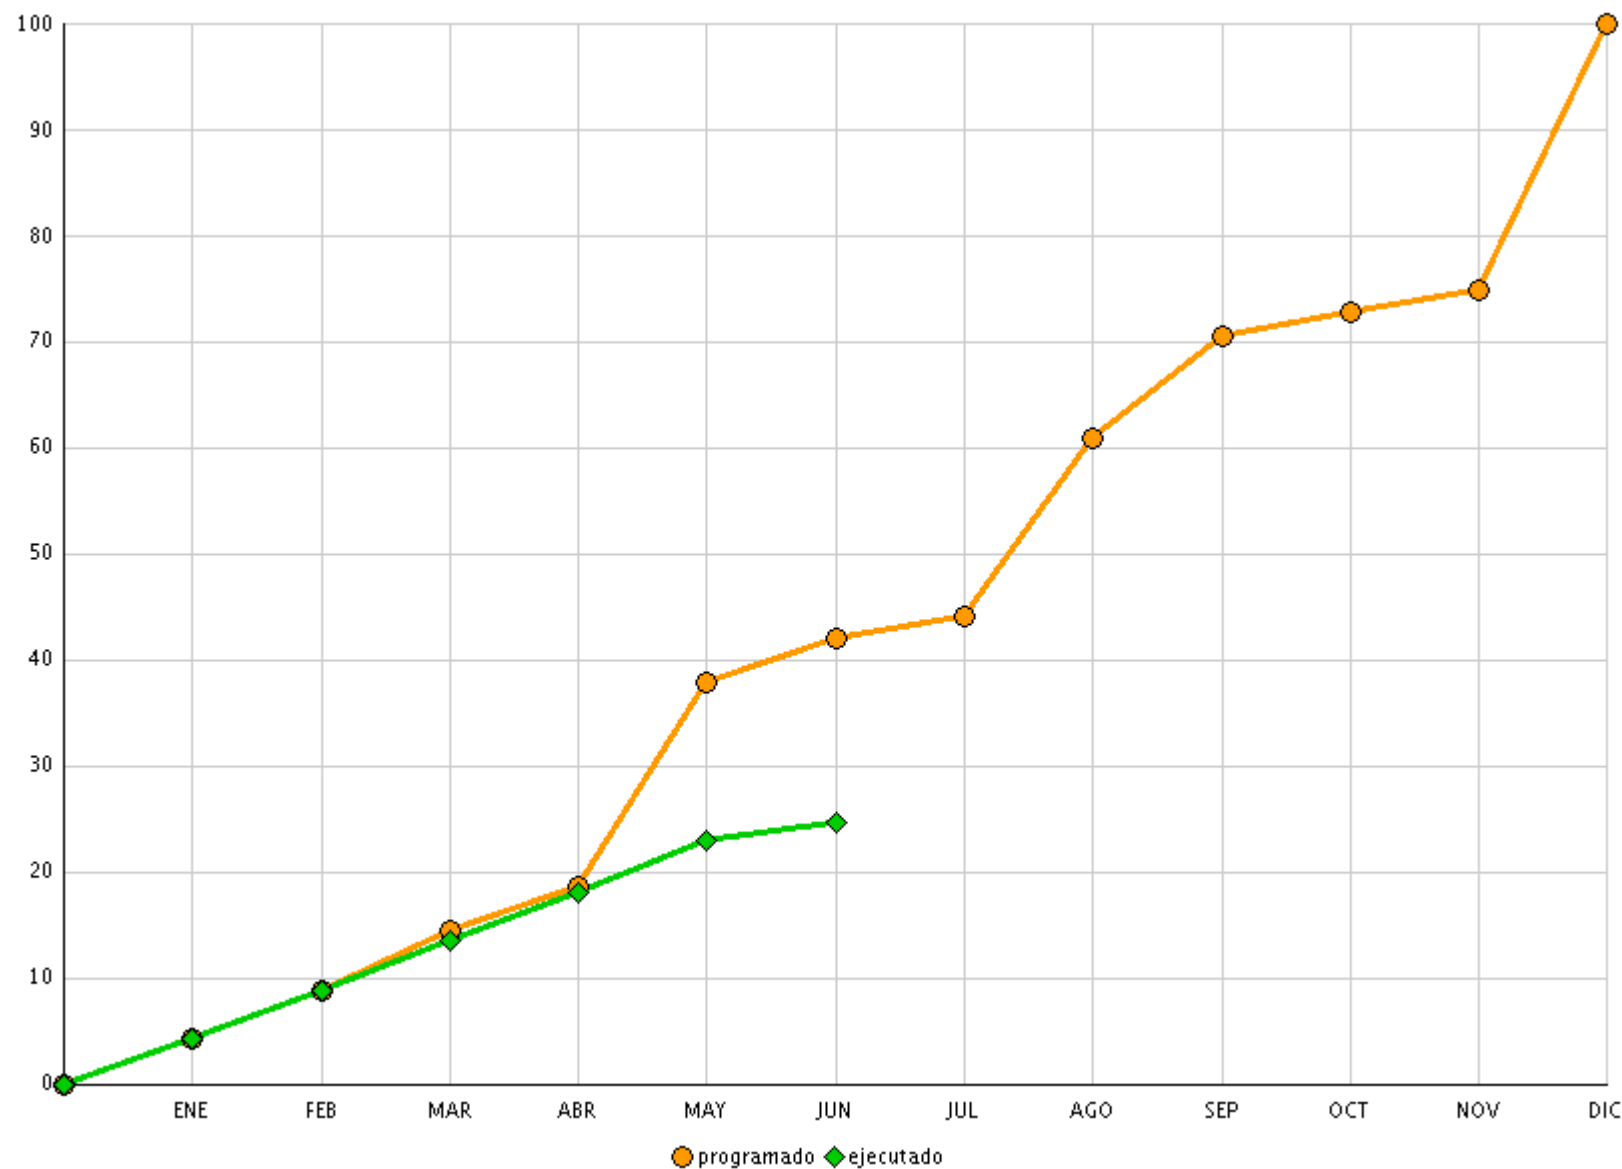

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.34	8.93	14.48	18.64	37.99	42.11	44.18	60.94	70.63	72.87	74.84	100.00
Ejecutado	4.34	8.87	13.54	18.04	22.96	24.78						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7680 25 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS HOGARES POTENCIALES PARA PLAN TERRAZAS Y DE RECIBIR SDVE	0.00																											
1.1	EMITIR CONCEPTOS DE VIABILIDAD SIG, HOGAR, JURÍDICA Y LEVANTAMIENTO.	10.00	10.00	10.00	5.00	15.00	14.00	14.00	11.00	3.00	11.00	7.00	11.00	14.00	5.00		7.00		11.00		11.00		4.00		0.00		100.00	63.00	6.30
1.2	ESPACIOS DE DIÁLOGO A) CON LÍDERES, B) CON POTENCIALES HOGARES, C) VISITAS TÉCNICAS HOGAR, D) SOCIALIZACIONES DISEÑO Y E) RENDICIÓN DE CUENTAS	10.00	1.00	1.00	2.00	16.00	24.00	81.00	1.00	74.00	1.00	84.00	23.00	87.00	1.00		1.00		23.00		1.00		2.00		20.00		100.00	343.00	34.30
1.3	PROYECTOS ESTRUCTURADOS: PAQUETES TÉCNICOS PARA RADICAR ANTE LA C.P.S.	10.00	5.00	5.00	5.00	11.00	12.00	12.00	11.00	9.00	11.00	8.00	11.00	8.00	3.00		7.00		11.00		11.00		11.00		2.00		100.00	53.00	5.30
2.	PREDIOS INTERVENIDOS EN EL PROYECTO PILOTO DEL PLAN TERRAZAS	0.00																											
2.1	OBRAS EJECUTADAS CON LOS RECURSOS DEL SDVE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	7.00	0.00	7.00		0.00		18.00		18.00		18.00		18.00		100.00	2.00	0.40
3.	ADELANTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y SOCIALES QUE GENEREN CONDICIONES PARA INICIAR LAS OBRAS.	0.00																											
3.1	HOGARES POSTULADOS, CON CONTRATO DE EJECUTOR E INTERVENTOR Y DEFINICIÓN ACCIONES PARA TRASLADO TRANSITORIO	14.00	7.00	7.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	0.00	11.00	13.00	0.00	6.00	0.00		13.00		14.00		14.00		14.00		12.00		100.00	34.00	4.76
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE SOLICITUDES, DE ACTO DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES Y/O LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RADICADAS DESDE EL PROYECTO PILOTO PLAN TERRAZAS ANTE LA C:P:S:	0.00																											
4.1	ACTOS DE RECONOCIMIENTO FIRMADOS	20.00	2.00	2.00	8.00	0.00	8.00	7.00	10.00	2.00	10.00	15.00	10.00	18.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		7.00		100.00	44.00	8.80
5.	PROYECTOS CON AMPLIACIONES EJECUTADAS CON MATERIALES DEL BDM	0.00																											
5.1	% DE AVANCE SOBRE PREDIOS PROGRAMADOS PARA INTERVENCIÓN CON MATERIALES DEL BDM	10.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	12.00	3.00	20.00	0.00	20.00		20.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	3.00	0.30
6.	HOGARES POSTULADOS ANTE LA SDHT PARA TRÁMITE SDVE CON ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS	0.00																											
6.1	HOGARES CON EXPEDIENTE RADICADO PARA EL TRÁMITE DE SDVE MODALIDAD MEJORAMIENTO PROGRESIVO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	18.00	2.00	0.00	0.00	6.00	14.00	13.00	14.00		14.00		20.00		21.00		0.00		0.00		100.00	37.00	2.22
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		62.38	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7684 32 Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y SOCIAL A LAS FAMILIAS ASENTADAS VIS O VIP, CON EL FIN DE OBTENER UN TÍTULO DE PROPIEDAD REGISTRADO	0.00																											
1.1	1.1.VINCULAR A LOS BENEFICIARIOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN, A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES MECANISMOS ADELANTADOS POR LA CVP	11.58	0.68	0.68	9.00	4.41	9.14	5.73	9.00	13.23	9.00	9.00	9.05	3.05	9.05		9.00		9.00		9.04		9.04		9.00		100.00	36.10	4.18
1.2	1.2. INGRESAR EN EL APLICATIVO SIMA LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE TITULACIÓN CON SUS RESPECTIVAS CARACTERIZACIONES, MODIFICACIONES Y SEGUIMIENTOS SOCIALES.	11.58	0.68	3.18	9.00	26.05	9.14	19.41	9.00	17.75	9.00	12.55	9.05	8.89	9.05		9.00		9.00		9.04		9.04		9.00		100.00	87.83	10.17
1.3	1.3. COTEJAR INFORMACIÓN INTERNA CON FONVIVIENDA	7.73	2.84	1.49	3.55	22.13	7.09	13.40	9.93	16.31	9.93	28.72	9.93	4.40	9.93		9.93		9.93		9.93		9.92		7.09		100.00	86.45	6.68
1.4	1.4. ELABORAR VIABILIDADES TÉCNICAS	7.73	6.67	6.50	8.33	13.83	8.33	22.17	9.18	18.33	9.18	27.83	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	96.99	7.50
1.5	1.5. ELABORAR CERTIFICADO PLANO PREDIAL	7.73	6.67	6.50	8.33	13.83	8.33	22.17	9.18	18.33	9.18	27.83	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	96.99	7.50
1.6	1.6. ELABORAR VIABILIDADES JURÍDICAS	7.73	3.36	10.17	10.00	13.83	10.00	20.50	10.00	18.17	8.33	59.67	8.33	24.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	146.34	11.31
1.7	1.7 PUBLICAR EN PRENSA DATOS DEL PREDIO A CEDER.	7.73	3.36	0.00	10.00	0.00	10.00	20.50	10.00	18.00	8.33	0.00	8.33	17.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	55.50	4.29
1.8	1.8. ELABORAR RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y O CESIÓN A TÍTULO GRATUITO	7.73	3.33	0.00	10.00	0.00	5.00	15.00	10.00	0.00	8.33	0.00	8.33	17.00	8.33		8.33		8.33		8.33		10.83		10.86		100.00	32.00	2.47
1.9	1.9. NOTIFICAR RESOLUCIÓN	7.73	3.36	3.50	10.00	2.33	10.00	20.67	10.00	26.83	8.33	22.50	8.33	23.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	99.33	7.68
1.10	1.10. REGISTRAR LA RESOLUCIÓN, ESCRITURA O SENTENCIA ANTE LA ORIP	7.73	3.36	6.17	10.00	18.83	10.00	21.67	10.00	18.50	8.33	18.17	8.33	17.17	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	100.51	7.77
2.	2. REALIZAR LA ENTREGA DE ZONAS DE CESIÓN	0.00																											
2.1	2.1. REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS PARTES INVOLUCRADAS	1.62	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.81
2.2	2.2. REALIZAR VISITAS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ZONAS A CEDER	1.15	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	18.18	9.09	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		9.09		100.00	36.36	0.42
2.3	2.3. REGISTRAR ESCRITURAS DE ZONAS DE CESIÓN	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.	3. HACER EL CIERRE DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE URBANISMO PARA VIVIENDA VIP	0.00																											
3.1	3.1. HACER SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	12.00	0.00	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33		13.33		15.56		15.56		15.56		15.55		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 70.78

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7696 26 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1. REALIZAR LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.	0.00																											
1.1	1.1. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL (MIPG), DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CVP.	2.61	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.30
1.2	1.2. EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN 2022 DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL -PIGA-.	2.61	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.30
1.3	1.3. EJECUTAR LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA VIGENCIA 2022 APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.	5.21	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	7.38	7.34	5.51	10.00	7.70	5.00	10.33	13.00		5.00		10.00		8.22		8.22		8.23		100.00	47.58	2.48
1.4	1.4. GARANTIZAR QUE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA CVP Y LA GESTIÓN JURÍDICA, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS.	2.61	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.30
1.5	1.5. REALIZAR EL CONTROL DE LEGALIDAD, NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO ATENDER LOS CONCEPTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CVP Y BRINDAR SOPORTE JURÍDICO.	2.61	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.30
1.6	1.6. INCORPORAR LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIO (SID), QUE PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS.	1.74	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.87
1.7	1.7. INCORPORAR LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS EN EL SISTEMA DE REPORTES DE ACTOS PROCESALES (OCDI), QUE PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS.	1.74	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.87
1.8	1.8. ADOPTAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DEL PROCESO DE CID QUE PERMITA ADELANTAR LOS TRÁMITES TENDIENTES A ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS SERVIDORES Y EX SERVIDORES DE LA CVP.	1.73	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.86
1.9	1.9. REALIZAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN REALIZADAS POR LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN.	5.21	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.60
1.10	10. REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD, CONFIABILIDAD, RAZONABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMAC.	5.20	5.00	5.00	9.40	9.40	9.30	9.30	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		9.00		8.30		5.00		5.00		100.00	52.70	2.74
1.11	11. IMPLEMENTAR LOS PLANES INSTITUCIONALES DEL MIPG ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		25.00		100.00	45.00	0.47

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7696 26 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.12 12. GESTIONAR LOS PROCESOS DE NÓMINA DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA FIJA Y PLANTA TEMPORAL DE LA CVP	1.04	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.52
1.13 13. GESTIONAR E IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS PARA LA CVP.	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		25.00		100.00	45.00	0.47
1.14 14. IMPLEMENTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA CVP	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		25.00		100.00	45.00	0.47
1.15 15. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO SGDEA.	1.04	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.47
2. 2. ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO QUE REQUIERA LA ENTIDAD.	0.00																											
2.1 2.1. IMPLEMENTAR EL PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		25.00		100.00	45.00	6.26
2.2 2.2. GESTIONAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUROS PARA PERMITIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA CVP	13.91	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	6.95
3. 3. IMPLEMENTAR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	0.00																											
3.1 3.1. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DEL PROGRAMA	0.63	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.31
3.2 3.2. PROMOVER EN LA CVP LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014)	0.32	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.16
3.3 3.3. FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A DIVULGAR Y SOCIALIZAR LOS PROCESOS MISIONALES DE LA CVP	0.31	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.15
3.4 3.4. EVALUAR DE MANERA BIMESTRAL EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON RELACIÓN A LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	0.32	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.16
3.5 3.5. REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PQRSY A LOS CIUDADANOS QUE ASISTEN O SE COMUNICAN POR MEDIO DEL CANAL TELEFÓNICO PARA REALIZAR ALGÚN TRÁMITE O SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD	0.31	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.15
4. 4. GENERAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN PROVEER DE FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO.	0.00																											
4.1 4.1. REALIZAR LOS DESARROLLOS Y/O IMPLEMENTACIONES NECESARIAS PARA LA APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL, ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL MPSI	4.92	8.00	8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00	12.00	0.00	18.00	30.00	12.00	0.00		30.00		0.00		12.00		0.00		0.00		100.00	58.00	2.85
5. 5. GENERAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN PROVEER DE FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO.	0.00																											
5.1 5.1. REALIZAR Y EJECUTAR LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA VIGENCIA 2022	28.91	10.00	10.00	0.00	3.00	0.00	4.00	20.00	13.00	0.00	50.00	40.00	10.00	20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	26.02
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								61.06

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7698 32 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1. ASIGNACIÓN Y DESEMBOLSO VUR	0.00																											
1.1	1.1. REALIZAR ESTUDIOS DE DOCUMENTOS	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	5.00	10.00	13.00	10.00	9.00	10.00	7.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	39.00	1.17
1.2	1.2 REALIZAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	9.20	10.53	4.82	10.53	3.51	10.53	16.23	10.53		10.53		10.53		10.53		10.53		5.23		100.00	33.76	0.68
1.3	1.3 APROBACIÓN EN MESAS DE REASENTAMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	0.00	10.53	63.16	10.53	31.58	10.53	0.00	10.53		10.53		10.53		10.53		10.53		5.23		100.00	94.74	2.84
1.4	1.4 REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	5.56	10.56	5.00	10.56	7.22	10.56	10.00	10.56		10.56		10.56		10.56		10.56		4.96		100.00	27.78	0.56
1.5	1.5 REALIZAR CONTRATO DE CESIÓN PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	4.00	0.00	0.00	1.15	1.15	10.03	0.57	12.89	2.87	12.89	2.29	12.89	8.88	12.89		12.89		10.03		7.16		5.73		1.45		100.00	15.76	0.63
1.6	1.6 REALIZAR LA ESCRITURA DEL PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	4.00	8.06	8.06	11.29	11.29	8.06	1.61	8.06	1.61	8.06	1.61	8.06	6.45	8.06		8.07		8.07		8.07		8.07		8.07		100.00	30.63	1.23
1.7	1.7 REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	8.00	1.82	1.82	7.03	7.03	9.11	3.91	11.72	2.34	11.72	8.33	11.72	3.65	11.72		11.72		9.11		6.51		5.21		2.61		100.00	27.08	2.17
1.8	1.8 PROYECTAR Y REGISTRAR RESOLUCIONES CON ASIGNACIÓN DE VUR	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	3.33	6.00	10.37	15.00	18.29	21.00	23.78	24.00		21.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.77	2.23
2.	2. AVALÚO PREDIO RECOMENDADO Y SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESOLUCIONES DE OFERTA DE COMPRA	0.00																											
2.1	2.1. EJECUTAR AVALÚOS DE PREDIOS EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	6.00	0.00	0.00	0.00	6.56	10.94	14.38	10.94	15.00	10.94	24.06	10.94	12.81	10.94		10.94		10.94		9.38		9.38		4.66		100.00	72.81	4.37
2.2	2.2. PROYECTAR Y SOLICITAR REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESOLUCIONES DE OFERTA DE COMPRA.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.67	26.00	29.03	13.00	16.13	16.00	12.90	16.00		19.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	64.73	5.83
3.	3. NUEVOS HOGARES BENEFICIADOS CON LA AYUDA DE RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA.	0.00																											
3.1	3.1 NUEVOS HOGARES BENEFICIADOS CON LA AYUDA DE RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	8.00	15.89	3.97	23.18	22.52	23.18	5.96	17.85		4.30		3.10		0.00		0.00		0.00		100.00	40.45	4.05
4.	4. ACOMPAÑAMIENTO PARA SELECCIÓN DE VIVIENDA Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN DE TRASLADO A LA ALTERNATIVA HABITACIONAL	0.00																											
4.1	4.1 REALIZAR ACTAS DE ENTREGA DE ALTERNATIVA HABITACIONAL A LAS FAMILIAS	10.00	0.00	0.00	1.45	1.45	22.74	13.23	17.27	1.15	15.30	12.66	10.20	15.30	1.42		1.42		1.26		15.89		9.64		3.41		100.00	43.79	4.38
4.2	4.2 REALIZAR ACTAS DE VERIFICACIÓN DE TRASLADO DE LAS FAMILIAS A SU ALTERNATIVA HABITACIONAL	5.00	0.00	0.00	1.35	1.35	1.52	6.94	11.99	9.08	17.98	9.25	15.92	10.79	10.63		3.43		3.43		3.26		18.50		11.99		100.00	37.41	1.87
4.3	4.3 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS PARA QUE SELECCIONEN VIVIENDA	5.00	0.00	0.00	3.23	3.23	12.26	25.16	5.92	7.69	14.79	22.49	20.71	29.59	23.02		20.07		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	88.16	4.41
5.	5. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO EN EL PERIODO	0.00																											
5.1	5.1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO EN EL PERIODO	25.00	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	33.32	8.33

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 44.72

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7703 32 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia	
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA CONSTRUCCIÓN DE 107,000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO EN 8 TERRITORIOS PRIORIZADOS	0.00																											
1.1	1.1. REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE PREVIABILIDAD A LAS OPORTUNIDADES DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO A ESCALA BARRIAL PARA LA PRIORIZACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00		
1.2	1.2. SUPERVISAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN LOS COMPONENTES TÉCNICO, SOCIAL Y SST-MA DE ACUERDO CON EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	15.00	20.41	20.41	18.37	20.41	16.33	18.37	14.29	16.33	14.29	16.33	6.12	0.00	0.00		2.04		2.04		2.04		2.04		2.03		100.00	91.85	13.78
1.3	1.3. REALIZAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA PROYECTAR LOS PLIEGOS, CONDICIONES Y ANEXOS TÉCNICOS, SOCIAL Y SST-MA, PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
1.4	1.4.SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA NECESARIOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO A ESCALA BARRIAL.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0.00																											
2.1	2.1. REALIZAR EL REPORTE MENSUAL DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE ACUERDO A LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA OFICIA ASESORA PLANEACIÓN	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.34		8.34		8.34		8.34		8.33		8.33		100.00	41.65	3.33
2.2	2.2. REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS NO LIQUIDADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES DE OBRA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	7.69	3.85	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		84.62		100.00	7.70	0.62
2.3	2.3. REALIZAR LA DEPURACIÓN FINANCIERA DE LOS SALDOS CONSTITUIDOS COMO PASIVOS EXIGIBLES, EFECTUANDO LOS GIROS Y/O LIBERACIONES DE LOS VALORES	8.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.05	4.32		0.00		94.26		0.00		0.00		0.00		100.00	1.15	0.09
2.4	2.4. REALIZAR LA DEPURACIÓN FINANCIERA DE LOS SALDOS CONSTITUIDOS COMO RESERVAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO 7703, EFECTUANDO LOS GIROS Y/O LIBERACIONES	8.00	5.01	5.01	9.36	4.77	14.73	7.66	6.35	6.73	8.74	8.11	9.48	4.72	7.93		4.62		1.59		5.25		4.61		22.33		100.00	37.00	2.96
2.5	2.5. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS ADELANTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS ACORDE CON LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS	8.00	2.64	2.63	5.26	5.26	7.89	7.89	10.53	10.53	10.53	10.53	13.16	13.16	5.26		5.26		13.16		10.53		7.89		7.89		100.00	50.00	4.00


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 24.78

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá

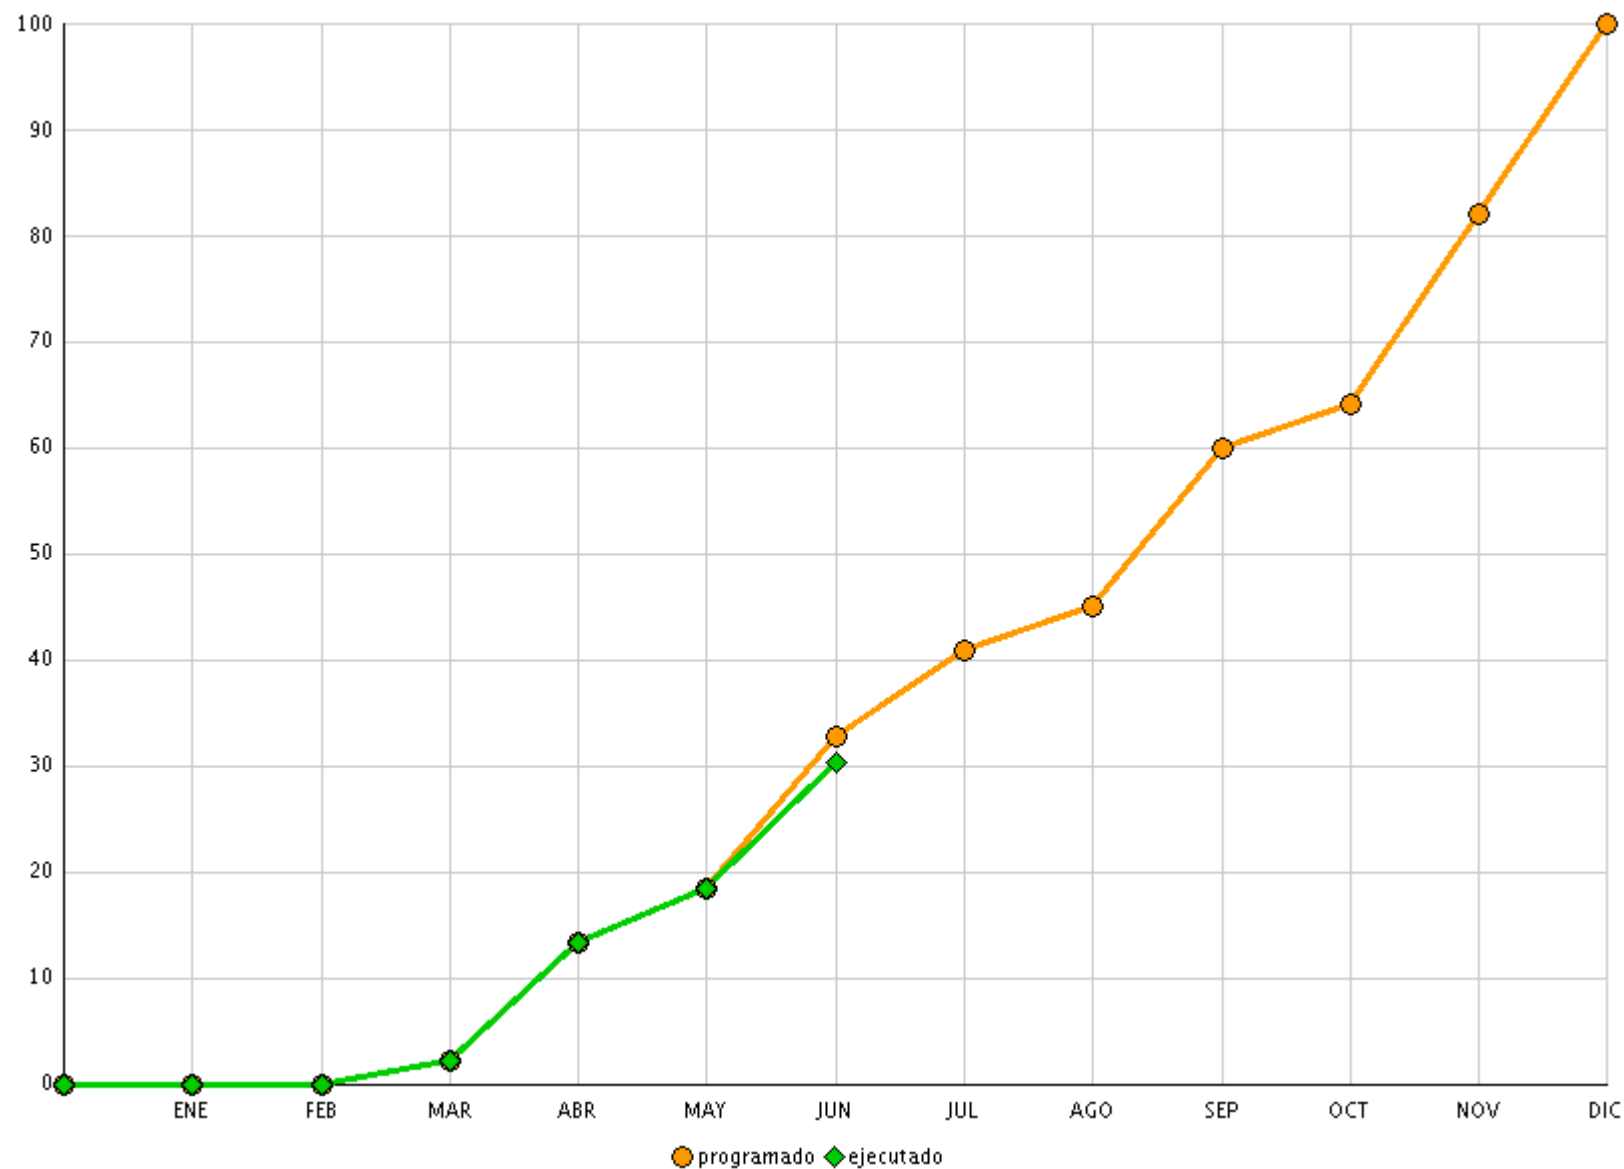


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	2.20	13.31	18.43	32.91	40.92	45.10	60.03	64.21	82.14	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	2.20	13.31	18.43	30.41						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

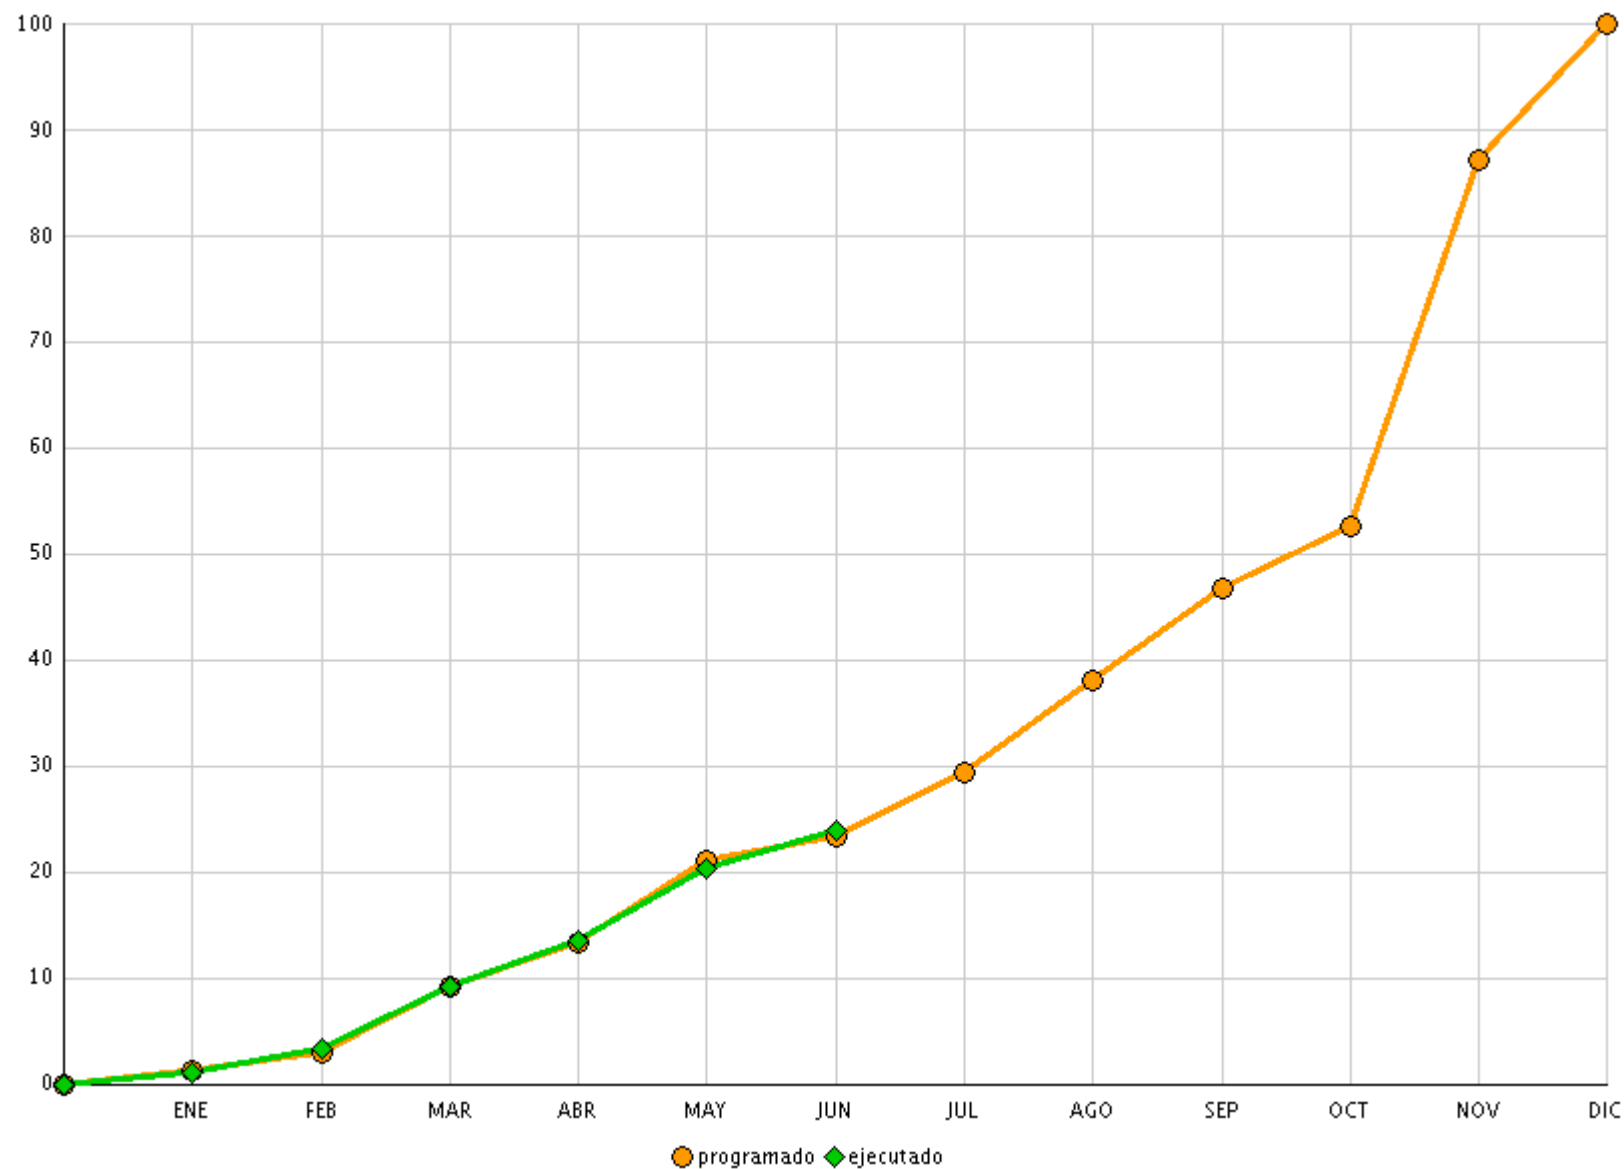


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.34	3.10	9.21	13.43	21.12	23.42	29.46	38.04	46.83	52.67	87.24	100.00
Ejecutado	1.17	3.48	9.24	13.55	20.28	23.92						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá

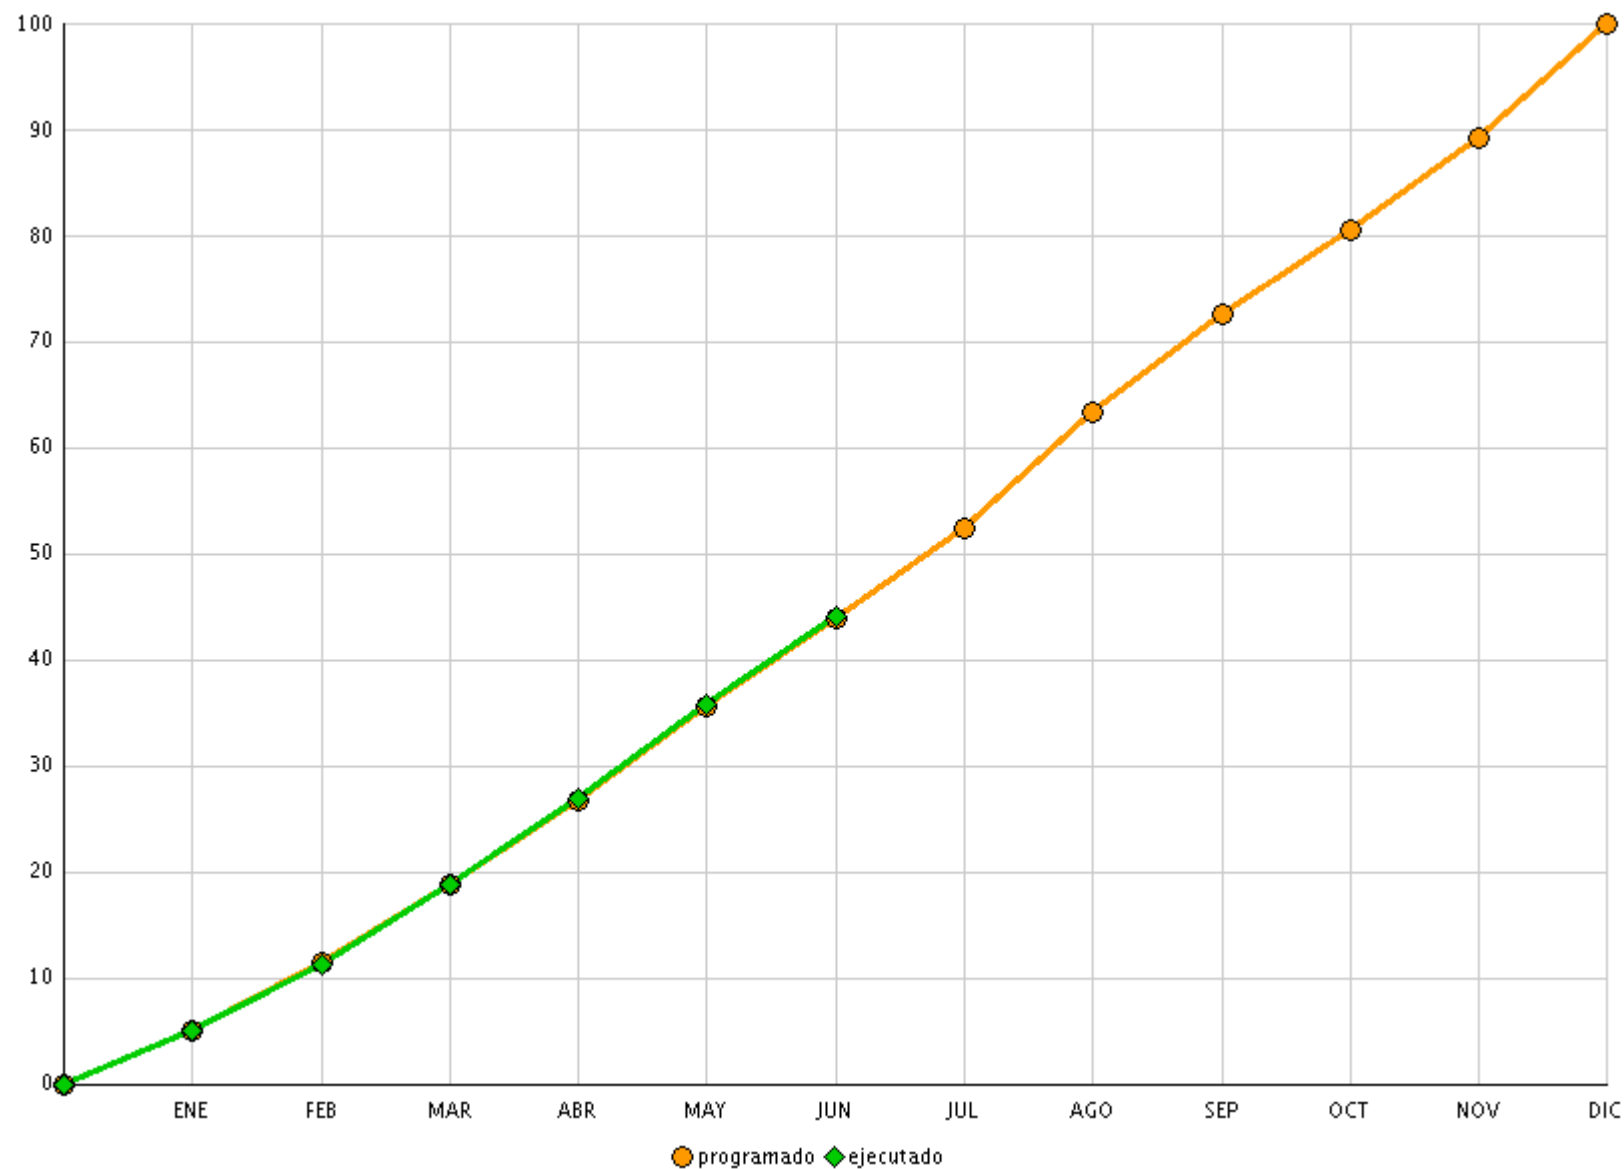


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.06	11.45	18.92	26.83	35.61	43.92	52.38	63.42	72.65	80.58	89.27	100.00
Ejecutado	5.12	11.38	18.89	27.03	35.78	44.17						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá

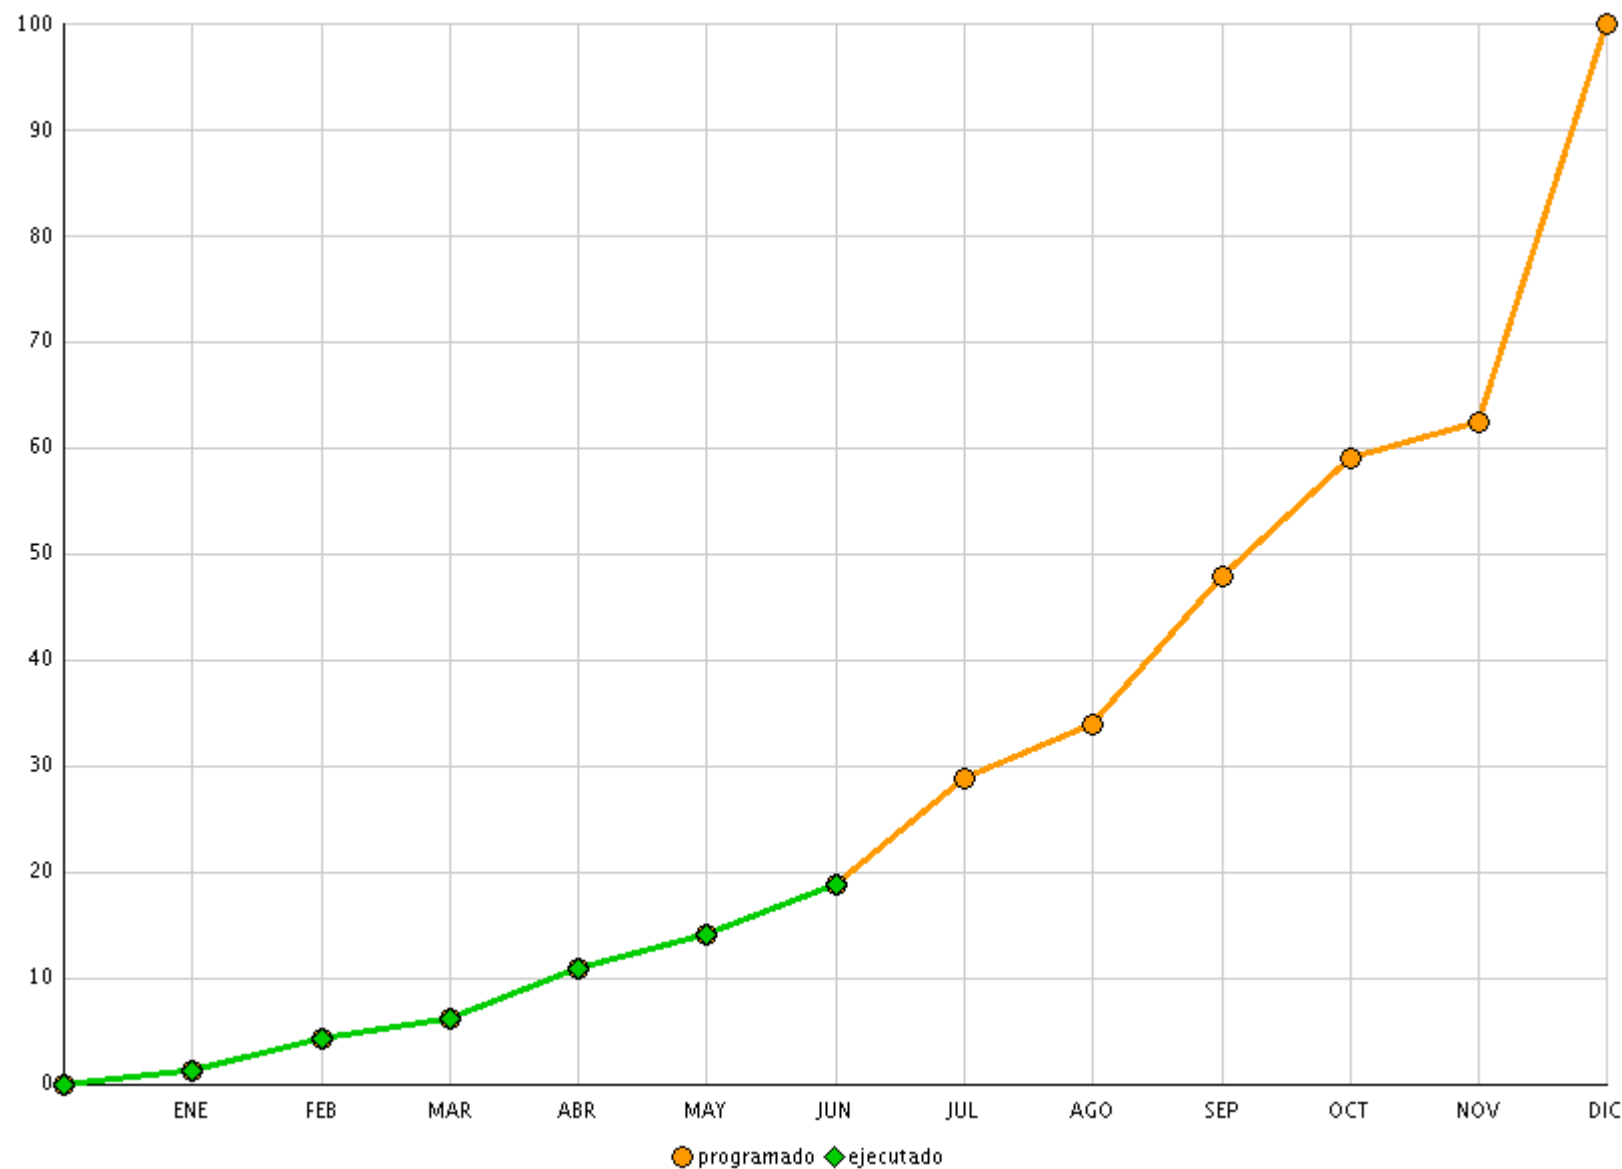


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.40	4.40	6.15	10.90	14.05	18.80	28.90	34.00	47.90	59.00	62.50	100.00
Ejecutado	1.40	4.40	6.15	10.90	14.05	18.80						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá

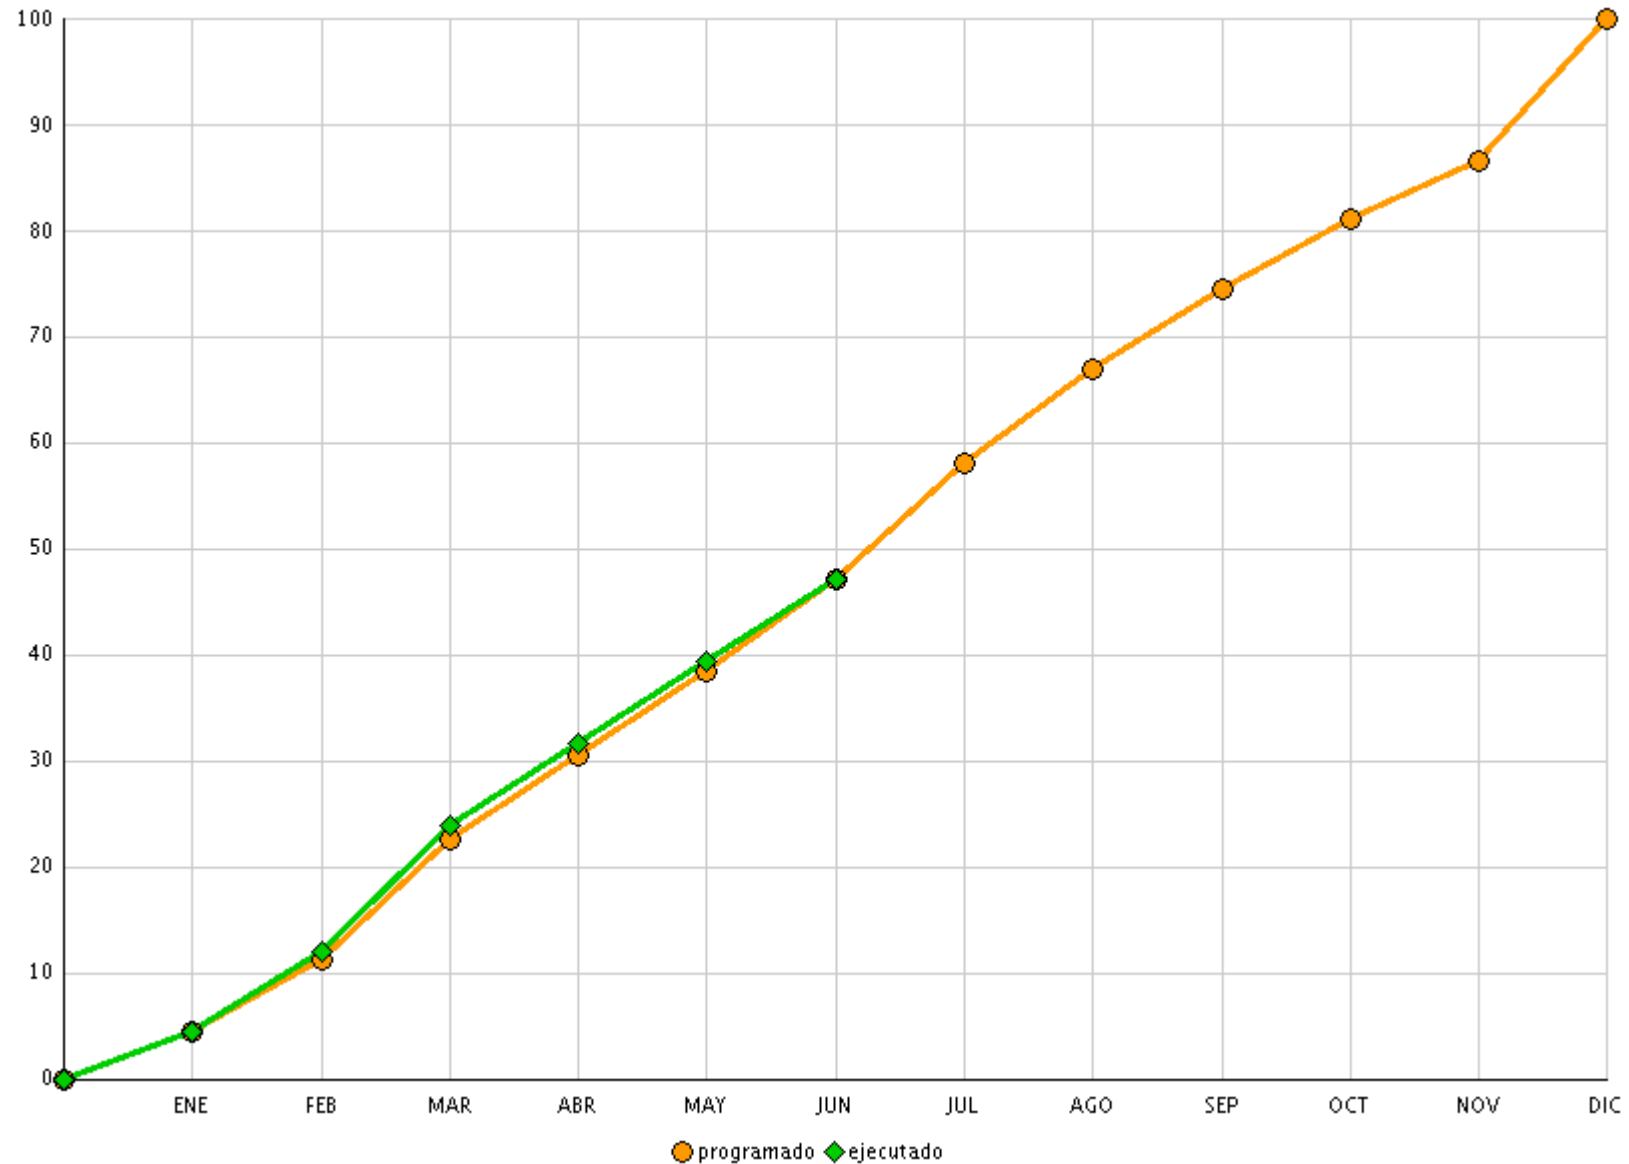


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.50	11.34	22.72	30.50	38.45	47.10	58.15	66.90	74.45	81.10	86.60	100.00
Ejecutado	4.50	12.06	23.92	31.75	39.47	47.20						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

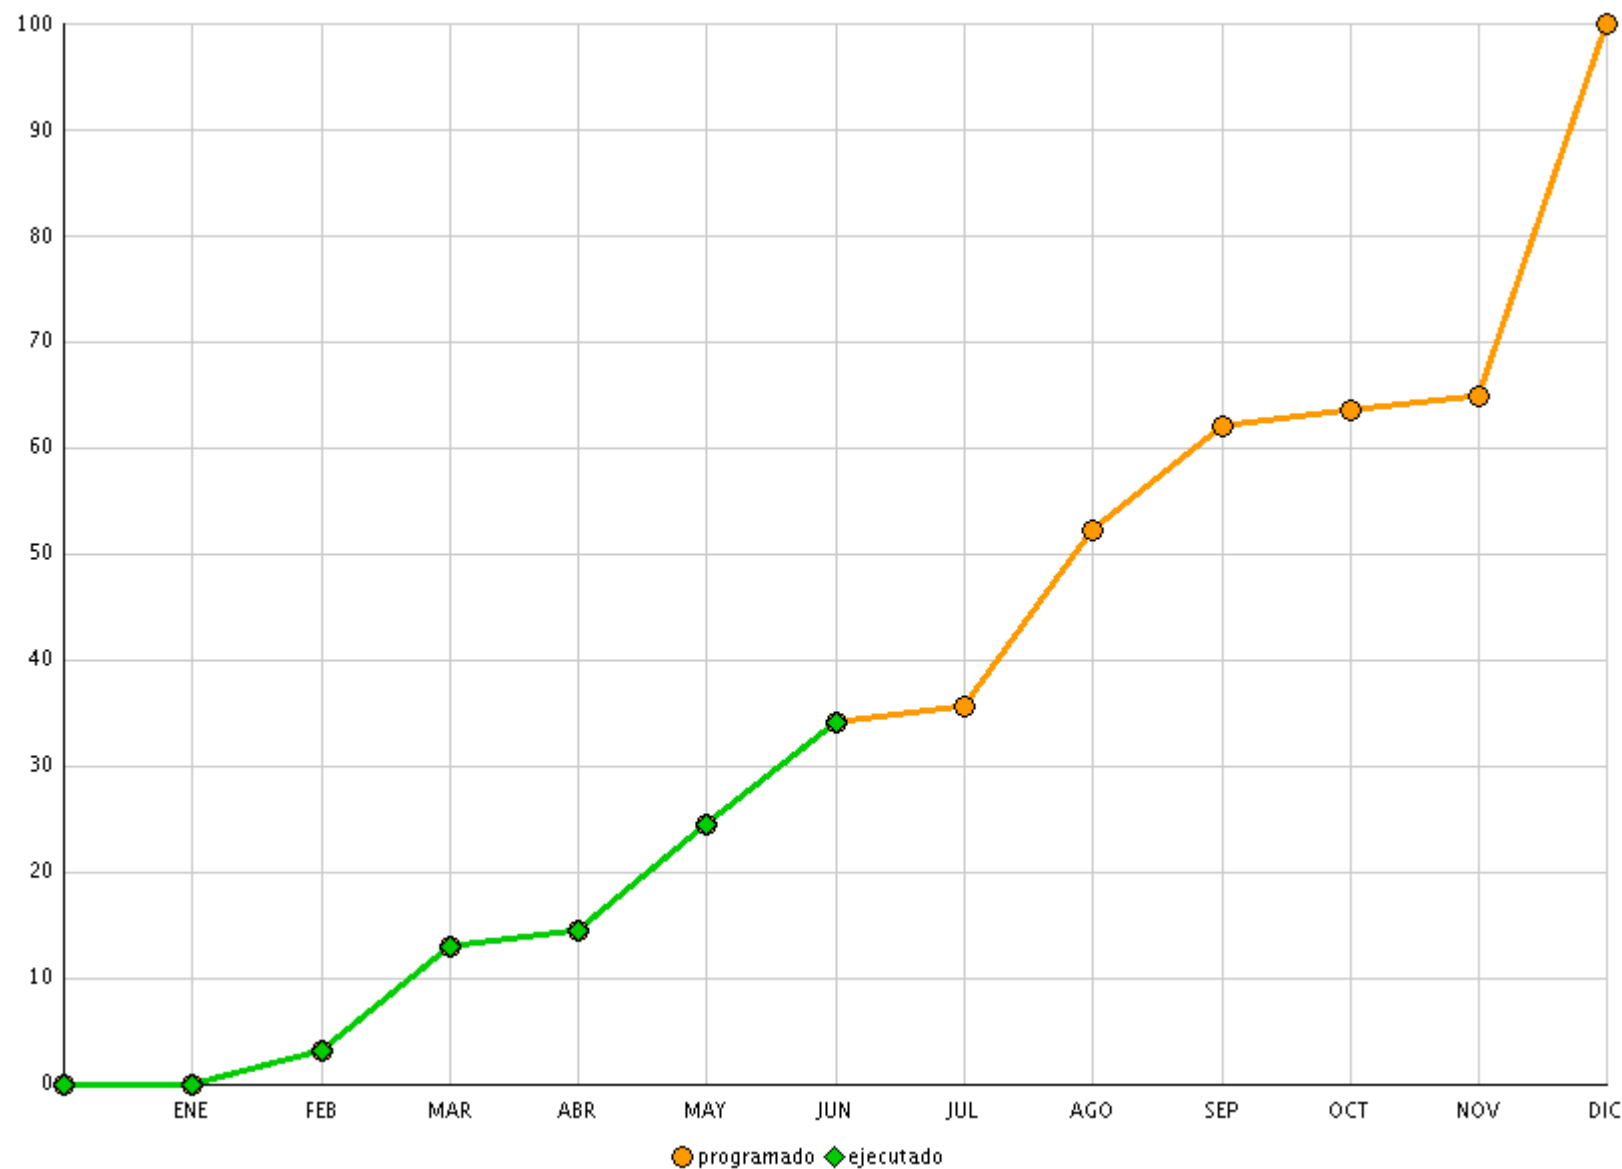


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.25	12.95	14.45	24.45	34.15	35.65	52.30	62.00	63.50	65.00	100.00
Ejecutado	0.00	3.25	12.95	14.45	24.45	34.15						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá

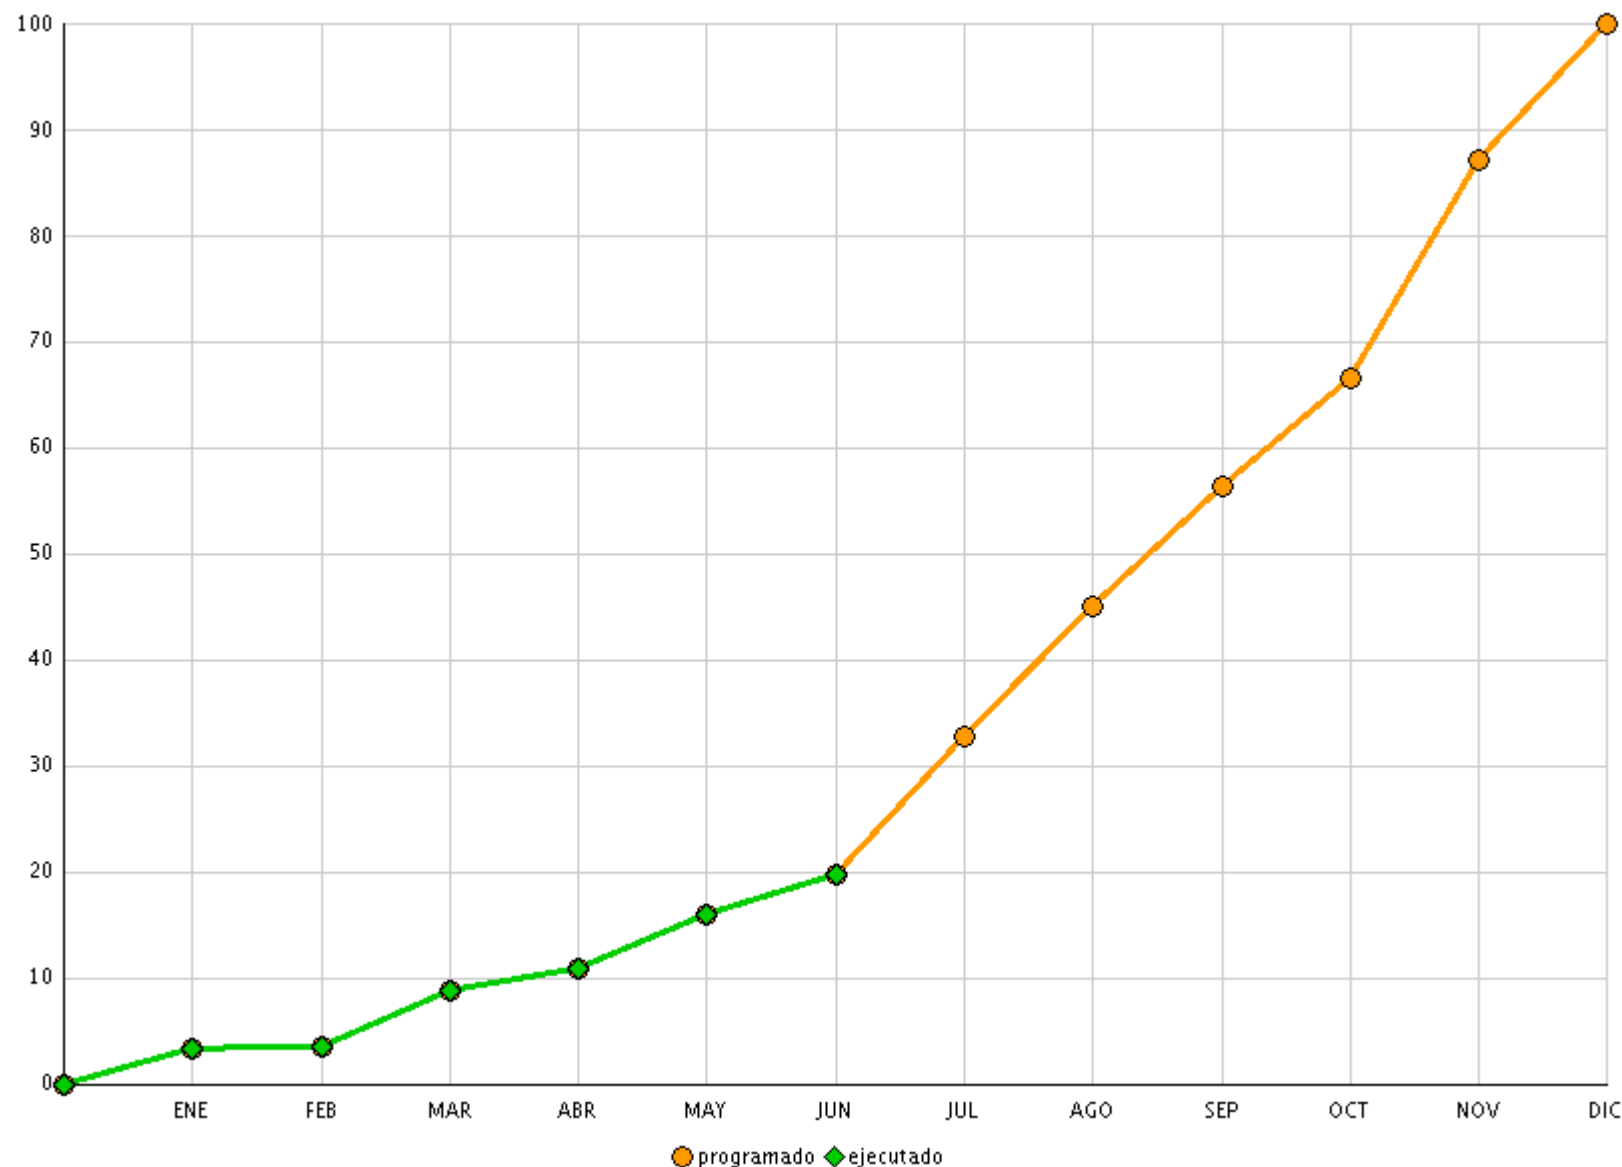


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.37	3.54	8.84	10.96	16.13	19.87	32.91	45.00	56.39	66.57	87.26	100.00
Ejecutado	3.37	3.54	8.79	10.91	16.13	19.87						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá

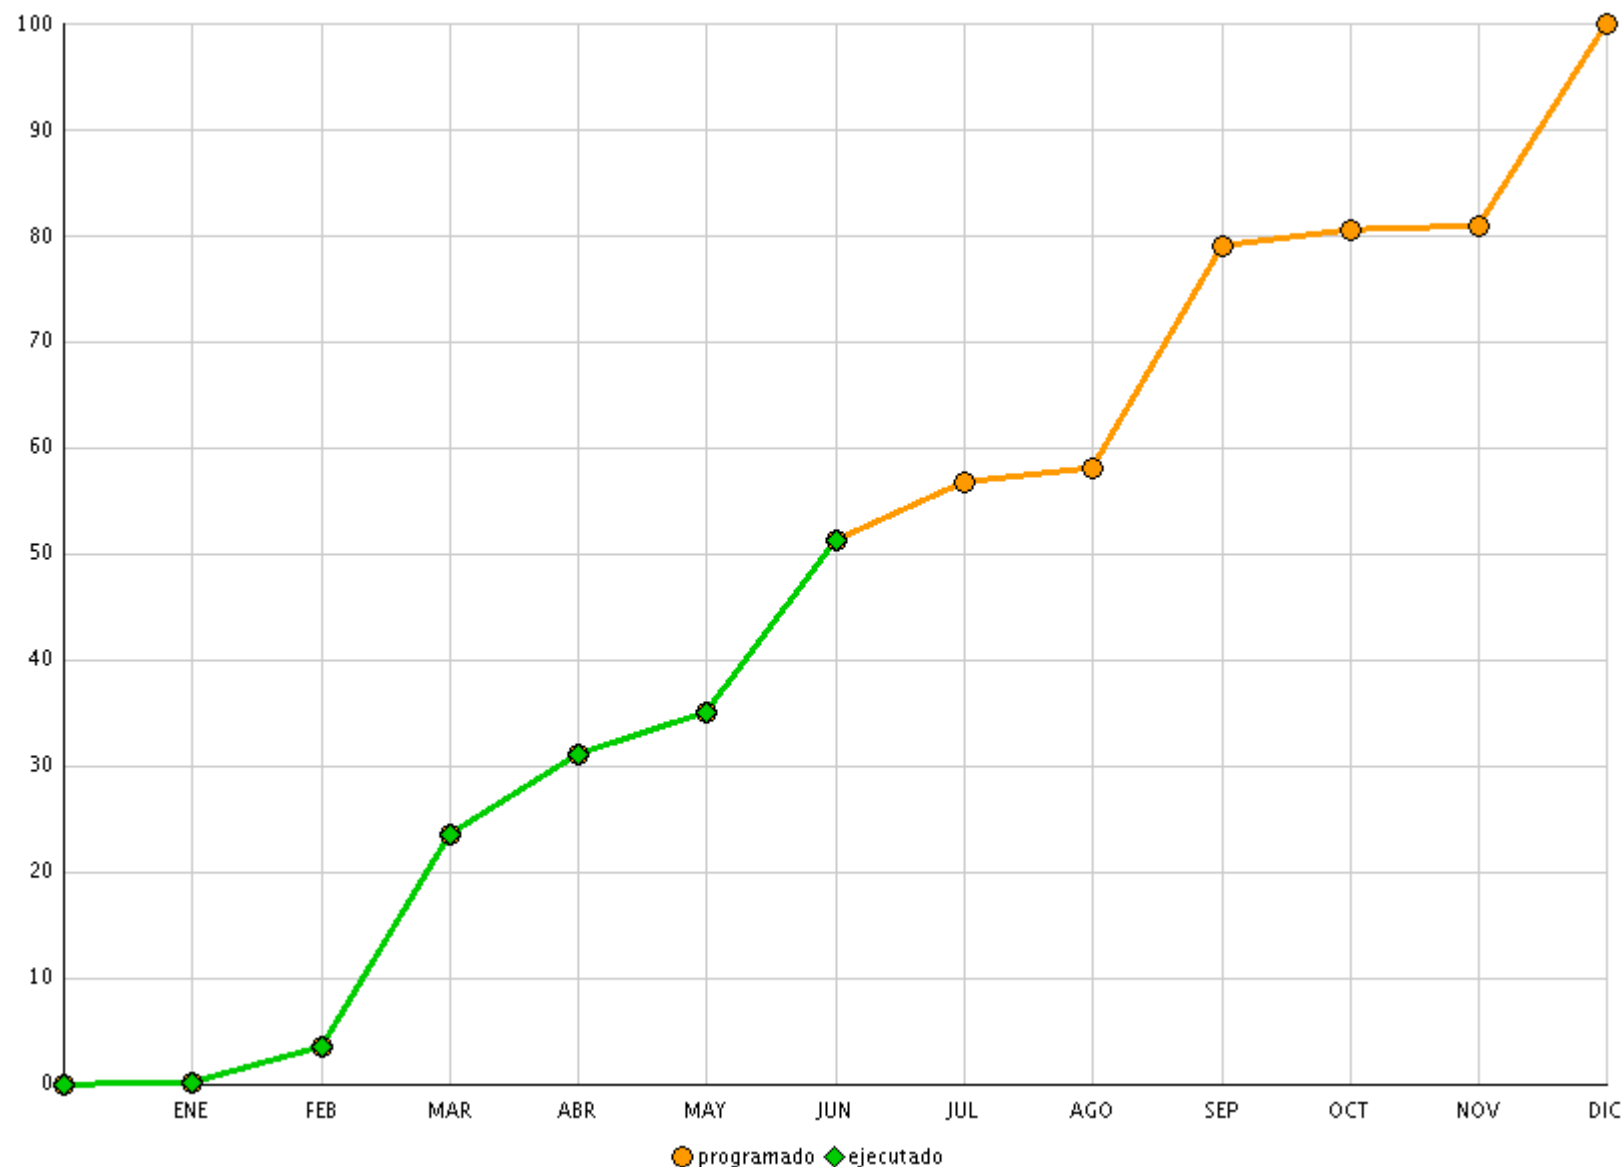

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.25	3.55	23.55	31.10	35.15	51.30	56.80	58.20	79.15	80.55	80.90	100.00
Ejecutado	0.25	3.55	23.55	31.10	35.15	51.30						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7850 53 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE ACUERDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		100.00	70.00	4.20
2.	FESTIVALES O EVENTOS DEPORTIVOS: PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.	REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS FONDOS DE DESARROLLO (RESERVAS) LOCAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	67.00	0.67
4.	REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA CONVOCATORIA, IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5.	FESTIVAL O EVENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.	REALIZAR LAS SESIONES DE PREPARACIÓN DEPORTIVA IMPLEMENTANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	12.54
7.	REALIZAR PROCESOS PARA EL CONTROL Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS Y ETAPAS DEPORTIVAS EN COMPETENCIAS.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		100.00	40.00	12.00
8.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEL LINEAMIENTO DE ENFOQUE DE GÉNERO, DERECHOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9.	GESTIONAR LA POSTULACIÓN DE BOGOTÁ PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DISTRITALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10.	ORGANIZAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL, NACIONAL Y DISTRITAL.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11.	CONVENIOS / INTERCOLEGIADOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12.	DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
13.	PAGAR 100 % DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 30.41

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7851 44 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CIRCULOS LUDICOS	0.20	4.40	0.00	8.90	7.80	8.90	16.10	8.90	9.40	8.90	6.70	8.90	8.90	11.10		6.70		11.10		6.70		8.90		6.60		100.00	48.90	0.10
2. PARQUES PARA LA CULTURA CIUDADANA	8.70	4.60	5.60	8.80	11.70	11.90	9.90	9.30	9.30	10.20	8.90	8.50	10.70	5.80		9.00		11.20		7.00		9.00		4.70		100.00	56.10	4.88
3. RECREATE EN FAMILIA	7.80	5.00	4.00	9.70	13.50	11.20	9.40	9.00	10.10	9.70	7.90	9.40	10.80	6.60		8.00		10.40		7.70		8.20		5.10		100.00	55.70	4.34
4. RED SENSIBILIZANDONOS	2.00	12.00	1.50	0.00	0.00	23.00	29.70	0.20	2.10	25.80	24.00	0.40	6.40	4.50		17.20		0.40		10.50		0.30		5.70		100.00	63.70	1.27
5. VACACIONES RECREATIVAS	3.70	7.70	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	12.00	26.30		0.00		0.00		19.60		9.20		24.60		100.00	20.80	0.77
6. RECREOLYMPIADAS	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	29.00	0.00	0.00	6.50	5.60	0.00		0.00		29.60		4.80		29.50		0.00		100.00	34.60	0.52
7. RECONOCIENDO NUESTRAS HABILIDADES	3.80	0.40	0.40	1.50	1.40	16.20	18.30	13.10	12.60	14.00	13.20	1.50	2.00	1.50		12.00		16.20		11.00		12.60		0.00		100.00	47.90	1.82
8. RECORRIENDO MI CIUDAD	1.10	0.00	0.00	6.70	6.70	10.50	10.50	9.30	9.30	9.00	8.70	9.60	10.00	9.60		8.90		9.60		9.60		8.60		8.60		100.00	45.20	0.50
9. ECOAVENTURAS	1.10	0.00	0.00	8.50	8.60	9.70	10.10	9.70	9.80	10.30	10.20	7.10	7.50	7.90		9.40		9.40		9.40		9.90		8.70		100.00	46.20	0.51
10. ACCIONES RECREATIVAS FDL	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	25.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	0.08
11. EVENTOS METROPOLITANOS	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	5.90	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60		27.70		0.00		11.10		22.20		22.20		100.00	11.20	0.59
12. CAMPEONATOS	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	14.00		21.00		32.50		16.30		9.30		2.30		100.00	4.60	0.59
13. CERTÁMENES DE NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	20.00	0.30
14. ACCIONES DEPORTIVAS FDL	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	88.90	62.50	0.00	37.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				100.00	100.00	2.40
15. IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	1.25
17. JORNADAS DE FORTALECIMIENTO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	4.00
18. GUÍAS METODOLOGICAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
19. CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A CONSEJOS LOCALES DRAFE	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
20. PAGAR EL 100% DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 23.92

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7852 27 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTIVIDAD FÍSICA COMUNIDAD GENERAL	21.00	4.80	4.87	9.20	8.00	9.20	9.90	9.20	9.30	9.20	10.10	6.90	6.90	6.60		8.90		8.90		9.10		9.00		9.00		100.00	49.07	10.30
2. ACTIVIDAD FÍSICA PERSONA MAYOR	6.00	4.40	5.00	8.90	8.60	8.90	9.60	8.90	9.90	8.90	9.70	7.60	7.80	7.60		8.90		8.90		8.90		9.10		9.00		100.00	50.60	3.04
3. DEPORTE PARA LA VIDA	11.00	4.80	5.40	9.10	10.00	9.10	10.10	9.10	9.30	9.10	10.10	7.70	8.50	6.00		8.80		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	53.40	5.87
4. EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	7.70	7.70	7.70		0.00	7.70	7.70	7.70		30.80						15.40		23.00		100.00	23.10	2.31
5. ACTIVIDAD FÍSICA - FONDOS DESARROLLO LOCAL (RESERVAS)	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	33.80	11.00	0.00	33.00		11.00		0.00		0.00						100.00	33.80	0.34
6. ACTIVIDAD FÍSICA - SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL (RESERVAS)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.50
7. AL TRABAJO EN BICI	7.00	6.80	7.20	7.60	7.70	8.30	7.80	9.20	9.40	9.20	9.90	9.20	9.80	9.20		6.60		6.60		9.20		9.10		9.00		100.00	51.80	3.63
8. CICLOVÍAS DOMINICALES, FESTIVAS Y NOCTURNAS.	21.00	9.40	9.00	6.30	6.30	6.30	6.00	7.80	8.00	7.80	7.80	7.80	7.80	10.90		9.40		6.30		9.40		9.40		9.20		100.00	44.90	9.43
9. ESCUELA DE LA BICI	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.70	8.20	7.70	7.70	8.30	8.70	8.30	9.00	9.60		7.80		7.80		9.60		9.60		9.60		100.00	47.60	3.33
10. ACTIVIDADES PROMOCIÓN USO DE LA BICICLETA - FONDOS DESARROLLO LOCAL (RESERVAS)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100.00	33.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.33
11. BICIEXPERIENCIAS (EVENTOS RECREATIVOS, ACADÉMICOS Y DEPORTIVOS DE PARTICIPACIÓN MASIVA)	4.00	5.60	5.60	5.60	5.60	11.10	6.00	5.60	6.00	11.10	17.00	5.60	6.00	5.60		11.10		5.60		11.10		5.60		16.40		100.00	46.20	1.85
12. PERSONAS BENEFICIADAS EN JORNADAS DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN FÍSICA - MUÉVETE BOGOTÁ	5.00	2.00	2.00	5.00	5.60	6.90	7.20	10.50	11.60	11.20	13.00	13.00	12.70	10.50		12.40		16.50		5.80		4.20		2.00		100.00	52.10	2.61
13. PERSONAS BENEFICIADAS EN EVENTOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		81.30		0.00		0.00		18.70		100.00	0.00	0.00
14. DISEÑAR E IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE MEDICIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS IMPACTOS EN CUANTO A SALUD FÍSICA Y MENTAL	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00		22.00		0.00		23.00		0.00		23.00		100.00	32.00	0.64
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							44.17	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7853 28 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR ACCIONES PARA EL CUIDADO, LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS.	9.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00		16.00		0.00		16.00		0.00		20.00		100.00	48.00	4.32
2.	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS OPERADOS.	1.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00		16.00				16.00		0.00		20.00		100.00	48.00	0.48
3.	REALIZAR ACCIONES DE REVERDECIMIENTO, ARBOLADO Y EMPRADIZACIÓN DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS PRIORIZADOS	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		40.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4.	MITIGAR LOS EFECTOS A TRAVES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL POR LAS INTERVENCIONES REALIZADAS.	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		40.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5.	REALIZAR ACCIONES PARA LA INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LOS PARQUES Y ESCENARIOS PRIORIZADOS.	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15.00		0.00		0.00		85.00		100.00	0.00	0.00
6.	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN PARQUES Y ESCENAROIOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15.00		0.00		0.00		85.00		100.00	0.00	0.00
7.	OPERAR LOS PARQUES Y ESCENARIOS	34.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	13.60
8.	REALIZAR CONVOCATORIAS A LA COMUNIDAD, ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y CONECTIVIDAD BAJO UN ENFOQUE POBLACIONAL Y DE GÉNERO	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
9.	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MEJORAMIENTO EN LOS PARQUES Y ESCENARIOS PRIORIZADOS.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20.00		0.00		30.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
10.	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN PARQUES Y ESCENARIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00				30.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
11.	PAGAR EL 100% DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										18.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7854 39 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. SESIONES DE CLASE DE FORMACIÓN EN CENTROS DE INTERÉS DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA (PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ESCOLAR).	25.00	0.00	0.00	4.00	7.00	4.00	6.00	7.00	7.00	7.00	8.10	13.00	9.60	13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		0.00		100.00	37.70	9.43	
2. FESTIVALES, EXHIBICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS (PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ESCOLAR).	5.00	0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	40.00	33.80	44.00	38.70	2.00		4.00		2.00		4.00		1.00		0.00		100.00	75.50	3.78	
3. PLANEACCIÓN DE ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	9.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	9.00	
4. EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00	
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00	
6. IDENTICACIÓN Y CONVOCATORIA DE POSIBLES TALENTOS DEPORTIVOS	9.00	0.00	0.00	33.30	33.00	33.30	33.00	33.40	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	9.00	
7. ENTRENAMIENTO DE RESERVA Y TALENTO DEPORTIVO	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	3.50	
8. VALORACIÓN DE DEPORTISTAS PARA LA PROYECCIÓN A ALTO RENDIMIENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00	
9. INVESTIGACIÓN INCLUSIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50	
10. PLANEACCIÓN DE LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	4.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.00	
11. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	0.00	5.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.00	
12. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								47.20	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7855 26 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y MEDIR EL SECTOR DEL DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, SU ECONOMÍA Y ESTRATEGÍAS DE INNOVACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		40.00		100.00	25.00	3.75
2.	DESARROLLAR LOS 5 COMPONENTES PARA LA INICIATIVA DE CLÚSTER	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		40.00		100.00	25.00	4.75
3.	DESARROLLAR ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ALIANZAS	8.00	0.00	0.00	13.00	13.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		19.00		6.00		6.00		6.00		20.00		100.00	37.00	2.96
4.	SUSCRIBIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS	17.00	0.00	0.00	13.00	13.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		19.00		6.00		6.00		6.00		20.00		100.00	37.00	6.29
5.	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS Y VIABILIDAD DE POSIBLES ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	40.00	10.40
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	40.00	6.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									34.15	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7856 28 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL VELÓDROMO BOGOTÁ, UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBALTAR) (INTERVENTORÍA))	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		76.00		0.00		24.00				100.00	0.00	0.00
2.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL FASE I	1.00	8.00	8.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.00		0.00		15.00		0.00		0.00		100.00	39.00	0.39
3.	ESTUDIOS DE PATOLOGÍA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE UDS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		17.00		0.00		100.00	33.00	0.33
4.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE VERAGUAS PZ-28, CÓD. IDRD 16-221	1.00	8.00	8.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	0.85
5.	ESTUDIOS Y DISEÑOS ECOLOGICOS Y DE INGENIERIA PARQUE GIBALTAR	1.00	0.00	0.00		0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00		0.00		0.00		20.00		30.00		10.00		100.00	30.00	0.30
6.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE ZONAL HACIENDA LOS MOLINOS	1.00	0.00	0.00		0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00		0.00		0.00		20.00		30.00		10.00		100.00	30.00	0.30
7.	CONSULTORÍA ACTUALIZACION Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		10.00		10.00		20.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8.	GESTIONAR MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA EL PROCESO DE GESTIÓN	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BUZONES DE CORREO ELECTRONICOS, HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA GE	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00		0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		100.00	67.00	0.40
10.	GESTIONAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PRO PLUS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS	0.10	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.10
11.	PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA META DEL PROYECTO	2.10	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	1.47
12.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANIZACIÓN CHICO CÓD. 02-231	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		5.00		15.00		15.00		20.00		25.00		100.00	0.00	0.00
13.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL LA VIDA CÓD. 01-012	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00		10.00		5.00		15.00		20.00		25.00		100.00	20.00	1.36
14.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL RINCON DE LOS ANGELES CÓD. 08-108	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00		10.00		5.00		15.00		20.00		25.00		100.00	20.00	1.36
15.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CEFE COMETAS CÓD. 11-204 (ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO INTERVENTORÍA)	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BILBAO CÓD. 11-074	6.80	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		41.00		0.00		0.00		100.00	26.00	1.77
17.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL SANTA ANA CÓD. 01-133 (REGALÍAS)	6.80	1.00	1.00	0.00	0.00	58.00	58.00	25.00	25.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.80
18.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA CÓD. 18-207 (REGALÍAS)	6.80	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		33.00		25.00		16.00		0.00		0.00		100.00	1.00	0.07
19.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BUENAVISTA EL PORVENIR, CÓDIGO IDRD 19-347	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00		10.00		0.00		5.00		35.00		25.00		100.00	15.00	1.02
20.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PORVENIR BOSA, CÓDIGO IDRD 07-391	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00		10.00		0.00		5.00		35.00		25.00		100.00	15.00	1.02

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte

7856 28 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
21. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SANTA LUCÍA, CÓDIGO IDRD 18-073	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		5.00		15.00		15.00		35.00		10.00		100.00	0.00	0.00
22. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL FASE I	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		75.00		25.00		100.00	0.00	0.00
23. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL VERAGUAS PZ-28, CÓD- 16-221.	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		12.00		0.00		38.00		0.00		100.00	0.00	0.00
24. GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES - ARL	0.10	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	0.07
25. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO A LAS OBRAS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
26. PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA META DEL PROYECTO	1.20	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	0.84
27. ATENDER COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTADO DE PASIVOS EXIGIBLES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	4.00	4.00	1.00	1.00	4.00		33.00		8.00		9.00		8.00		26.00		100.00	12.00	0.72
28. PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA META DEL PROYECTO	1.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	0.70
29. GESTIONAR GARANTIA EXTENDIDA DE SERVIDORES, NETWORKING, ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DELL	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		19.87		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7857 22 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		10.00		100.00	50.00	2.50
2. MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.50
3. DESARROLLAR ACCIONES PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
4. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO SIGA	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00		15.00		10.00		15.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.30
5. SUMINISTRAR LOS APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO A LA GESTIÓN	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	17.50
6. SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS, BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		30.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
7. PROCESOS Y ACTIVIDADES PARA EL ROBUSTECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN DEL INSTITUTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	15.00
8. EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		51.30		

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7597 Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

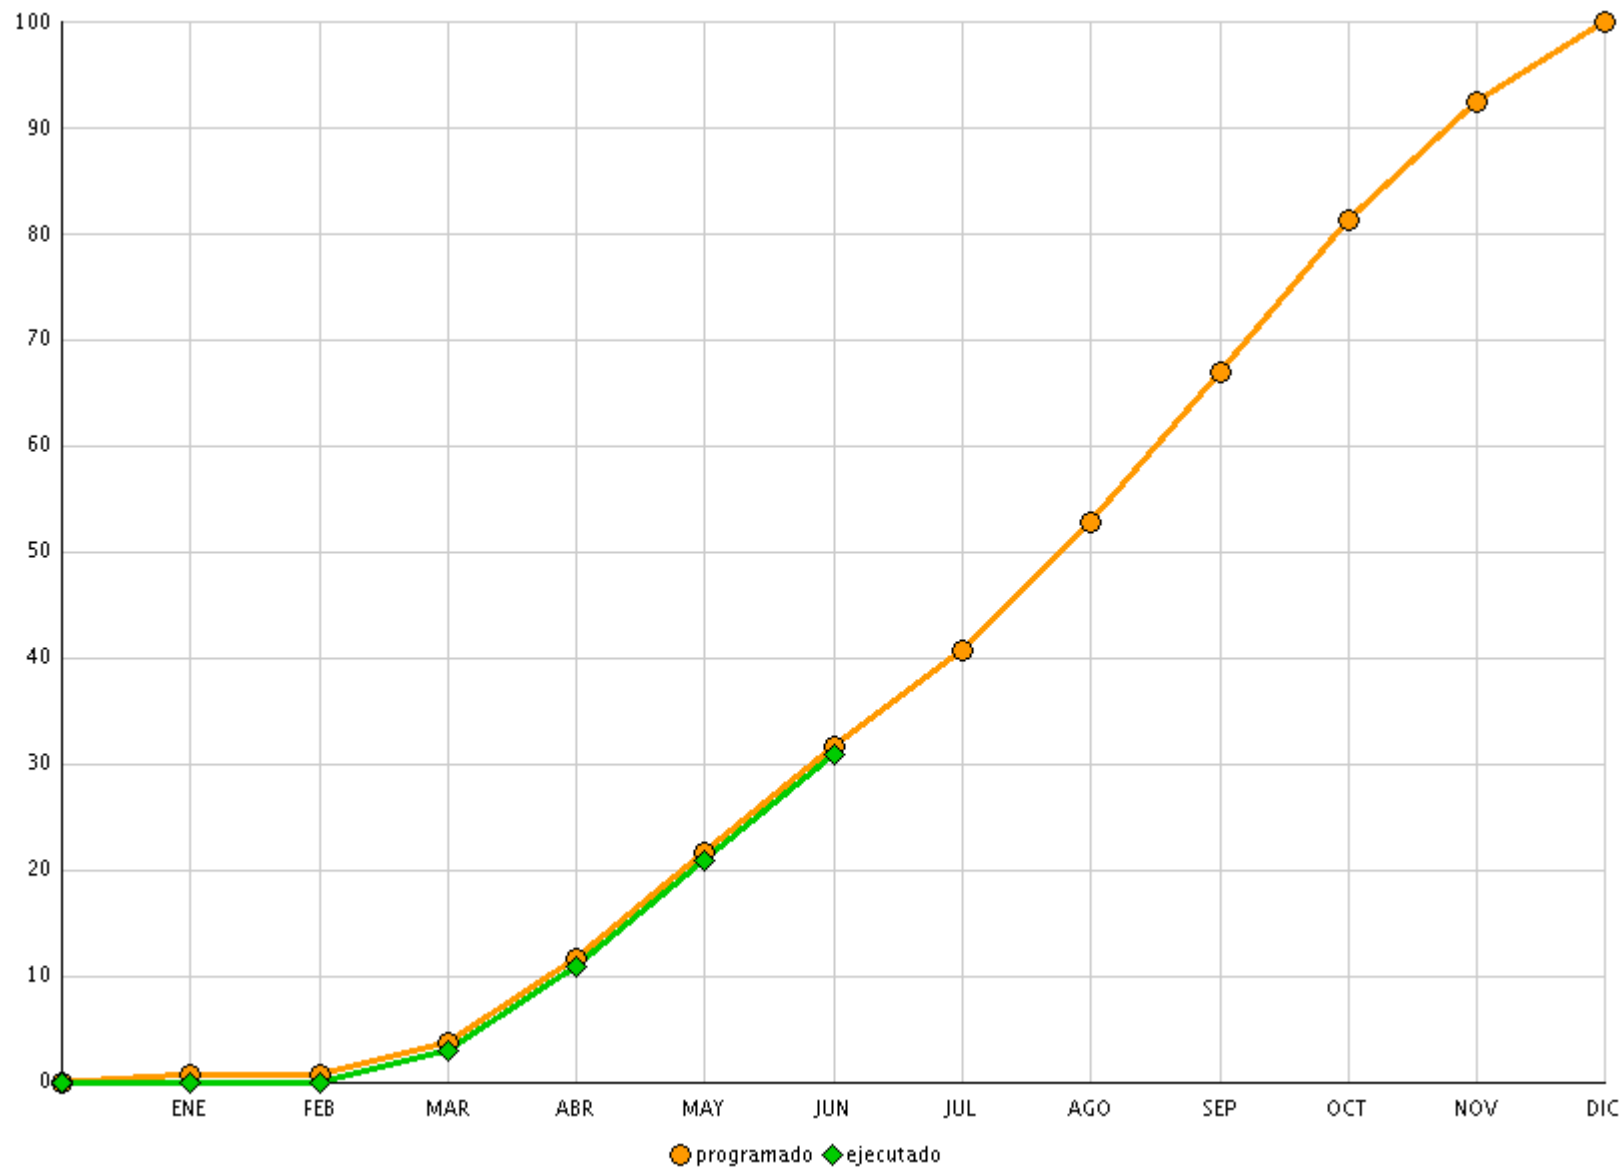


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.75	0.75	3.75	11.75	21.75	31.75	40.75	52.75	67.00	81.25	92.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	3.00	11.00	21.00	31.00						

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7601 Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá

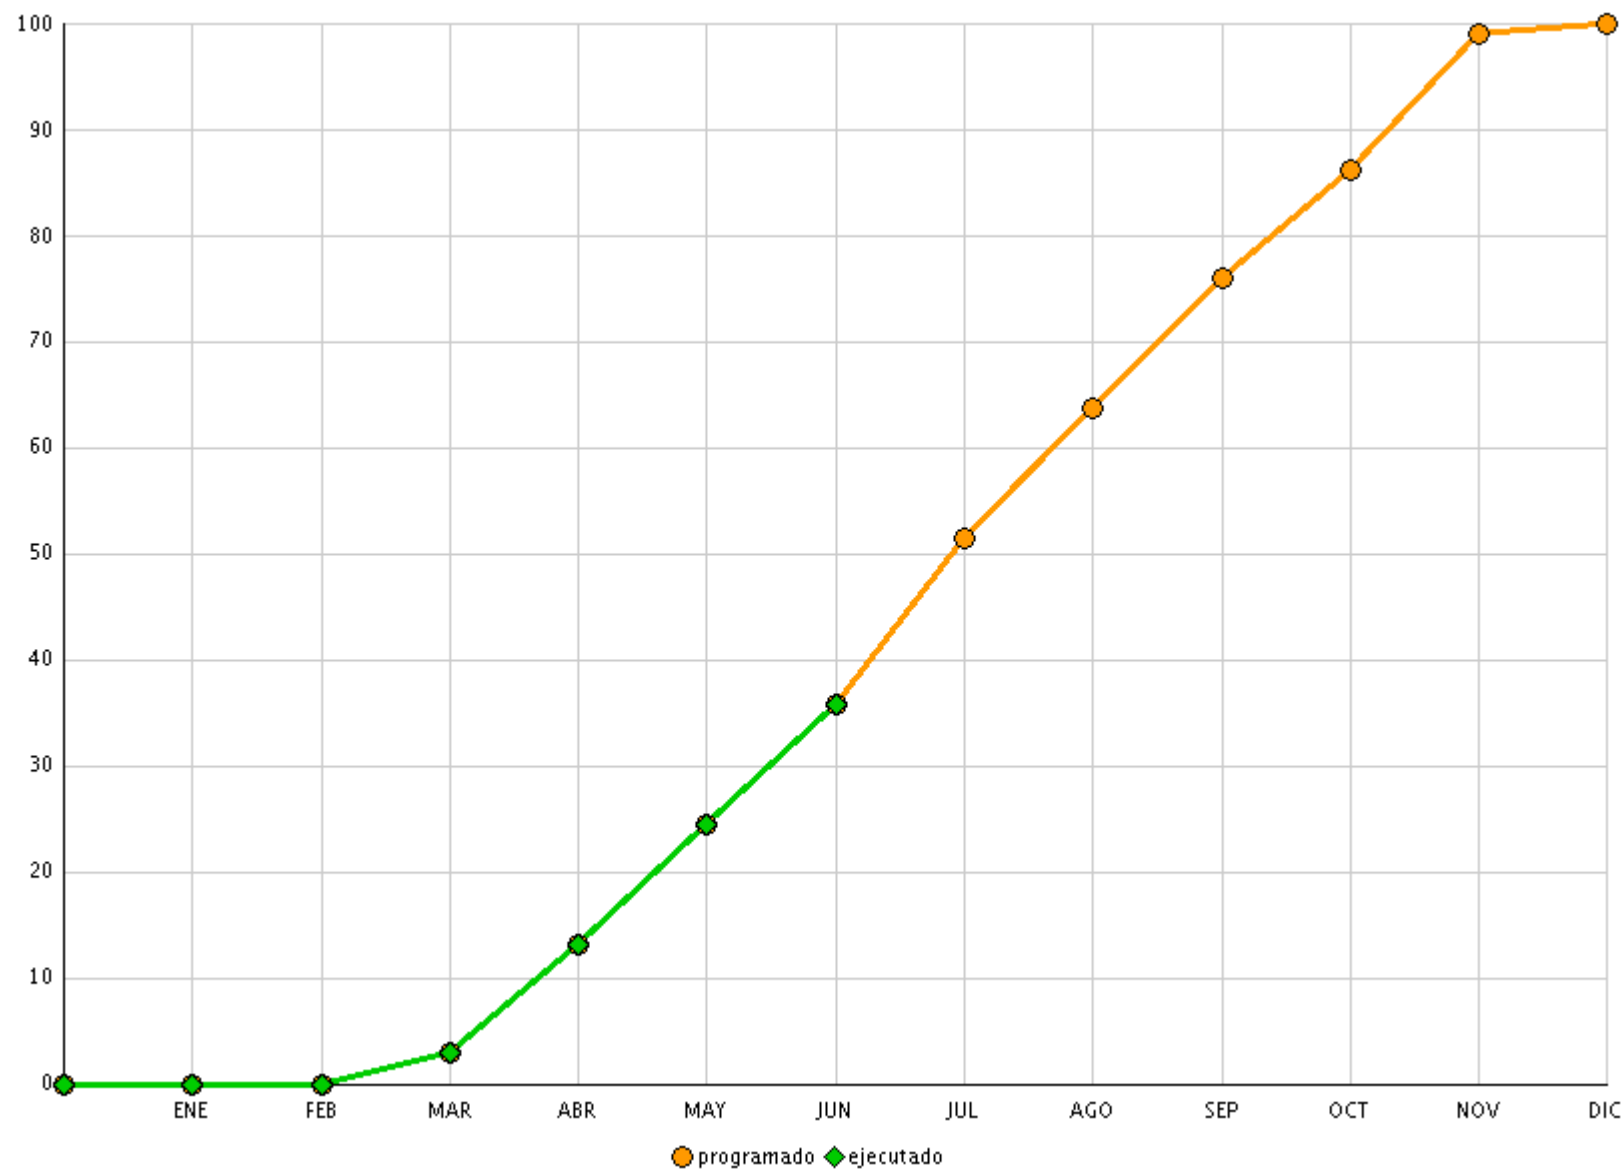


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	3.00	13.25	24.50	35.75	51.50	63.75	76.00	86.25	99.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	3.00	13.25	24.50	35.75						

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7611 Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá

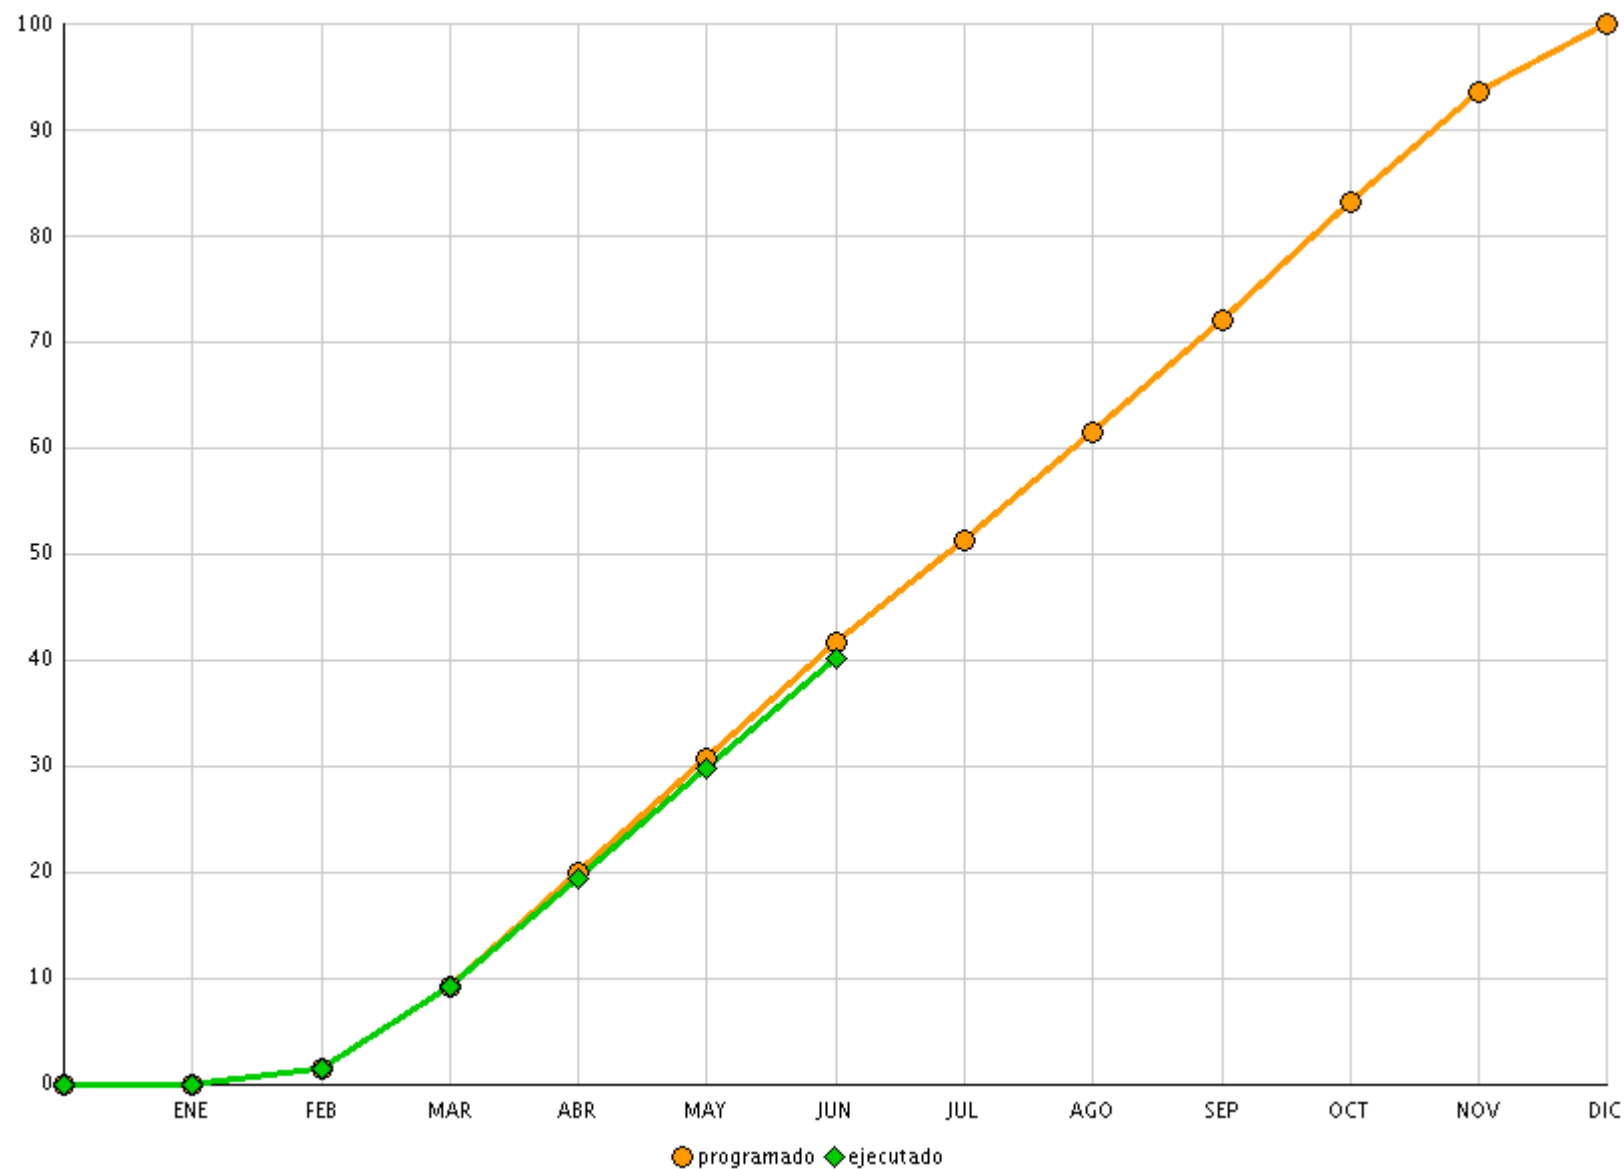


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.50	9.25	20.00	30.75	41.75	51.25	61.50	72.00	83.25	93.50	100.00
Ejecutado	0.00	1.50	9.25	19.50	29.75	40.25						

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7612 Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá

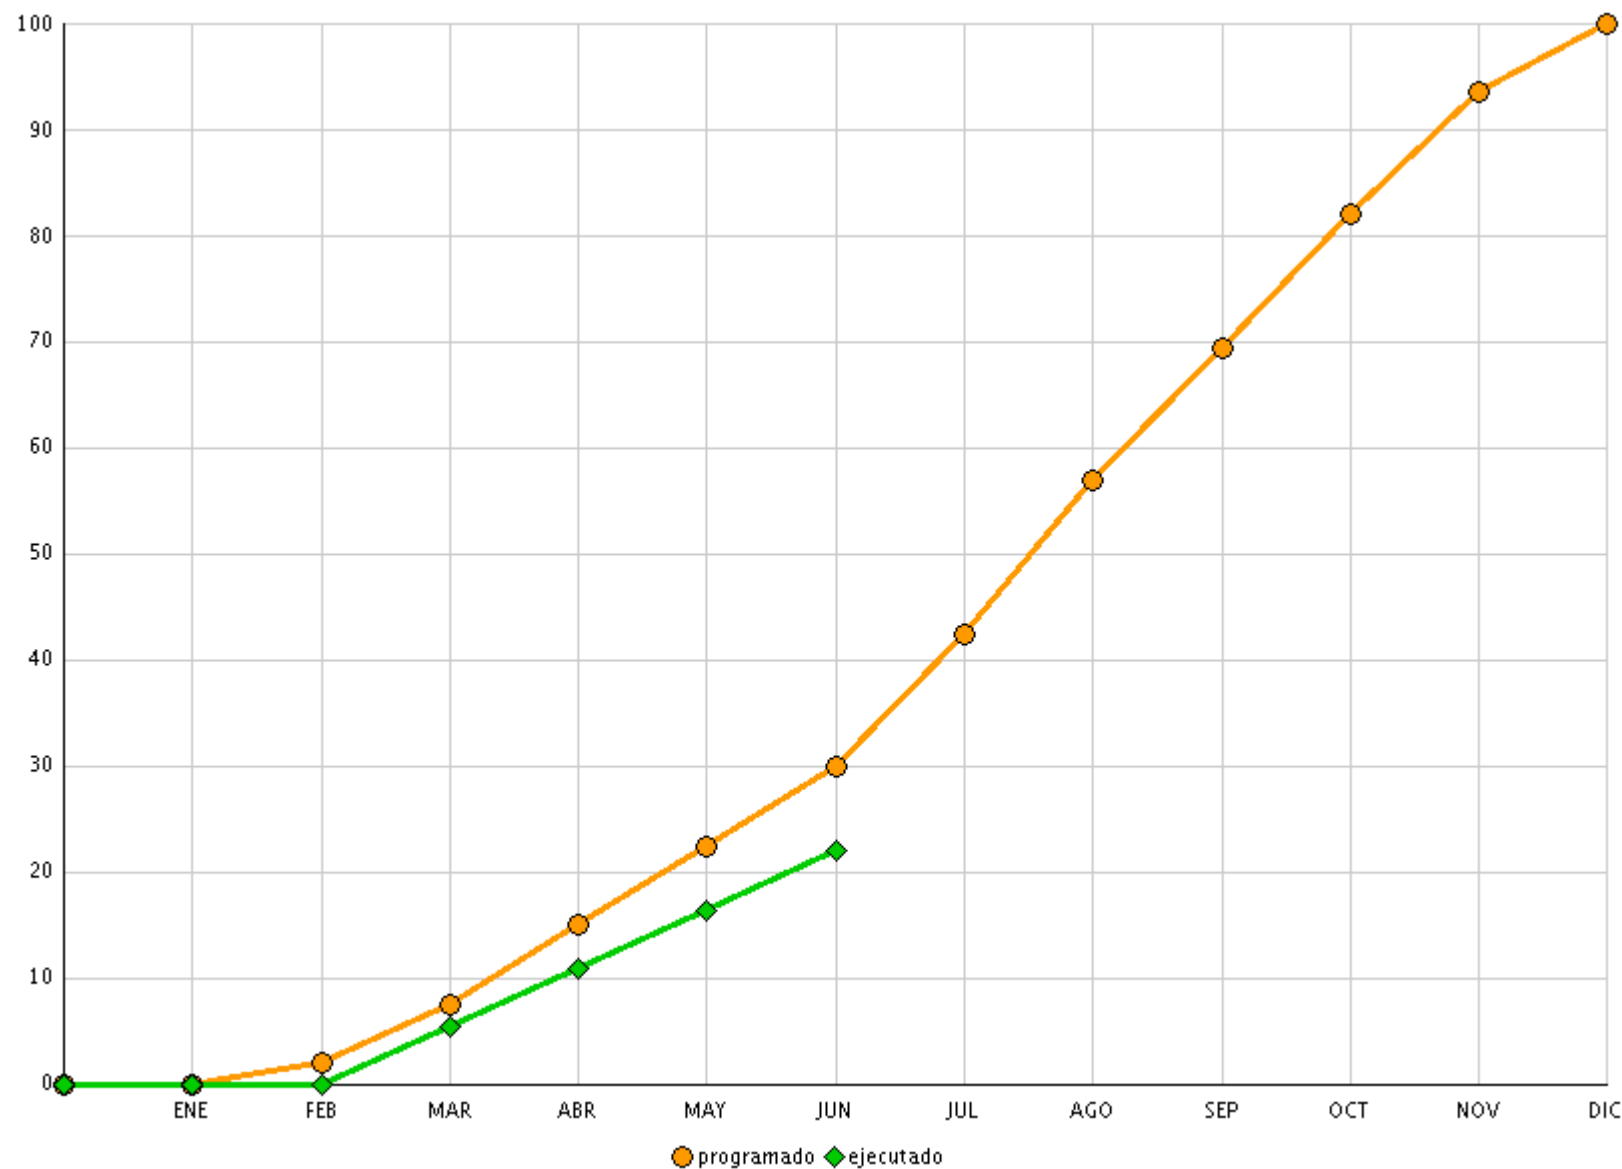


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.00	7.50	15.00	22.50	30.00	42.50	57.00	69.50	82.00	93.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	5.50	11.00	16.50	22.00						

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7639 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

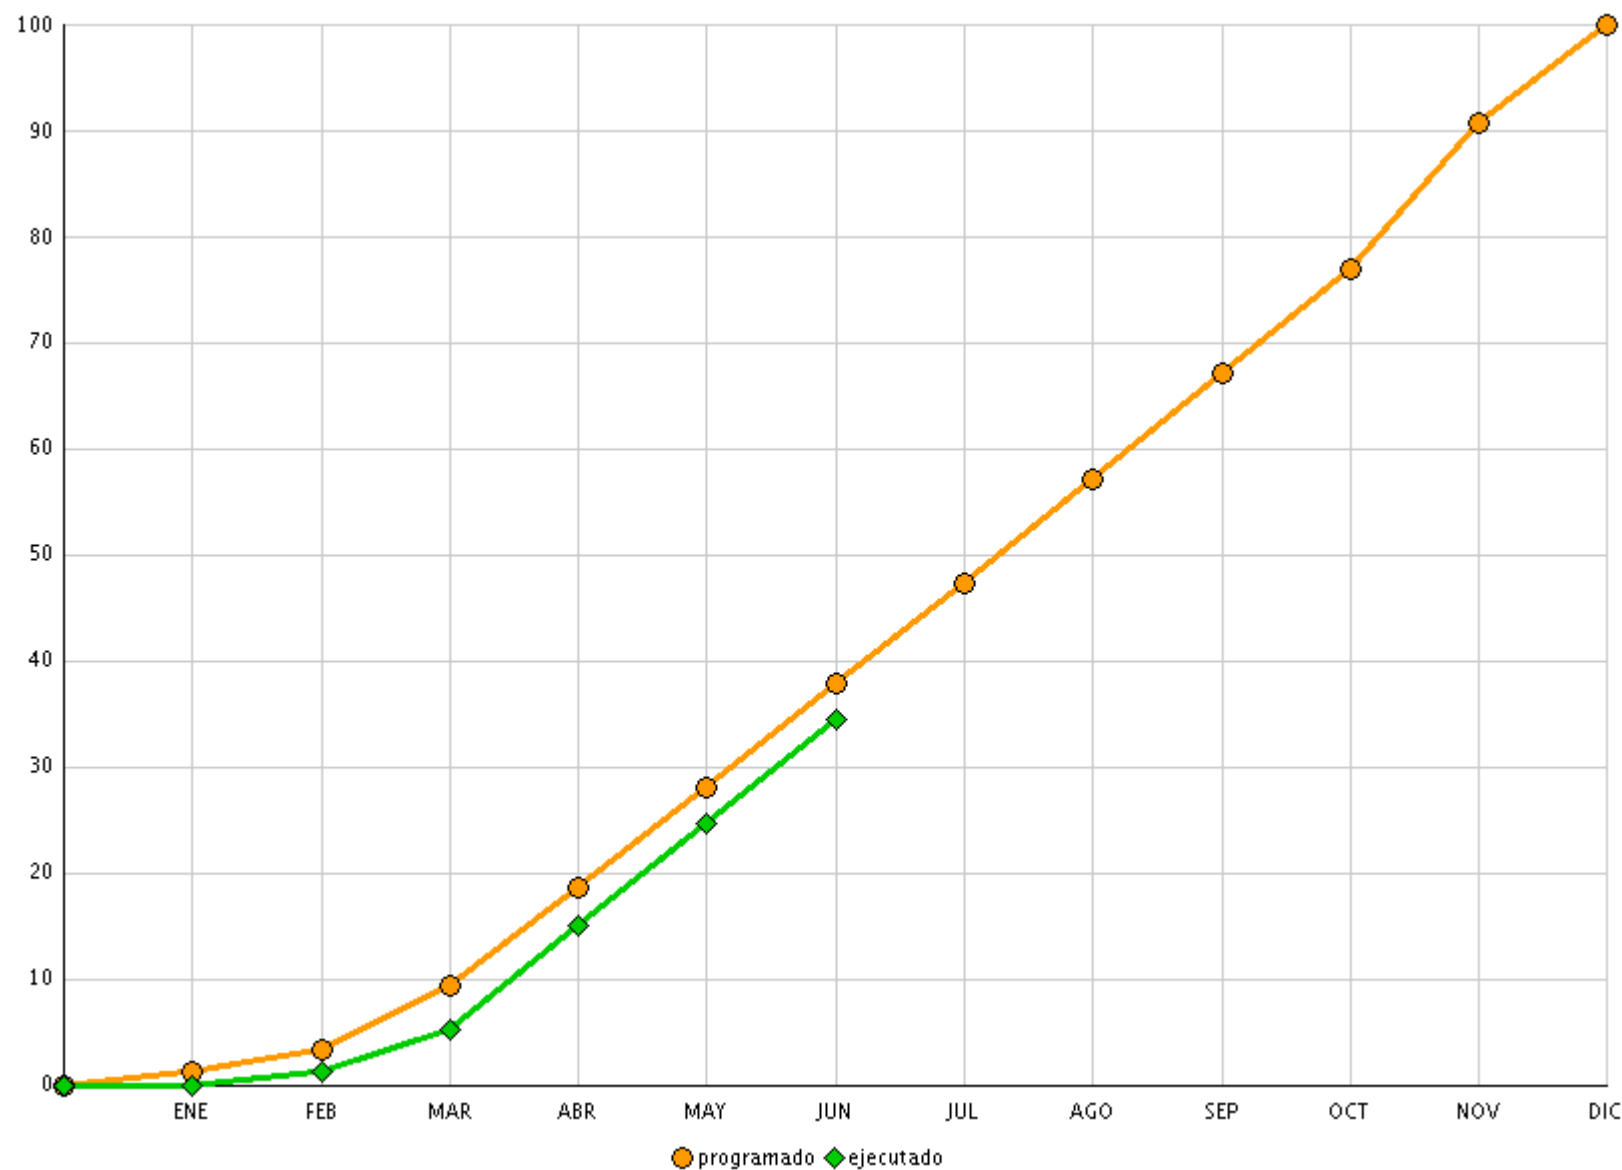


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.30	3.45	9.45	18.60	28.05	37.85	47.35	57.20	67.25	76.95	90.75	100.00
Ejecutado	0.00	1.40	5.35	15.00	24.70	34.55						

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7649 Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

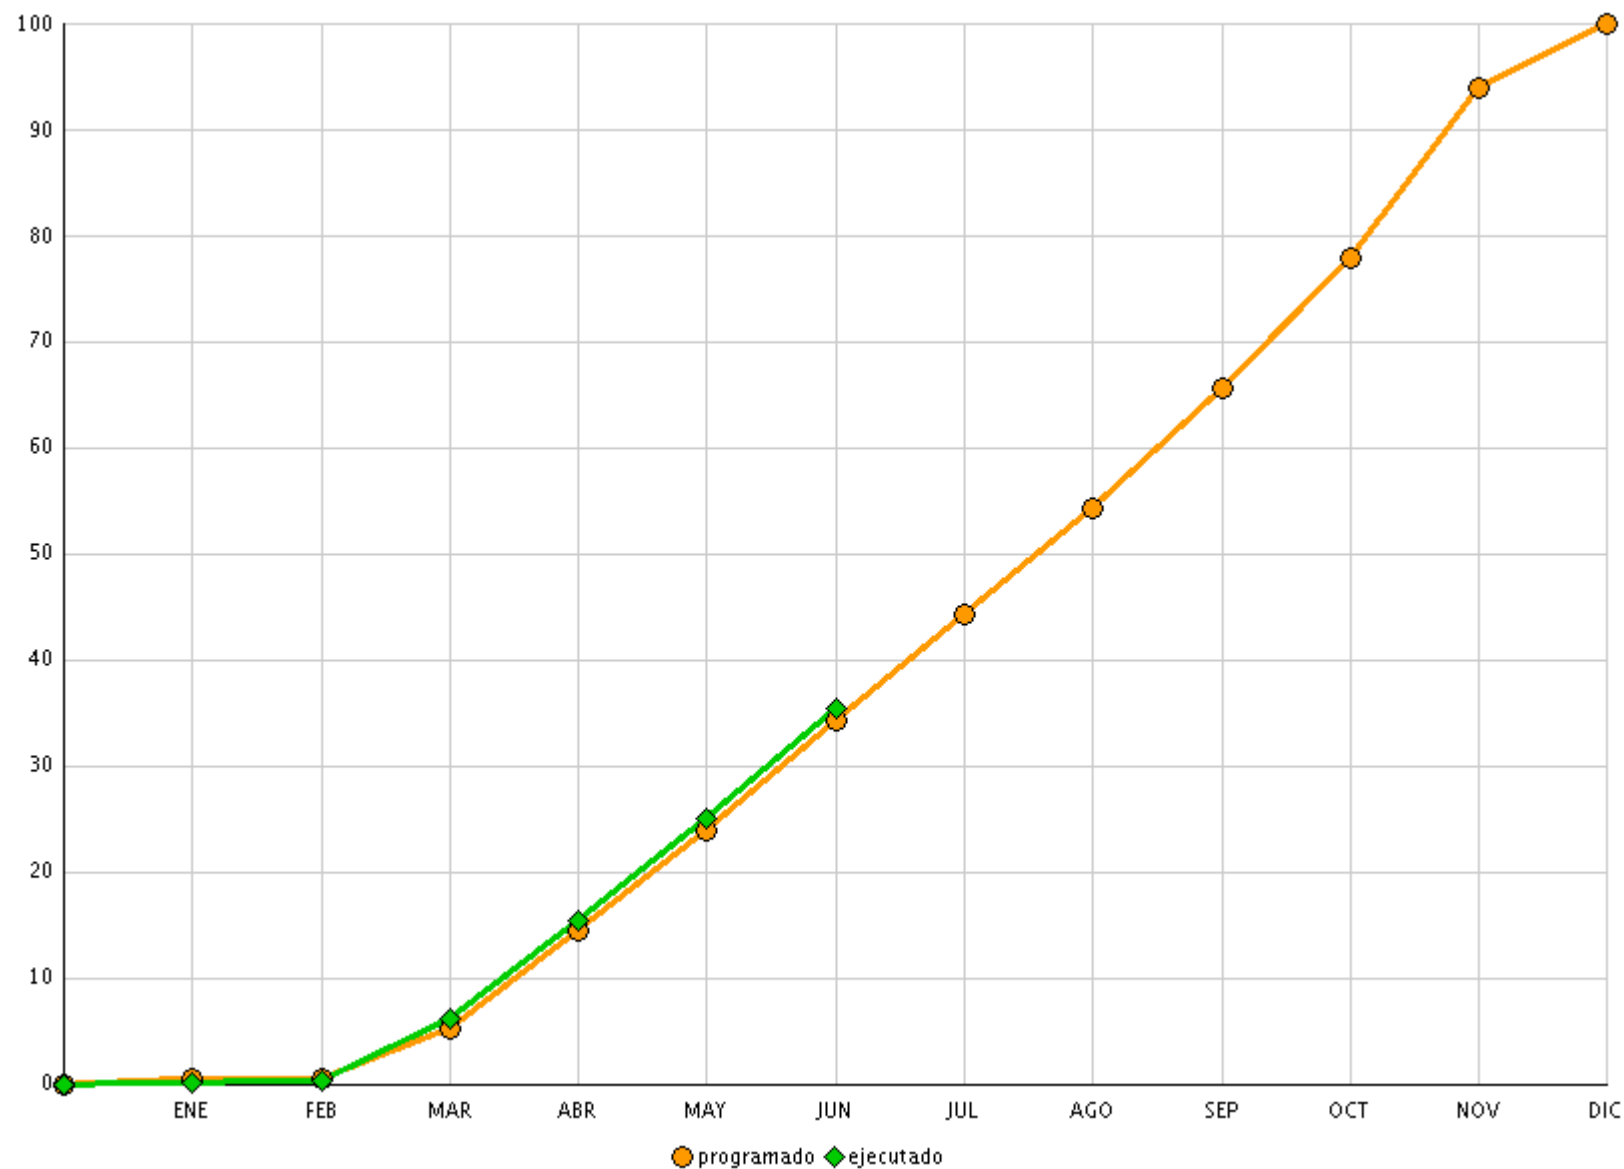

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.50	0.50	5.25	14.50	24.00	34.25	44.25	54.25	65.75	78.00	94.00	100.00
Ejecutado	0.10	0.35	6.30	15.55	25.05	35.40						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7597 34 Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	FORMULAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00		10.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	35.00	15.75	
2.	ADQUIRIR EQUIPOS HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	25.00	3.75	
3.	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	5.25	
4.	FORMULAR, IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN PUBLICA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	25.00	6.25	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		31.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7601 32 Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	DISEÑAR LA METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL QUE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00		5.00		5.00		5.00		30.00		0.00		100.00	15.00	1.50	
2.	IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL CICLO DE EDUCACION INTEGRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		10.00		10.00		0.00		100.00	42.50	17.00		
3.	IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL IDPC	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		0.00		100.00	37.50	11.25		
4.	PROMOVER UN PROCESO DE FORMACIÓN A MADRES, PADRES, SABEDORES, CUIDADORES, CUIDADORAS Y SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL SECTOR CRD EN PATRIMONIO CULTURAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	30.00	6.00		
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		35.75	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7611 43 Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	INTERVENIR BIENES DE INTERÉS CULTURAL, INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EN EL DISTRITO CAPITAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00
2.	INTERVENIR BIENES MUEBLES Y/O MONUMENTOS LOCALIZADOS EN EL DISTRITO CAPITAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00
3.	AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00		10.00		10.00		15.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50
4.	FOMENTAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TORNO A LA ACTIVACIÓN DE MEMORIA Y PATRIMONIOS INTEGRADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
5.	PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MONUMENTOS MEDIANTE EL PROGRAMA "ADOPTA UN MONUMENTO"	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
6.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, MANEJO, INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL D.C	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	1.75
7.	ORIENTAR A LA CIUDADANÍA ACERCA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO CAPITAL	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.75
8.	RESPONDER LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA PARA CONSERVAR, PROTEGER Y RECUPERAR EL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO CAPITAL	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.75
9.	REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LOS TRÁMITES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ENFOCADOS A LA REDUCCIÓN U OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS Y ACTIVIDADES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.50
10.	PROMOVER JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN RELACIÓN A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										40.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7612 27 Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AVANZAR EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS COLUMBARIOS	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	8.00
2.	AVANZAR EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA, ANTIGUO CEMENTERIO DE POBRES	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	14.00
3.	TALLERES DE ACTIVACIÓN PATRIMONIAL DE LOS COLUMBARIOS Y EL ANTIGUO CEMENTERIO DE POBRES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4.	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										22.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7639 29 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECONOCER Y PROMOVER ACCIONES PARA LA INTERPRETACIÓN DE NARRATIVAS QUE TIENE LA CIUDADANÍA ALREDEDOR DEL PATRIMONIO DE BOGOTÁ	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	30.00	1.50
2. DESARROLLAR LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES ORIENTADAS A PÚBLICOS DIVERSOS QUE PERMITA RECONOCER AL MUSEO DE BOGOTÁ -MDB Y AL MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA -MCA	7.00	15.00	0.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	35.00	2.45
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MUSEO DE BOGOTÁ, PROPICIANDO PROCESOS DE CO-CREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN TORNOS A LA CIUDAD Y A SU FORMA DE HABITARLA Y VIVIRLA	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	1.75
4. DESARROLLAR EL PROYECTO DE DIVULGACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL QUE PERMITA POSICIONAR EL MUSEO DE BOGOTÁ COMO UN ESPACIO DE DEBATE CIUDADANO	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.50
5. DESARROLLAR UN ESTUDIO DE AUDIENCIAS Y DE PÚBLICOS DEL MUSEO DE BOGOTÁ Y MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA, QUE PERMITA GENERAR ESTRATEGIAS DE RELACIONAMIENTO CON PÚBLICOS POTENCIALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. FORTALECER Y APOYAR LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS EN LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, RAFAEL URIBE URIBE, MÁRTIRES, SUMAPAZ Y CIUDAD BOLÍVAR (BECA MCA)	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		0.00		0.00		100.00	40.00	2.80
7. GESTIONAR LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE BOGOTÁ EN LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA "COLECCIONES COLOMBIANAS", PARA FACILITAR SU USO Y CONSULTA A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS REALIZADOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	30.00	0.60
8. DISEÑAR LA ACTIVACIÓN DEL ÁREA ARQUEOLÓGICA PROTEGIDA DE LA HACIENDA EL CARMEN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
9. IMPLEMENTAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, ACTIVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL ÁREA ARQUEOLÓGICA PROTEGIDA DE LA HACIENDA EL CARMEN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
10. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN SOCIAL Y SALVAGUARDIA DE LOS PATRIMONIOS INTEGRADOS DEL CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS -CHSJD (CONVENIO 342 DE 2021 ERU- IDPC)	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
11. GENERAR NUEVOS SENTIDOS SOBRE BOGOTÁ Y SUS PATRIMONIOS CULTURALES CON LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DE LAS PUBLICACIONES DEL SELLO EDITORIAL DEL IDPC	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
12. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL IDPC, PARA LA PROMOCIÓN DE REDES DE DIÁLOGOS, INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS DE LOS PATRIMONIOS DE LA CIUDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
13. VISIBILIZAR LA GESTIÓN MISIONAL E INSTITUCIONAL DEL IDPC, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNAS E INTERNAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7639 29 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
14. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTIMULOS DEL IDPC EN LA VIGENCIA 2022 PARA APOYAR INICIATIVAS DE LA CIUDADANÍA ORIENTADAS A LA SALVAGUARDIA, ACTIVACIÓN, APROPIACION Y VISIBILIZACION	7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
15. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS 2022 PARA FORTALECER INICIATIVAS LOCALES E INTERLOCALES DE ACTIVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.90
16. AVANZAR EN LA GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL FESTIVAL JIZCA CHIA ZHUE DEL PUEBLO MUISCA DE BOSA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	1.20
17. AVANZAR EN LA GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA CULTURA BOGOTANA DEL USO Y DISFRUTE DE LA BICICLETA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	1.20
18. ACOMPAÑAR A LAS COMUNIDADES, ORGANIZACIONES Y ENTIDADES PARA LA SALVAGUARDIA DE MANIFESTACIONES CULTURALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	0.30
19. CONSOLIDAR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODÓLOGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (PCI) DE LA CIUDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	35.00	1.75
20. GENERAR ESPACIOS DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (PCI) DE LA CIUDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	1.50
21. AVANZAR EN LA GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA CREACIÓN COLECTIVA DEL TEATRO LA CANDELARIA EN LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ÁMBITO DISTRITAL (LRPCID)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.50
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		34.55		

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región


INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Vert.	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GESTIONAR LA ADOPCIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	1.75
2.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		0.00		100.00	35.00	1.75
3.	ACTIVAR Y DIVULGAR EL PATRIMONIO CULTURAL DEL ÁREA ARQUEOLÓGICA PROTEGIDA.	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		10.00		100.00	35.00	1.75
4.	PROPICIAR EL RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		100.00	35.00	1.75
5.	CONCERTAR CON LA COMUNIDAD EL INSTRUMENTO DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VIVO CAMPESINO DEL SUMAPAZ	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	1.75
6.	IDENTIFICAR PARTICIPATIVAMENTE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO VIVO CAMPESINO DEL SUMAPAZ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		10.00		100.00	30.00	1.50
7.	POSICIONAR LA IMPORTANCIA DE LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VIVO CAMPESINO DEL SUMAPAZ A TRAVÉS DE ESPACIOS DE GESTIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		10.00		100.00	30.00	1.50
8.	INICIAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		30.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	GESTIONAR LA ADOPCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN -PEMP DEL PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
10.	GESTIONAR LA FORMULACIÓN DEL PEMP DEL SECTOR DE BOSA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	40.00	4.00
11.	GESTIONAR LA FORMULACIÓN DEL PEMP DEL SECTOR DE TEUSAQUILLO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	40.00	4.00
12.	GESTIONAR LA SEGUNDA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN PEMP DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ	5.00	0.00	2.00	0.00	5.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	47.00	2.35
13.	REALIZAR LA ACTIVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (ÁREA PEMP-CHB)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	40.00	2.00
14.	REALIZAR LA ACTIVACIÓN DEL NÚCLEO FUNDACIONAL BOSA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.0																					

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Proyecto de inversión

7720 Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

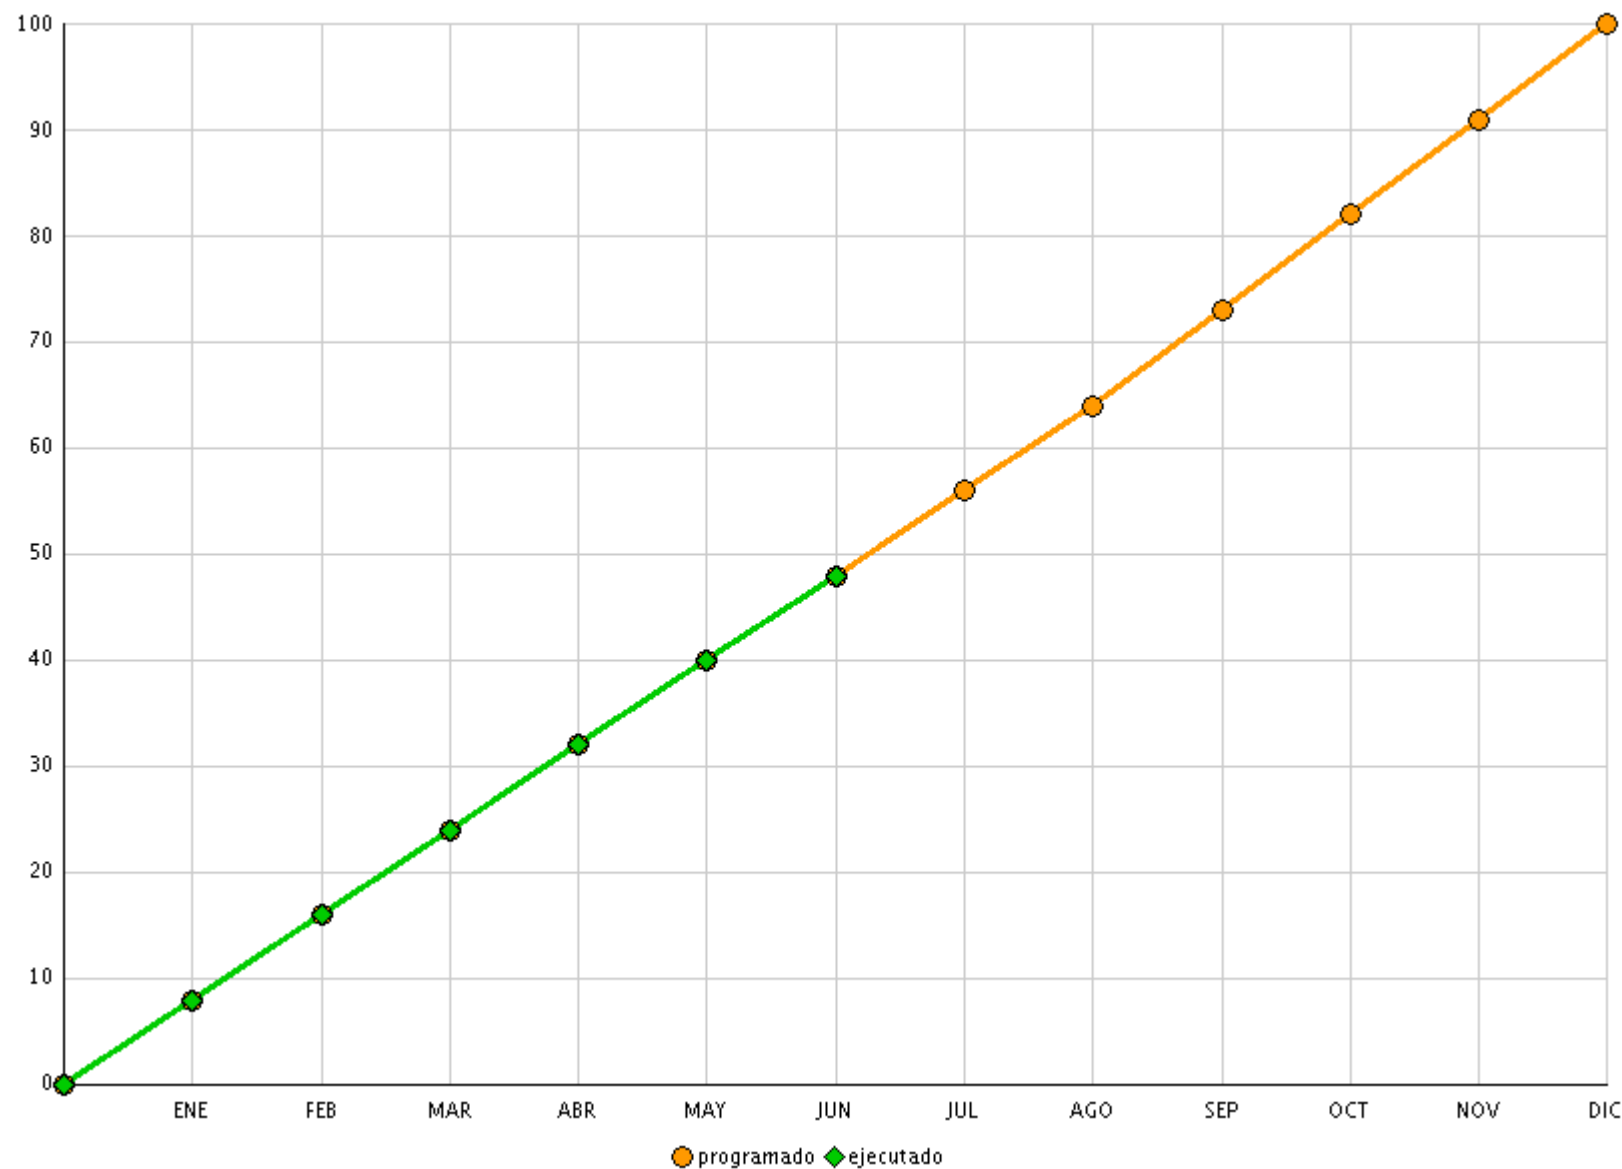


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00						

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Proyecto de inversión

7726 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá

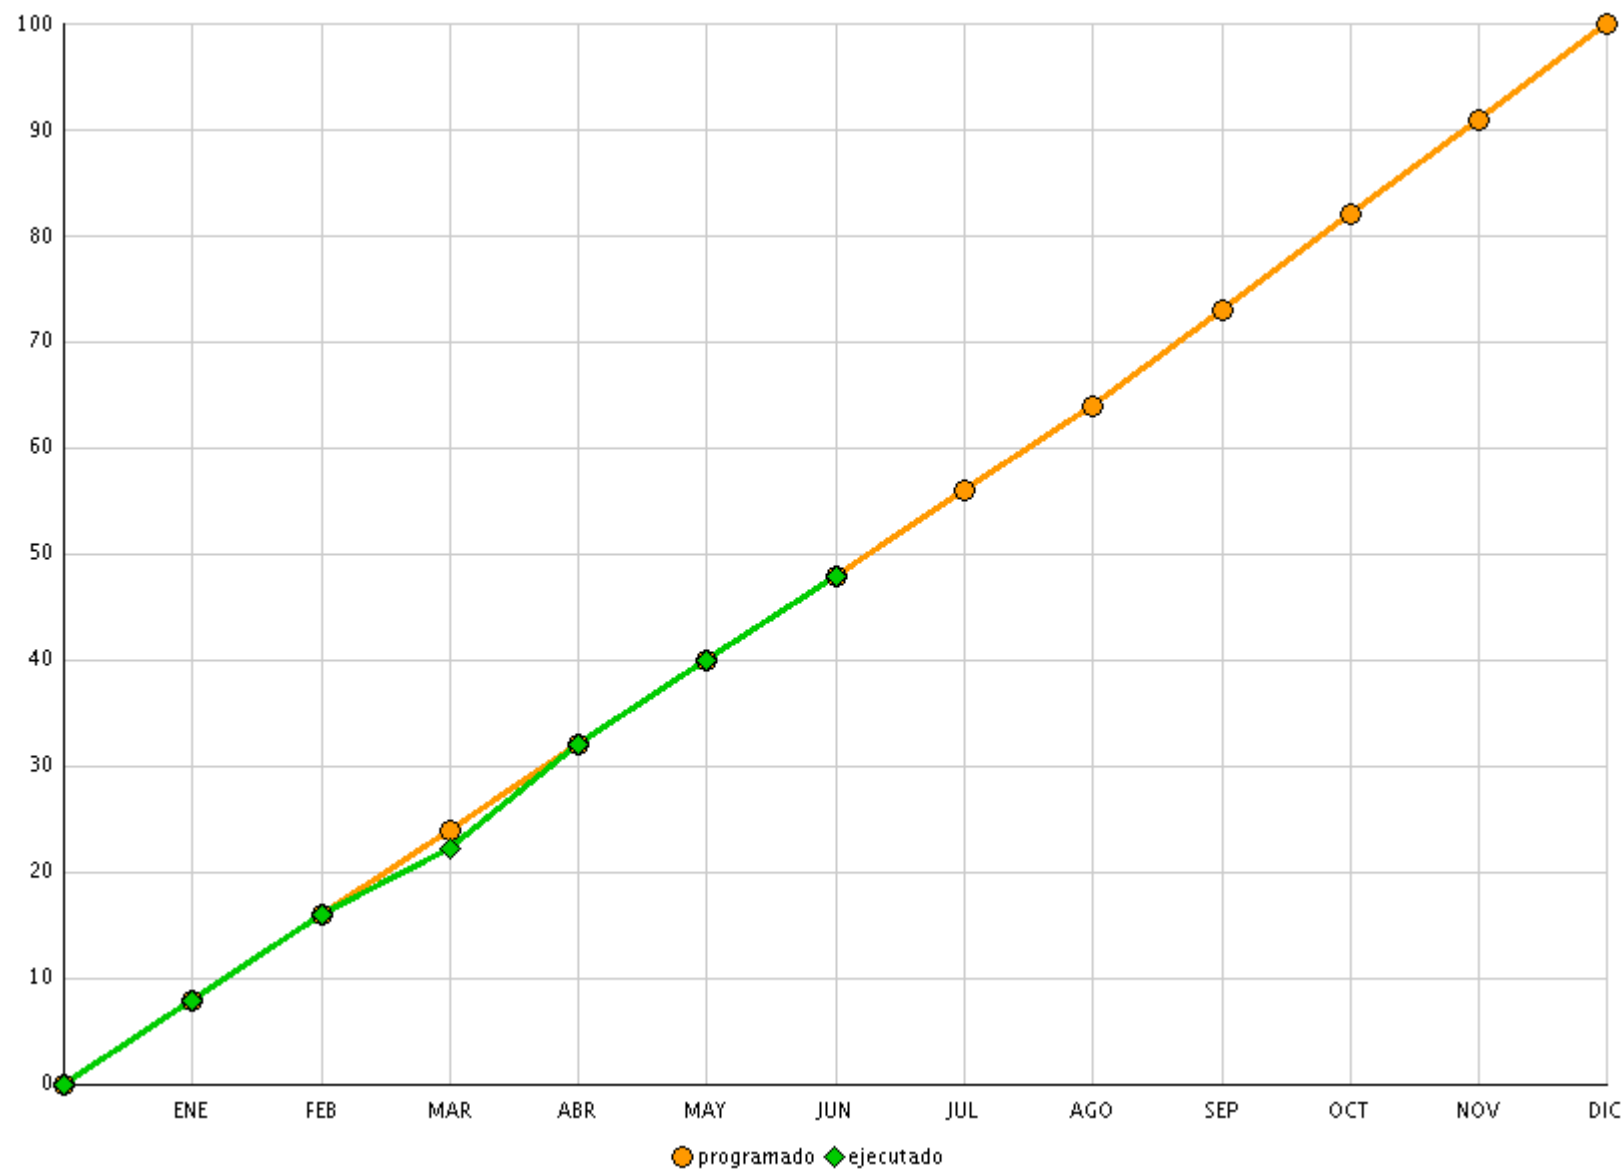


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	22.20	32.00	40.00	48.00						

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Proyecto de inversión

7727 Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá

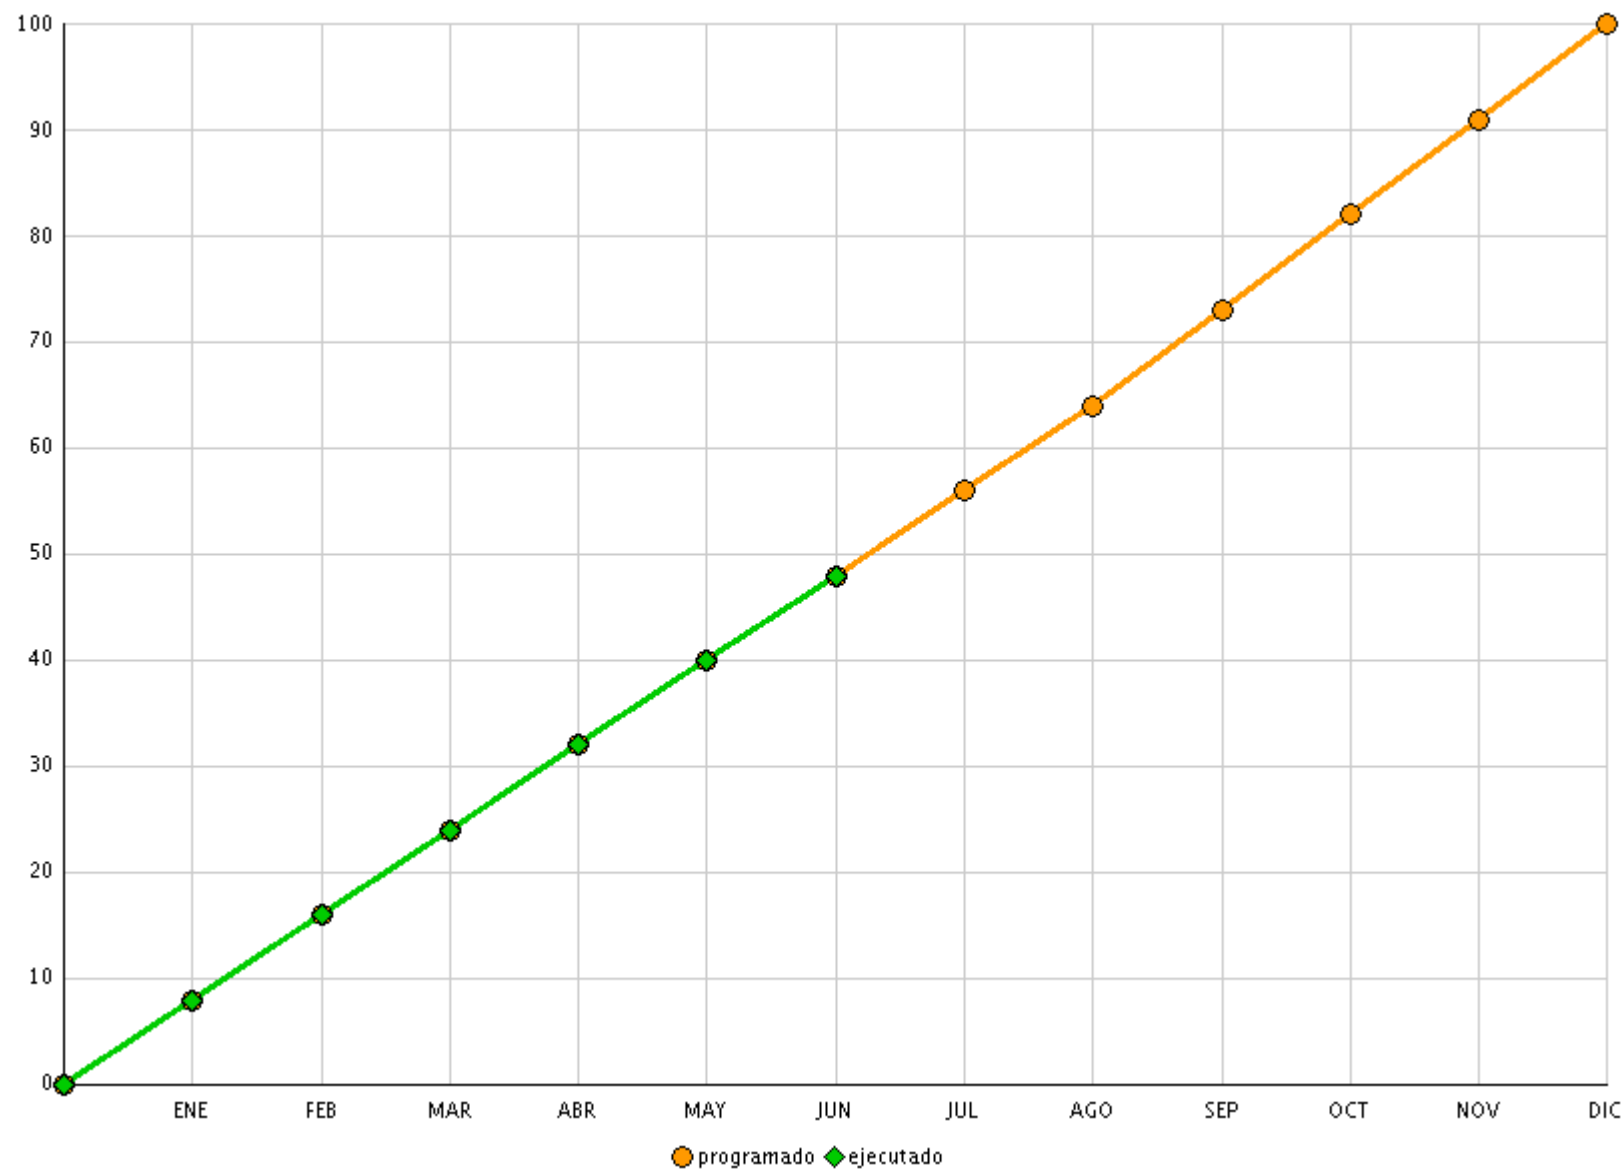

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
7720 21 Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONT TALENTO HUMANO DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN ESPECIAL FORMAL E INFORMAL Y SERVICIOS ALIMENTARIOS	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
2.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS TALLERES FORMATIVOS Y TERAPÉUTICOS, A LOS SERVI MÉDICOS Y ADQ DE INSUMOS ALIMENTARIOS	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
3.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL MODELO PEDAGÓGICO EN SUS ÁREAS, ETAPAS, Y CONTEXTOS	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	19.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							48.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

7726 18 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONT TALENTO HUMANO DE APOYO, ADMINISTRATIVO, COORDINACIÓN, OPERACIÓN EN GENERACIÓN DE OPORT DE INGRESO A JUVENTUD	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	9.60
2.	SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DE ESTÍMULO A JÓVENES CORRESPONDIENTE PROCESO COMPETENCIAS PARA GENERACIÓN DE OPORT DE INGRESO A JUVENTUD	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
3.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS OPERATIVOS	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	9.60
4.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA VINCULACIÓN SOCIOECONÓMICA	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	8.00	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		48.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
7727 19 Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONT TALENTO HUMANO PARA LA OPERACIÓN DE LAS DEPEND Y UPI QUE APORTA A LA EJEC DEL MODELO PEDAGÓGIC	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
2.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL TANTO FÍSICA COMO TECNOLÓGICA	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
3.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (UPI Y DEPENDENCIAS	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	19.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									48.00	

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7664 Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá

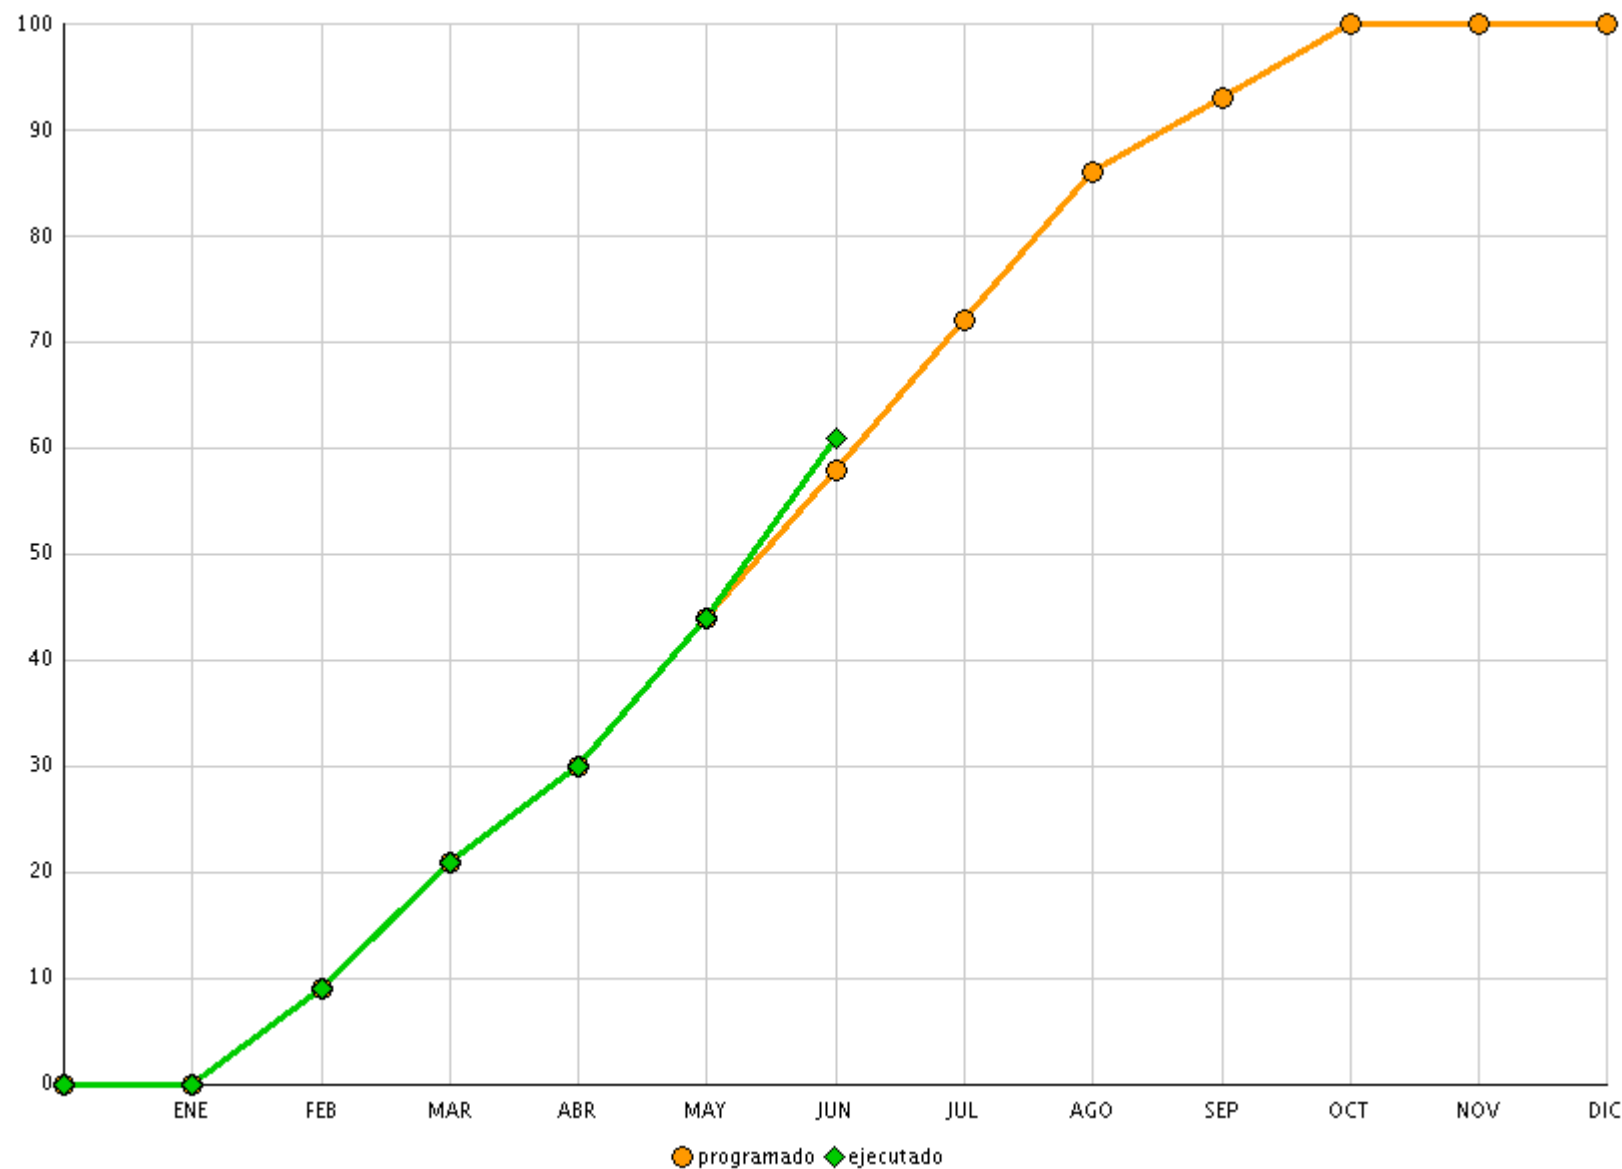


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	21.00	30.00	44.00	58.00	72.00	86.00	93.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	21.00	30.00	44.00	61.00						

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7674 Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá.

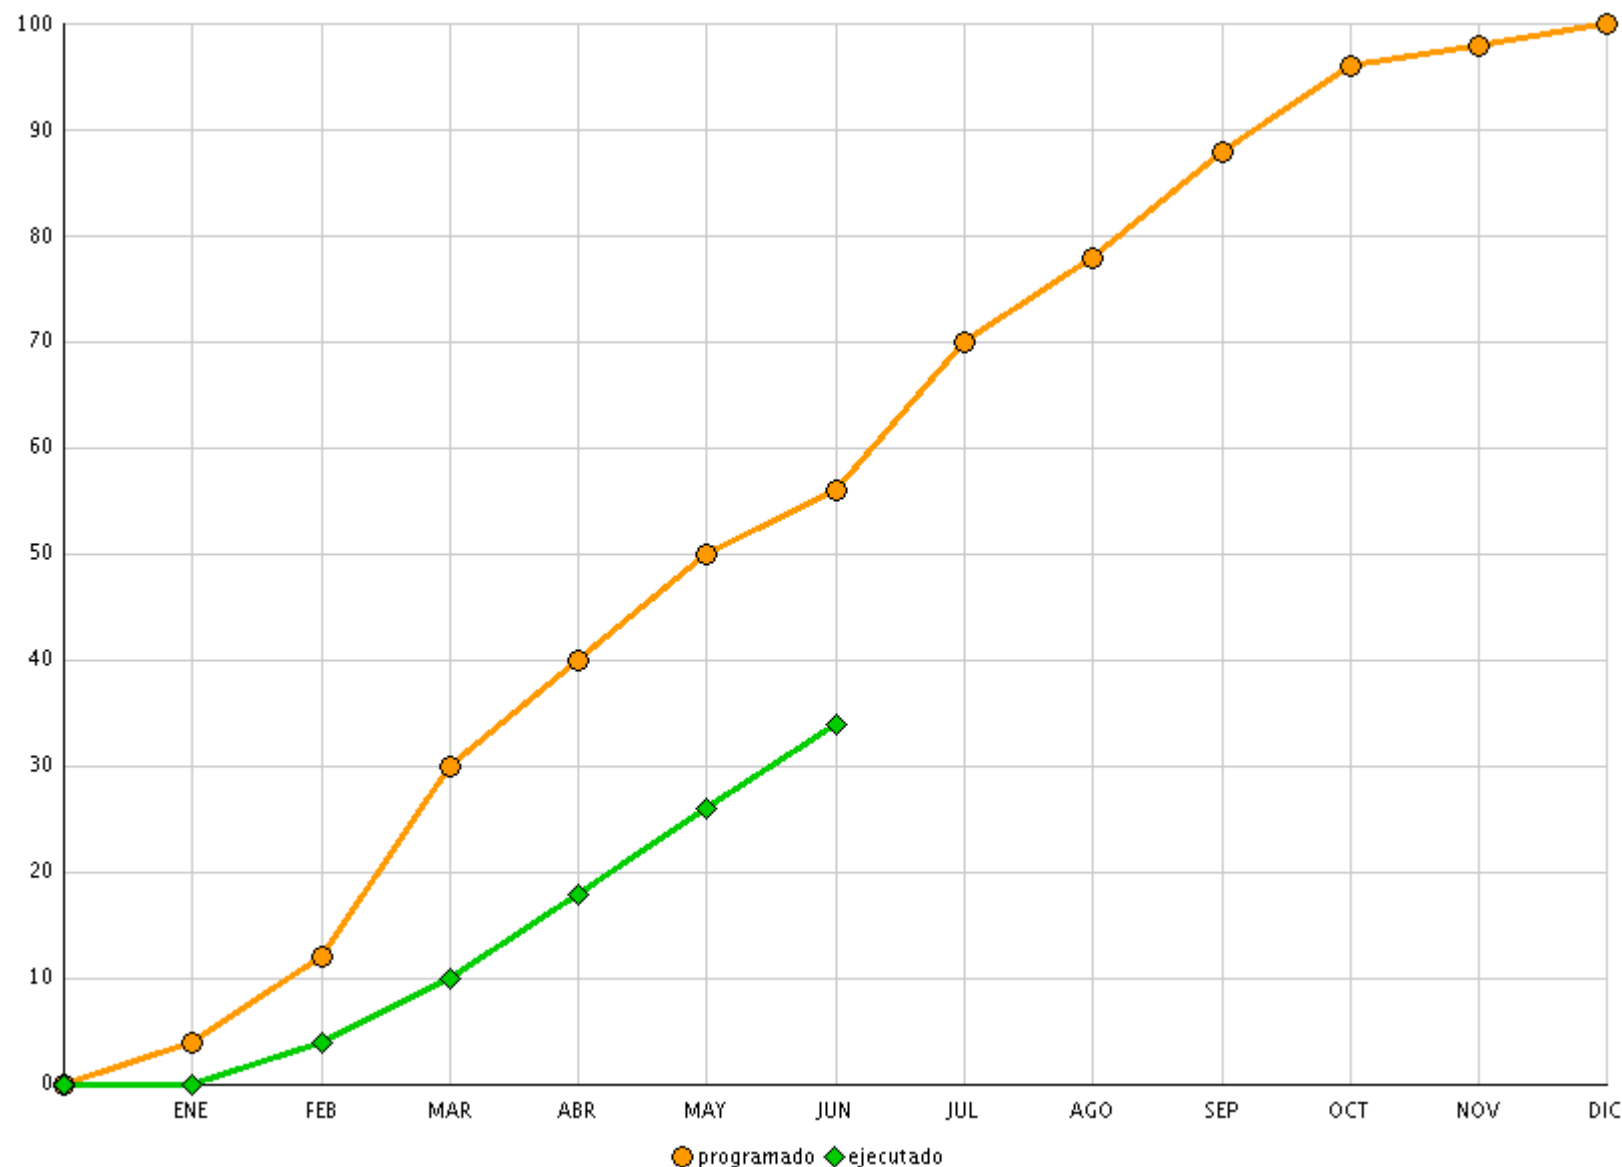


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.00	12.00	30.00	40.00	50.00	56.00	70.00	78.00	88.00	96.00	98.00	100.00
Ejecutado	0.00	4.00	10.00	18.00	26.00	34.00						

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7682 Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

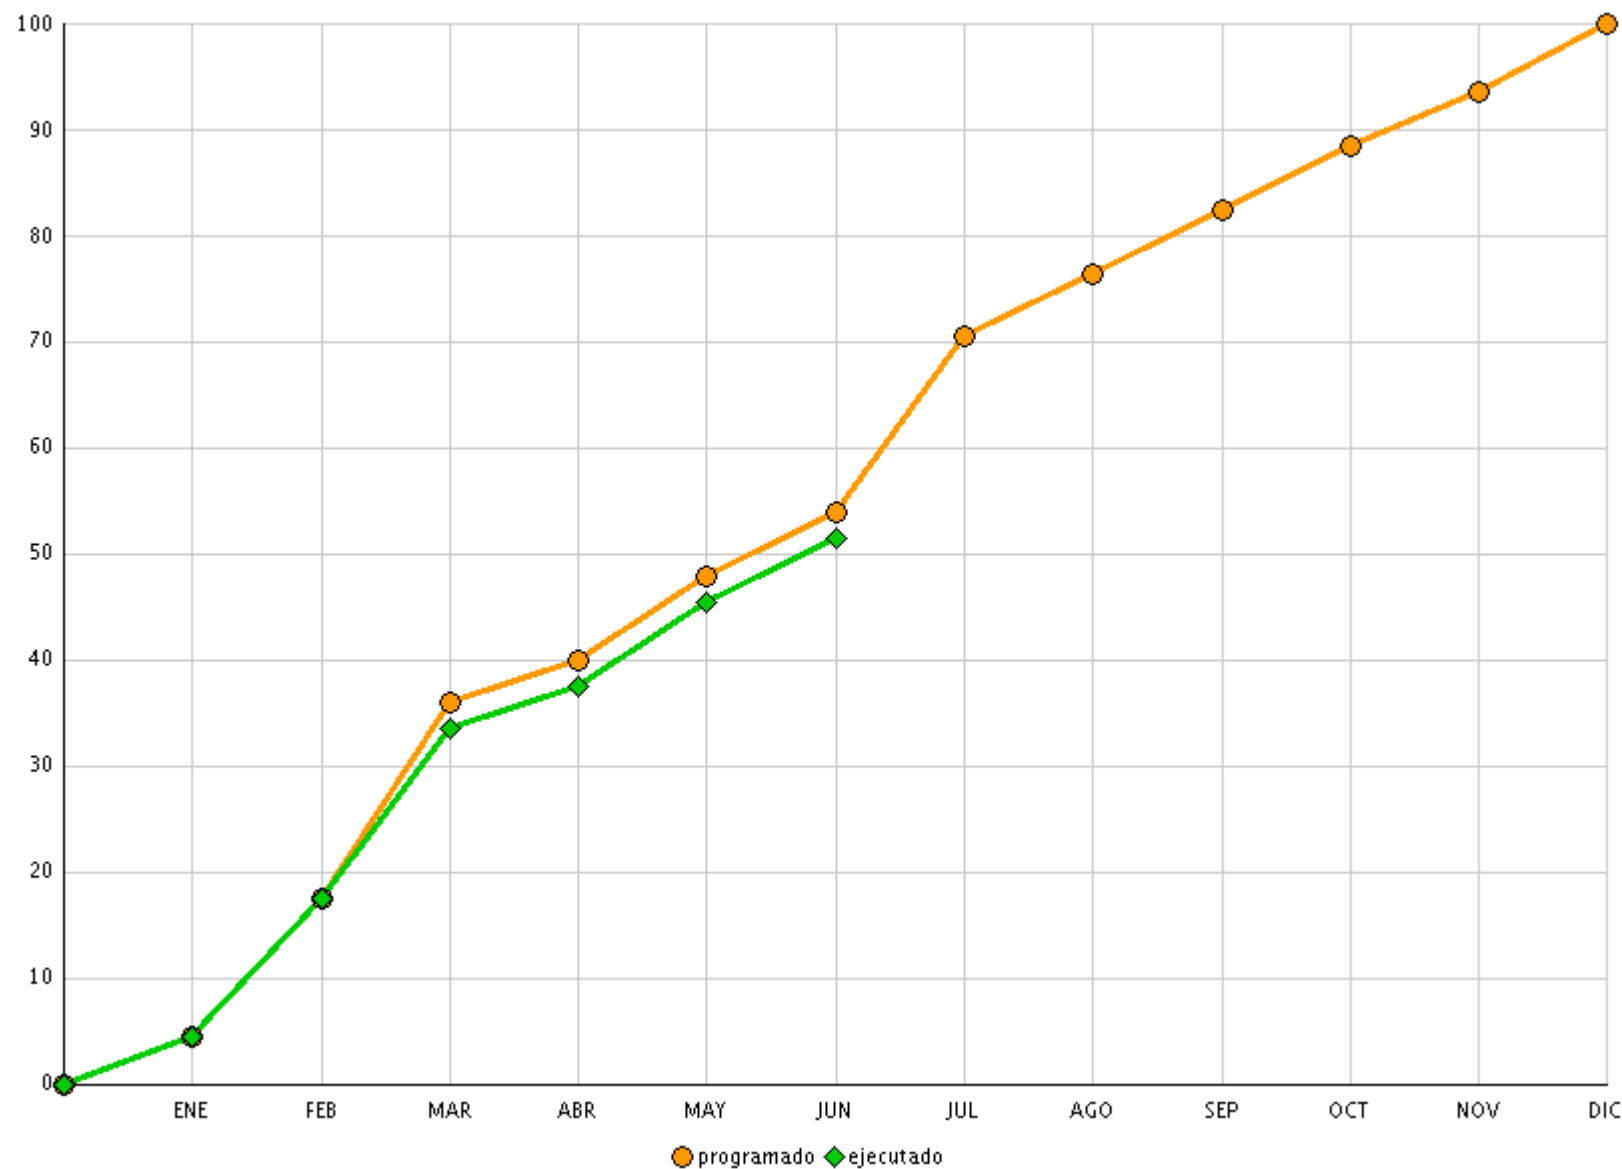


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.50	17.50	36.00	40.00	48.00	54.00	70.50	76.50	82.50	88.50	93.50	100.00
Ejecutado	4.50	17.50	33.50	37.50	45.50	51.50						

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7713 Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

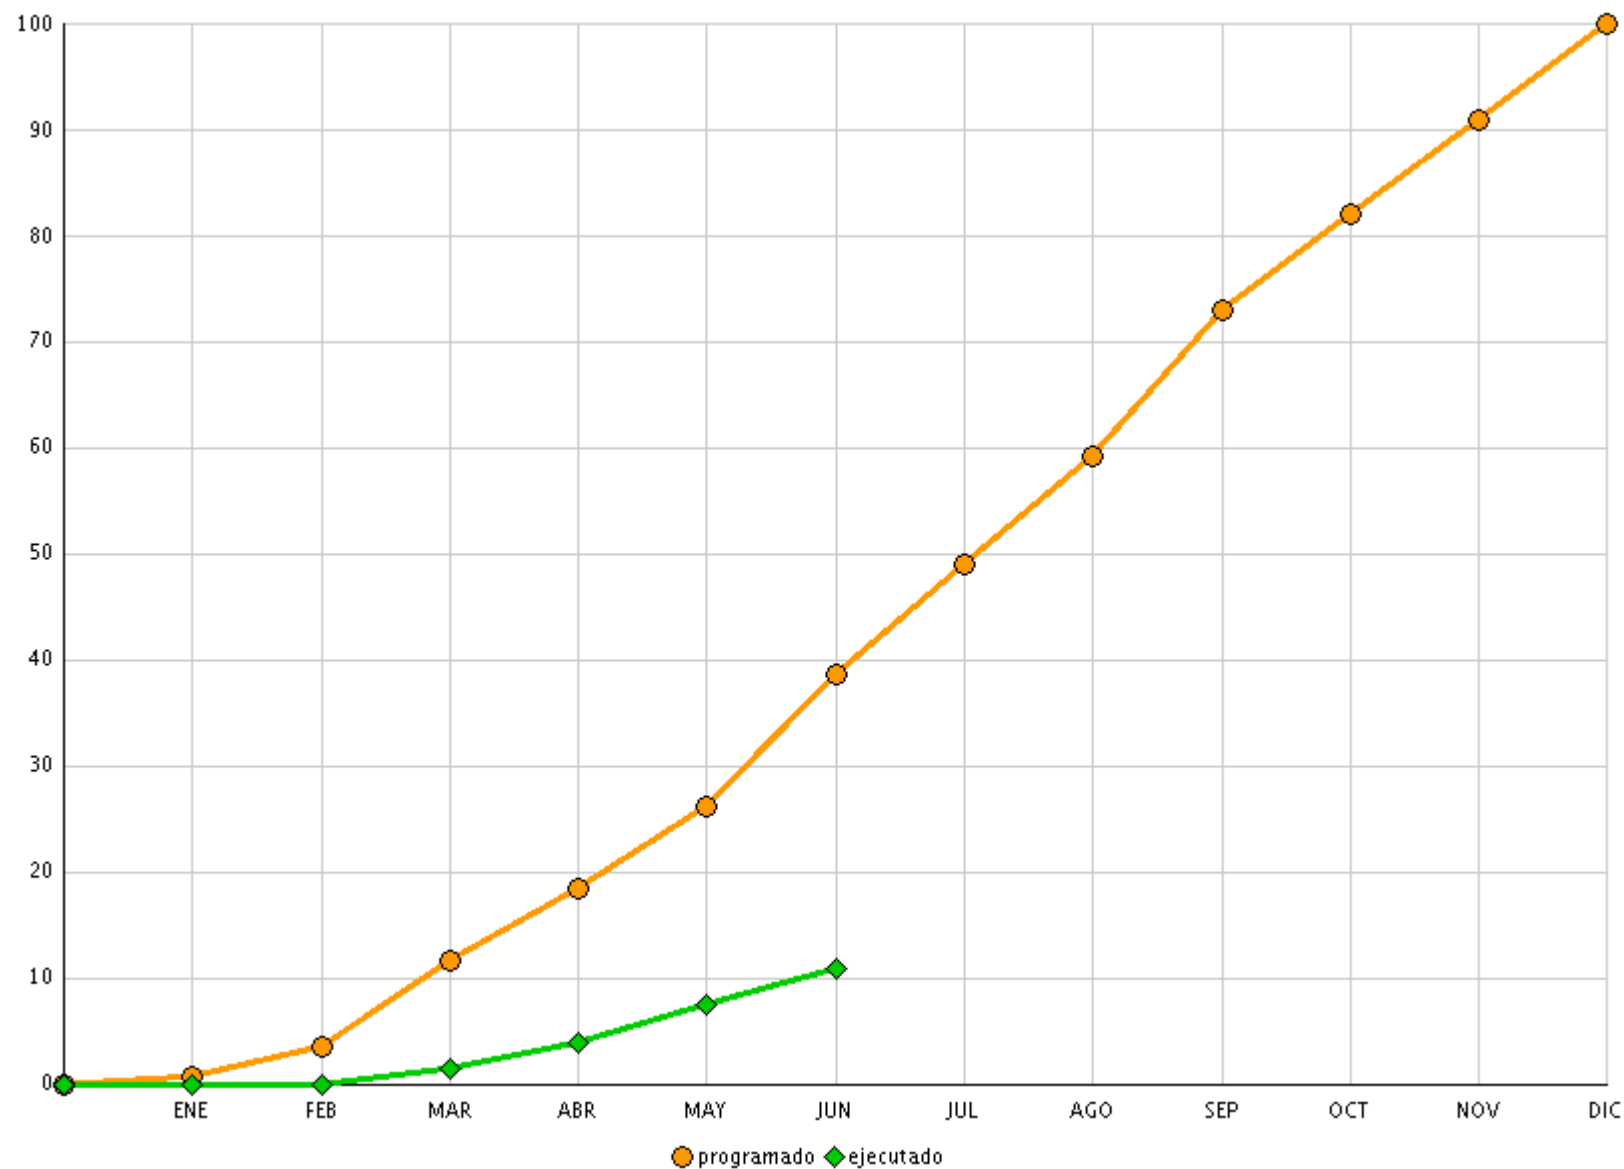


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.75	3.50	11.75	18.50	26.25	38.75	49.00	59.25	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	1.50	4.00	7.50	11.00						

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7724 Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá

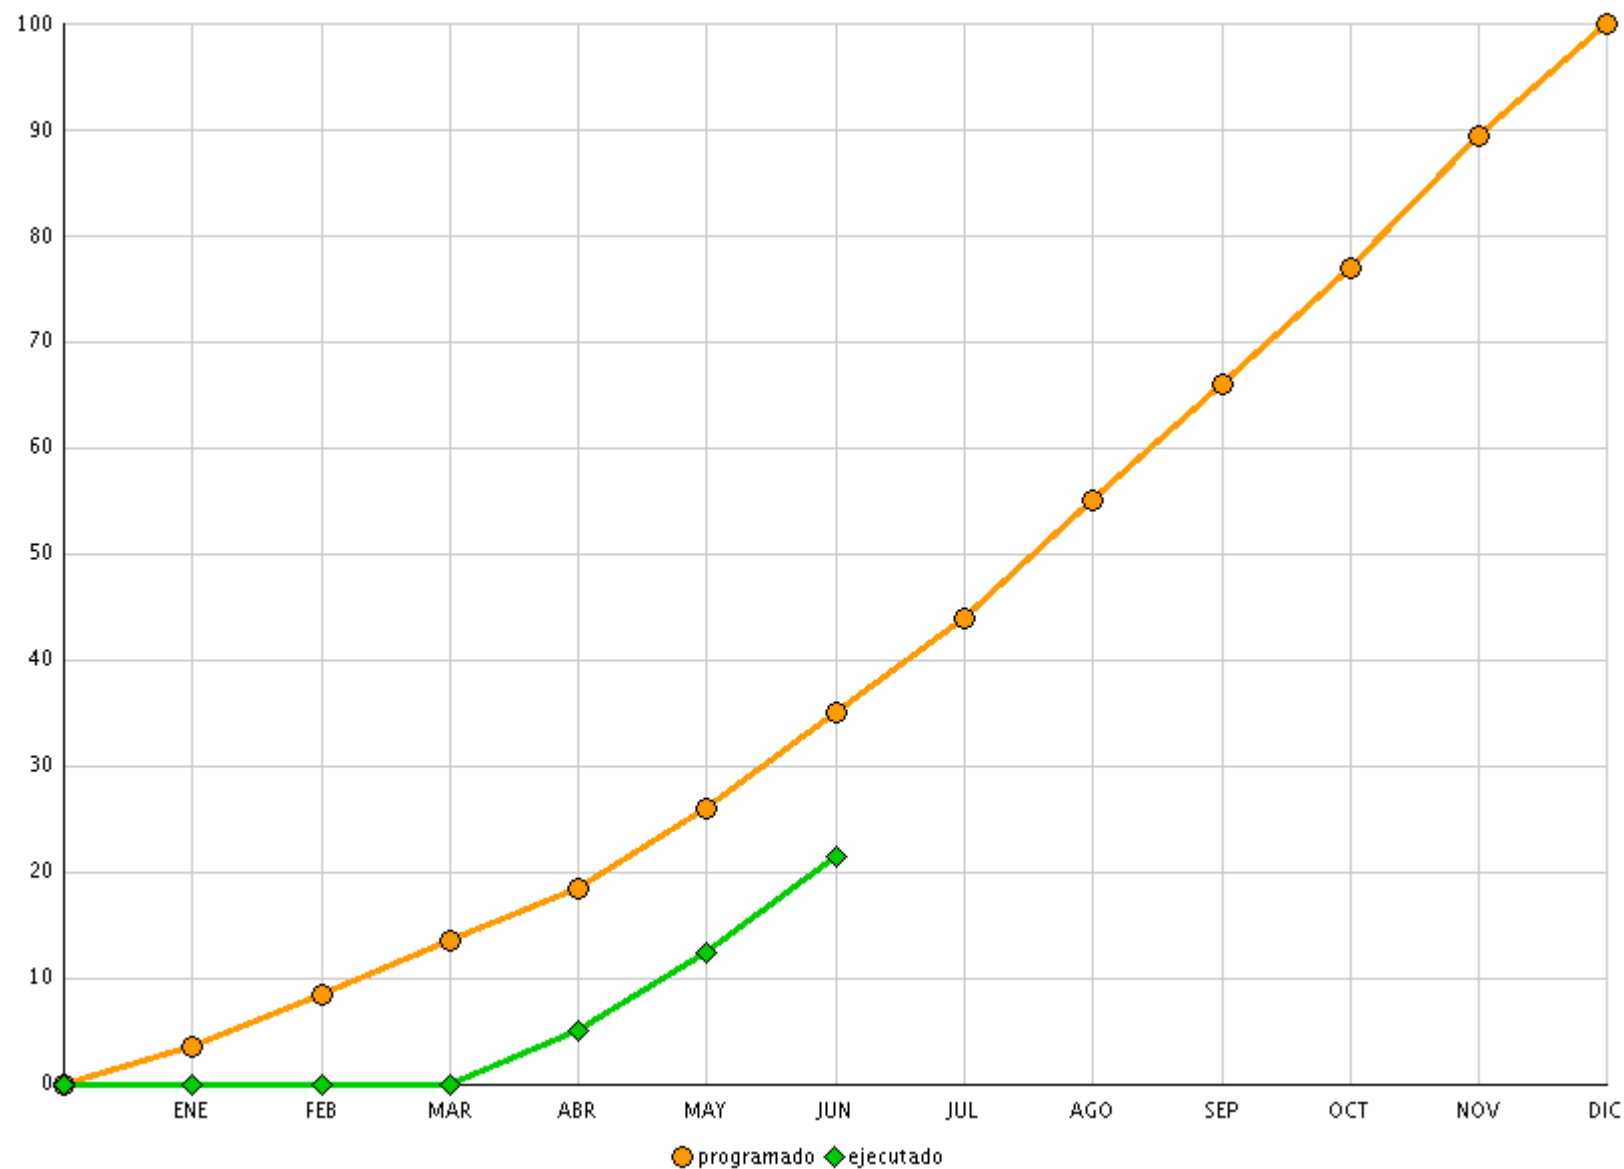


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.50	8.50	13.50	18.50	26.00	35.00	44.00	55.00	66.00	77.00	89.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	5.00	12.50	21.50						

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7760 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

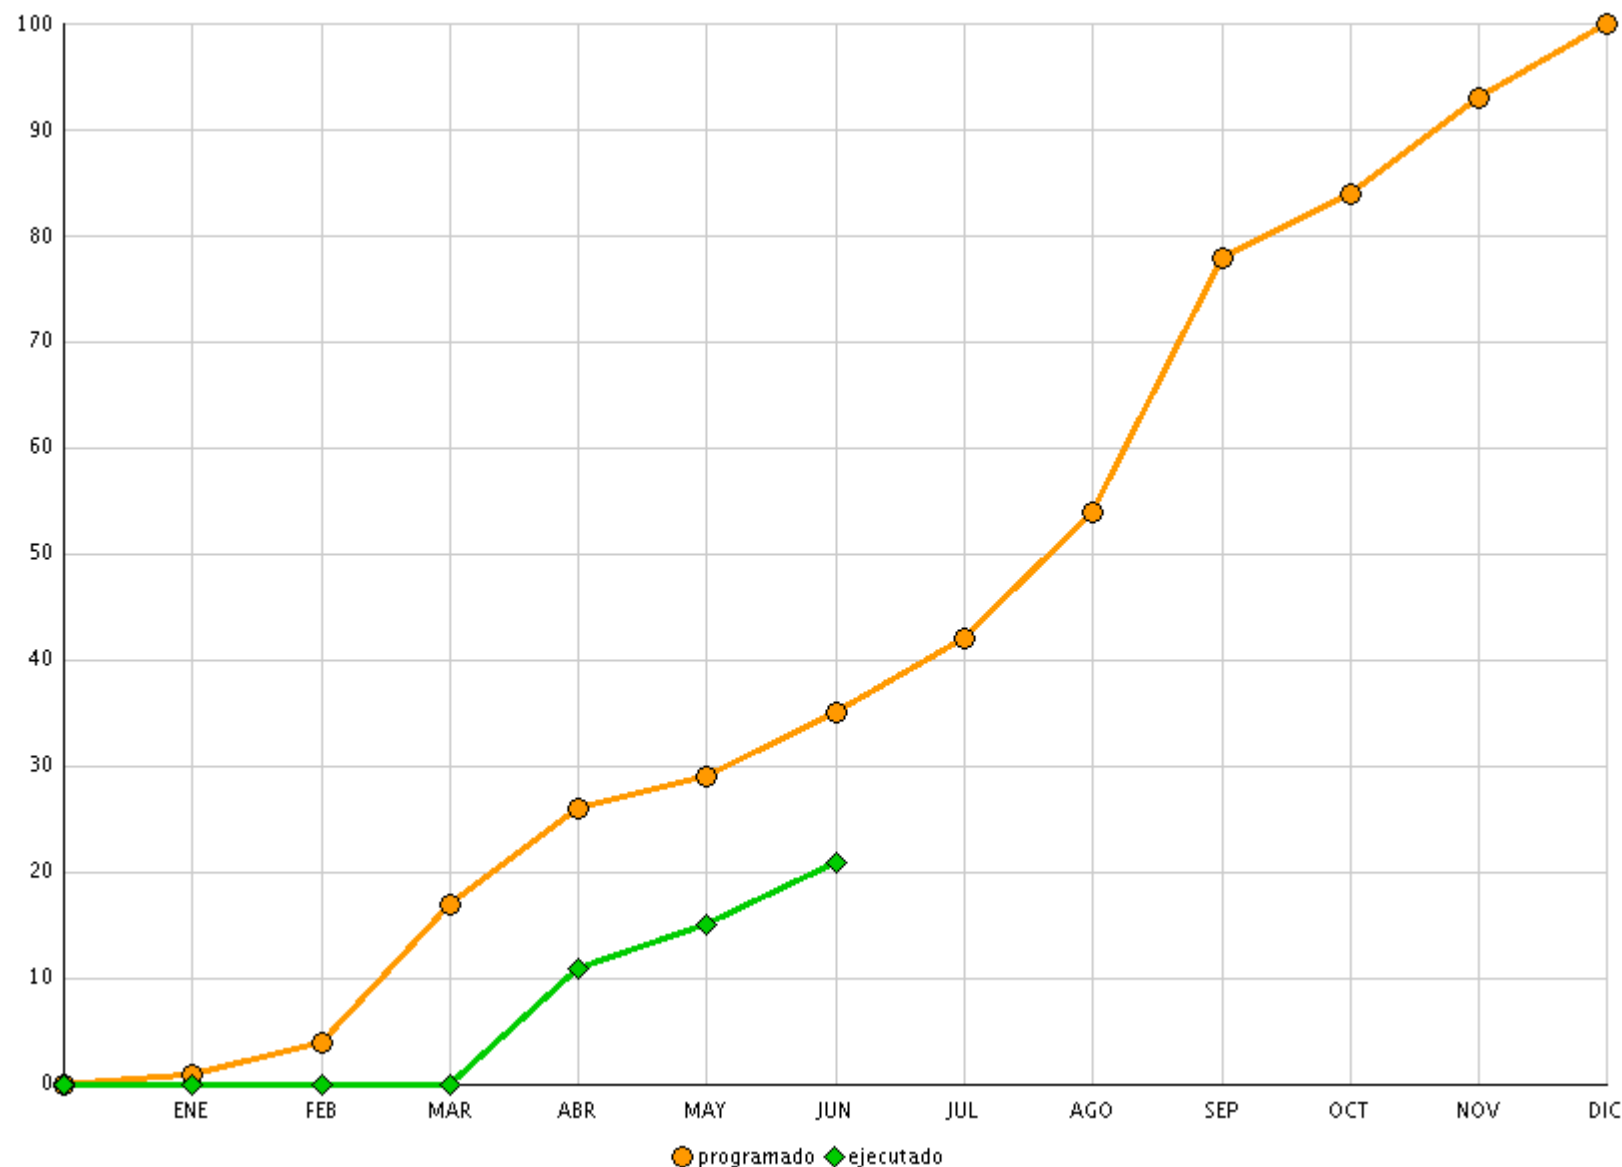

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.00	4.00	17.00	26.00	29.00	35.00	42.00	54.00	78.00	84.00	93.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	11.00	15.00	21.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7664 22 Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PLANEAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	40.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	110.00	33.00
2.	EJECUTAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	40.00	28.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								61.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7674 17 Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE LOS	20.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	50.00	10.00
2.	REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE BIENES DE INTERÉS	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	30.00	6.00
3.	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	12.00
4.	PROGRAMAR Y REALIZAR LOS ENCUENTROS DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA SOBRE EL ROL DEL PROYECTO BRONX	20.00	0.00	0.00	20.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	30.00	6.00
5.	DISEÑAR Y ESTRUCTURAR UN MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										34.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7682 23 Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROGRAMAR Y REALIZAR UN FESTIVAL COMO ESCENARIO MUSICAL	15.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
2.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	2.00
3.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.50
4.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR UNA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA DINAMIZAR EL CENTRO DE BOGOTÁ	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
5.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR LOS EVENTOS PRODUCTO DE LAS ARTICULACIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	6.00
6.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR UNA LÍNEA EDITORIAL MEDIANTE PUBLICACIONES Y CONTENIDOS, FÍSICOS Y	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
7.	PROGRAMAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS DE LA ENTIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	3.00
8.	PROGRAMAR Y DISEÑAR LOS ESTIMULOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										51.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7713 18 Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE OFERTA Y DEMANDA DEL ECOSISTEMA CREATIVO DEL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00	
2.	DISEÑAR Y HABILITAR LA PLATAFORMA DIGITAL DE	15.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
3.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR LOS APOYOS TÉCNICOS DE PROCESOS LOCALES EN LA ECONOMÍA CULTURAL Y	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PERSONALES Y EMPRESARIALES DE INICIATIVAS DE LA ECONOMÍA	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
5.	PROGRAMAR Y OTORGAR INCENTIVOS ECONÓMICOS A AGENTES DEL ECOSISTEMA DE LA ECONOMÍA CREATIVA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	25.00	5.00
6.	PROGRAMAR Y APOYAR LA REALIZACIÓN DE MERCADOS O LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES EN ESPACIOS DE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								11.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7724 14 Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROYECTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	20.00	6.00
2.	CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA CURATORIAL	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		15.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	15.00	3.00
3.	REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	50.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	25.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									21.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7760 16 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROYECTAR Y EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	20.00	2.00
2.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPEMENTACIÓN DE LA LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	15.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00		5.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	35.00	7.00
3.	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	6.00
4.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	30.00	6.00
5.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES QUE GARANTICE EL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		30.00		0.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6.	PROGRAMAR Y GENERAR LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES PROYECTADOS .	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										21.00

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7572 Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá

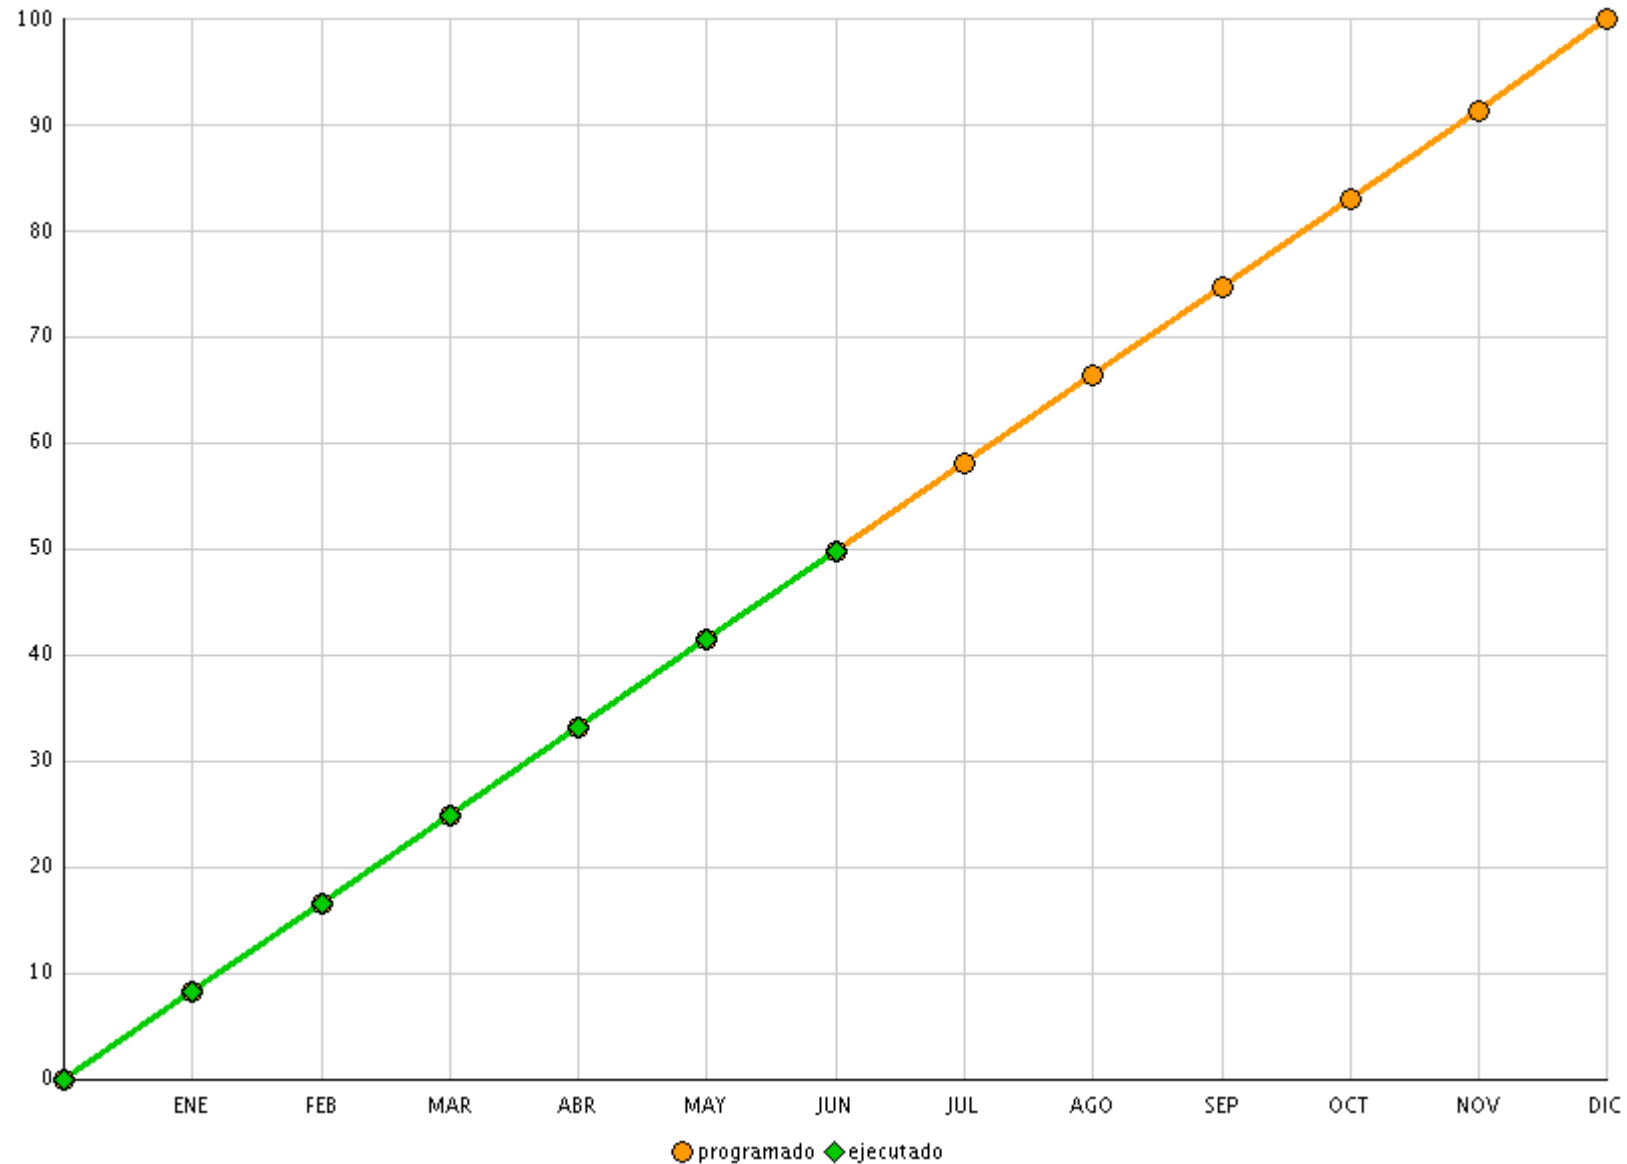


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7586 Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

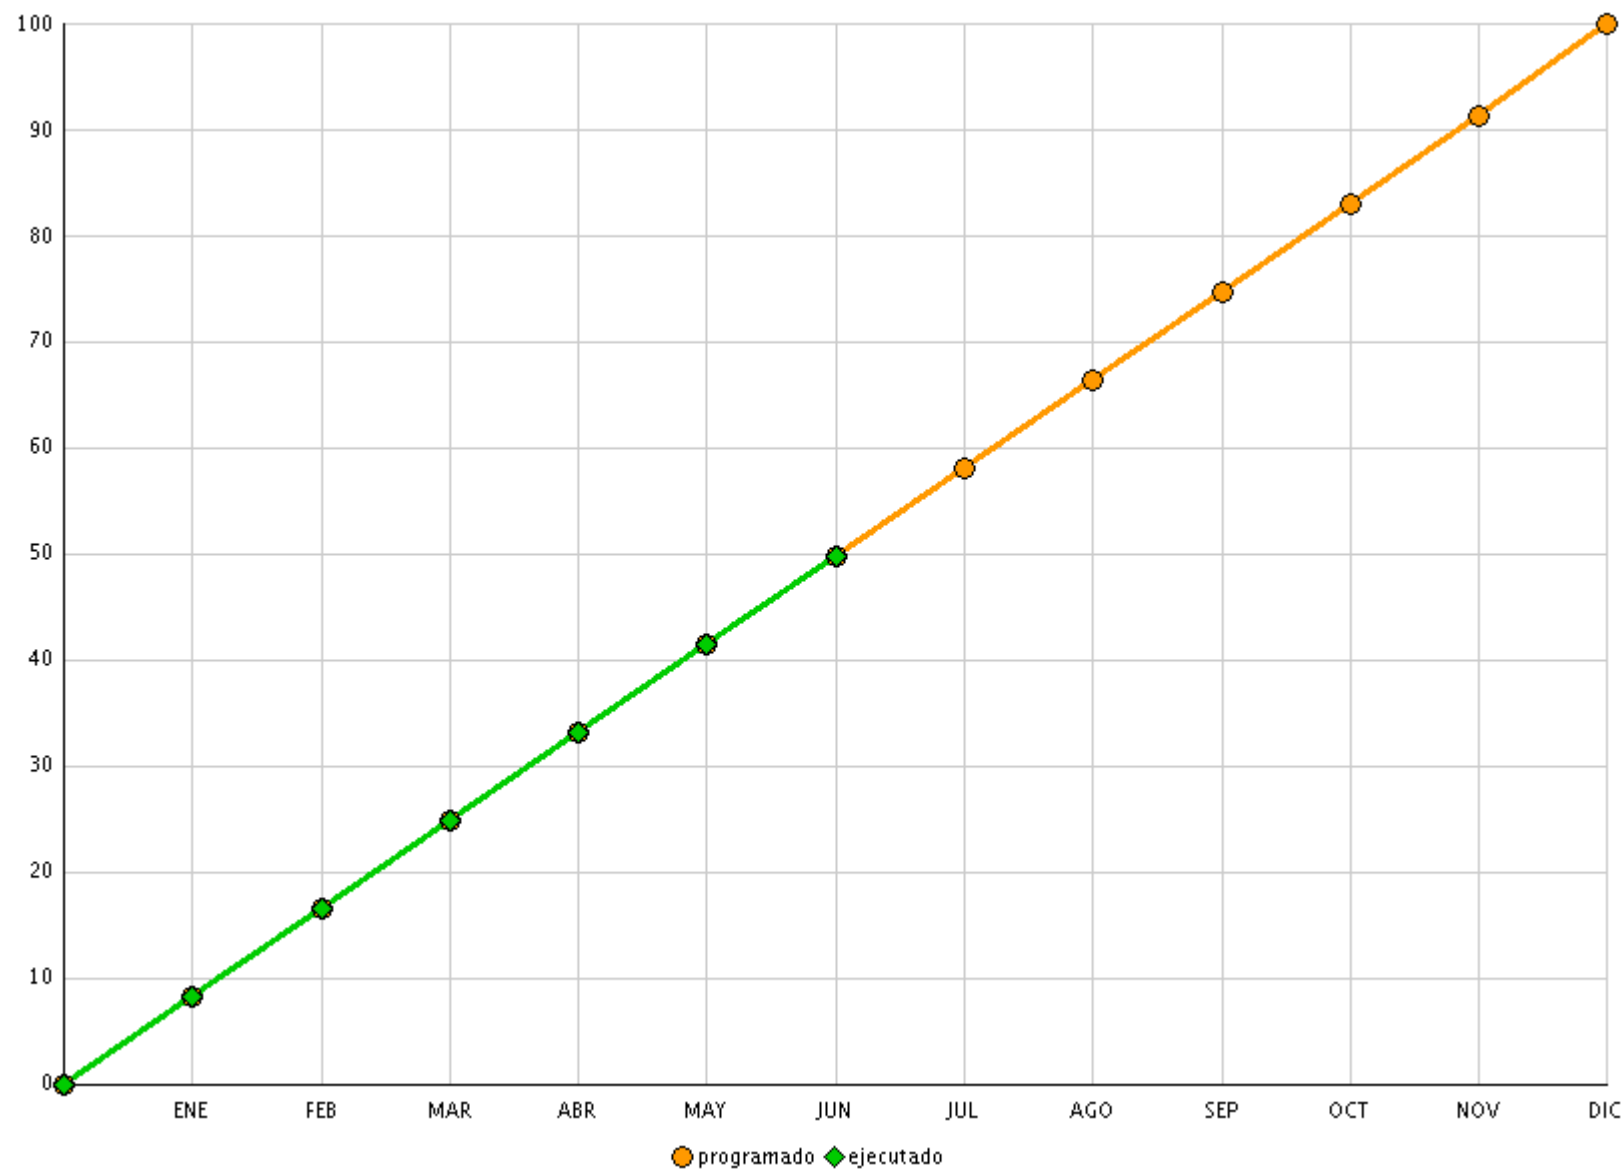


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7663 Formación Musical Vamos a la Filarmónica

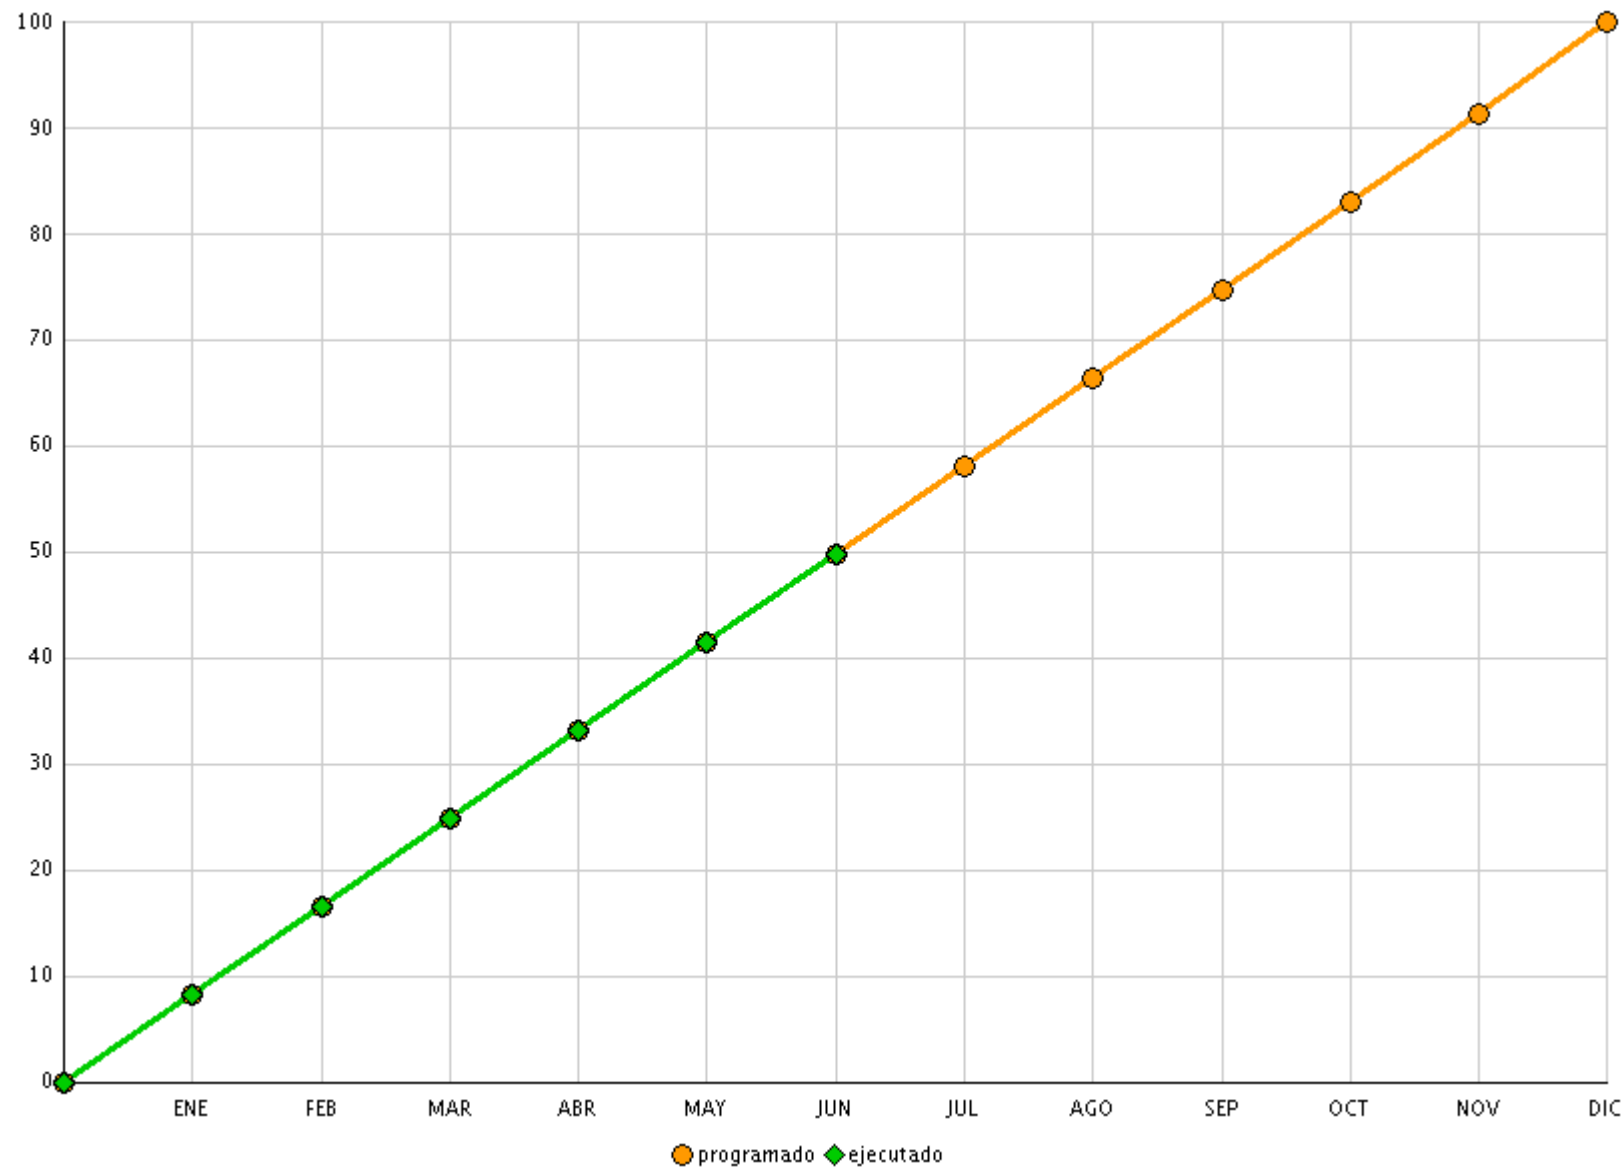


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7691 Bogotá Ciudad Filarmónica

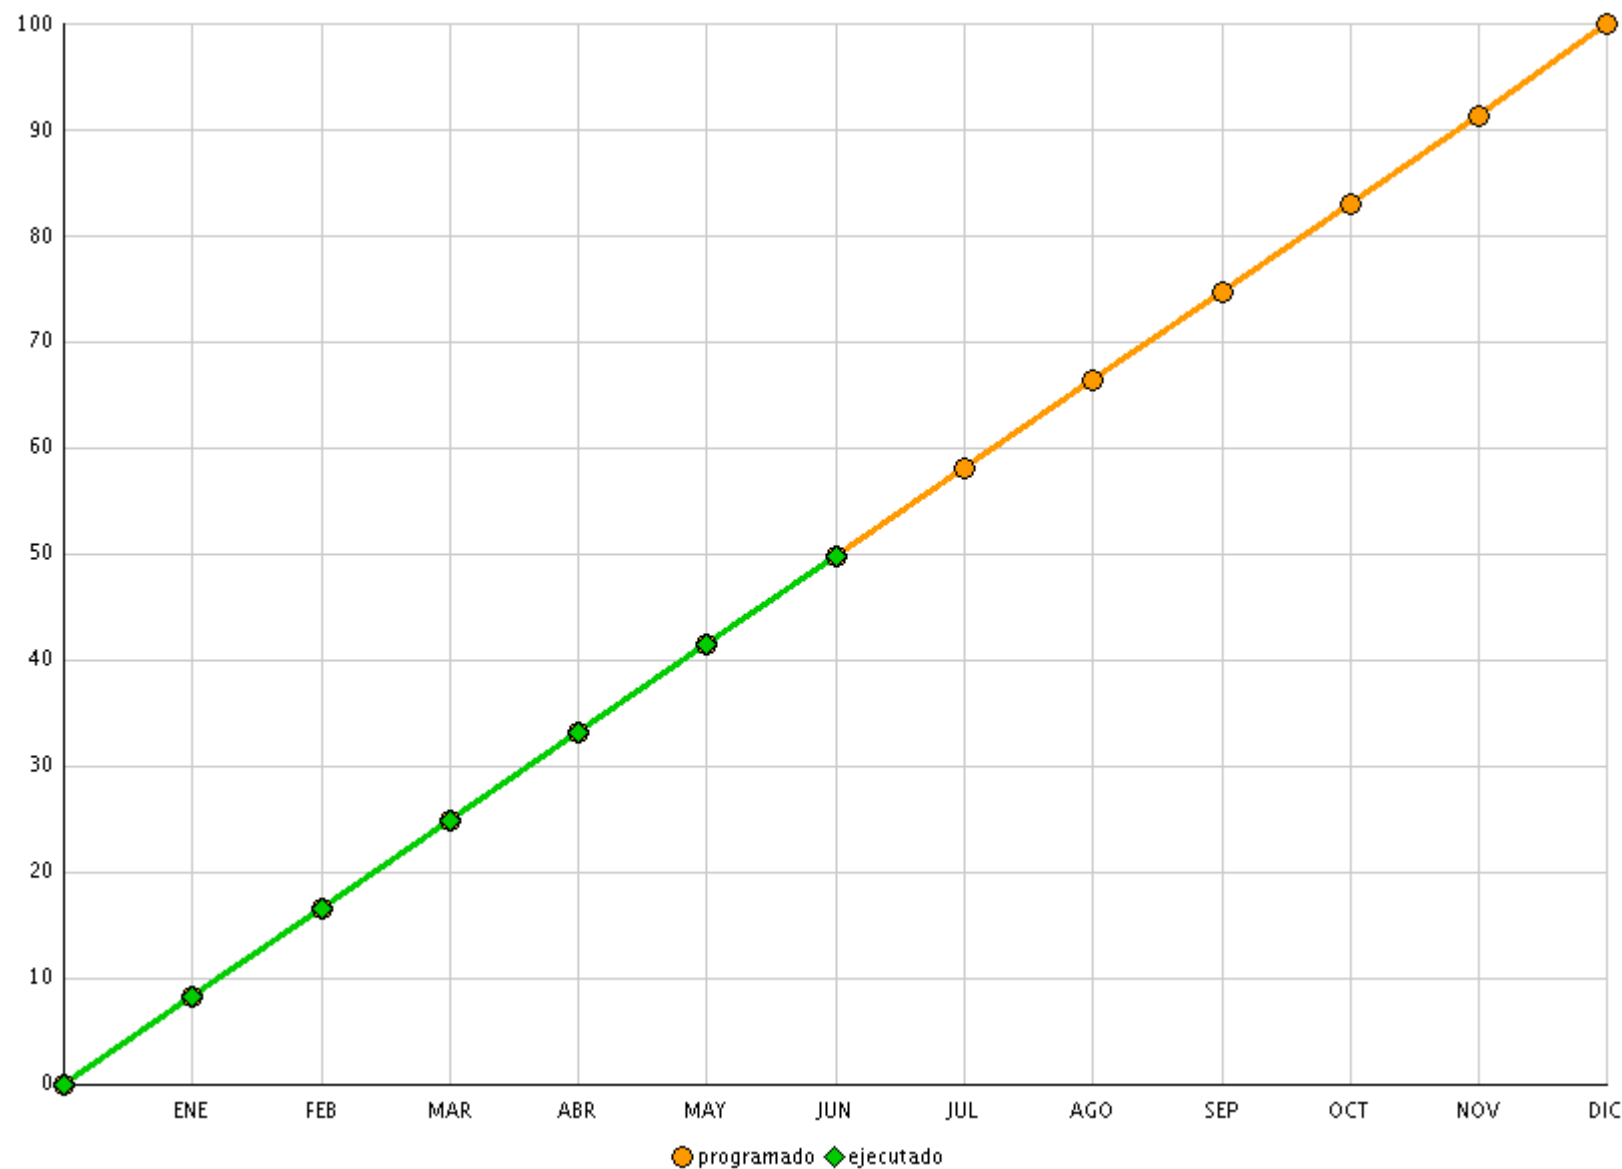


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7693 Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá

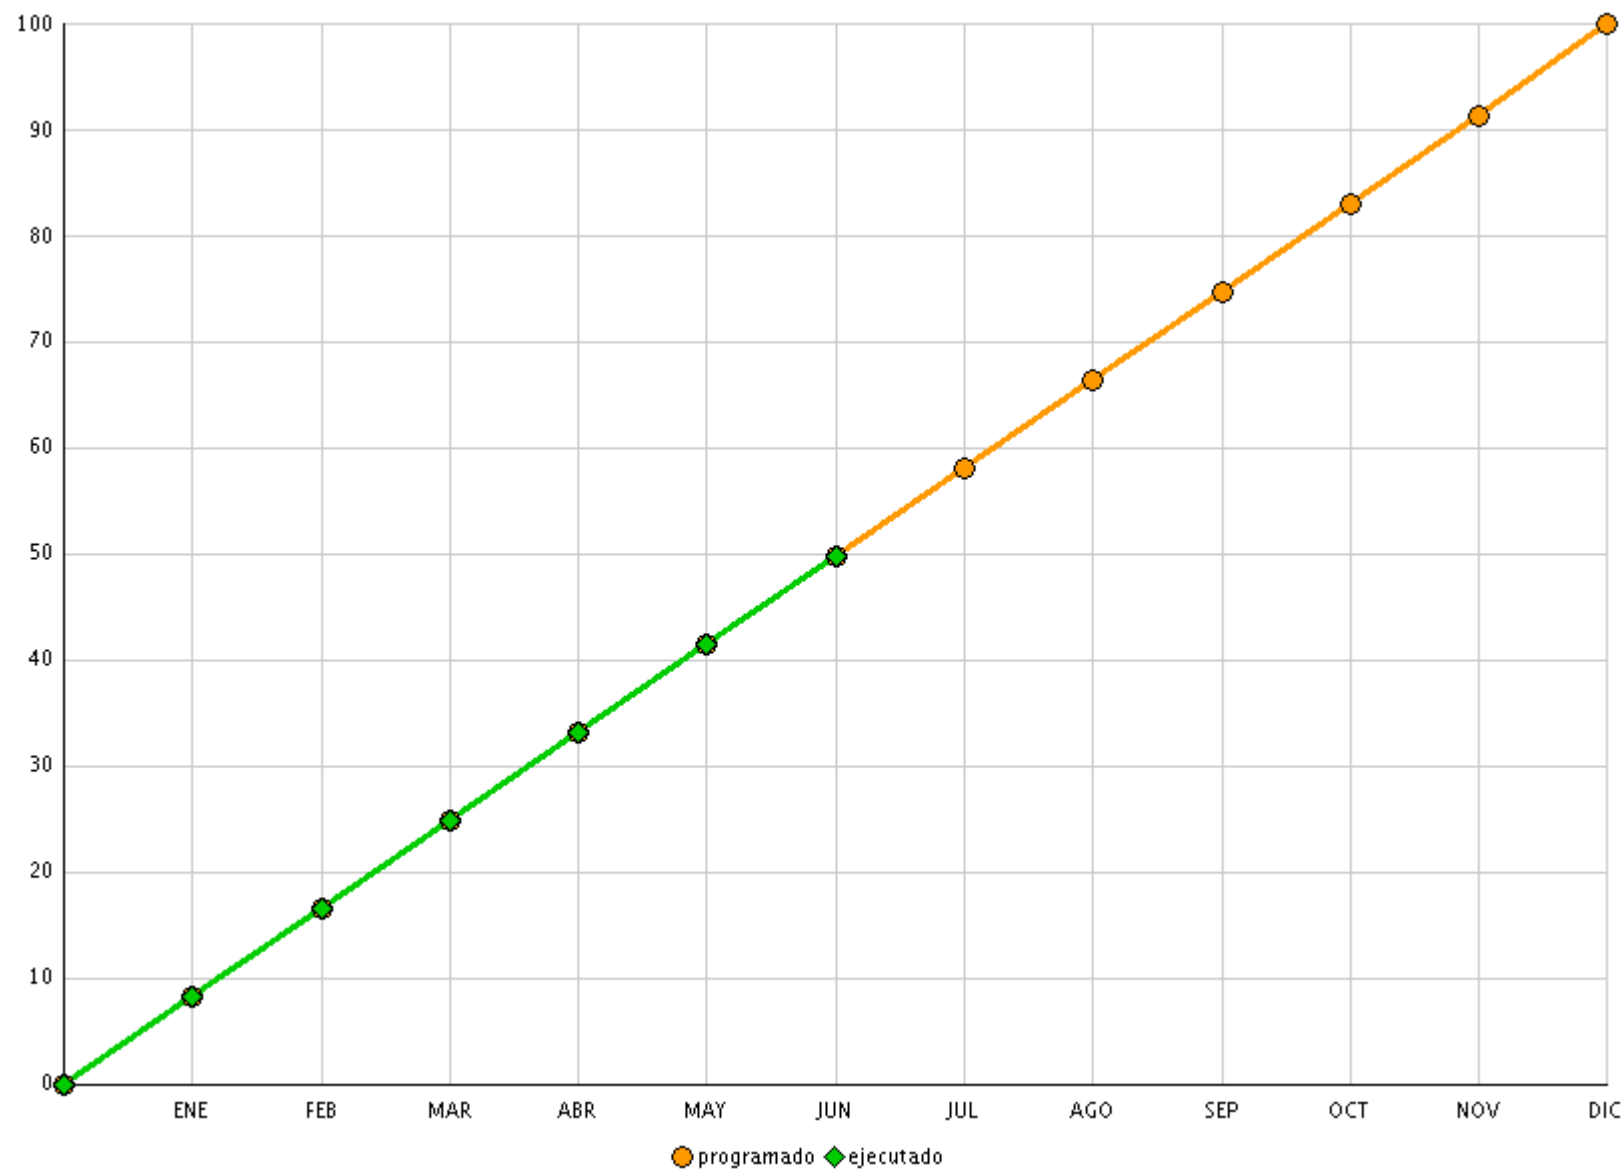


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7697 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá

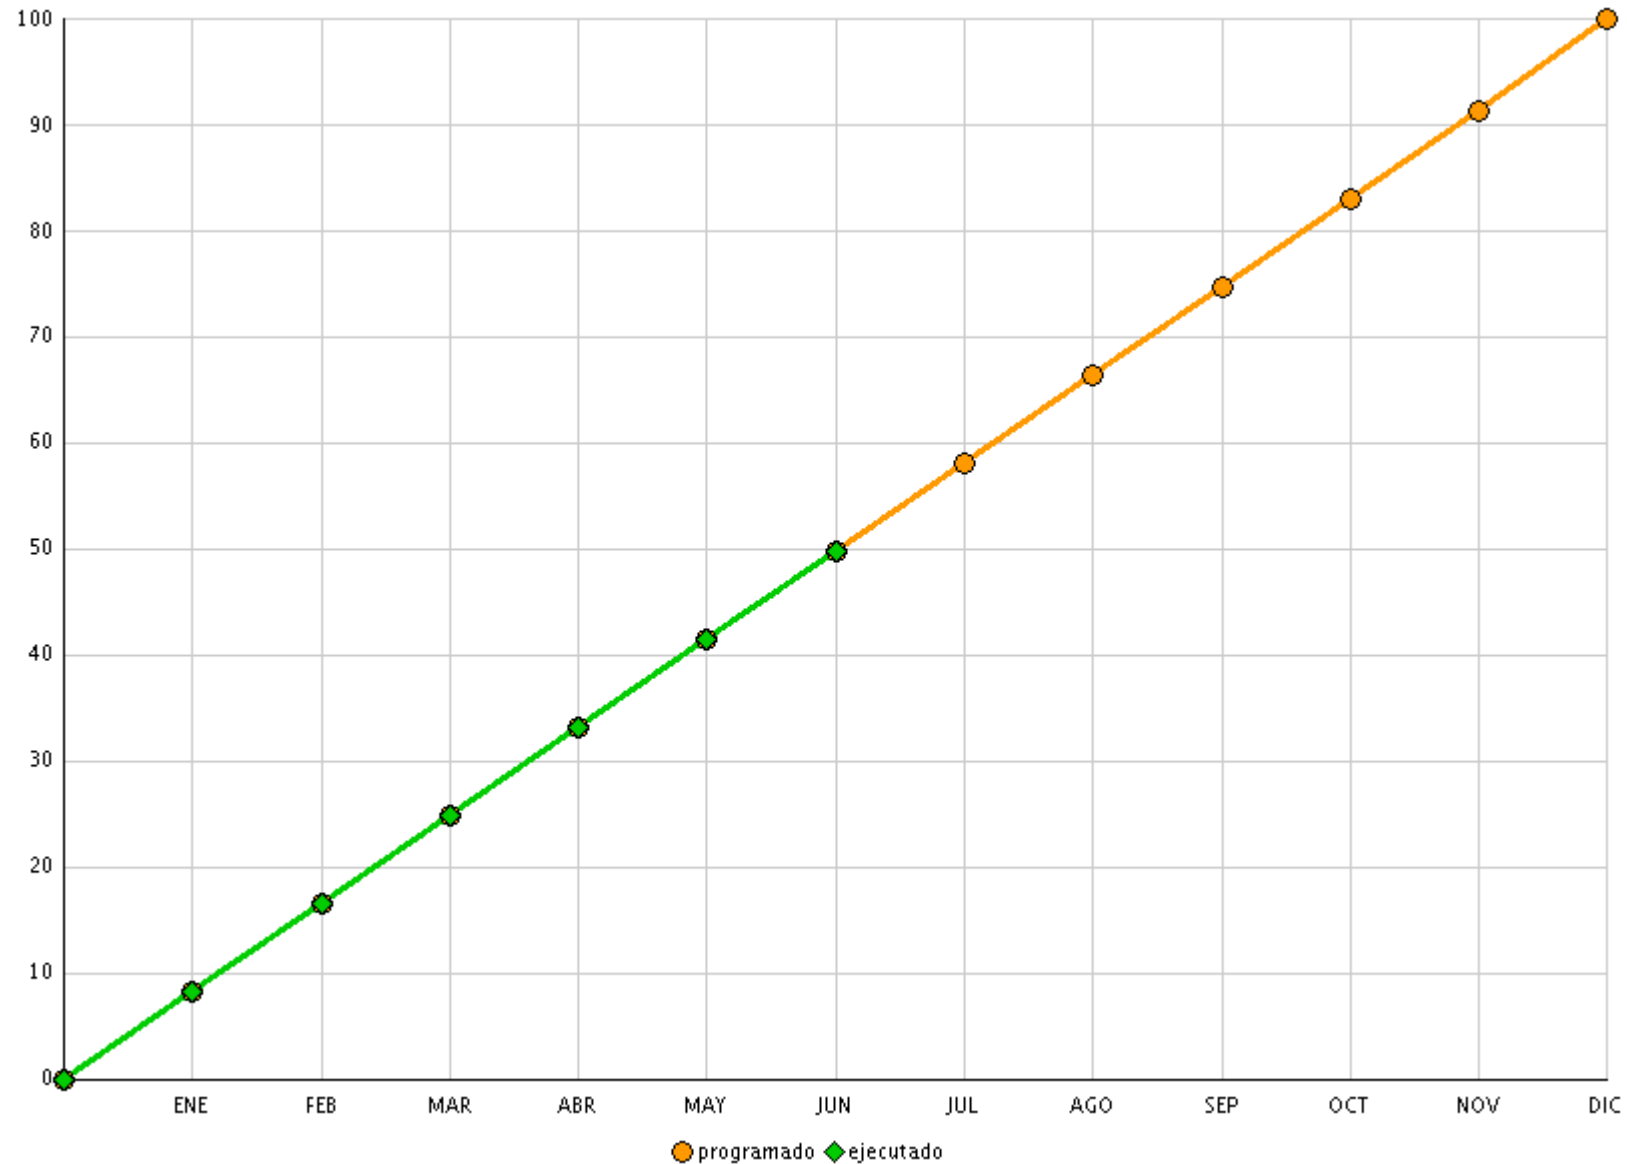

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

216 Orquesta Filarmónica de Bogotá

7572 52 Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYAR CON RECURSO HUMANO PARA LOS ASUNTOS TECNICOS DE LA GESTION DE UNA ALIANZA PUBLICO PRIVADA - APP -	50.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	24.90
2.	INSUMOS FISICOS Y MATERIALES PARA LA GESTIÓN DE LA APP	50.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	24.90
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										49.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7586 56 Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: MAESTROS Y ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN MUSICAL DE LA CIUDAD	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
2. SERVICIOS PUBLICOS	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
3. VIGILANCIA	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
4. ASEO Y CAFETERIA	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																					49.80			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7663 57 Formación Musical Vamos a la Filarmónica

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. APOYO A LA GESTION MISIONAL EN TODAS LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
2. VIRTUALIZACION DE LA OFERTA ARTISTICA	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
3. MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSTRUMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
4. SERVICIOS OPERATIVOS PARA LA ATENCION	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
5. VINCULACION DE ARTISTAS FORMADORES	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
6. CAPACITACION DE ARTISTAS FORMADORES	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
7. CREACION DE CONTENIDOS	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
8. INVESTIGACIONES	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
9. DIVULGACION DE LA OFERTA ARTISTICA	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
10. PRODUCCION DE LA OFERTA ARTISTICA	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 49.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7691 49 Bogotá Ciudad Filarmónica

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PUBLICAS O PRIVADAS PARA PROMOVER LA OFERTA CULTURAL DE LA OFB	12.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	6.23
2.	APOYAR A LOS ARTISTAS DE LA OFB PARA SU CIRCULACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN DESARROLLO DE LAS ALIANZAS REALIZADAS	12.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	6.23
3.	PROVEER LA PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ORQUESTA Y FESTIVALES	12.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	6.23
4.	REPARACION, MANTENIMIENTO Y TALLERES DE INSTRUMENTOS CON COMPRA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS	12.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	6.23
5.	ACTUALIZACION DE MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA DE LA OFB INCLUYE PARTITURAS	12.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	6.23
6.	APOYAR LA GESTION Y CIRCULACION	12.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	6.23
7.	APOYAR LA GESTION MISIONAL PARA EL RELACIONAMIENTO Y LAS COMUNICACIONES	12.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	6.23
8.	SERVICIOS OPERATIVOS PARA LA GESTION DEL PROYECTO	12.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	6.23
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									49.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7693 53 Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONVOCATORIAS PROGRAMA DISTRITAL DE ESTIMULOS	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.27
2.	APOYOS CONCERTADOS	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.27
3.	CONVOCATORIA BANCO DE JURADOS	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.27
4.	APOYO A LA GESTION MISIONAL Y CLASES MAGISTRALES	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.27
5.	APOYO A LA GESTION MISIONAL Y COORDINACION	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.27
6.	GESTION LOGISTICA Y OPERATIVA	17.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.47
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								49.80		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7697 38 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	PROVEER EL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA EL APOYO A LA GESTION	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.27	
2.	CONTAR CON LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS Y LOS APOYOS MATERIALES Y FISICOS NECESARIOS PARA EL APOYO A LA GESTION	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.27	
3.	GESTION CON MEDIOS COMUNITARIOS	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.27	
4.	ESTRATEGIAS DE DIVULGACION INTERNA Y EXTERNA	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.27	
5.	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA ESTRATEGICA	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.27	
6.	DESARROLLO DE CONTENIDOS	17.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.47	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.80	

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7651 Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

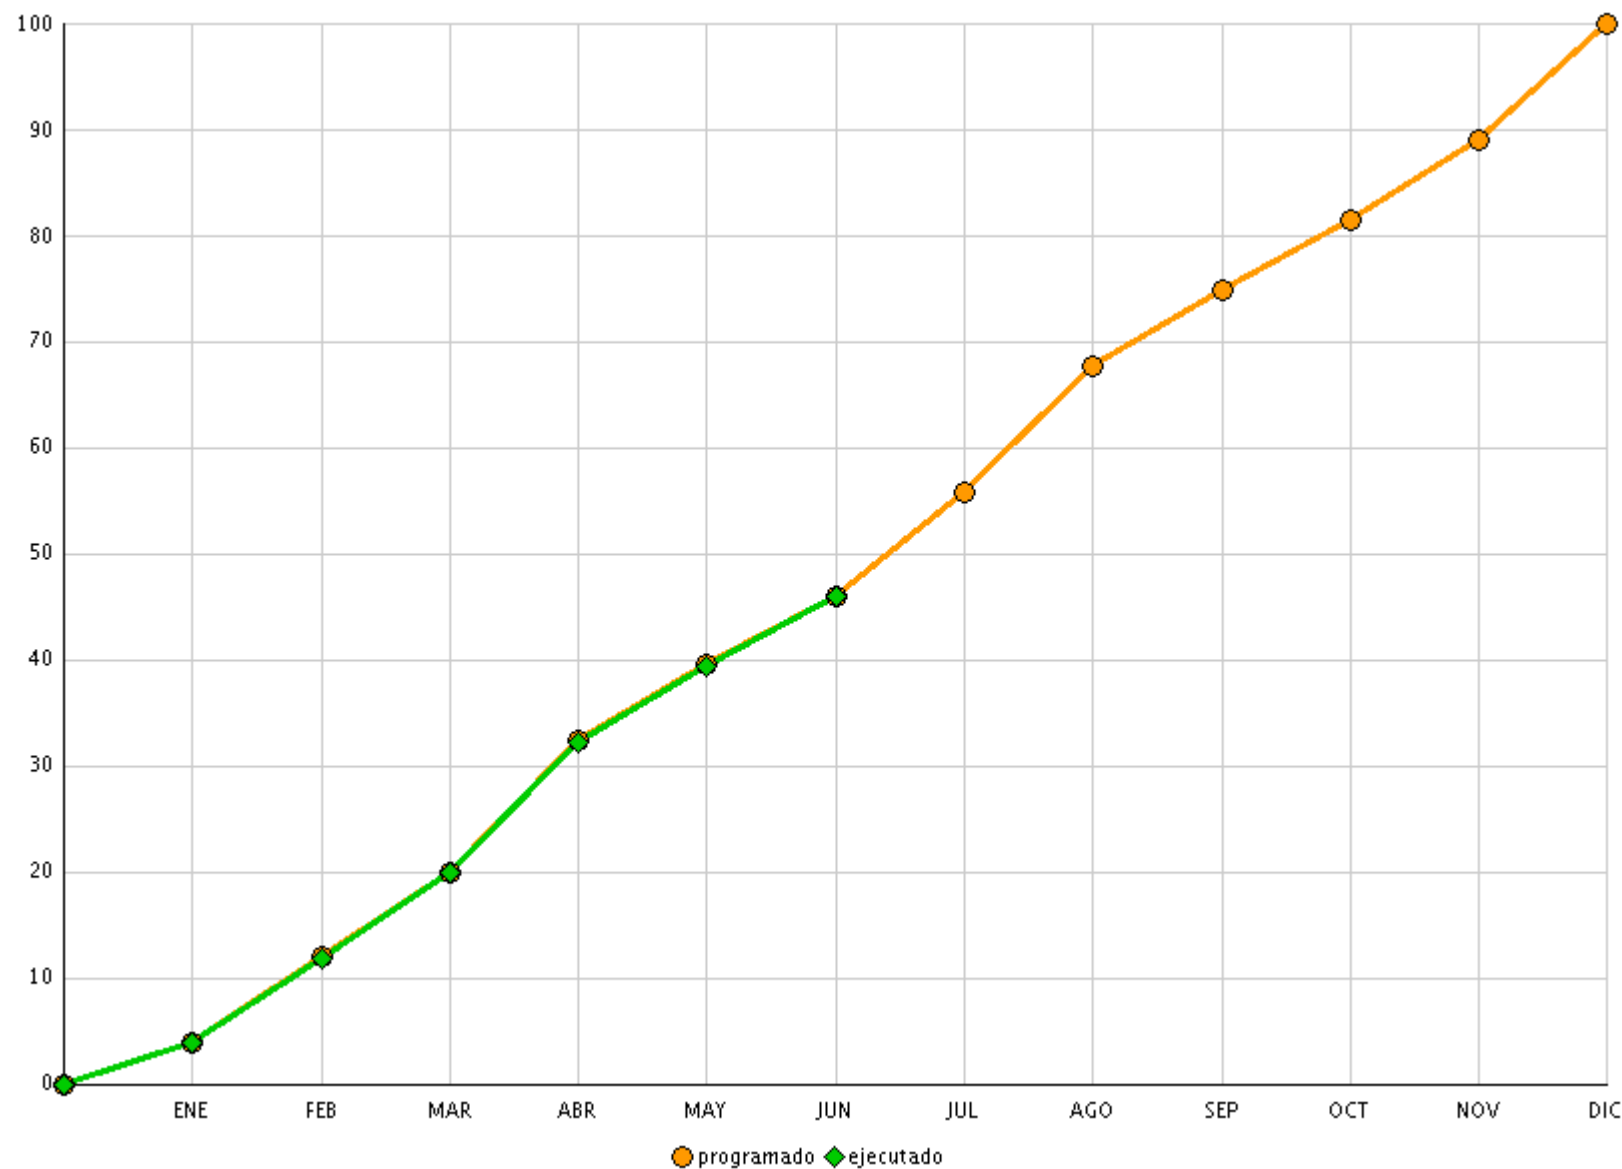


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.96	12.04	20.05	32.43	39.53	46.04	55.90	67.76	74.90	81.50	88.97	100.00
Ejecutado	3.96	11.95	19.96	32.34	39.44	45.95						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7666 Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

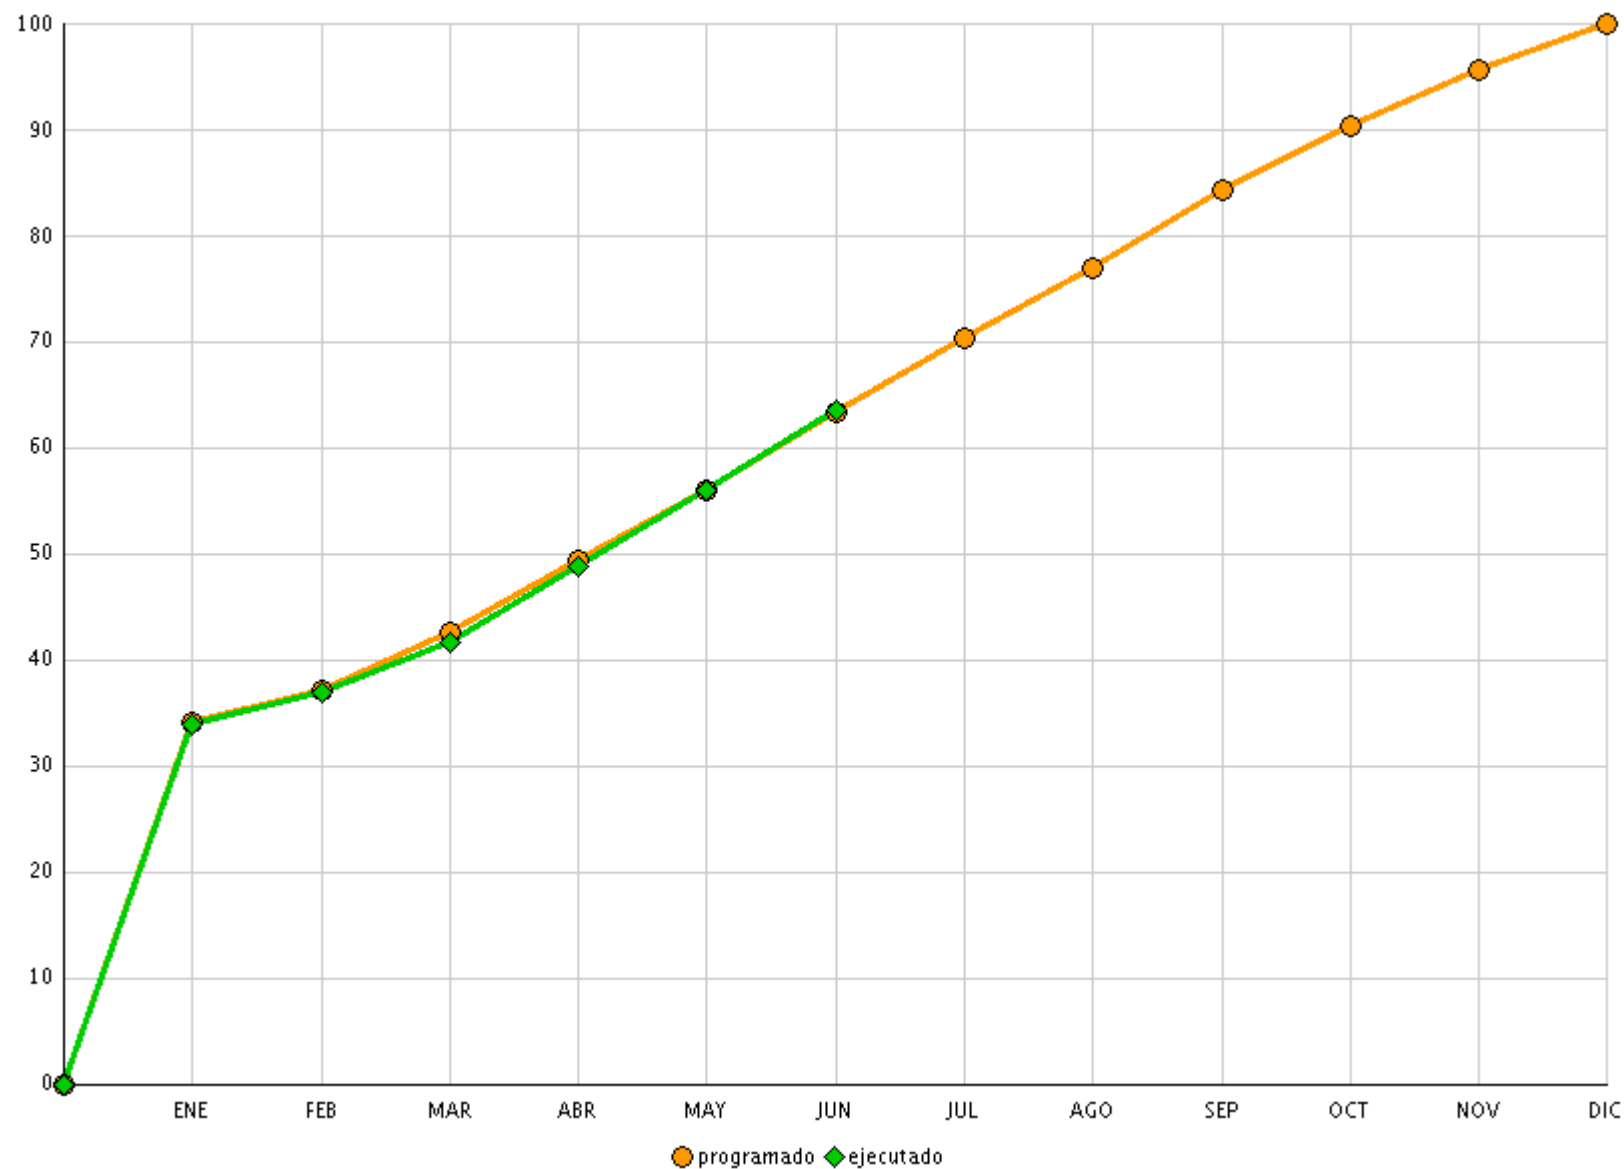


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	34.09	37.08	42.59	49.34	56.09	63.43	70.42	77.05	84.30	90.32	95.71	100.00
Ejecutado	34.02	37.06	41.71	48.85	55.99	63.49						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7667 Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

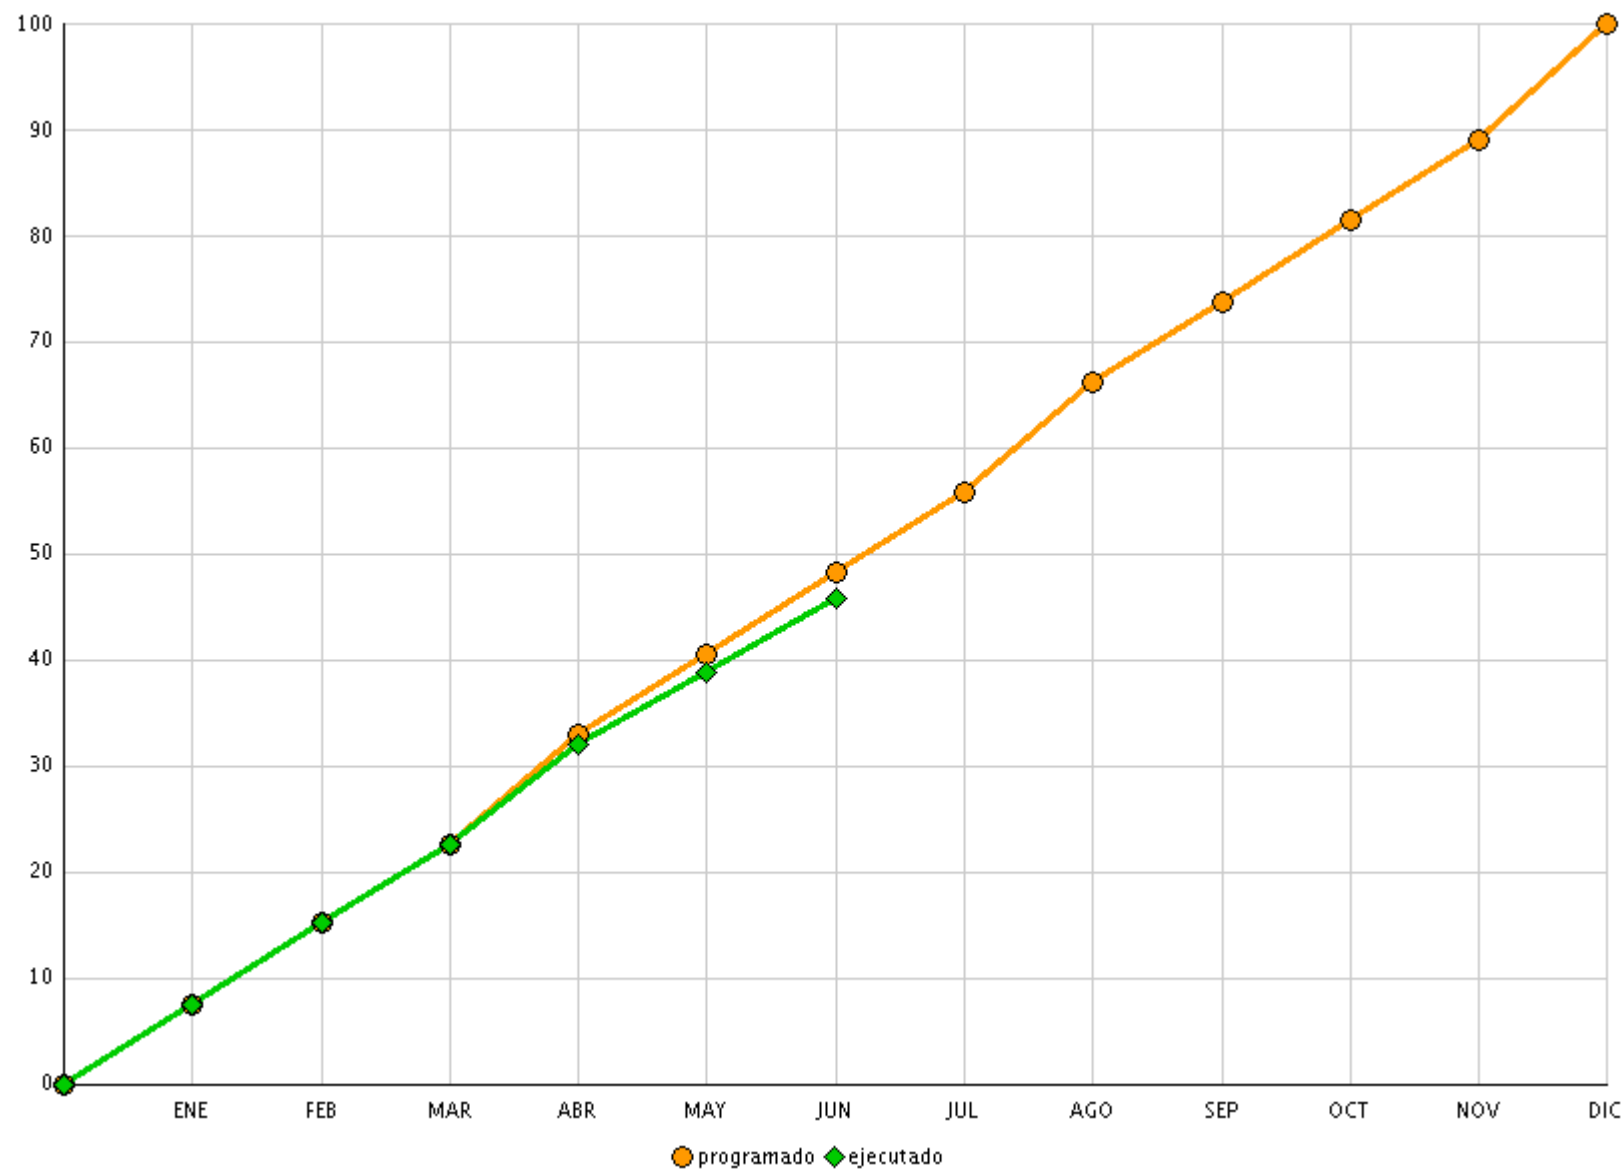


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.62	15.25	22.64	32.96	40.59	48.22	55.85	66.19	73.82	81.46	89.09	100.00
Ejecutado	7.62	15.28	22.67	32.08	38.83	45.80						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7677 Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

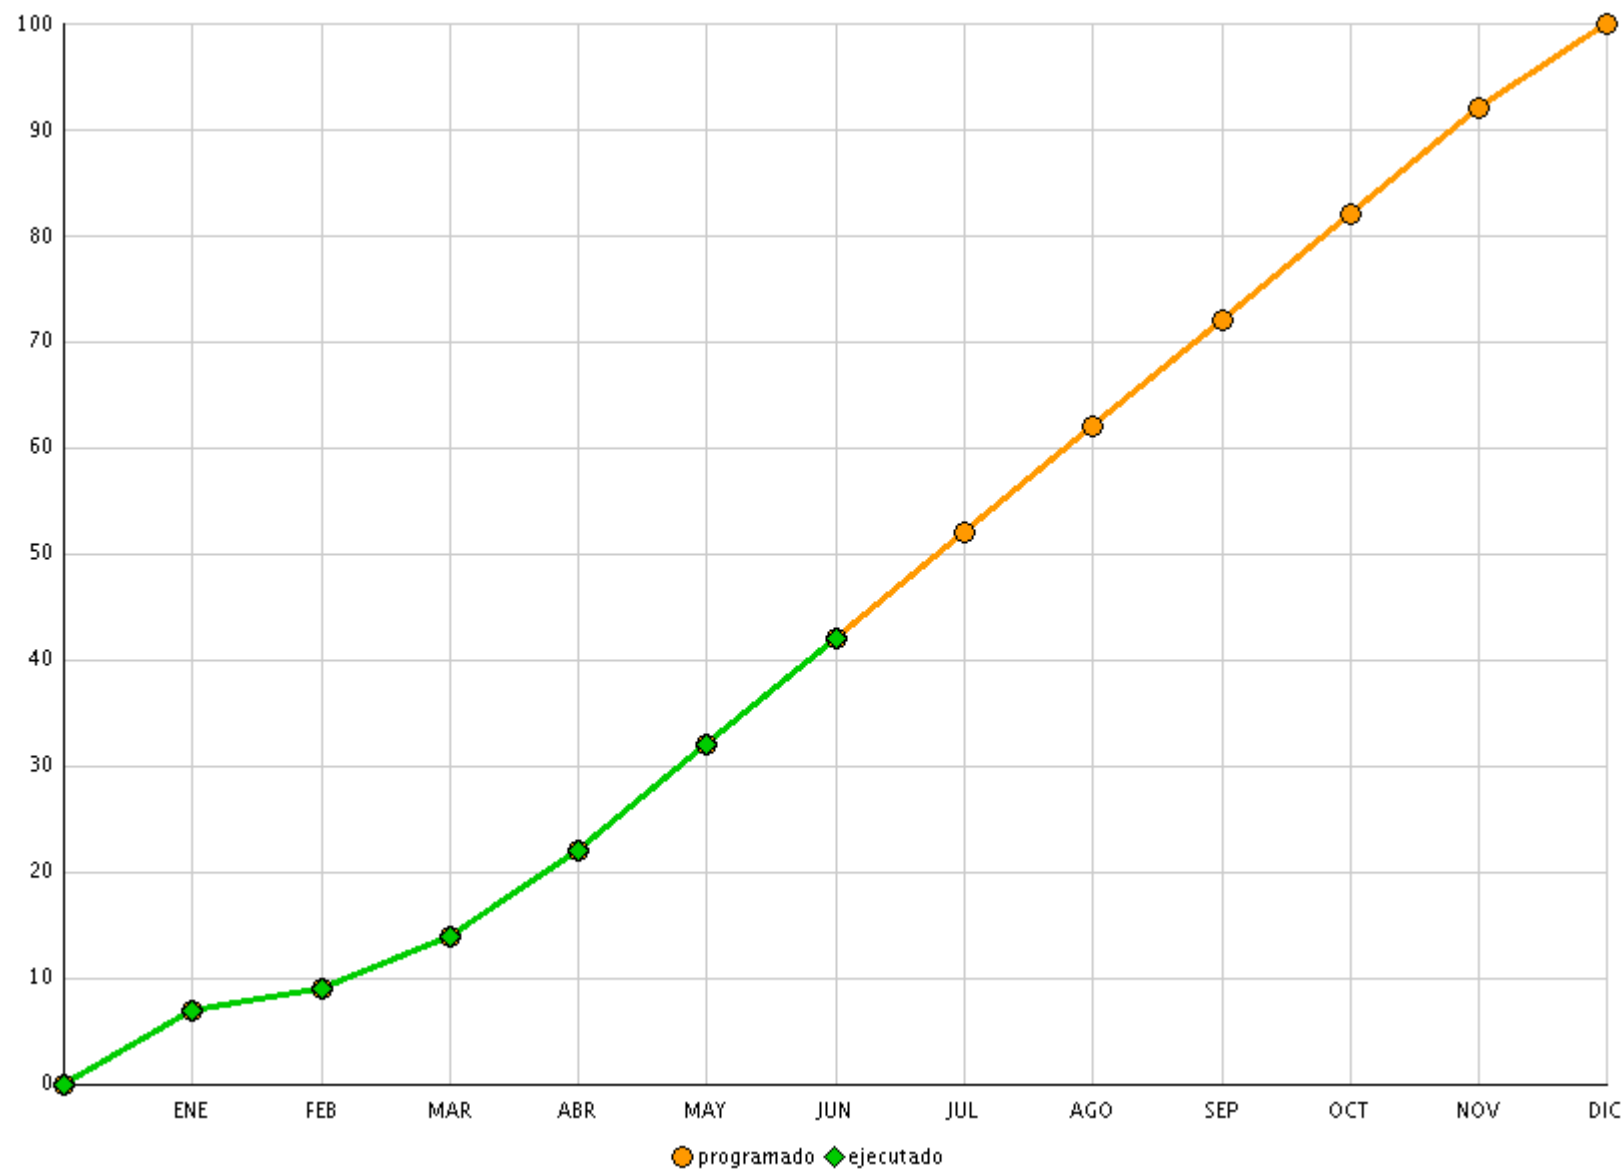


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.00	9.00	14.00	22.00	32.00	42.00	52.00	62.00	72.00	82.00	92.00	100.00
Ejecutado	7.00	9.00	14.00	22.00	32.00	42.00						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7679 Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá

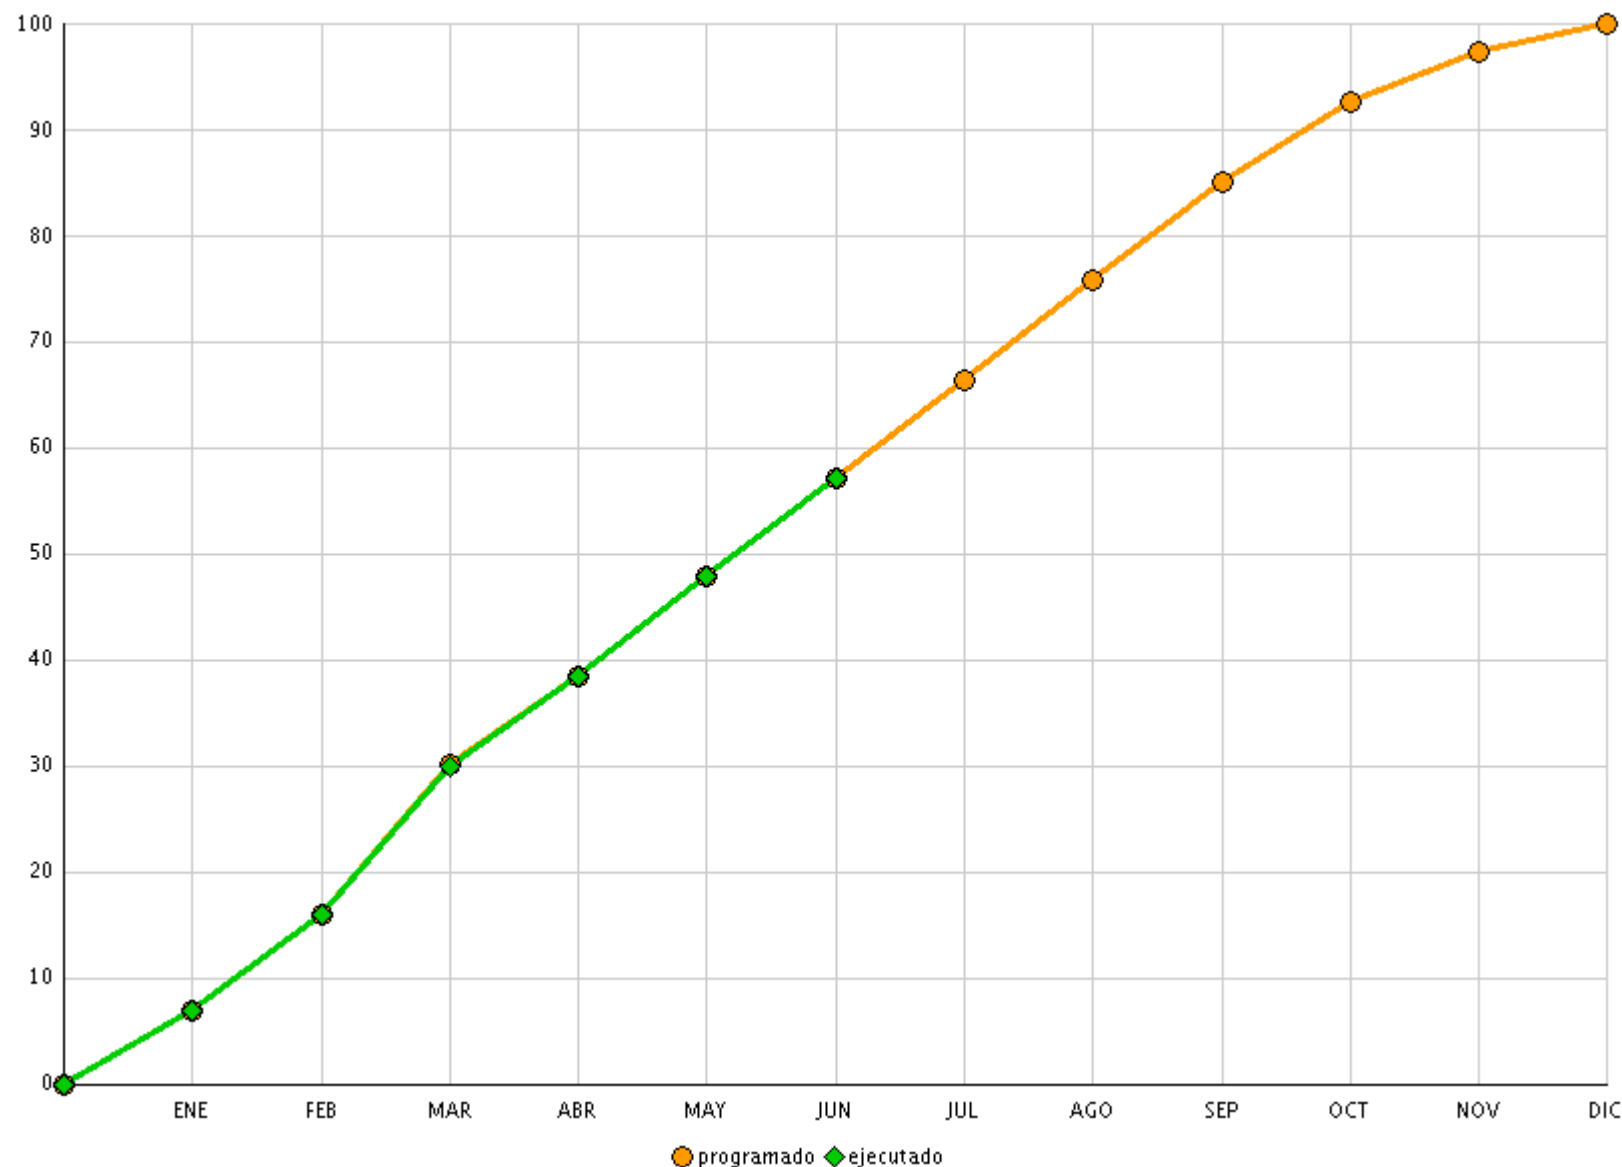


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.05	16.07	30.12	38.52	47.83	57.14	66.47	75.80	85.14	92.69	97.32	100.00
Ejecutado	7.05	16.07	29.96	38.52	47.83	57.14						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7681 Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

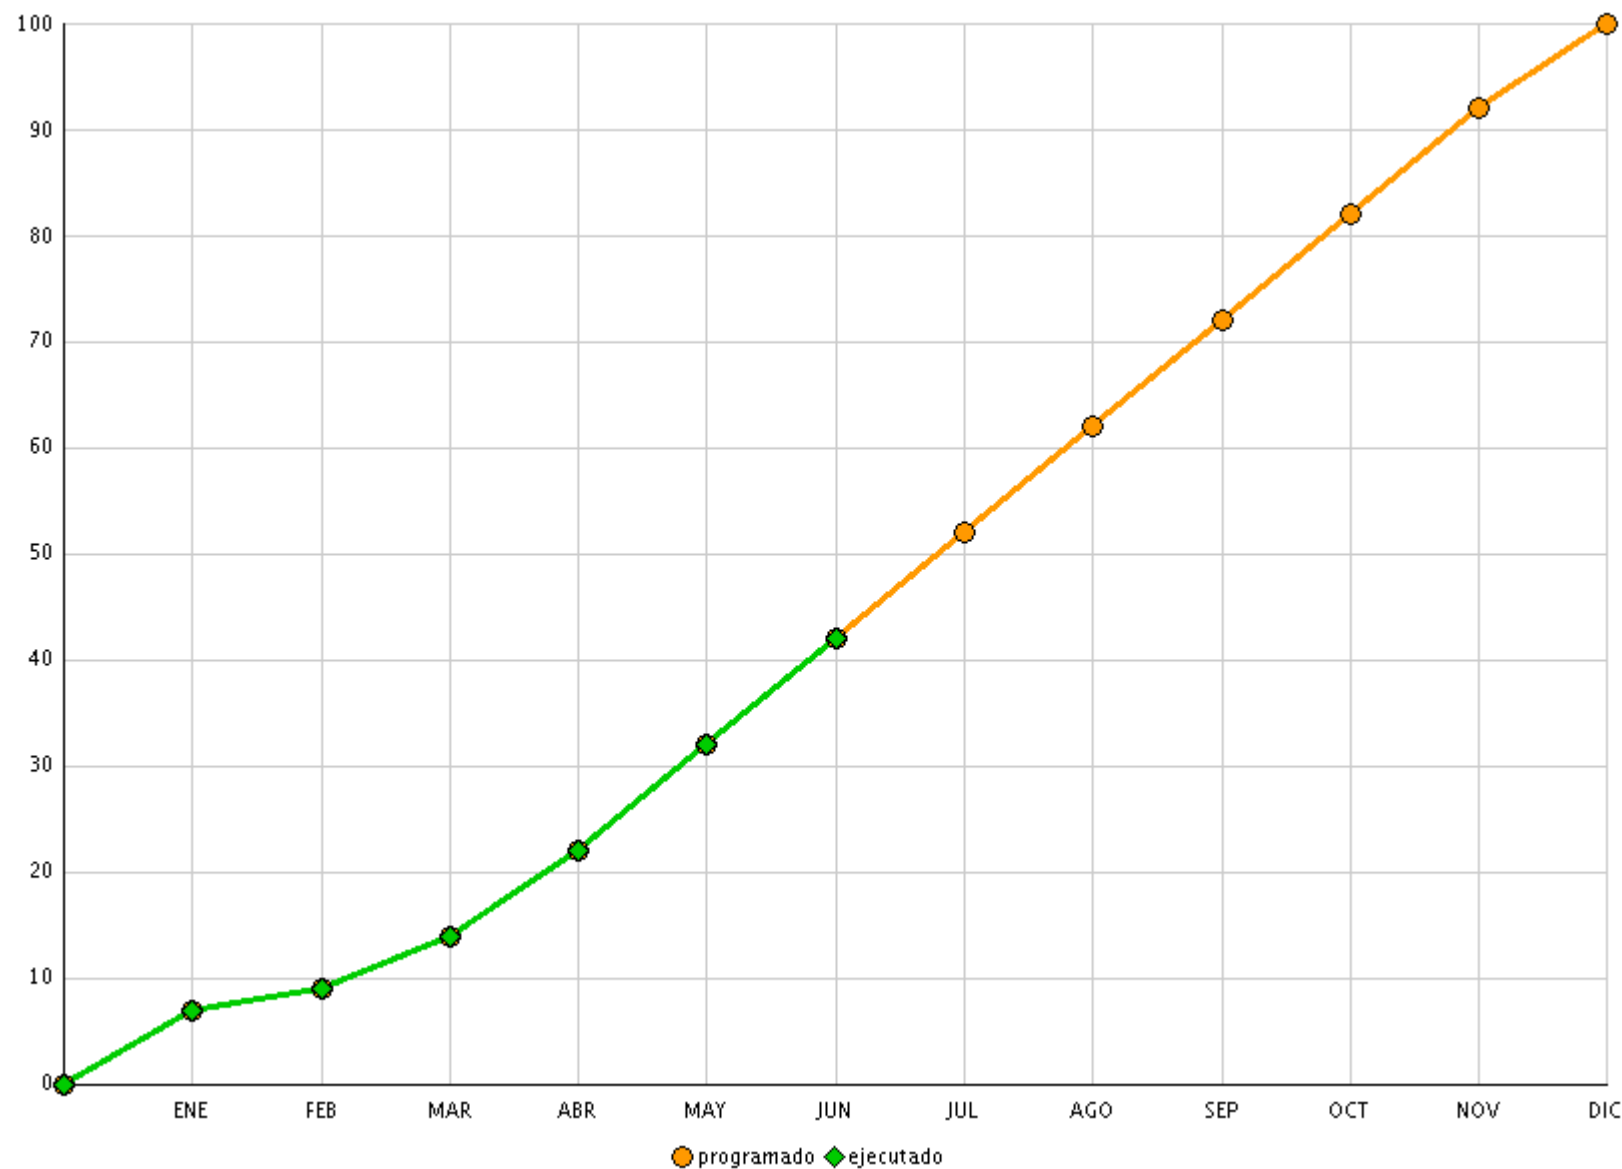


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.00	9.00	14.00	22.00	32.00	42.00	52.00	62.00	72.00	82.00	92.00	100.00
Ejecutado	7.00	9.00	14.00	22.00	32.00	42.00						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7683 Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

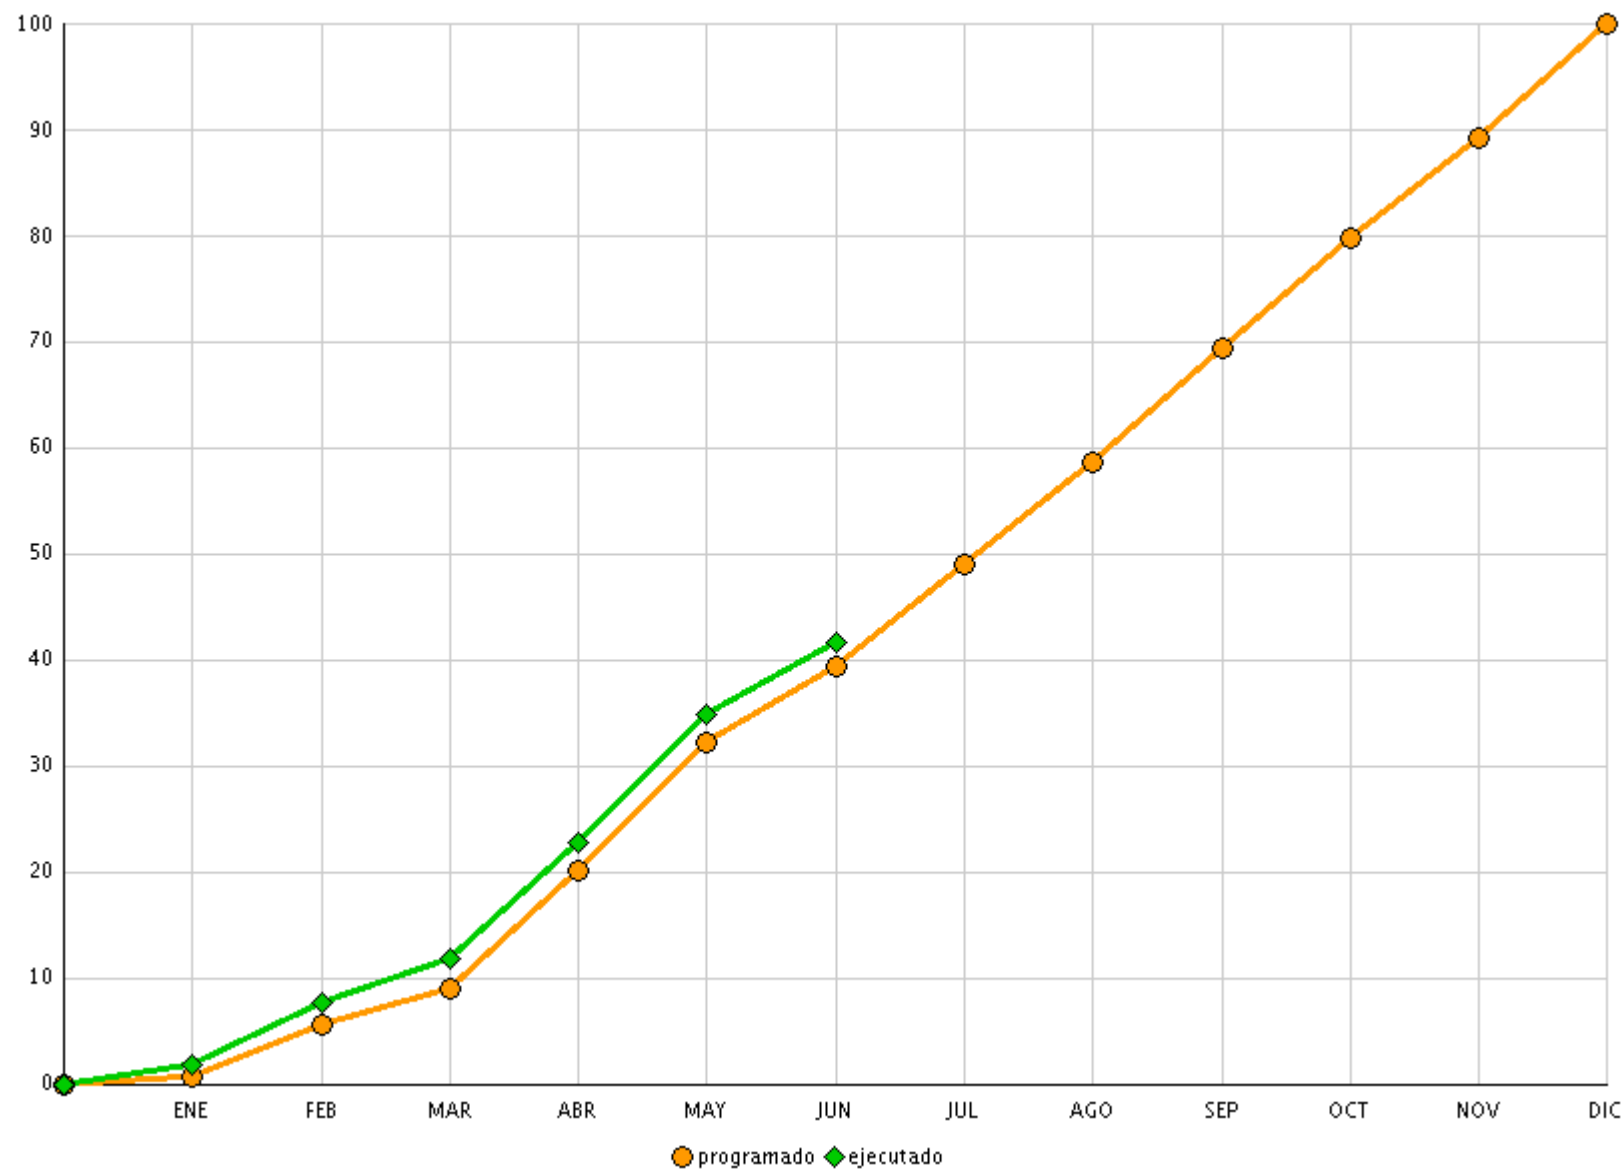

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.78	5.59	9.11	20.15	32.25	39.38	49.07	58.75	69.41	79.83	89.27	100.00
Ejecutado	1.94	7.64	11.86	22.84	34.87	41.62						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7651 17 Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ENRIQUECER CON ESPECIES ACCESADAS A LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL TROPICARIO.	26.20	6.90	6.90	10.34	10.00	10.34	10.34	9.66	9.66	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97		8.97		8.97		8.97		6.90		2.04		100.00	54.84	14.37
2.	DESARROLLAR 1 PROTOCOLO DE MANEJO DE ESPECIES A EXHIBIR EN EL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	8.10	2.78	2.78	8.61	8.61	4.44	4.44	16.25	16.25	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72		20.00		4.72		4.72		4.17		20.15		100.00	41.52	3.36
3.	IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA GENERAR PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA FLORA REPRESENTATIVA DEL TROPICARIO.	24.90	3.79	3.79	3.64	3.64	10.12	10.12	9.88	9.88	7.09	7.09	4.09	4.09	16.97		6.61		7.24		3.85		12.88		13.84		100.00	38.61	9.61
4.	IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA GENERAR PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA FLORA REPRESENTATIVA DEL TROPICARIO.	7.70	2.00	2.00	6.00	6.00	12.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	12.00		8.00		8.00		12.00		6.00		8.00		100.00	46.00	3.54
5.	DESARROLLAR 1 PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO QUE INTEGRE LOS PROTOCOLOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL TROPICARIO.	33.10	2.50	2.50	10.00	10.00	4.50	4.50	16.50	16.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		17.00		6.00		6.00		5.00		14.50		100.00	45.50	15.06
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										45.95

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7666 12 Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	VINCULAR PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	6.37	2.86	2.87	9.43	9.51	9.43	10.93	9.43	11.67	9.43	9.70	9.43	10.00	9.43		9.43		9.43		9.43		9.42		2.85		100.00	54.68	3.48
2.	VINCULAR PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	11.00	0.79	0.97	1.98	2.40	8.33	3.66	8.33	5.40	8.33	6.18	14.28	3.32	8.33		8.33		14.28		7.94		7.95		11.13		100.00	21.93	2.41
3.	VINCULAR PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	66.49	50.54	50.62	1.96	1.96	4.20	4.13	4.68	5.09	5.12	4.73	5.28	4.99	5.27		5.20		5.17		5.07		4.24		3.27		100.00	71.52	47.55
4.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANÍA CON ENFOQUE TERRITORIAL	6.88	3.11	1.00	3.26	3.26	3.26	2.25	10.00	11.90	10.00	25.00	10.00	39.29	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.37		100.00	82.70	5.69
5.	FORMAR PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32		0.00		26.32		0.00		21.04		0.00		100.00	26.32	0.30
6.	REALIZAR JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	4.91	0.00	0.00	6.67	6.67	13.33	6.67	13.33	20.00	13.33	13.33	13.33	0.00	13.33		13.33		6.67		6.68		0.00		0.00		100.00	46.67	2.29
7.	CONSTRUIR REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	3.20	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		0.00		100.00	55.00	1.76
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										63.49

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7667 12 Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA	22.00	7.27	7.27	7.27	7.30	7.30	7.30	8.48	9.11	8.48	9.11	8.48	10.11	8.49		8.49		8.49		8.49		8.49		10.27		100.00	50.20	11.04
2.	REALIZAR 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL	65.00	7.27	7.27	7.27	7.30	7.30	7.30	11.40	11.40	7.27	7.30	7.27	7.30	7.27		11.43		7.27		7.27		7.27		11.71		100.00	47.87	31.12
3.	REALIZAR 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO	13.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	28.00	3.64
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										45.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7677 20 Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN DEL RIESGO	76.40	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	32.09
2. PLANIFICACIÓN DE LA ARBORIZACIÓN Y JARDINERÍA DEL DISTRITO CAPITAL.	5.10	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	2.14
3. PROCESO DE PARTICIPACIÓN	1.10	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	0.46
4. PROCESO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	15.20	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	6.38
5. PROCESOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	2.20	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	0.92
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		42.00		

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DETERMINAR EL POTENCIAL ECOLÓGICO Y VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DEL ALMACENAMIENTO Y FLUJO DE CARBONO.	9.37	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		2.50		100.00	52.50	4.92
2.	EVALUAR ASPECTOS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA	11.67	5.00	5.00	10.00	10.00	17.00	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		3.00		2.60		2.40		100.00	62.00	7.24
3.	REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE LA FLORA DE BOGOTÁ D.C.	5.51	7.50	7.50	7.50	7.50	15.30	15.30	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.10		8.10		8.20		8.20		8.10		5.00		100.00	54.30	2.99
4.	REALIZAR EL ENRIQUECIMIENTO MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	10.15	7.50	7.50	7.50	7.50	15.30	15.30	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.10		8.10		8.20		8.20		8.10		5.00		100.00	54.30	5.51
5.	CURAR Y ENRIQUECER LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	11.90	10.05	10.05	4.95	4.95	23.20	23.20	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10		8.10		8.10		8.20		2.60		2.40		100.00	62.50	7.44
6.	ANALIZAR FENÓMENOS DE DISTURBIO Y ASPECTOS ECOLÓGICOS DE ESPECIES INVASORAS	9.32	7.50	7.50	12.50	12.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		5.50		4.00		0.50		100.00	60.00	5.59
7.	ANALIZAR DINÁMICAS, MECANISMOS Y PROCESOS ECOLÓGICOS A NIVEL DE ECOSISTEMAS Y PAISAJE	4.48	7.50	7.50	12.50	12.50	10.00	10.00	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33	10.34		10.34		10.17		5.00		2.83		0.33		100.00	60.99	2.73
8.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN PROPAGACIÓN TRADICIONAL E IN VITRO	6.13	5.00	5.00	10.00	10.00	16.50	15.10	9.50	10.90	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50		9.50		9.50		7.80		1.20		2.50		100.00	60.00	3.68
9.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN SANIDAD VEGETAL	1.91	5.00	5.00	10.00	10.00	16.50	15.10	9.50	10.90	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50		9.50		9.50		7.80		1.20		2.50		100.00	60.00	1.15
10.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN BIOPROSPECCIÓN	3.39	5.00	5.00	10.00	10.00	16.50	15.10	9.50	10.90	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50		9.50		9.50		7.80		1.20		2.50		100.00	60.00	2.03
11.	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	17.57	8.20	8.20	8.20	8.20	7.90	7.90	8.30	8.30	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50		9.50		9.50		8.70		7.20		4.00		100.00	51.60	9.07
12.	IMPLEMENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DATOS CIENTÍFICOS	8.60	6.80	6.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80		9.80		9.80		9.80		4.50		0.50		100.00	55.80	4.80

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 57.14

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7681 19 Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN LAS HUERTAS URBANA Y PERIURBANA	72.30	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	30.37
2. FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DISTRITAL DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	4.50	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	1.89
3. FORTALECER LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	23.20	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	9.74
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		42.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7683 15 Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECER Y MANTENER EN 100% DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG.	8.66	3.00	8.00	3.00	4.00	9.00	10.00	8.00	7.00	11.00	9.00	10.00	11.00	12.00		9.00		8.00		8.00		10.00		9.00		100.00	49.00	4.24
2.	ACTUALIZAR Y EJECUTAR EL 100% DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD.	44.20	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	12.30	12.30	16.33	16.33	4.00	3.00	10.34		9.00		11.33		10.33		8.00		11.37		100.00	38.63	17.07
3.	ELABORAR E IMPLEMENTAR 1 DIAGNÓSTICO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL	0.34	4.50	4.00	5.00	5.00	13.00	14.00	10.00	10.00	11.00	11.00	7.00	6.00	9.00		9.00		4.00		5.00		9.50		13.00		100.00	50.00	0.17
4.	EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.96	2.36	2.40	5.50	14.00	6.33	6.33	8.33	8.33	10.33	10.33	8.33	7.00	9.33		9.33		8.33		9.33		11.00		11.50		100.00	48.39	0.95
5.	LOGRAR EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL PETIC PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMA TIC	11.39	4.00	5.00	4.50	10.00	12.00	15.00	10.30	10.50	10.00	10.00	9.20	9.20	7.00		7.00		6.00		7.00		8.00		15.00		100.00	59.70	6.80
6.	PREPARAR 100 POR CIENTO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	2.07	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00		5.00		10.00		10.00		15.00		10.00		100.00	75.00	1.55
7.	ADELANTAR 1.400 METROS CUADRADOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	27.43	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	5.00	10.00	10.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00		11.00		12.00		13.00		13.00		10.00		100.00	33.00	9.05
8.	ADELANTAR 2.686 METROS CUADRADOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00		20.00		15.00		10.00		0.00		0.00		100.00	45.00	1.78


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 41.62

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Proyecto de inversión

7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá

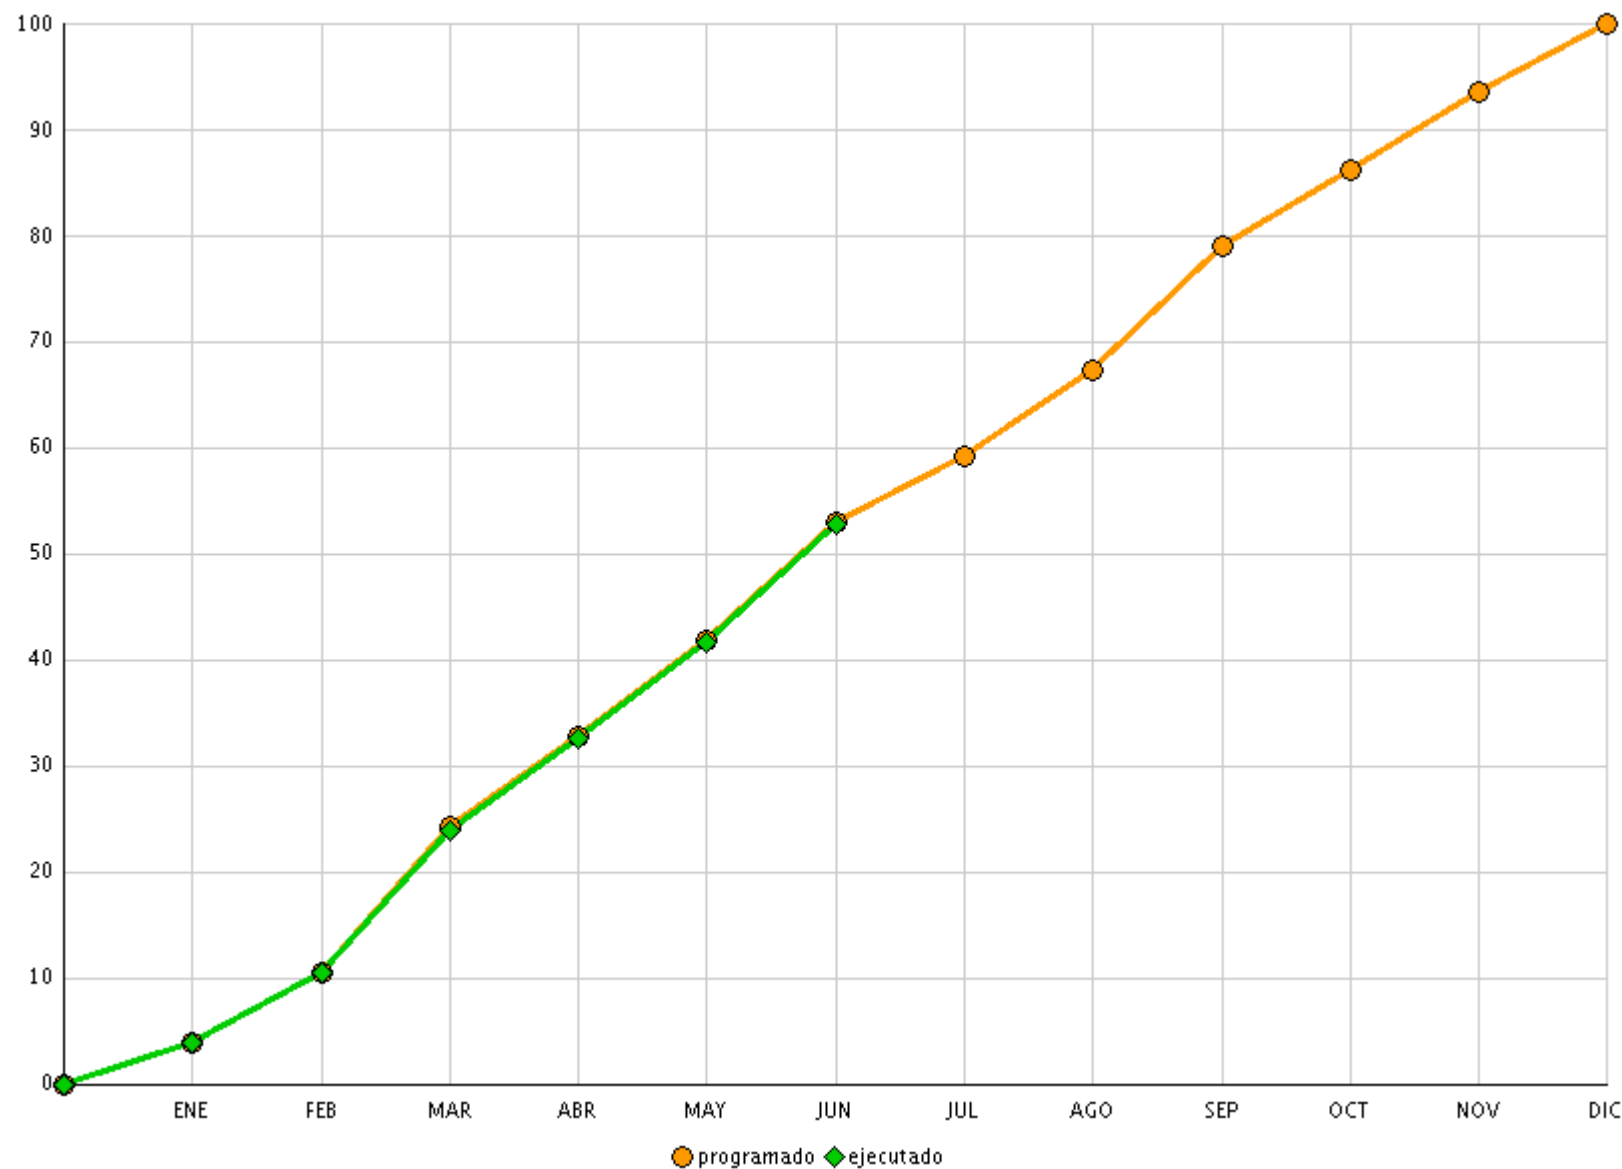

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.91	10.51	24.32	32.87	41.97	52.96	59.25	67.45	79.15	86.25	93.60	100.00
Ejecutado	3.91	10.51	24.04	32.59	41.69	52.82						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

219 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

7553 16 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN ARTE, EDUCACIÓN Y GÉNERO 2022	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	1.95
2.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA 2022	3.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
3.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN MEDIA Y JÓVENES: EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN BOGOTÁ 2022	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.50
4.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS SOMÁTICAS EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y BIENESTAR EMOCIONAL EN CONTEXTOS ESCOLARES 2022	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	30.00	0.90
5.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN GESTIÓN EDUCATIVA Y TERRITORIO: TRANSFORMACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL CIERRE DE BRECHAS 2022	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		5.00		100.00	5.00	0.15
6.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN ÍNDICE DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 2022	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	11.00		9.00		18.00		15.00		15.00		1.00		100.00	31.00	1.55
7.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN CARRERA DOCENTE Y EL MAESTRO INVESTIGADOR: UNA RUTA HACIA LA TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA 2022	5.00	4.00	4.00	10.00	10.00	16.00	16.00	10.00	10.00	17.00	17.00	10.00	10.00	4.00		10.00		4.00		2.00		10.00		3.00		100.00	67.00	3.35
8.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN RECURSOS CONVENIO SED-PUJ 2345-2021-DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE JARDINES INFANTILES PRIVADOS DE BOGOTÁ 2022	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	30.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
9.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 2022	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.30
10.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PROMOCIÓN Y APOYO 2022	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.50	8.00	7.50		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	48.00	6.72
11.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA MAESTROS Y MAESTRAS QUE INSPIRAN 2022	14.00	4.00	4.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	59.00	8.26
12.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2022	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.50	8.00	7.50		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	48.00	6.72
13.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2022	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		20.00		100.00	53.00	7.42


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 52.82

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7678 Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá

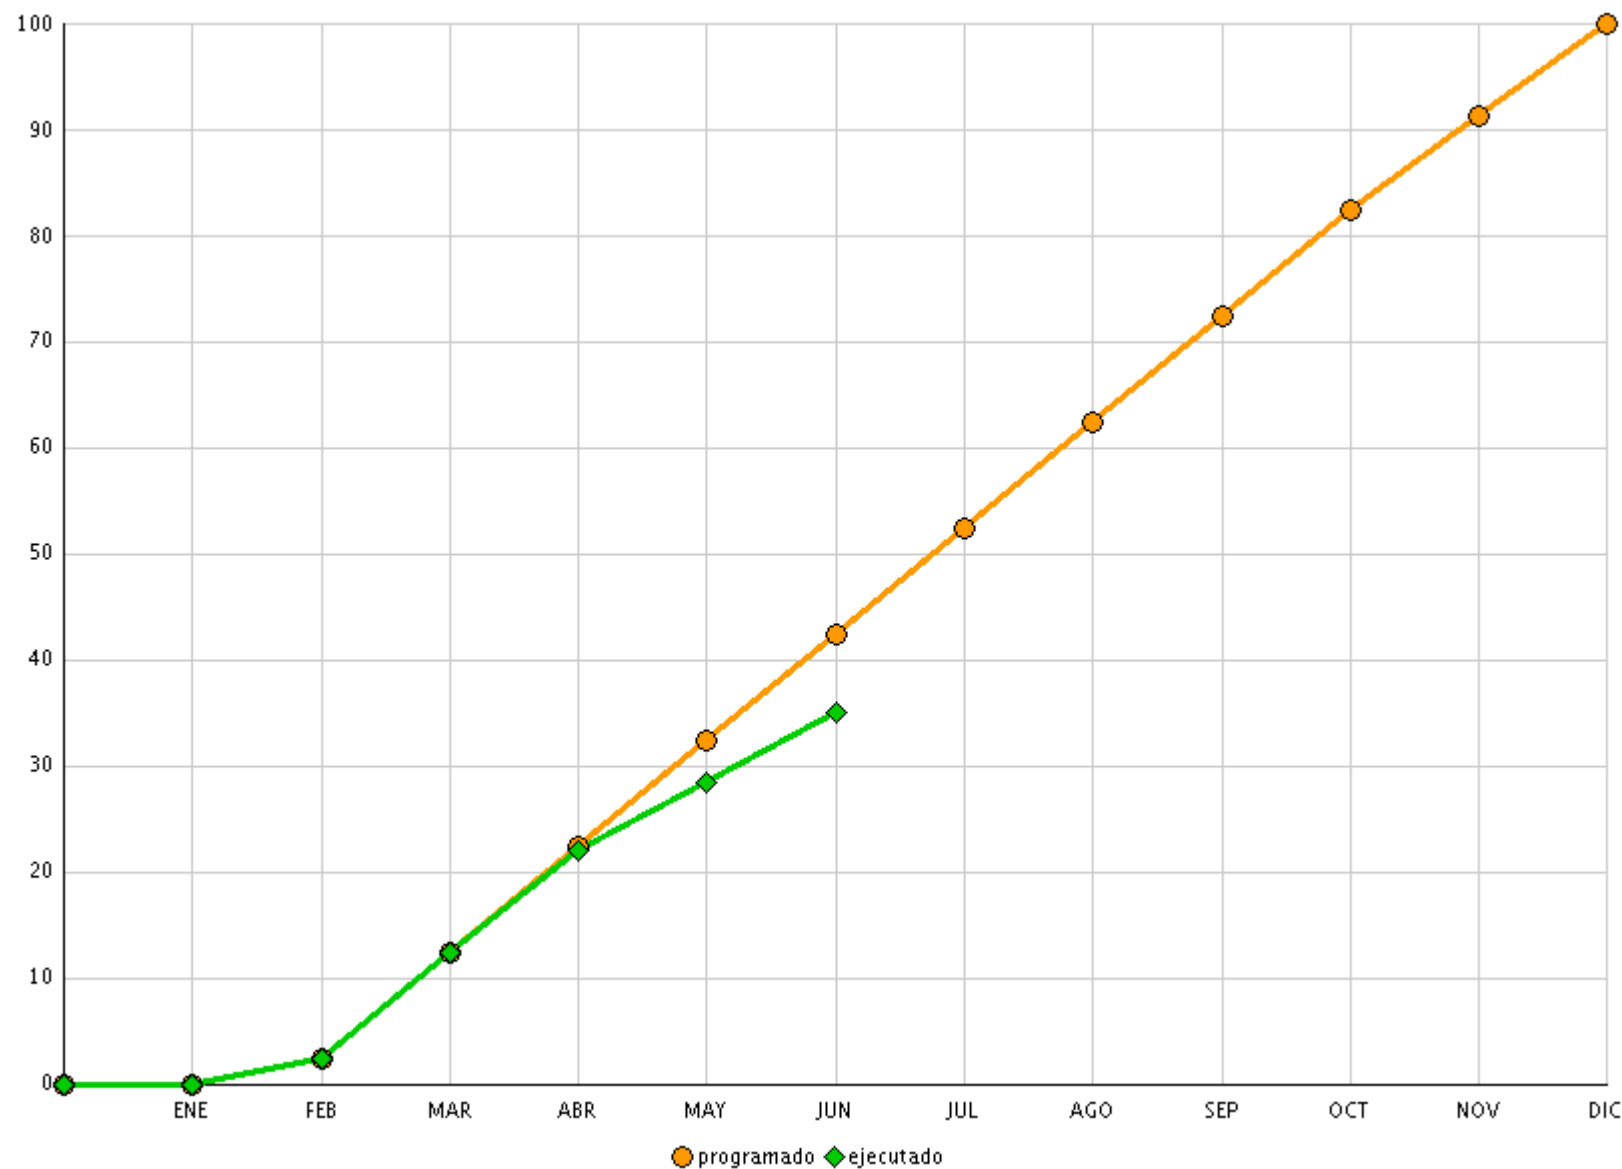


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.50	12.50	22.50	32.50	42.50	52.50	62.50	72.50	82.50	91.25	100.00
Ejecutado	0.00	2.50	12.50	22.00	28.50	35.00						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7685 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

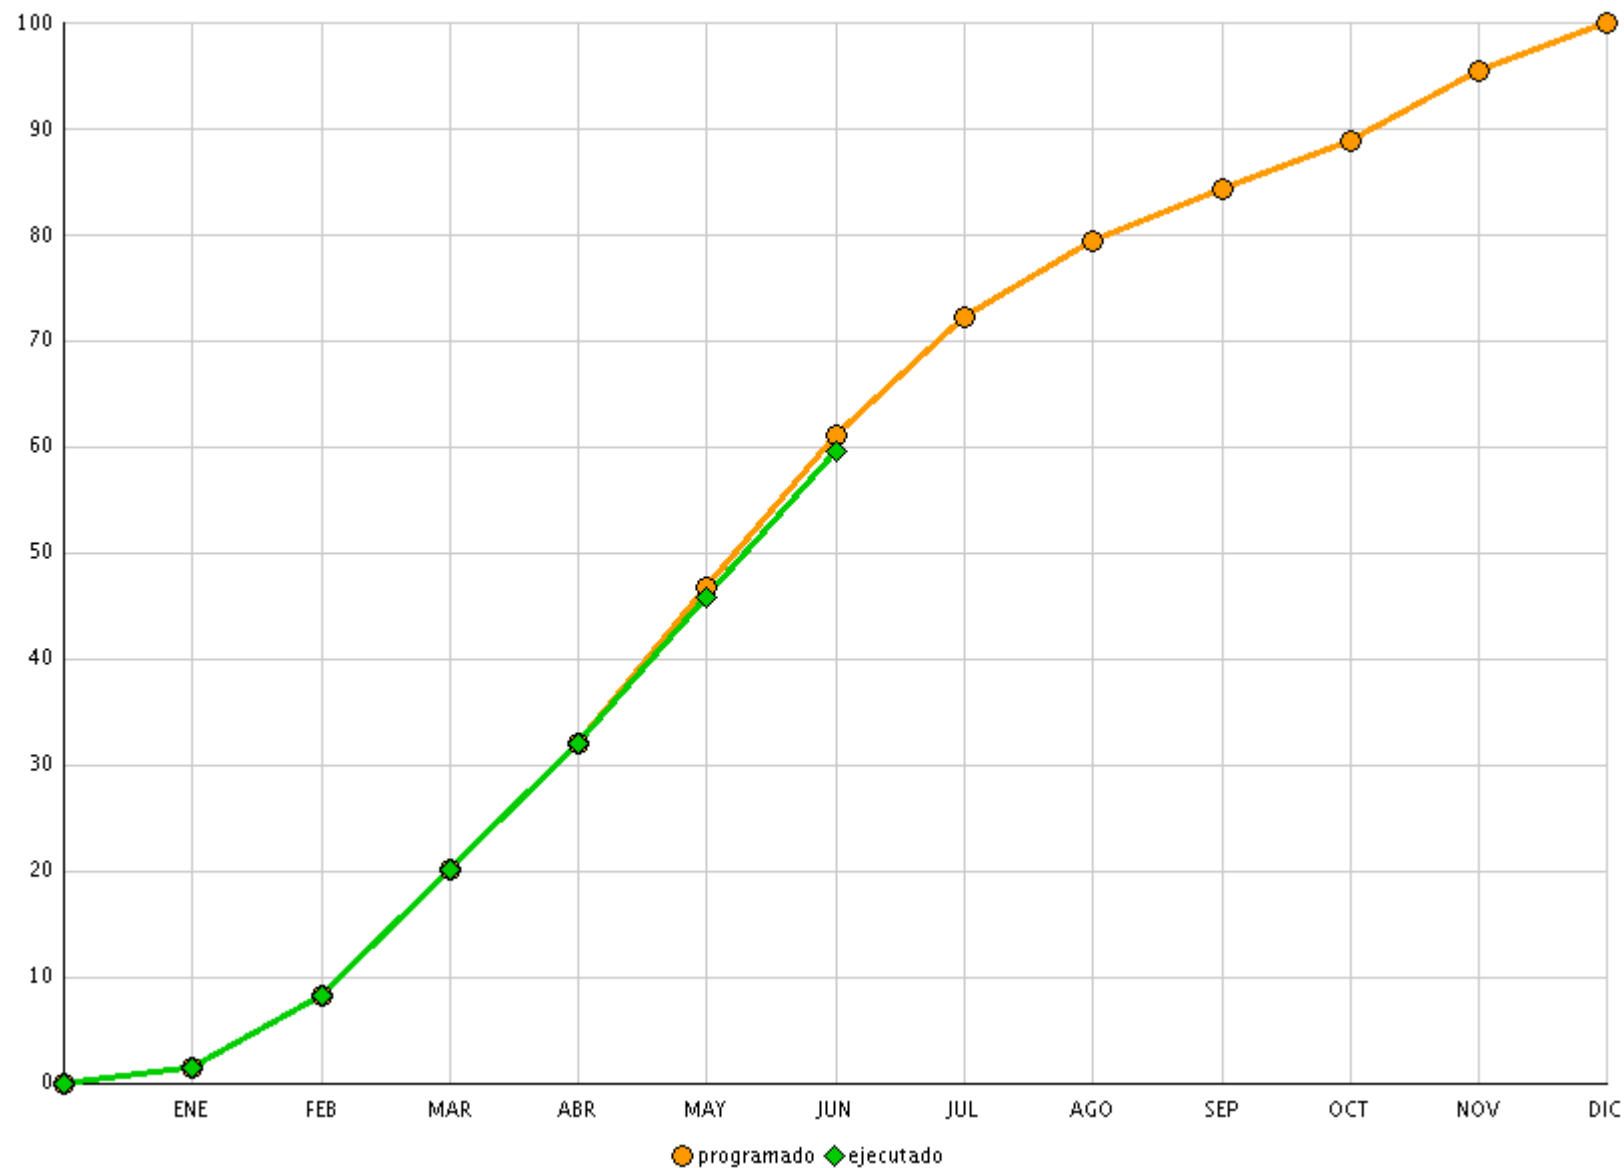


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.50	8.25	20.20	32.05	46.70	61.20	72.25	79.35	84.25	88.90	95.45	100.00
Ejecutado	1.50	8.25	20.20	32.05	45.90	59.60						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

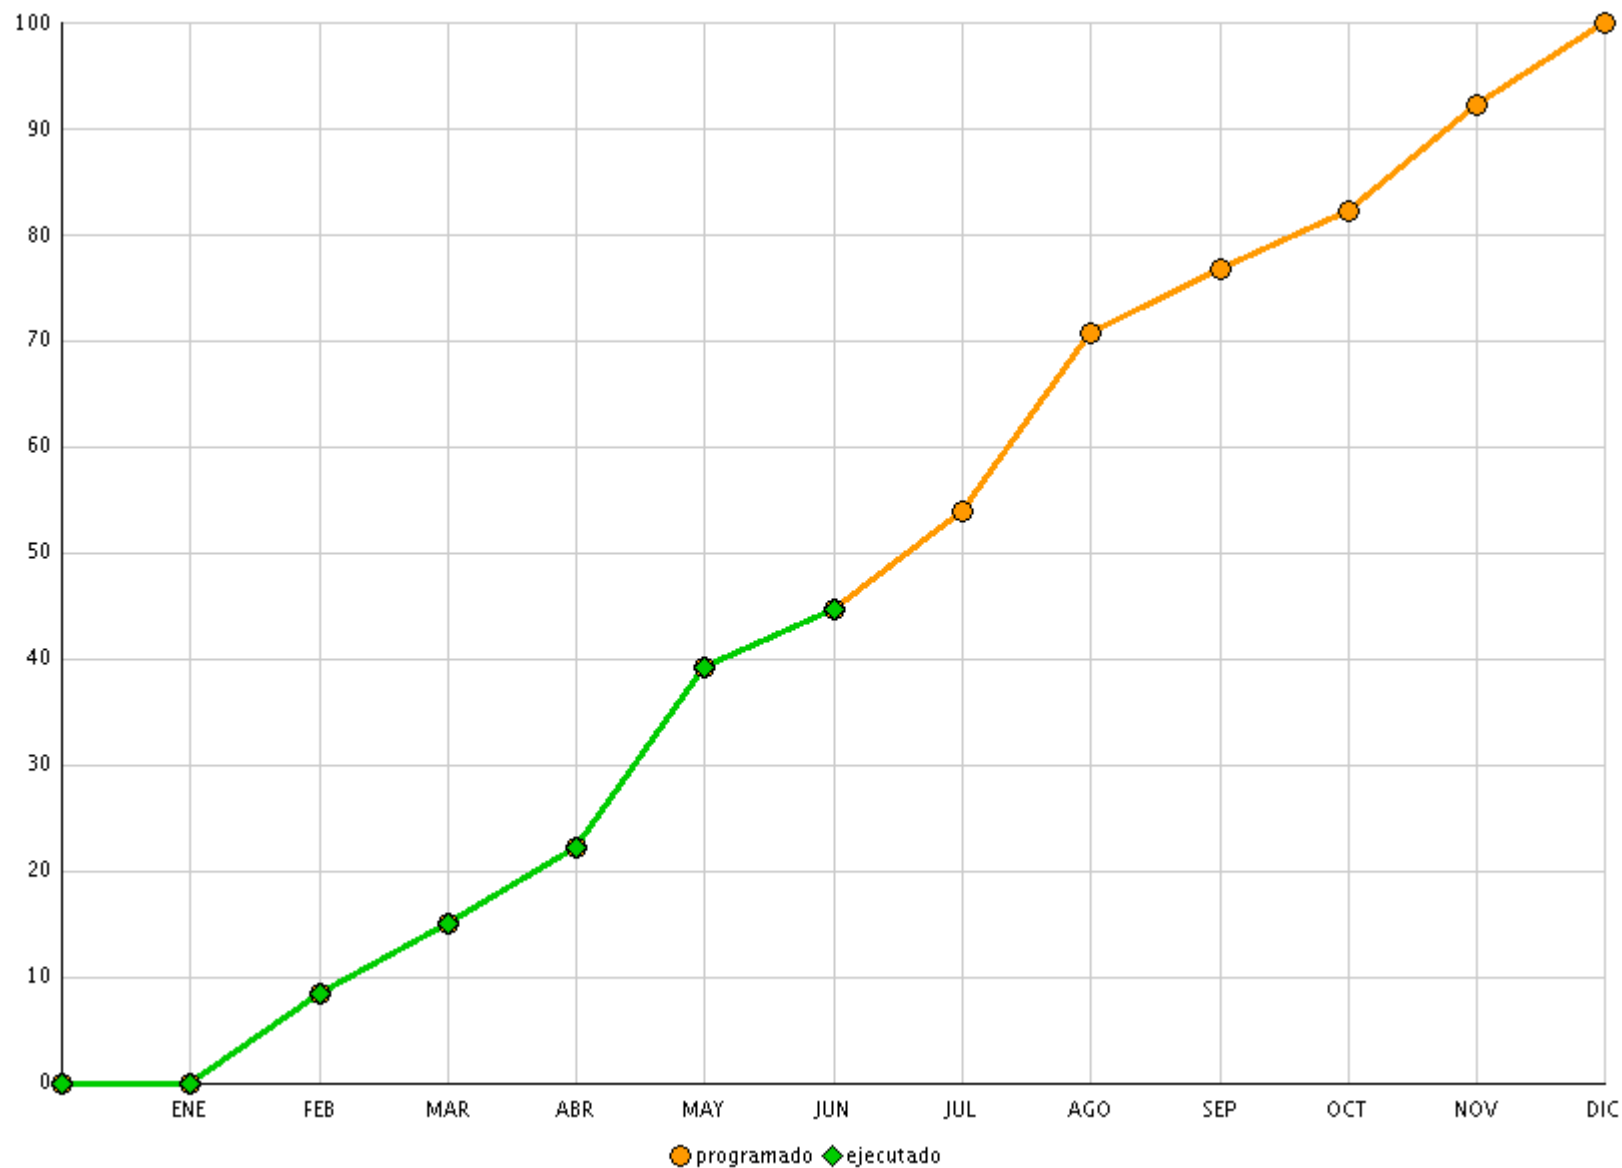


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	8.40	15.00	22.20	39.20	44.80	54.00	70.80	76.80	82.20	92.30	100.00
Ejecutado	0.00	8.40	15.00	22.20	39.20	44.80						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7688 Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

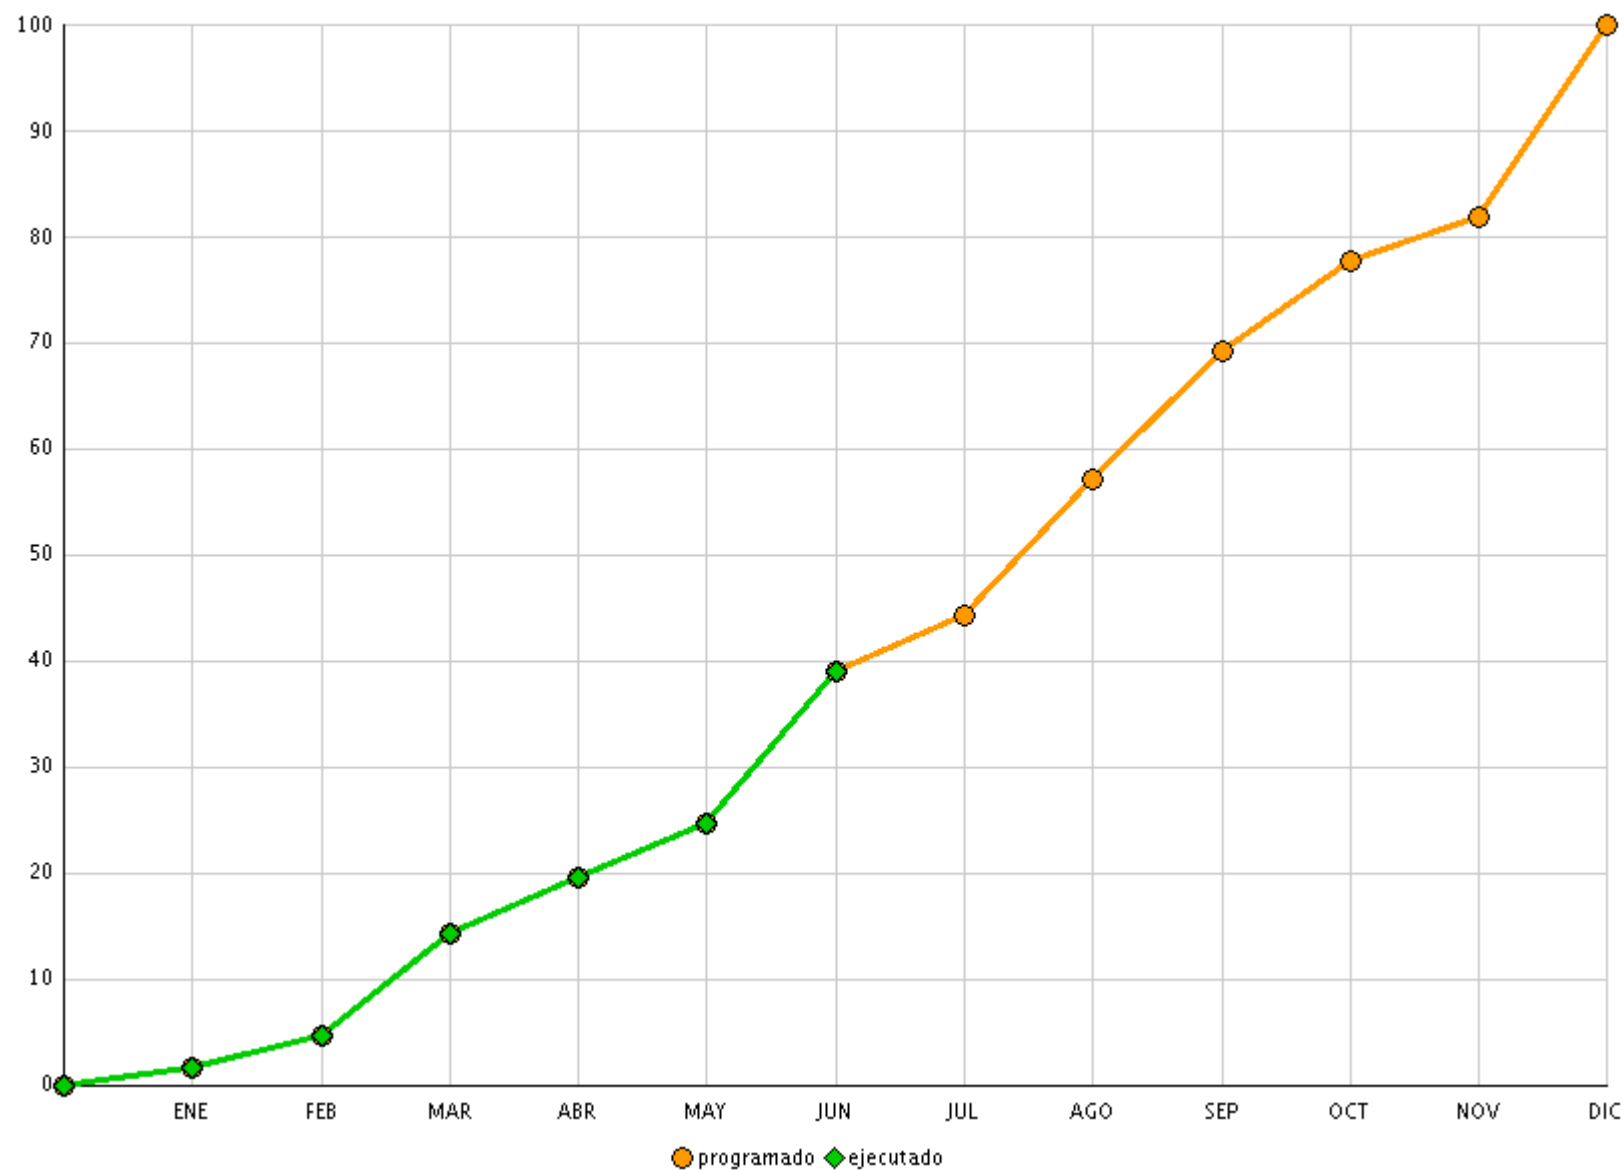


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.60	4.80	14.32	19.54	24.77	39.14	44.36	57.19	69.27	77.67	81.90	100.00
Ejecutado	1.60	4.80	14.32	19.54	24.77	39.14						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7712 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

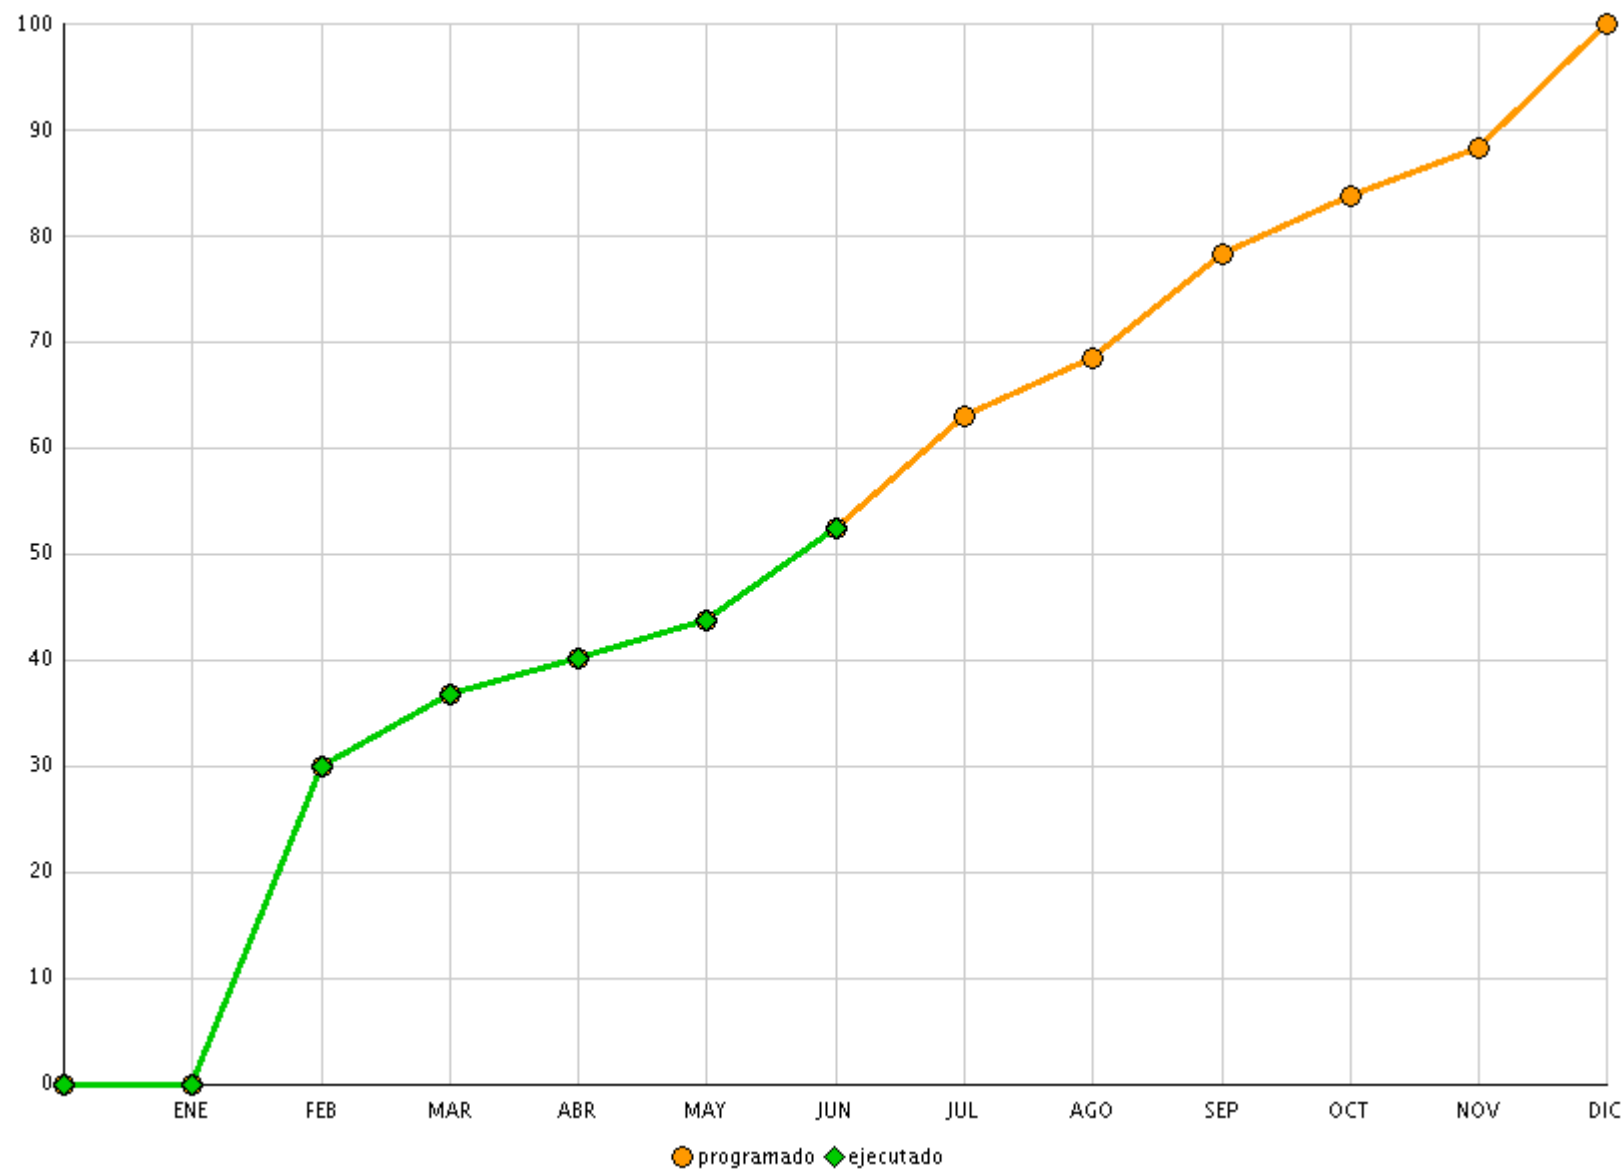


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	30.00	36.75	40.25	43.75	52.50	63.00	68.50	78.25	83.75	88.25	100.00
Ejecutado	0.00	30.00	36.75	40.25	43.75	52.50						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7714 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

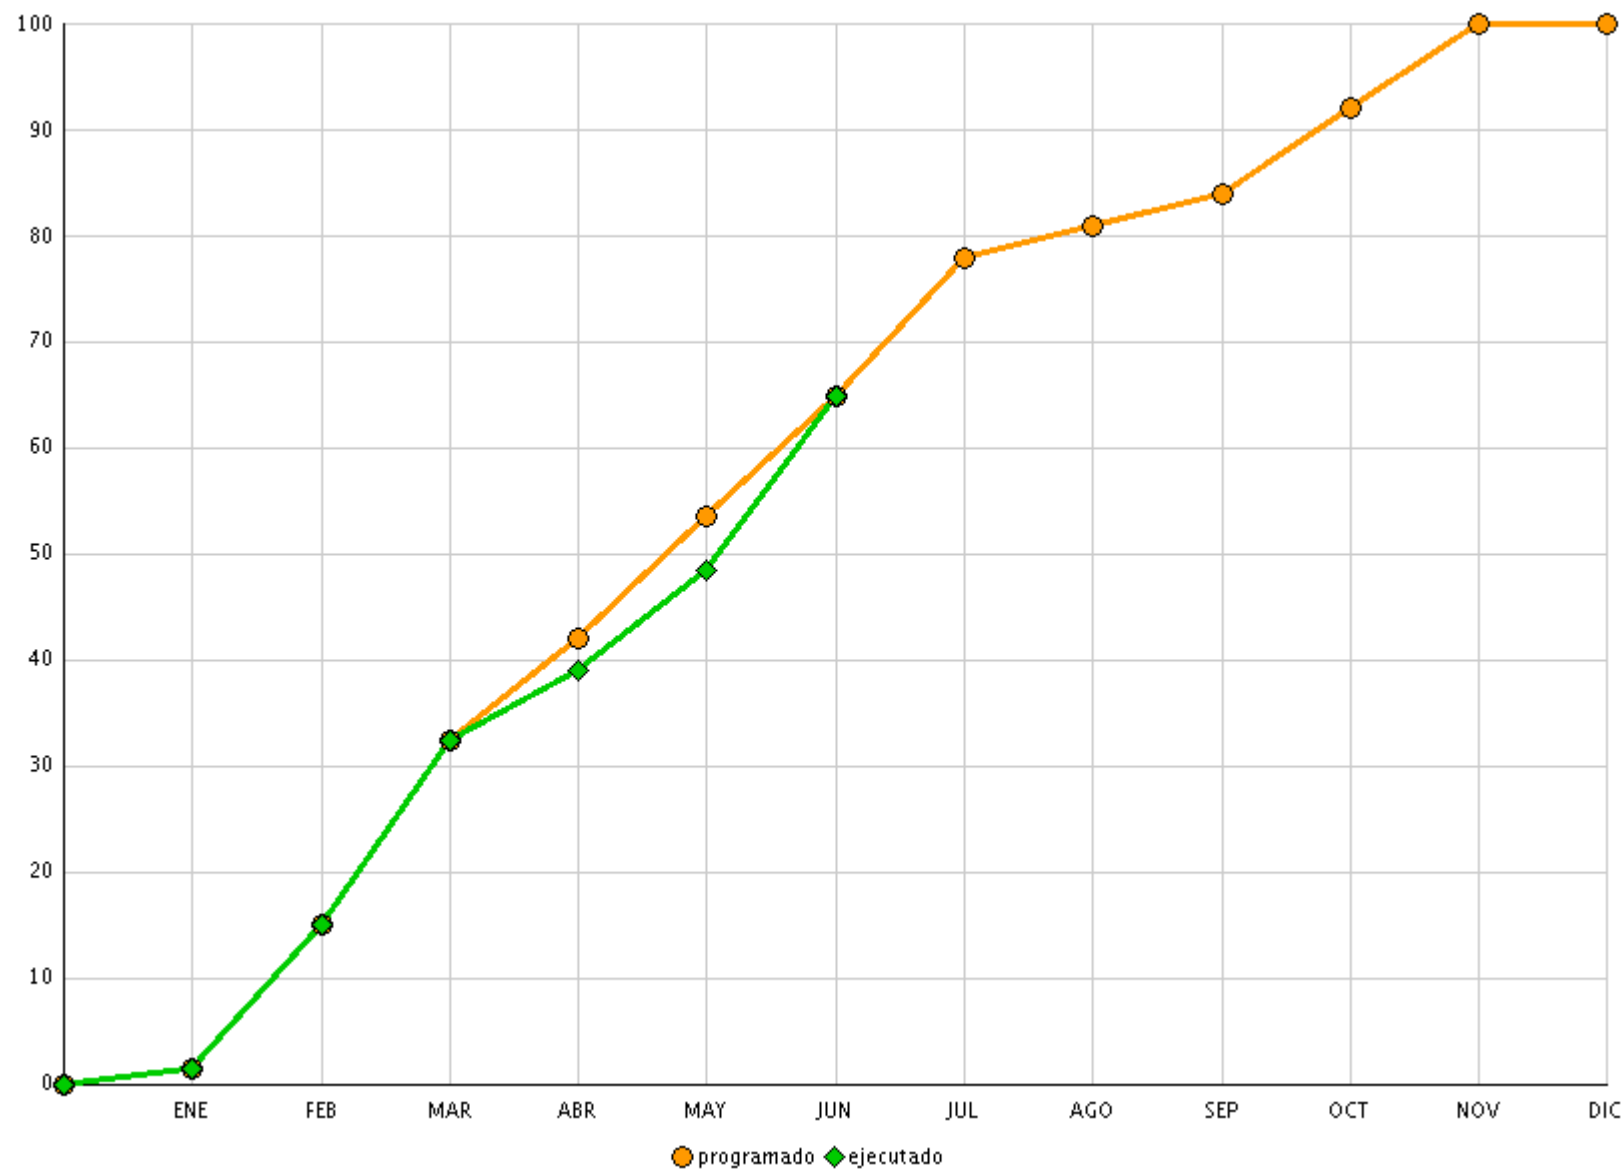


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.50	15.00	32.50	42.00	53.50	65.00	78.00	81.00	84.00	92.00	100.00	100.00
Ejecutado	1.50	15.00	32.50	39.00	48.50	65.00						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7723 Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá

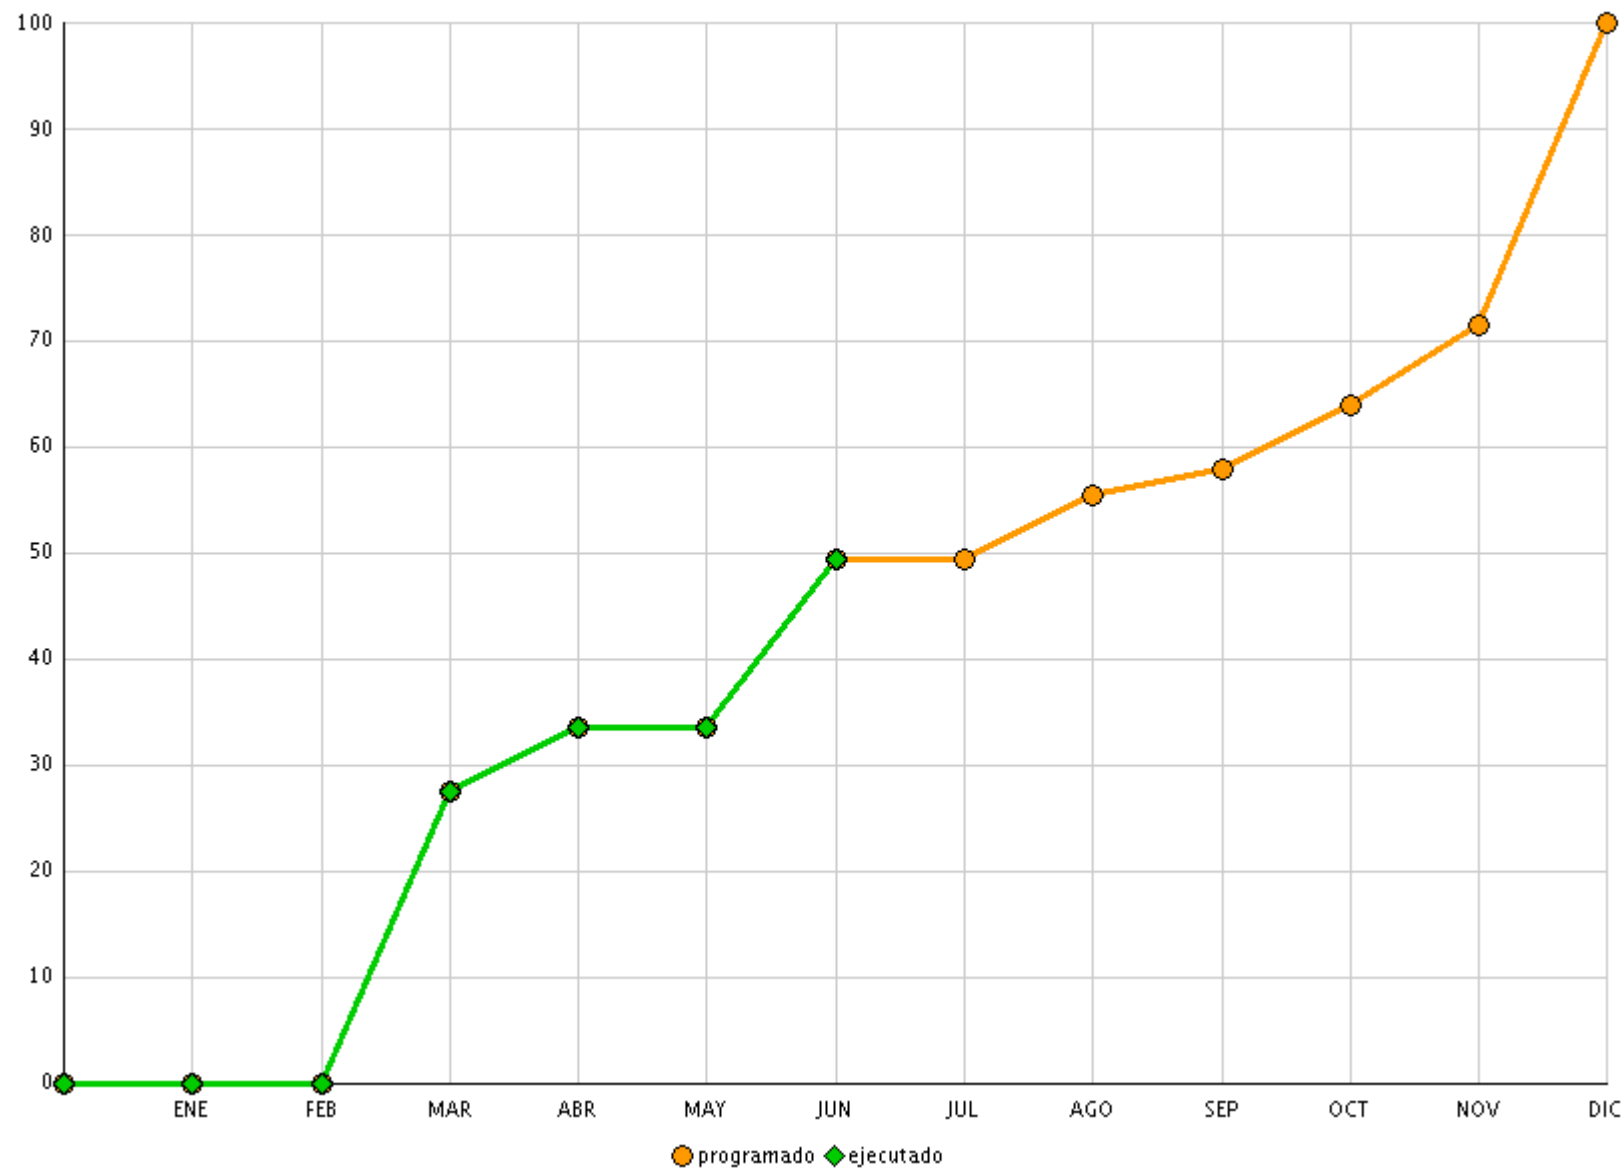


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	27.50	33.50	33.50	49.50	49.50	55.50	58.00	64.00	71.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	27.50	33.50	33.50	49.50						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7729 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

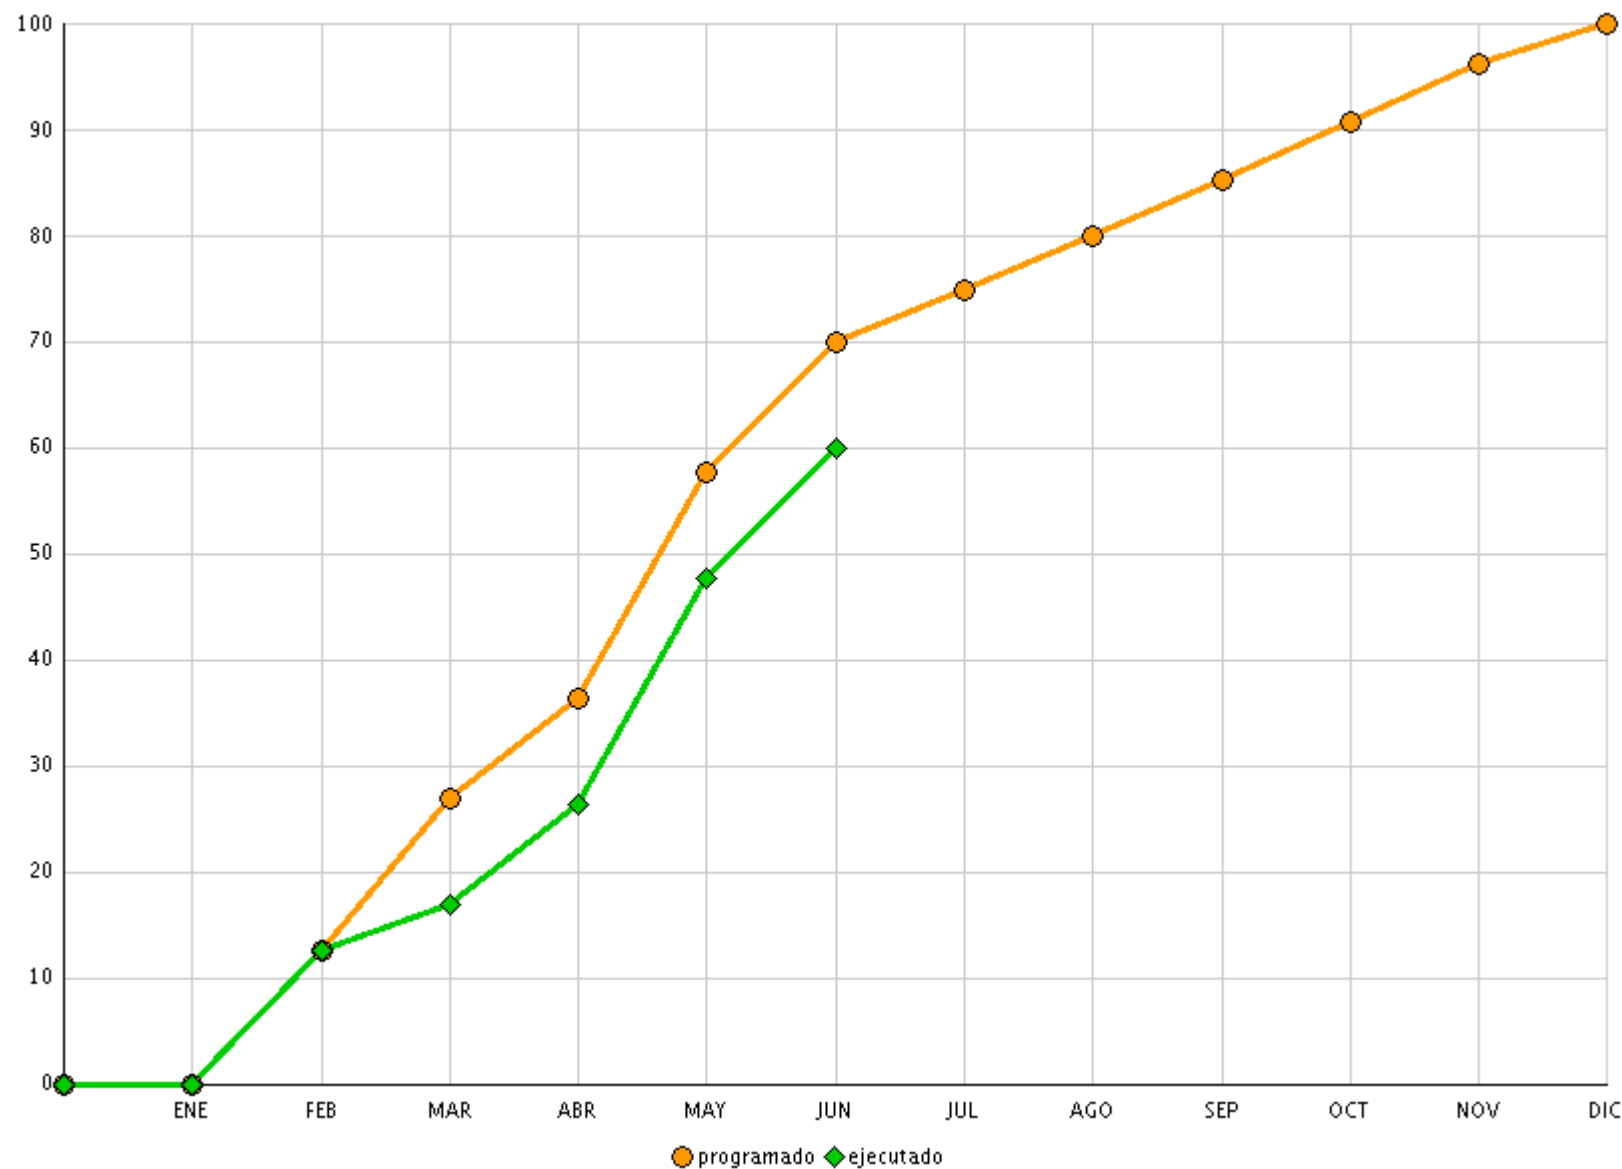


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	12.65	27.00	36.35	57.70	70.05	74.90	80.00	85.35	90.70	96.20	100.00
Ejecutado	0.00	12.65	17.00	26.35	47.70	60.05						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7796 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

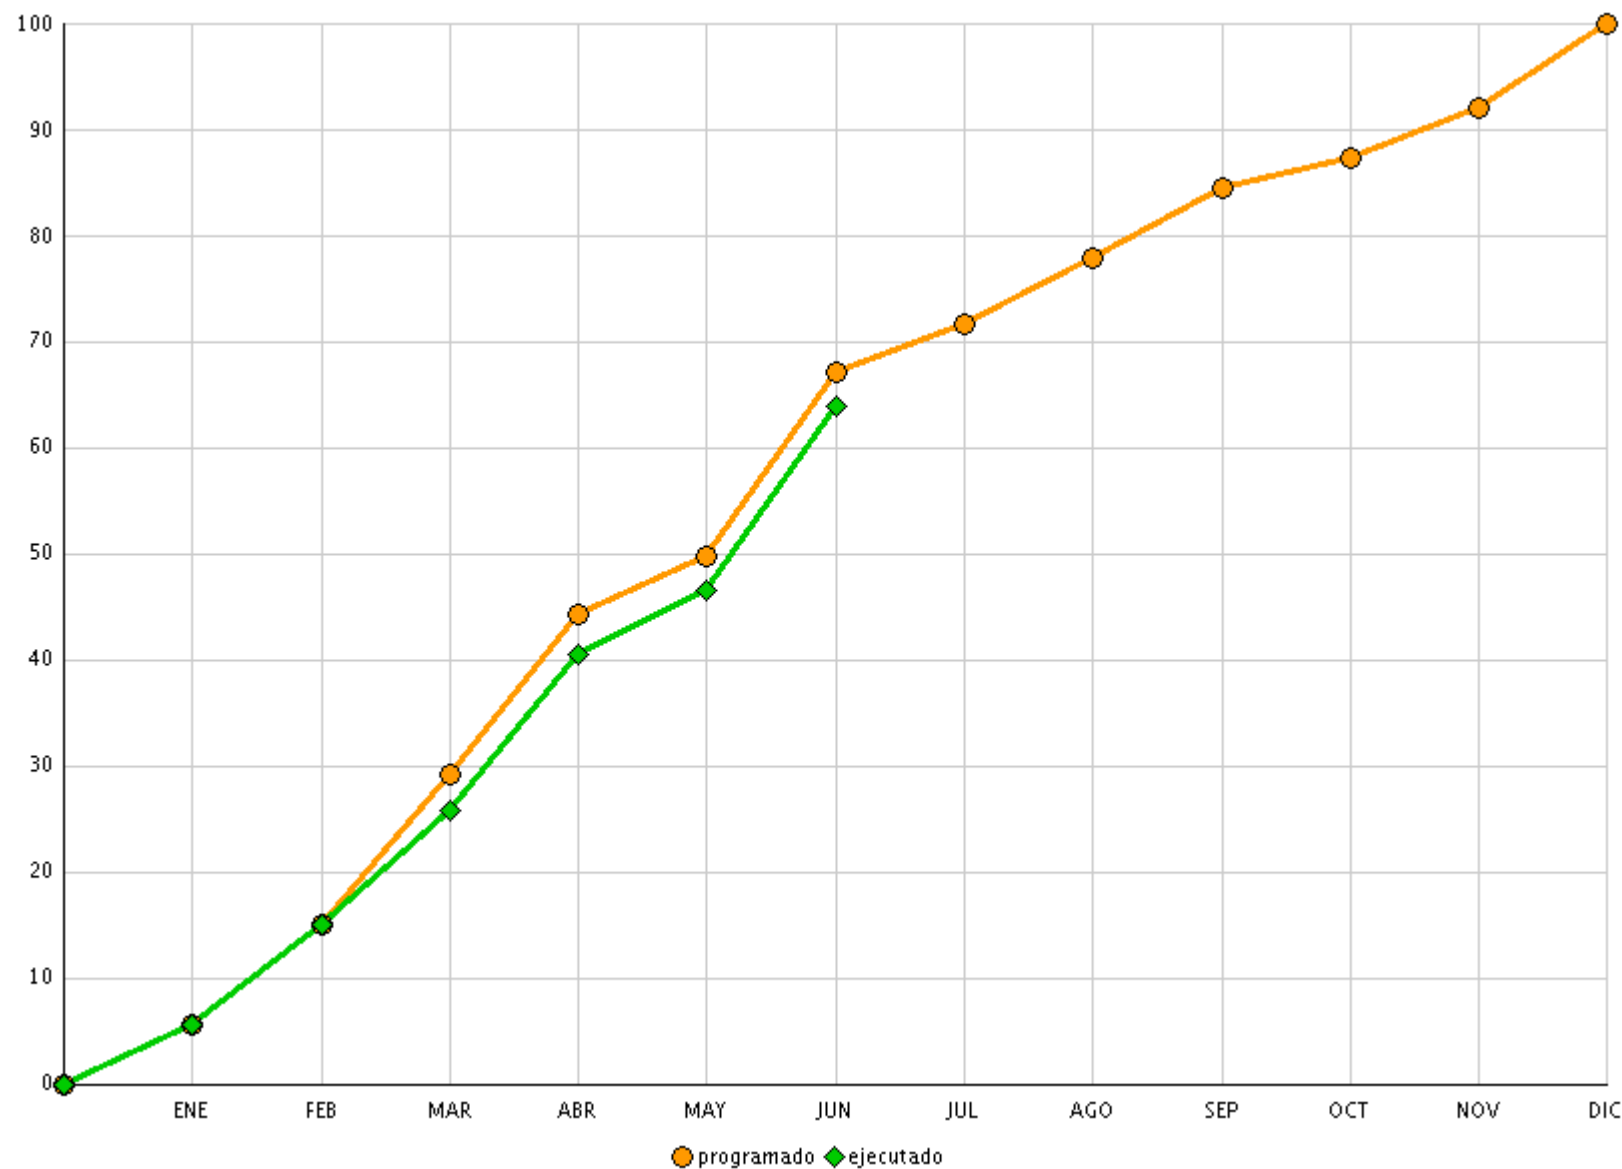

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.64	15.18	29.32	44.36	49.72	67.11	71.62	77.96	84.60	87.41	92.17	100.00
Ejecutado	5.64	15.18	25.87	40.56	46.62	64.01						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7678 27 Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ÉTNICAS	0.00																														
1.1 APLICAR EL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN A 21 INSTANCIAS ÉTNICAS INDÍGENAS (10), NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS (10), GITANAS (1)	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00			
1.2 ELABORAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO A 19 INSTANCIAS ÉTNICAS INDÍGENAS (9), NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS (9), GITANAS (1) 12%	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	2.50			
1.3 DESARROLLAR LA FASE DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO DE FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS ÉTNICAS EN TEMAS COMO: INTERÉTNICO CONCERTADO CON LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	20.00	6.00			
1.4 PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA A 20 INSTANCIAS ÉTNICAS: FORMALIZACIÓN DE INSTANCIAS INDÍGENAS, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, CONSTRUCCIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS, ENTRE OTROS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	16.00			
1.5 EVALUAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ÉTNICAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN Y EL IFOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.50			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										35.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7685 36 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunes y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco		Proyectos		Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. POLÍTICA PÚBLICA DE ACCIÓN COMUNAL FORMULADA	0.00																											
1.1 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN PARTICIPATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA COMUNAL	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	10.50
1.2 PROYECTAR Y TRAMITAR LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA COMUNAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3 DESARROLLAR LA METODOLOGÍA PEDAGÓGICA PARA LA APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA COMUNAL POR PARTE DE LA CIUDADANÍA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2. ORGANIZACIONES COMUNALES ACOMPAÑADAS	0.00																											
2.1 APLICAR EL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN A 224 ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.2 ELABORAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO A 224 ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	0.50
2.3 DESARROLLAR LA FASE DE FORMACIÓN (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, UPL, LEY COMUNAL, JUSTICIA COMUNAL, PPI,	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	3.00
2.4 PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA A 224 ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	60.00	3.60
2.5 ENTREGAR INCENTIVOS A 224 ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	2.60
2.6 EVALUAR EL FORTALECIMIENTO A 224 ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN Y EL IFOC	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		15.00		20.00		20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL ACOMPAÑADAS	0.00																											
3.1 APLICAR EL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN A 300 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		10.00		5.00		5.00		0.00		100.00	40.00	2.00
3.2 ELABORAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO A 43 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
3.3 DESARROLLAR LA FASE DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO DE FORTALECIMIENTO A 906 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	6.40
3.4 PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA A 600 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
3.5 EVALUAR EL FORTALECIMIENTO DE 43 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN Y EL IFOC	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ORGANIZACIONES COMUNALES Y PROPIEDAD HORIZONTAL	0.00																											
4.1 ADECUAR EN UN 100% LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PARTICIPACIÓN DE JAC Y PH.	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	20.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 59.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7687 23 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIÓN MEDIOS COMUNITARIOS FORTALECIDOS	0.00																											
1.1	APLICAR EL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN A 67 MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	4.50
1.2	ELABORAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO A 67 ORGANIZACIONES DE MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	0.80
1.3	HACER SEGUIMIENTO A LA FASE DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO DE FORTALECIMIENTO A 67 MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	20.00	1.20
1.4	PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA A 67 MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
1.5	ENTREGAR INCENTIVOS A 67 MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		30.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
1.6	EVALUAR EL FORTALECIMIENTO DE 67 MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.	ORGANIZACIONES SOCIALES FORTALECIDAS	0.00																											
2.1	APLICAR EL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN A 162 ORGANIZACIONES SOCIALES	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	4.00
2.2	ELABORAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO A 162 ORGANIZACIONES SOCIALES	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	1.60
2.3	HACER SEGUIMIENTO A LA FASE DE FORMACIÓN A 190 EN EL MARCO DEL MODELO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES FORTALECIDAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.60
2.4	PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA A 162 ORGANIZACIONES SOCIALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.80
2.5	ENTREGAR INCENTIVOS A 162 ORGANIZACIONES SOCIALES	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		30.00		20.00		10.00		10.00		100.00	20.00	1.00
2.6	EVALUAR EL FORTALECIMIENTO DE 162 ORGANIZACIONES SOCIALES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN POR SEGUNDA VEZ DEL FORMULARIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		0.00		50.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3.	POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS COMUNITARIOS FORMULADA	0.00																											
3.1	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS COMUNITARIOS	10.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
3.2	CONSOLIDAR EL DOCUMENTO DE ESTRUCTURA Y EL PLAN DE ACCIÓN PARTICIPATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS COMUNITARIOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	6.50
3.3	PROYECTAR Y TRAMITAR LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS COMUNITARIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.4	DESARROLLAR LA METODOLOGÍA PEDAGÓGICA PARA LA APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS COMUNITARIOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4.	OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADO	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7687 23 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
4.1	DESARROLLAR UN INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BOGOTÁ	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		40.00		0.00		0.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
4.2	ELABORAR UN INFORME PUBLICADO EN PÁGINA WEB SOBRE LA MOVILIZACIÓN EN Y POR BOGOTÁ DESDE 2012 HASTA JULIO DE 2021	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		40.00		0.00		0.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
4.3	ELABORAR UN DOCUMENTO DE RECOMENDACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE BARRAS FUTBOLERAS, QUE INCLUYA LAS VOCES DE LOS PROTAGONISTAS Y DE LOS CLUBES, INCLUYENDO LA CARTOGRAFÍA SOCIAL	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		40.00		0.00		0.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
4.4	ELABORAR UN INFORME SOBRE TEJIDO ASOCIATIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ TENIENDO EN CUENTA LOS DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		40.00		0.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	2.00
4.5	ELABORAR EL ATLAS DE CARTOGRAFÍA SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		40.00		0.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	2.40

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 44.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7688 23 Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC													
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
TOTAL						\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CIUDADANOS FORMADOS	0.00																											
1.1	DISEÑAR LOS CURSOS PARA LA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN DEL IDPAC BAJO LA MODALIDAD BLENDED.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
1.2	DESARROLLAR LOS CURSOS PARA FORMAR 20.639 CIUDADANOS EN PARTICIPACIÓN DEL IDPA	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	9.60
1.3	REALIZAR EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	5.00
2.	LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL FORTALECIDO	0.00																											
2.1	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ACCIONES DE FORMACIÓN EN ESCENARIOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50
2.2	ELABORAR Y PRODUCIR TRES (3) PAPERS SOBRE INNOVACIÓN CIUDADANA EN PARTICIPACIÓN	7.00	0.00	0.00	4.00	4.00	10.00	10.00	20.00	20.00	3.00	3.00	10.00	10.00	20.00		3.00		3.00		9.00		18.00		0.00		100.00	47.00	3.29
2.3	REALIZAR DOS (2) CAMPAÑAS AUDIOVISUALES Y/O ESCRITAS PROMOCIONANDO EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN DEL IDPAC	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	25.00	25.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		15.00		0.00		0.00		100.00	55.00	1.65
2.4	REALIZAR UNA CONVOCATORIA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN CIUDADANA - LABLOCAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	2.25
2.5	REALIZAR UN LABORATORIO DE INNOVACIÓN (LABIC)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		40.00		40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.6	REALIZAR UNA JORNADA DE ACTIVIDADES CON LA CIUDADANÍA EN DONDE SE IMPLEMENTE LA CAJA DE HERRAMIENTAS REALIZADA POR PARTICILAB	8.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.60
2.7	REALIZAR UN EVENTO EN EL MARCO DEL CUMPLEAÑOS NÚMERO 15 DEL IDPAC	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.8	DISEÑAR Y CONSOLIDAR METODOLOGÍAS DEL LABORATORIO-PARTICILAB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.9	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN EN CORREDOR VERDE	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									39.14	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7712 22 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS FORTALECIDOS	0.00																											
1.1	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
1.2	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMEN EN EL PLAN DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		0.00		100.00	30.00	6.00
1.3	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	40.00	4.00
1.4	REALIZAR UNA EVALUACIÓN SEMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.	ESTRATEGIA DE MIPG IMPLEMENTADA EN EL IDPAC	0.00																											
2.1	APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE AUTODIAGNÓSTICO DE LAS POLÍTICAS DEL MODELO DE INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN POR PROCESOS.	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
2.2	ELABORAR, CONSOLIDAR Y CARGAR EL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD - CIERRE DE BRECHAS VIGENCIA 2022	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
2.3	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD - CIERRE DE BRECHAS VIGENCIA 2022.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	10.00
2.4	REALIZAR, EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG, CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		52.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7714 18 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA	0.00																												
1.1	ACTUALIZAR Y APROBAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI.	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00	
1.2	ELABORAR LOS MÓDULOS: DE ORGANIZACIONES COMUNALES, ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES, VOTACIONES VIRTUALES, CERTIFICACIONES Y PAZ Y SALVOS EN LA PLATAFORMA DE LA PARTICIPACIÓN 2.0	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	16.00	
1.3	ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	0.00	50.00	30.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00	
1.4	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	5.00	
1.5	PONER EN OPERACIÓN LA NUEVA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00	
1.6	RENOVAR EL LICENCIAMIENTO ENDPOINT SANBLAS Y VPN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
1.7	CARGUE Y VALIDACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL APROBADAS EN LA ENTIDAD EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
1.8	CAPACITAR EN LA APLICACIÓN DE LAS TRD Y CREACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ARCHIVO DE GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00	
1.9	PARAMETRIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	9.00	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		65.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7723 19 Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 10 ASESORÍAS TÉCNICAS ENTRE ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0.00																											
1.1	ACTUALIZAR EL DOCUMENTO METODOLÓGICO DE LA ESTRATEGIA DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO ENTRE ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	7.50
1.2	DISEÑAR UN PLAN DE ASESORÍA TÉCNICA CON CADA ALCALDÍA LOCAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	25.00
1.3	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ASESORÍA TÉCNICA CON CADA ALCALDÍA LOCAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	40.00	12.00
1.4	REALIZAR CUATRO ASESORARÍAS TÉCNICAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO EN LA CIP EN TEMAS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.00
1.5	EVALUAR LOS LOGROS OBTENIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ASESORÍA A LAS ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DISTRITALES EN MATERIA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 49.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7729 18 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE REFORMULADA	0.00																											
1.1	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y LAS PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A ESTE	20.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	10.00
1.2	SISTEMATIZAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y LAS PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A ESTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
1.3	ELABORAR EL DOCUMENTO DE DECRETO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	17.00
1.4	SOCIALIZAR CON LA CIUDADANÍA EL DOCUMENTO DE DECRETO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
2.	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00																											
2.1	APLICAR EL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN A 150 INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRIORIZADAS	13.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	6.50
2.2	ELABORAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS 150 INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CARACTERIZADAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.80
2.3	DESARROLLAR LA FASE DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
2.4	PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS COMO CONSTRUCCIÓN DE UPL, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,	15.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		9.00		100.00	45.00	6.75
2.5	EVALUAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS 150 INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CARACTERIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL IFIS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		15.00		20.00		20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										60.05

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 24 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIÓN OBRAS PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	0.00																											
1.1	ELABORAR Y PUBLICAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LAS CONVOCATORIAS DE OSP	2.00	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
1.2	REALIZAR EL LANZAMIENTO, DIFUSIÓN Y RADICACIÓN DE PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA DE OSP 2022.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
1.3	REALIZAR LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE 20 OSP CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE NACIONES UNIDAS - PNUD.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
1.4	EJECUTAR, HACER SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS 46 OSP 2.0 - EN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 846 DE 2021 CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT	4.00	10.00	10.00	30.00	30.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
1.5	REALIZAR LAS ENTREGAS PROTOCOLARIAS CON LA COMUNIDAD Y LOS TRÁMITES PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS 46 CONVENIOS SOLIDARIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OSP 2.0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
2.	ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADA	0.00																											
2.1	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN Y LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.50
2.2	ESTRUCTURAR LOS PLANES DE ACCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA CADA LOCALIDAD, CON APORTES DE TODAS LAS ÁREAS	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
2.3	IMPLEMENTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SPP EN LOS PLANES DE ACCIÓN ARTICULACIÓN PARA CADA LOCALIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.50
2.4	REALIZAR JORNADA DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.	EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS REALIZADOS	0.00																											
3.1	DISEÑAR LA RUTA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50
3.2	GESTIONAR LA LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
3.3	REALIZAR UNA CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA DIFUSIÓN DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
3.4	REALIZAR UN EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3.5	SISTEMATIZACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD	0.00																											
4.1	APLICAR EL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN A LOS	3.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 24 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD		0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
4.2 ELABORAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
4.3 DESARROLLAR LA FASE DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO DE FORTALECIMIENTO A LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
4.4 PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		0.00		100.00	30.00	1.50
4.5 EVALUAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. GESTIÓN INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES IMPLEMENTADAS.	0.00																											
5.1 FORMULACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONVOCATORIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES	3.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
5.2 REALIZAR LOS TRÁMITES Y GESTIONES PERTINENTES PARA ADELANTAR LA ETAPA CONTRACTUAL	1.00	0.00	0.00	30.00	30.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
5.3 REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERTINENTES PARA ADELANTAR LA CONVOCATORIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
5.4 EVALUAR Y SELECCIONAR LAS ORGANIZACIONES GANADORAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
5.5 REALIZAR LA ENTREGA DE LOS INCENTIVOS A LAS ORGANIZACIONES GANADORAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
5.6 EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES GANADORAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.7 REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN A LAS INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES IMPLEMENTADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		30.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADA	0.00																											
6.1 IMPLEMENTAR DEL SISTEMA INFORMATIVO DC: 4 PRODUCTOS DCTV; 7 PROGRAMAS RADIALES PROPIOS; DIFUSIÓN EN LAS 8 REDES SOCIALES Y PUBLICACIÓN DE NOTAS WEB.	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.84
6.2 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PROMOVIENDO EL USO DE LA INTRANET Y CORREO MASIVO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
6.3 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL USO DEL LENGUAJE CLARO EN LA ENTIDAD.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
6.4 CONTRIBUIR POR DEMANDA, A LA GESTIÓN COMUNICATIVA DE LOS PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL DISEÑO DE PIEZAS COMUNICACIONALES.	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.46
6.5 ASESORAR Y REALIZAR EL DISEÑO DEL BRANDING DEL EVENTO (PRESENCIAL) ESPECIALMENTE SOBRE LOS HITOS DE LA ENTIDAD DURANTE EL 2022	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.46
6.6 GESTIONAR LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS EXTERNOS Y REDES SOCIALES, DE MANERA CREATIVA E INNOVADORA.	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.92

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 24 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
6.7 REALIZAR LA EVALUACIÓN DE MARCA IDPAC 2022	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		60.00		100.00	40.00	0.40
6.8 VINCULAR A DC RADIO EN LAS EMISORAS DE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.33
6.9 DISEÑAR INSTRUMENTO DE CONSULTA CIUDADANA SOBRE LAS TEMÁTICAS QUE LA CIUDADANÍA QUIERE QUE SEAN TRATADAS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD.	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
6.10 EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS ASISTENTES FRENTE A LOS RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS- RDC	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
6.11 ENTREGAR LA PÁGINA WEB FINALIZADA	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
7. IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA PARA PROMOVER EXPRESIONES Y ACCIONES DIVERSAS E INNOVADORAS DE PARTICIPACIÓN	0.00																											
7.1 DOCUMENTAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA ESTRATEGIA INNOVADORA QUE INCENTIVE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.25
7.2 FORMULAR PLANES DE TRABAJO CON LOS NUEVOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN IDENTIFICADOS EN LAS LOCALIDADES PRIORIZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		35.00		0.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.3 APLICAR LAS HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ABORDAJE DE NUEVOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS LOCALIDADES PRIORIZADAS Á	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		35.00		0.00		30.00		0.00		100.00	35.00	0.35
7.4 DIVULGAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL IDPAC EN FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN.	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	0.50
7.5 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN IDPAC Y PROPONER ACCIONES DE MEJORA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
7.6 DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CON NIÑOS Y NIÑAS (REALIZAR UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS ENTRE NIÑOS Y NIÑAS EN ALGUNAS LOCALIDADES PRIORIZADAS POR LA CEP	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	1.00
7.7 REALIZAR LA ARTICULACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL Y DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN LA CIUDAD-REGIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	0.50
7.8 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DEL IDPAC	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
7.9 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES LIDERADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.10 ACTUALIZAR, GESTIONAR Y REESTRUCTURAR LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES LIDERADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
7.11 DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO E INTERIORIZACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES EN LOS AMBIENTES LABORALES DE LA SUBDIRECCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	0.50
7.12 ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS WEB DEL PORTAL INSTITUCIONAL ASOCIADOS A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS LIDERADAS POR LA SPP	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	0.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal


7796 24 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
8.	PROCESOS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS	0.00																											
8.1	ADELANTAR 17 PROCESOS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE PACTOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										64.01

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7705 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

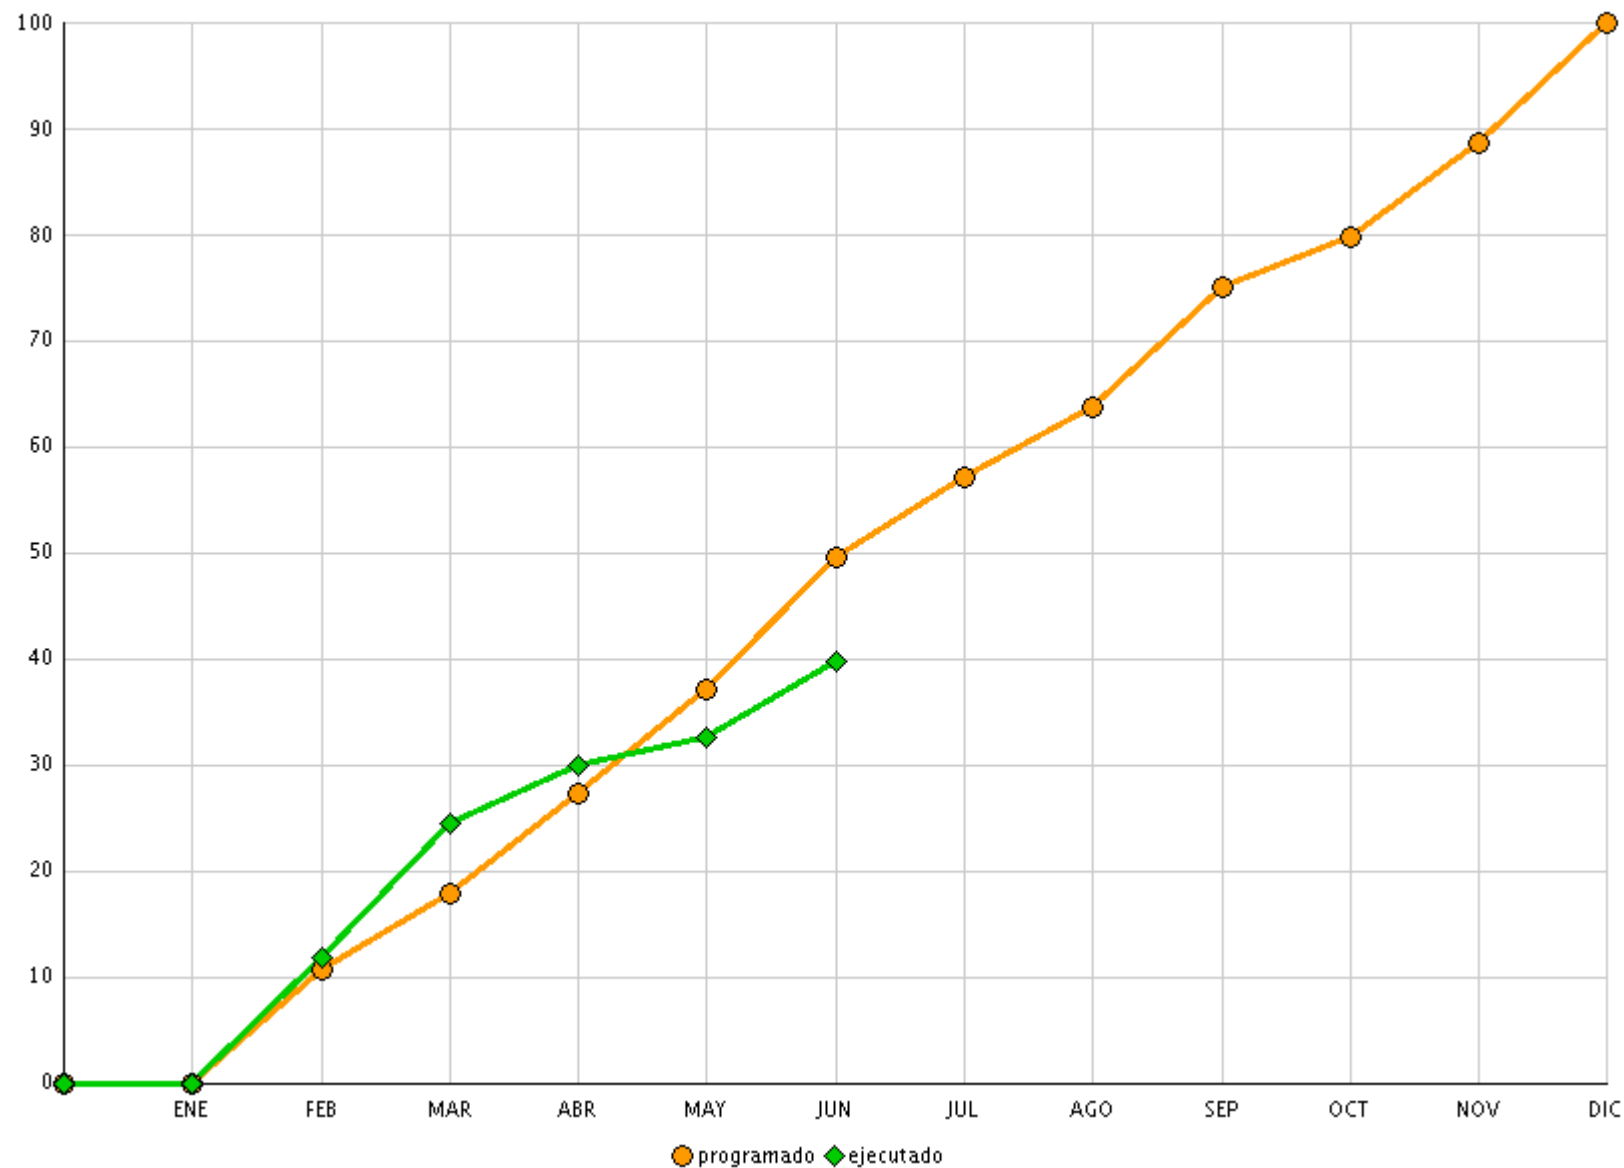


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.79	17.87	27.34	37.20	49.62	57.23	63.75	75.11	79.82	88.66	100.00
Ejecutado	0.00	11.93	24.49	29.99	32.73	39.76						

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7706 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

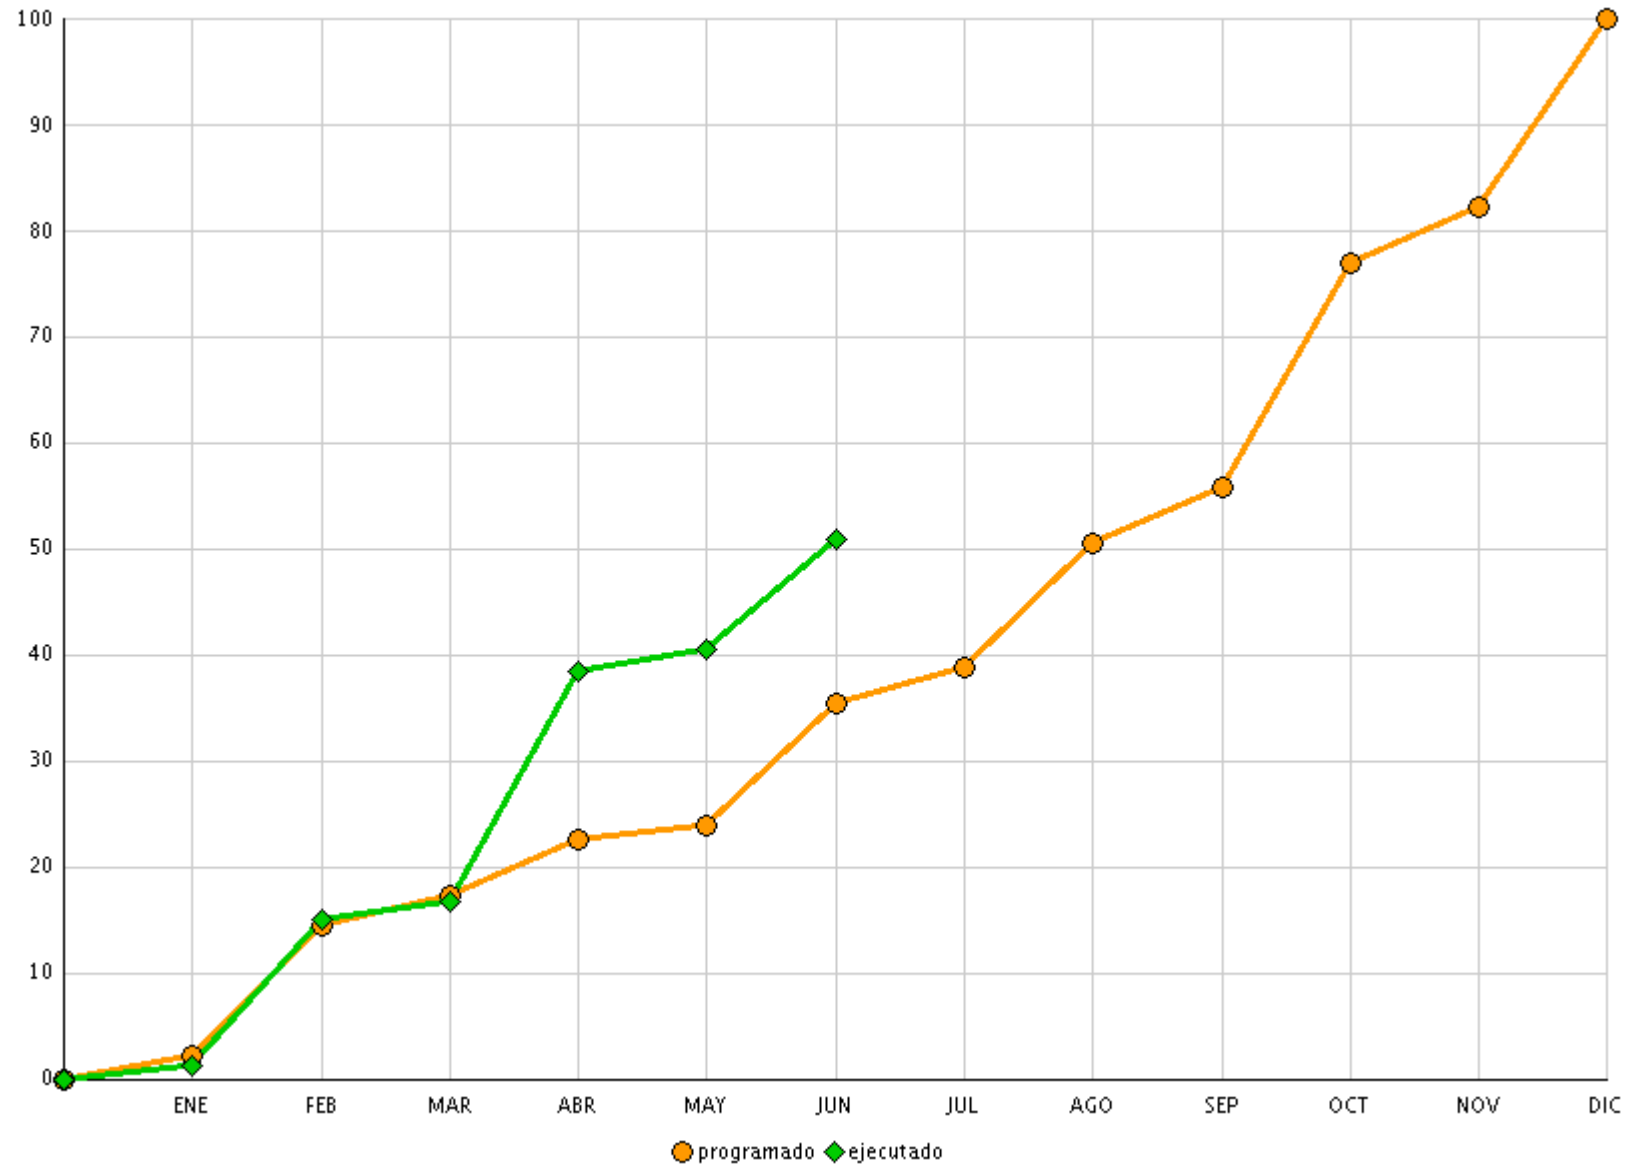


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.28	14.57	17.44	22.72	24.03	35.46	38.91	50.48	55.79	76.97	82.27	100.00
Ejecutado	1.28	15.00	16.73	38.48	40.55	50.90						

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7707 Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá

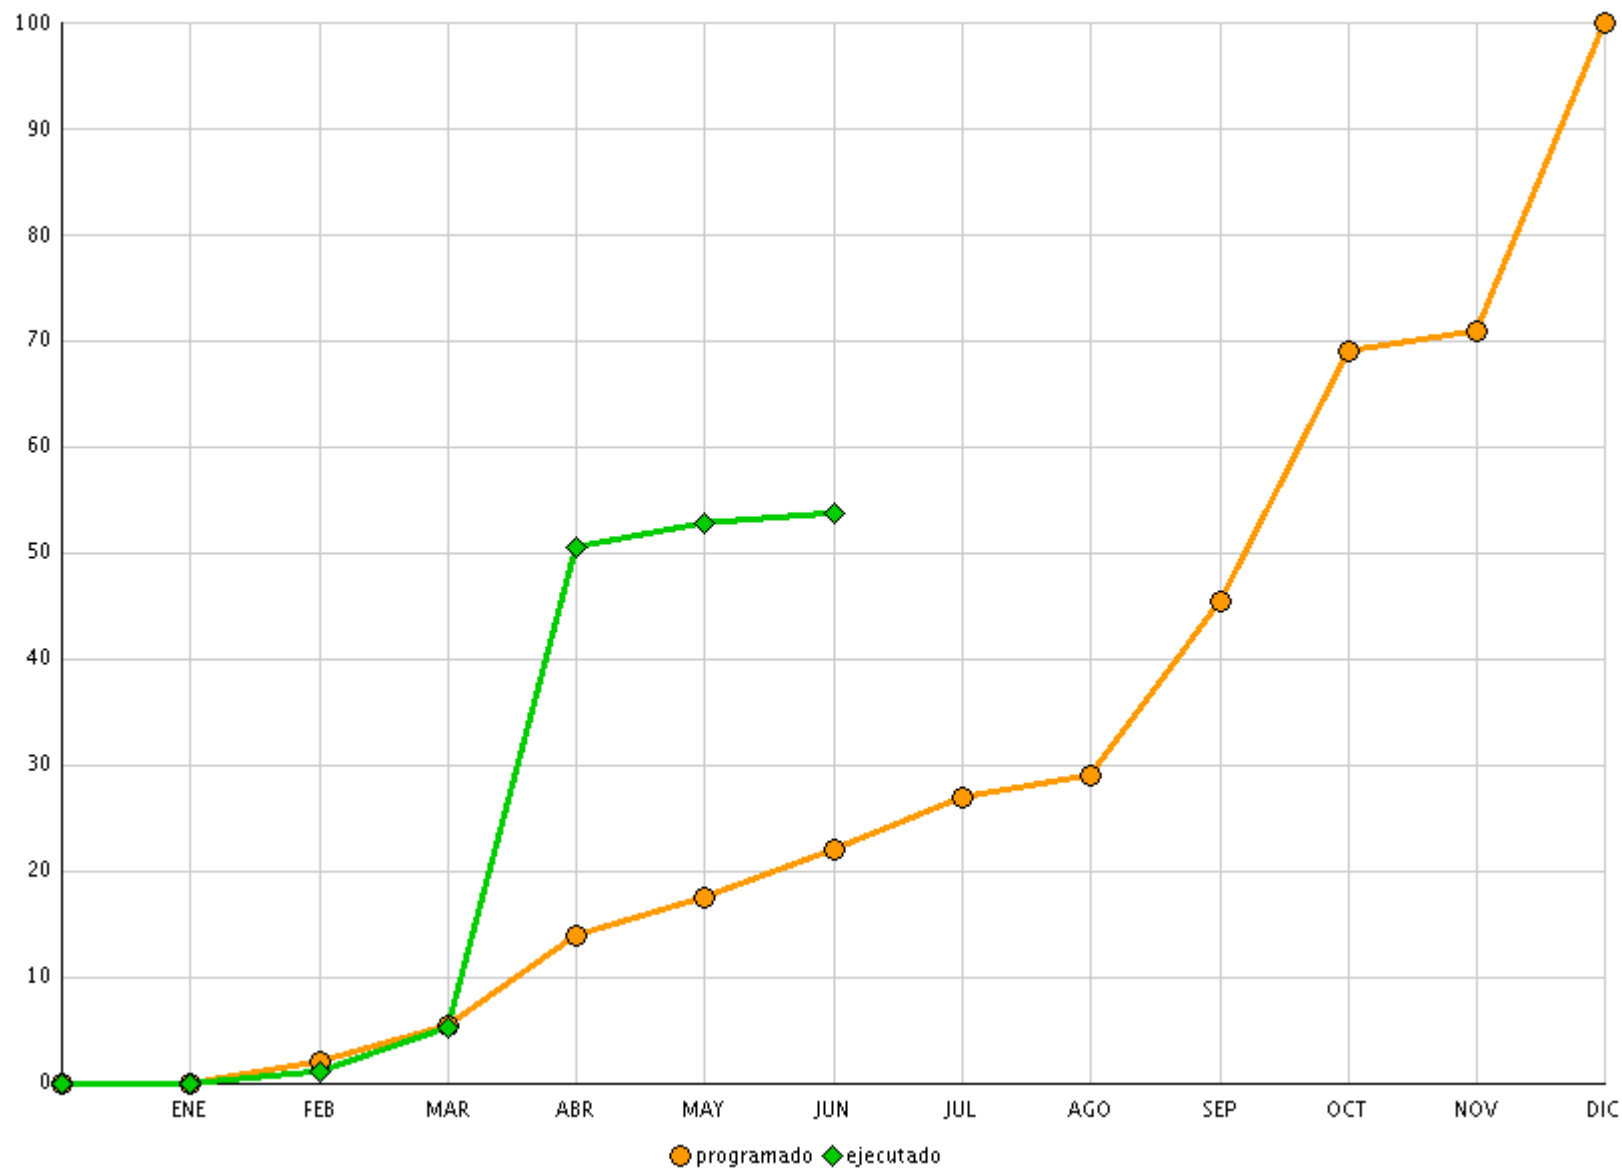


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.00	5.50	14.01	17.51	22.01	27.01	29.01	45.52	69.02	71.02	100.00
Ejecutado	0.00	1.21	5.21	50.51	52.91	53.70						

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7708 Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá

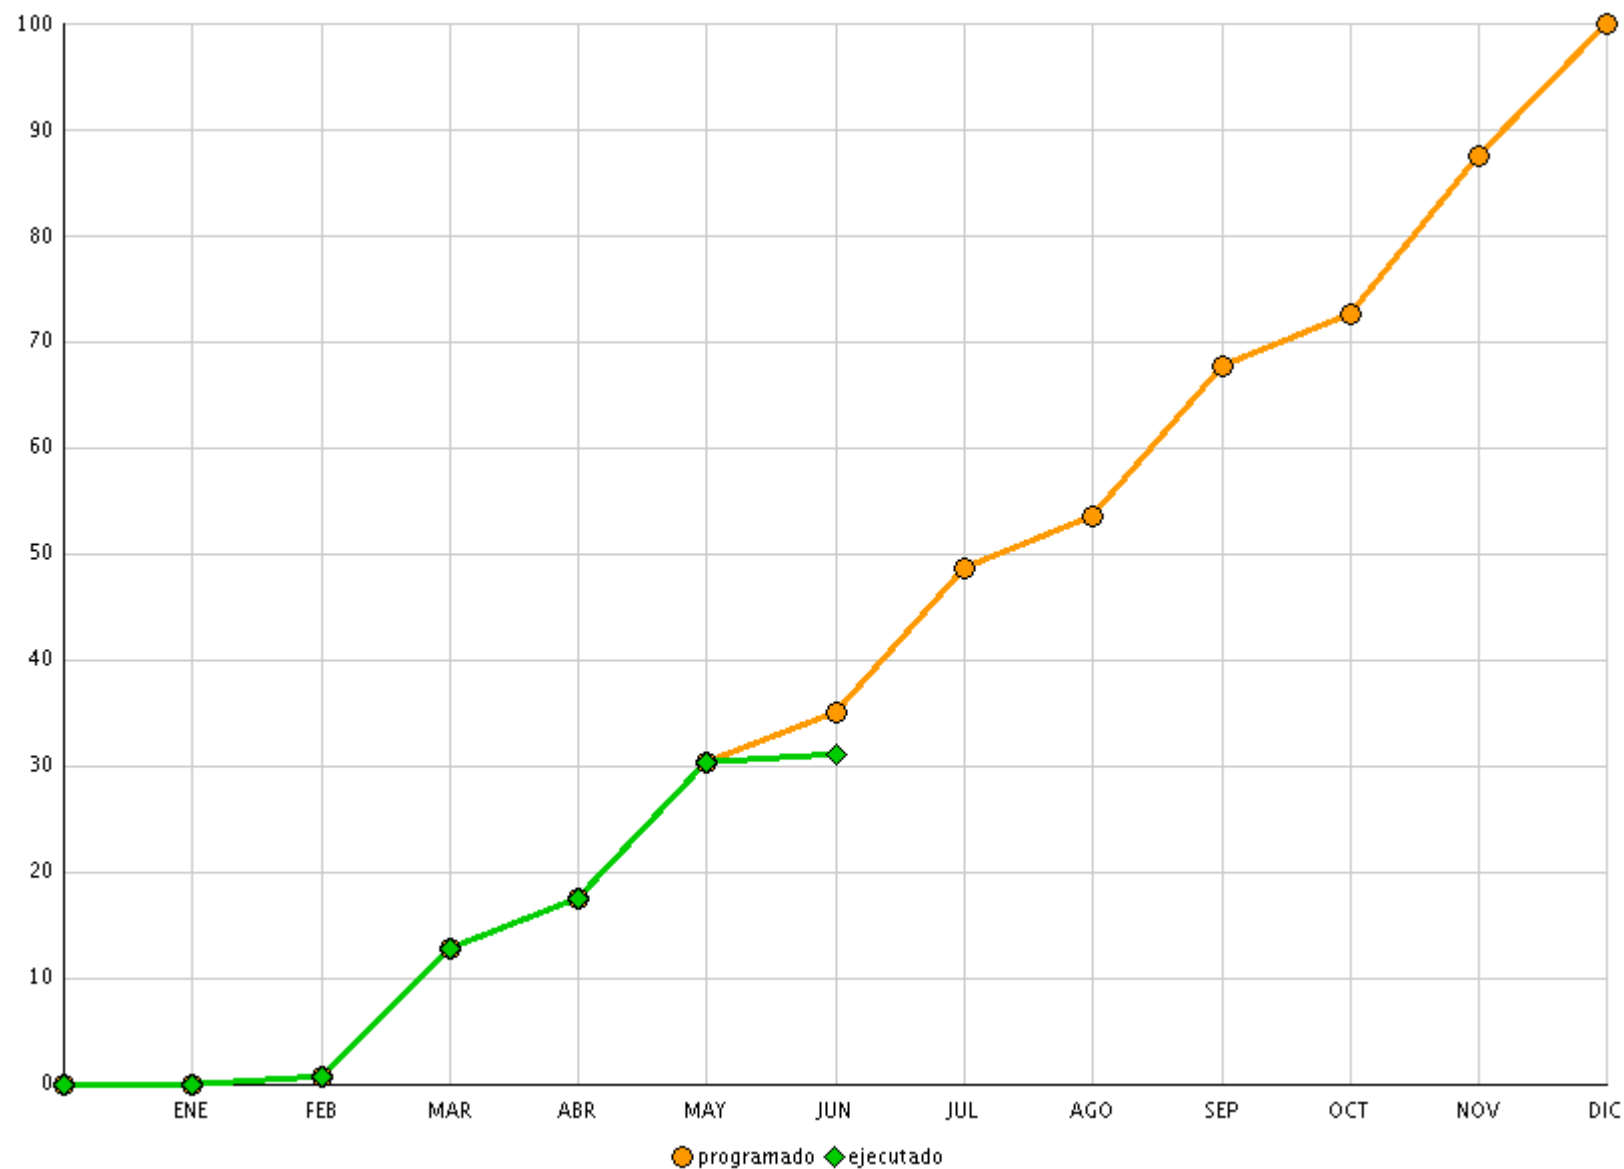


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.80	12.75	17.60	30.28	35.13	48.64	53.49	67.77	72.62	87.64	100.00
Ejecutado	0.00	0.84	12.79	17.64	30.32	31.17						

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7709 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

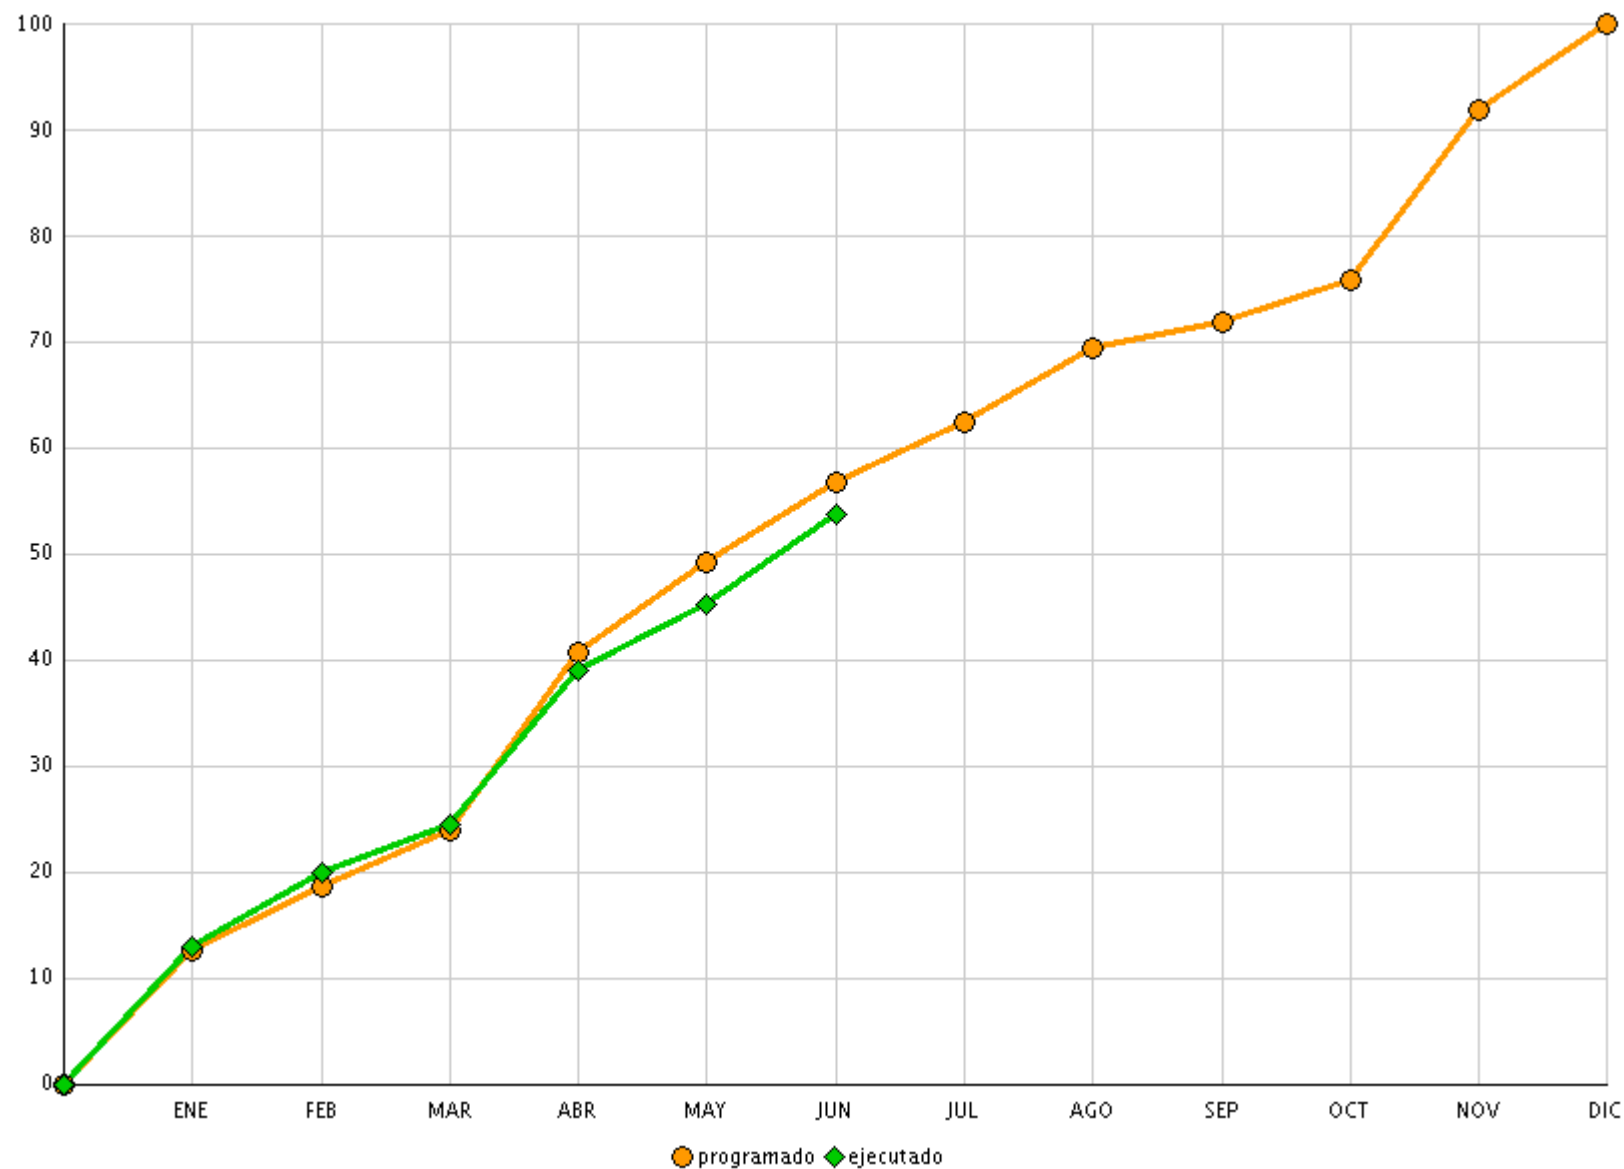


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	12.71	18.68	24.02	40.78	49.21	56.81	62.54	69.45	71.84	75.93	91.81	100.00
Ejecutado	12.97	19.94	24.51	39.12	45.28	53.71						

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7908 Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá

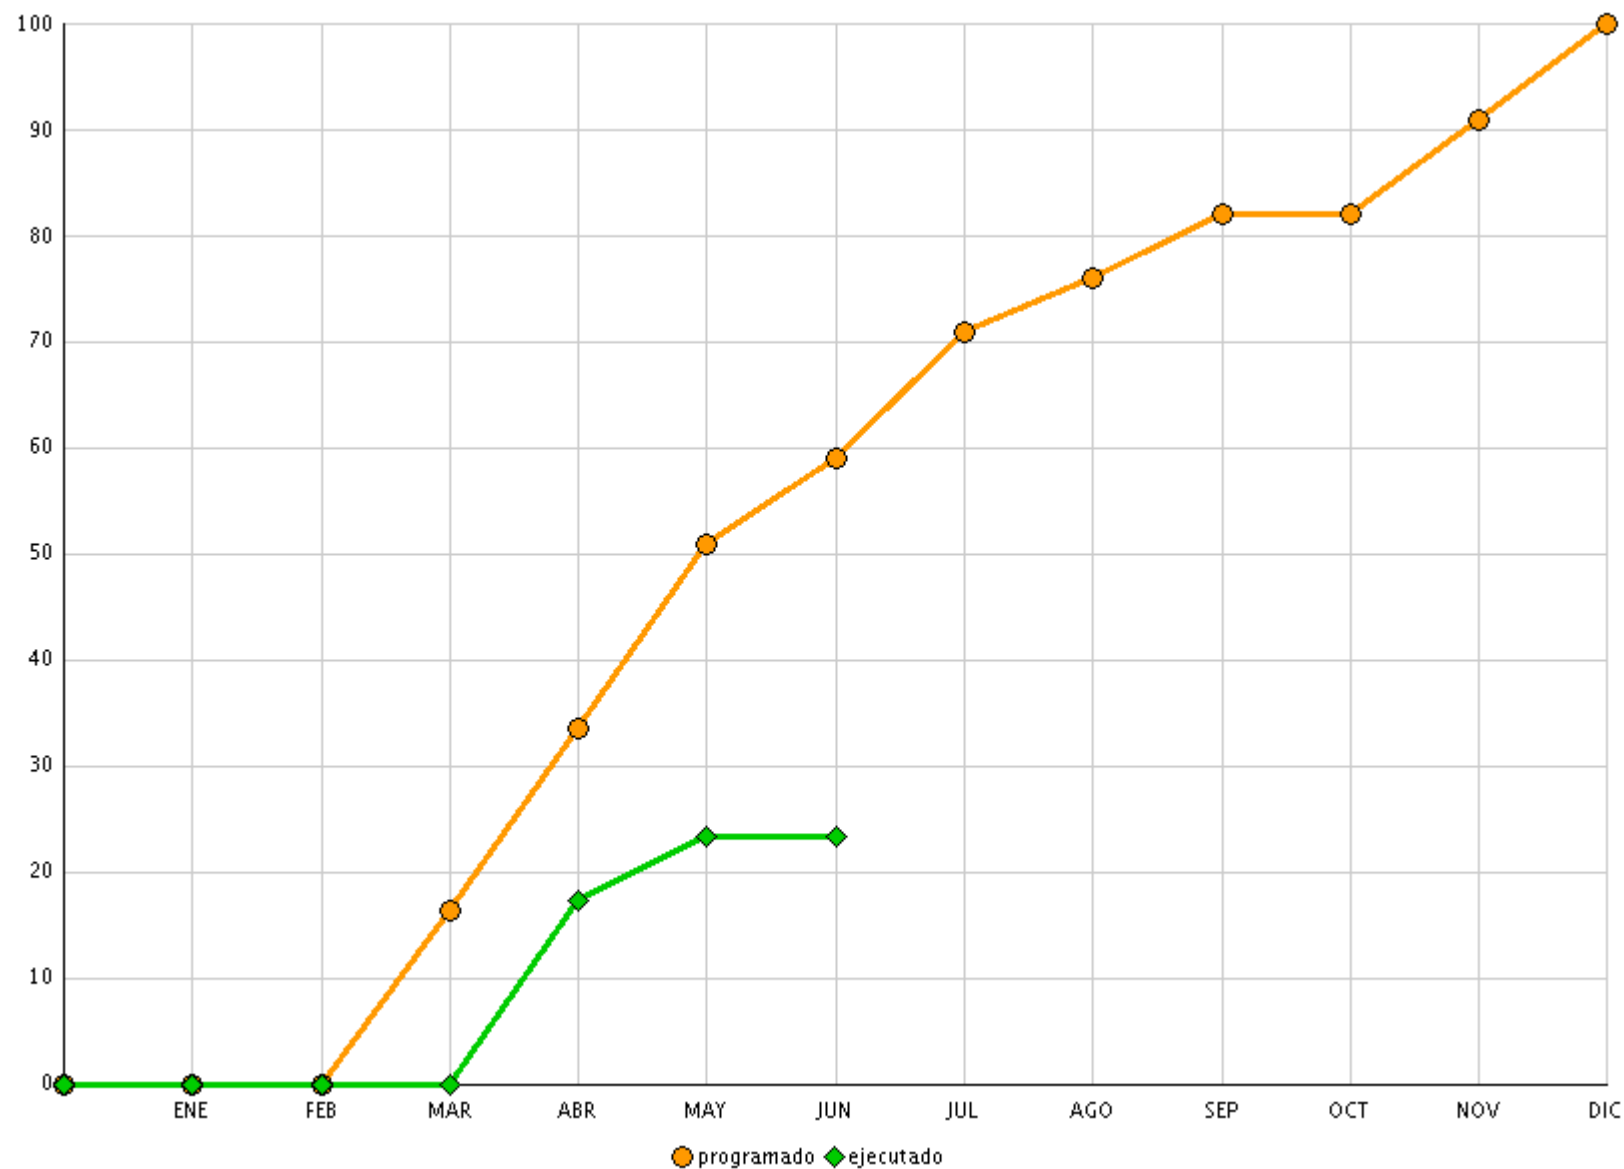

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	16.50	33.50	51.00	59.00	71.00	76.00	82.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	17.33	23.33	23.33						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7705 33 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZAR LA POLÍTICA DISTRITAL DE TURISMO	0.00																											
1.1 APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL CONPES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2 JORNADAS DE CONCERTACIÓN CON LA CIUDADANÍA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3 DOCUMENTO PRELIMINAR DE LA POLÍTICA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.4 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DE POLÍTICA PÚBLICA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.5 APROBACIÓN DE LA POLÍTICA POR EL CONPES DISTRITAL.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.6 PLAN DE ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA PP.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. INCORPORAR PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE	0.00																											
2.1 PST O CONEXOS AL TURISMO INCORPORADOS AL PROGRA DE SOSTENIBILIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	3.90	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00		0.00		31.00		0.00		22.50		0.00		100.00	50.40	2.02
2.2 INFORMES DE ACOMPAÑAMIENTO A INICIATIVAS DE ECONOMÍA CIRCULAR.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	1.50
2.3 PLAN DE ACCIÓN DEL DTI	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. CAPACITAR EMPRESAS U ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS O CONEXAS A LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO, EN TEMAS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	0.00																											
3.1 CAPACITAR A 280 EMPRESAS U ORGANIZACIÓN C., PST O CONEXAS AL TURISMO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.60	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		21.40		0.00		100.00	61.80	2.47
3.2 FORMALIZAR MUJERES CON EMPRENDIMIENTOS/ORGANIZACIONES CON VOCACIÓN TURÍSTICA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	14.30	0.00		0.00		0.00		0.00		57.10		0.00		100.00	14.30	0.29
3.3 CONVOCATORIA A INICIATIVAS PRODUCTIVAS SECTORES LGBTI A LA RUTA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL IDT.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.4 ACOMPAÑAR A DOS INICIATIVAS DE GRUPOS ÉTNICOS CONEXAS AL TURISMO EN SU FORMALIZACIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	1.00
4. IMPLEMENTAR PRODUCTOS TURÍSTICOS, QUE SEAN DE ALCANCE REGIONAL	0.00																											
4.1 DIAGNÓSTICOS: ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA (POR QUÉ Y PARA QUÉ) DEL DISEÑO EL PRODUCTO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
4.2 CARACTERIZACIONES: ACTUALIZACIÓN CON RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE OFERTA Y DEMANDA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.3 DISEÑO: ARTICULACIÓN ENTRE DIFERENTES ACTORES (INTERNOS Y EXTERNOS).	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7705 33 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
4.4 IMPLEMENTACIÓN: ACTUALIZACIÓN CON PUESTA EN ACCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN DISEÑO Y VALIDACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.5 ENTREGA A PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO: CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PROCESO EN CONJUNTO CON PROMOCIÓN PARA LANZAMIENTO DEL PRODUCTO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CULTURA Y RESPONSABILIDAD TURÍSTICA	0.00																											
5.1 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A CONDUCTORES DE TAXI.	0.43	0.00	0.00	11.70	2.00	9.80	28.90	9.80	11.80	9.80	13.50	9.80	32.10	9.80		9.80		9.80		9.80		9.90		0.00		100.00	88.30	0.38
5.2 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS.	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	0.00	12.40	6.80	12.40	14.00	12.40	0.00	12.40		12.40		12.80		12.80		0.00		0.00		100.00	20.80	0.09
5.3 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A ESTUDIANTES EDUCACIÓN SUPERIOR	0.43	0.00	0.00	14.00	11.00	14.00	6.00	14.00	3.00	0.00	10.00	0.00	1.00	0.00		14.00		14.00		14.00		16.00		0.00		100.00	31.00	0.13
5.4 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A PST O CONEXOS AL TURISMO.	0.44	0.00	0.00	10.00	8.30	10.00	9.30	10.00	2.30	10.00	2.30	10.00	8.80	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	31.00	0.14
5.5 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A OTRAS POBLACIONES	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5.6 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN CULTURA TURÍSTICA Y APROPIACIÓN DE CIUDAD A MUJERES SIDICU	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		0.00		16.70		0.00		16.50		100.00	0.00	0.00
5.7 TURISMO RESPONSABLE: SENSIBILIZACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O ACTORES CONEXOS A LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO EN PRÁCTICAS DE COMERCIO JUSTO PARA EL SECTOR	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	301.00	50.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	317.00	1.36
5.8 TURISMO RESPONSABLE: JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CÓDIGO	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	33.30	50.00	50.00	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	116.60	0.51
5.9 TURISMO RESPONSABLE: PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.10 TURISMO RESPONSABLE: LANZAMIENTO DEL CÓDIGO.	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.11 TURISMO RESPONSABLE: EVENTO DE TURISMO RESPONSABLE	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.12 TURISMO RESPONSABLE: ESTRATEGIA DIVULGACIÓN TIPS DE LA PP DE TRANSPARENCIA.	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.13 TURISMO ACCESIBLE: FORMACIÓN A PST Y CONEXOS EN TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE.	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	65.00	0.28
5.14 TURISMO ACCESIBLE: FORMACIÓN A FUNCIONARIOS EN TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE.	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	18.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	202.00	0.89
5.15 TURISMO ACCESIBLE: FORMACIÓN A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE.	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.30		33.30		33.40		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.16 TURISMO ACCESIBLE: EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.44
5.17 TURISMO ACCESIBLE: MÓDULOS DE PROTOCOLOS DE SERVICIO INCLUYENTE PARA TIPOS DE DISCAPACIDAD	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	33.00	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	99.70	0.43

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7705 33 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
5.18 TURISMO ACCESIBLE: RED DE TURISMO ACCESIBLE	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90		0.00		14.30		0.00		14.30		28.50		100.00	0.00	0.00
5.19 EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: CÁTEDRA DE TURISMO.	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	8.30	0.00		16.70		16.70		16.70		16.50		0.00		100.00	8.30	0.04
5.20 EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: ENCUENTRO ANUAL DE ESTUDIANTES (FESSTUR) Y ENCUENTRO DE PROFESORES.	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.21 EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: DIPLOMADOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y DOCENTES	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5.22 EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: VINCULACIÓN A PRÁCTICAS LABORALES.	0.44	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	120.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	225.00	0.99
5.23 EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: CURSOS DE FORMACIÓN EN TURISMO Y AFINES DIRIGIDOS A QUIENES HAGAN PARTE DE LA CADENA DE VALOR Y/O A CIUDADANÍA EN GENERAL	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	0.26
6. FORTALECER PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS DE GESTIÓN	0.00																											
6.1 INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	75.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	107.50	1.08
6.2 DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO	1.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	105.00	1.05
6.3 PLAN DE TRABAJO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	105.00	7.35
6.4 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	0.50
7. GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS	0.00																											
7.1 DIAGNÓSTICO DE ATRACTIVO	2.00	0.00	0.00	28.60	28.60	14.40	14.30	14.00	14.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00		14.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.90	1.72
7.2 ESTUDIOS PREVIO Y PUBLICACIÓN DE OFERTA	2.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.70	14.30	14.00	14.00	0.00	0.00	29.00	0.00	14.00		0.00		14.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.60	0.85
7.3 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.	2.00	0.00	0.00	15.00	14.30	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	29.00		14.00		0.00		0.00		14.00		0.00		100.00	42.30	0.85
7.4 EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN	2.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	17.00	8.00	0.00	0.00	17.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	24.70	0.49
7.5 ENTREGA DE INTERVENCIÓN.	2.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00		17.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	16.70	0.33
8. IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN CORREDORES TURÍSTICOS DE BOGOTÁ	0.00																											
8.1 DIAGNÓSTICO DE CORREDOR A INTERVENIR.	2.00	0.00	0.00	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.30		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.70	1.33
8.2 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE CORREDORES.	2.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	200.00	4.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7705 33 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
8.3 CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN DE CORREDORES.	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00			
8.4 SEÑALIZACIÓN DEL CORREDOR	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
8.5 ENTREGA DE CORREDOR FINALIZADO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
9. IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS IMPLEMENTADOS POR EL IDT EN BOGOTÁ	0.00																														
9.1 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
9.2 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
9.3 EJECUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEL PRODUCTO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
9.4 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00			
10. MANTENER LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PRIORIZADA EN BOGOTÁ	0.00																														
10.1 REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SEÑALES PROGRAMADAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	8.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	2.00			
10.2 ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESO GENERAL DE CONTRATACIÓN PARA INSTALACIÓN Y MANTEMIENTO DE SEÑALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00			
10.3 ADJUDICACIÓN DE CONTRATO PARA INSTALACIÓN MANTEMIENTO DE SEÑALES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		39.76	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7706 30 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPACTAR PERSONAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO ORIENTADO A LA RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	0.00																											
1.1	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS VISITANTES A LA CIUDAD PUEDAN HACER RESERVAS DE BIENES Y SERVICIOS TURÍSTICOS PARA EL AUMENTO DEL GASTO TURÍSTICO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE BTÁ	5.00	0.00	0.00	2.00	2.90	0.00	0.00	3.00	3.50	0.00	0.00	7.30	3.40	0.00		18.30		0.00		36.70		0.00		32.70		100.00	9.80	0.49
1.2	DESARROLLAR ACCIONES QUE GENEREN NUEVOS USUARIOS EN LA PÁGINA WEB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	207.10	0.00	0.00	4.00	11.70	0.00		25.00		0.00		32.00		0.00		35.00		100.00	218.80	10.94
1.3	ENVIAR EL NEWSLETTER CON LA OFERTA DE LA CIUDAD A LA BASE DE DATOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	86.40	0.00	0.00	20.00	13.60	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	100.00	5.00
1.4	DESARROLLAR PAUTAS EN MEDIOS DIGITALES EN MERCADOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	26.70	0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		100.00	26.70	2.67
1.5	DESARROLLAR CONTENIDOS ENCAMINADOS A INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS SEGUIDORAS DE LAS REDES SOCIALES DE BOGOTADC.TRAVEL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	39.40	0.00	0.00	16.70	10.30	0.00		33.20		0.00		16.70		0.00		16.70		100.00	49.70	2.49
1.6	APOYAR O PARTICIPAR EN EVENTOS LIDERADOS POR OTRAS ENTIDADES, EN LOS CUALES SE PROMOCIONA LA CIUDAD DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO	6.00	0.00	0.00	53.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	20.10	0.00		0.00		0.00		15.50		0.00		15.60		100.00	86.50	5.19
1.7	APOYAR O PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO.	4.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	25.00	0.00		0.00		0.00		12.50		0.00		12.50		100.00	87.50	3.50
1.8	REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN CON PERSONAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS TURÍSTICOS QUE PERMITAN DAR A CONOCER LA OFERTA DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO	6.00	0.00	0.00	10.10	15.50	0.00	0.00	4.00	3.20	0.00	0.00	6.90	3.30	0.00		9.90		0.00		68.60		0.00		0.50		100.00	22.00	1.32
1.9	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO.	4.00	0.00	0.00	8.20	10.80	0.00	0.00	21.60	27.00	0.00	0.00	24.30	24.30	0.00		21.60		0.00		21.60		0.00		2.70		100.00	62.10	2.48
2.	ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO A CORTO PLAZO EJECUTADA Y CUMPLIDA EN 2020	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	CAPTAR EVENTOS RELACIONADOS CON CONGRESOS, CONVENCIONES, REUNIONES, VIAJES DE INCENTIVO Y GRANDES EVENTOS PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR TURISMO	0.00																											
3.1	APOYAR Y/O REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA CAPTACIÓN EVENTOS DEL SEGMENTO MICE PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURISMO EN BOGOTÁ	8.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	4.00
3.2	CARACTERIZAR LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL SEGMENTO MICE EN LA CIUDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00	22.00	11.10	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		22.00		100.00	33.30	1.00
3.3	CARACTERIZAR LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL SEGMENTO MICE EN LA CIUDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00	28.00	11.10	0.00		0.00		28.00		0.00		0.00		22.00		100.00	33.30	1.33
3.4	REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	ATENDER CONSULTAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7706 30 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
CANALES DE LA RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BOGOTÁ																															
4.1 ATENDER CONSULTAS A TRAVÉS DE LA RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	6.00	7.30	7.30	7.60	7.80	6.60	8.80	9.00	9.10	8.00	10.00	10.00	7.50	10.00		8.30		6.60		8.30		8.30		10.00		100.00	50.50	3.03			
4.2 REALIZAR RECORRIDOS PRESENCIALES PARA PERSONAS INTERESADAS EN LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	6.00	5.30	5.30	9.00	10.40	8.50	8.30	11.90	13.80	7.90	12.00	8.10	8.70	8.30		8.10		8.10		8.30		8.20		8.30		100.00	58.50	3.51			
4.3 REALIZAR RECORRIDOS PRESENCIALES Y VIRTUALES MOSTRANDO LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	5.00	10.40	10.40	11.10	12.90	7.90	13.90	14.90	14.70	7.00	14.90	7.00	12.20	7.00		6.50		6.50		7.00		6.20		8.50		100.00	79.00	3.95			
4.4 SESIONES DE INFORMACIÓN EN PEDESTALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00		0.00		33.30		0.00		0.00		33.40		100.00	0.00	0.00			
4.5 NÚMERO DE VISUALIZACIONES DE RECORRIDOS EN CANALES VIRTUALES	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.00		0.00		45.00		0.00		41.00		100.00	0.00	0.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		50.90	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7707 15 Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	SENSIBILIZAR Y ASESORAR PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE ESCNNA EN EL CONTEXTO DE TURISMO	0.00																											
1.1	SENSIBILIZAR Y ASESORAR A PST U ORGANIZACIONES	22.00	0.00	0.00	9.10	5.50	9.10	18.20	9.10	12.70	9.10	10.90	9.10	3.60	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	50.90	11.20
1.2	INVESTIGACIÓN SOBRE ESCNNA EN CONTEXTOS DE TURISMO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3	ARTICULACIÓN CON OTROS DESTINOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.4	EVENTO NACIONAL EN PRO DE LA PREVENCIÓN DE LA ESCNNA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.5	IMPLEMENTACIÓN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.6	SENSIBILIZACIONES A MUJERES DE LAS CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	625.00	37.50
2.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA VISITANTES VÍCTIMAS DE DELITOS EN LAS ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO	0.00																											
2.1	PLAN DE SEGURIDAD TURÍSTICA PARA PRODUCTOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.2	IMPLEMENTAR LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL TURISTA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.3	PRIMER ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.4	MESA INTERINSTITUCIONAL (CENTRO DE MONITOREO).	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.5	CONGRESO DE SEGURIDAD TURÍSTICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.6	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 53.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7708 11 Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR EL PORTAL ÚNICO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE BOGOTÁ QUE INCLUYE PÁGINA WEB Y APP	0.00																											
1.1 DESARROLLAR, ACTUALIZAR Y PROGRAMAR SECCIONES DEL SITIO WEB	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	14.10	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	0.00	16.20		0.00		17.30		0.00		18.40		18.90		100.00	29.20	11.68
1.2 DESARROLLAR, PROGRAMAR Y DISEÑAR LAS SECCIONES DENTRO DE LA APLICACIÓN MOVIL BOGOTÁDCTRAVEL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	20.00	4.00
2. ALCANZAR RENDIMIENTO OPERACIONAL DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LA CIUDAD	0.00																											
2.1 ELABORAR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL PORCENTAJE EL AVANCE DE LA META PROGRAMADA, TENIENDO COMO REFERENTE EL REPORTE DE TEST DE GOOGLE POR MODULO DESARROLLADO QUE ESTE SOBRE EL 60%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	17.70	0.00	0.00	18.80	18.80	0.00	0.00	20.10		0.00		21.20		0.00		22.20		0.00		100.00	36.50	10.95
2.2 REPORTAR LA OPTIMIZACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SEO EN EL PORTAL IMPLEMENTADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	2.00
2.3 REPORTE DE MÉTRICAS DE LA PÁGINA WEB: VELOCIDAD DE CARGA, PORCENTAJE DE REBOTE, DURACIÓN PROMEDIO Y NÚMERO DE PAGINAS NAVEGADAS DE LA PÁGINA WEB	5.00	0.00	0.00	16.00	16.70	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00		17.00		0.00		17.00		0.00		16.00		100.00	50.70	2.54
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		31.17

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7709 30 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECER EL DESARROLLO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	0.00																											
1.1	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG VIGENCIA 2022.	10.00	0.00	0.00	8.80	8.40	10.10	6.40	12.00	11.90	7.40	7.30	11.00	11.50	7.00		6.20		3.50		6.60		7.90		19.50		100.00	45.50	4.55
1.2	LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA DE RE-CERTIFICACIÓN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2015 Y NTC-ISO 14001: 2015.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3	REALIZAR ACTIVIDADES PARA APROPIAR LA HERRAMIENTA DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL DAFP VERSIÓN 5.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.30		0.00		0.00		0.00		33.40		100.00	33.30	0.67
1.4	REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL- PIGA VIGENCIA 2022.	5.00	4.50	4.30	9.40	9.40	6.80	6.80	11.10	7.70	6.80	6.00	11.10	11.10	5.10		10.30		6.80		8.50		5.10		14.50		100.00	45.30	2.27
2.	PROVEER EL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT	0.00																											
2.1	CONSOLIDAR EL PAA DE LA VIGENCIA 2022, PROGRAMANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ÁREAS TRANSVERSALES	3.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
2.2	EJECUTAR LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN LA VIGENCIA PARA PROVEER EL RECURSO HUMANO REQUERIDO POR LAS ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT	10.00	81.00	77.00	6.00	11.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	8.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	89.00	8.90
2.3	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META, MEDIANTE MESAS MENSUALES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN	7.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	45.50	3.19
3.	REALIZAR INVESTIGACIONES Y/O ESTUDIOS Y/O MEDICIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA, PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR TURISMO DE BOGOTÁ	0.00																											
3.1	REALIZAR PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL AÑO 2021 DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS (DEMANDA)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.30	67.00	28.30	0.00	28.30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	89.90	4.50
3.2	REALIZAR PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTUDIOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN VIAJEROS EN BOGOTÁ 2021	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	2.70
3.3	REALIZAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA LÍNEA DE TURISMO, MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.4	REALIZAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON LAS LÍNEA DE BIG DATA Y CIENCIA DE DATOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.5	REALIZAR PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL AÑO 2021 DE LAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	33.30	66.70	33.40	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	76.70	3.84

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7709 30 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
OPERACIONES ESTADÍSTICAS (OFERTA)																															
3.6 REALIZAR PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CON COMPONENTE GEOESTADÍSTICO(OFERTA)	2.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00			
3.7 REALIZAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA LÍNEA DE DATOS CUALITATIVOS (TANTO DE OFERTA COMO DE DEMANDA)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	15.60	12.50	21.90	6.30	18.80	12.50	6.30	6.30		12.50		6.30		12.50		6.30		6.00		100.00	62.60	3.13			
4. CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OPERATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IDT	0.00																														
4.1 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL IDT EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IDT	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
4.2 INSTALAR SEÑALES INFORMATIVAS INCLUYENTES EN LA SEDE PRINCIPAL DEL IDT, PARA GARANTIZAR EL ACCESO A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00			
4.3 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO SGDEA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
5. MANTENER LA CAPACIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DEL IDT	0.00																														
5.1 BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	3.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	41.50	1.25			
5.2 DAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SICAPITAL, EN CADA UNO DE SUS MÓDULOS.	2.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.00			
5.3 BRINDAR LAS CONEXIONES IP PARA LA CONECTIVIDAD DEL INSTITUTO EN LA RED	2.00	8.30	8.60	8.30	9.00	8.30	9.20	8.30	6.80	8.30	6.80	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	48.70	0.97			
5.4 REALIZAR SEGUIMIENTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDT.	1.00	8.30	100.00	8.30	100.00	8.30	100.00	8.30	100.00	8.30	100.00	8.30	100.00	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	600.00	6.00			
5.5 ADMINISTRAR LAS CUENTAS DE USUARIO PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDT	1.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.50			
5.6 IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO IPV6 PARA ACCESO A INTERNET EN EL DOMINIO IDT.GOV.CO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
5.7 ADQUIRIR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍA Y REALIZAR SEGUIMIENTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDT.	7.00	9.10	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	27.30	0.00	9.10	0.00	9.10	0.00	18.20		0.00		0.00		0.00		9.10		9.00		100.00	18.20	1.27			
5.8 REALIZAR DESARROLLOS DE SOFTWARE Y CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE ACTUALIZADOS (DESARROLLO DE SICAPITAL)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00			
5.9 IMPARTIR DOS CAPACITACIONES EN TEMAS DE MEJORAS TECNOLÓGICAS Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD USUARIA DE SERVICIOS TI DEL IDT	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		53.71	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7908 17 Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR PROYECTOS QUE CONLLEVEN AL FORTALECIMIENTO DE LAS TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS O AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SECTOR	0.00																											
1.1	ABRIR CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS QUE CENTREN SUS ESFUERZOS EN DESARROLLAR EVENTOS CON INTERES TURISTICO EN LAS LOCALIDADES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
1.2	DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS MENCIONADAS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS Y GENERAR EL INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.	DESARROLLAR CONVOCATORIAS PÚBLICAS QUE PERMITAN SELECCIONAR PROYECTOS TURÍSTICOS QUE PUEDAN SER EJECUTADOS A PARTIR DE LA DESTINACIÓN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS	0.00																											
2.1	ESTABLECER LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y PRESENTARLAS ANTE EL COMITÉ EJECUTIVO PARA SU APROBACIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.50
2.2	ABRIR LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA SELECCIONAR PROYECTOS TURÍSTICOS ESTRUCTURADOS POR COMUNIDADES ORGANIZADAS, EMPRENDIMIENTOS, EMPRESARIOS U OTROS ACTORES DEL SECTOR	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.50
2.3	REALIZAR UNA ESTRATEGIA PARA COMUNICAR Y DIVULGAR LAS CONVOCATORIAS QUE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
3.	APOYAR LA FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS O PROYECTOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO, LIDERADOS POR MUJERES, JÓVENES, CAMPESINOS U OTROS GRUPOS SOCIALES O COMUNITARIOS	0.00																											
3.1	ABRIR CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS O INICIATIVAS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO, LIDERADOS POR MUJERES, JÓVENES, CAMPESINOS U OTROS GRUPOS SOCIALES O COMUNITARIOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
3.2	DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS MENCIONADAS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.3	ENTREGAR LOS ESTIMULOS FINANCIEROS A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.4	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	OTORGAR ESTÍMULOS O INCENTIVOS A LOS ACTORES DEL SECTOR TURISMO PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	0.00																											
4.1	ABRIR CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA BENEFICIAR ACTORES DEL SECTOR TURISMO CON ESTÍMULOS O INCENTIVOS PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	33.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.30	1.33

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7908 17 Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
PROMOCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO																												
4.2 DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS EJECUTADAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.3 ENTREGAR LOS ESTIMULOS A LOS BENEFICIARIOS SELECCIONADOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.4 HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INCIATIVAS SELECCIONADAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. CAPACITAR PERSONAS EN HABILIDADES Y COMPETENCIAS LIGADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO	0.00																											
5.1 ESTABLECER LA ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLAR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.2 DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE RECIBIRÁN LAS CAPACITACIONES DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA ESTABLECIDA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.3 DESARROLLAR CAPACITACIÓN LIGADA AL DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN	0.00																											
6.1 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL SECTOR Y GENERAR ESTRATEGIAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ENCONTRADAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.2 EJECUTAR Y AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 23.33

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7571 Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá

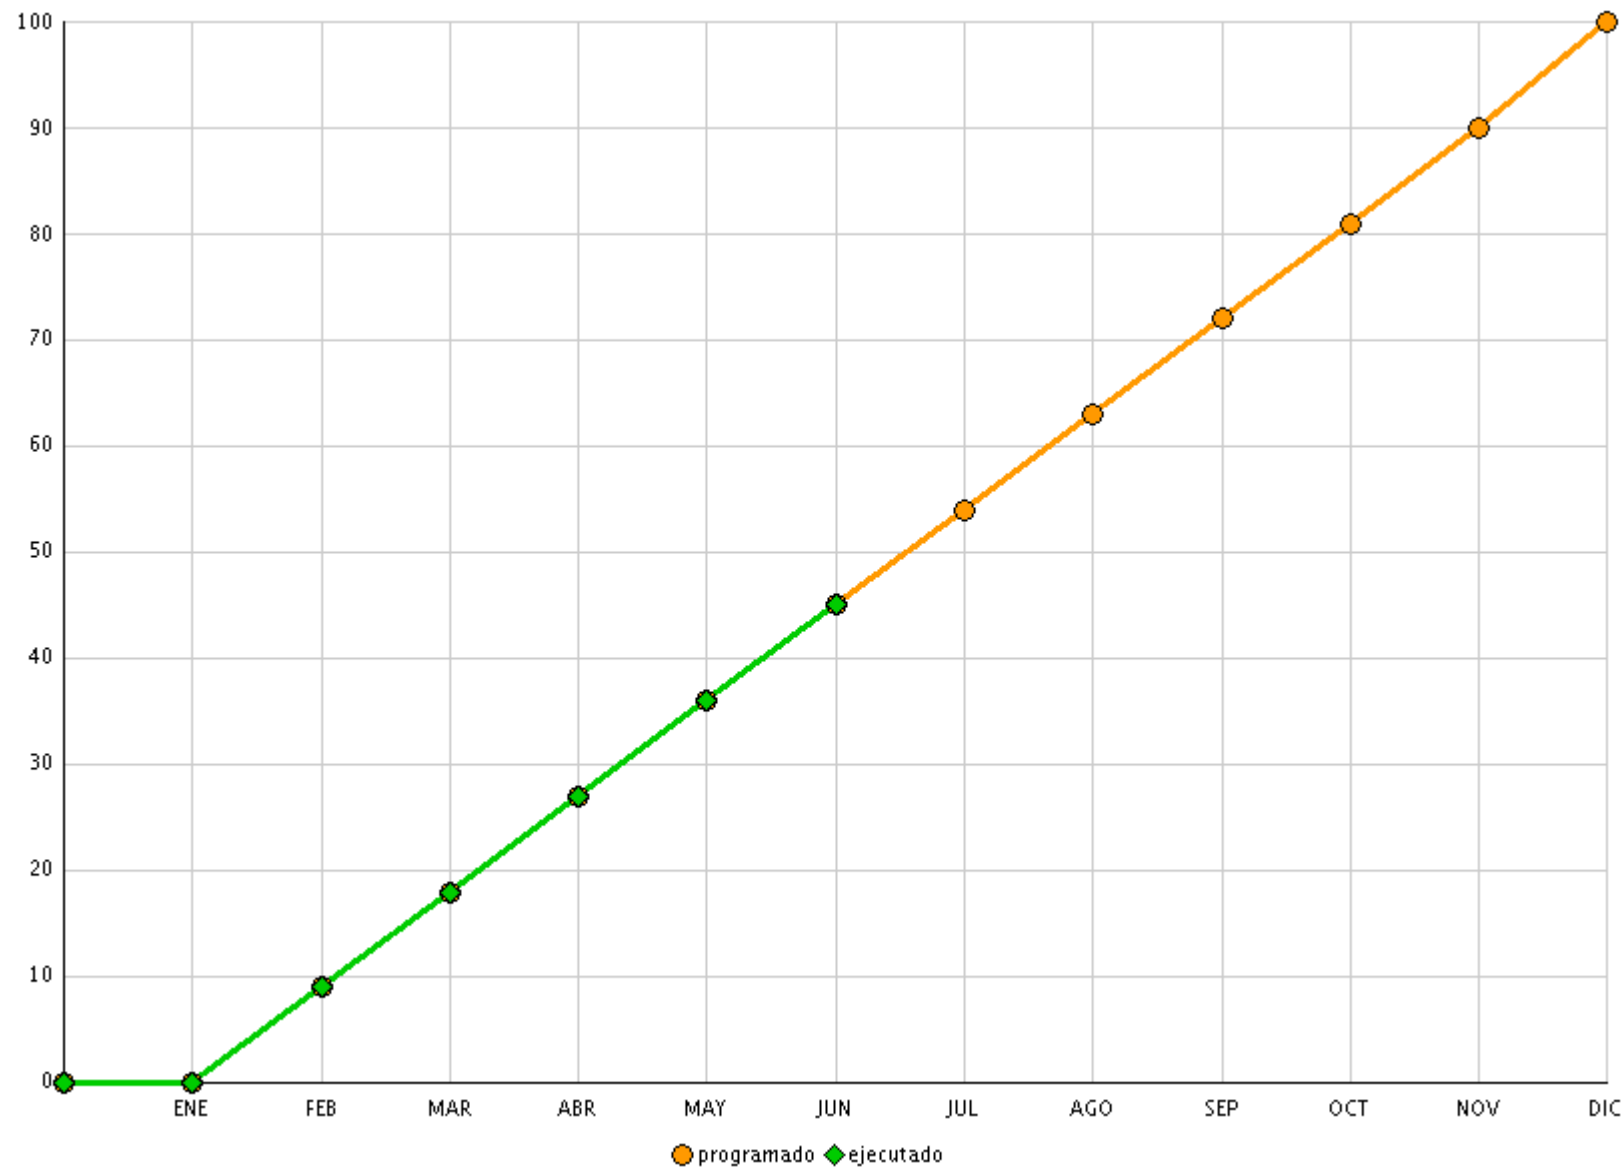


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7585 Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

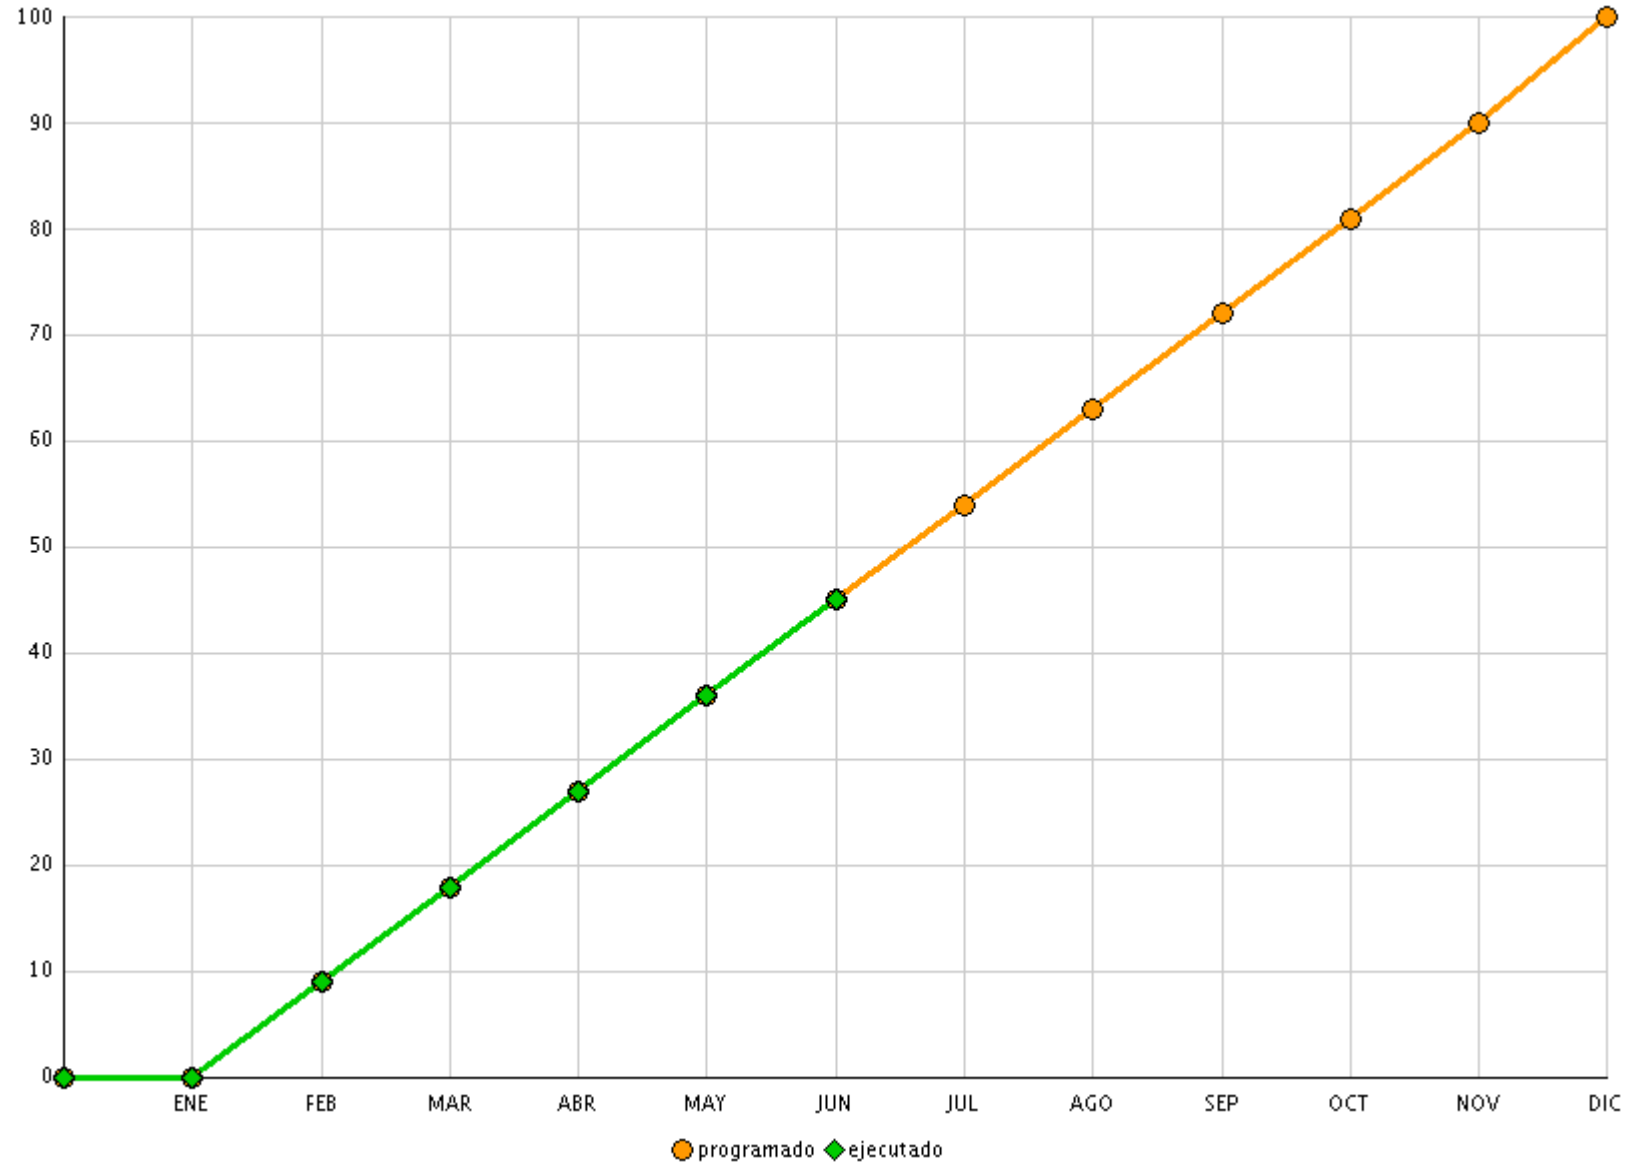


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7594 Desarrollo de las prácticas literarias como derecho

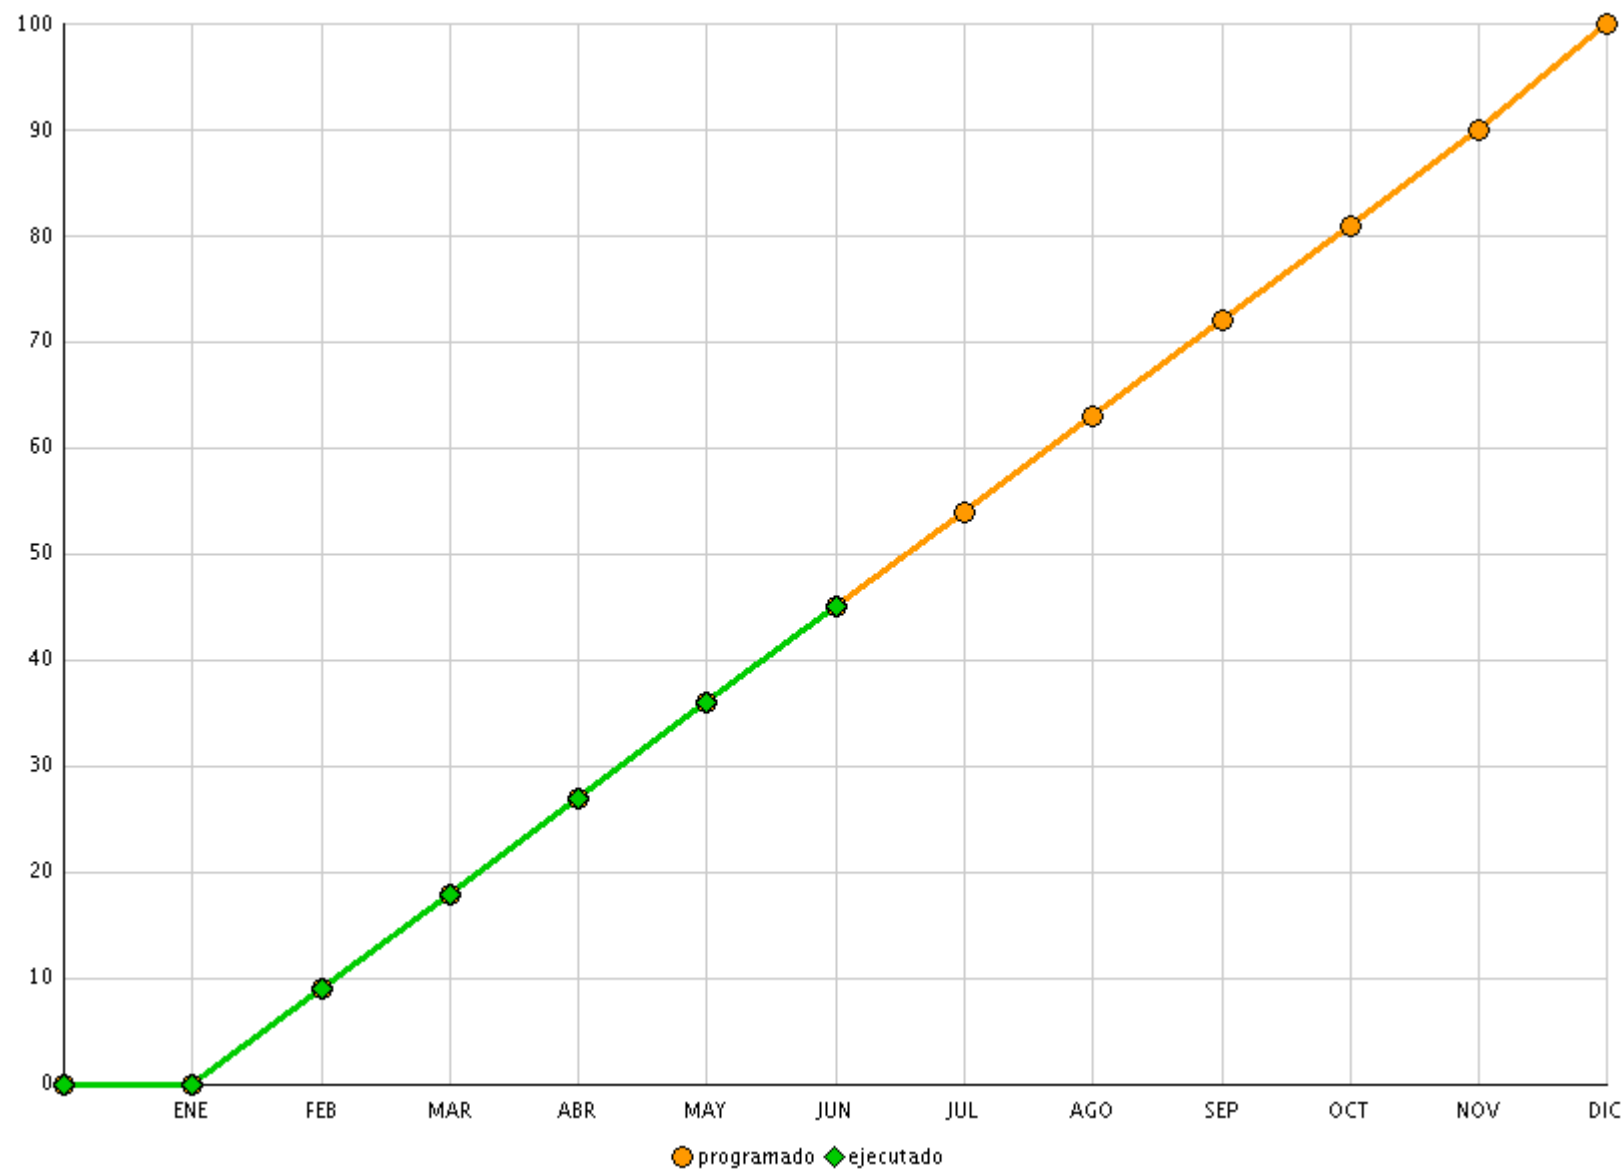


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7598 Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC

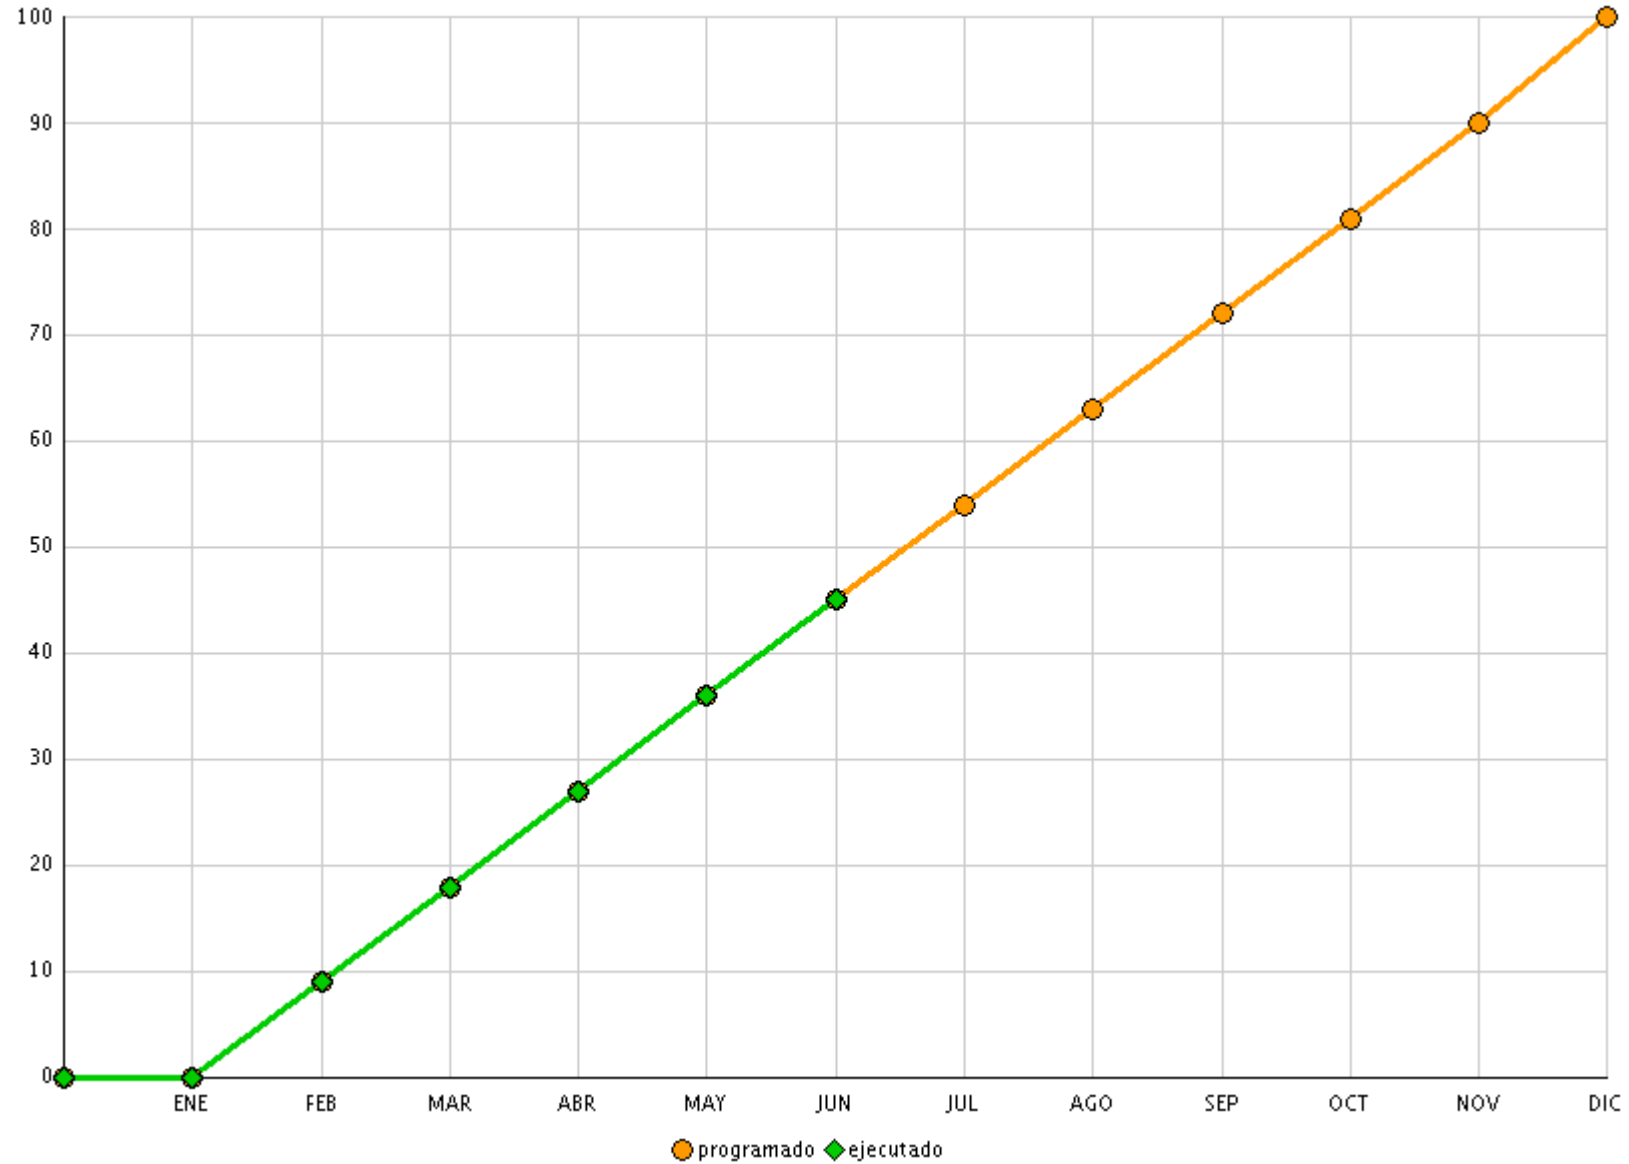


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7600 Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.

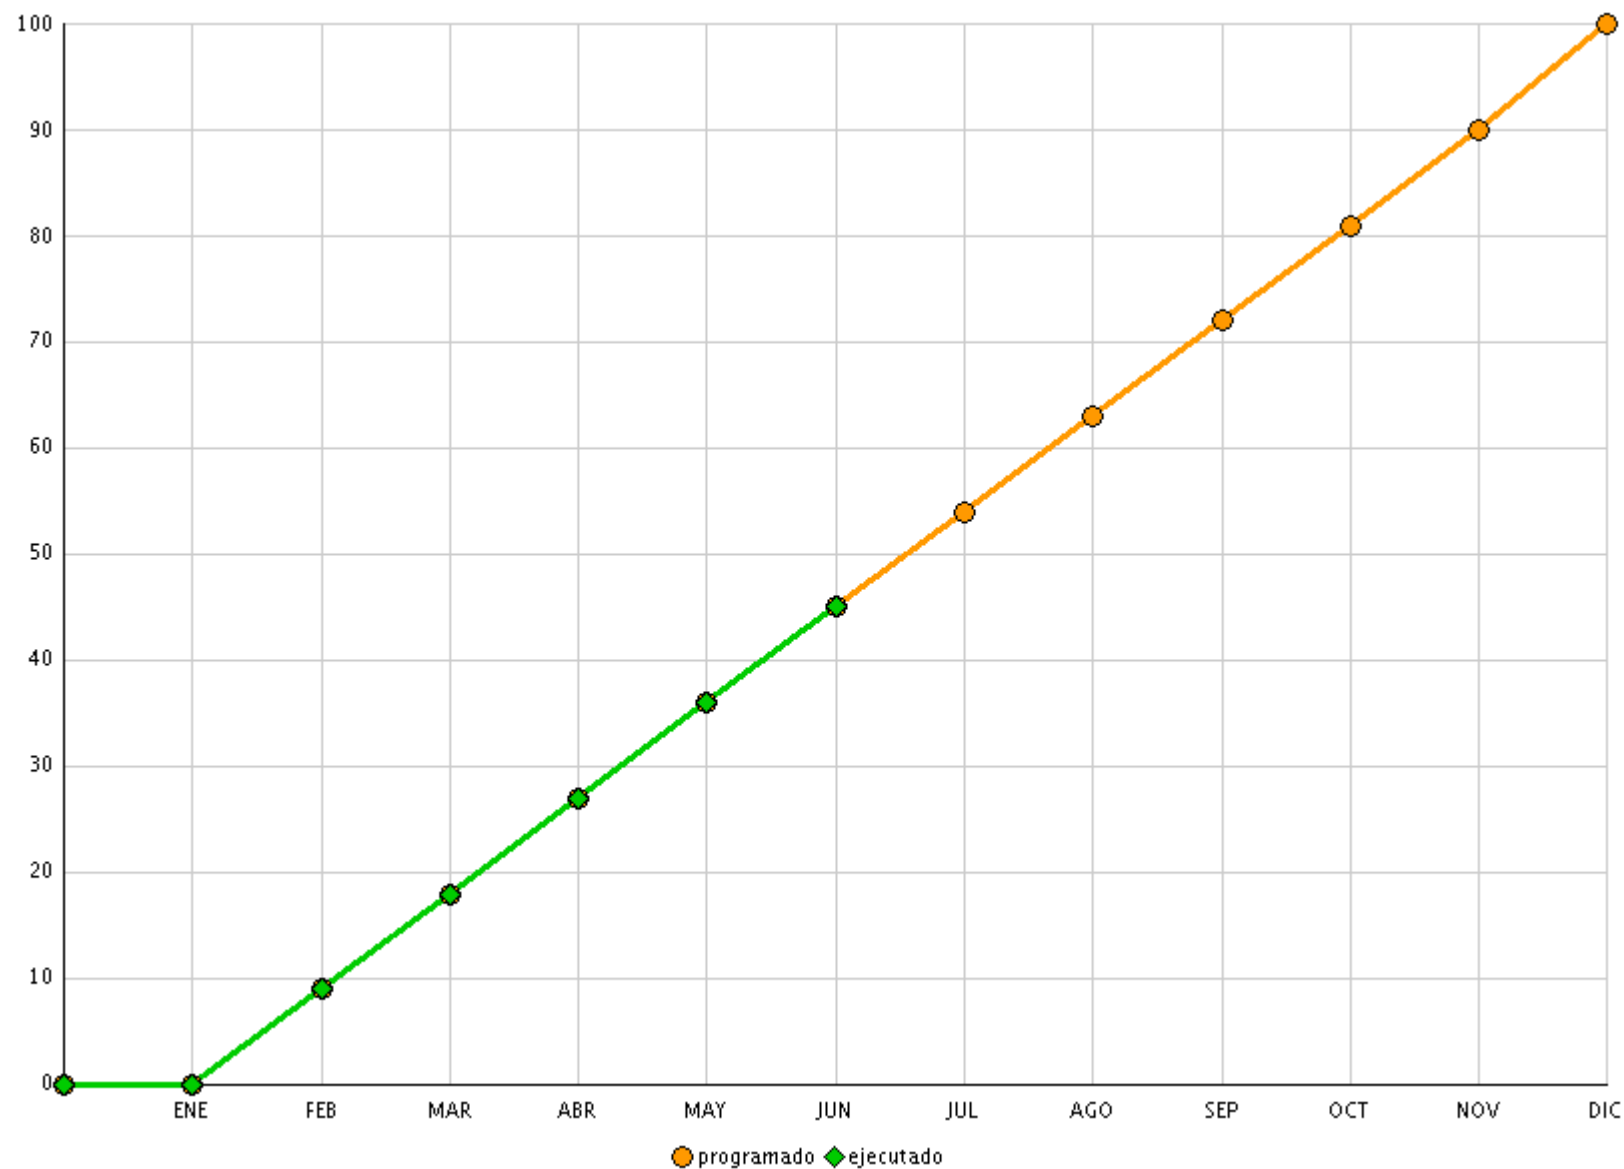


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7603 Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.

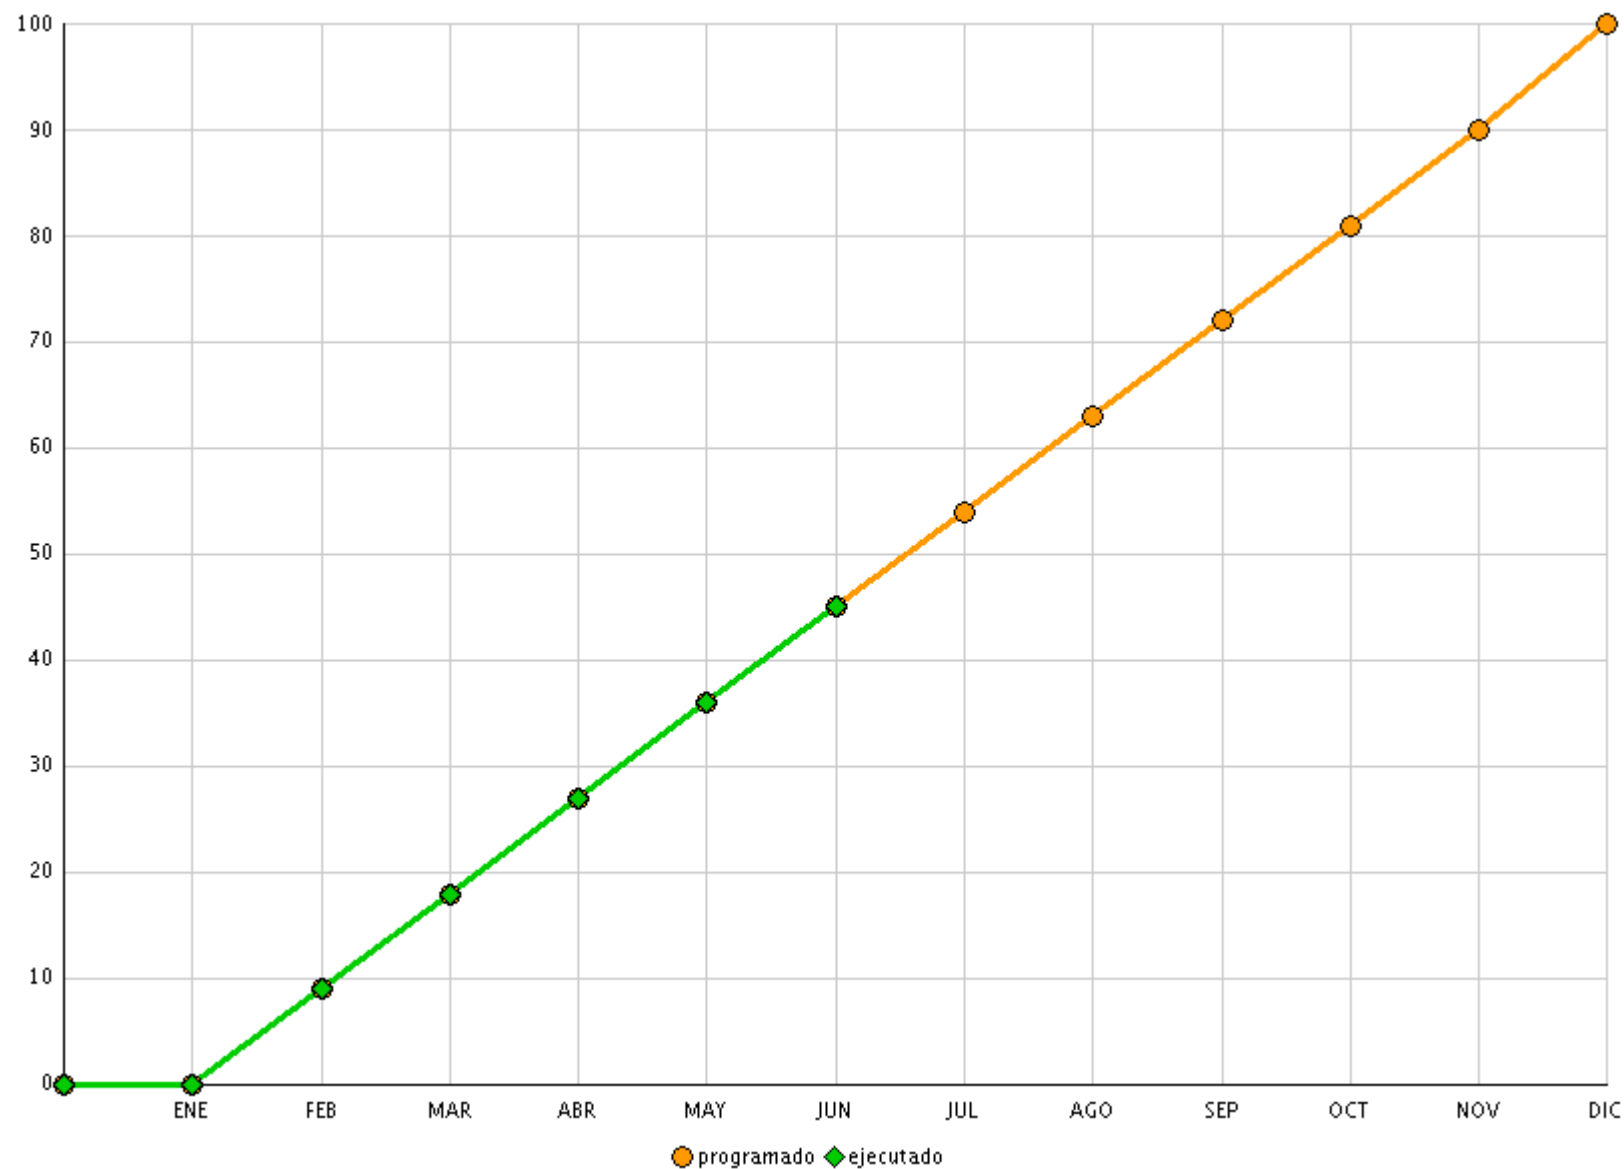


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7607 Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.

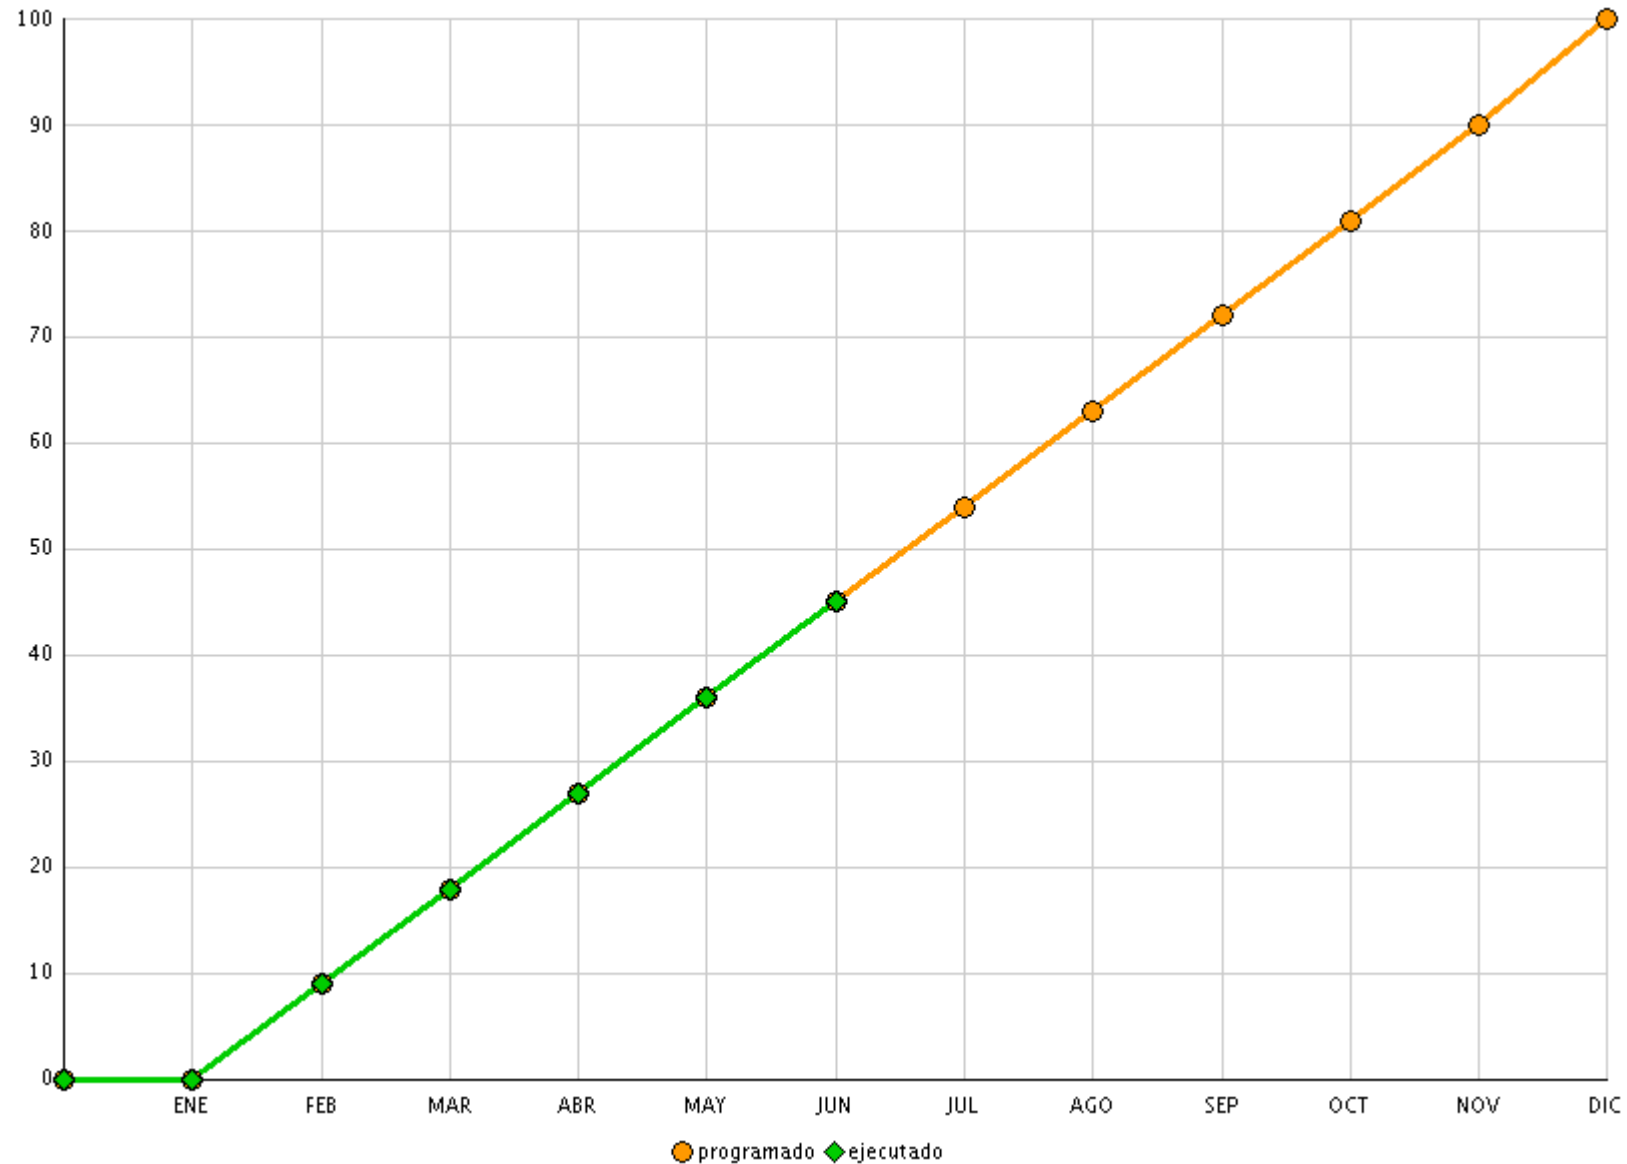


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7614 Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

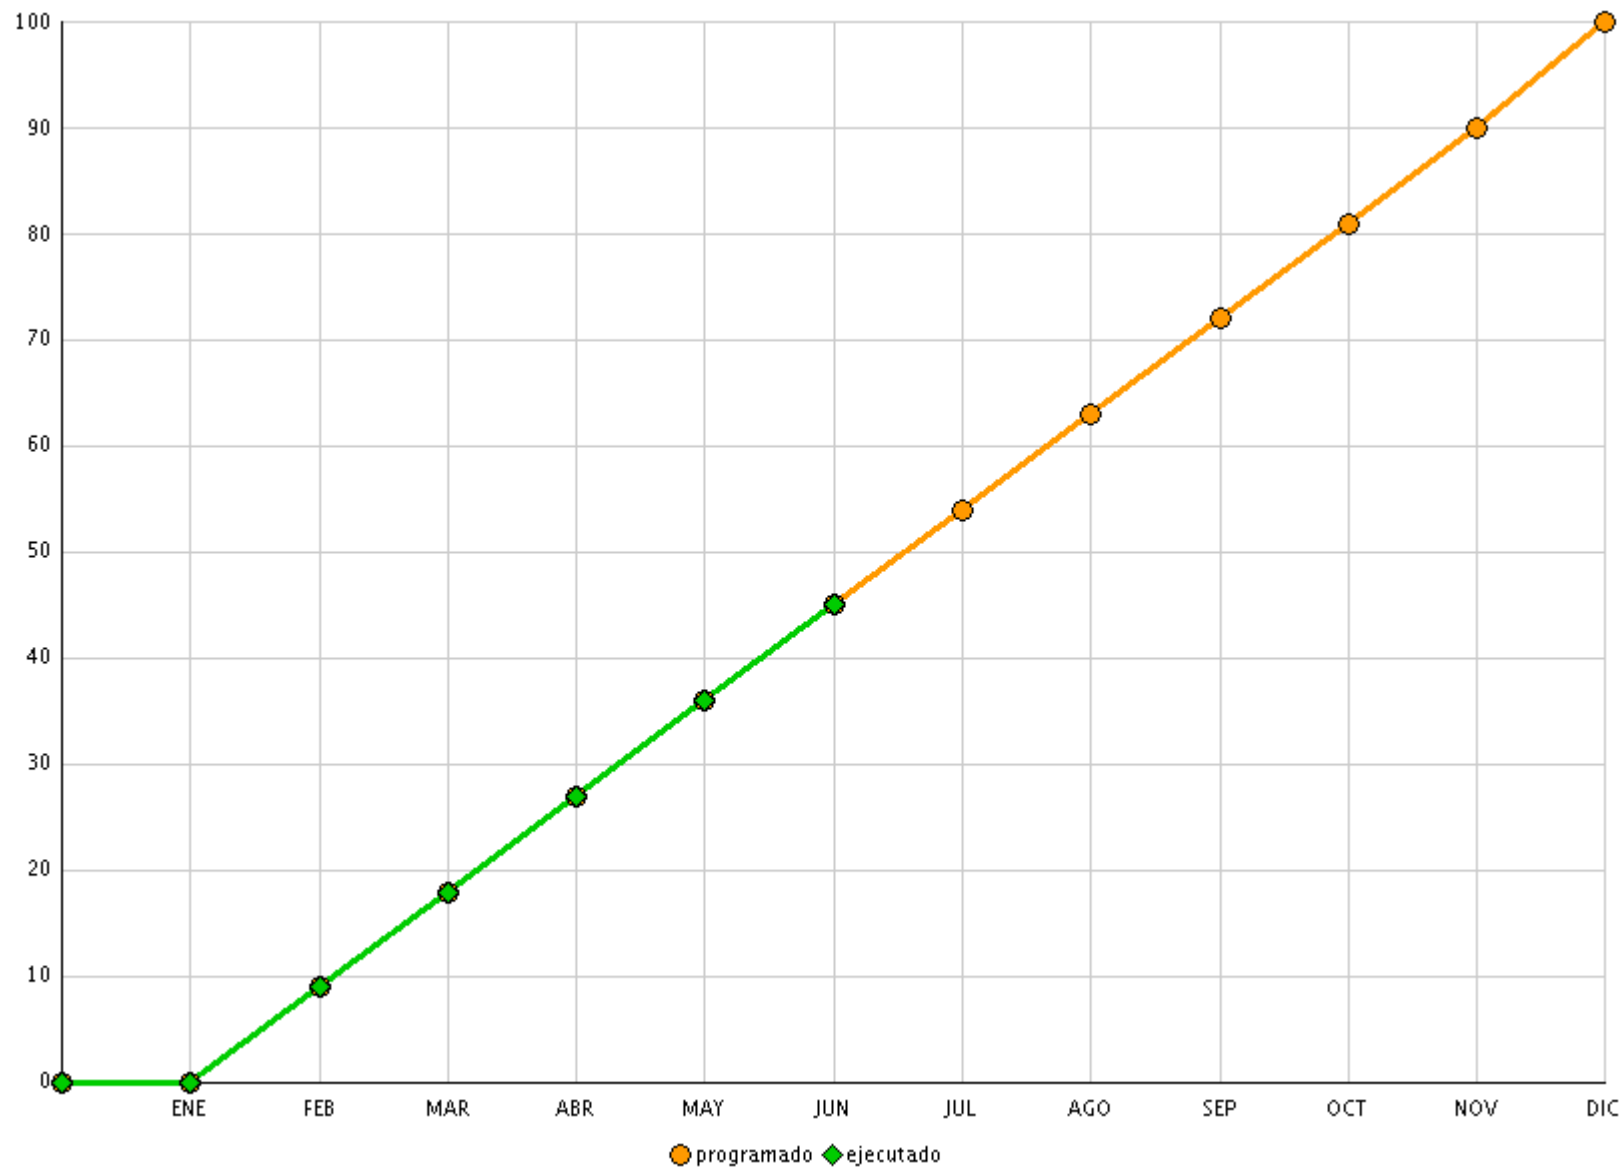


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7617 Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.

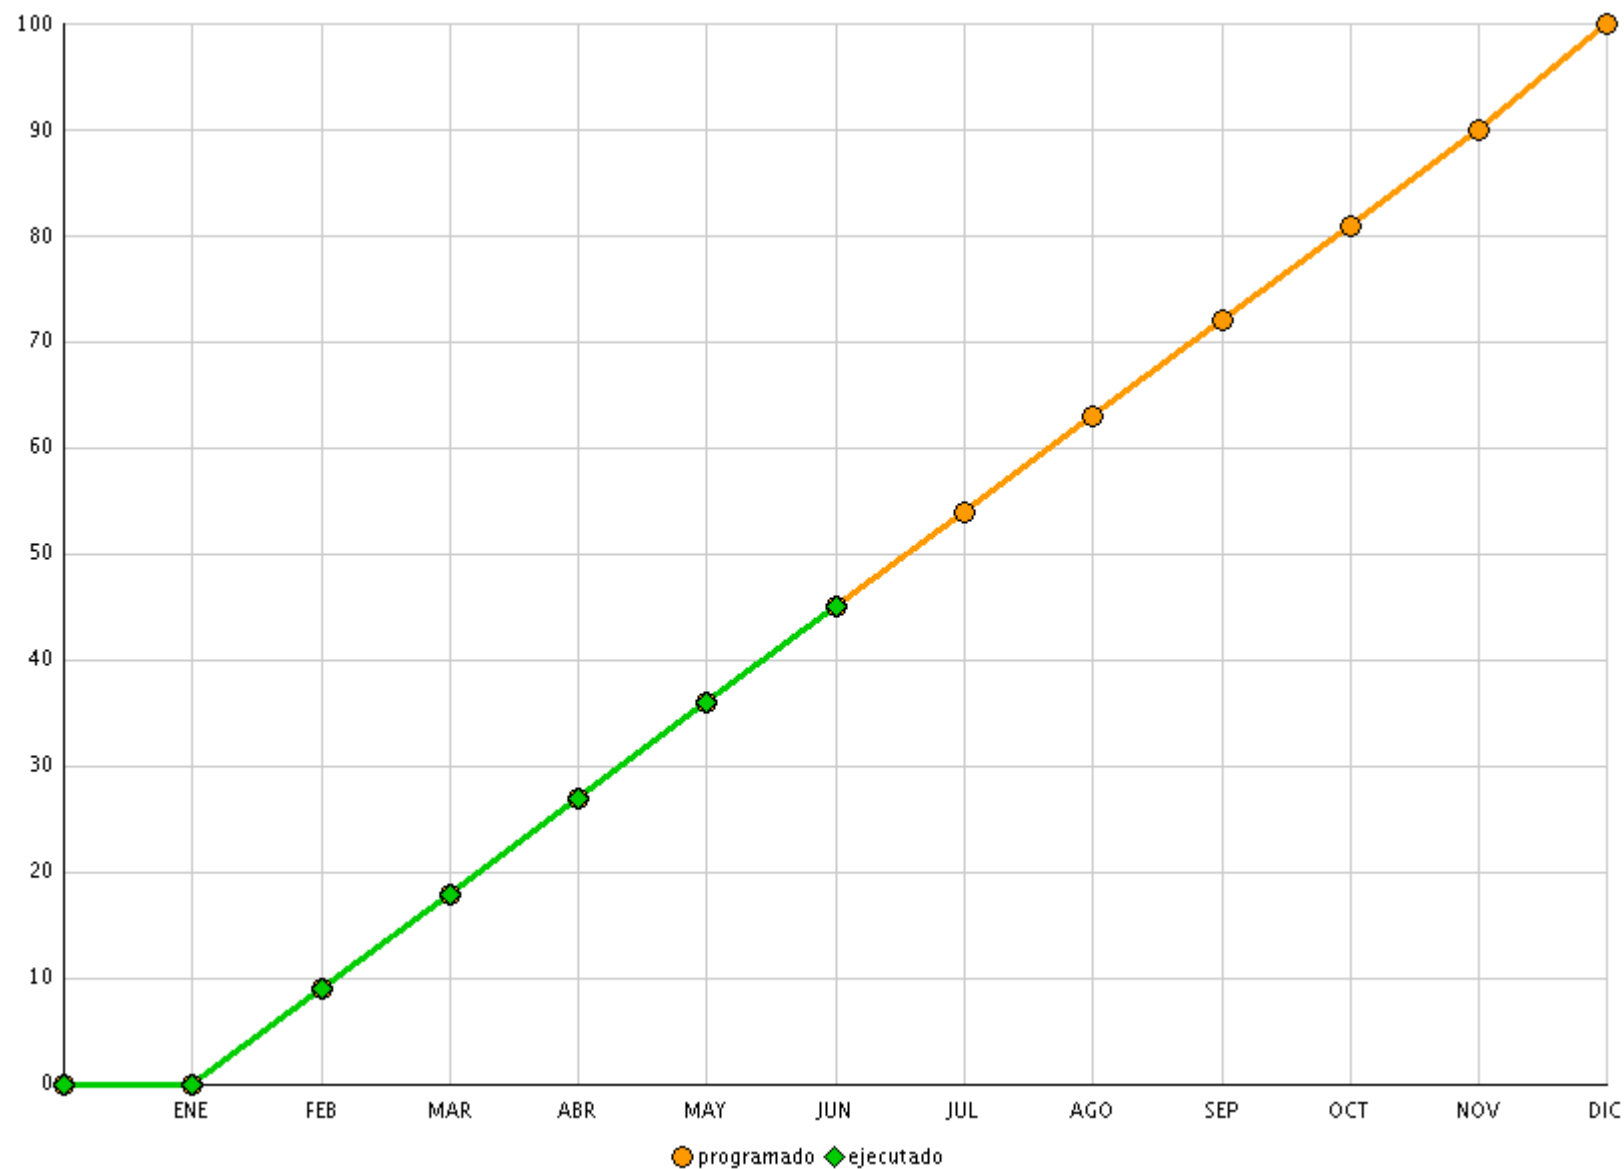


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7619 Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.

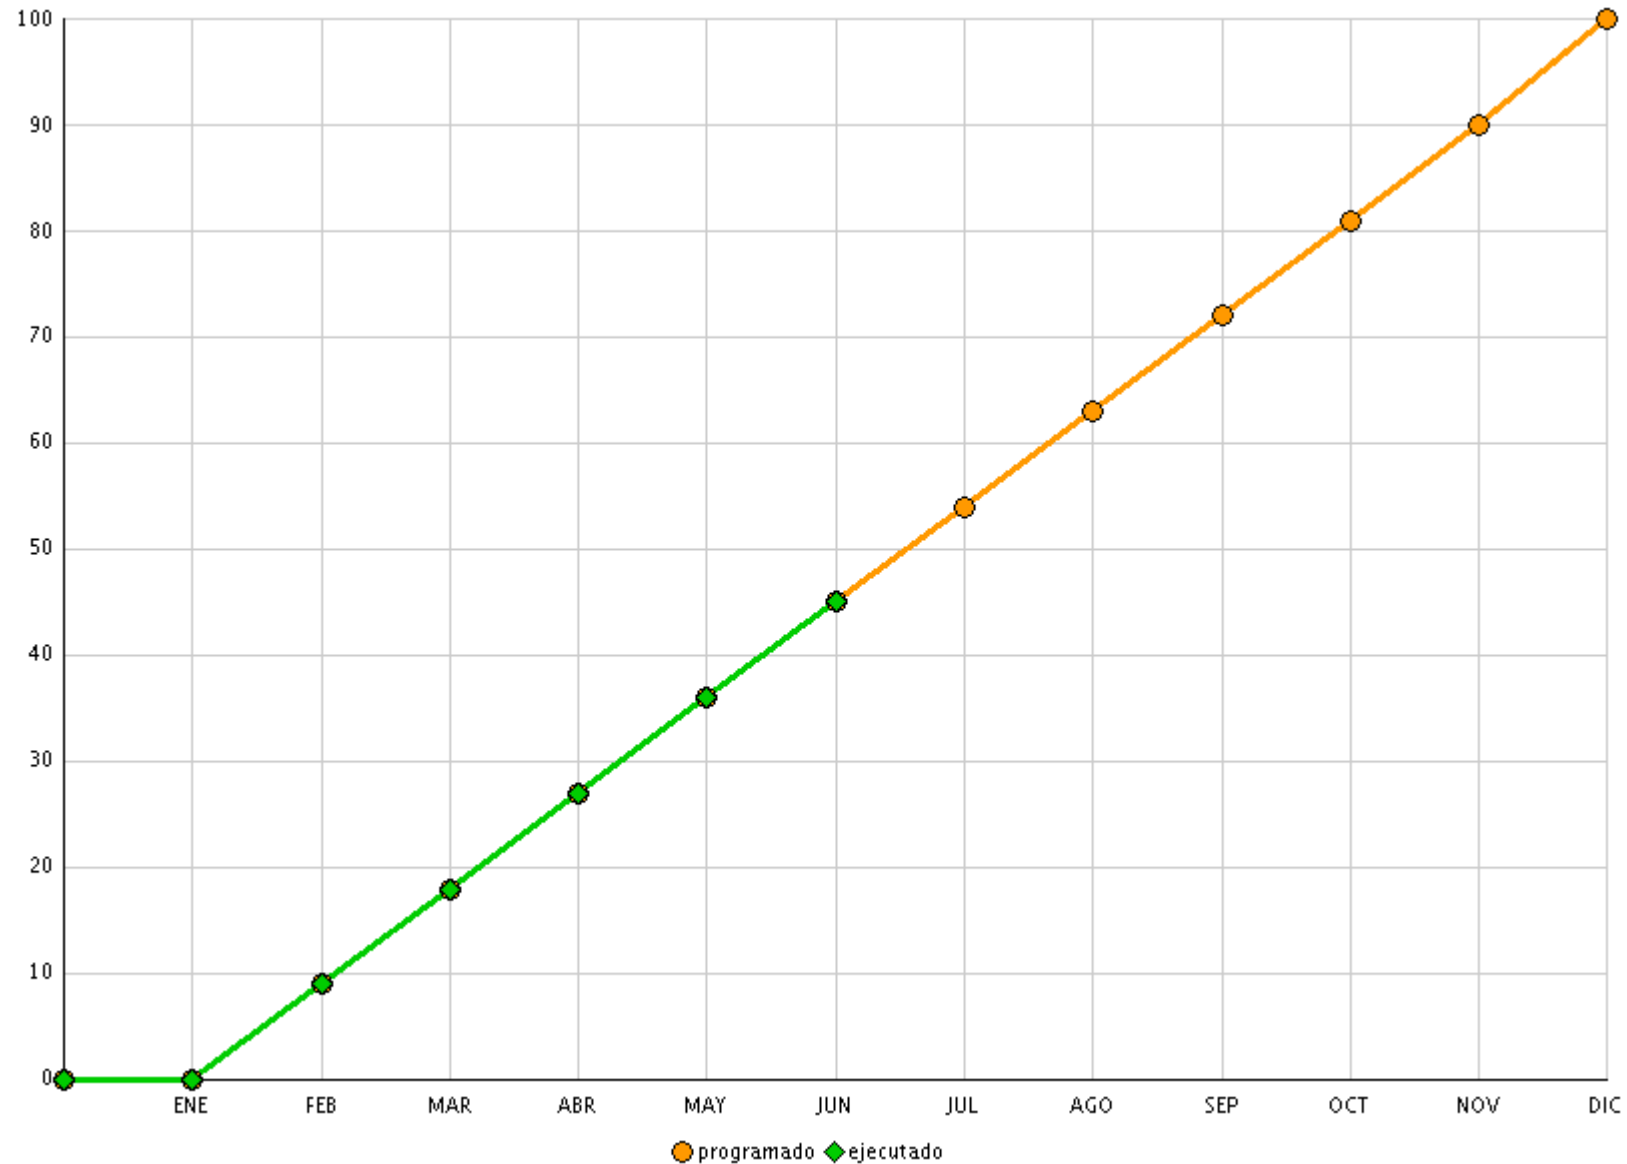


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7622 Modernización integral de la Gestión Administrativa y fortalecimiento institucional Bogotá D.C.

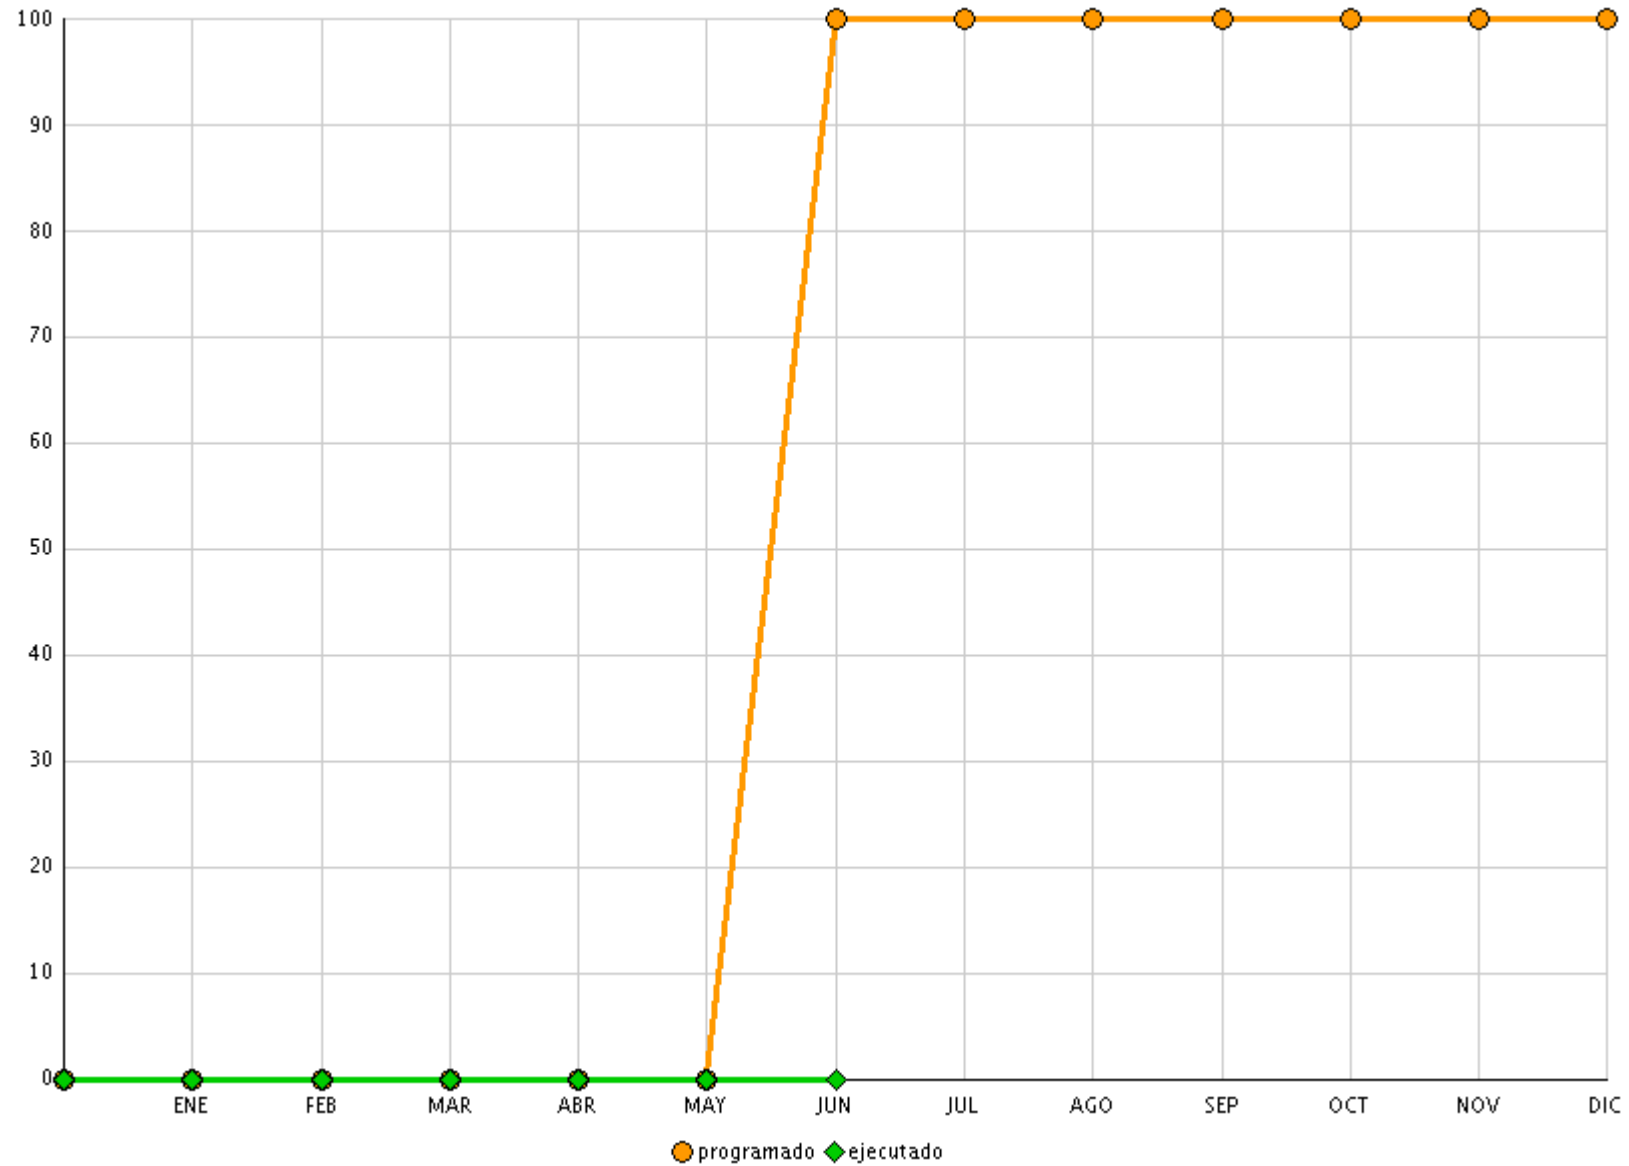


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7625 Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C.

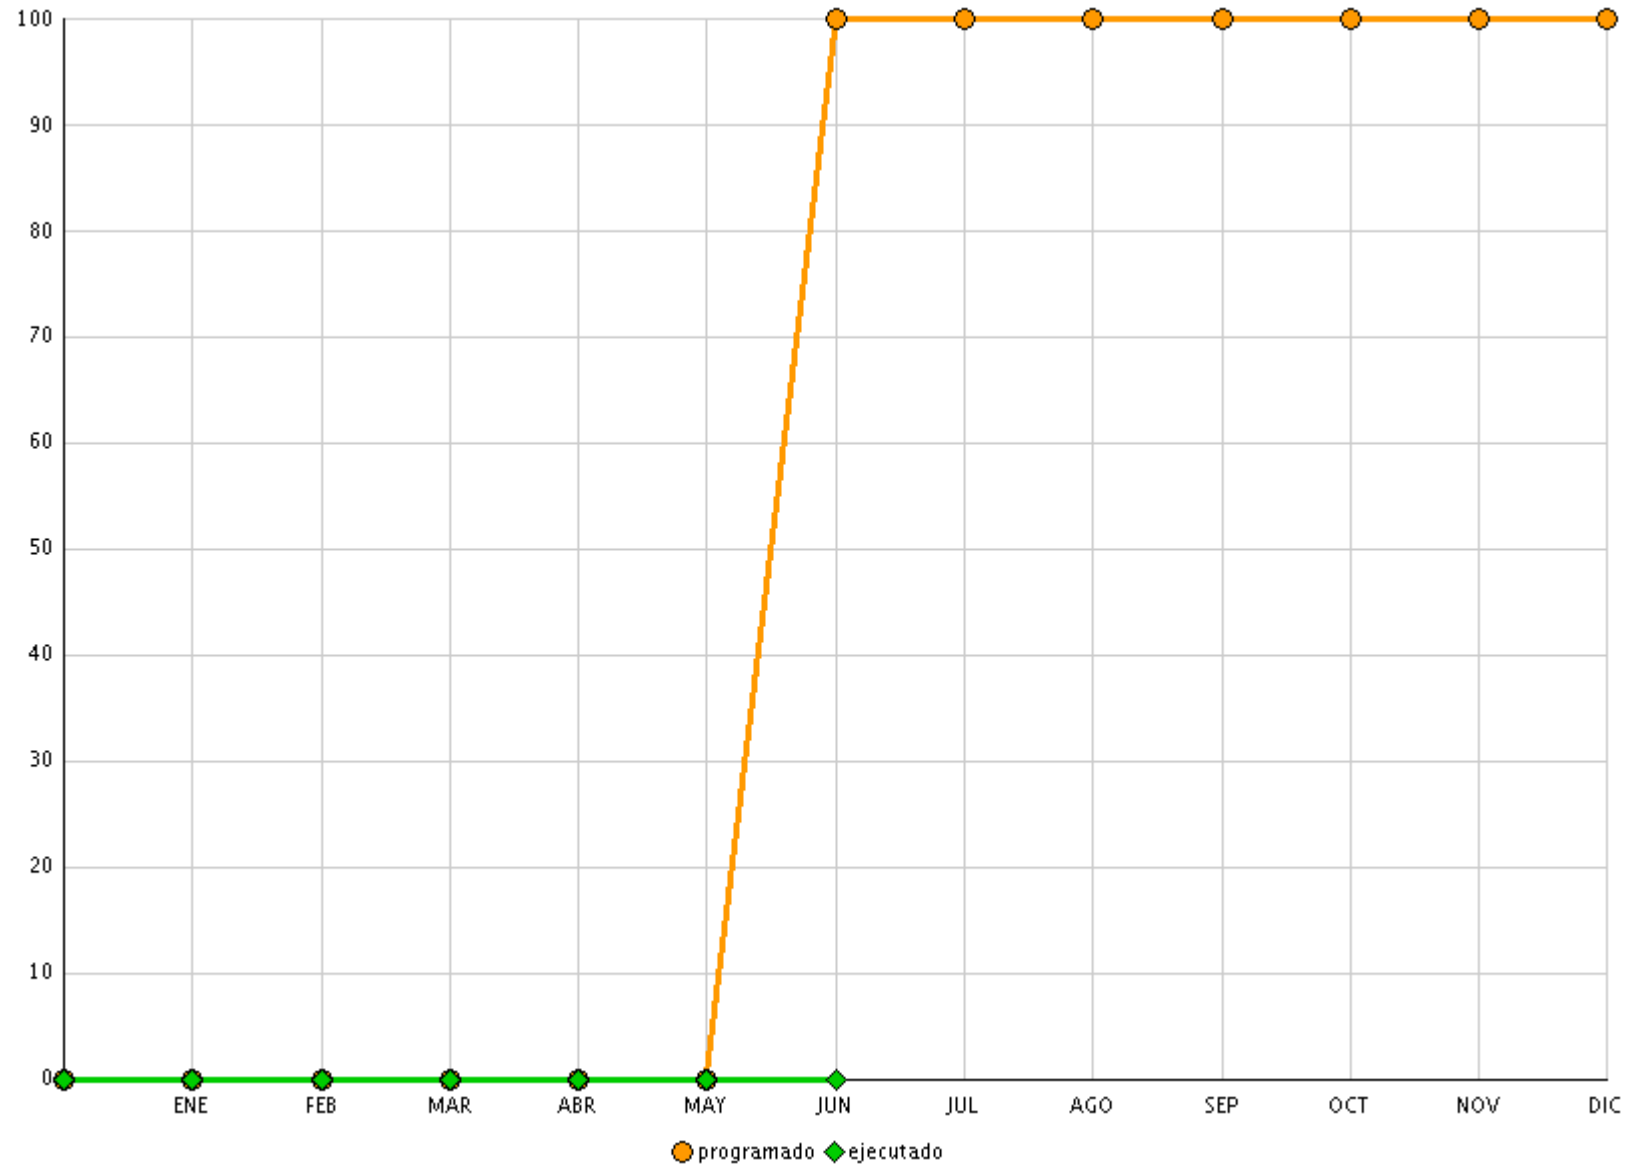


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7902 Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá

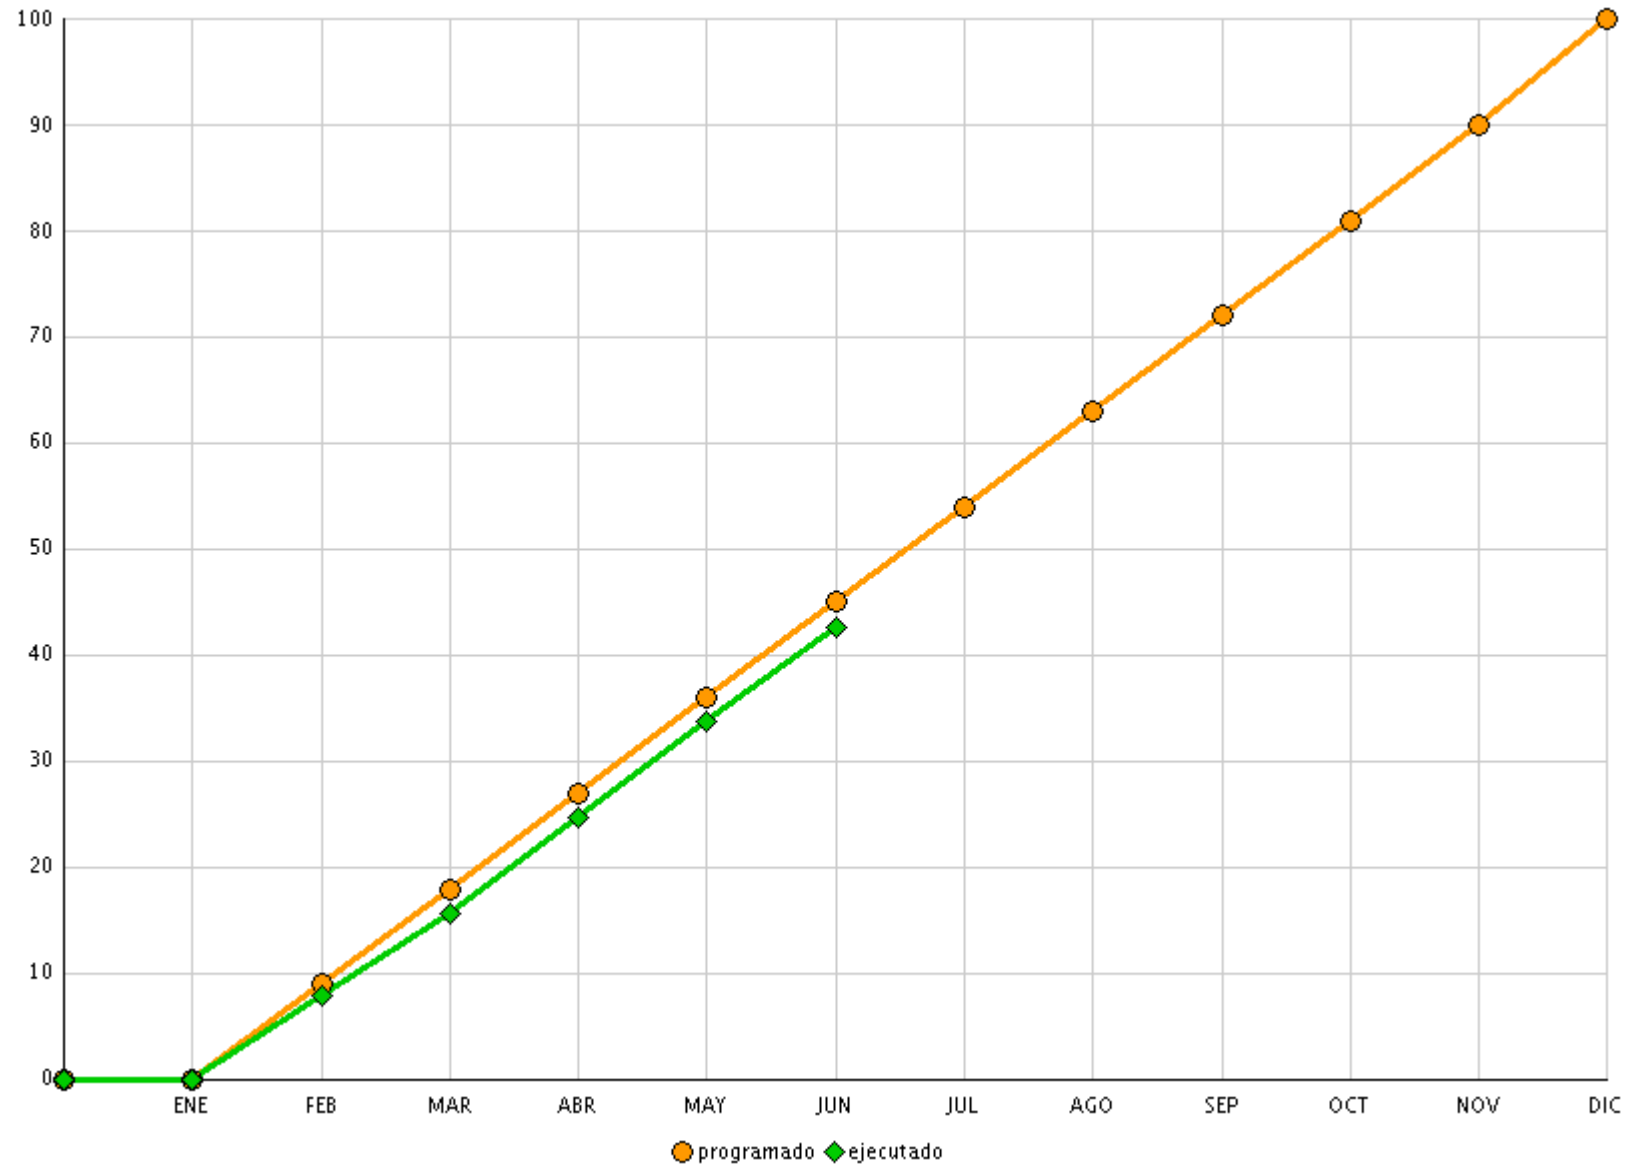


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	7.85	15.70	24.70	33.70	42.70						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7909 Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los territorios de Bogotá D.C

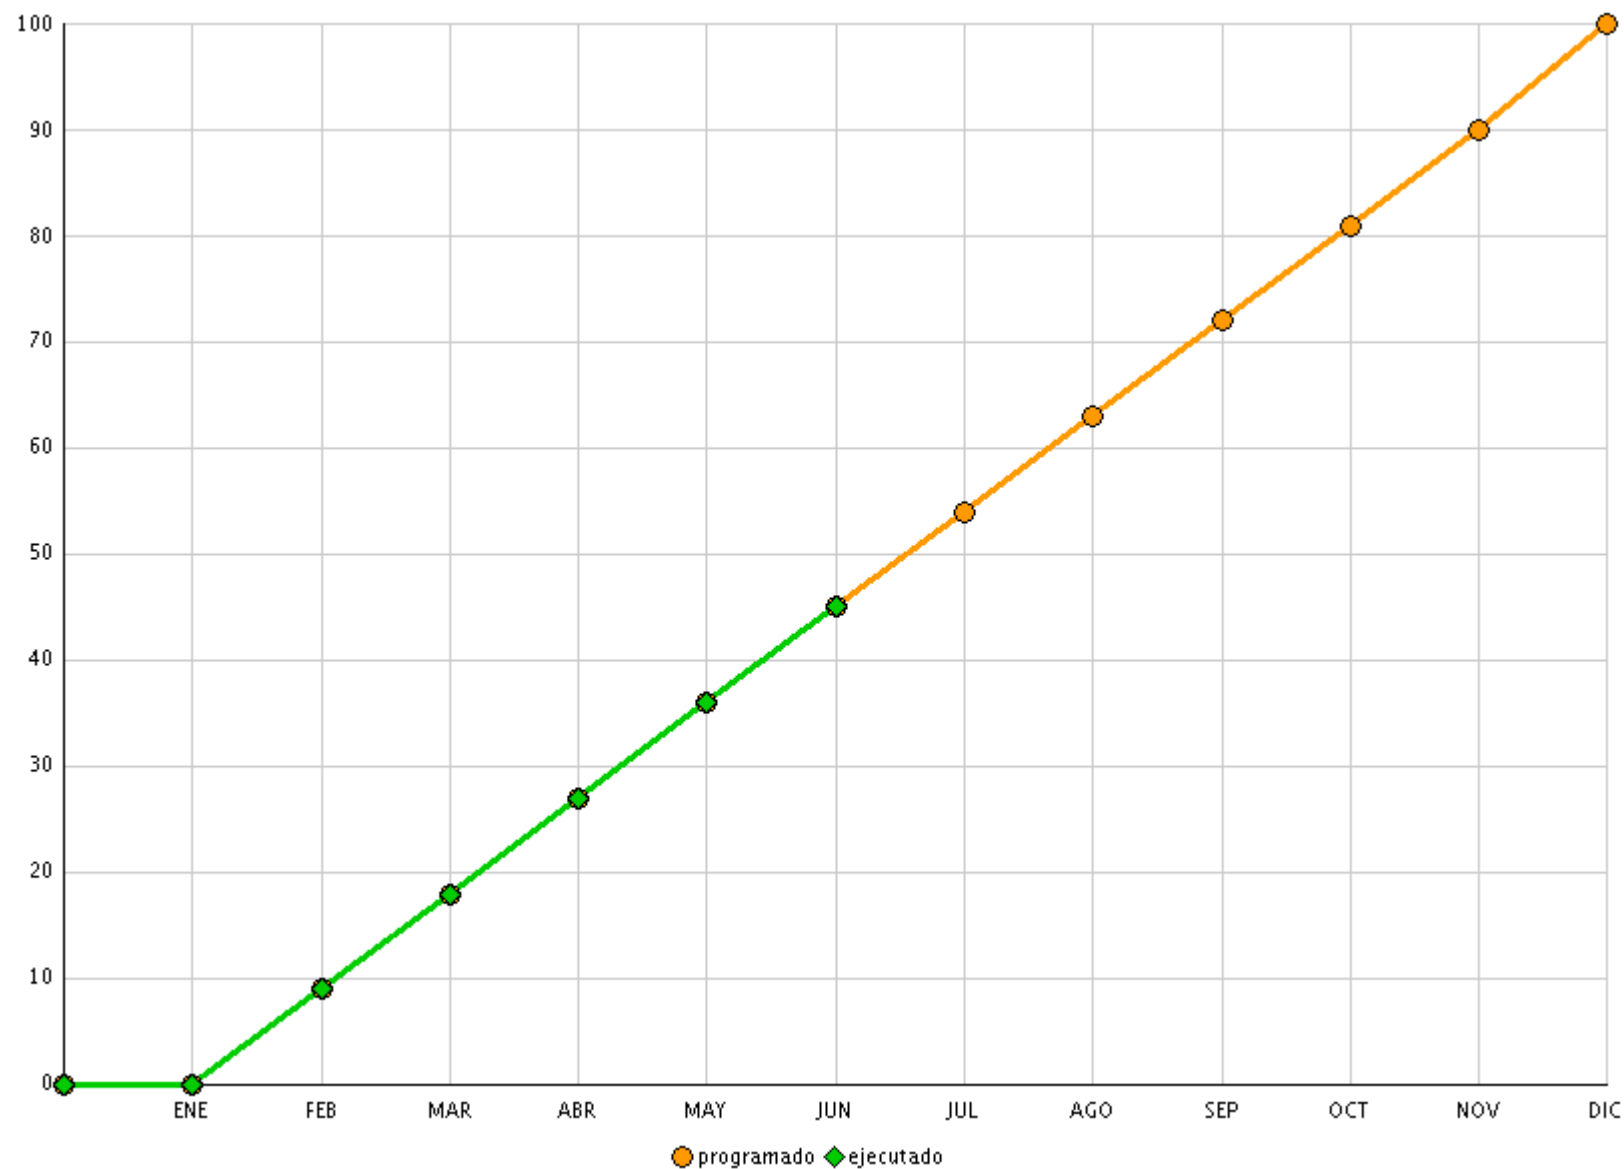

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	72.00	81.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7571 35 Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTIVIDADES DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA OFERTA CULTURAL	66.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	29.70
2.	ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	17.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	7.65
3.	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	17.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	7.65
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										45.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7585 34 Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES										Millones de pesos 2022									
Año		Banco Proyectos IPC Valor		Presupuesto Definitivo						Ejecución Vigencia									
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos															

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	0.67	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.30
2.	RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES	9.37	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.22
3.	CIRCULACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA.	28.47	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	12.81
4.	EDUCACIÓN INFORMAL PARA EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL	3.54	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.59
5.	EDUCACIÓN INFORMAL EN ARTES Y CULTURA	7.69	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.46
6.	ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL Y LA CIUDADANÍA.	1.64	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.74
7.	GESTIÓN, GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CAMPO DE LAS ARTES.	1.66	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.75
8.	PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN TORNO AL CAMPO DE LAS ARTES Y DE LAS PRÁCTICAS CREATIVAS CIUDADANAS.	37.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	16.65
9.	OPORTUNIDADES EQUITATIVAS E INNOVADORAS PARA LAS ARTES	9.96	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.48
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										45.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7594 27 Desarrollo de las prácticas literarias como derecho

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTIVIDADES CADENA DEL LIBRO	48.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	21.60
2.	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CIRCULACIÓN	12.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	5.40
3.	LIBRO AL VIENTO Y OTRAS PUBLICACIONES	35.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	15.75
4.	ACTIVIDADES EN TERRITORIO	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									45.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7598 21 Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN	26.36	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	11.86
2.	ESTRATEGIAS DE CIRCULACIÓN	39.09	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	17.59
3.	ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN	25.45	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	11.45
4.	ESTRATEGIAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN	9.10	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.10
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7600 29 Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS Y BANCO DE JURADOS	42.78	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	19.25
2.	PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS, PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS METROPOLITANOS Y	27.83	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	12.52
3.	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN	10.44	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.70
4.	PROGRAMA DISTRITAL DE SALAS CONCERTADAS	13.99	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	6.30
5.	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES DEL SECTOR	4.96	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.23
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										45.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7603 24 Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ARTICULACIÓN DE DIÁLOGOS	78.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	35.33
2. DIFUSIÓN OFERTA CULTURAL	4.71	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.12
3. ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN	16.79	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	7.56
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7607 29 Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AMPLIAR EL ALCANCE DE LOS DIAGNÓSTICOS NECESARIOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	2.43	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.09
2.	DOTAR LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	9.16	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.12
3.	FORTALECER LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS INTERVENCIONES	36.68	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	16.51
4.	IMPLEMENTAR Y MAXIMIZAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO FÍSICO EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	3.10	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.40
5.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	48.63	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	21.88
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									45.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7614 30 Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN	5.28	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.38			
2. PROGRAMACIÓN CONVERGENTE	68.64	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	30.89			
3. GESTIÓN Y DOTACIÓN ESPECIALIZADA	23.84	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	10.73			
4. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	2.24	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.01			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7617 28 Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENCIONES	73.71	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	33.17
2. FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	2.17	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.98
3. CONTENIDOS	5.07	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.28
4. ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN	10.49	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.72
5. LABORATORIOS Y ESPACIOS ADECUADOS	3.38	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.52
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.18	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.33
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7619 33 Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	65.48	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	29.47		
2. ACTIVIDADES COMPONENTE PEDAGÓGICO	12.83	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	5.77		
3. ACTIVIDADES ENTORNOS VISIBLES	2.06	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.93		
4. ACTIVIDADES GESTIÓN TERRITORIAL	19.63	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	8.83		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7622 15 Modernización integral de la Gestión Administrativa y fortalecimiento institucional Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. SISTEMA DE APRENDIZAJE PARA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7625 23 Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ARTICULACIÓN INTRA-INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA OFERTA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. CREACIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. RED INTEGRADA DE EQUIPAMIENTOS Y NODOS CULTURALES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		0.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7902 21 Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	42.72	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	19.22
2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	12.80	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	27.00	3.46
3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	10.52	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.73
4. SISTEMA DE APRENDIZAJE PARA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL	0.16	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.07
5. ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN	33.80	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	15.21
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		42.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7909 11 Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los territorios de Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIAL	23.40	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	10.53
2.	CREACIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS	67.67	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	30.45
3.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.93	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.02
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										45.00

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7775 Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales

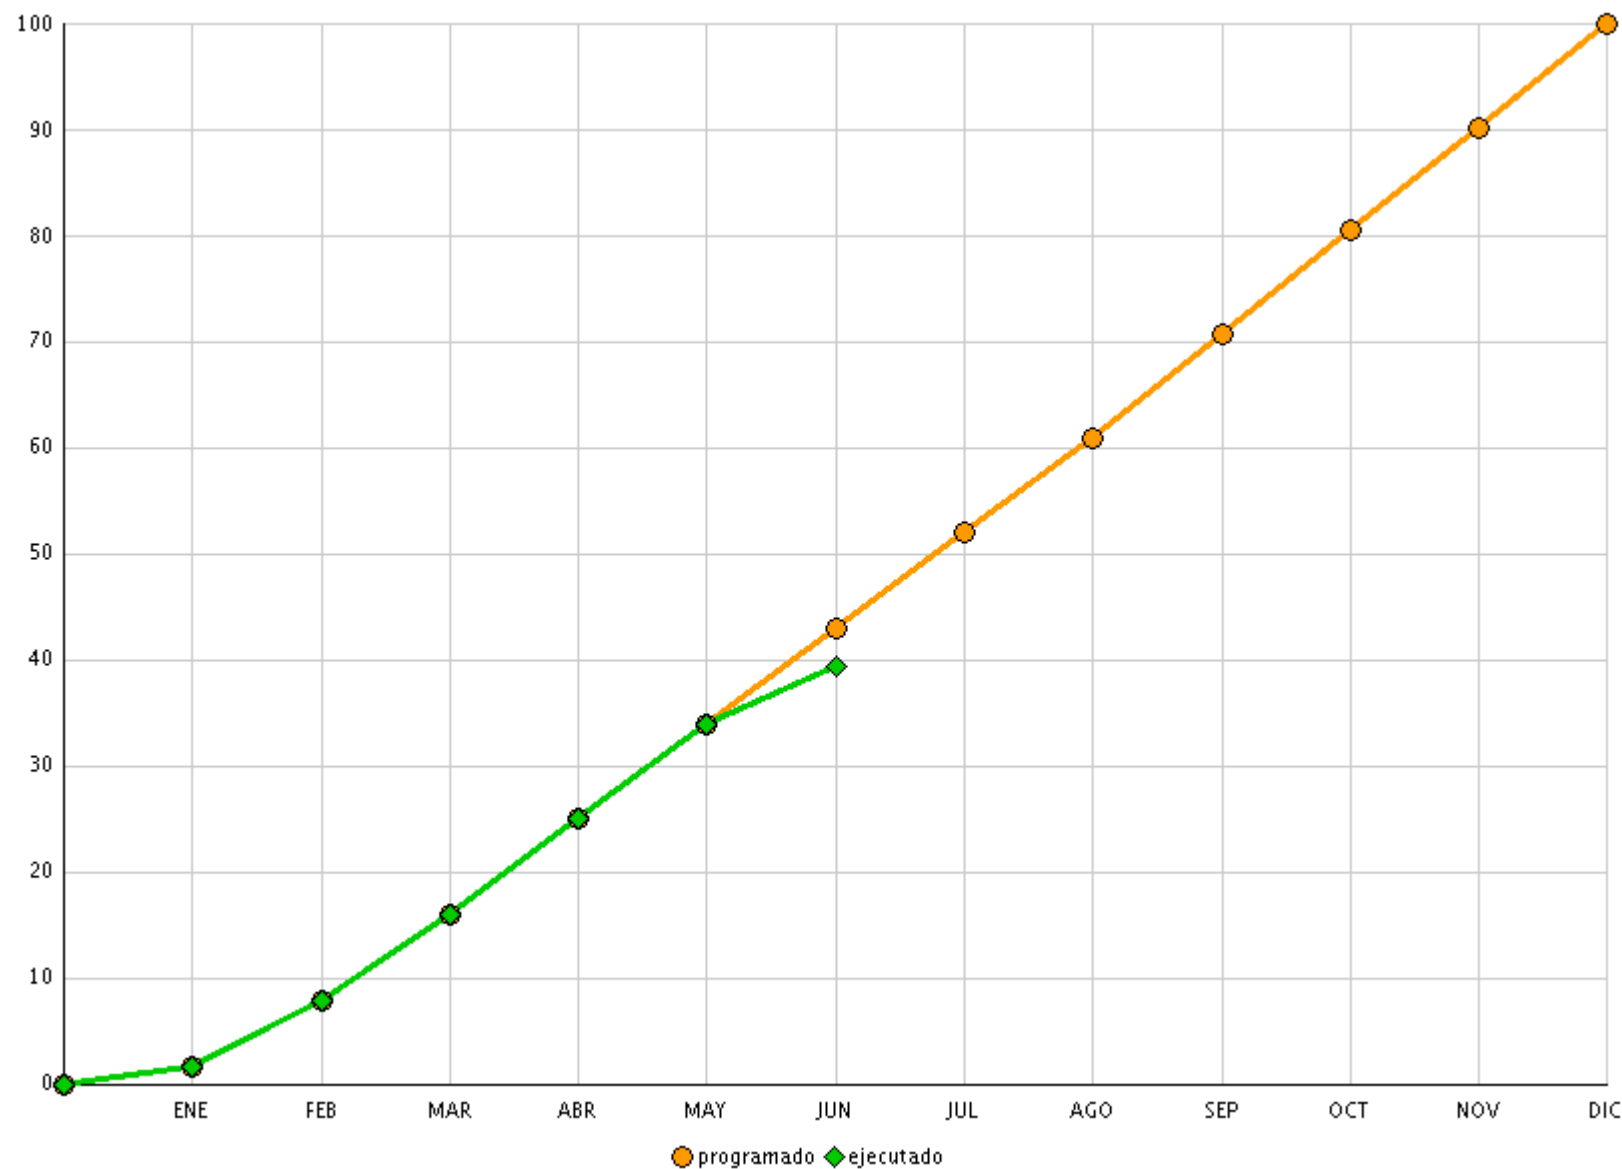


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.75	8.00	16.00	25.00	34.00	43.00	52.00	61.00	70.75	80.50	90.25	100.00
Ejecutado	1.75	8.00	16.00	25.00	34.00	39.50						

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7839 Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones

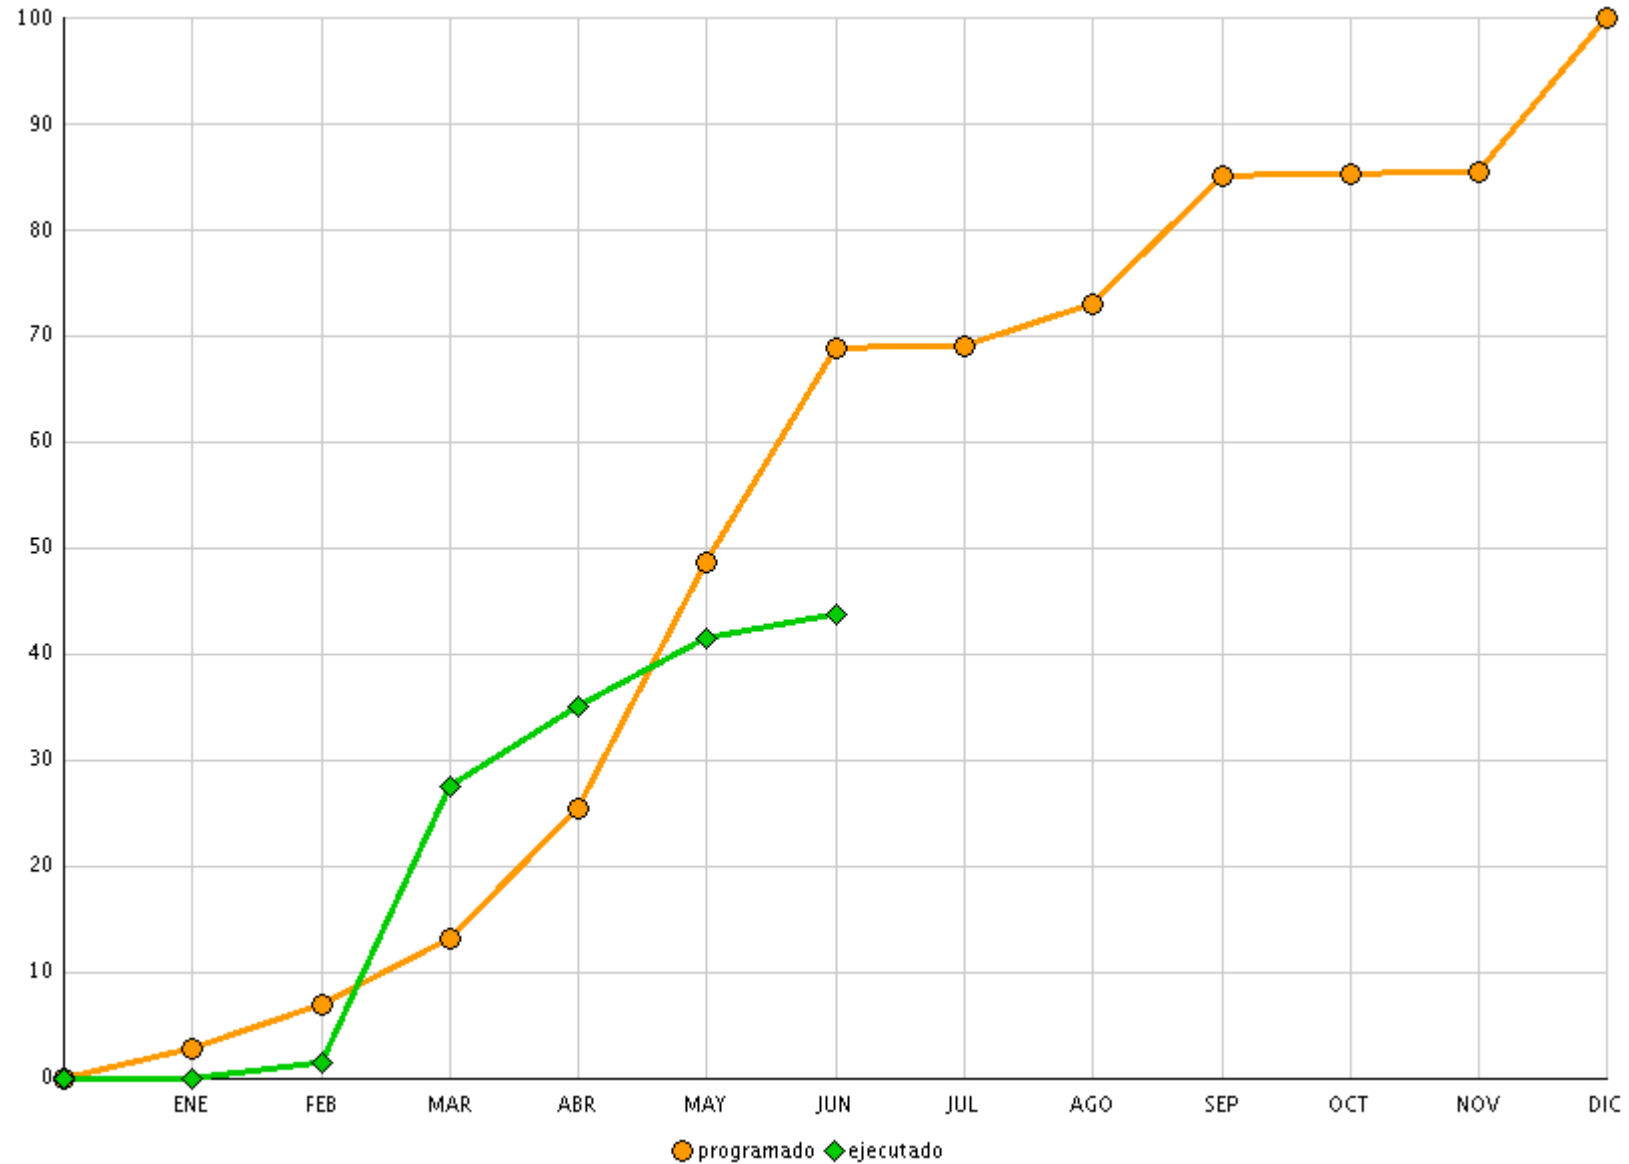


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.74	6.98	13.15	25.49	48.73	68.90	69.14	73.08	85.05	85.29	85.53	100.00
Ejecutado	0.00	1.51	27.63	35.18	41.60	43.72						

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7840 Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.

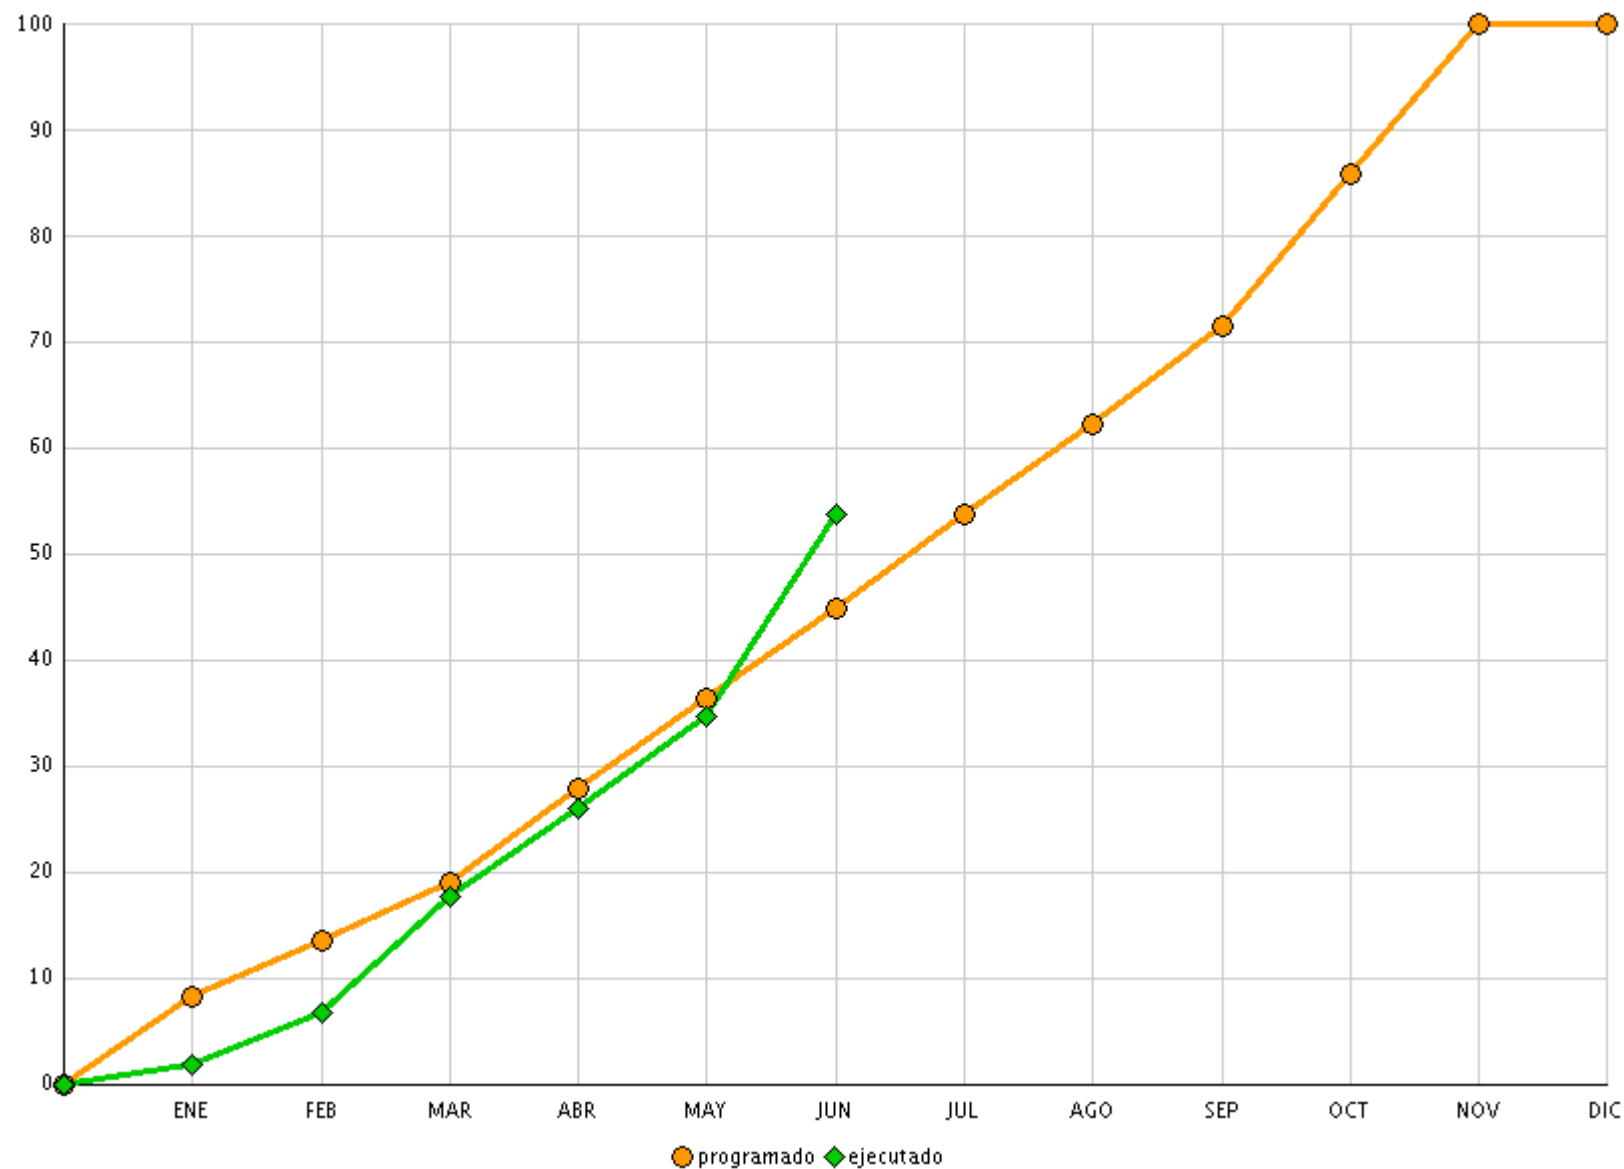


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.39	13.55	19.06	27.98	36.47	44.98	53.73	62.33	71.44	85.84	100.00	100.00
Ejecutado	1.80	6.81	17.67	26.09	34.70	53.80						

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7841 Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

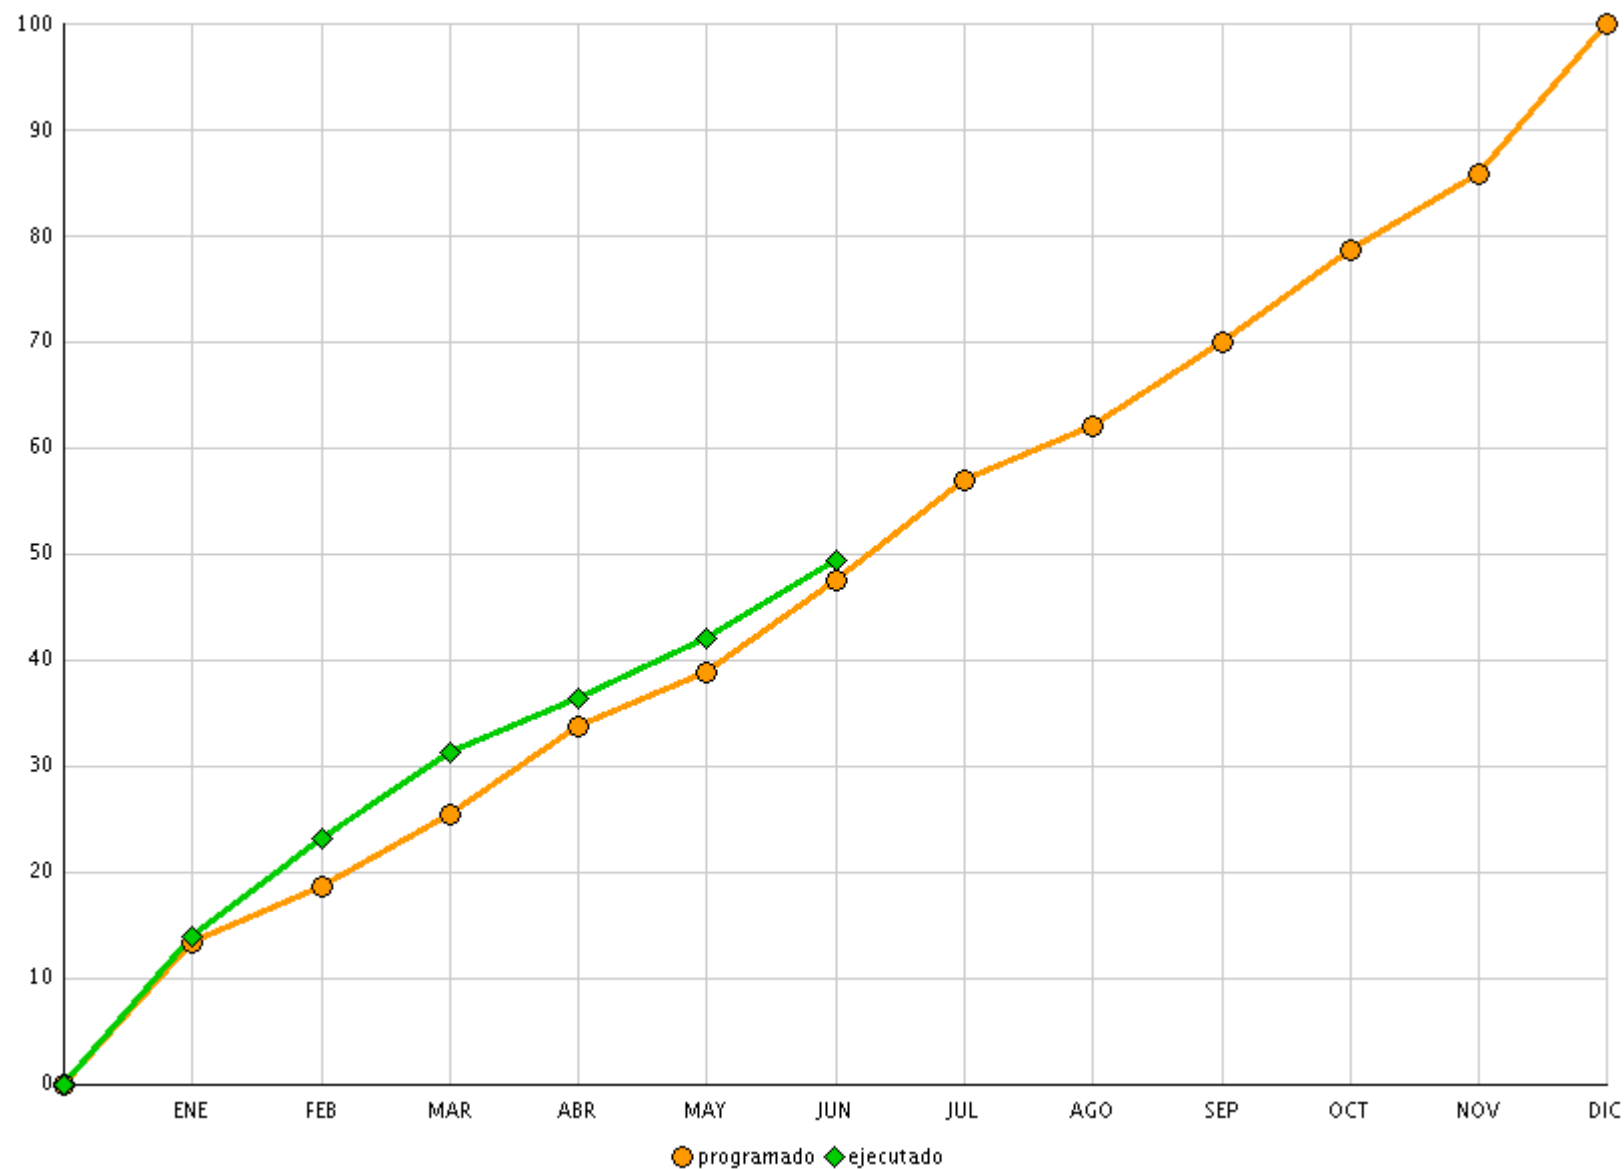

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	13.43	18.77	25.49	33.83	38.86	47.46	56.94	62.07	69.97	78.60	85.94	100.00
Ejecutado	14.02	23.13	31.28	36.38	42.14	49.35						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7775 23 Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORAR PROPUESTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TERRITORIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2.	ELABORAR Y FIRMAR EL CONVENIO O CONTRATO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE TRABAJO DE LOS PROCESOS NUEVOS O EN DESARROLLO	55.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	22.00
4.	GESTIONAR Y ENTREGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE TRABAJO	35.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	17.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									39.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

7839 25 Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A ACTUALIZAR	10.00	25.00	0.00	25.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
2. FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE COMPROMISO DE LAS CAPAS DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.11	0.00	0.00	55.00	0.27	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.38	0.04
3. VERIFICAR Y APROBAR LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE LOS DATOS Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS CAPAS DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	20.00	0.11	0.00	0.05	30.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		20.00		100.00	0.24	0.05
4. PUBLICAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LA LICENCIA DE USO OTORGADA POR LA ENTIDAD.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	10.00	0.11	0.00	0.05	30.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	0.24	0.02
5. REVISAR LOS ANTECEDENTES Y ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE ANALÍTICA DE DATOS	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	25.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	23.00
6. DISEÑAR CASOS DE USO APLICADOS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	10.00	0.00	20.00	60.00	21.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	71.00	6.39
7. IMPLEMENTAR CASOS DE USO APLICADOS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
8. DISEÑAR ESTRATEGIA CENTRADA EN EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.	3.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	30.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
9. IMPLEMENTAR ESTRATEGIA CENTRADA EN EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		30.00		100.00	40.00	1.20
10. .MONITOREAR LAS PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	3.00	8.00	0.07	8.00	0.08	9.00	0.13	8.00	0.07	8.00	0.09	9.00	0.07	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	0.51	0.02
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		43.72		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7840 21 Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN FÍSICA Y GEOGRÁFICA DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO CAPITAL.	24.00	25.16	4.15	7.64	6.07	3.58	8.05	5.02	10.84	5.97	12.15	8.37	15.51	8.76		7.97		7.18		13.76		6.59		0.00		100.00	56.77	13.62
2.	REALIZAR LA ACTULIZACIÓN JURÍDICA DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO CAPITAL.	24.00	5.00	0.00	6.15	0.22	6.15	14.41	10.00	1.21	10.00	5.35	10.00	50.06	10.00		10.00		10.00		11.15		11.55		0.00		100.00	71.25	17.10
3.	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO CAPITAL	24.00	0.00	0.00	2.94	2.22	6.98	6.50	15.06	12.22	7.08	4.44	4.41	0.56	5.80		5.16		8.08		22.78		21.71		0.00		100.00	25.94	6.23
4.	REALIZAR LA CONSERVACION CATASTRAL DEL COMPONENTE FÍSICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO (ATENCIÓN MINIMA DE 12.200 RADICACIONES)	23.00	5.00	3.48	5.00	12.93	5.00	13.13	5.00	8.91	10.00	12.69	10.00	11.76	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	62.90	14.47
5.	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN FÍSICA, GEOGRÁFICA , JURÍDICA Y ECONÓMICA DE LOS PREDIOS RURALES EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EXCLUYENDO SUMAPAZ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	17.82	11.00	10.91	13.00	8.40	15.00	10.60	11.00		15.00		15.00		13.00		0.00		0.00		100.00	47.73	2.39
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		53.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7841 24 Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	12.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.00
2.	APROVISIONAR Y GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UAED PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI	20.00	0.00	0.00	9.00	37.00	9.00	0.00	9.00	0.50	9.00	12.50	9.00	0.50	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	50.50	10.10
3.	EJECUTAR LAS FASES Y ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UAED, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEFINIDAS.	20.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	17.40	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	44.40	8.88
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN Y REPORTE DE MIPG TRIMESTRAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		100.00	33.00	3.30
5.	DISEÑAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	31.80	0.00		0.00		22.19		0.00		0.00		34.00		100.00	44.78	5.37
6.	FORMULAR EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE MIPG 2023	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		70.00		100.00	0.00	0.00
7.	REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS CIUDADANOS PARA ESTUDIO Y RESPUESTA SEGÚN CAPACIDAD OPERATIVA	4.00	8.33	8.22	8.33	8.22	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		8.33		100.00	49.78	1.99
8.	EMITIR RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL USUARIO SEGÚN CAPACIDAD OPERATIVA	10.00	8.33	8.22	8.33	8.22	8.34	8.34	8.33	8.28	8.33	8.27	8.34	8.22	8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		8.33		100.00	49.55	4.96
9.	EJECUTAR LAS FASES Y ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UAED, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEFINIDAS.	2.00	35.00	35.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		0.00		100.00	75.00	1.50
10.	REALIZAR LAS GESTIONES DE PROMOCIÓN Y COTIZACIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PARA DETECTAR POSIBLES CLIENTES	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.20
11.	REALIZAR ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y FIRMA DE CONTRATO	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		0.00		20.00		20.00		30.00		20.00		100.00	10.00	0.05
12.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO, FACTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		8.33		100.00	50.00	1.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										49.35

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

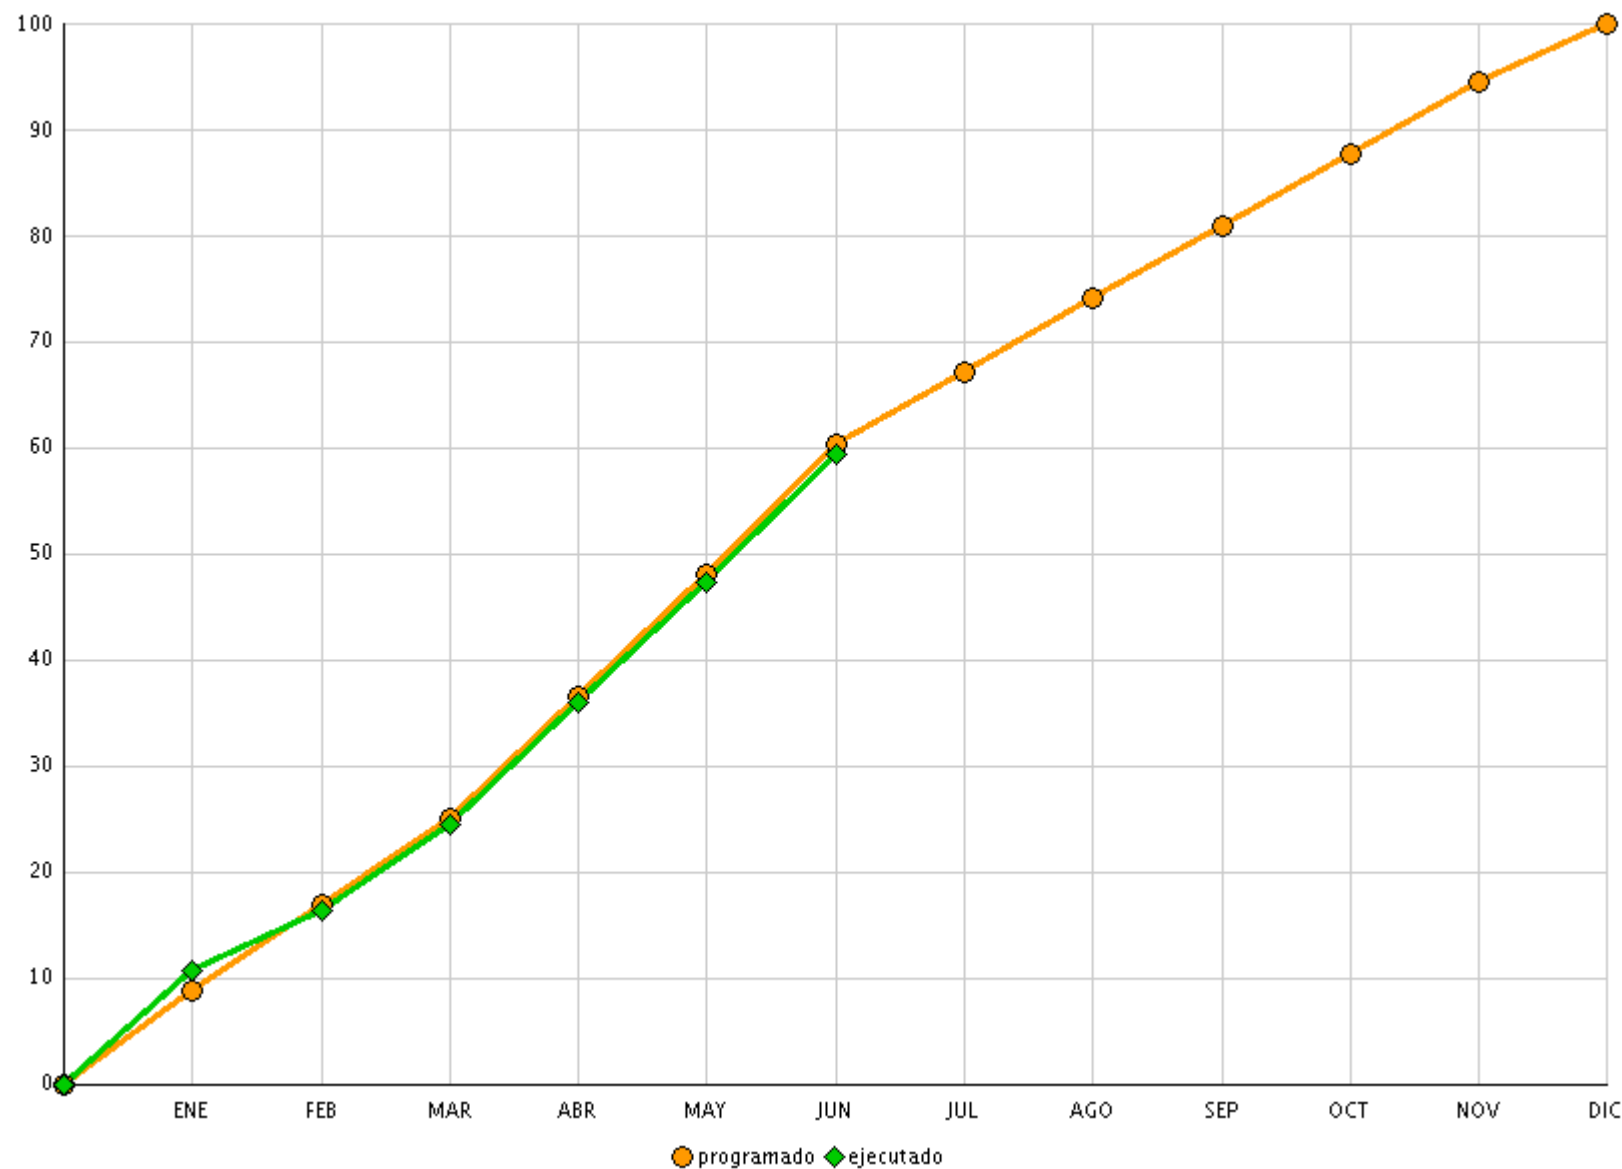


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.90	17.00	25.10	36.60	48.20	60.30	67.20	74.10	80.90	87.70	94.50	100.00
Ejecutado	10.70	16.40	24.50	36.00	47.30	59.40						

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7859 Fortalecimiento Institucional

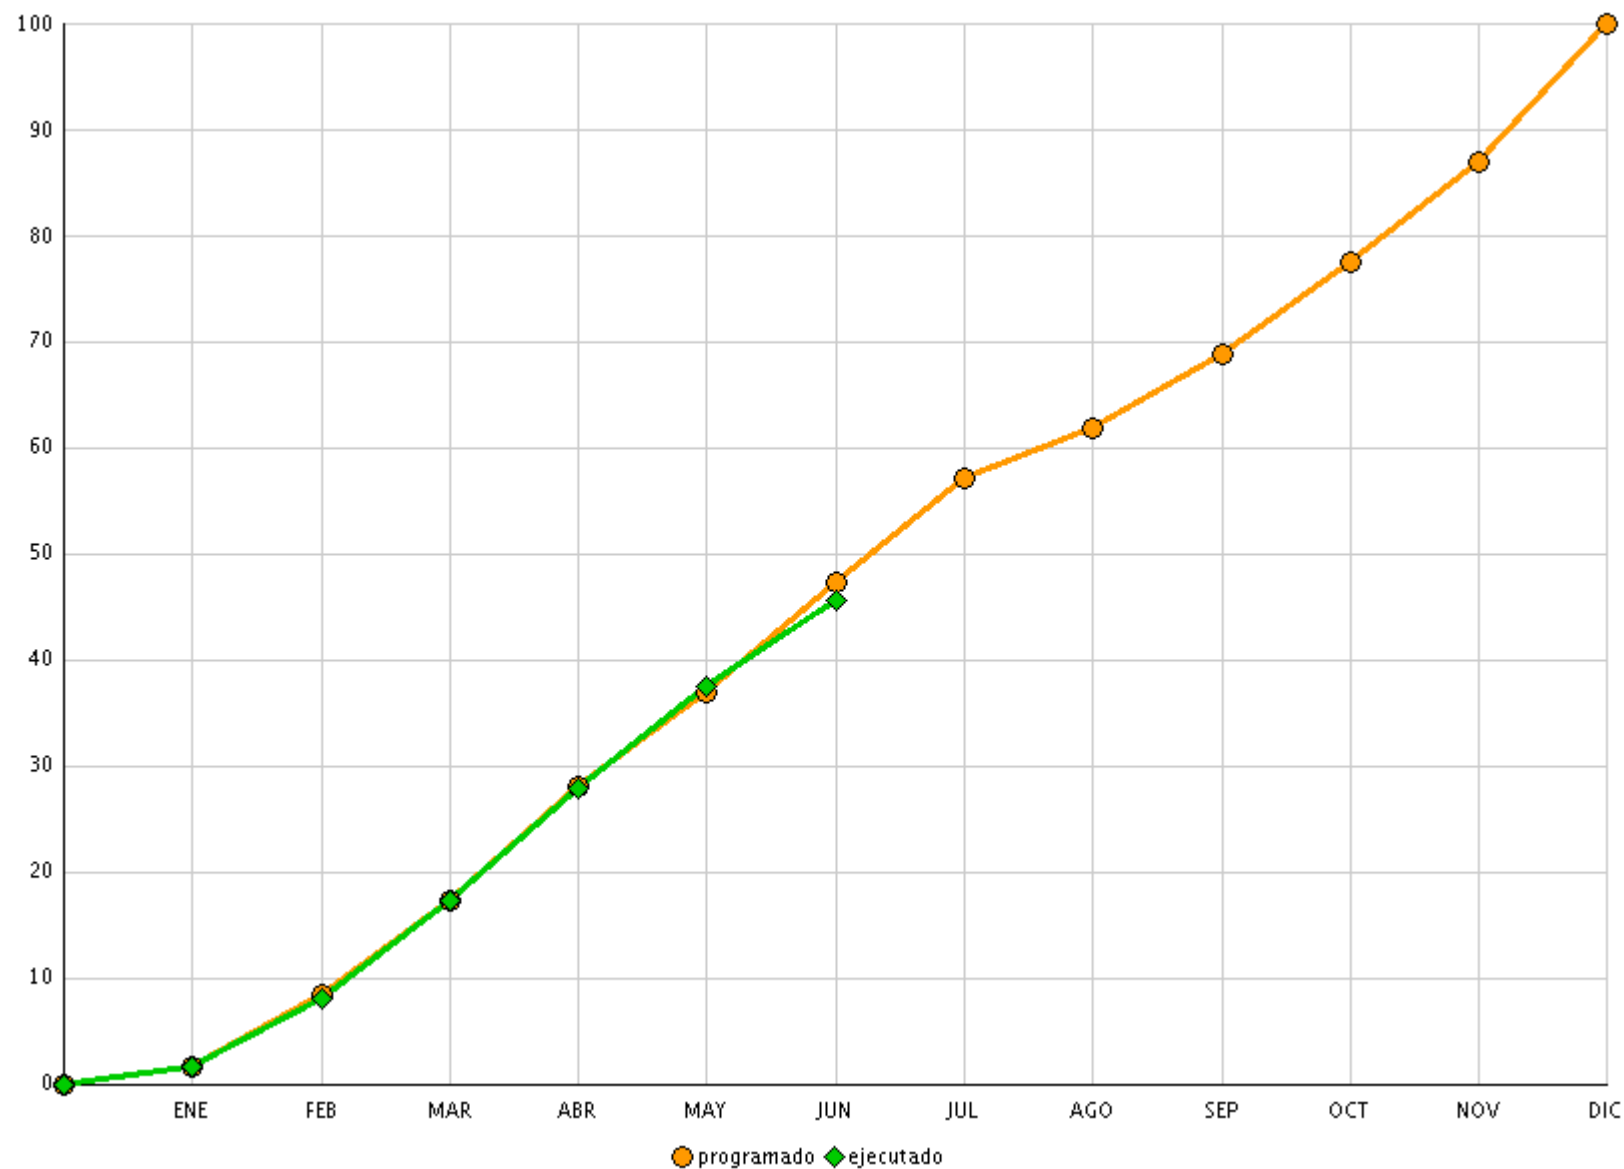


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.65	8.47	17.41	28.13	36.93	47.39	57.21	61.95	68.79	77.54	86.98	100.00
Ejecutado	1.65	8.11	17.31	27.92	37.50	45.74						

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

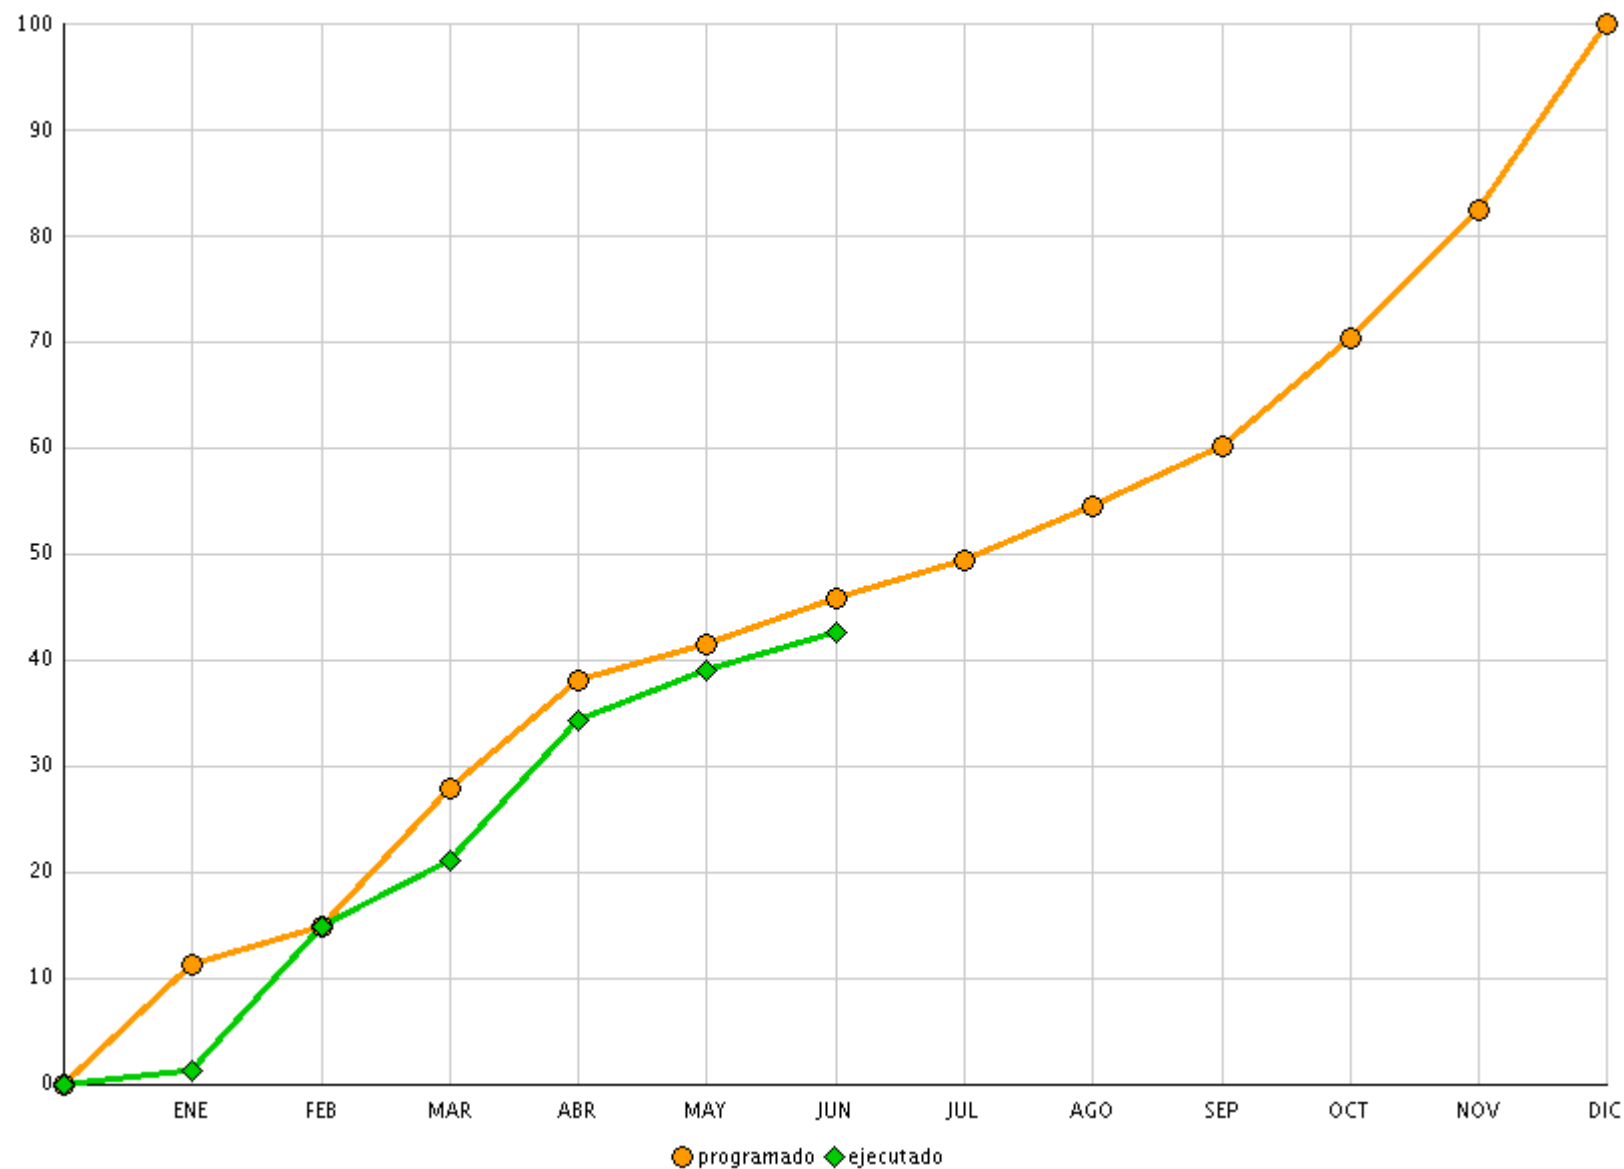


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	11.22	14.95	28.00	38.15	41.52	45.83	49.48	54.47	60.14	70.46	82.45	100.00
Ejecutado	1.32	14.95	21.06	34.27	39.00	42.63						

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7903 Apoyo a la adecuación y conservación del espacio publico de Bogota

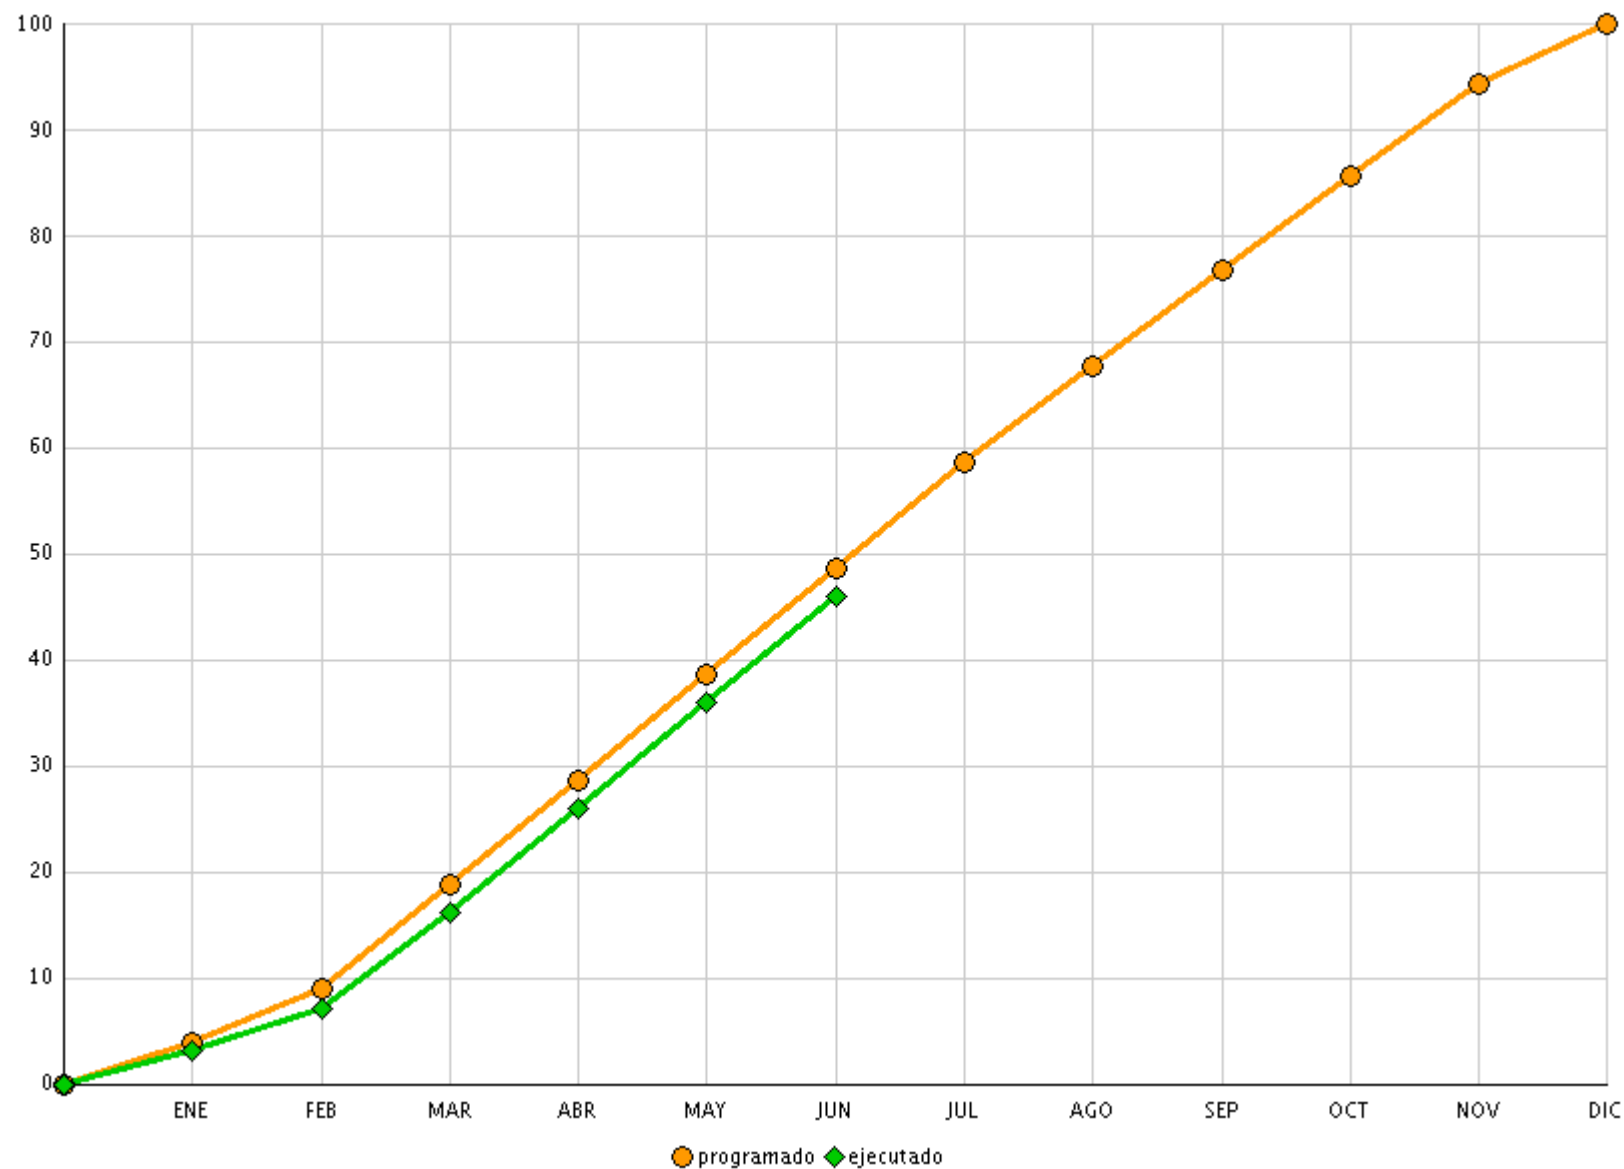

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.00	9.00	18.80	28.60	38.60	48.60	58.60	67.80	76.80	85.60	94.40	100.00
Ejecutado	3.20	7.20	16.20	26.00	36.00	46.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7858 24 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	25.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
2. PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.00	5.00	5.00	9.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	46.00	13.80
3. INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL	30.00	15.00	21.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		100.00	56.00	16.80
4. GESTIÓN AMBIENTAL, PROMOCIÓN Y CULTURA CIUDADANA	10.00	5.00	5.00	9.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	46.00	4.60
5. GESTIÓN DE LABORATORIO	10.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	42.00	4.20
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		59.40		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7859 22 Fortalecimiento Institucional

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENCIÓN A GRUPOS DE VALOR	14.00	1.00	1.00	5.50	5.50	12.00	12.00	27.00	27.00	7.00	7.50	9.50	9.00	6.00		4.50		1.50		14.50		0.50		11.00		100.00	62.00	8.68
2. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA	19.00	2.51	2.50	10.50	10.40	2.51	2.40	10.49	10.35	2.51	2.40	13.00	12.90	2.51		10.45		2.51		10.49		30.00		2.52		100.00	40.95	7.78
3. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	18.75	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	43.75	3.06
4. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	7.00	0.96	0.96	9.96	0.96	9.36	13.36	9.96	9.96	0.96	0.00	14.56	13.60	9.96		0.96		14.56		9.96		9.60		9.20		100.00	38.84	2.72
5. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44	5.54	0.00	0.00	5.44	5.44	0.00	0.00	38.78		0.00		5.78		0.00		5.78		38.78		100.00	10.98	0.88
6. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS	5.00	2.50	2.50	9.90	16.60	30.00	30.00	3.50	2.50	21.60	11.60	0.00	0.00	3.50		0.00		9.00		10.00		10.00		0.00		100.00	63.20	3.16
7. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13.00	2.00	2.00	7.00	7.00	6.75	6.75	6.50	6.50	31.50	31.50	6.75	6.75	6.50		6.50		6.75		6.50		6.50		6.75		100.00	60.50	7.87
8. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	5.00	2.00	2.00	12.45	11.45	14.40	14.40	12.30	12.30	9.95	9.95	13.50	13.50	10.50		9.00		6.00		4.50		1.95		3.45		100.00	63.60	3.18
9. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	16.25	0.00	0.00	7.50	7.50	23.75		0.00		2.50		16.25		0.00		33.75		100.00	23.75	1.90
10. REDISEÑO INSTITUCIONAL	2.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	12.00	10.00	16.00	16.00	0.00	0.00	21.00		0.00		0.00		27.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
11. INTERVENCIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		16.00		0.00		16.00		30.00		100.00	38.00	1.14
12. DISPOSICIÓN DE UNA SEDE PARA EL PROCESO OPERATIVO Y LOGÍSTICO DE LA UAERMV	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	0.96
13. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA UAERMV	3.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		9.50		4.50		4.50		4.50		4.50		100.00	60.50	1.82
14. GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	40.00	1.60

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 45.74

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7860 19 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. AUMENTAR EN 50 PUNTOS PORCENTUALES EL NIVEL DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UAERMV.	33.00	4.00	4.00	1.00	1.00	21.00	1.00	5.00	5.00	3.00	3.00	1.00	1.00	9.00		11.00		11.00		7.00		5.00		22.00		100.00	15.00	4.95
2. REALIZAR 4 ACTUALIZACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI DE LA UAERMV	33.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		15.00		20.00		25.00		100.00	40.00	13.20
3. IMPLEMENTAR 50 FUNCIONALIDADES EN CINCO (5) DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UAERMV.	34.00	0.00	0.00	10.00	10.00	18.00	17.00	25.00	34.00	7.00	11.00	2.00	0.00	2.00		4.00		6.00		9.00		11.00		6.00		100.00	72.00	24.48
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		42.63		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7903 18 Apoyo a la adecuacion y conservacion del espacio publico de Bogota

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	20.00	4.00	0.00	5.00	0.00	9.00	5.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		9.00		8.00		8.00		8.00		100.00	34.00	6.80			
2. PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.00	4.00	4.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	49.00	14.70			
3. INTERVENCIÓN	40.00	4.00	4.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	49.00	19.60			
4. GESTIÓN AMBIENTAL	10.00	4.00	4.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	49.00	4.90			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.00	

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7569 Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

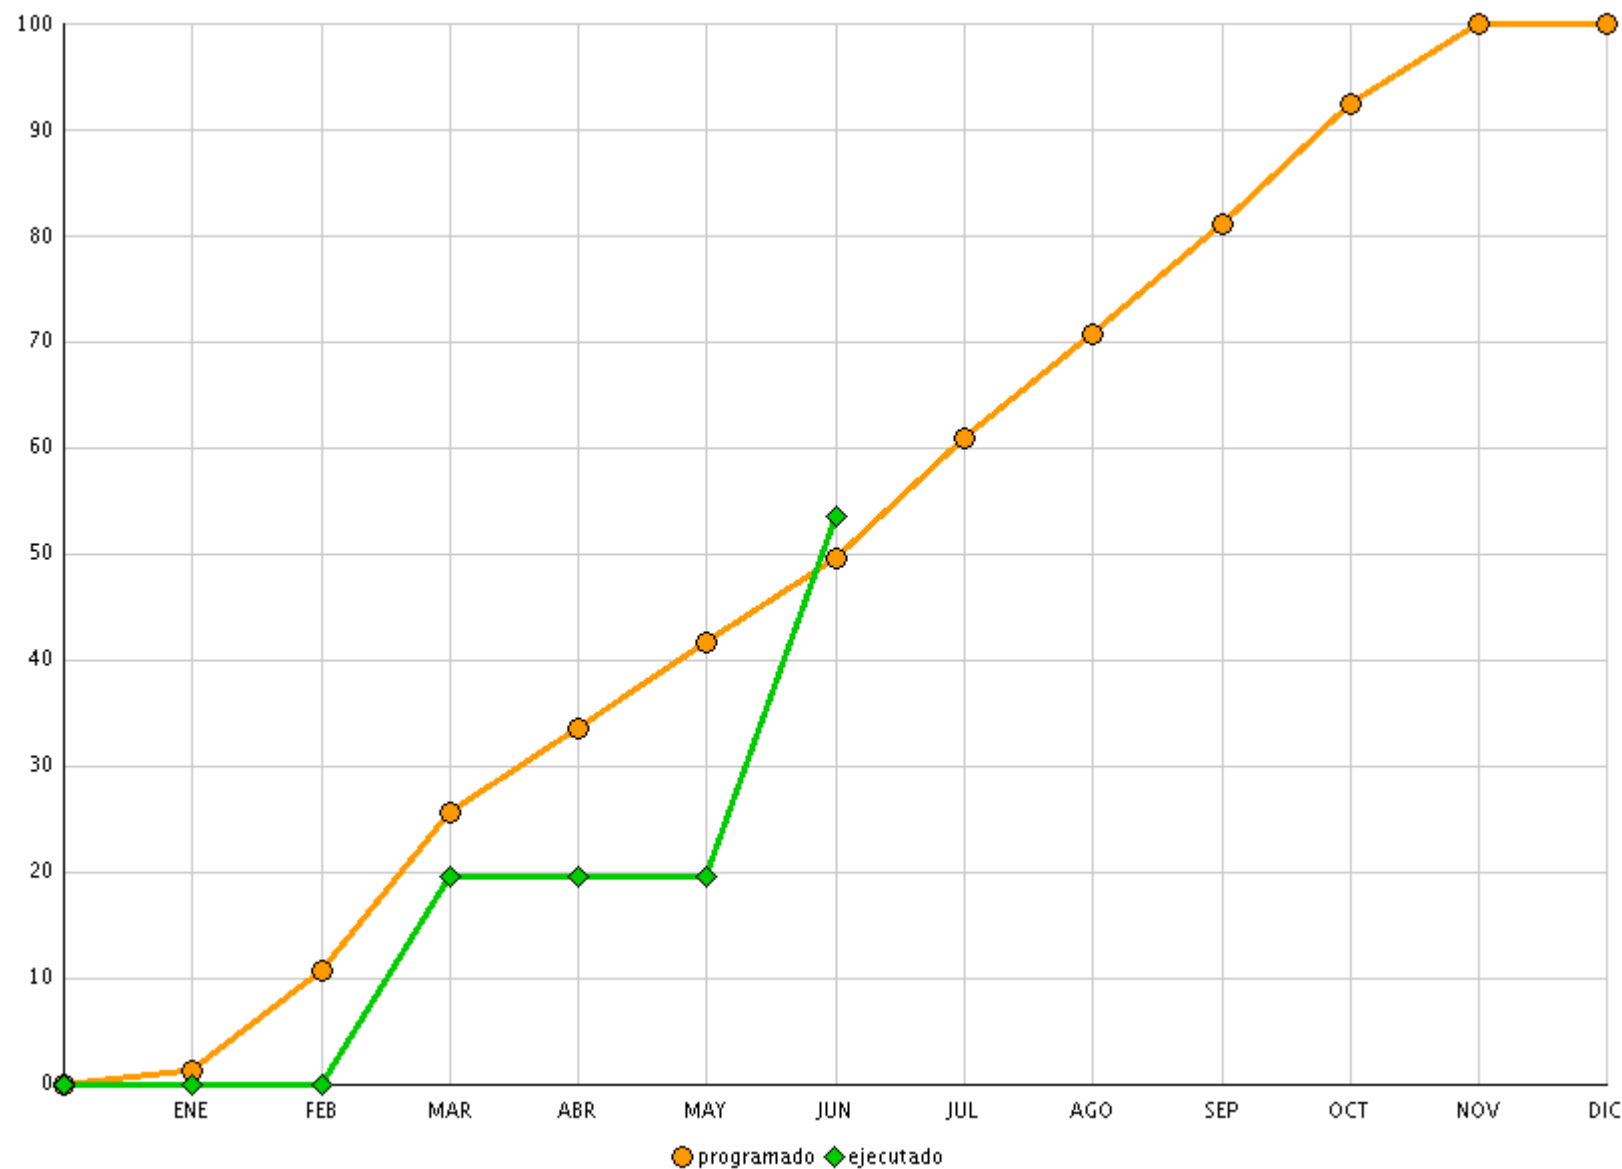


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.40	10.75	25.65	33.65	41.65	49.65	60.91	70.78	81.20	92.45	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	19.60	19.60	19.60	53.58						

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7628 Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá

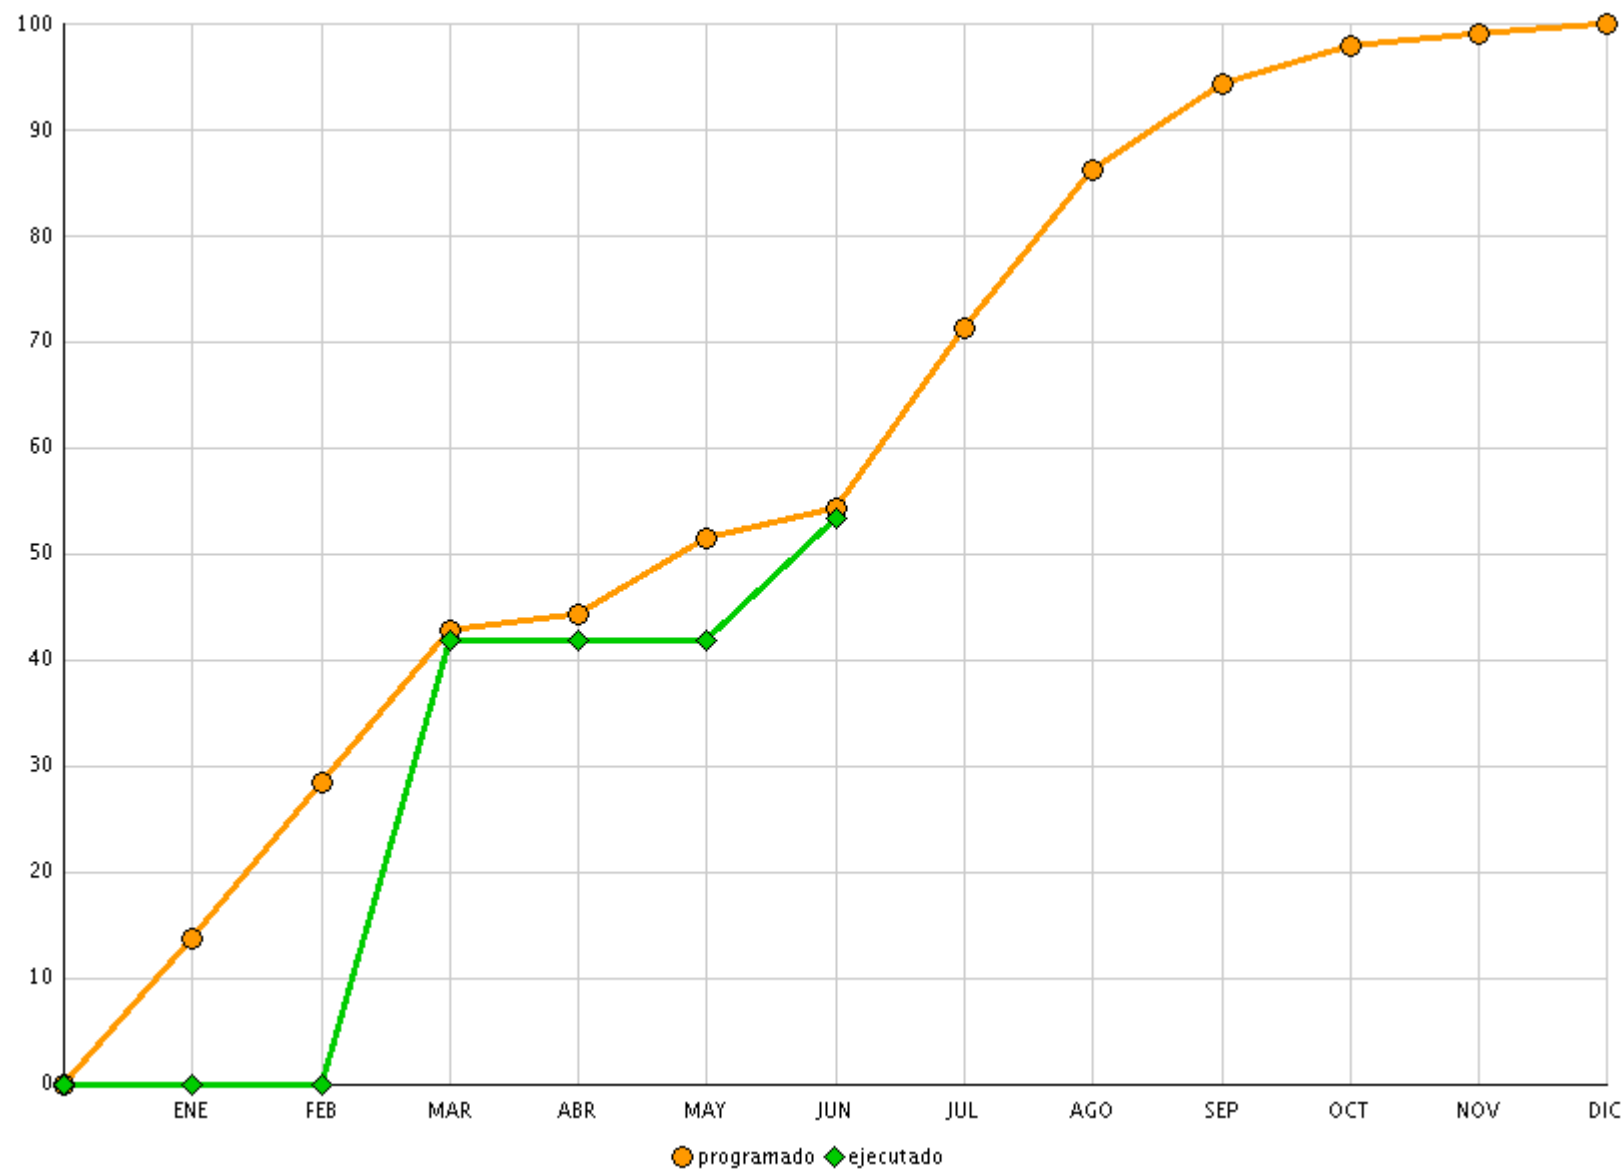


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	13.80	28.50	42.86	44.26	51.56	54.32	71.36	86.26	94.26	98.00	99.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	41.86	41.86	41.86	53.32						

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7644 Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá

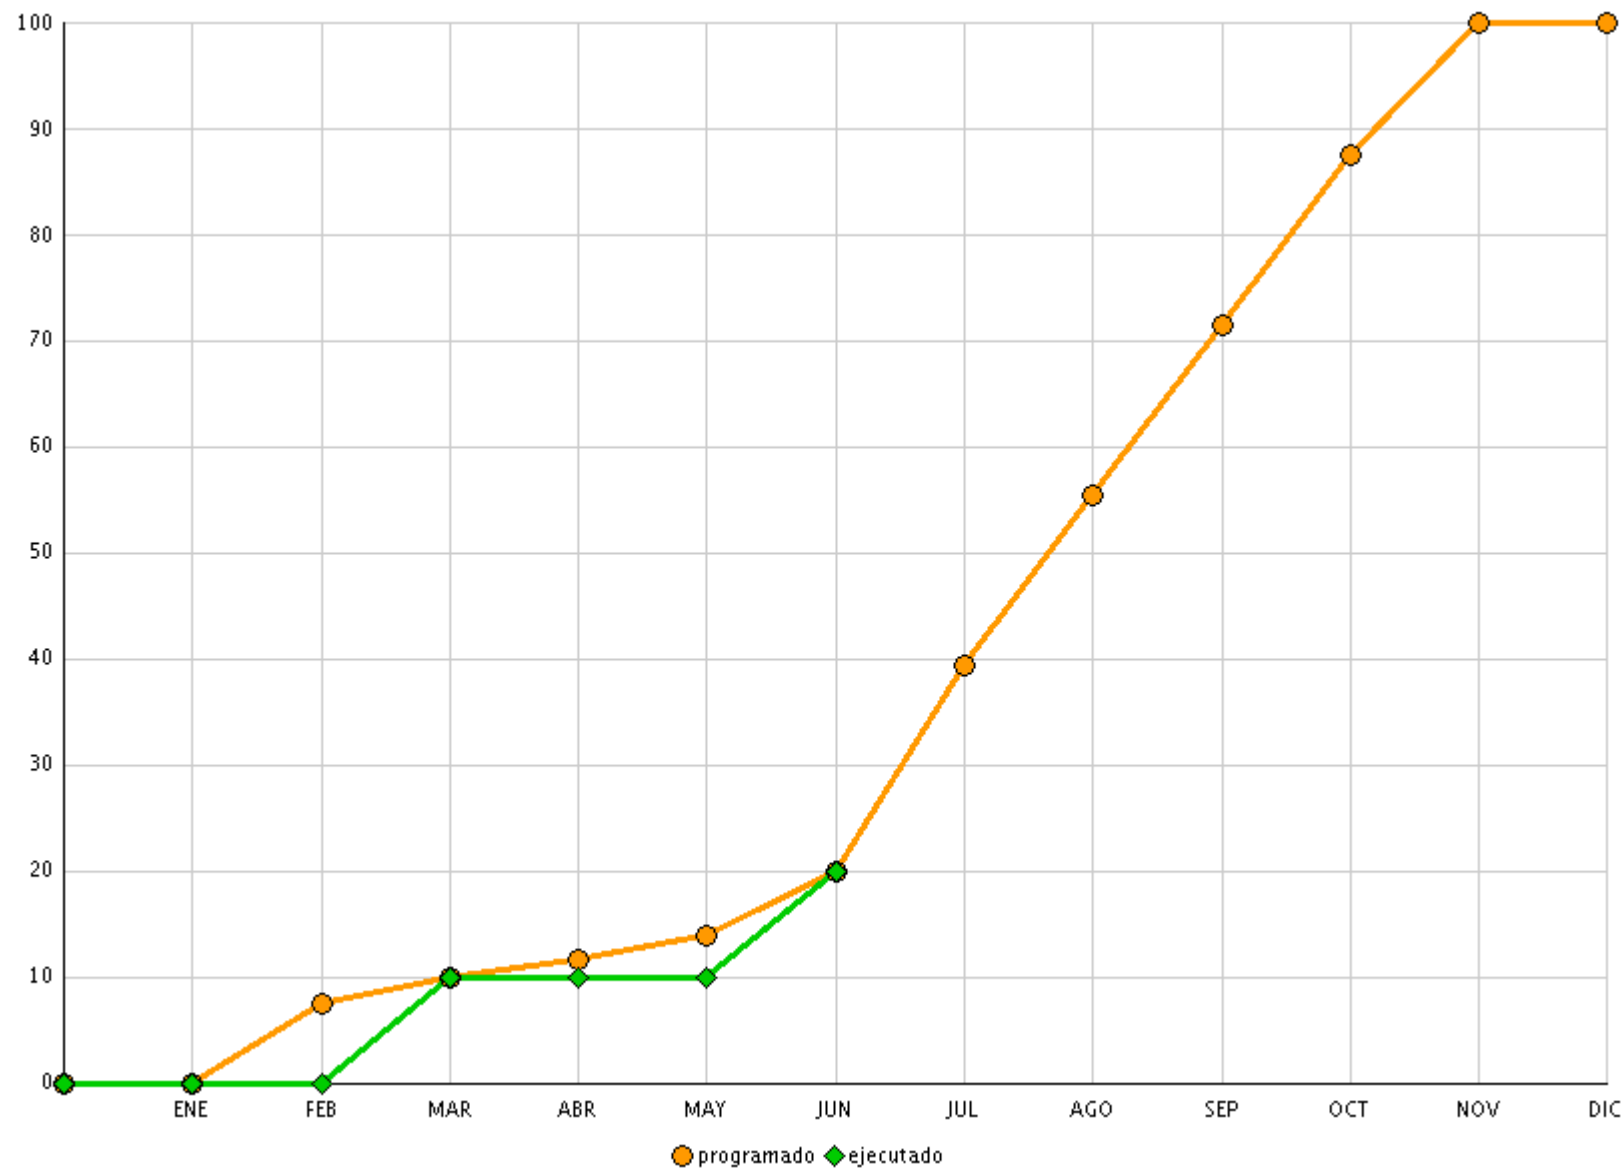


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	7.50	10.00	11.75	14.00	20.00	39.50	55.50	71.50	87.50	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00						

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7652 Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá

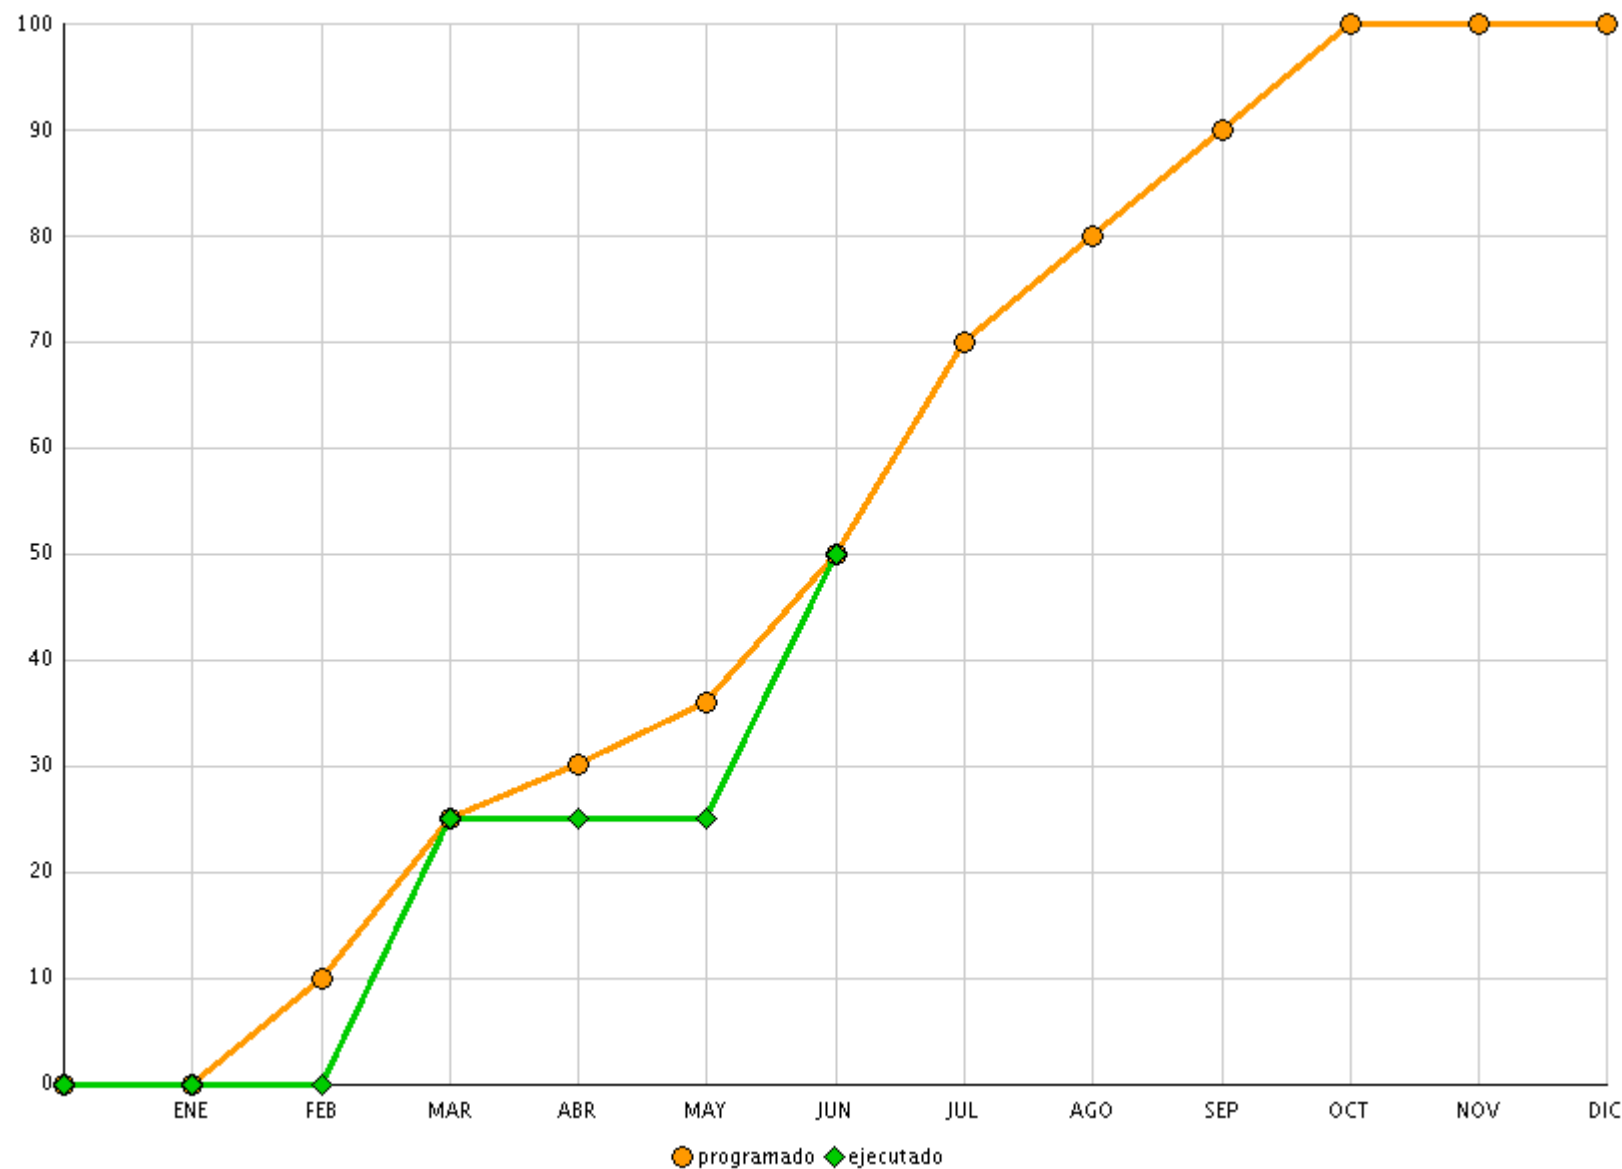


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.00	25.00	30.20	36.00	50.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7660 Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá

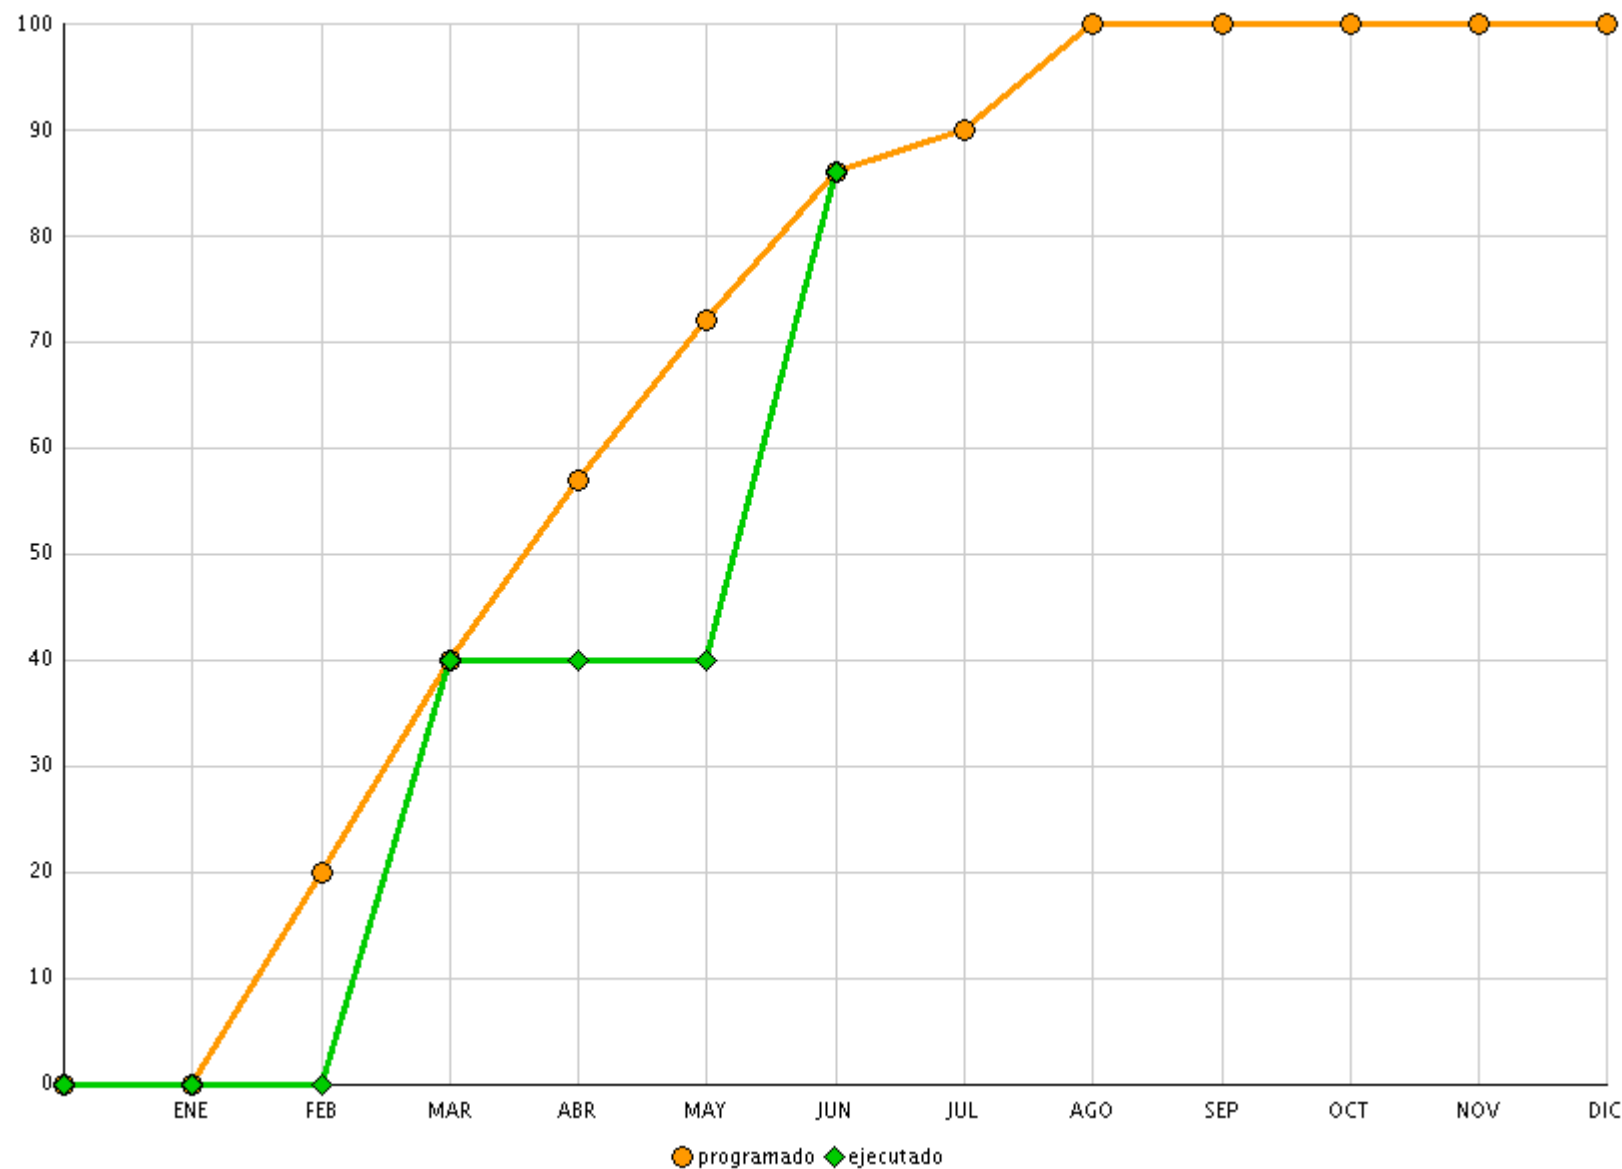

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	20.00	40.00	57.00	72.00	86.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	86.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7569 34 Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	SEPARAR Y TRATAR RPCC / PLANTAS DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	6.00		0.00		10.00		10.00		25.00		0.00		100.00	50.00	2.50
2.	HACER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TONELADAS EN LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS.	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	50.00	11.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	10.00
3.	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL PGIRS	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	11.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.50
4.	DESARROLLAR LA CONSULTORÍA DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	35.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	23.00	11.00		0.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	58.00	0.58
5.	ESTRUCTURAR MODELOS DE APROVECHAMIENTO PARA LA CIUDAD POR FLUJO DE ORGÁNICOS Y PLÁSTICOS ENTRE OTROS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	50.00	50.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.50
6.	PROPENDER LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO PERSONAL, TÉCNICO, EMPRESARIAL Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN RECICLADORA EN GENERAL EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	20.00		30.00		20.00		6.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.50
7.	CONTRIBUIR A LA FORMALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA REGISTRADAS EN RURO Y RUOR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	20.00		0.00		20.00		11.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.50
8.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y SOCIAL PARA FORTALECER LA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ECA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	20.00		20.00		11.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.50
9.	CONTRATAR EL TALENTO HUMANO MULTIDISCIPLINARIO PARA APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONCESIONADAS MEDIANTE ASE Y GESTIÓN DE HOSPITALARIOS	7.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	10.00		10.00		10.00		6.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.50
10.	EJECUTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A OBLIGACIONES DE HACER PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTANDAR DE CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.	13.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	11.00		10.00		10.00		20.00		0.00		0.00		100.00	50.00	6.50
11.	REMUNERAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO CUBIERTOS EN LA TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	8.00		13.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
12.	REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, A TRAVÉS DE UN MODELO ADECUACIÓN EN SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	50.00	30.00		20.00		20.00		6.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.50
13.	FORMULAR UNA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA	2.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	8.00		3.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
14.	IMPLEMENTACION DE UN MODELO EFICIENTE Y SOSTENIBLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	20.00		20.00		11.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.50
15.	IMPLEMENTAR LA PRIMERA FASE DEL MODELO DE APROVECHAMIENTO PARA LA CIUDAD	14.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	50.00	11.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	75.00	10.50
16.	CONTRIBUIR CON LA FORMALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS RECICLADORES Y LAS ORGANIZACIONES	4.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	11.00		10.00		10.00		20.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.00
17.	REALIZAR ACOMPNAMIENTO A LAS ECAS Y POBLACION RECICLADORA	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	11.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 53.58

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7628 34 Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. EJECUTAR UN ESTUDIO DE CARGAS ESTRUCTURALES Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SI ASÍ FUERE, SUBSANANDO LAS NECESIDADES QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00		
2. AUMENTAR LA CAPACIDAD EN LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, SUBSANANDO LAS NECESIDADES QUE COADYUVEN A FORTALECER Y MANTENER LA MISMA.	20.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.30	2.30	7.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00	20.00		30.00		30.00		8.70		0.00		0.00		100.00	11.30	2.26		
3. ESTABLECER E IMPLEMENTAR UN PATRÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE AUMENTEN EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD.	69.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	4.00	14.00	16.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	74.00	51.06		
4. REALIZAR MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPAMIENTOS DE LA UAESP	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		53.32	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

7644 29 Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS, OSARIOS Y CENIZARIOS EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	FORTALECER LA GESTIÓN PARA REALIZAR PROYECTOS DE REVITALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, DESARROLLO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN LOS CEMENTERIOS	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
3.	MEJORAR LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO EN LOS EQUIPAMIENTOS DEL DISTRITO	35.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5.00	25.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.00	25.00	20.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	50.00	17.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										20.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7652 25 Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL.	80.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.00	25.00	20.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	50.00	40.00
2. FORTALECER LA PLANEACIÓN, LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL, PARA SU MODERNIZACIÓN	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	6.00	0.00	9.00	0.00	10.00	25.00	20.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		50.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

7660 37 Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad


INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022		AVANCE A: 30/06/2022																											
ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. OTORGAR SUBVENCIONES O AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL DISTRITO	*****	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	17.00	0.00	15.00	0.00	14.00	46.00	4.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	86.00	86.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								86.00	

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

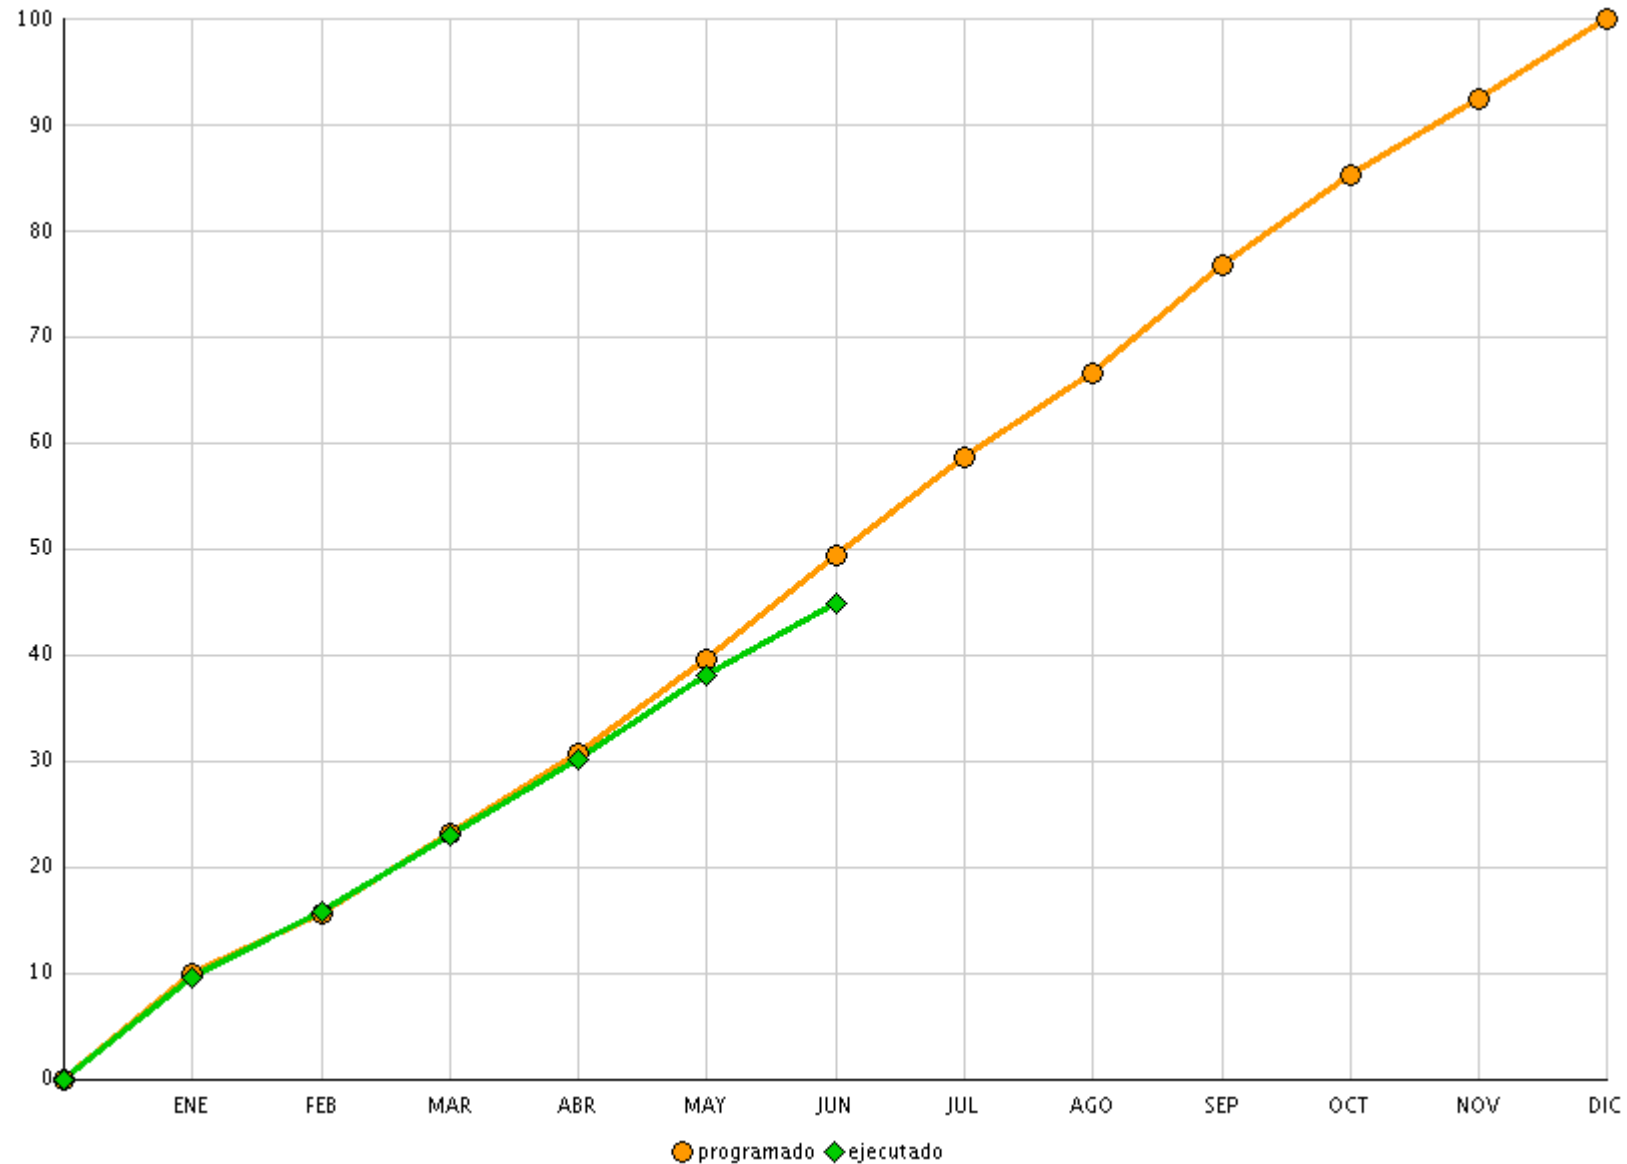


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.91	15.67	23.18	30.73	39.71	49.51	58.66	66.60	76.73	85.25	92.55	100.00
Ejecutado	9.63	15.92	23.06	30.12	38.20	44.97						

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7551 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

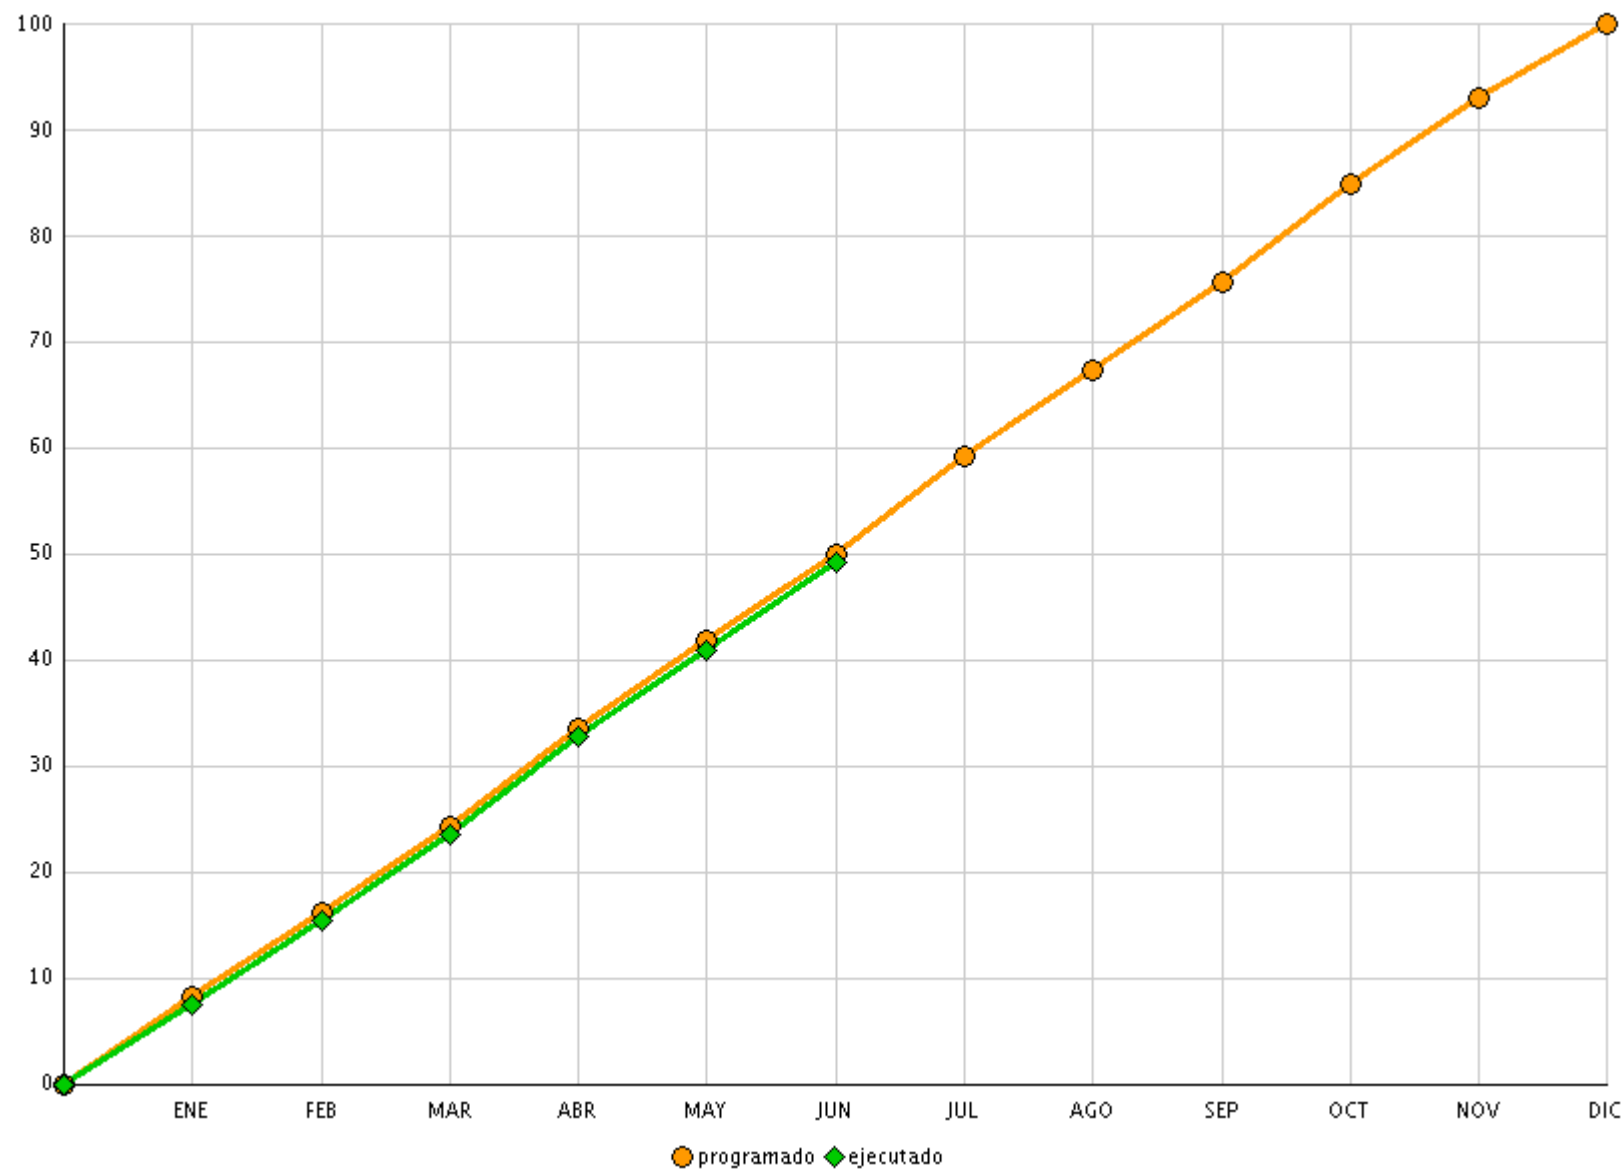


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.38	16.26	24.40	33.63	41.83	50.03	59.24	67.44	75.64	84.85	93.05	100.00
Ejecutado	7.52	15.41	23.54	32.77	40.97	49.17						

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

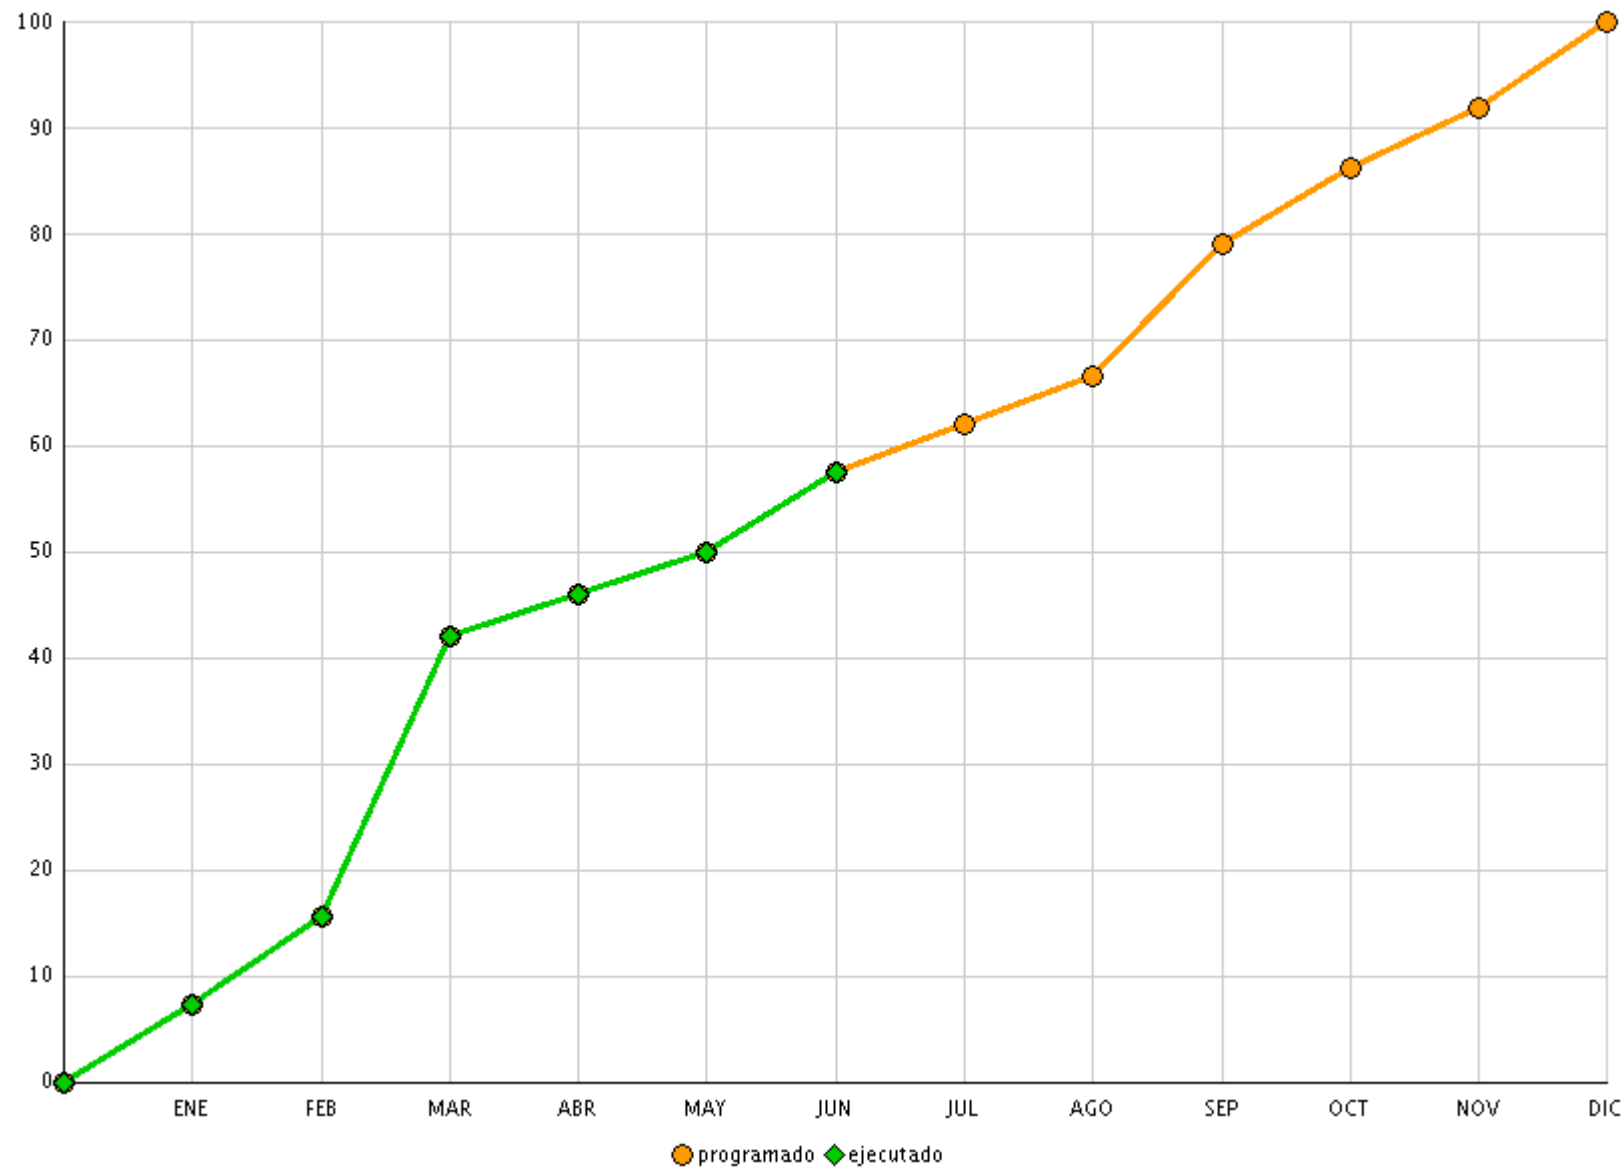


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.35	15.60	42.06	46.12	50.02	57.52	62.10	66.60	79.10	86.18	91.92	100.00
Ejecutado	7.35	15.60	42.06	46.12	50.02	57.52						

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7556 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

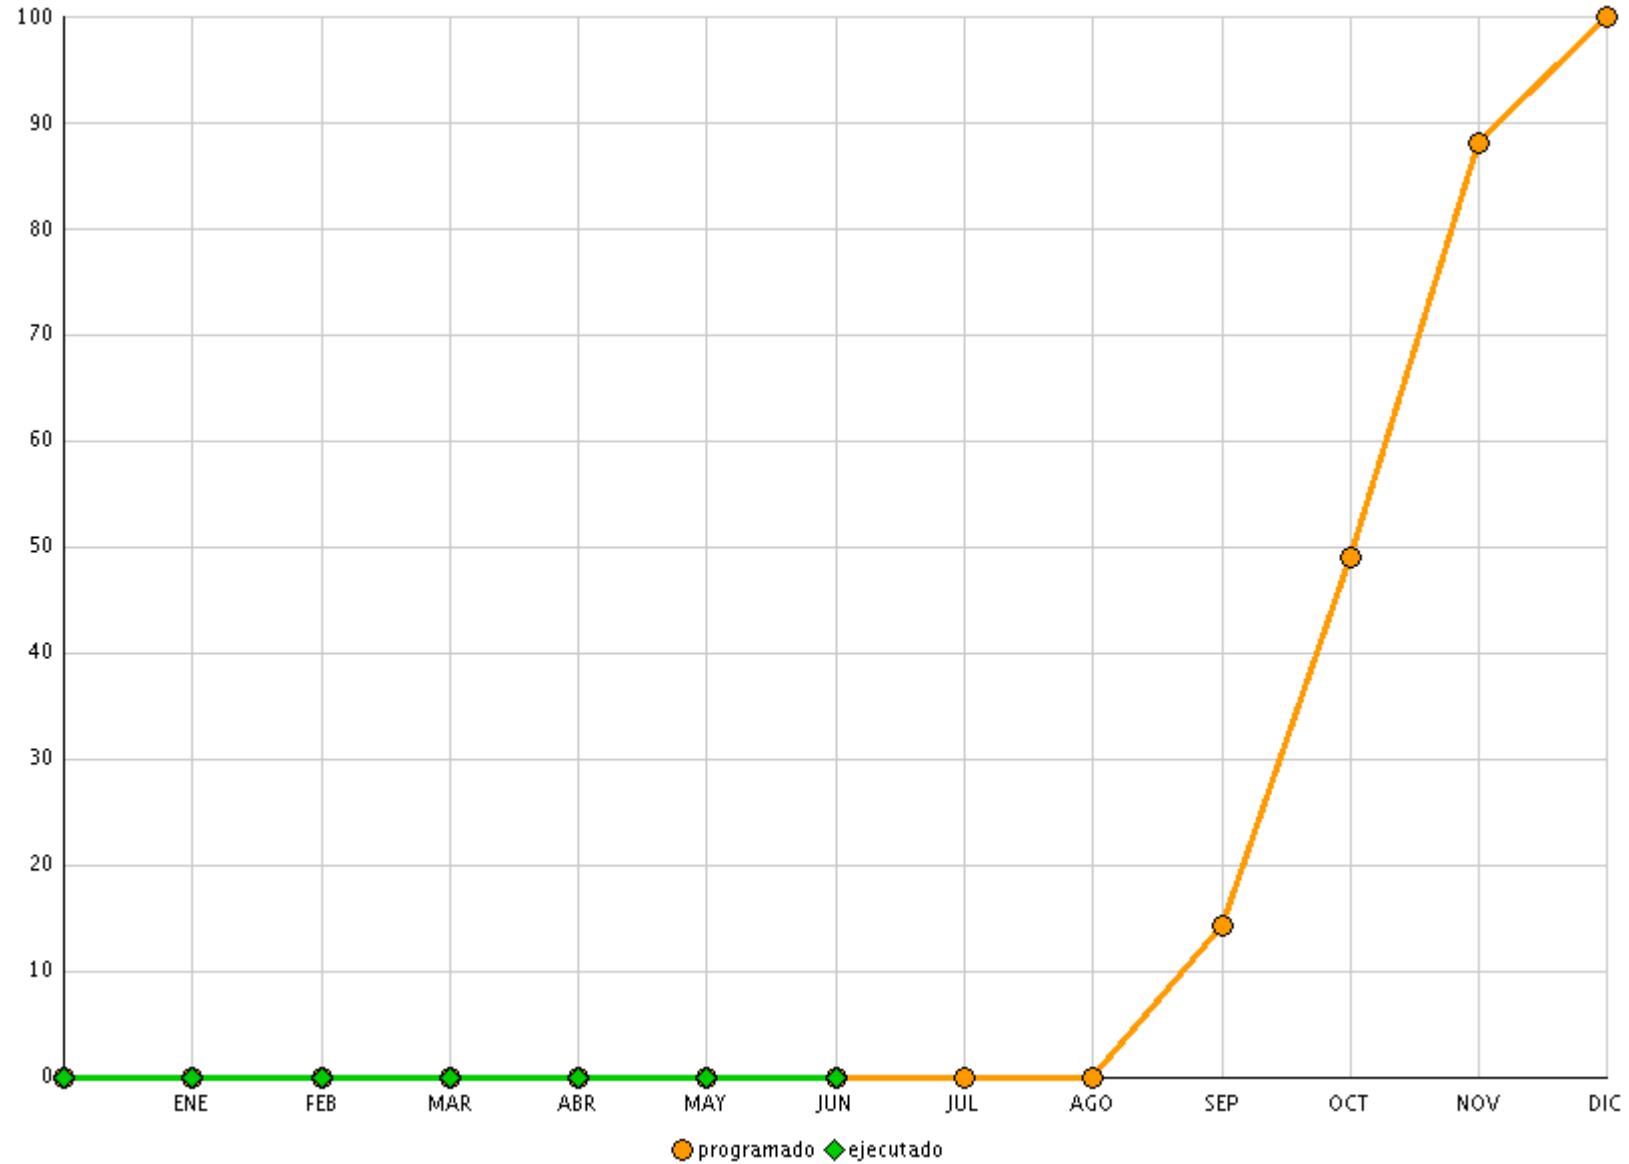


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	49.14	88.07	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

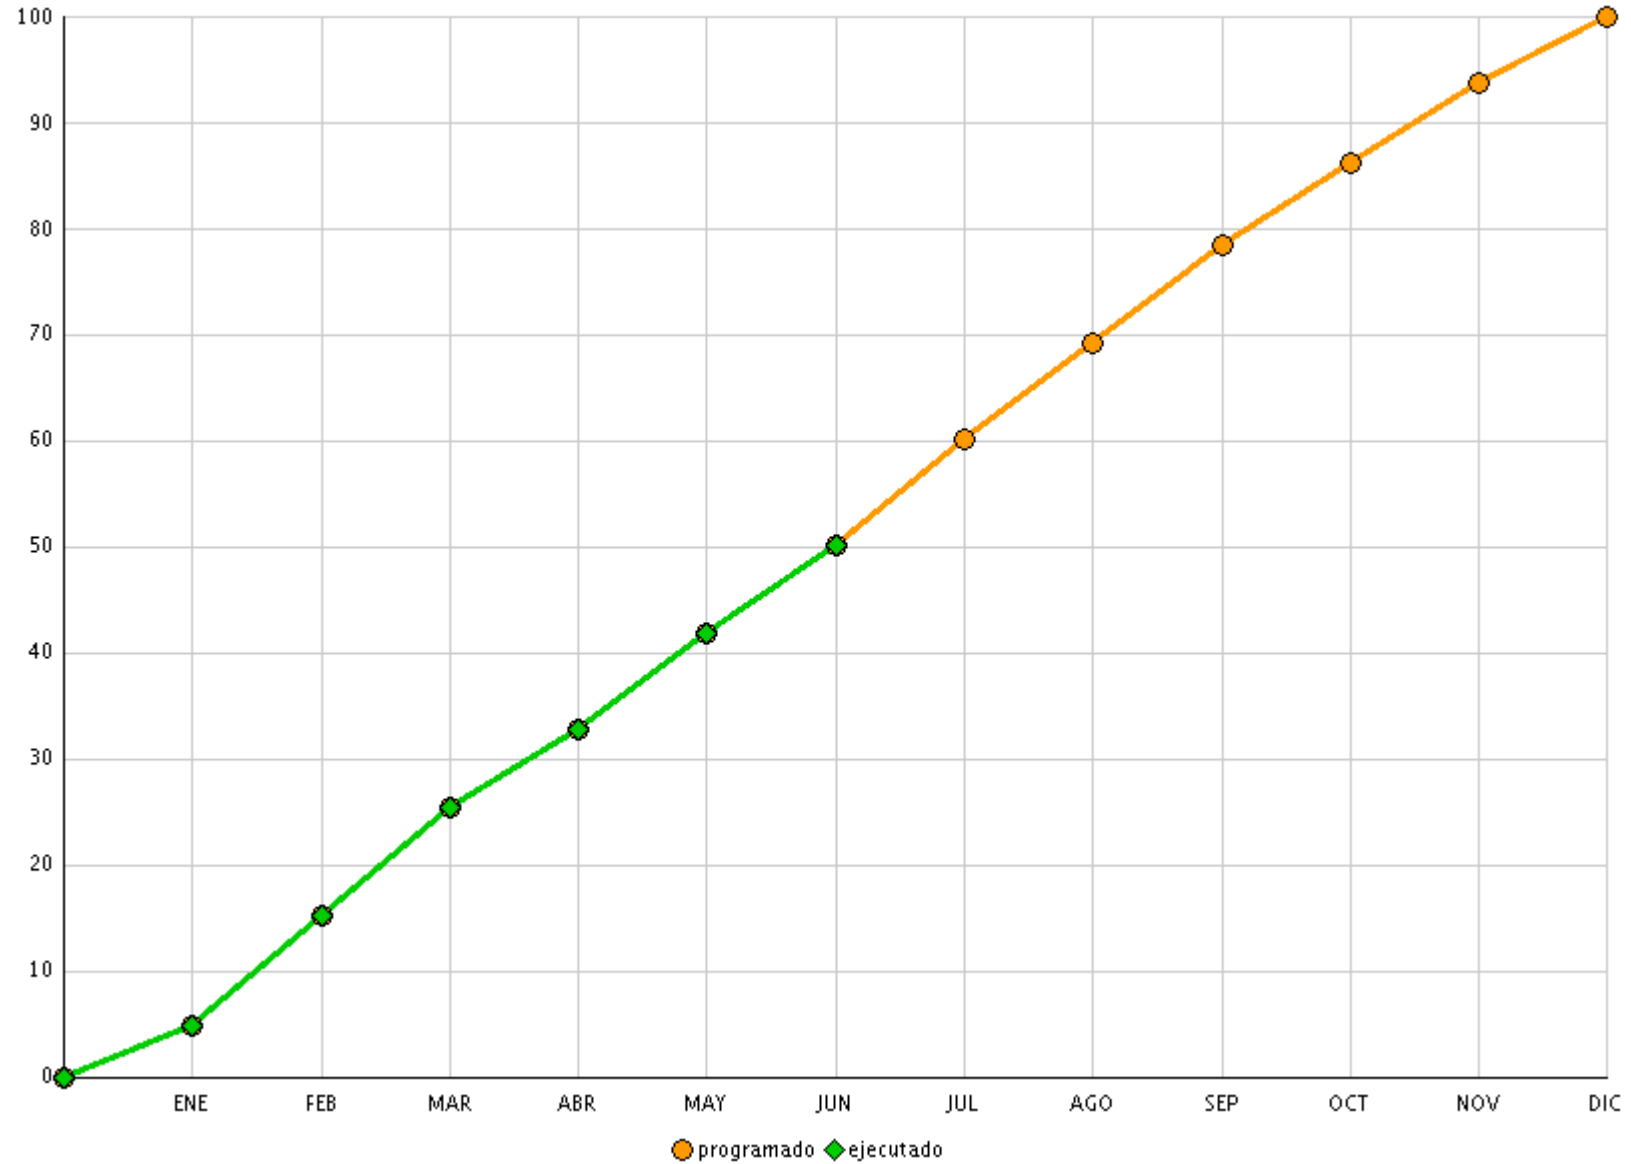

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.98	15.21	25.46	32.90	41.93	50.12	60.11	69.32	78.52	86.21	93.76	100.00
Ejecutado	4.98	15.21	25.46	32.90	41.93	50.12						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7550 21 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CULMINAR EL DOCUMENTO DE ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL.	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	0.00	30.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	2.35
2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REDISEÑO.	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	26.36	0.00	8.24		8.86		26.44		8.30		9.00		8.72		100.00	4.08	0.34
3. GESTIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA	5.60	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	2.80
4. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES DEL IDPYBA	2.80	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	1.40
5. CREAR CONTENIDO AUDIOVISUAL LLAMATIVO PARA LOS PÚBLICOS OBJETIVOS	4.20	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	2.10
6. GESTIONAR Y CREAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA	1.40	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.70
7. REALIZAR REPORTES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL DISTRITO Y LA NACIÓN	9.80	10.80	10.80	7.30	8.50	7.30	7.30	10.80	10.80	7.30	7.30	7.30	7.30	10.80		7.30		7.30		10.80		6.50		6.50		100.00	52.00	5.10
8. ELABORAR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		30.00		10.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. FORMULACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS DEL INSTITUTO	1.40	14.50	14.50	4.00	4.00	5.00	5.00	16.50	16.50	4.00	4.00	5.00	5.00	16.50		4.00		5.00		16.50		4.00		5.00		100.00	49.00	0.69
10. ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL Y CAUSAS CIUDADANAS EN LA TEMÁTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	0.70	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	28.00	28.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.50		5.00		5.00		21.50		9.00		6.00		100.00	36.00	0.25
11. FORMULACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 2023	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		40.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG-FURAG	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	7.14	7.14	7.14		7.14		7.14		7.14		7.14		7.16		100.00	32.14	0.90
13. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.80	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00		0.00		16.66		0.00		0.00		0.00		100.00	83.34	2.33
14. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO	2.80	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00		0.00		16.66		0.00		0.00		0.00		100.00	83.34	2.33
15. ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS	2.80	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	50.00	1.40
16. REALIZAR REPORTES POR PARTE DE PLANEACIÓN EN LOS DIFERENTES APLICATIVOS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL	2.80	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	1.40
17. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL INSTITUTO	1.20	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.60
18. ELABORAR LOS CONCEPTOS JURIDICOS CON ACTUACION NORMATIVOS	1.20	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.60
19. ADELANTAR LAS ACTUACIONES PROCESALES EN ASUNTOS PENALES	1.20	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.60
20. BRINDAR ASESORIAS JIURIDICAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN JURÍDICA	1.20	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7550 21 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
21. DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MATERIA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL	3.40	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	1.70
22. DAR RESPUESTA Y HACER SEGUIMIENTO A TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	1.40	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.70
23. DAR RESPUESTA Y HACER SEGUIMIENTO A TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	4.60	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	2.30
24. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	2.70	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	1.35
25. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA PIC	0.50	8.34	3.75	8.34	7.41	8.33	7.14	8.33	6.48	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	33.11	0.17
26. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	0.50	10.00	0.00	10.00	5.42	10.00	7.00	10.00	10.00	3.33	3.33	10.00	3.33	10.00		10.00		3.33		10.00		10.00		3.34		100.00	29.08	0.15
27. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE REINDUCCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE INDUCCIONES REQUERIDAS	0.40	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	75.00	0.30
28. EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO ANUAL (SST)	0.40	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	6.48	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	48.13	0.19
29. EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO ANUAL (PESV)	0.40	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.20
30. EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG.	0.40	8.34	0.00	8.34	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	16.66	0.07
31. MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO, DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN EL SOFTWARE DE ALMACEN.	0.90	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.45
32. DAR RESPUESTA AL LAS SOLCITUDES DE ASIGNACION DE VEHICULOS.	0.90	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.45
33. MANTENER AL DIA LOS PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LOS PAGOS A LOS PROVEDORES A CARGO DE RECURSOS FISICOS.	0.90	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.45
34. POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL	2.40	16.07	16.07	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	4.17	4.17	12.50	12.50	7.74		4.17		4.17		7.74		12.50		7.72		100.00	55.96	1.34
35. DESARROLLAR Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE LE SEAN REQUERIDAS	0.70	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.35
36. REALIZAR SEGUIMIENTO E INFORMAR A LAS DEPENDENCIAS Y GERENTES DE PROYECTOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DEMÁS MOVIMIENTOS QUE SEAN DE RELEVANCIA.	0.70	8.34	4.17	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	45.82	0.32
37. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.	0.70	3.33	3.33	3.33	0.00	18.33	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.01		0.00		0.00		25.00		100.00	53.33	0.37
38. DAR RESPUESTA A LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE LE SEAN ASIGNADOS.	0.70	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	49.98	0.35
39. DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	0.90	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	5.00	8.33	4.17	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	42.49	0.38
40. MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DE LOS PROCESOS.	0.80	8.34	0.00	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	33.33	0.27

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7550 21 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
41. RECIBIR LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DOCUMENTALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO.	0.90	8.34	0.00	8.34	2.78	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	27.78	0.25
42. DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	3.50	0.00	0.00	2.22	2.22	5.22	2.22	6.10	2.22	8.10	8.10	5.35	5.35	9.51		9.51		12.26		14.51		13.04		14.18		100.00	20.11	0.70
43. ESTADISTICAS Y DESARROLLOS EN EL PORTAL WEB	3.50	10.42	10.42	10.42	25.42	19.17	11.67	10.42	2.92	2.92	2.92	11.67	11.67	2.92		2.92		11.67		2.91		2.91		11.65		100.00	65.02	2.28
44. REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS	3.50	5.84	5.83	5.84	5.83	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58		9.58		9.58		9.58		5.84		5.84		100.00	49.98	1.75
45. IMPLEMENTACIÓN SOBRE EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DEL INSTITUTO.	3.50	2.50	2.50	4.82	4.82	13.32	13.32	6.32	6.32	6.32	6.32	13.82	13.82	6.32		6.32		13.82		6.32		6.32		13.80		100.00	47.10	1.65
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		44.97

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7551 28 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA)	6.06	11.60	11.60	5.13	5.13	8.37	8.37	8.34	8.34	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	50.08	3.03
2.	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA ESPECIE ABEJAS COMUNES (APIS MELLIFERA).	1.52	8.35	8.35	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	0.76
3.	REALIZAR CENSOS POBLACIONALES GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS DE PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA).	2.27	10.00	10.00	6.72	6.72	8.36	8.36	8.36	8.36	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	50.08	1.14
4.	REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADO CON PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA) Y/O ABEJAS COMUNES (APIS MELLIFERA)	2.27	9.00	9.00	7.68	7.68	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	1.14
5.	PRESENTAR AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA EL MANEJO Y CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA ESPECIE ABEJA COMÚN (APIS MELLIFERA).	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33		0.00		0.00		33.33		0.00		0.00		100.00	33.34	1.01
6.	ATENDER ANIMALES POR PRESUNTO MALTRATO	10.53	8.55	8.96	8.55	8.55	8.55	8.55	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27		8.27		8.27		8.27		8.27		8.19		100.00	50.87	5.36
7.	ATENDER ANIMALES POR URGENCIAS VETERINARIAS	5.89	8.61	9.82	8.61	8.61	8.62	8.62	8.61	8.61	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59		8.59		8.59		8.59		8.46		5.55		100.00	52.84	3.11
8.	ATENDER ANIMALES POR BRIGADAS MÉDICAS	15.16	8.33	4.46	8.37	8.37	8.37	8.37	8.58	8.58	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57		8.57		8.57		8.57		8.57		6.36		100.00	46.92	7.11
9.	CUSTODIAR EL 100% DE LOS CANINOS Y FELINOS QUE SEAN REMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL	1.26	8.33	6.06	8.33	8.33	8.33	8.33	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		4.53		100.00	49.15	0.62
10.	PRESTAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PALOMAS DE PLAZA COLUMBA LIVIA	9.26	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63		8.63		8.63		8.63		8.63		5.97		100.00	50.88	4.71
11.	CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES POR PRESUNTO MALTRATO	7.13	8.36	10.00	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	51.72	3.69
12.	EFFECTUAR INTERVENCIÓN POR PRESUNTO MALTRATO Y CLASIFICAR DE ACUERDO AL RESULTADO.	18.53	8.36	9.78	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	51.50	9.54
13.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DEL PROGRAMA.	2.85	8.34	0.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	41.68	1.19
14.	REALIZAR JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN	4.27	8.34	2.50	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	44.18	1.89
15.	ESTERILIZAR CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O DE LOS ESTRATOS 0,1,2,3 PERTENECIENTES A LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO.	9.97	8.33	5.84	8.33	8.33	8.33	8.33	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		4.53		100.00	48.93	4.88

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 49.17

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7555 16 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ACTUALIZAR	INDICADORES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL REPORTE		4.00	15.00	15.00	15.00	15.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
2.	ACTUALIZAR	INDICADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL REPORTE		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	70.00	70.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
3.	ACTUALIZAR	INDICADORES DEL TERCER TRIMESTRE DEL REPORTE		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00		70.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
4.	ACTUALIZAR	INDICADORES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL REPORTE		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		15.00		15.00		70.00		100.00	0.00	0.00	
5.	PRIORIZAR LAS NECESIDADES INVESTIGATIVAS A TRAVÉS DEL DIAGNOSTICO			10.00	8.00	8.00	12.00	12.00	50.00	50.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	8.50	
6.	ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES			7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		35.00		10.00		25.00		100.00	0.00	0.00	
7.	PRIORIZAR LAS NECESIDADES METODOLÓGICAS DE LA BATERIA DE HERRAMIENTA			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	50.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	8.50	
8.	APROBAR LAS NECESIDADES METODOLÓGICAS DE LA BATERIA DE HERRAMIENTA			7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		35.00		10.00		25.00		100.00	0.00	0.00	
9.	PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN			4.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00		
10.	DISEÑO METODOLÓGICO Y EJECUCIÓN DEL PRODUCTO DE INVESTIGACION			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00		
11.	SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		60.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
12.	REVISIÓN, Y PUBLICACIÓN			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		15.00		70.00		15.00		100.00	0.00	0.00	
13.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CONVENIOS			5.00	25.00	25.00	35.00	35.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
14.	ELABORACIÓN DE CONVENIOS			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	4.00
15.	HACER SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		23.00		23.00		33.00		100.00	12.00	0.24	
16.	DISEÑAR EL SEMILLERO			5.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00	
17.	CONVOCATORIA DE SEMILLEROS			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00	
18.	REALIZACIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00		2.00		2.00		26.00		24.00		26.00		100.00	14.00	0.28

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 57.52

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7556 14 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. VERIFICACION DIAGNOSTICO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARTICULARES DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		50.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ELABORACIÓN DISEÑOS DE LOS CUATOS FRIOS QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		50.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. ELABORACIÓN DISEÑOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES.	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		50.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. ADELANTAR LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR EL 100% DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, PROFESIONALES, SERVICIOS GENERALES Y MEDICOS DE LA CASA ECOLOGICA DE ANIMALES.	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		16.00		28.00		28.00		28.00		100.00	0.00	0.00
9. GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FISICOS Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CASA ECOLOGICA DE ANIMALES.	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13.00		29.00		29.00		29.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7560 17 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	VINCULAR PRESTADORES DE SERVICIOS A LA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.34		8.34		8.33		8.33		100.00	49.98	10.00
2.	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CONSTRUIDAS	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	2.50	2.50	12.50	12.50	7.50	7.50	12.50		15.00		15.00		5.00		5.00		5.00		100.00	42.50	6.38
3.	VINCULAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
4.	VINCULAR ESTUDIANTES AL PROCESO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTEL ESCOLAR OBLIGATORIO	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	26.00	26.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00		6.00		6.00		6.00		11.00		0.00		100.00	67.00	3.35
5.	VINCULAR DOCENTES EN EL SEMILLERO DE DOCENTES EN PYBA	5.00	12.50	12.50	12.50	12.50	25.00	25.00	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	28.13		3.12		3.12		3.12		3.12		0.00		100.00	59.39	2.97
6.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN Y CAPACITACION EN ÁMBITO COMUNITARIO, RECREODEPORTIVO E INSTITUCIONAL	5.00	6.67	6.67	10.01	10.01	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	50.04	2.50
7.	VINCULAR CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN TALLERES DE FORMACIÓN QUE ABORDEN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SU APLICACIÓN EN LAS INSTANCIAS Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PYBA	20.00	0.00	0.00	16.70	16.70	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35		8.35		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.10	10.02
8.	DEFINIR Y EJECUTAR PACTOS CON LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LOCALIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	15.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	50.04	7.51
9.	GESTIONAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES, INTERSECTORIALES Y DE CIUDAD REGIÓN	10.00	1.00	1.00	6.00	6.00	7.00	7.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		5.00		100.00	49.00	4.90
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.12

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7821 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá

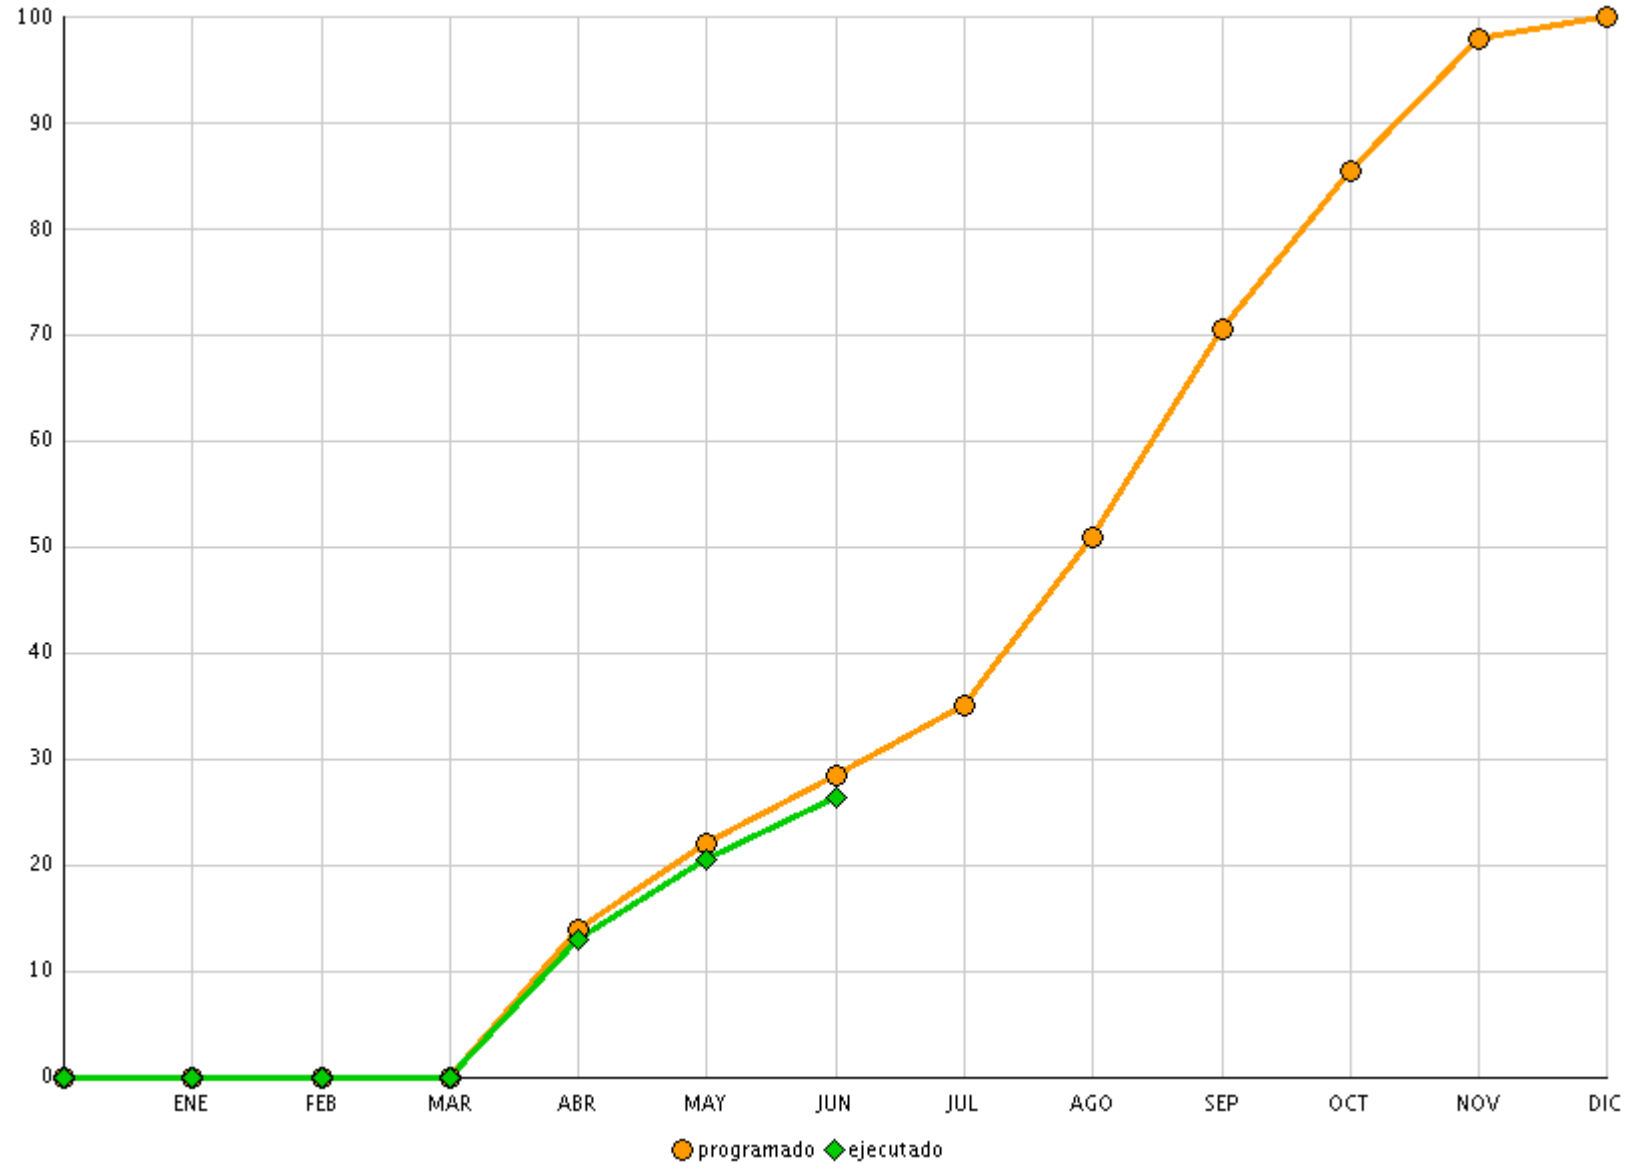


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	14.00	22.00	28.50	35.00	51.00	70.50	85.50	98.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	13.00	20.50	26.50						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7866 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.

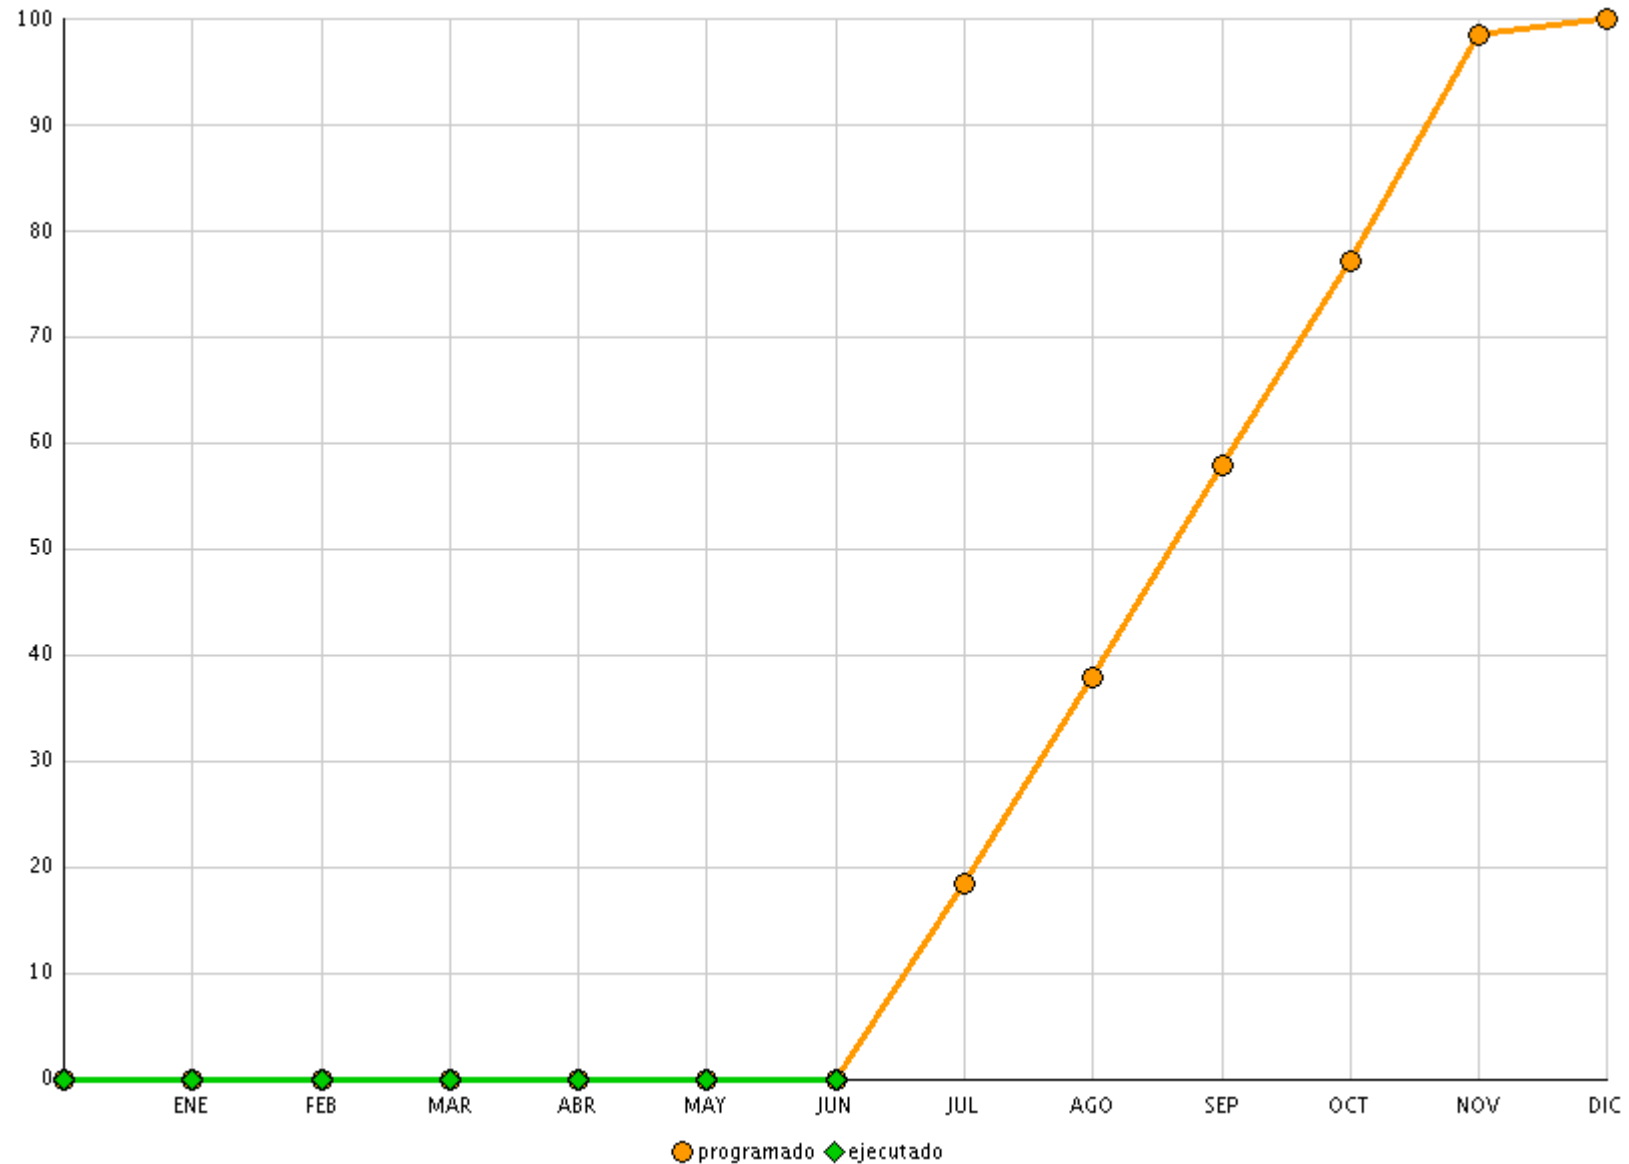


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	38.00	58.00	77.25	98.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7875 Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital

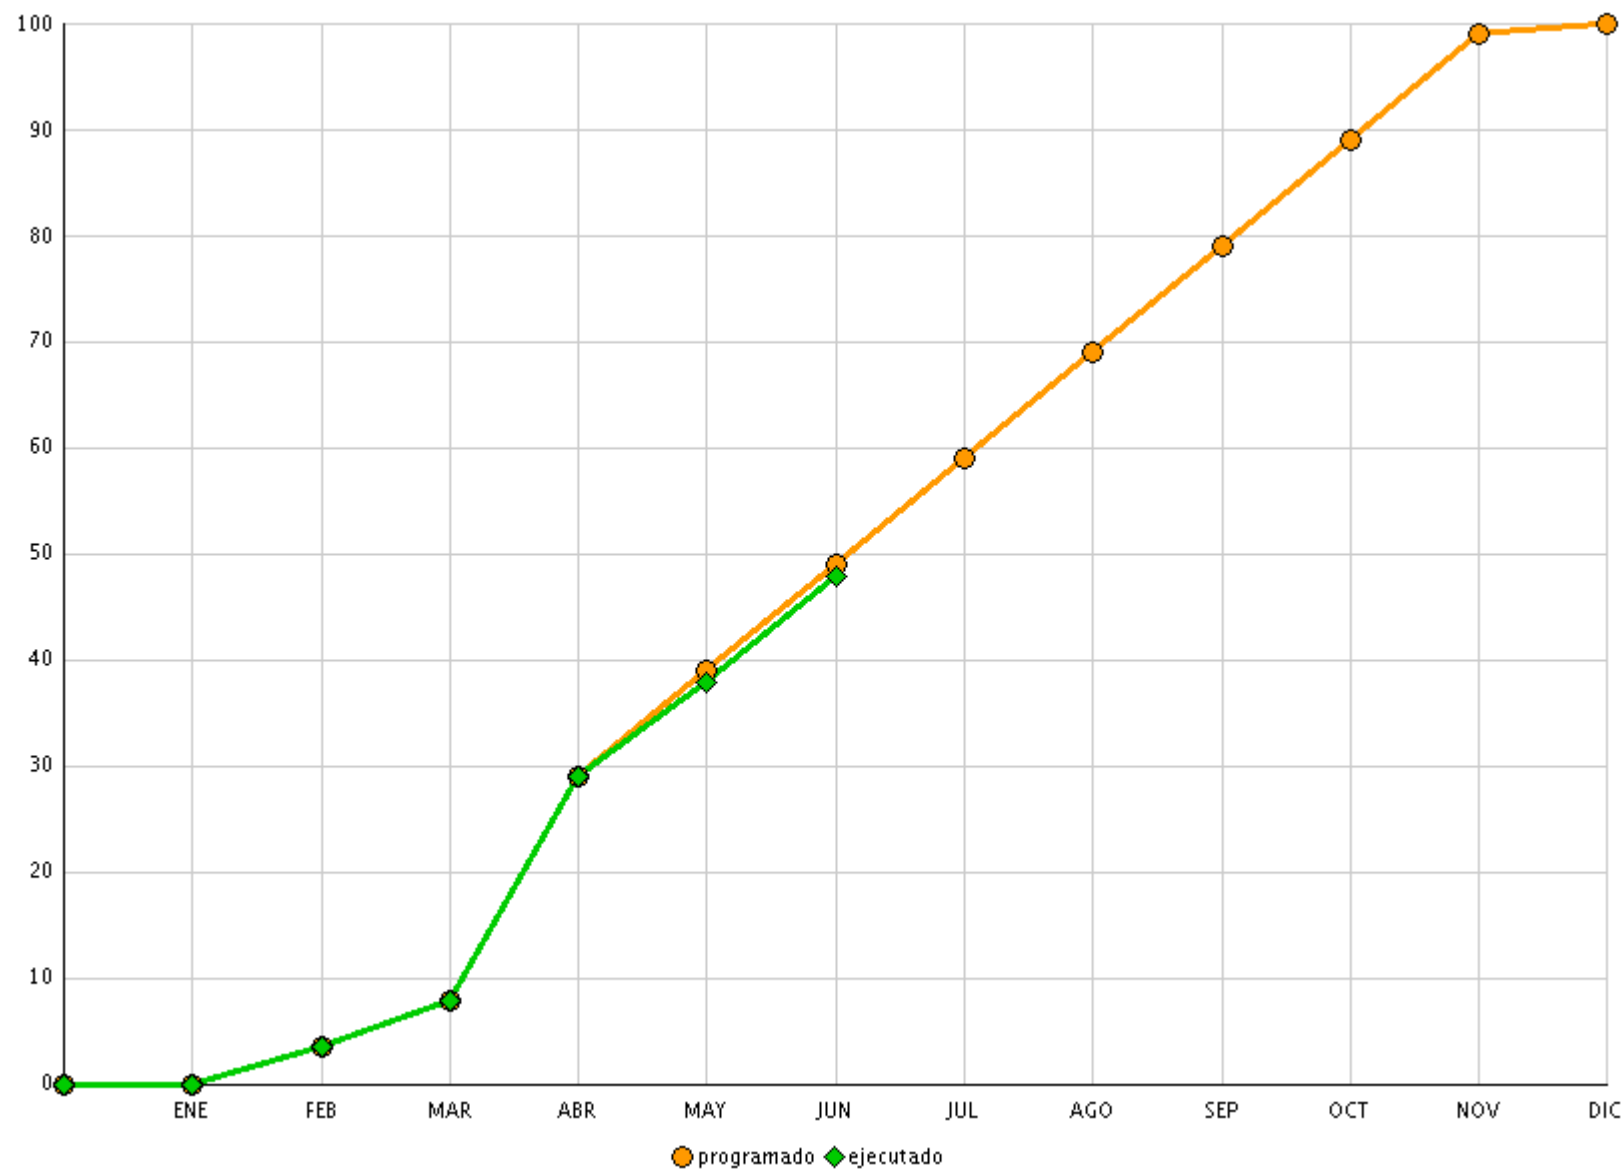


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.50	8.00	29.00	39.00	49.00	59.00	69.00	79.00	89.00	99.00	100.00
Ejecutado	0.00	3.50	8.00	29.00	38.00	48.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7878 Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.

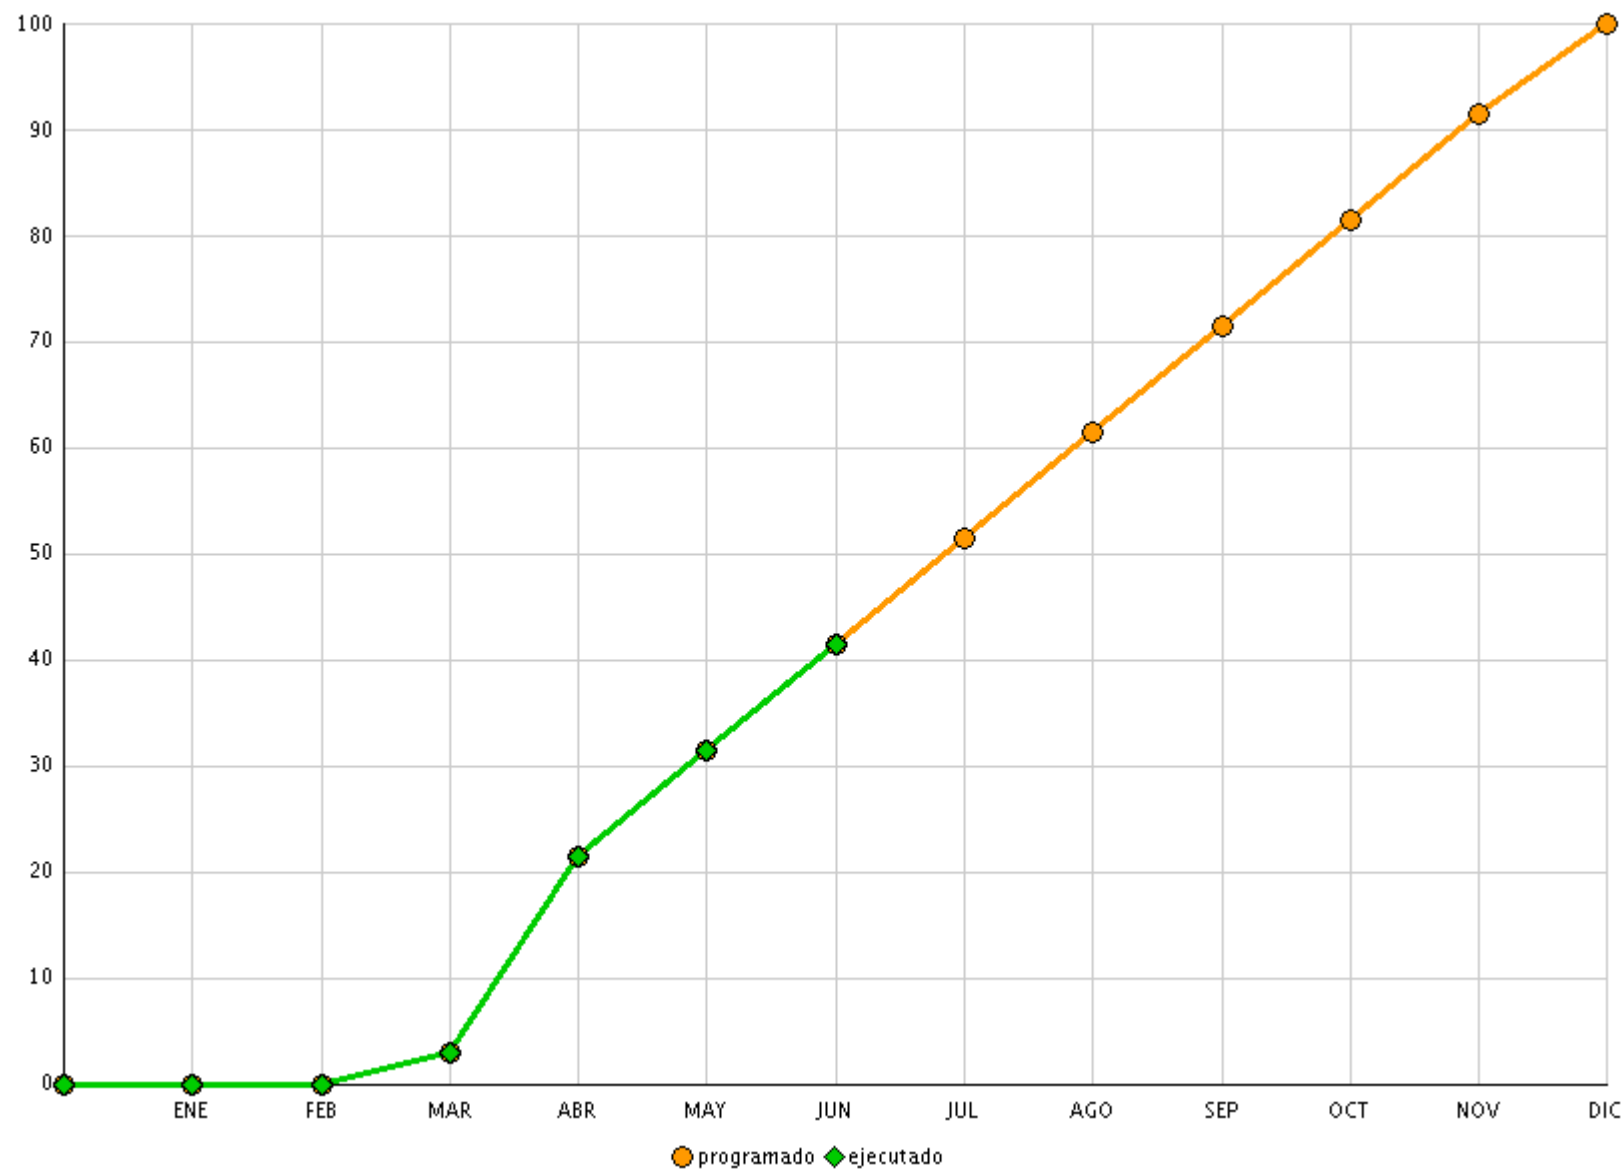


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	3.00	21.50	31.50	41.50	51.50	61.50	71.50	81.50	91.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	3.00	21.50	31.50	41.50						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7889 Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco

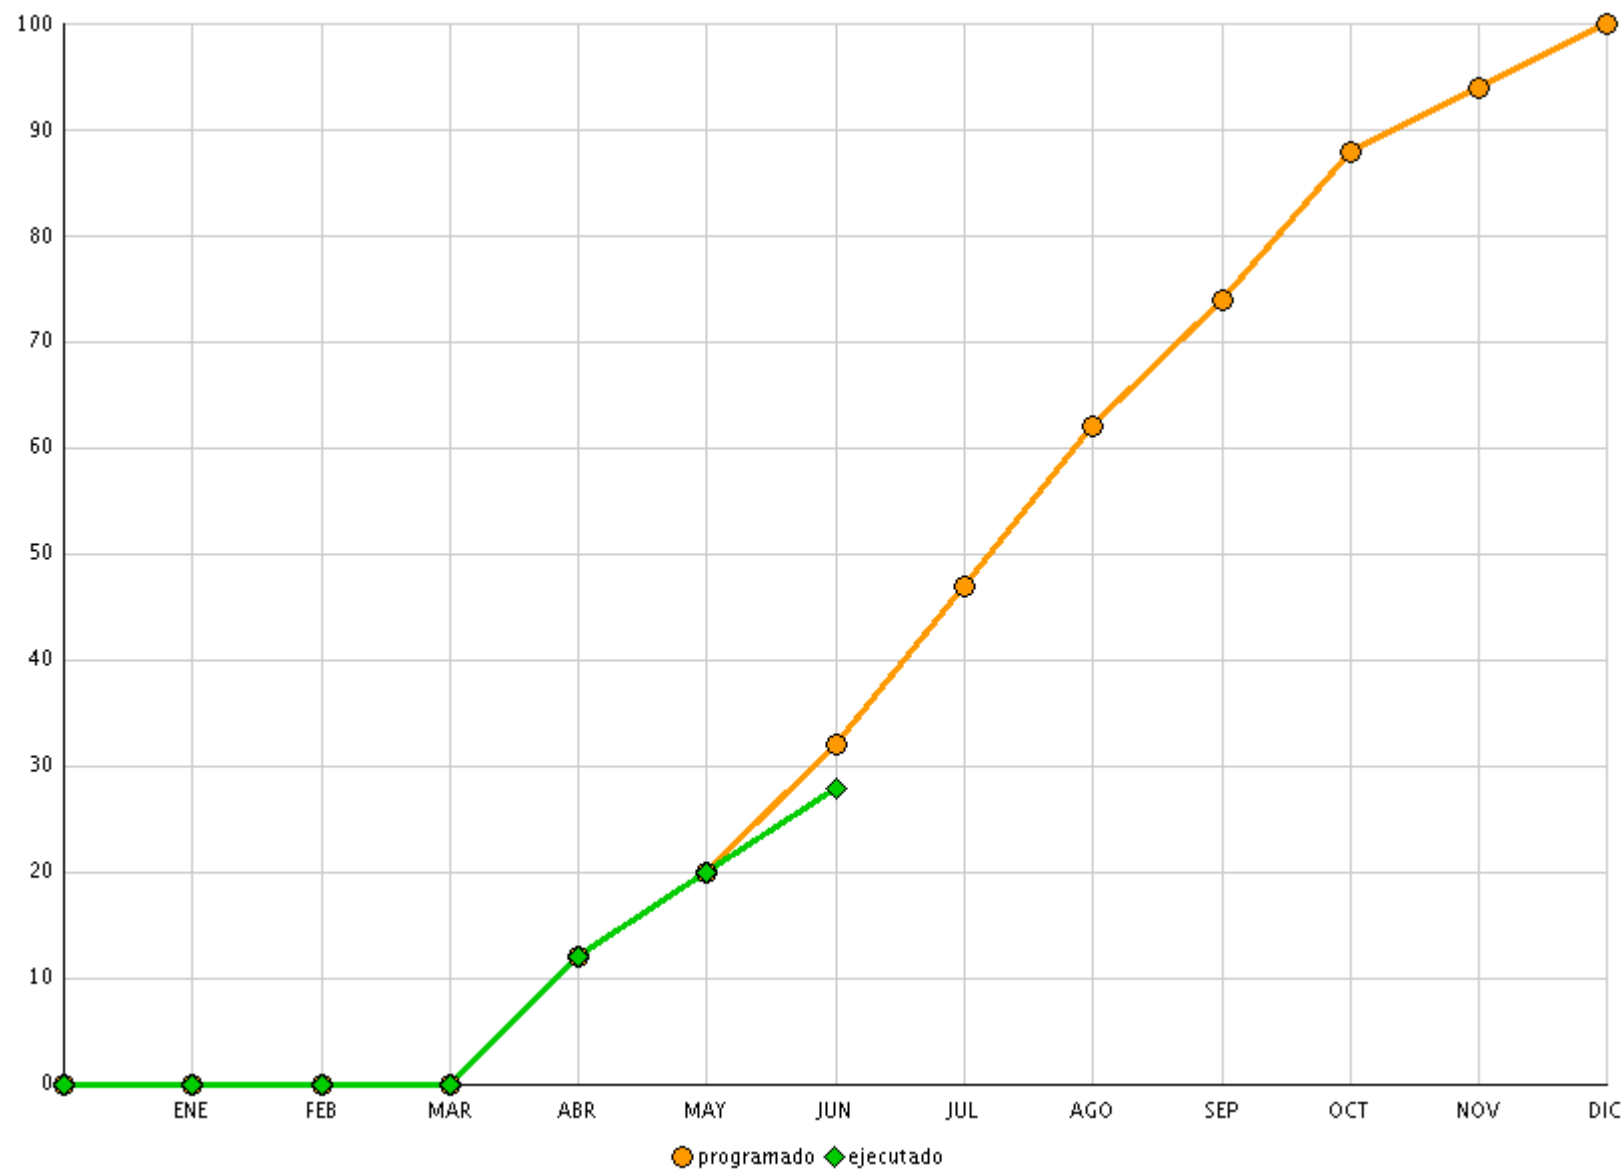


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	12.00	20.00	32.00	47.00	62.00	74.00	88.00	94.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	12.00	20.00	28.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7892 Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

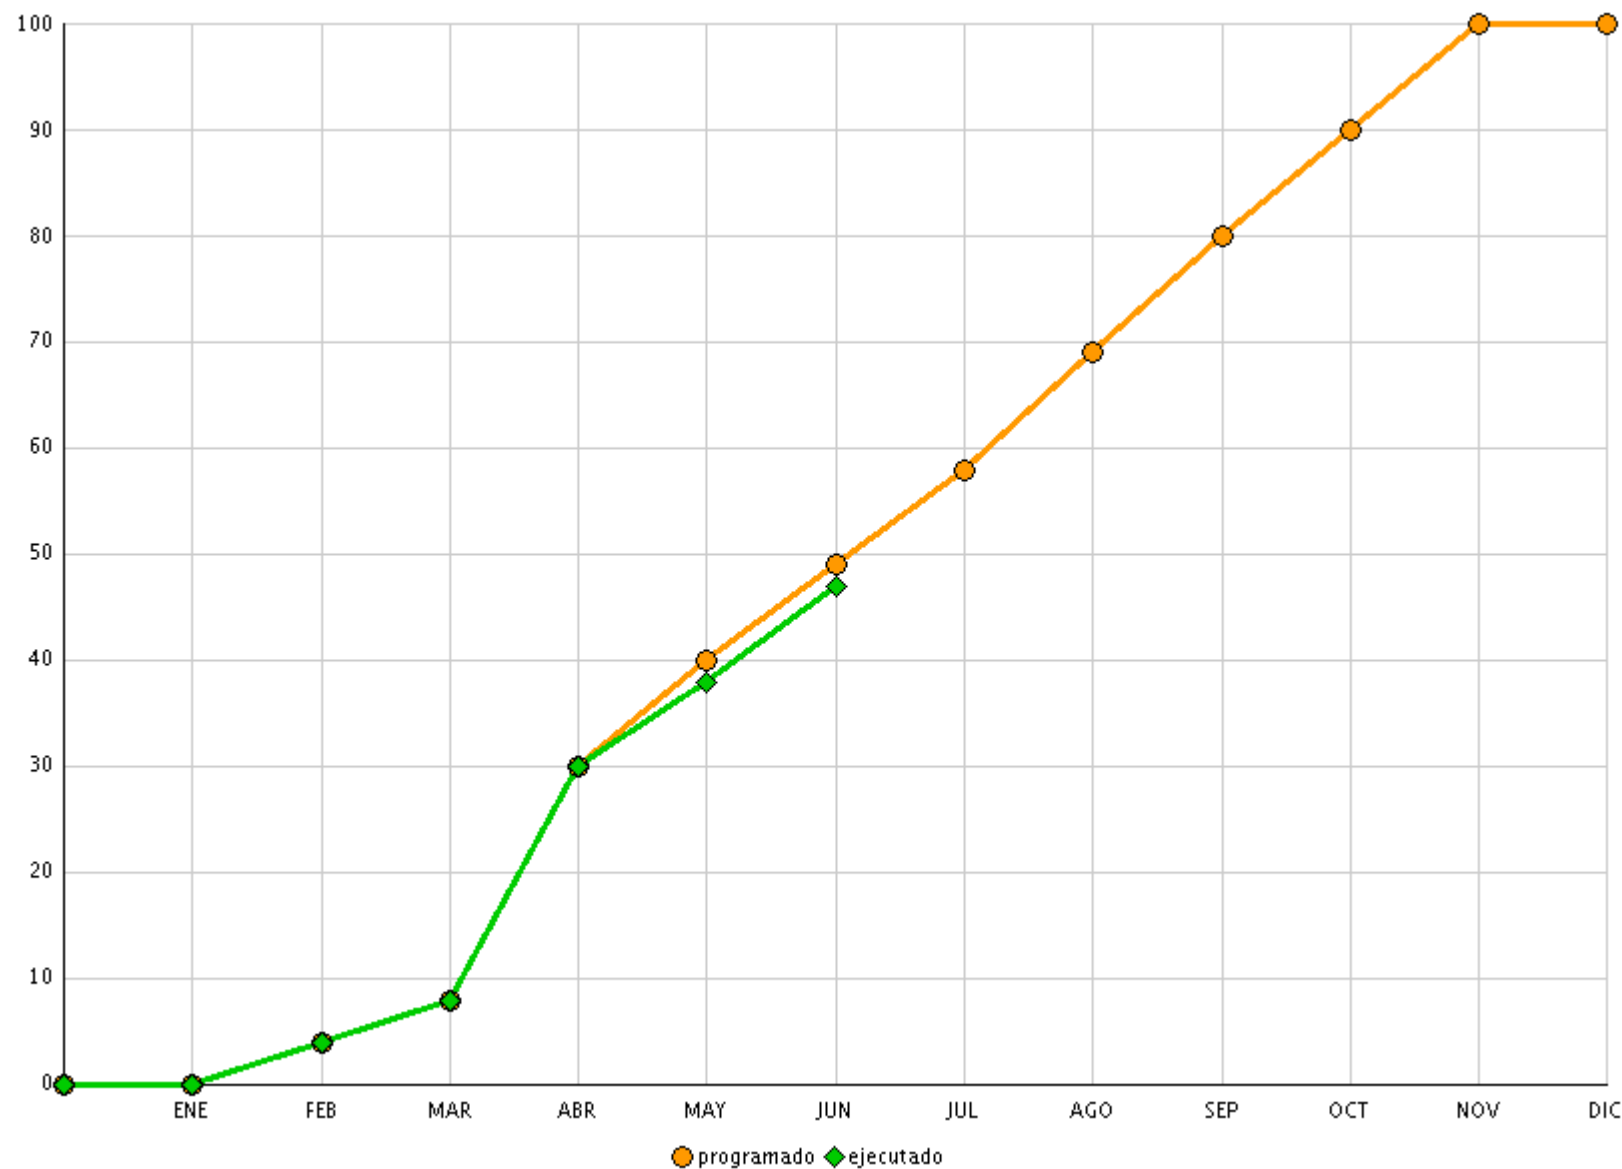


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.00	8.00	30.00	40.00	49.00	58.00	69.00	80.00	90.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	4.00	8.00	30.00	38.00	47.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7894 Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

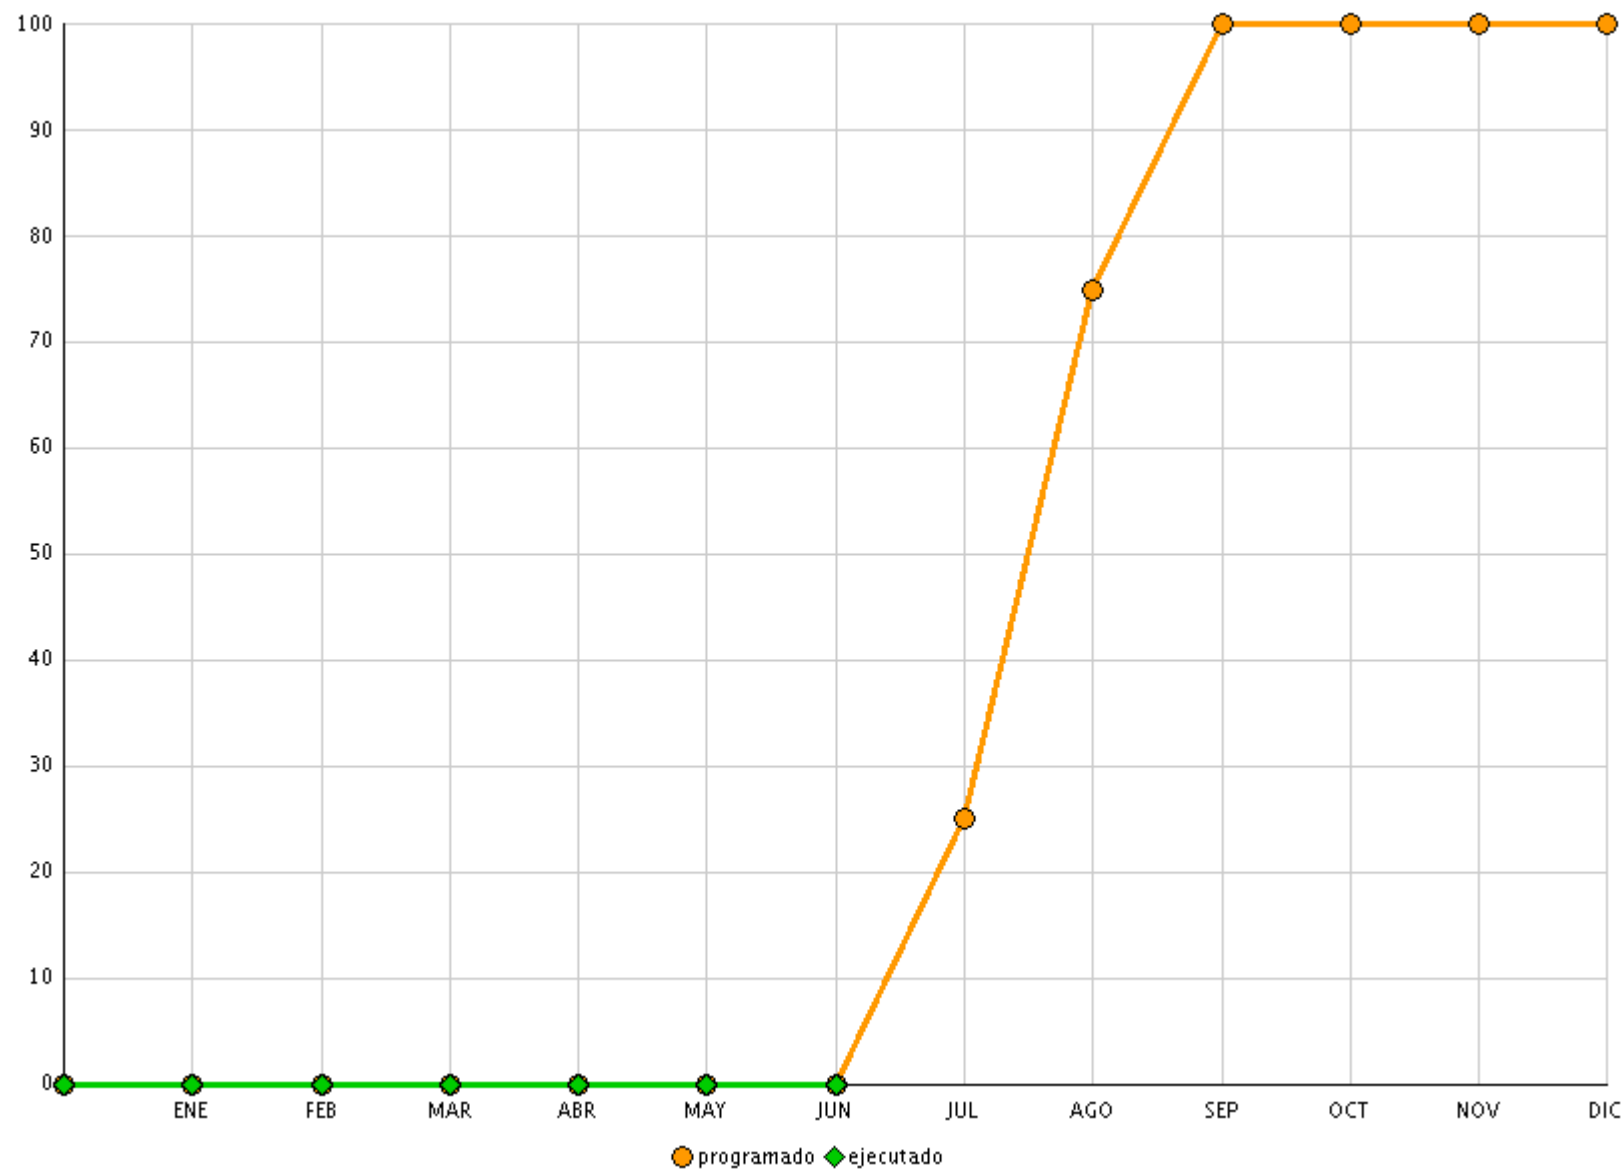


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7896 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

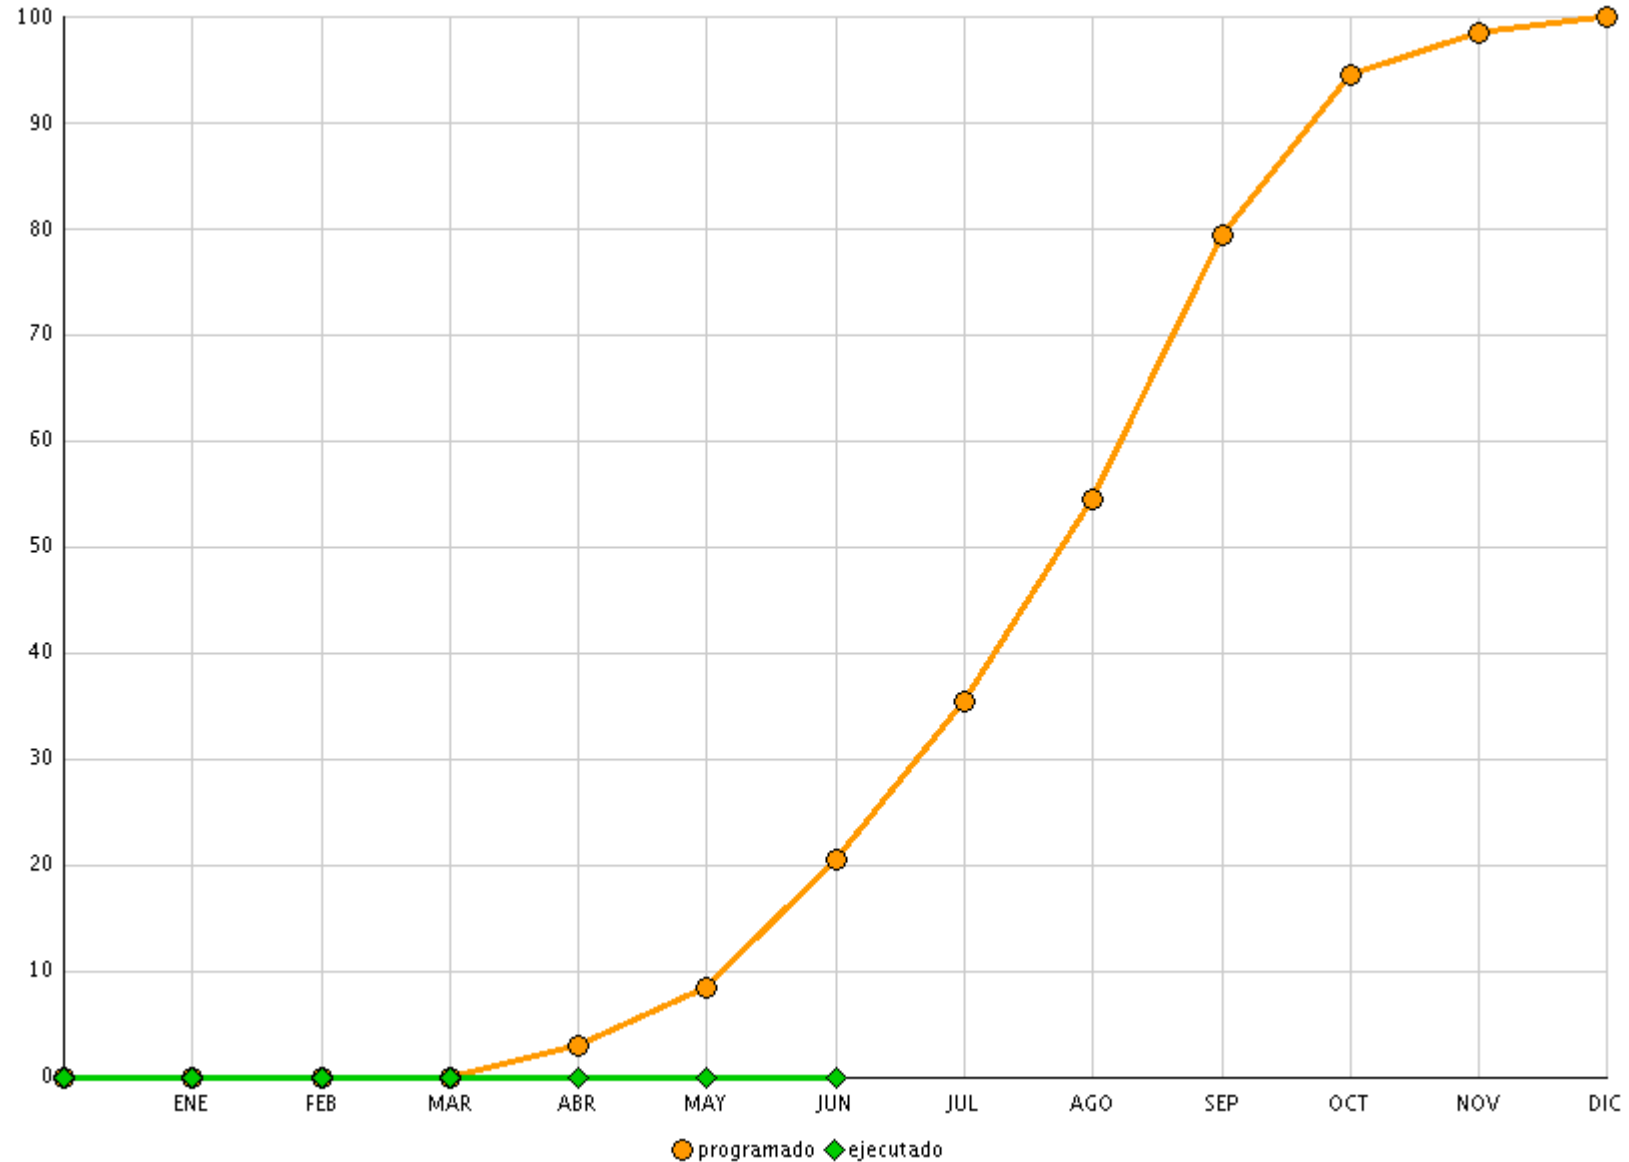


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	3.00	8.50	20.50	35.50	54.50	79.50	94.50	98.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7897 Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

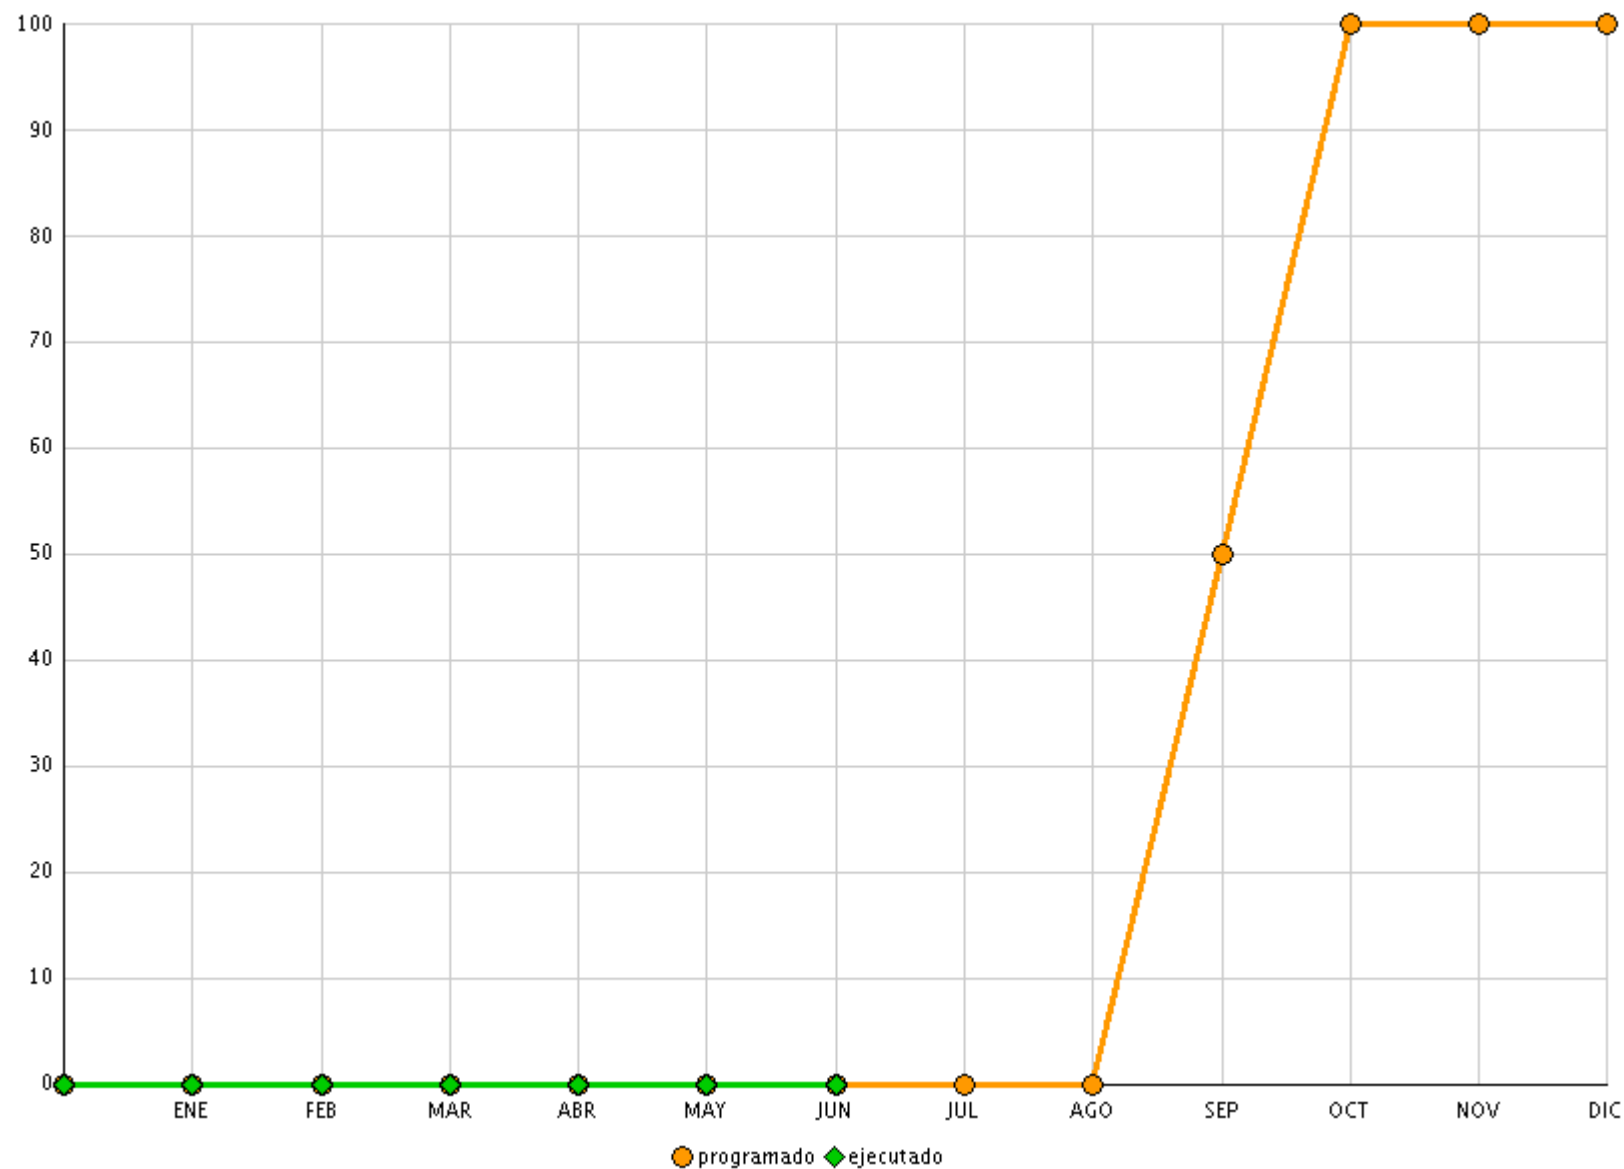


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7898 Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

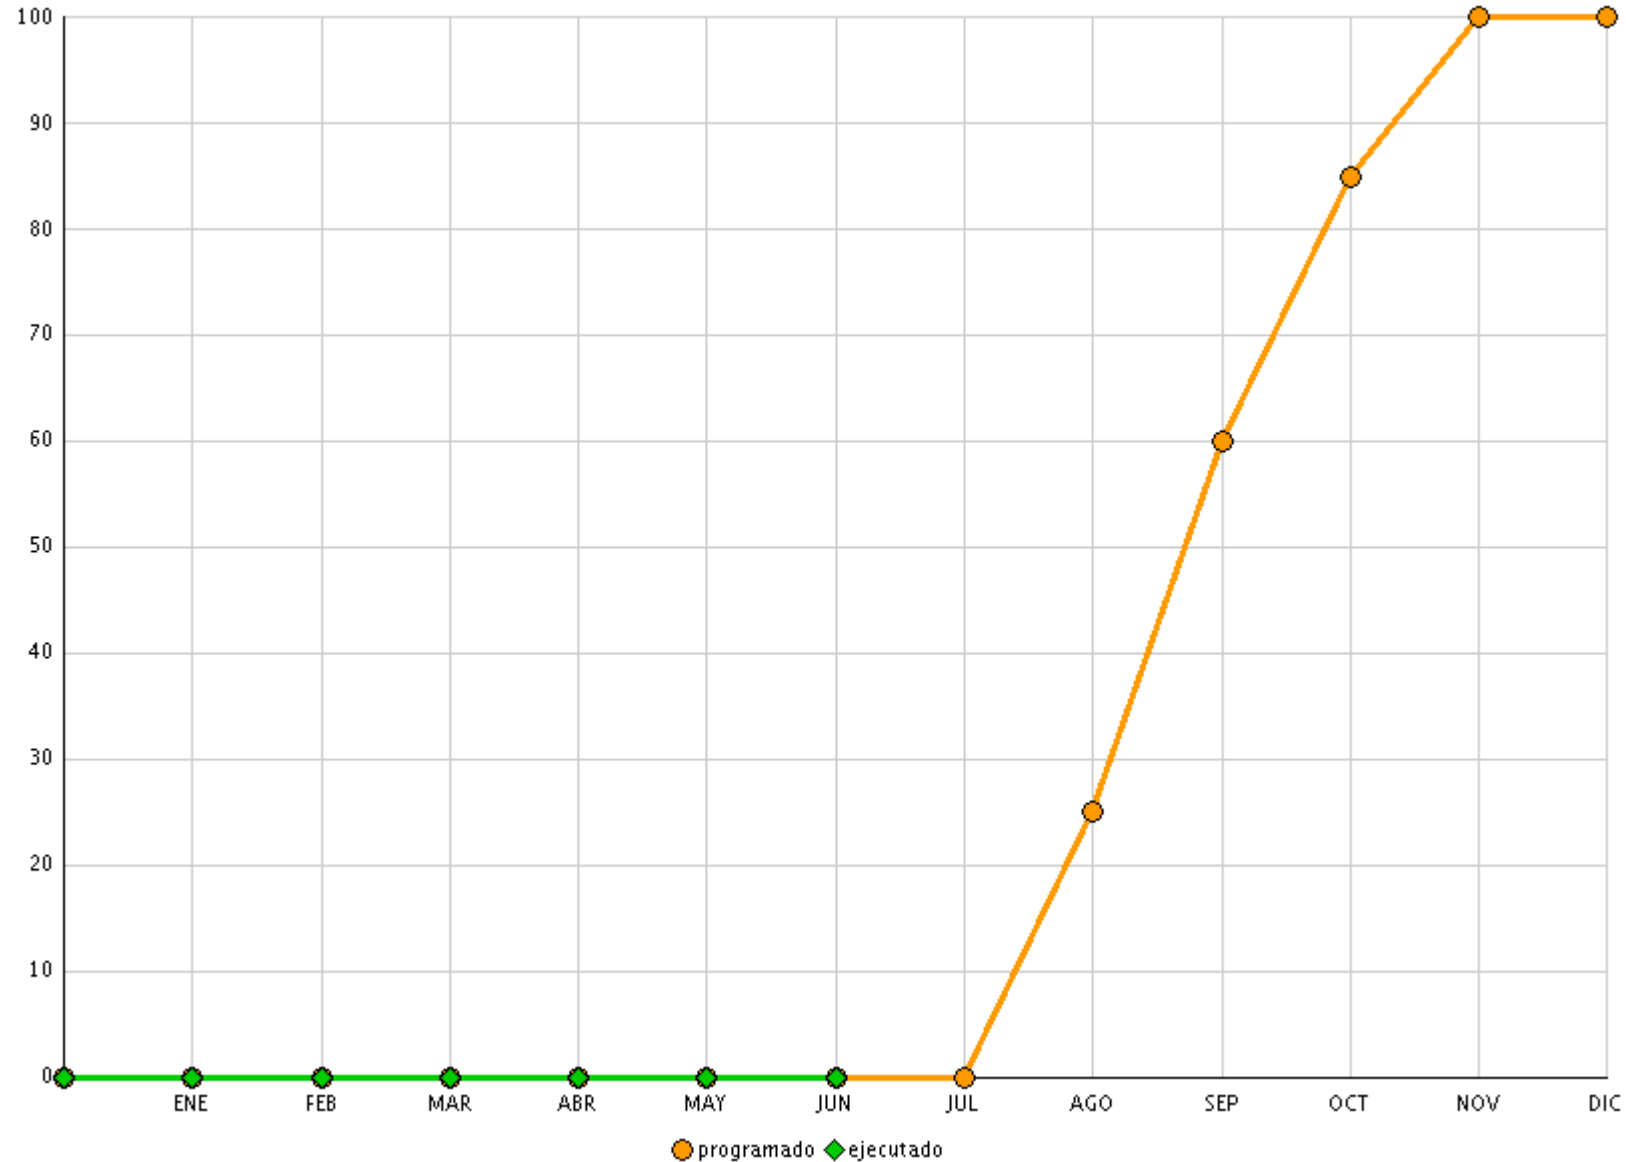


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	60.00	85.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7899 Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

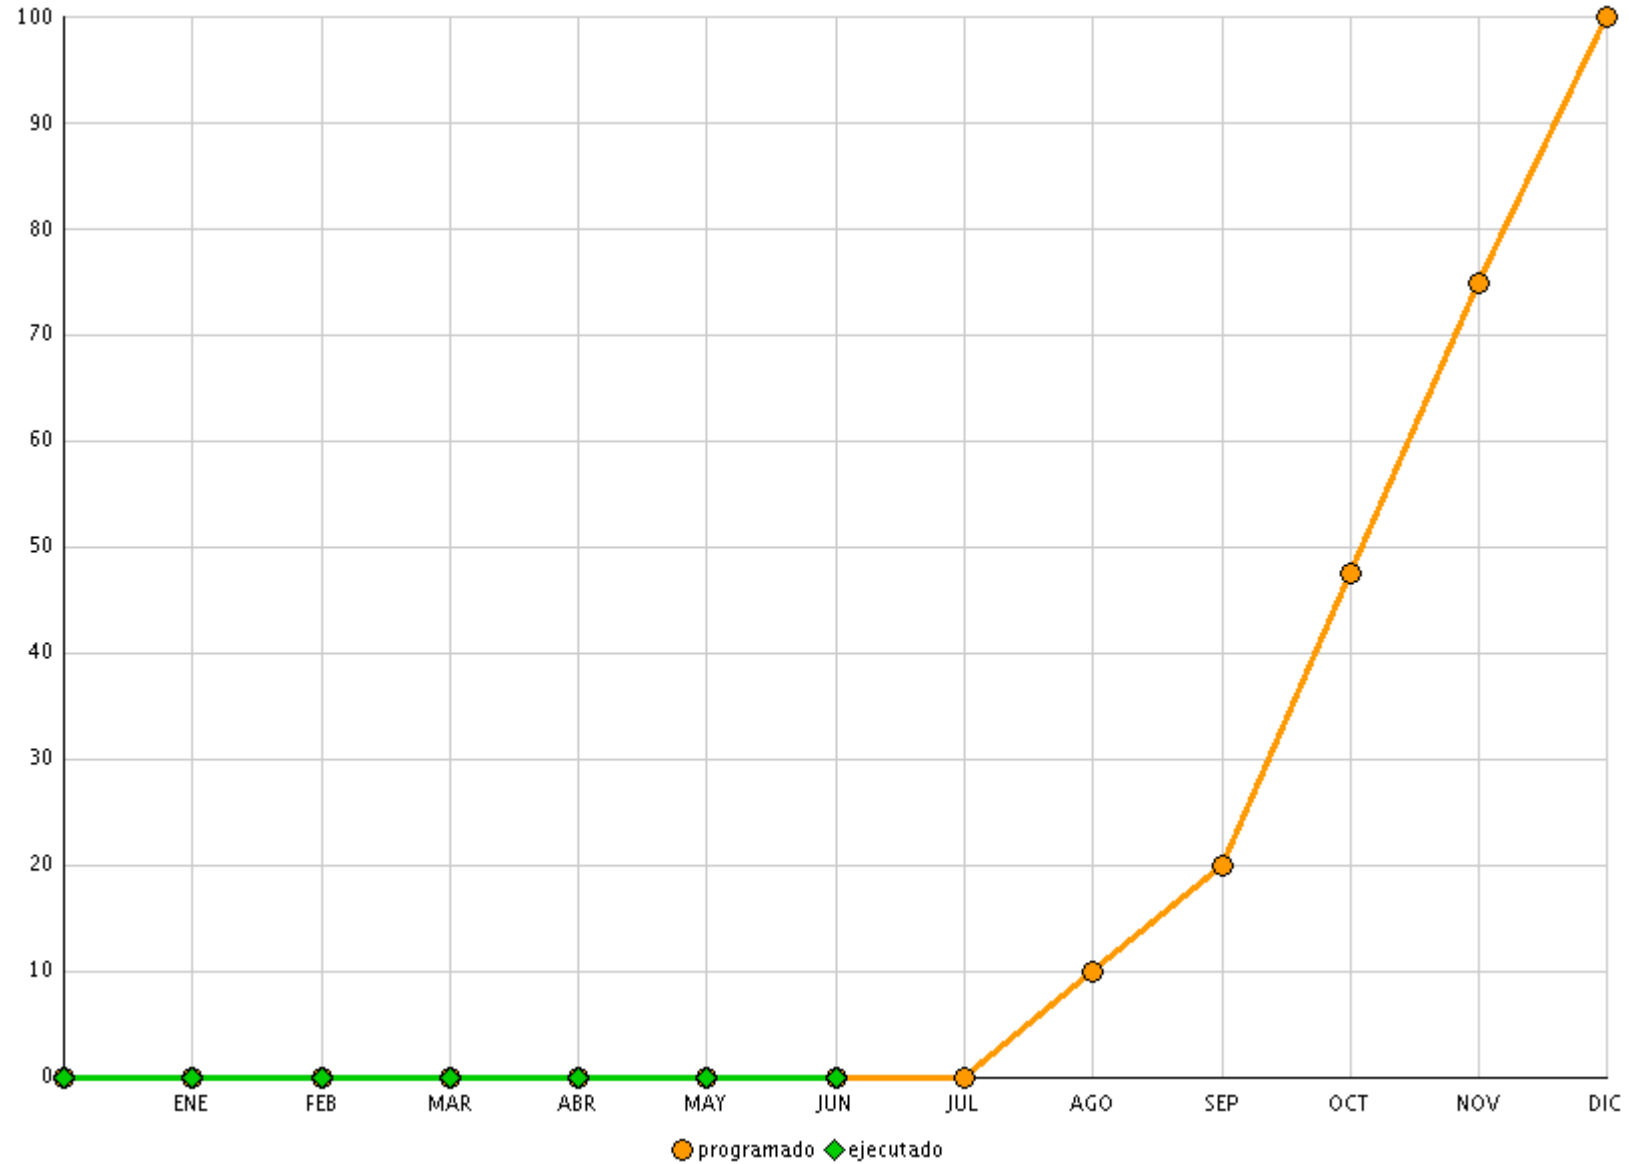


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	47.50	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7900 Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información

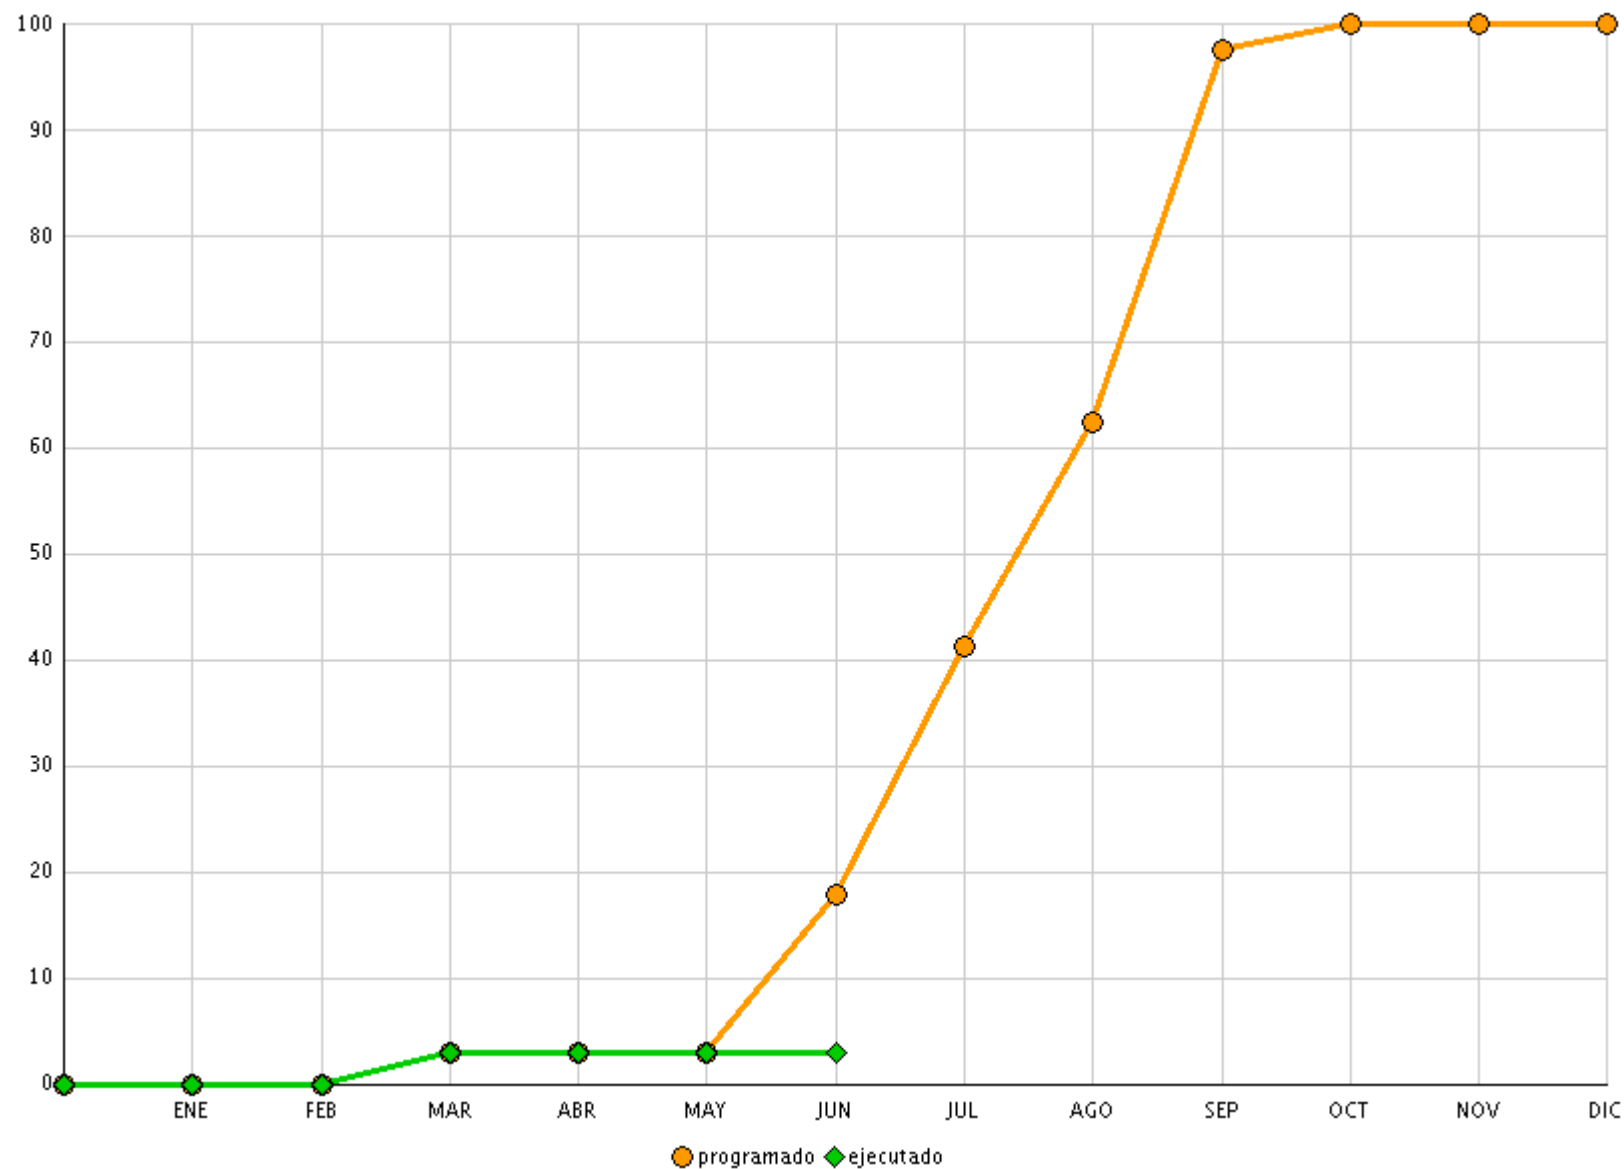

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	18.00	41.25	62.50	97.50	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7821 41 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO, PLAN DE ACCIÓN, PREAUDITORIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA DE CERTIFICACIÓN CON BASE EN LA NORMA EXISTENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO DE LARGO PLAZO "PLAN MAESTRO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	2.00
3.	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS ESPECIALIZADAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	10.50
4.	ADQUIRIR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS ESPECIALIZADAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	30.00	6.00
5.	ADQUIRIR EQUIPOS DE AUDIOVISUALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		30.00		30.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	ADQUIRIR EQUIPOS DE SOFTWARE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		30.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	ADQUIRIR EQUIPOS COMPUTADORES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		30.00		30.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	ADQUIRIR EQUIPOS ROBUSTOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		30.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	ADQUIRIR EQUIPOS MUSICA Y SONIDO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		30.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	FORTALECER LABORATORIOS Y AULAS ESPECIALIZADAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 26.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7866 21 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTRATAR SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE TALLERES Y MATERIAL DE ESTUDIO, TENIENDO COMO BASE LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 11 Y SABER PRO ASI COMO LAS NE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	VINCULAR MONITORES EN LA MODALIDAD DE ASISTENTES ACADÉMICOS PARA REALIZAR LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PRIMEROS SEMESTRES EN CADA FACULTAD DE ACUERDO A SUS NECESID	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO AL INTERIOR DE LAS FACULTADES Y A NIVEL INSTITUCIONAL, ASÍ COMO EL DESARROLLÓ DE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		10.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE CÓMPUTO Y DEMÁS ARTÍCULOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE REA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DISEÑO DE MATERIAL DIGITAL PARA LA SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO EN LA UNIVERSIDAD DESARROLLO DE TALLERES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	ADQUIRIR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA LOS DOCENTES, A FIN DE FORTALECER SUS COMPETENCIAS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	ADQUIRIR EL MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE CONSEJERÍA, ASESORÍA Y GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA APEA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	ADQUIRIR DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS Y DOCENTES ENCARGADOS DEL MANEJO DE HERRRAMIENTAS GENERADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	CONTRATAR UN PROFESIONAL DESARROLLADOR, PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS BASADO EN EL MODELO DE DESERCIÓN, EN UN SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	CONTRATAR SERVICIOS PARA LA DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO SE MATERIAL Y DOCUMENTOS ACCESIBLES QUE PERMITAN LA DIVULGACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN EL PROYECTO..	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11.	ADQUIRIR RECURSOS PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		20.00		25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7866 21 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
12. VINCULAR MONITORES PARA BRINDAR APOYO Y GENERAR MATERIAL RELACIONADO CON LA SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								0.00

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GENERAR AVANCES Y RESOLUCIONES DE AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS PARA SU DESARROLLO EN LAS CONVOCATORIAS DEL CIDC.	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
2.	CONTRATAR DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS EN LAS BASES DEL CIDC	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
3.	EFFECTUAR EL PAGO DE LAS CONTRAPARTIDAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COFINANCIADOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
4.	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED RITA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	4.00
5.	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE APOYAN AL CIDC Y LAS ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN.	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
6.	CONTRATAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS PARA INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
7.	CONTRATAR SERVICIOS PARA APOYAR EL PROCESO EDITORIAL DE LIBROS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
8.	CONTRATAR SERVICIOS PARA APOYAR LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS REGISTRADOS ANTE EL CIDC EN EVENTOS EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
9.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL DESARROLLO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
10.	CONTRATAR SERVICIOS DE APOYO EDITORIAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
11.	PAGO DE TASAS SOBRE PATENTES Y DEMÁS REQUERIMIENTOS LEGALES DE REGISTRO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
12.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL ESACLONAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION GENERADOS POR INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	48.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7878 21 Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR ESTRATEGIAS Y FORMULACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA INCORPORACIÓN DE TIC EN PROGRAMAS PRESENCIALES Y LOS PROCESOS DE FORMACIÓN QUE FACILITE EL USO E IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOG	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00
2. ROMOVER EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y ENTORNOS VIRTUALES MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS DE FORMACIÓN CONSTANTE PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE APOYEN EN LOS PROCESOS ACADE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DE AUTOR EN TEMATICAS REQUERIDAS PARA ACTUALIZAR Y CREAR PROGRAMAS EXISTENTES.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00
4. INCENTIVAR, PARTICIPAR Y GESTIONAR PROYECTOS ACADÉMICOS QUE REQUERIERA LA MEDIACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y ASÍ PARTICIPAR EN PROCESOS DE FLEXIBILIDAD ACA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00
5. ACOMPAÑAR A LOS PROYECTOS CURRICULARES EN LA CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CALIFICADO, ASÍ COMO LA DE PROPONER NUEVOS ESPACIOS QUE SE PUEDAN DESARROLLARSE BAJO METODOLOGÍA VIRTU	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00
6. FORMULAR Y DESARROLLAR EL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, VIDEOCONFERENCIA, CAMPUS VIRTUAL Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00
7. CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL OBSERVATORIO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA BASE SOCIAL Y LAS EXPERIENCIAS DE LAS DIFERENTES ENTES QUE APROPIAN LAS TECNOLOGÍAS EN LOS ESPACIOS AC	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		41.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7889 26 Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS, PUBLICACIONES SERIADAS Y PERIÓDICAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00		
2. ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO, E-BOOKS A PERPETUIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00		
3. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA ALEPH	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00		
4. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL SOPORTE DEL RIUD (REPOSITORIO INSTITUICIONAL)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00		
5. ADQUIRIR SOLUCIONES TECNOLOGICAS A NIVEL SOFTWARE. (SOFTWARE RED HAT+EZPROXY+INTELIGENCIA DE NEGOCIOS+DESCUBRIDOR+MESA DE AYUDA+LICENCIAS DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA EL REPOSITORIO)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
6. CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. (AUDITORIOS Y SALAS AUDIOVISUALES)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00				0.00		100.00	0.00	0.00		
7. CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOFTWARE Y HARDWARE (VIRTUALIZACIÓN).	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00				0.00		0.00		100.00	40.00	4.00		
8. REALIZAR/ADQUIRIR PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		0.00		40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		28.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7892 21 Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYAR DOCENTES DE PLANTA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGÚN EL PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE ACUERDO 09 DE 2007 Y SEGÚN EL PFC 2015.	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	4.00
2.	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADO PARA APOYO EN CREACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS PARA NUEVOS DOCTORADOS Y/O ÉNFASIS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.00
3.	APOYAR LA ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE LOS NUEVOS DOCTORADOS Y PROPUESTAS DE NUEVOS ÉNFASIS DE LOS DOCTORADOS ACTUALES.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	8.00
4.	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REGIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50
5.	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50
6.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN Y APOYO A LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50
7.	ADQUIRIR MUEBLES, ENSERES Y/O INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE LOS DOCTORADOS.	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7894 23 Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADQUIRIR EQUIPOS COMPUTADORES	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	ADQUIRIR EQUIPOS ROBUSTOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7896 26 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2022		
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
	IPC	Valor			
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1 CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA DE ESPACIOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, Y SU INTERVENTORIA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.	1.2 CONTRATAR LA DOTACIÓN DE ESPACIOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		0.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	1.3 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REPARACION DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y ELEMENTOS DE FACHADAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	1.4 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION PROTECCION MANEJO HIDRAULICOY LA REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL MOVIMIENTODE REMOCION EN MASA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	1.5 REALIZAR ESTUDIOS PATOLOGICOS Y/O ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y/O DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS) DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE A	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	1.6 CONTRATAR LA IMPLEMENTACION SUMINISTRO INSTALACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA Y SEPARACION DE AGUAS RESIDUALES DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DIST	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	1.7 SUMINISTRAR E INSTALAR PANELES SOLARES Y/O ADAPTAR EL SISTEMA LUMINICO ACTUAL A LA NORMA REGLAMENTARIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		20.00		20.00		10.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	1.8 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	1.9 CONTRATAR LA ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COLISEO SEDE FACULTAD TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00				0.00		100.00	0.00	0.00
10.	1.10 CONTRATAR EL DISEÑO Y/O SUMINISTRO Y/O INSTALACION DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS PELIGROSOS Y HOSPITALARIOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		10.00		30.00		20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11.	2.1 CONTRATAR LA SUPERVISION INDEPENDIENTE ESTRUCTURAL Y DE GEOTECNIA PARA EL PRYECTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12.	2.2 ELABORAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		30.00		30.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas

7896 26 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL ASI COMO EL DISEÑO ARQUITECTONICO ESTUDIOS TECNICOS																												
13.	2.3 CONTRATAR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO PARA ELABORAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRNACI	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		20.00		30.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
14.	3.1 CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
15.	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON OBJETO DE REALIZAR LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, ESTRUCTURALES Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL NUEVO EDIFICI	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
16.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE APOYAR LA FORMULACIÓN PLAN MAESTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7897 20 Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, EN LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SOPORTE DE LAS LAS AUDITORÍAS EXTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
2. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE GOBIERNO SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN 533 DE 2015	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
3. ADQUIRIR ELEMENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, QUE PERMITAN Y MEJOREN LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD DE ESTUDIANTES. PLAN DE ACCIÓN: CONTINGENCIA SANITARIA - COMPONENTE CONECTIVIDA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										0.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7898 12 Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIALES CON EL OBJETO DE APLICAR, DIVULGAR Y CAPACITAR CONTINUAMENTE EN LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIALES DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. COMPRAR LOS ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN NECESARIOS EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO SGDEA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. ADQUIRIR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS SGDEA.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7899 16 Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ADMINISTRADA POR UDNET.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	2.1 ADQUISICION DE EQUIPOS COMPONENTES Y DEMAS SISTEMAS PARA DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE DATACENTER DE LA UNIVERSIDAD	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									0.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7900 20 Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1	CONTRATAR	LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR EL MODELO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	1.2	CONTRATAR	LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETOI DE FORMALIZACION DEL COMITE O GRUPO DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y ORIENTAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE L	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	1.3	CONTRATAR	LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE ESTABLECER Y EJECUTAR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DEFINIDA Y DE CADA UNA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	1.4	CONTRATAR	LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE EVALUAR EL NIVEL DE MADUREZ DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y DE TI EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	2.1	CONTRATAR	LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE GESTIONAR LA FORMALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS DEFINIDAS Y EVALUAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	2.2	CONTRATAR	LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETIVO DE DEFINIR EL MODELO DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	3.1	CONTRATAR	LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE PAOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR EL PETI Y GESTIONAL LA FORMALIZACION DEL MISMO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	4.1	CONTRATAR	LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE EJECUTAR LOS PROYECTOS DE DESARROLLO O ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y LOS PROYECTOS DE DESARRO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	45.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	3.00
9.	4.2	CONTRATAR	LA ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE DEFINIDOS PARA LA VIGENCIA DEL PETO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	4.3	CONTRATAR	LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE EVALUAR EL RETORNO A LA INVERSION DE LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA DEL PETI	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical				100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										3.00

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7626 Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá

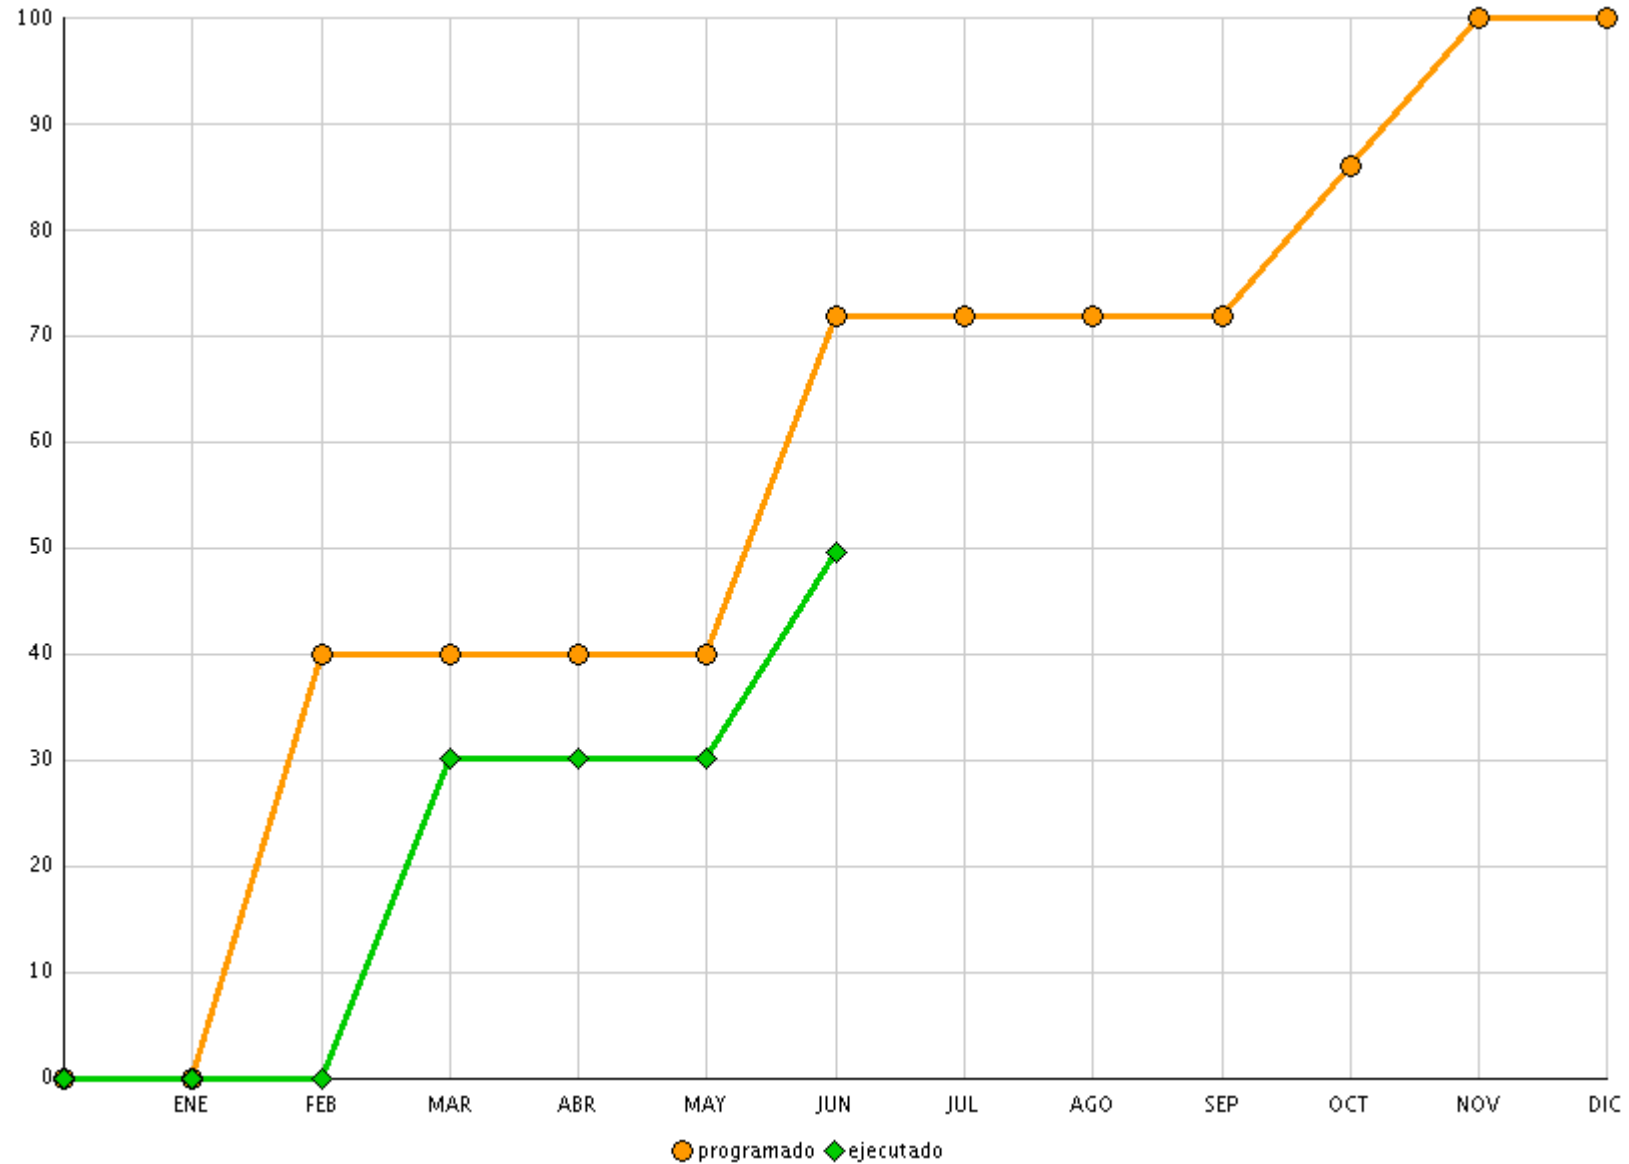


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	71.80	71.80	71.80	71.80	86.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	30.20	30.20	30.20	49.60						

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7627 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá

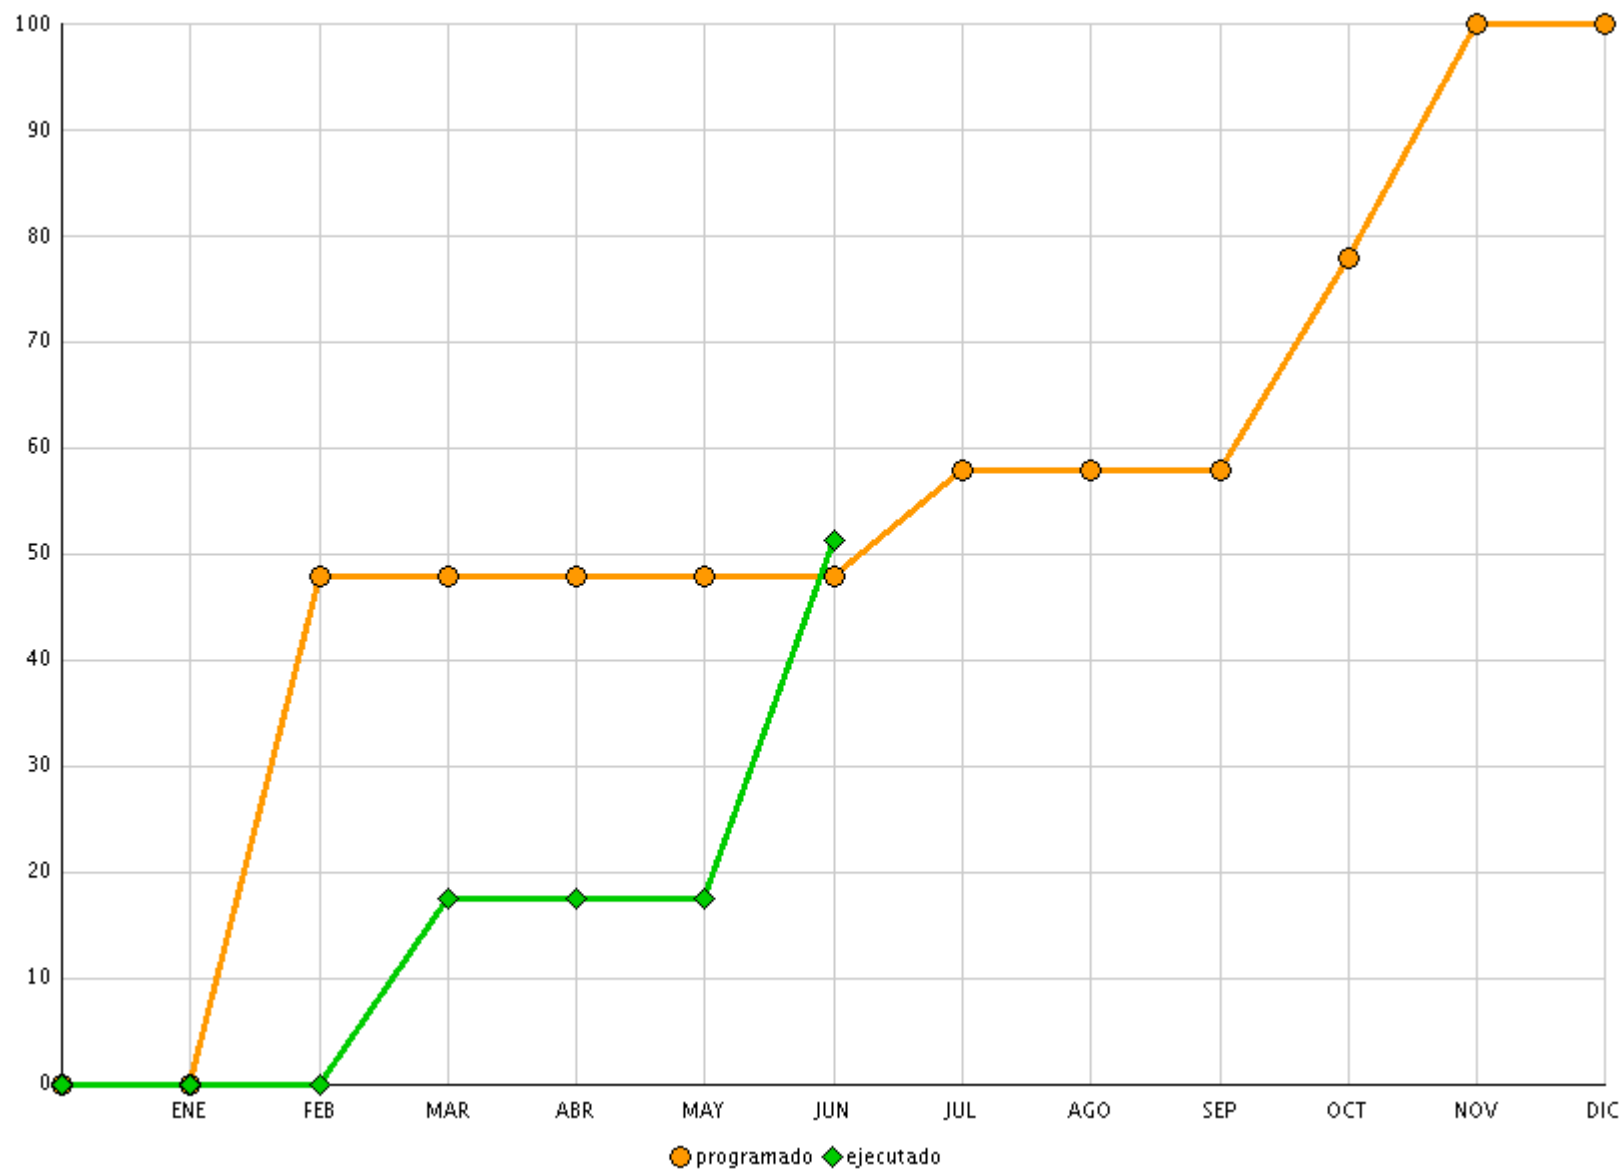


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	58.00	58.00	58.00	78.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.60	17.60	17.60	51.30						

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7694 Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

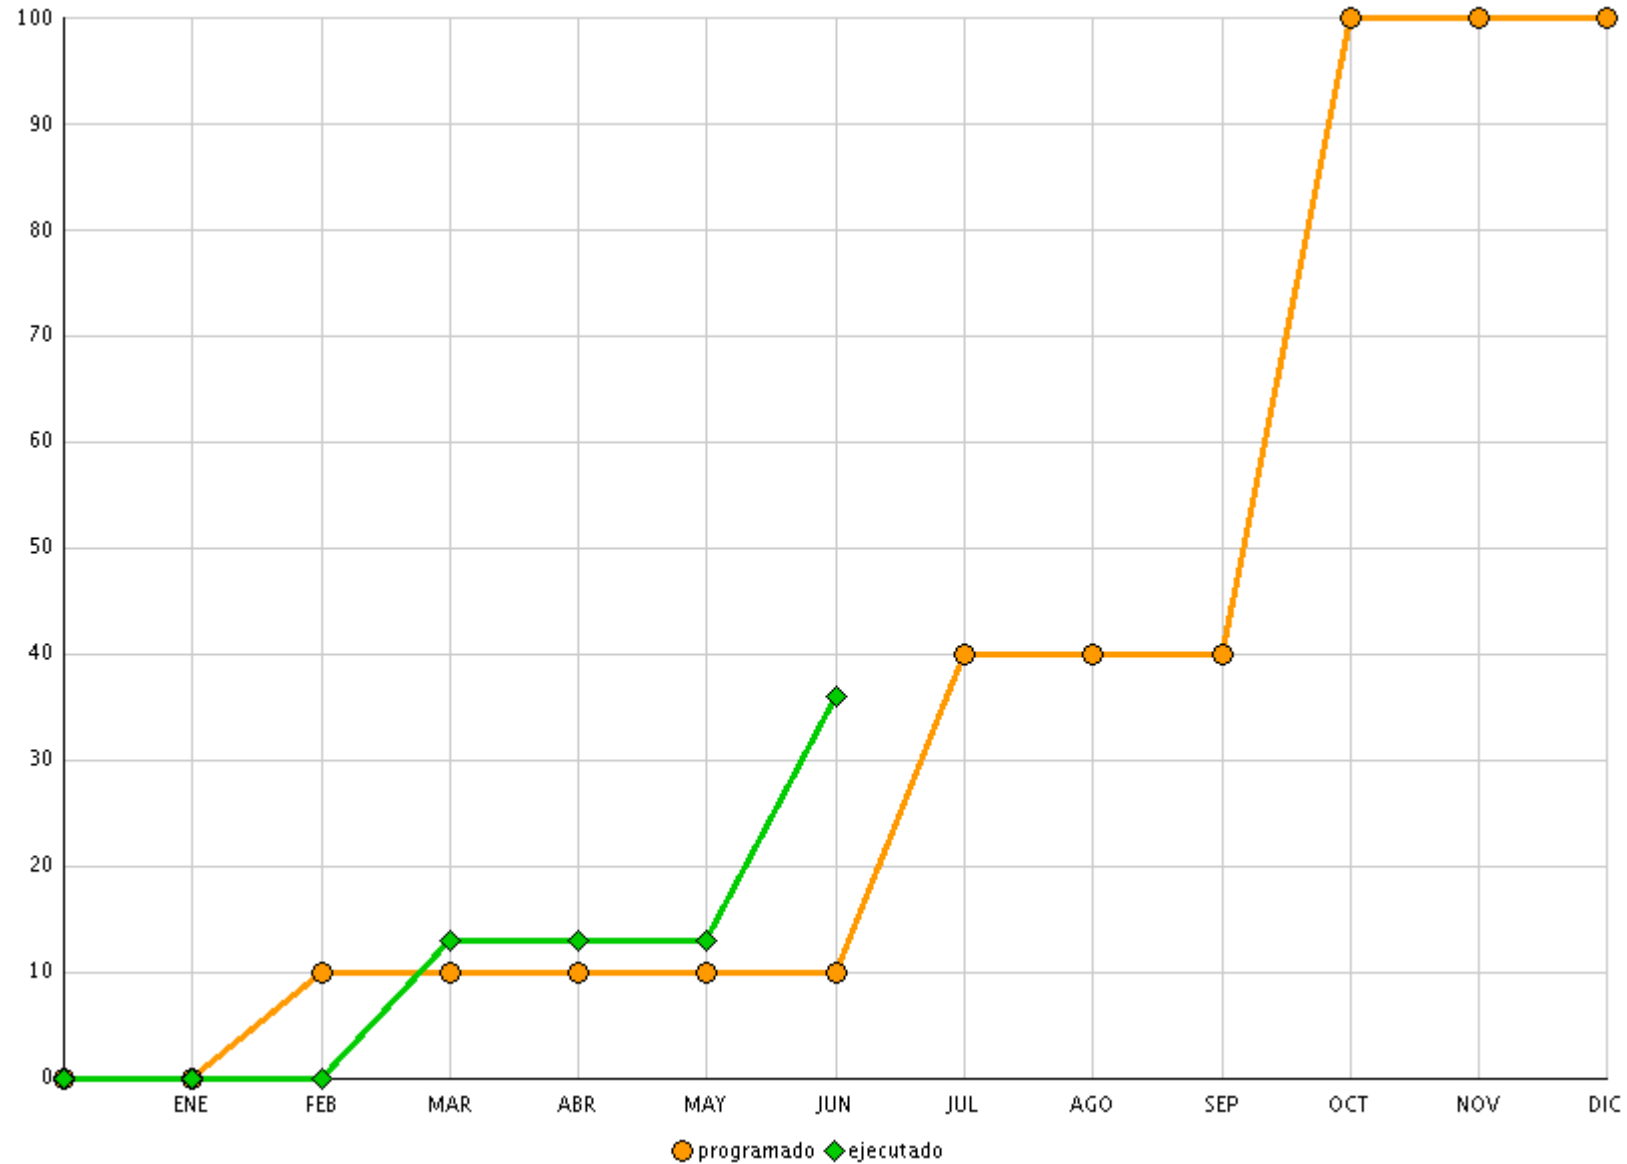


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	36.00						

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7704 Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

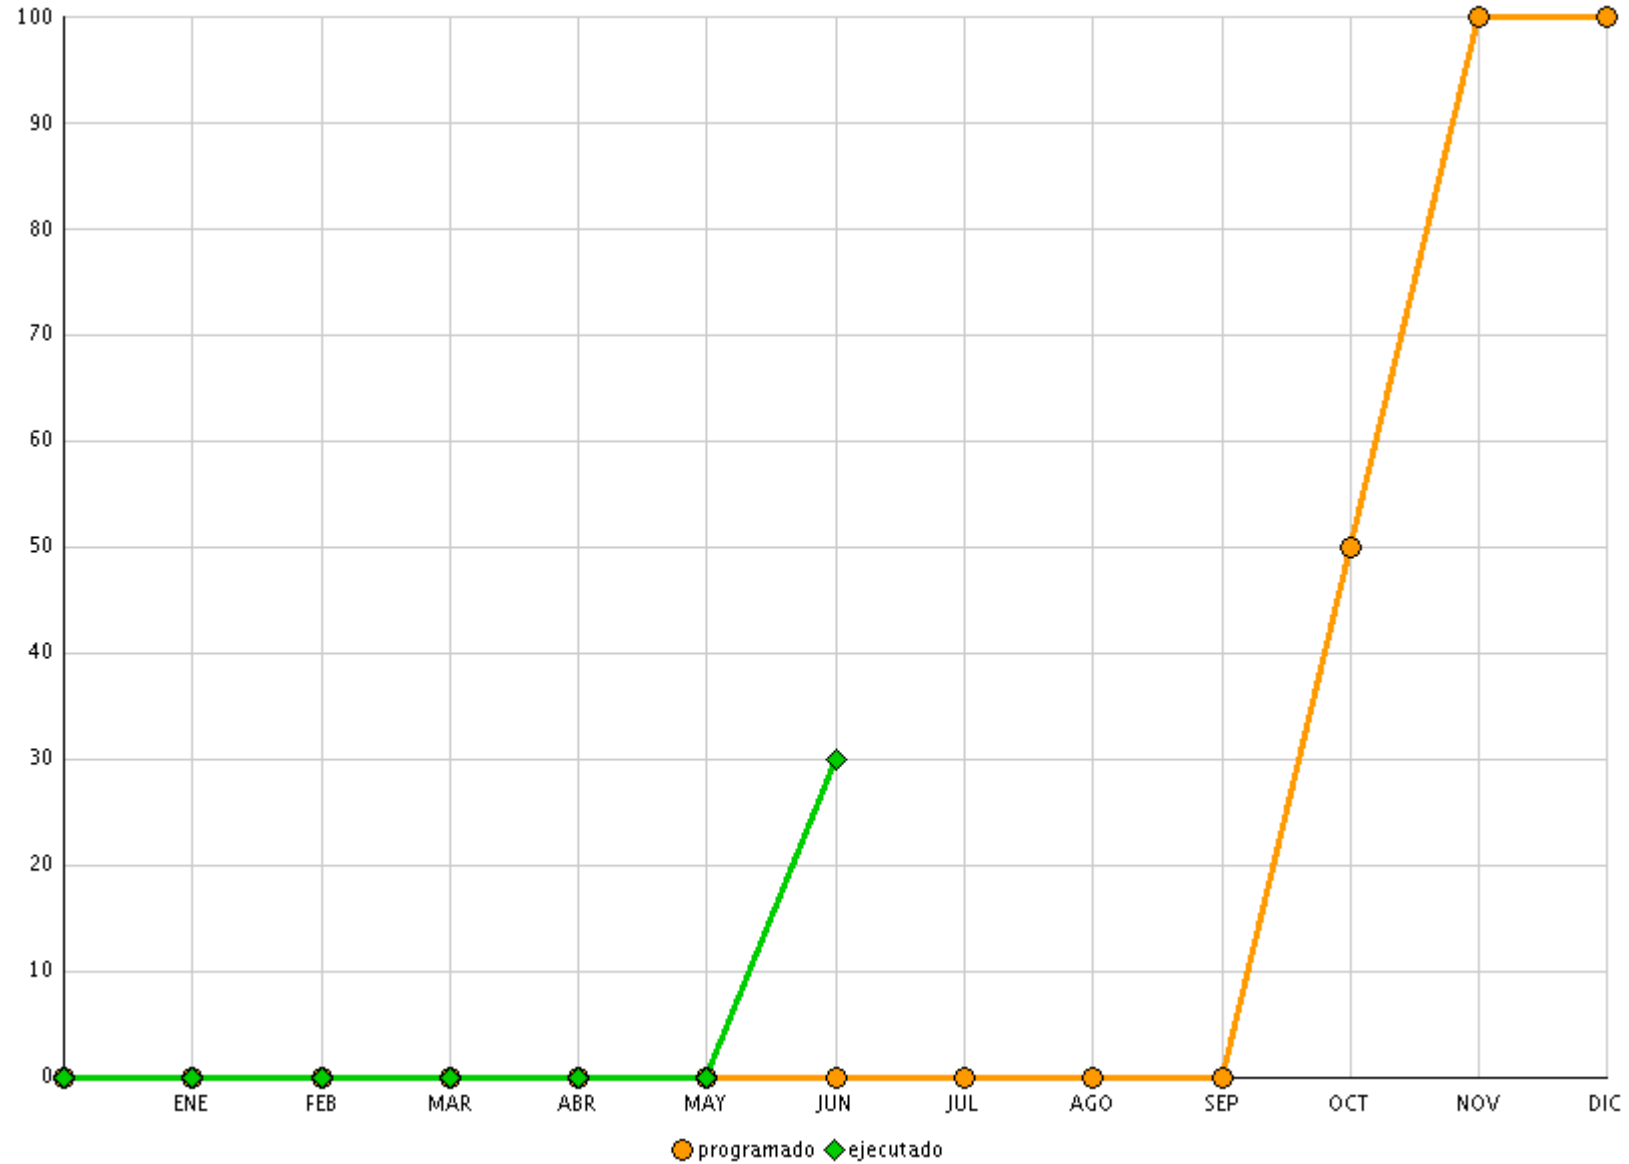

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7626 51 Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1.	APOYAR LAS ACCIONES DE FORMACION PEDAGOGICAS PPCDL	20.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	7.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		0.00		100.00	29.00	5.80	
2.	APOYAR LAS ACCIONES DE DIALOGO CON LA COMUNIDAD PPCDL	20.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	21.00	0.00		0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	37.00	7.40	
3.	ESTRATEGIA DE COMUNICACION EN MEDIOS LOCALES SOBRE CONTROL SOCIAL	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	88.00	17.60	
4.	ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	21.00	0.00		0.00		0.00		51.00		0.00		0.00		100.00	39.00	7.80	
5.	APOYAR LA EJECUCION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	20.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	55.00	11.00	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7627 53 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES										Millones de pesos 2022									
Año		Banco Proyectos IPC Valor		Presupuesto Definitivo						Ejecución Vigencia									
0			\$0						\$0.00									\$0.00	
0			\$0						\$0.00									\$0.00	
0			\$0						\$0.00									\$0.00	
0			\$0						\$0.00									\$0.00	
0			\$0						\$0.00									\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos															

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PLAN DE TRABAJO AUDITORIA SEGUIMIENTO ISO 9001:2015	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		100.00	70.00	14.00
2.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES PIGA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	20.00		0.00		0.00		80.00		0.00		0.00		100.00	7.00	0.70
3.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	5.00
4.	INCORPORAR ODS EN EL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL Y ADHESION AL PACTO GLOBAL	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	58.00	5.80
5.	REALIZAR ANALISIS DE INFORMACION BASADO EN BIG DATA	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00		0.00		0.00		60.00		0.00		0.00		100.00	36.00	3.60
6.	APOYAR LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTIVOS EN SU SUSTANCIACION PARA MINIMIZAR LAS PRESCRIPCIONES	20.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	10.00
7.	APOYAR LA EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL - PAD	20.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		0.00		100.00	61.00	12.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										51.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

235 Contraloría Distrital

7694 41 Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	ADQUISICION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS TI	*****	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	30.00		0.00		0.00		60.00		0.00		0.00		100.00	36.00	36.00		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		36.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7704 34 Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	30.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									30.00	

240 - Lotería de Bogotá

Proyecto de inversión

7516 Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá

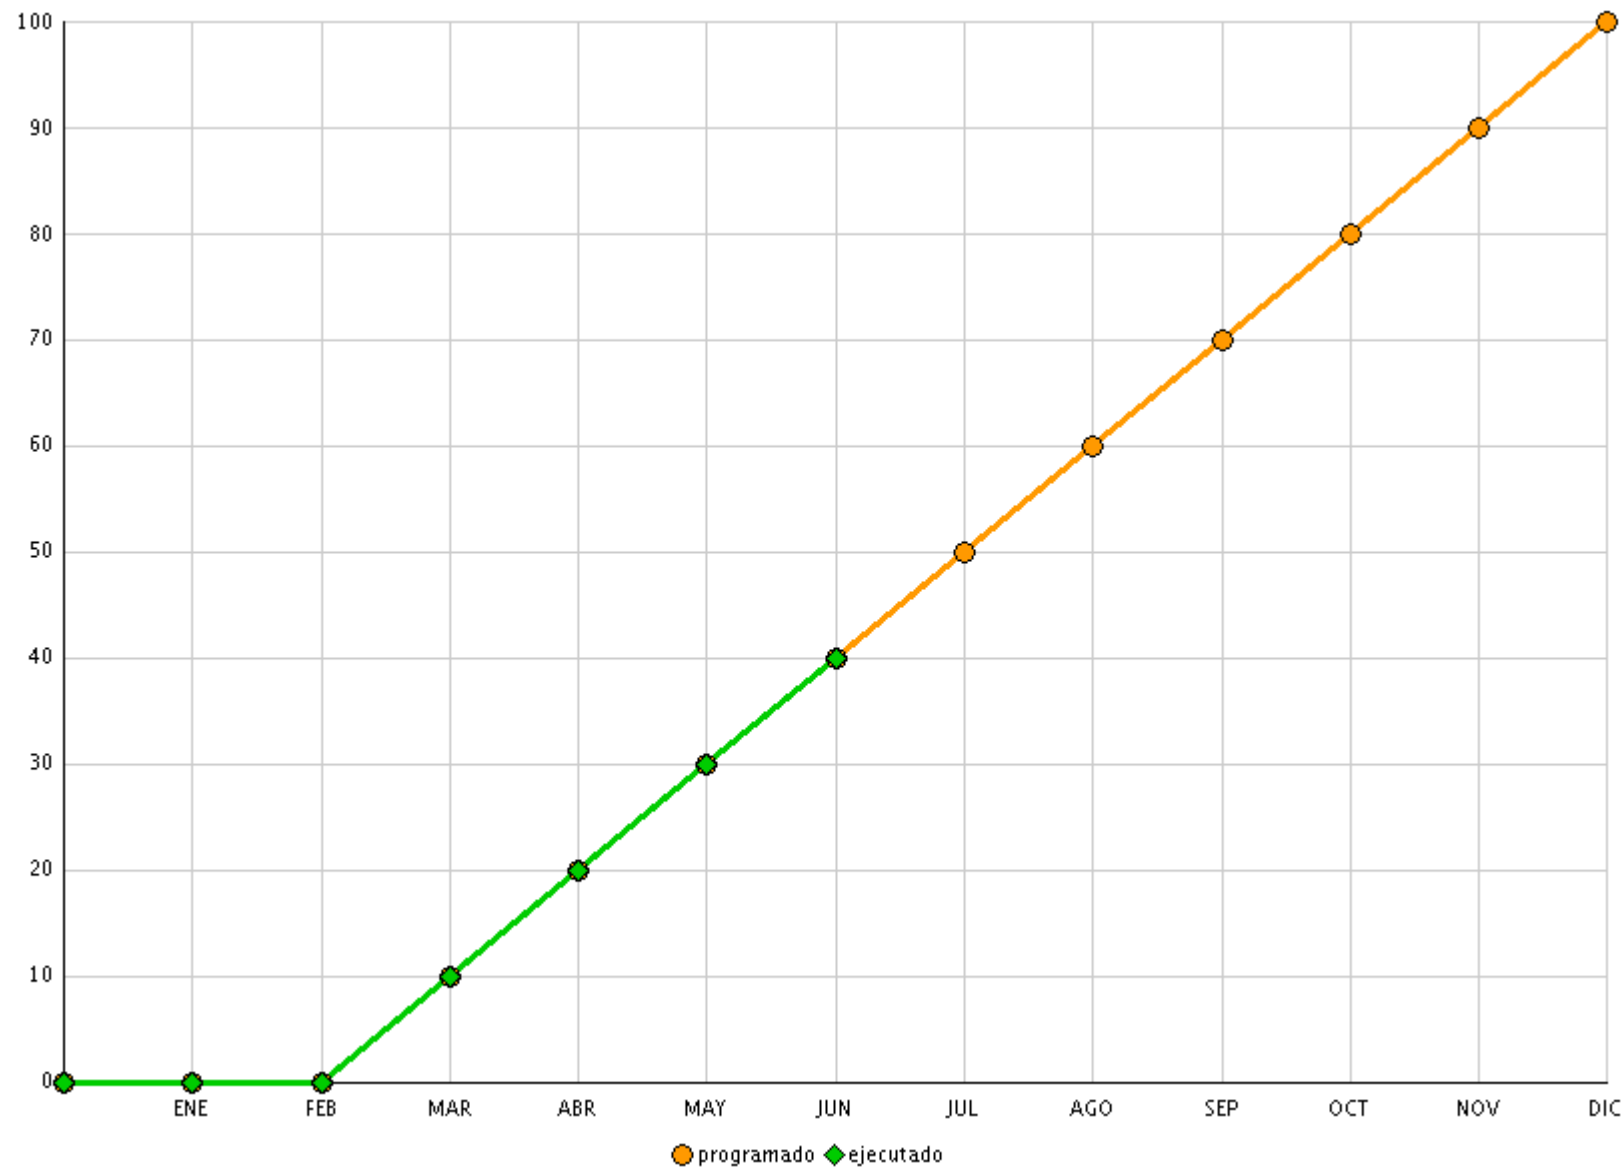

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

240 Lotería de Bogotá

7516 17 Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022


AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1.	DESARROLLAR	ACCIONES	PARA	CUMPLIR	CON	EL	PLAN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	20.00
2.	DESARROLLAR	ACCIONES	PARA	CUMPLIR	CON	LOS	PLANES	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	20.00
OPERATIVOS																																	
Total ponderación vertical					100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										40.00	

260 - Canal Capital

Proyecto de inversión

7505 Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación

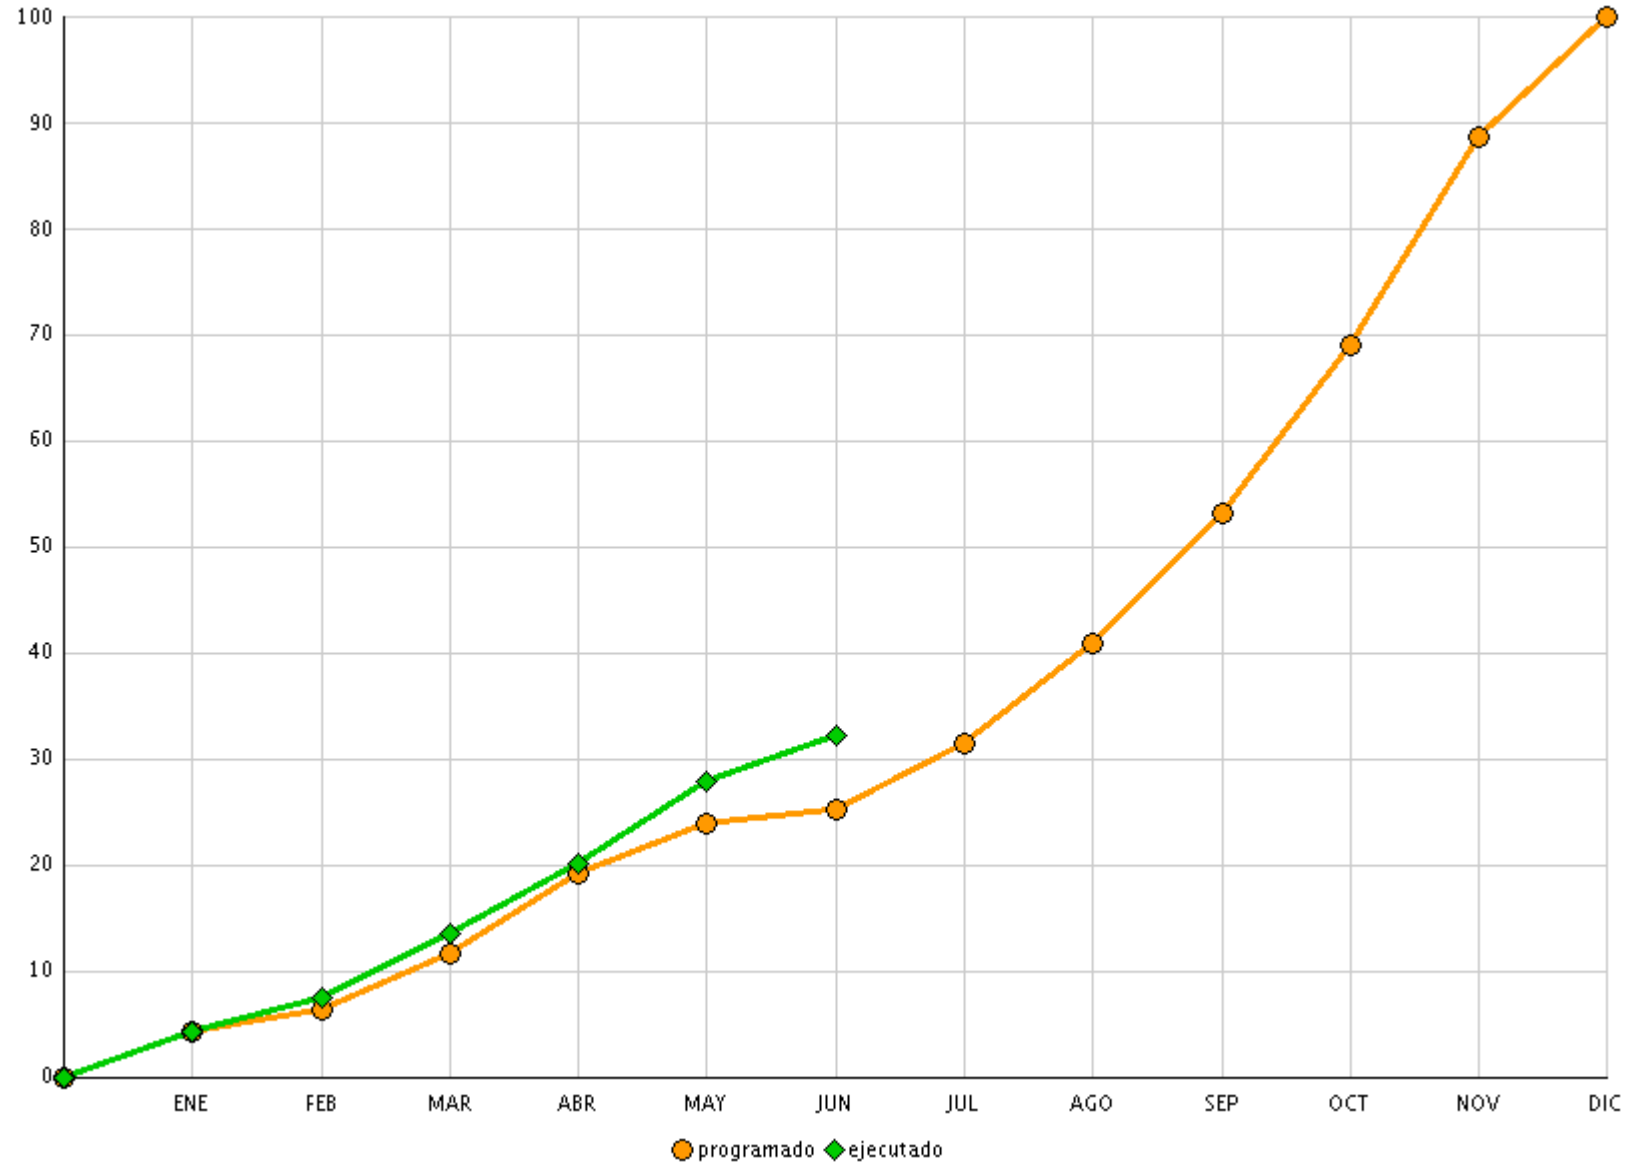


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.25	6.50	11.75	19.25	24.00	25.25	31.50	41.00	53.25	69.00	88.75	100.00
Ejecutado	4.25	7.50	13.50	20.25	28.00	32.25						

260 - Canal Capital

Proyecto de inversión

7511 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital

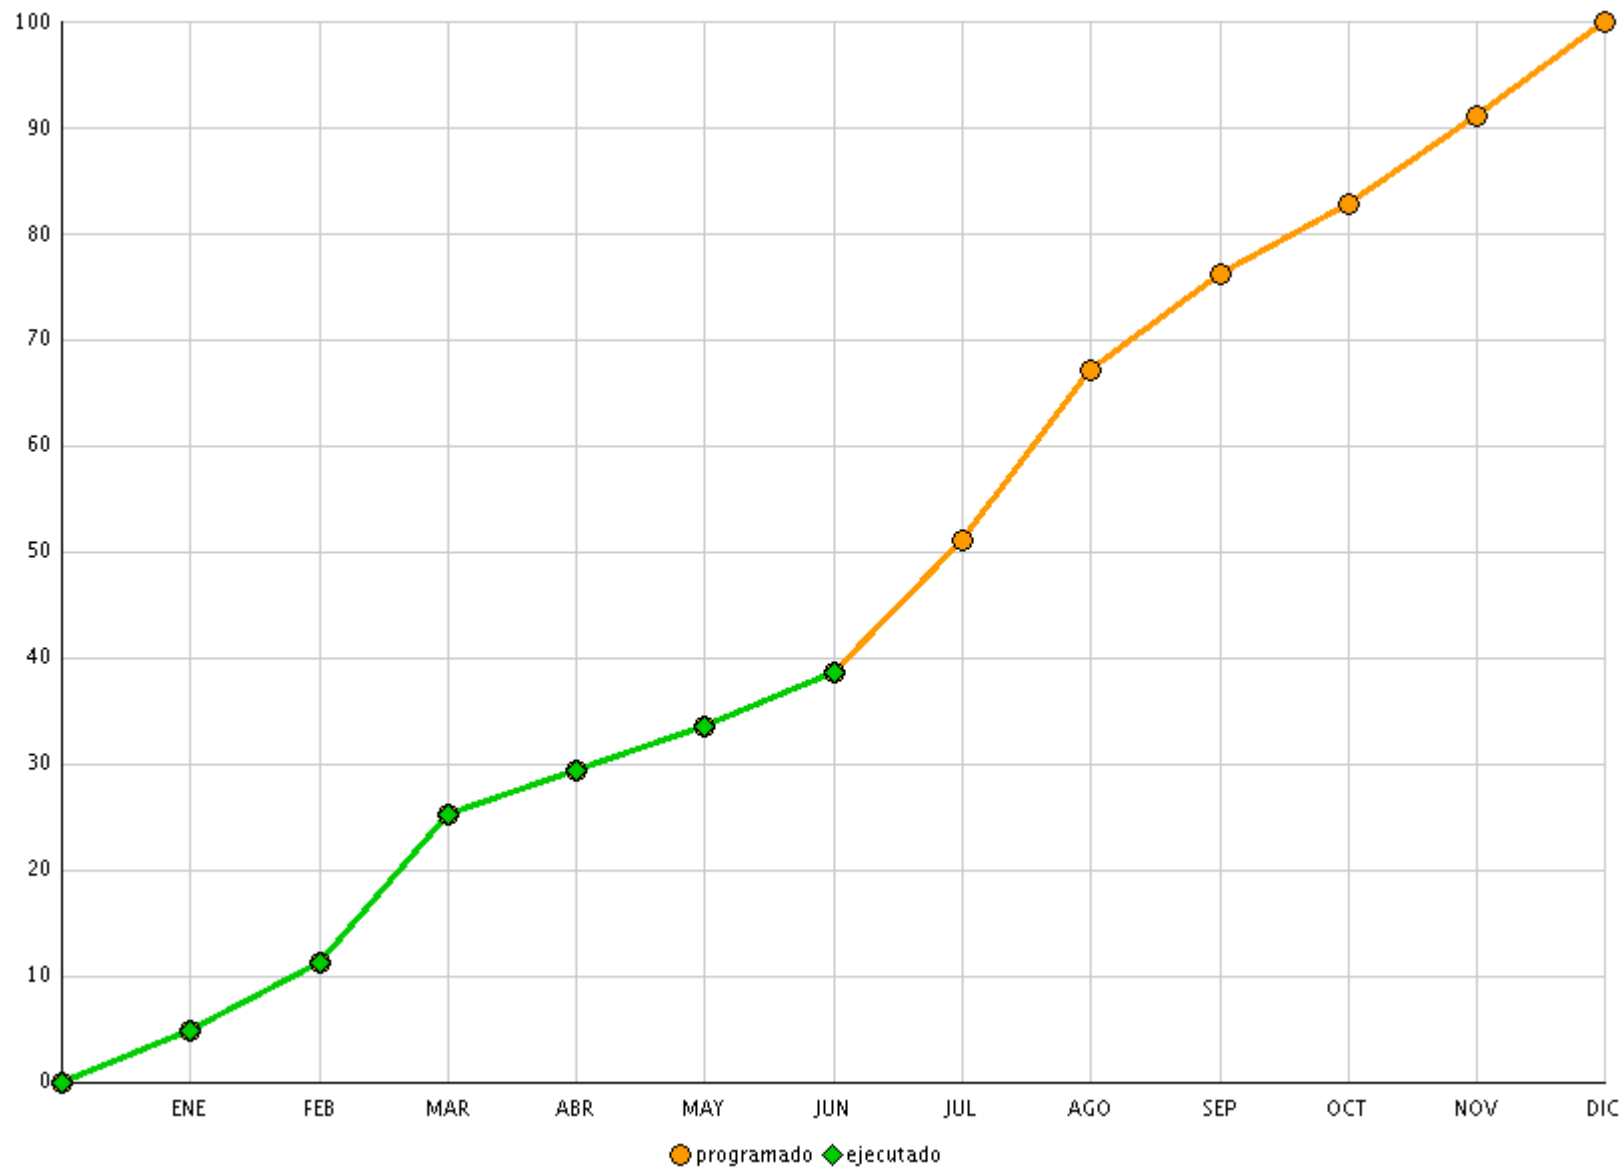

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.93	11.34	25.26	29.42	33.59	38.75	51.18	67.09	76.26	82.92	91.09	100.00
Ejecutado	4.93	11.34	25.26	29.42	33.59	38.75						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

260 Canal Capital

7505 37 Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. PREPARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN PLAN DE INVERSIONES	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		5.00		10.00		20.00		35.00		5.00		100.00	25.00	8.75		
2. ESTRUCTURACIÓN EQUIPOS HUMANO Y TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS	20.00	15.00	15.00	5.00	10.00	20.00	15.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	65.00	13.00		
3. PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	30.00	7.50		
4. RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA INGESTA Y EMISIÓN DE PROGRAMAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00		10.00		15.00		20.00		20.00		30.00		100.00	15.00	3.00		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		32.25	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

260 Canal Capital

7511 34 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR DOCE (12) SEGUIMIENTOS AL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5.00	8.50	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.50
2.	DAR CUMPLIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO PARA CADA PERIODO EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	45.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		10.00		100.00	55.00	24.75
3.	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA (QUE INVOLUCRA CENTRO DE DATOS, CONECTIVIDAD Y EQUIPOS TERMINALES)	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00		20.00		5.00		5.00		10.00		5.00		100.00	35.00	10.50
4.	LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MICROSOFT CON FINALIZACIÓN DE SOPORTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7.50		25.00		25.00		12.50		12.50		12.50		100.00	5.00	1.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 38.75																										

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7223 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

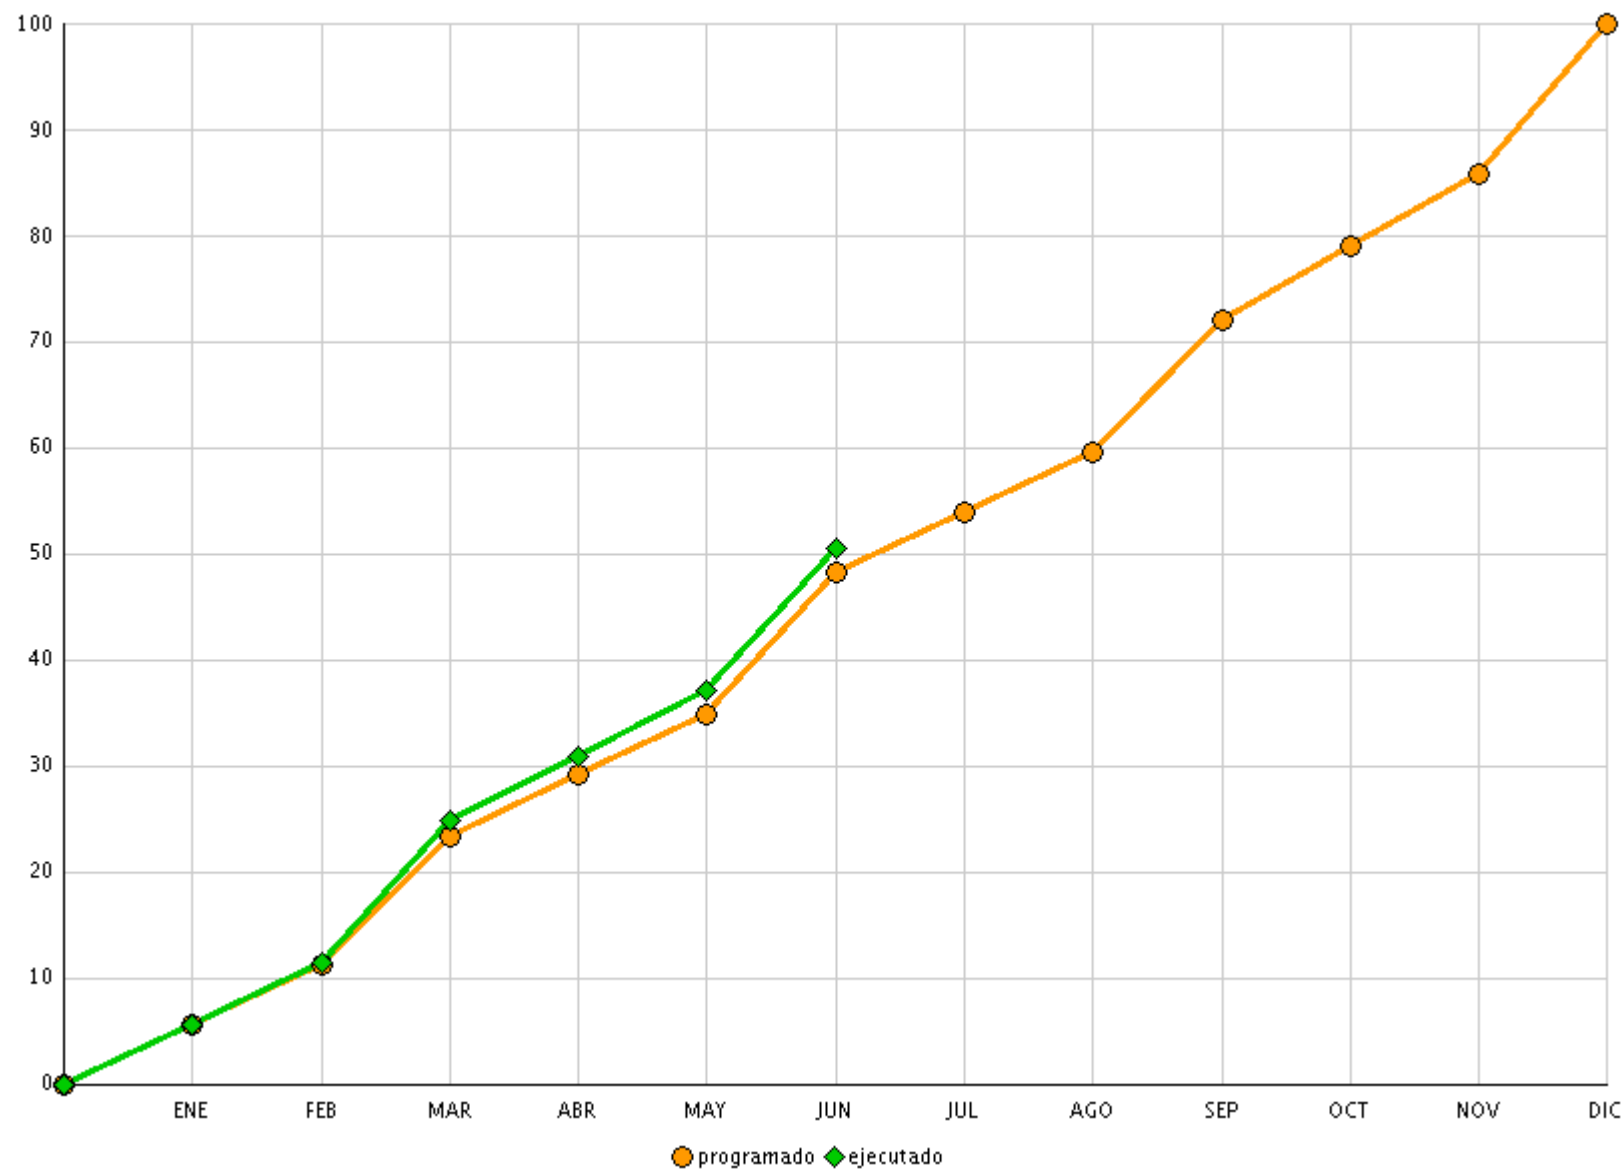


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.65	11.26	23.48	29.15	34.87	48.30	54.00	59.64	72.15	78.98	85.80	100.00
Ejecutado	5.68	11.41	24.88	30.97	37.14	50.57						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7251 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

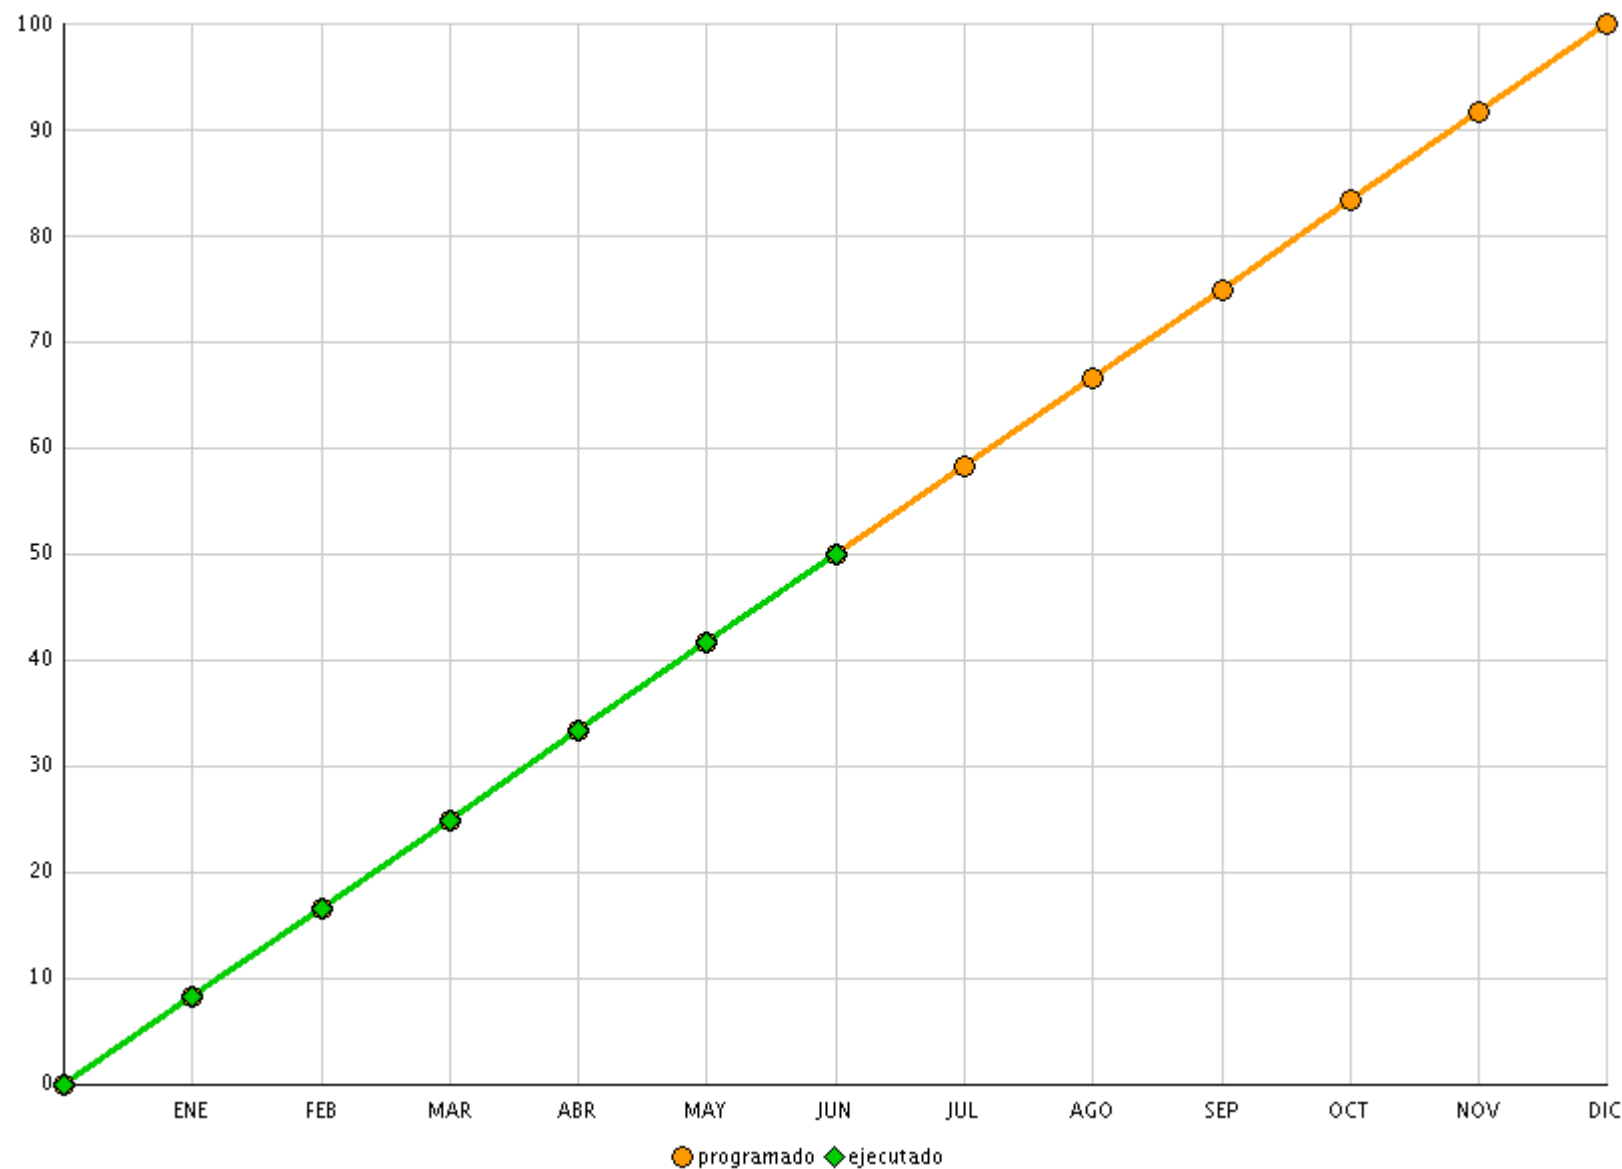


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.98	83.32	91.66	100.00
Ejecutado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7512 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

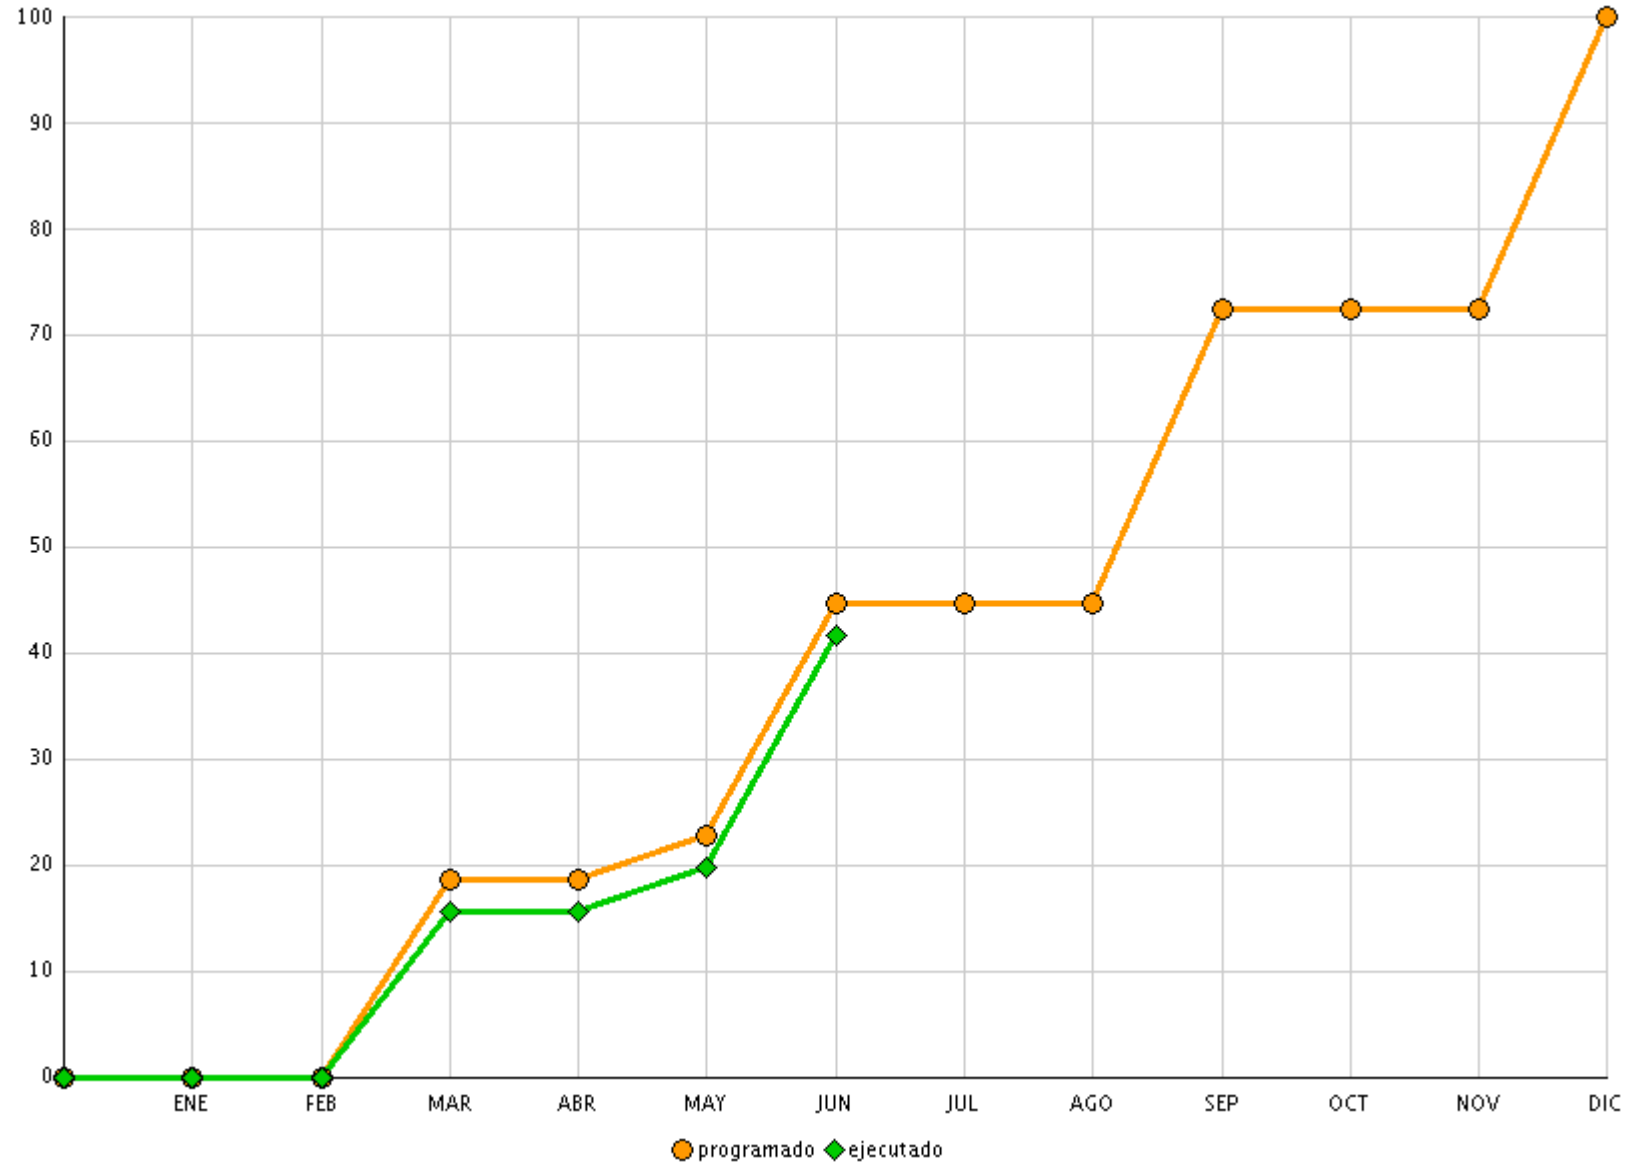


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	18.75	18.75	22.92	44.79	44.79	44.79	72.40	72.40	72.40	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	15.63	15.63	19.75	41.63						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7513 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

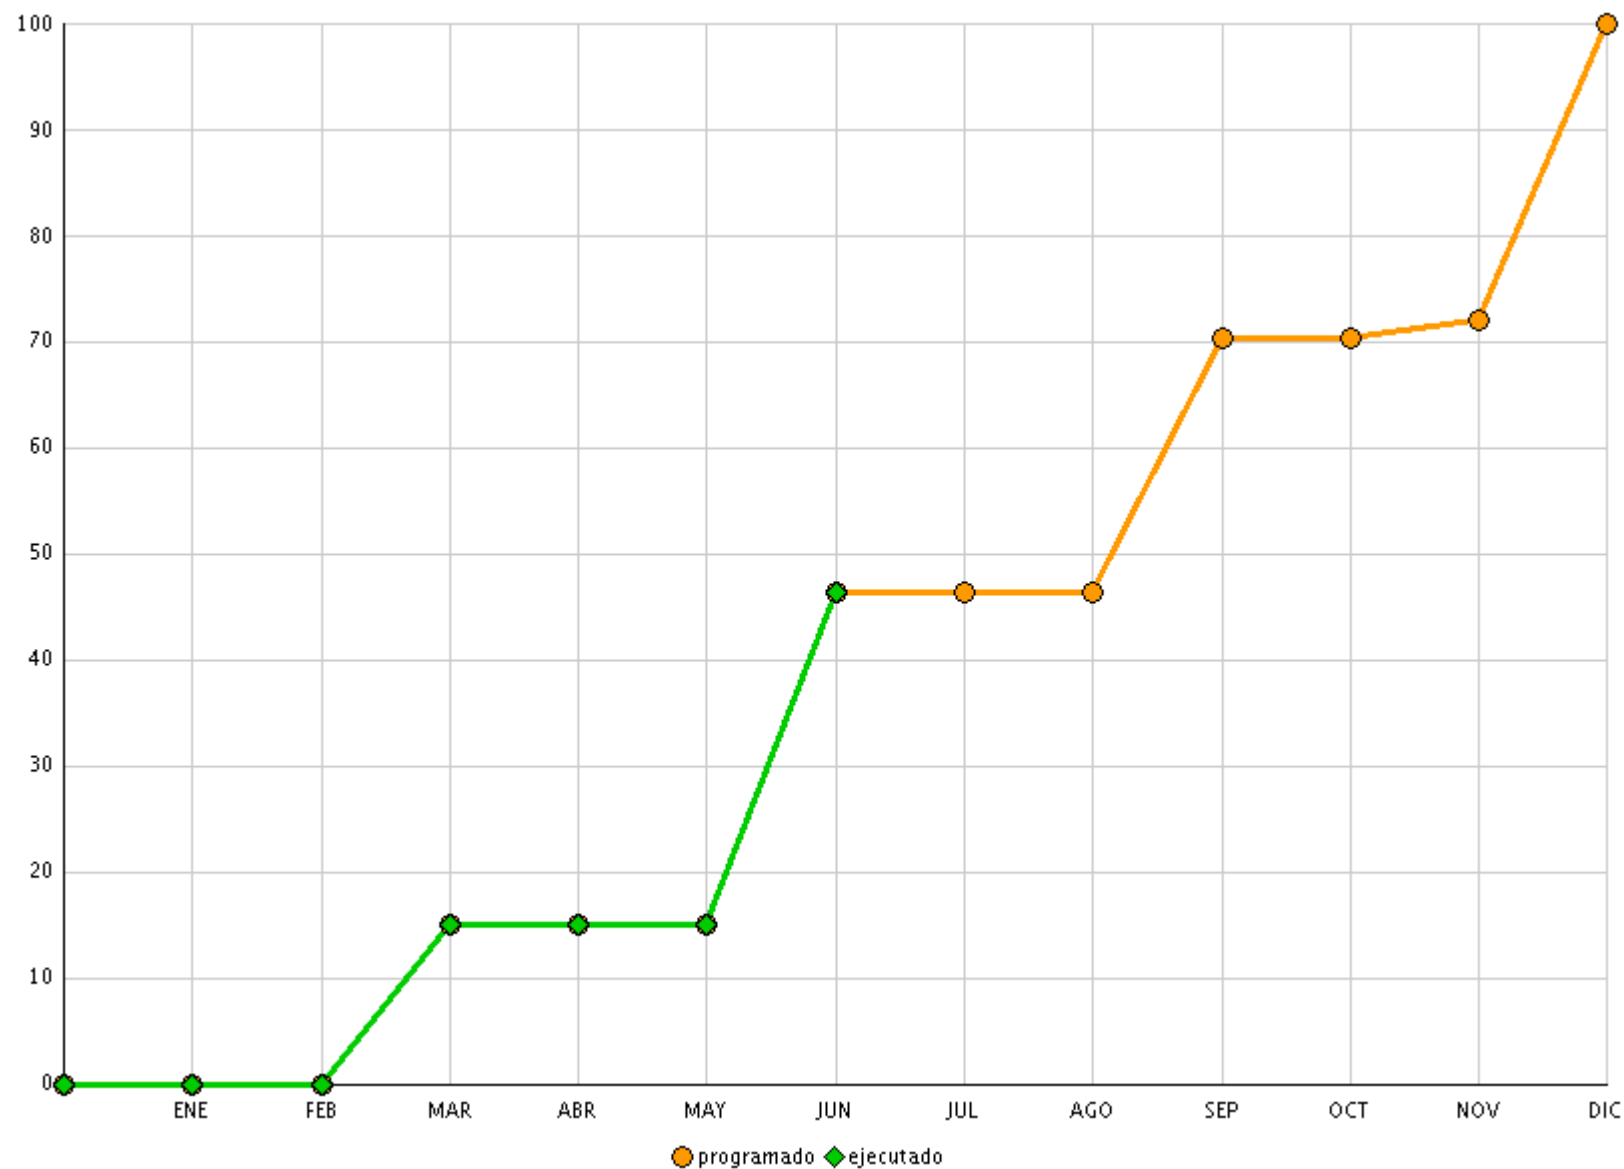


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	15.16	15.16	15.16	46.34	46.34	46.34	70.34	70.34	72.01	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	15.16	15.16	15.16	46.34						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7514 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

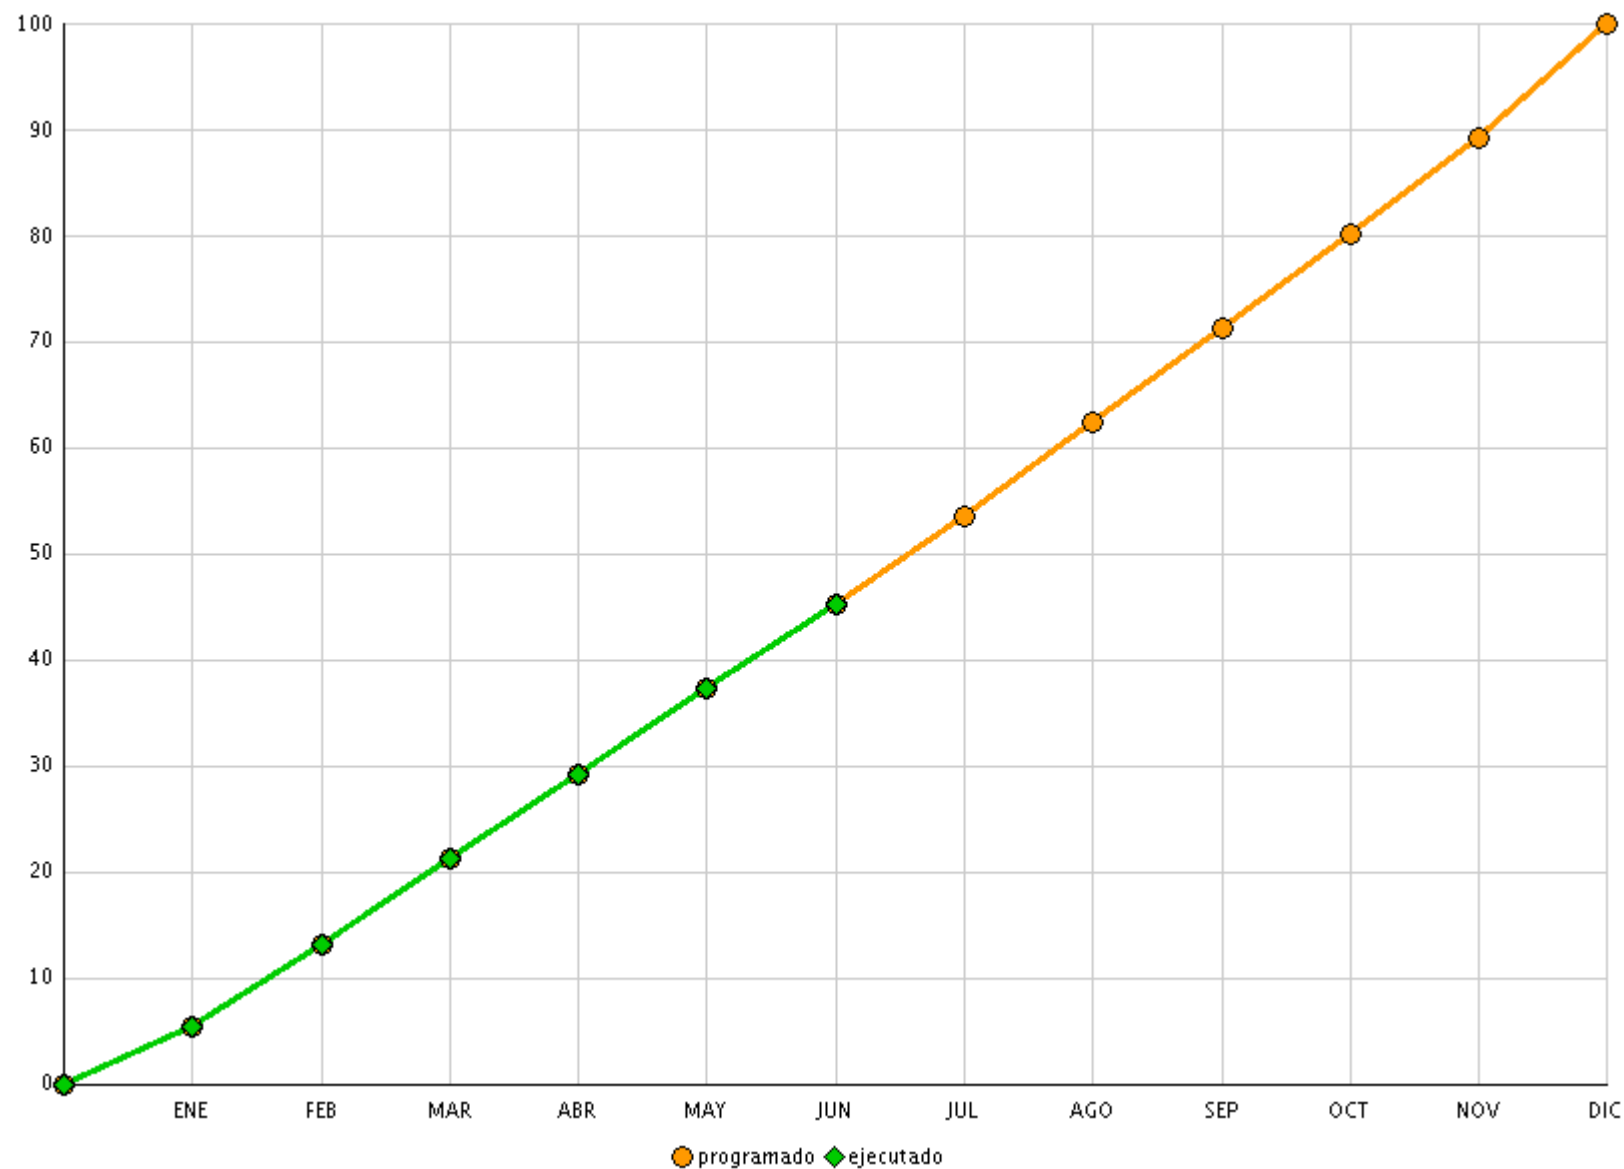


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.42	13.21	21.25	29.29	37.33	45.37	53.53	62.45	71.36	80.28	89.19	100.00
Ejecutado	5.42	13.21	21.25	29.29	37.33	45.37						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7515 Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

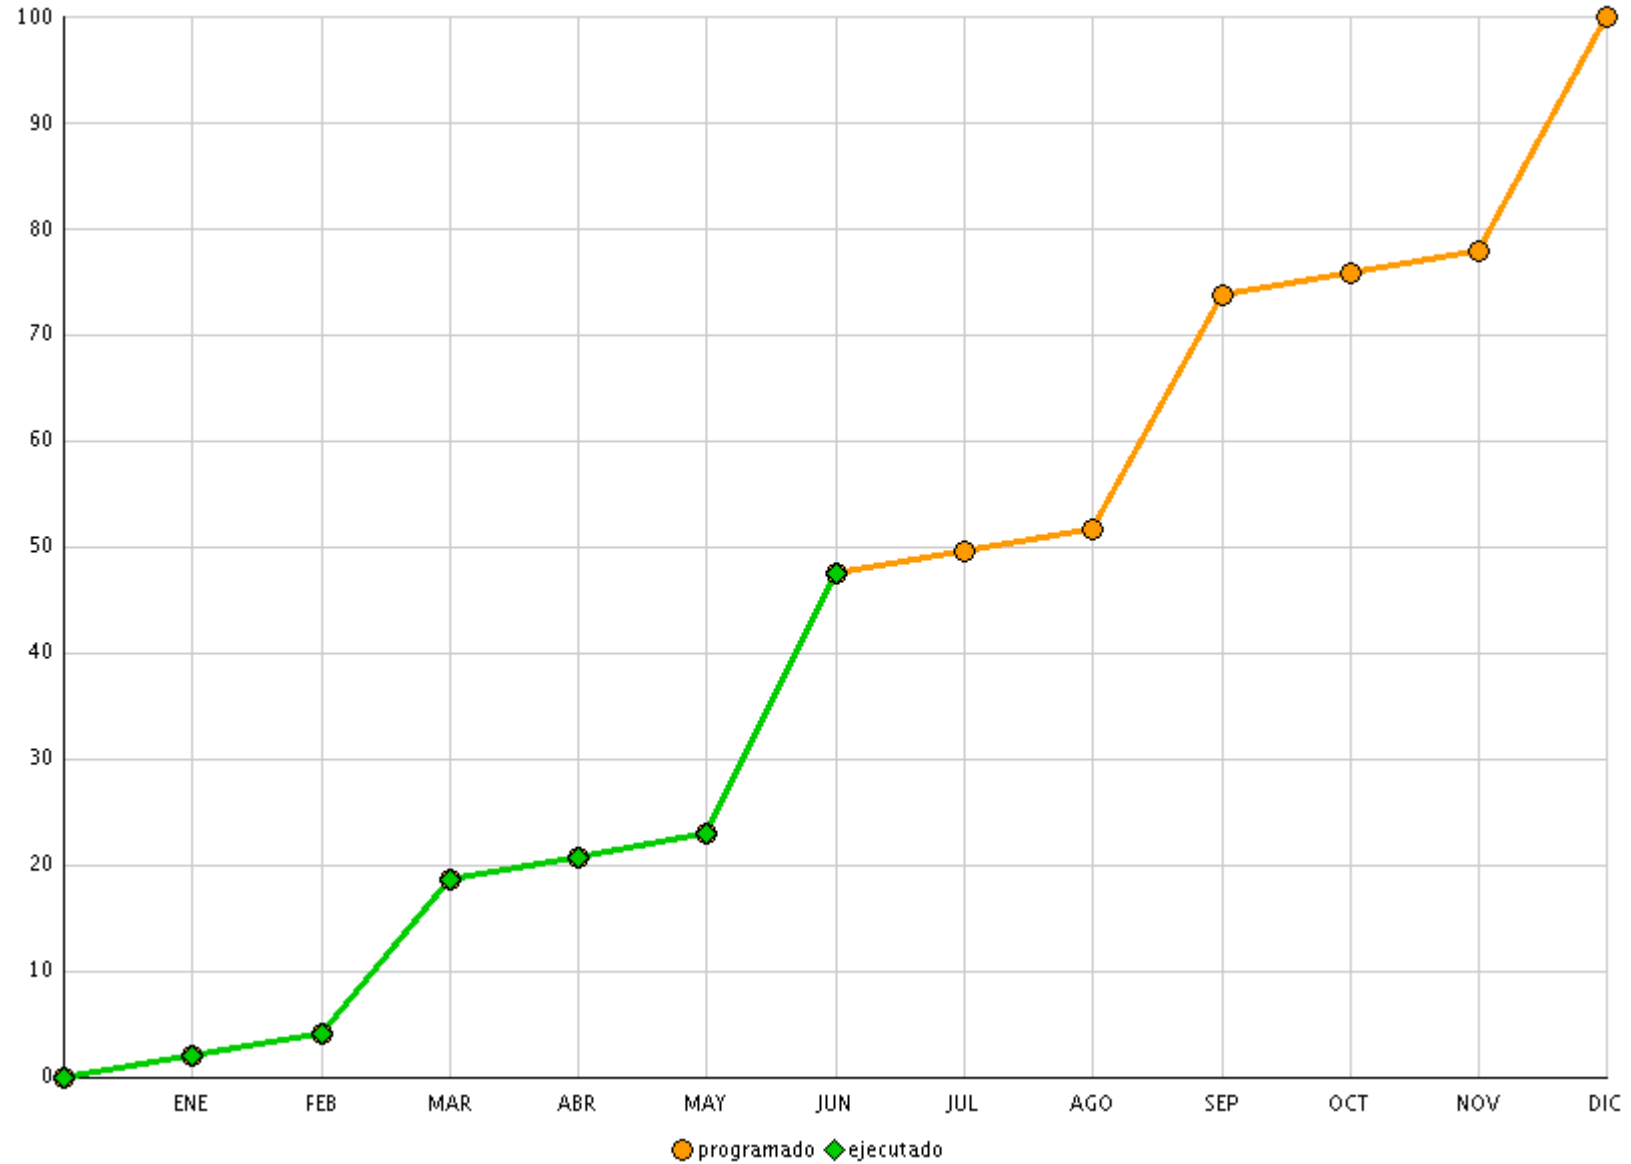


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.09	4.17	18.76	20.84	22.92	47.51	49.59	51.67	73.75	75.84	77.92	100.00
Ejecutado	2.09	4.17	18.76	20.84	22.93	47.51						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7517 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

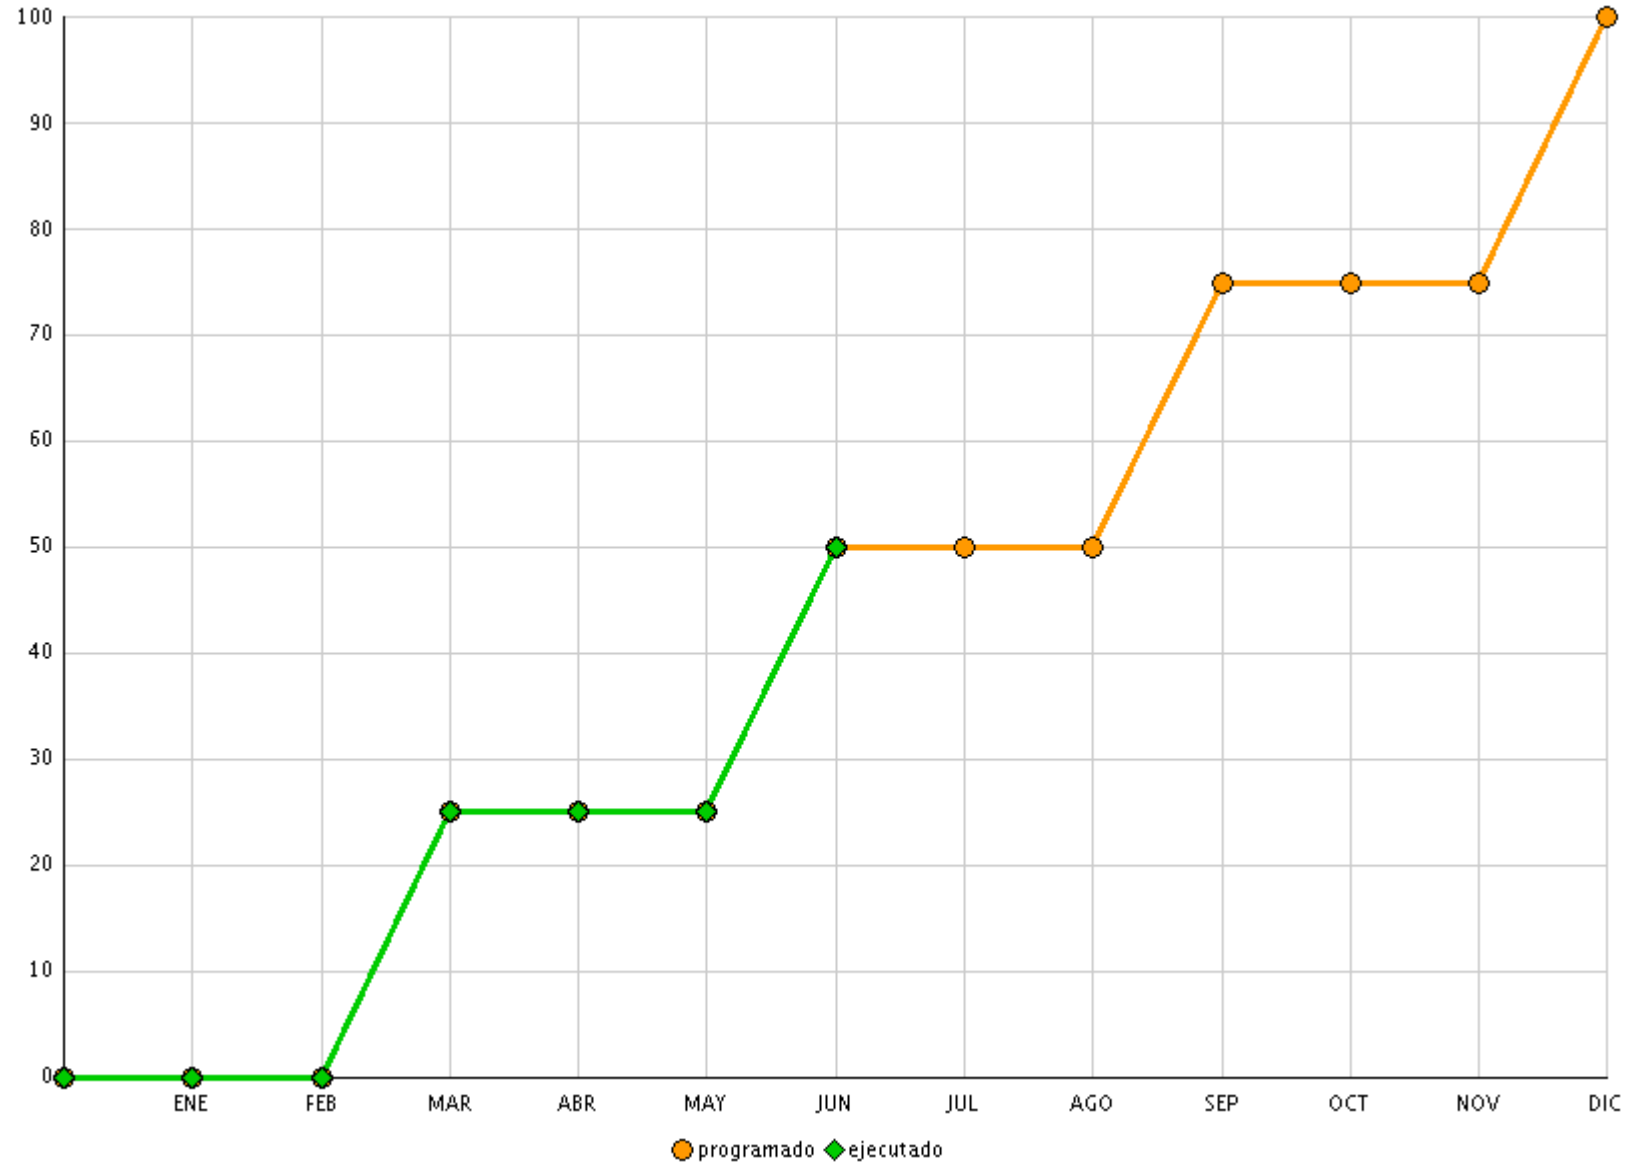

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7223 316 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. VALIDACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE FLOTA DEL COMPONENTE ZONAL DEL SITP, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PREVISTO	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00		0.00		18.00		0.00		0.00		32.00		100.00	50.00	7.16	
2. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE TOMA DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO DISMINUIR EN 2,36 MINUTOS EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN LOS COMPONENTES TRONCALY ZONAL D	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		20.00		100.00	50.00	7.14	
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS COMPONENTES TRONCAL, DE ALIMENTACIÓN Y CABLE AÉREO EN OPERACIÓN	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.00	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.65	7.09	
4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y/O CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LAS RUTAS ZONALES EN SERVICIO	14.28	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25		6.25		6.25		14.60		14.60		14.55		100.00	37.50	5.36	
5. GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA PARA CUBRIR EL DIFERENCIAL TARIFARIO DE LOS AGENTES DEL SISTEMA	14.28	8.32	8.50	8.01	8.87	8.24	16.98	8.46	11.43	8.82	11.94	8.72	9.07	8.71		8.23		8.32		8.20		8.16		7.81		100.00	66.79	9.54	
6. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS, DE ESTACIONES DEL SISTEMA	14.28	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.04	7.15	
7. GESTIONAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA TRONCAL A CARGO DE LA ENTIDAD	14.28	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.01	7.14	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								50.57	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7251 238 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EL MEJORAMIENTO DE 43 ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14		
2.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA DISEÑAR Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14		
3.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA DISEÑAR Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PATIOS TRONCALES Y ZONALES DEL SITP	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14		
4.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE CORREDORES TRONCALES DE TRANSPORTE MASIVO	14.32	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.16		
5.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LA ADECUACIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA SÉPTIMA	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14		
6.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14		
7.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL COMPONENTE BRT	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	50.00	7.14		
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.98	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7512 13 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO:	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	: 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	3.13
2.	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		37.50		0.00		0.00		37.50		100.00	25.00	3.13
3.	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
4.	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASOCIADA A LOS PROCESOS SOPORTE DE LA ENTIDAD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
5.	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
6.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DE OAP Y DEFINIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2022	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
7.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2022	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
8.	PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG 2022 (...)	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.00	0.00	0.00	0.00		0.00		33.33		0.00		0.00		33.34		100.00	33.00	4.13

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	41.63

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7513 15 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.33
2.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.33
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DISEÑO GRÁFICO	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		50.00		100.00	25.00	4.17
4.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.33
5.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00		0.00		14.00		0.00		0.00		43.00		100.00	43.00	7.16
6.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		30.00		0.00		10.00		0.00		100.00	60.00	10.02
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									46.34	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7514 17 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE ARTICULACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ITS NO SIRCI A BORDO DE LA NUEVA FLOTA, CON LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE GESTIÓN	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	12.50
2.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS DE LOS GTFS, COMO UNO DE LOS MECANISMOS DE SERVICIOS ITS DE INFORMACIÓN AL USUARIO A TRAVES DE HERRAMIENTAS COMO LA TR	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	12.50
3.	DISEÑAR Y ESTRUCTURAR TÉCNICAMENTE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON EL CONCESIONARIO SIRCI, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA RENOVACIÓN Y MEJORAS DEL SERVICIO ITS D	25.00	3.00	3.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.50		100.00	45.50	11.38
4.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI DE TRANSMILENIO S.A.	25.00	2.00	2.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		10.00		10.00		10.00		10.00		17.00		100.00	36.00	9.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									45.37	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7515 18 Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA, PARA DIRECCIONAR LAS CAPACIDADES Y OFERTA DISTRITAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD FÍSICA, HUMANA, CIUDADANA Y VIAL DE	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	12.50	
2.	ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS O CONTINGENCIAS OCURRIDAS EN EL SISTEMA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	40.00	10.00	
3.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL SISTEMA	25.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.04	12.51	
4.	FORTALECER E IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	12.50	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		47.51

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7517 15 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECER E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO ANTI-EVASIÓN	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									50.00	

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7506 Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá

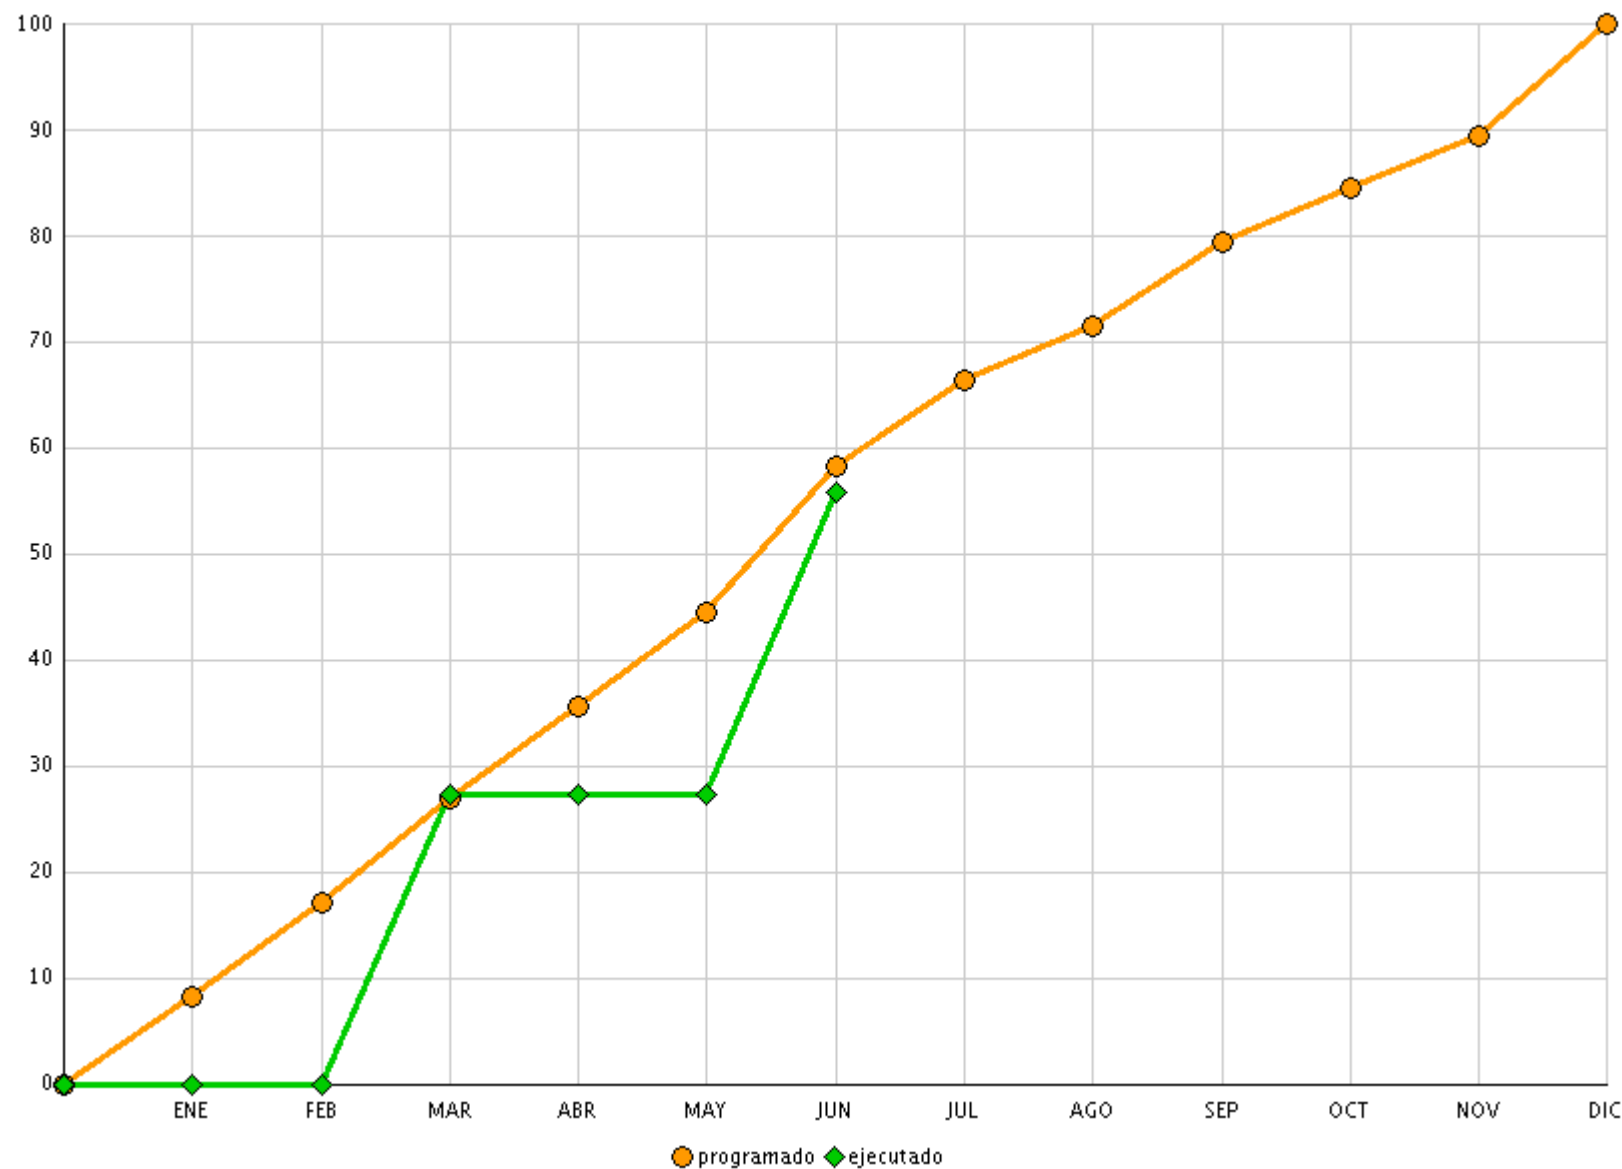


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	17.09	26.90	35.69	44.49	58.30	66.49	71.48	79.49	84.48	89.48	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	27.32	27.32	27.32	55.91						

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7507 Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá

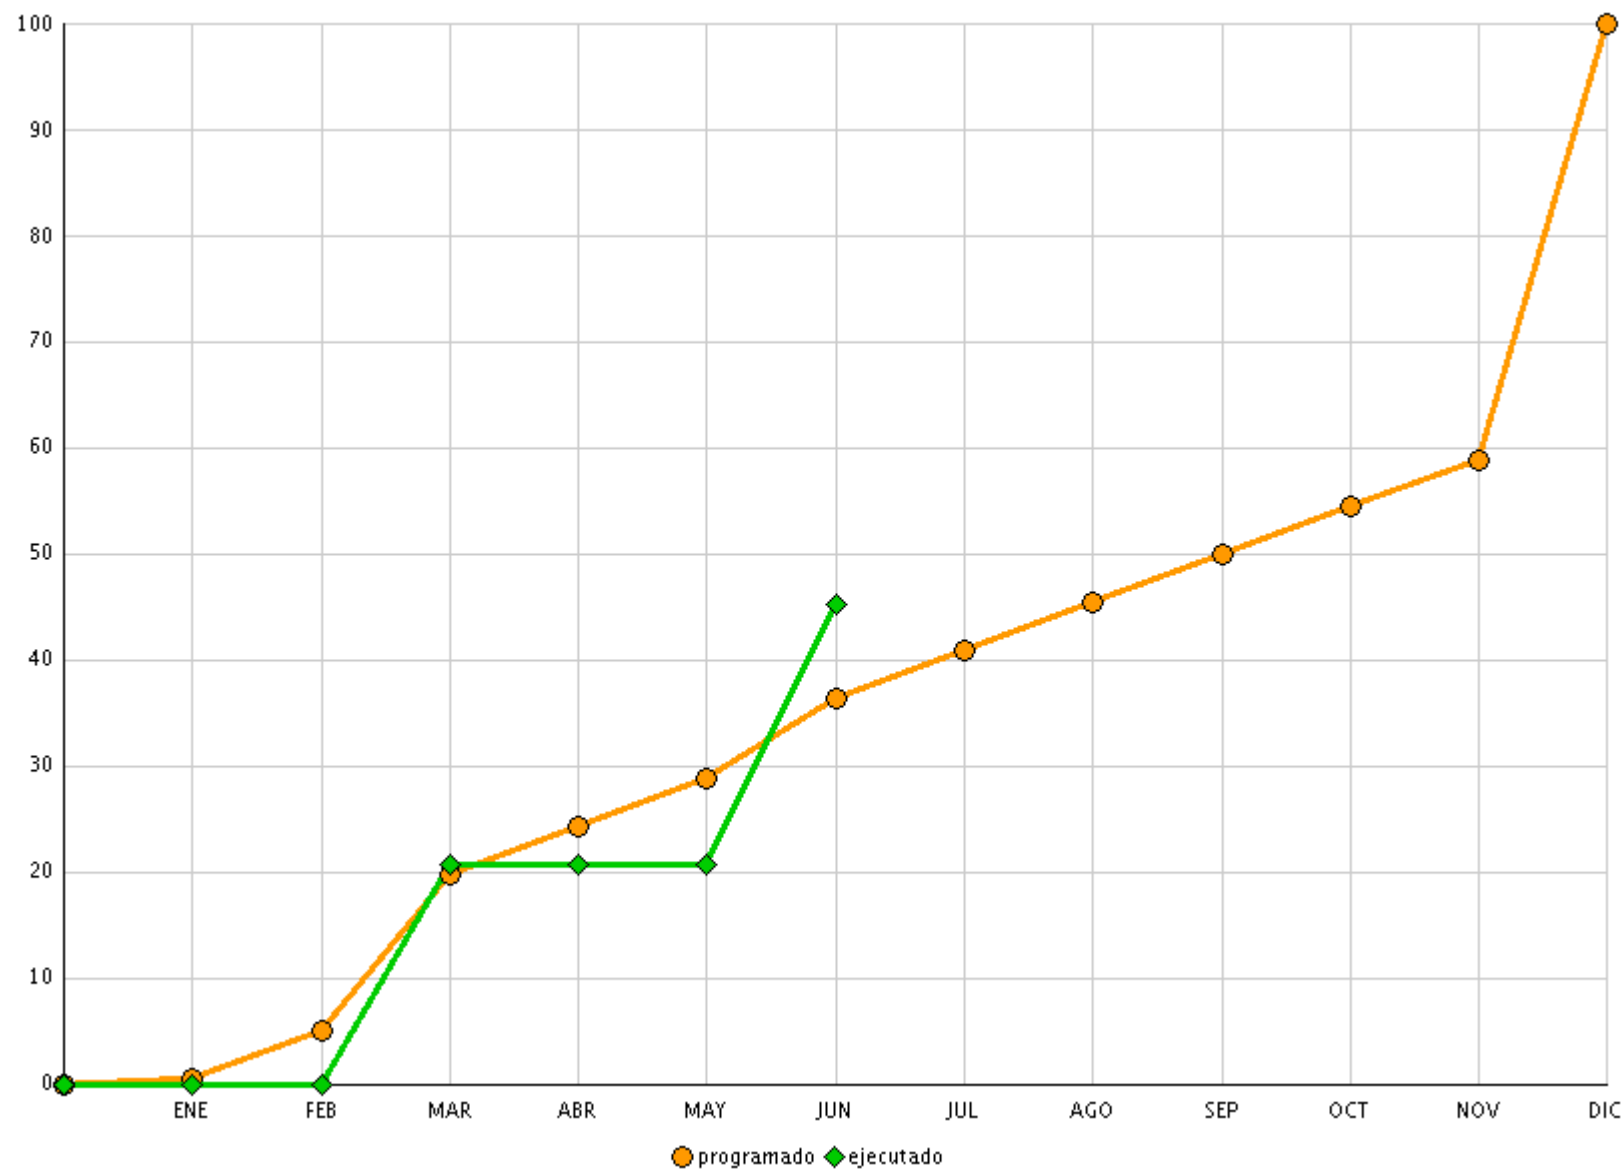


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.50	5.00	19.81	24.31	28.81	36.44	40.94	45.44	49.94	54.44	58.94	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	20.79	20.79	20.79	45.26						

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7508 Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá

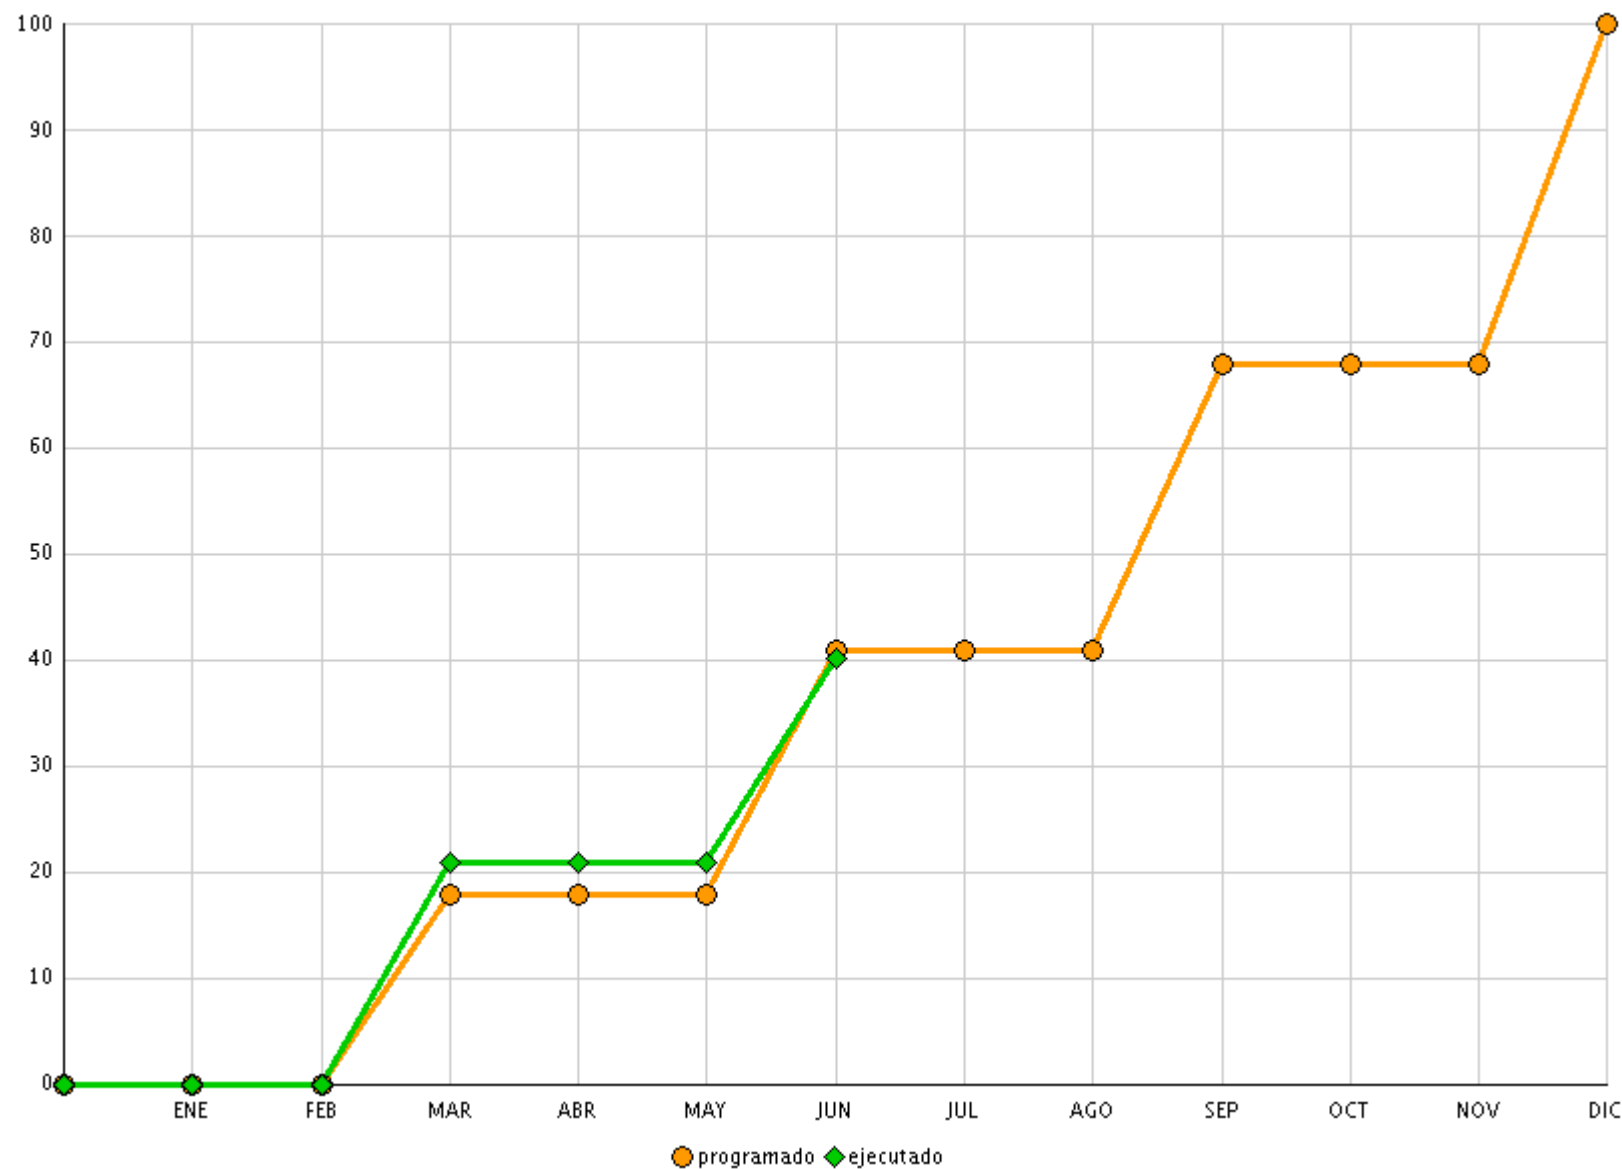


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	41.00	41.00	41.00	68.00	68.00	68.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	20.85	20.85	20.85	40.25						

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7509 Adquisición y gestión de suelo Bogotá

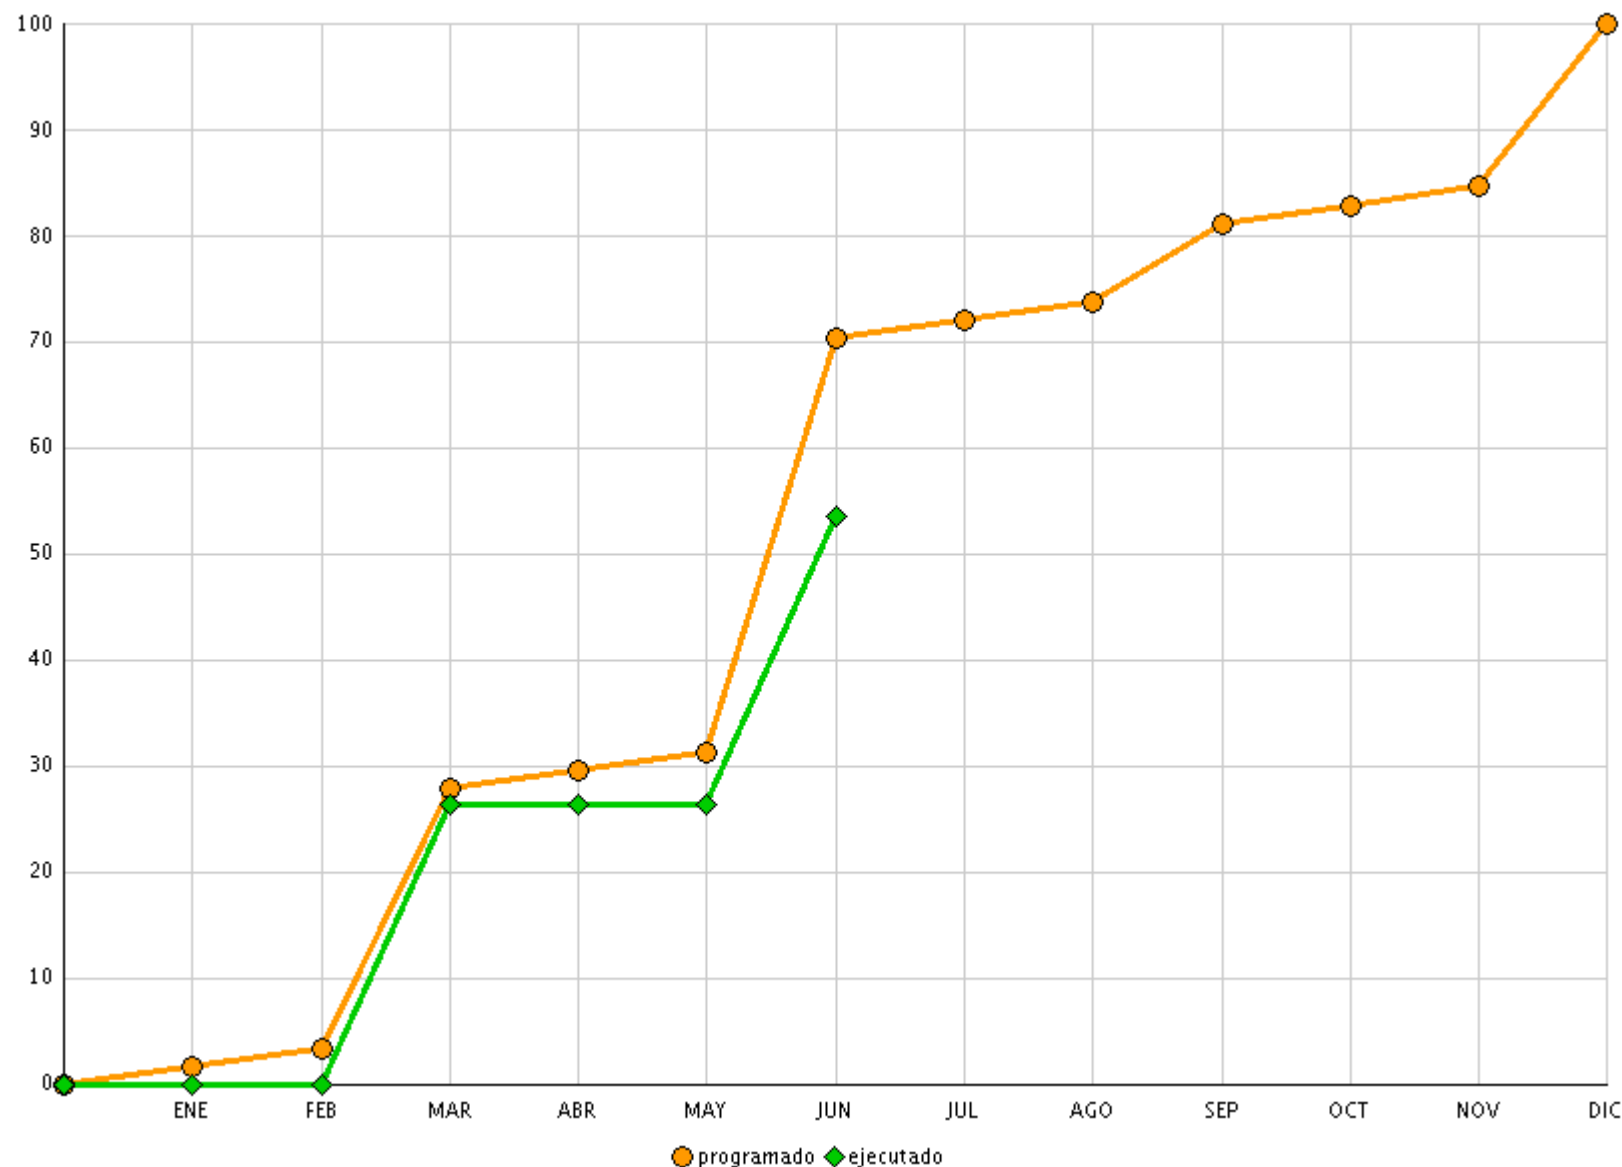

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.70	3.40	27.90	29.60	31.30	70.30	72.00	73.70	81.20	82.90	84.80	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	26.50	26.50	26.50	53.50						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7506 29 Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. DEFINICIÓN DEL MODELO DE RELACIONAMIENTO CON EL DISTRITO QUE PRIORICE LAS ACTUACIONES URBANAS DE LA ERU	10.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	42.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	33.00	16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	7.50	
2. EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		30.00		100.00	25.00	2.50	
3. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE MARCA DE LA EMPRESA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.50	
4. PARTICIPAR EN UNA AUDITORÍA PARA OPTAR POR LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD DE LA EMPRESA BAJO LOS CRITERIOS DE LA NORMA ISO 9001:2015.	10.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	42.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	42.00	16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	84.00	8.40	
5. ELABORAR EL MAPA DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA	5.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	25.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	25.00	8.30		8.30		8.40		8.30		8.30		8.40		100.00	50.00	2.50	
6. CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL	10.00	8.35	0.00	8.35	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.02	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	5.00	
7. IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN 2022 DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA 2020 A 2024	5.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.98	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50	
8. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PETH (PIC- PSST- BIENESTAR E INCENTIVOS- PTH- CULTURA)	10.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	16.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	33.18	8.33		8.33		8.33		8.33		8.35		8.35		100.00	49.98	5.00	
9. DEFINIR UNA PROPUESTA PARA EL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO CON EL MODELO DE OPERACIÓN PROPUESTO Y LA METODOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL.	10.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.90	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	16.75	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	41.65	4.17	
10. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA JD DE UNA PROPUESTA DE SU NUEVO REGLAMENTO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN	5.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	50.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	27.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	77.00	3.85	
11. ELABORACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO	10.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	45.01	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	70.00	7.00	
12. ELABORA, SOCIALIZAR, APROBAR Y DIVULGAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, REALIZANDO EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO CORRESPONDIENTE.	10.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	25.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	25.00	8.30		8.30		8.40		8.30		8.30		8.40		100.00	50.00	5.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								55.91	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7507 36 Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REVISAR LA POTENCIALIDAD DE PREDIOS PRIORIZADOS Y SU PREFACTIBILIDAD PARA LA GESTIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LA EMPRESA	6.25	1.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.86	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.86	2.87
2.	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS CON EL FIN DE DEFINIR LA ESTRATEGIA PARA QUE LA ERU PUEDA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR FUNCIONES COMO OPERADOR URBANO	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	31.14	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	3.13
3.	GESTIONAR Y DEFINIR CON LAS PARTES INTERESADAS (SDHT, CAJAS DE COMPENSACIÓN, ENTRE OTROS) LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA PRIORIZADOS POR LA EMPRESA	6.25	1.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.86	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.86	2.87
4.	ADELANTAR LAS ACCIONES REQUERIDAS (ESTRUCTURACIÓN MODELOS DE NEGOCIO, PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVOCATORIAS, ENTRE OTROS) PARA LOS PROYECTOS QUE ESTÁN EN CURSO	6.25	1.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.86	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.86	2.87
5.	ADELANTAR LAS ACCIONES REQUERIDAS (ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS, VINCULACIÓN DE FIDEICOMITENTES Y SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN) PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA VIGENCIA.	6.25	1.00	0.00	9.00	0.00	9.00	19.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	37.00	2.31
6.	PROGRAMAR Y PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR EL FONDO DE COMPENSACIONES OBLIGADOS VIS Y VIP.	6.25	1.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.86	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.86	2.87
7.	REALIZAR LA ESCRITURACIÓN Y ENTREGA DE PREDIOS PRODUCTO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS NEGOCIOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN.	6.25	1.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.86	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	8.14	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	27.00	1.69
8.	DESARROLLAR PROYECTOS INMOBILIARIOS CON EL SECTOR PRIVADO	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		80.00		100.00	45.86	2.87
9.	DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE INGRESOS PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA 2022 EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	6.25	1.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.86	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	19.14	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	38.00	2.38
10.	OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		80.00		100.00	47.00	2.94
11.	REALIZAR DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PODRÍAN GENERAR EN LOS DIFERENTES PROYECTOS URBANOS GESTIONADOS POR LA EMPRESA Y PROPONER ACCIONES DE MITIGACIÓN	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		75.00		100.00	50.00	3.13
12.	ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORÍA Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS PROYECTOS	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		75.00		100.00	50.00	3.13
13.	REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRAS E INTERVENTORÍA Y OTROS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		75.00		100.00	50.00	3.13
14.	COMPLETAR LA FASE DE CIERRE DE PROYECTOS CON ÁREAS	6.25																									100.00	50.00	3.13

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

7507 36 Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
DE CESIÓN PENDIENTES DE ENTREGA A ENTIDADES DISTRITALES		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		75.00							
15. EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DEFINIDO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN FIDUCIARIA DE LA ERU PARA LA VIGENCIA 2022	6.25	1.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.86	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.86	2.87			
16. DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA LA SELECCIÓN DE ASOCIADOS, DISEÑADORES, DESARROLLADORES Y EJECUTORES DE LOS PROYECTOS QUE GARANTICEN SU CALIDAD	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		75.00		100.00	50.00	3.13			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.26	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7508 21 Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAR SOLUCIONES AMBIENTALES PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PROYECTOS FORMULADOS POR LA EMPRESA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		100.00	45.00	9.00		
2.	REALIZAR LA INCORPORACIÓN DE ACCIONES Y/O PROPUESTA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE LOS ÁMBITOS PRIORIZADOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		35.00		100.00	35.00	7.00		
3.	ADELANTAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O RADICACIÓN Y/O ADOPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (ACTUACIONES ESTRATÉGICAS)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	19.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		100.00	30.25	6.05		
4.	ADELANTAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O RADICACIÓN Y/O ADOPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, SEGÚN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		100.00	50.00	10.00		
5.	PARTICIPAR EN ESCENARIOS ACADÉMICOS Y SECTORIALES NACIONALES E INTERNACIONALES COMO EXPERTOS EN RENOVACIÓN URBANA.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		35.00		100.00	41.00	8.20		
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		40.25	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7509 35 Adquisición y gestión de suelo Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL FORMULADO PARA CADA PROYECTO GESTIONADO POR LA EMPRESA	10.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
2.	PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA APLICABLE A LA GESTIÓN SOCIAL EN PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA	10.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	21.00	9.00	0.00	9.00	0.00	10.00	34.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		0.00		100.00	55.00	5.50
3.	ELABORAR, SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR EL DOCUMENTO GENERAL DE PROTOCOLO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PARA TRABAJAR CON ENTIDADES DISTRITALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	9.00
4.	ADELANTAR LA GESTIÓN DE SUELO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA EMPRESA SEGÚN LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	26.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		100.00	50.00	25.00
5.	REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS PEDIALES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		17.00		100.00	50.00	5.00
6.	GARANTIZAR LA INCIDENCIA EFECTIVA DE LOS CIUDADANOS EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA, A TRAVÉS DE DIVERSOS ESPACIOS, MECANISMOS, CANALES Y PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							53.50			

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

19 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

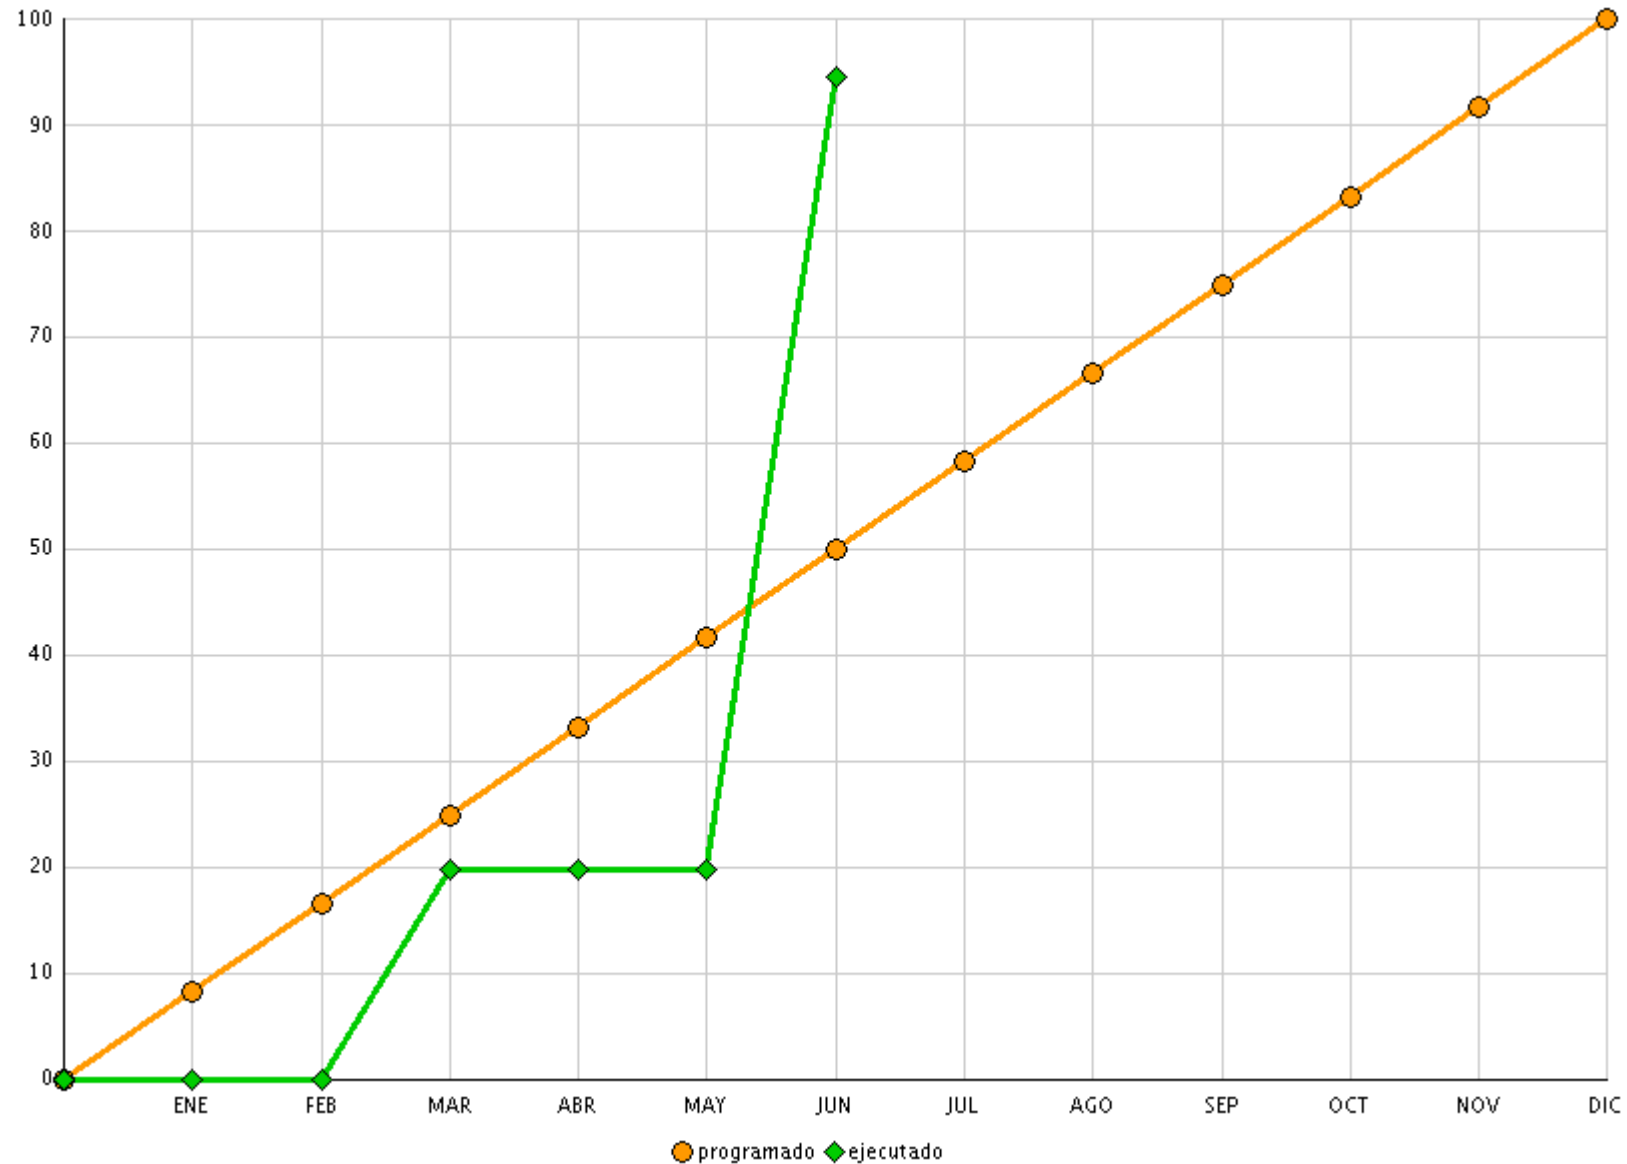


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.32	16.65	24.97	33.29	41.62	49.95	58.29	66.62	74.96	83.29	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	19.88	19.88	19.88	94.48						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

20 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

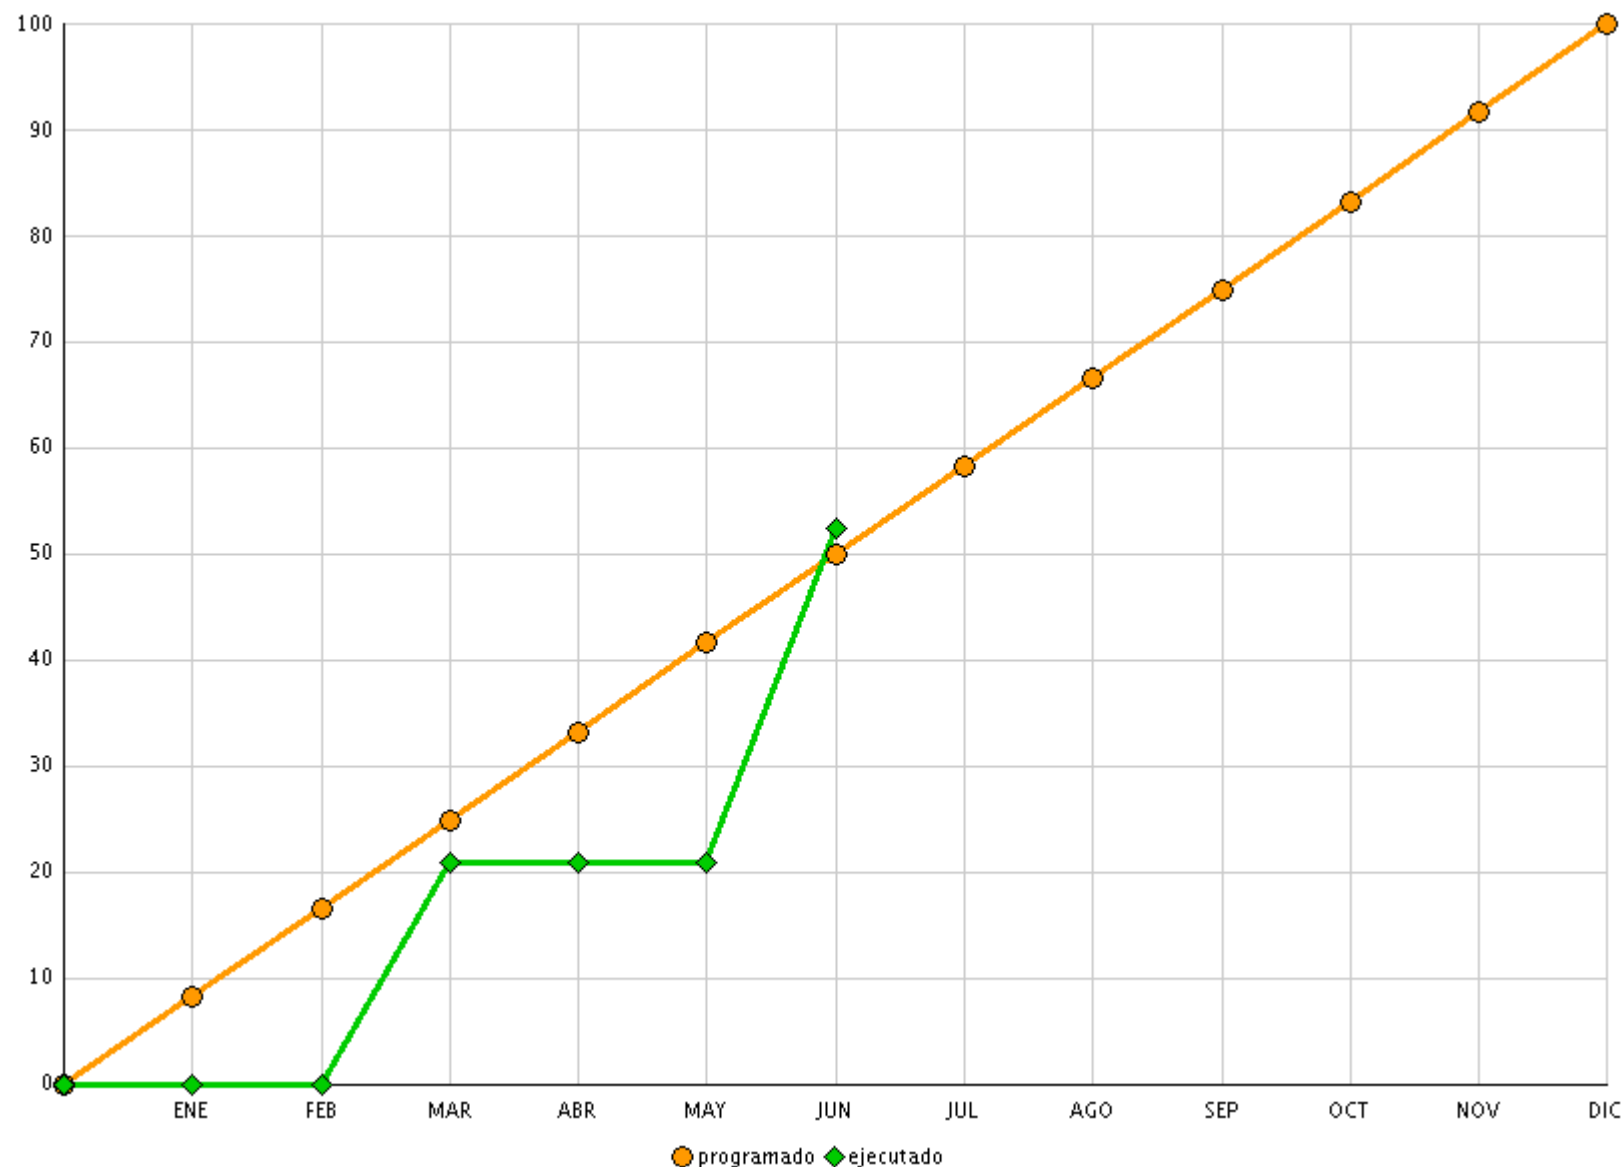


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.32	16.65	24.97	33.29	41.62	49.95	58.29	66.62	74.96	83.29	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.01	21.00	21.00	21.00	52.47						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

21 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

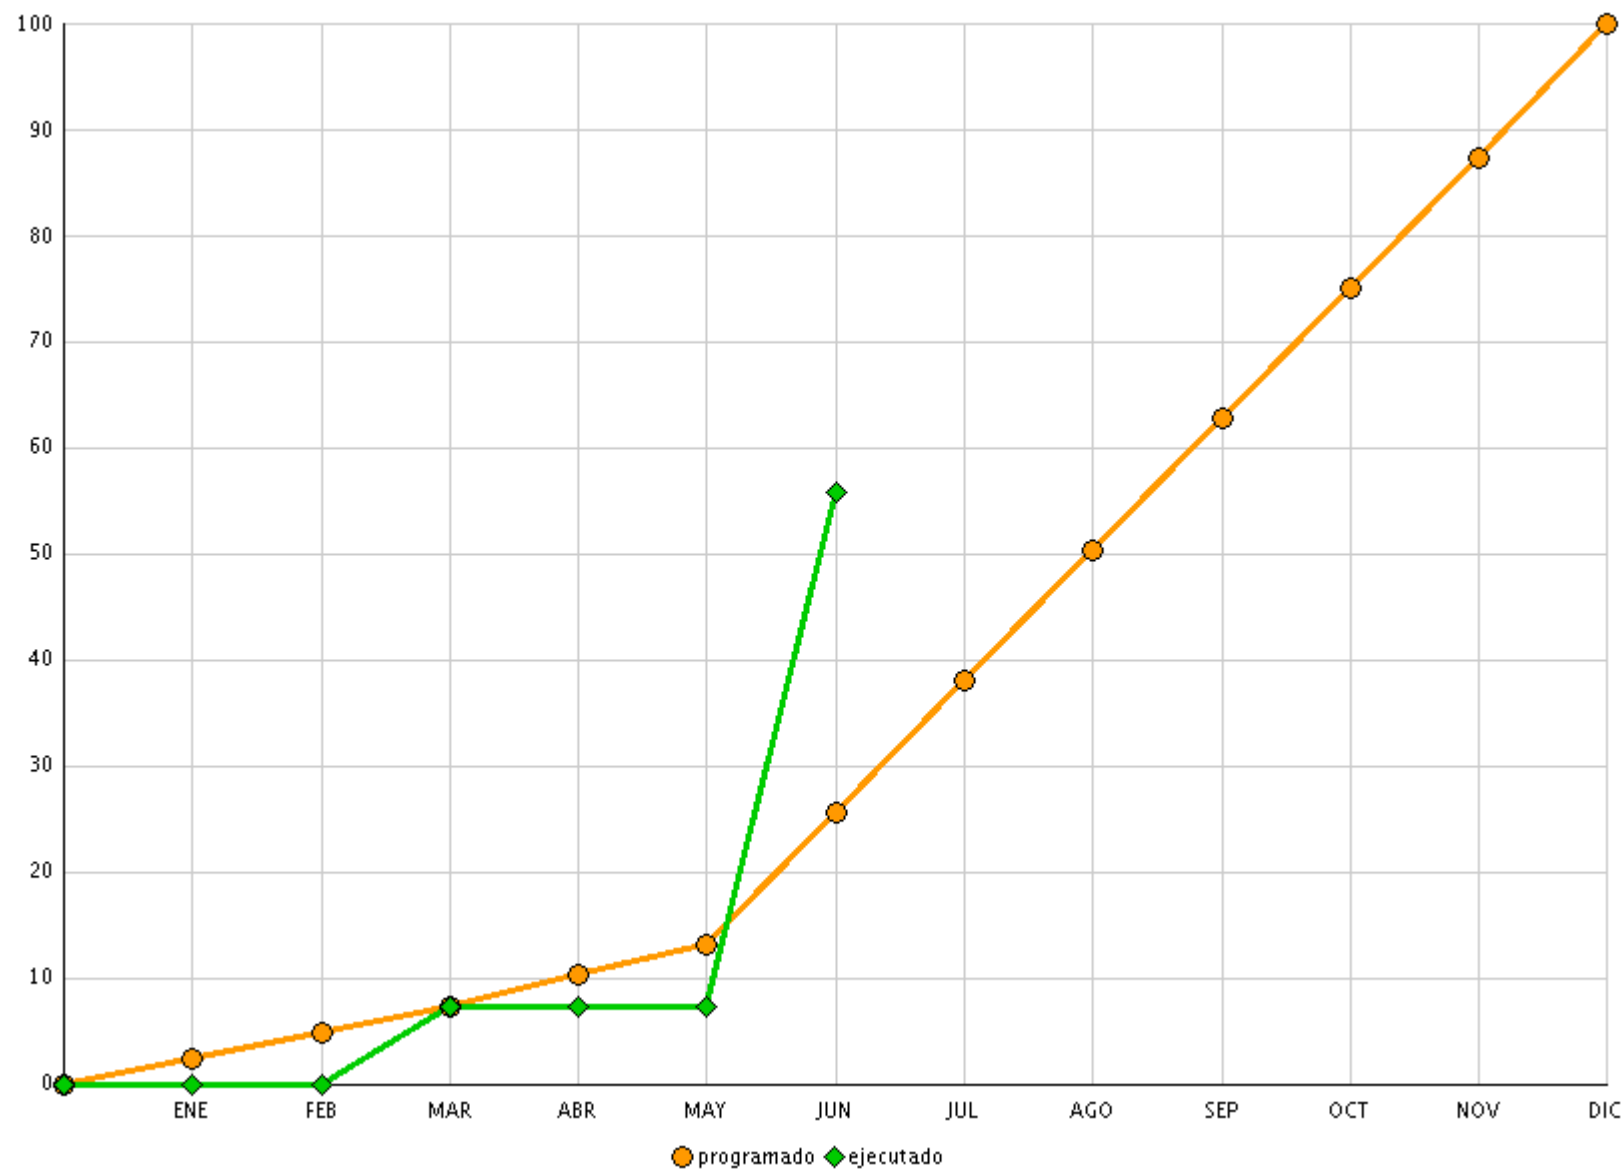


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.43	4.86	7.29	10.29	13.29	25.67	38.04	50.42	62.79	75.17	87.45	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	7.29	7.29	7.29	55.76						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

22 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

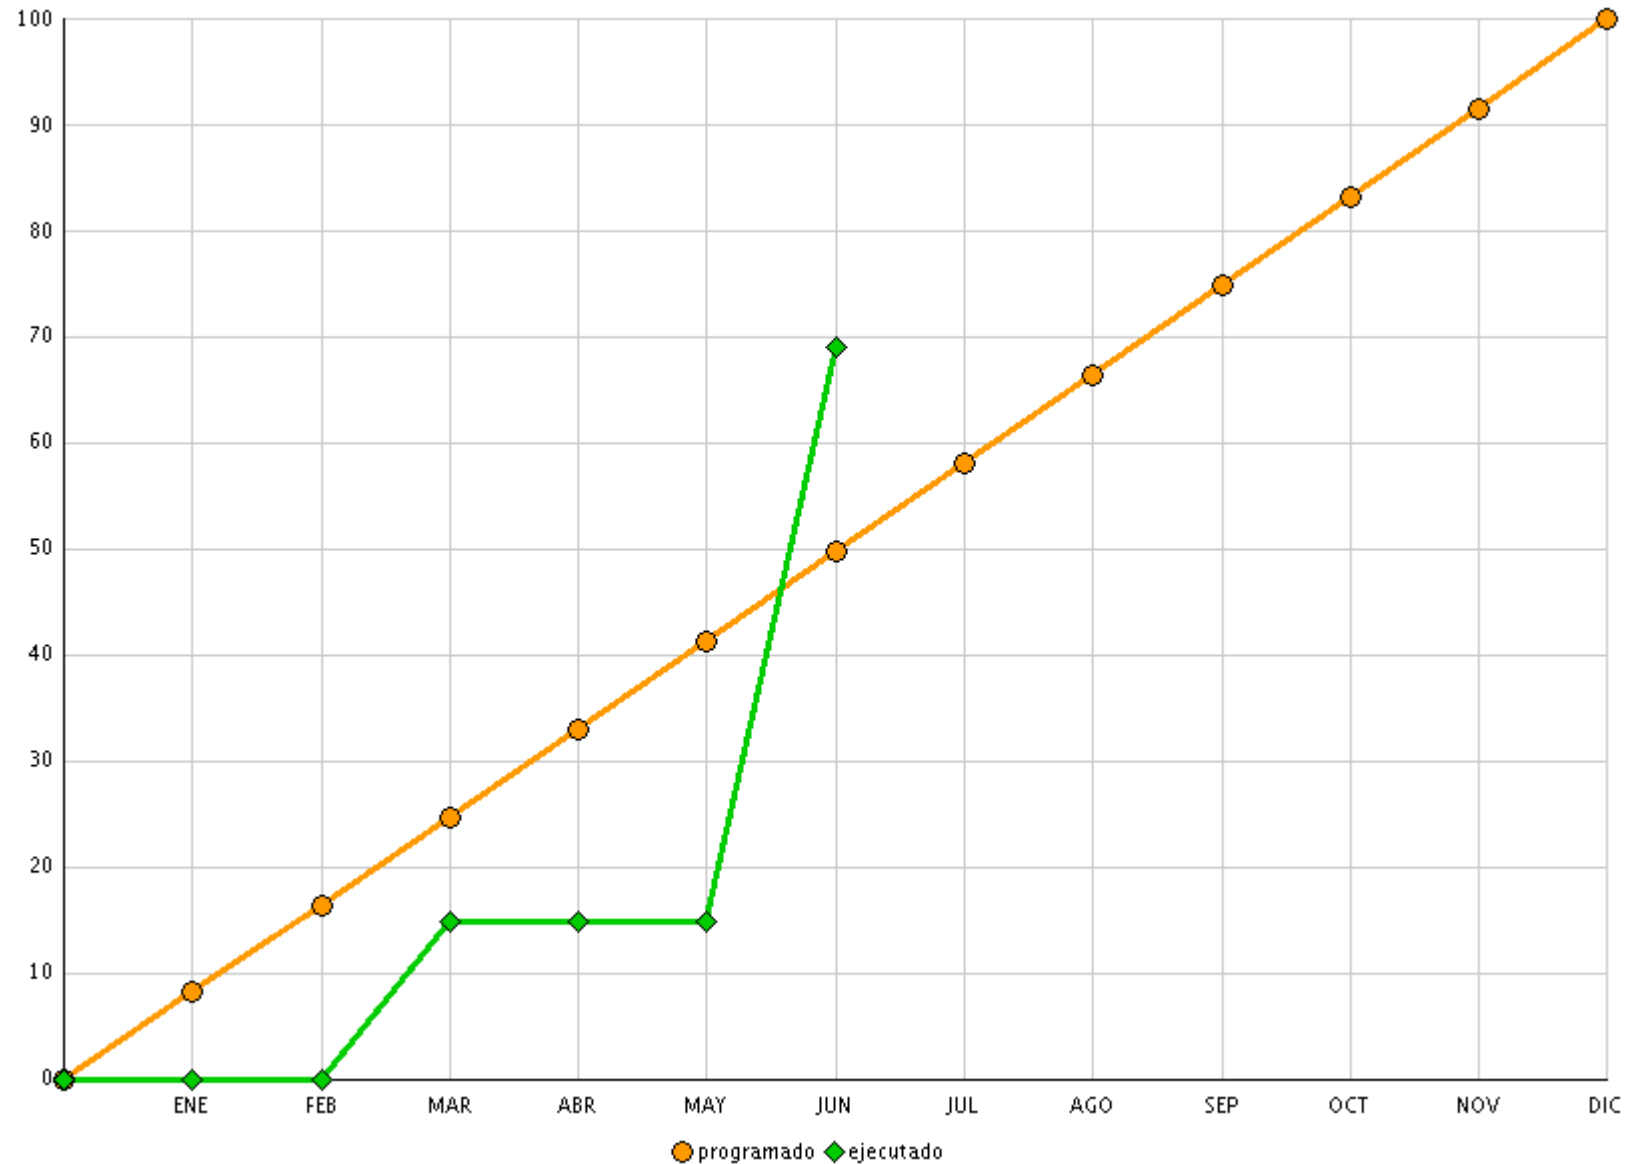


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.21	16.42	24.63	33.00	41.37	49.74	58.11	66.48	74.85	83.22	91.59	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	14.85	14.85	14.85	69.12						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

50 Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

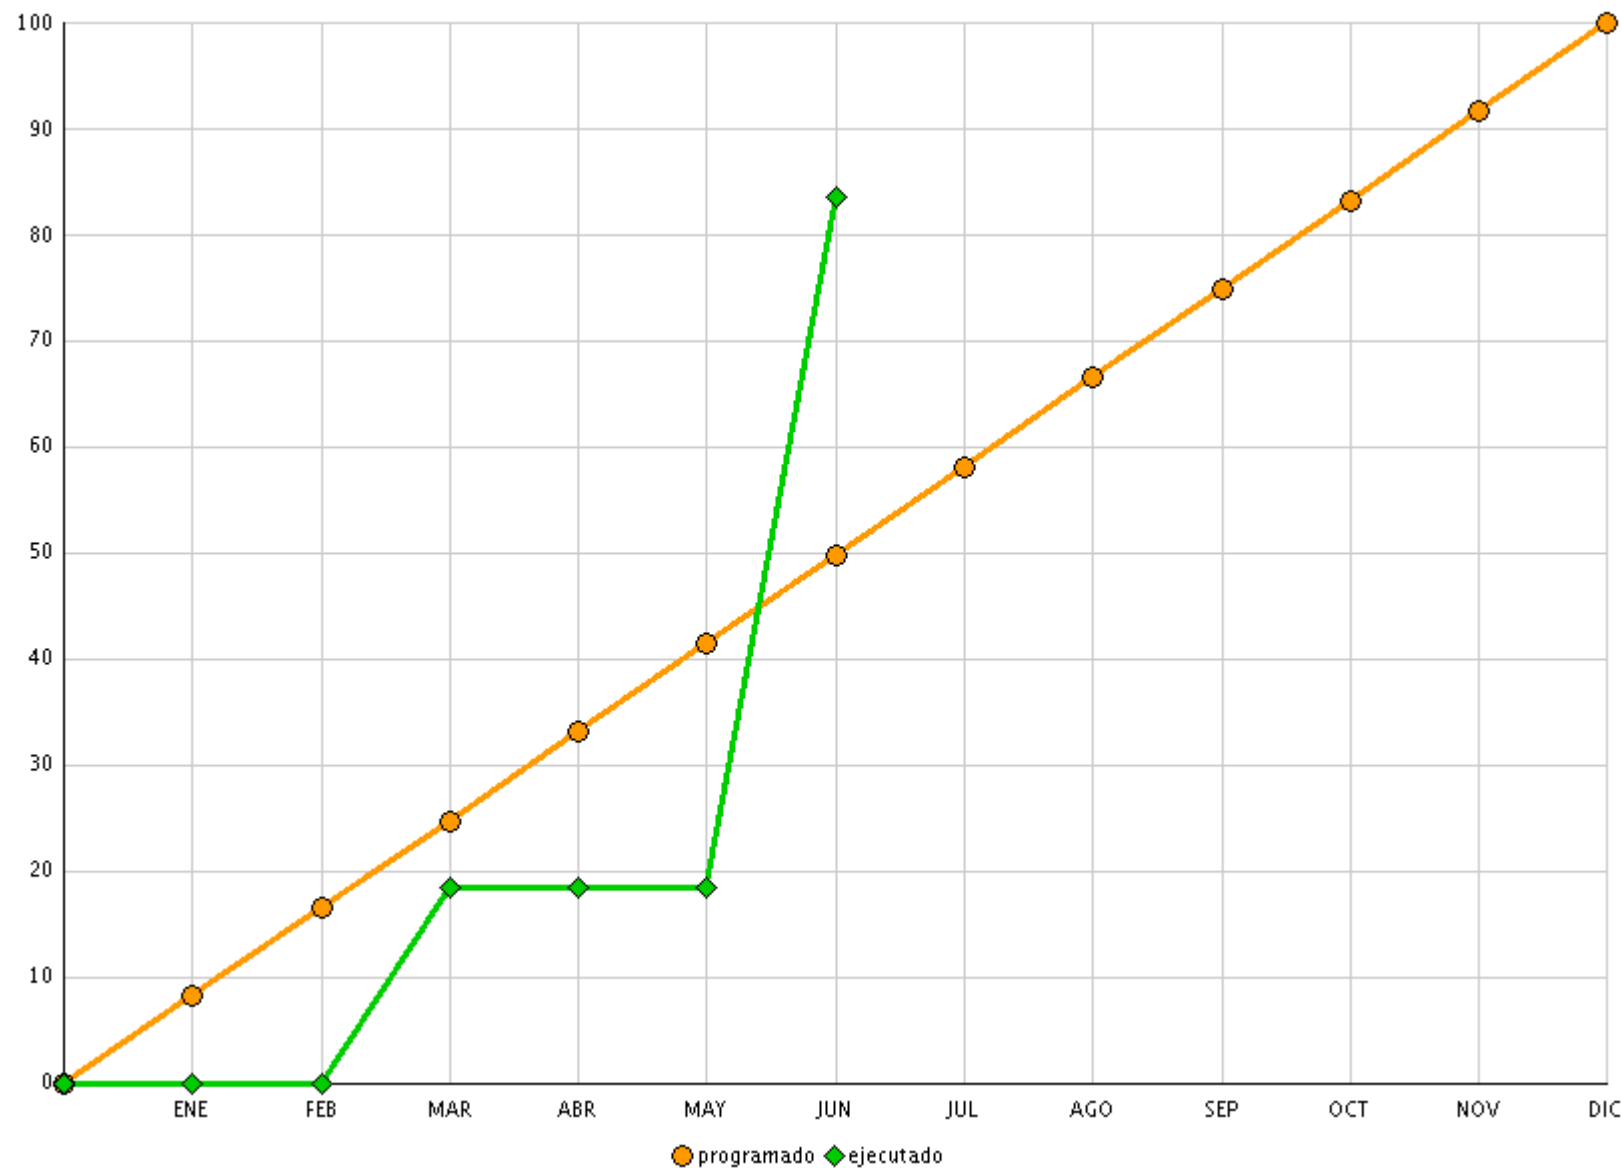


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.25	16.51	24.76	33.11	41.47	49.83	58.18	66.54	74.89	83.25	91.60	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.49	18.49	18.49	83.64						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

51 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

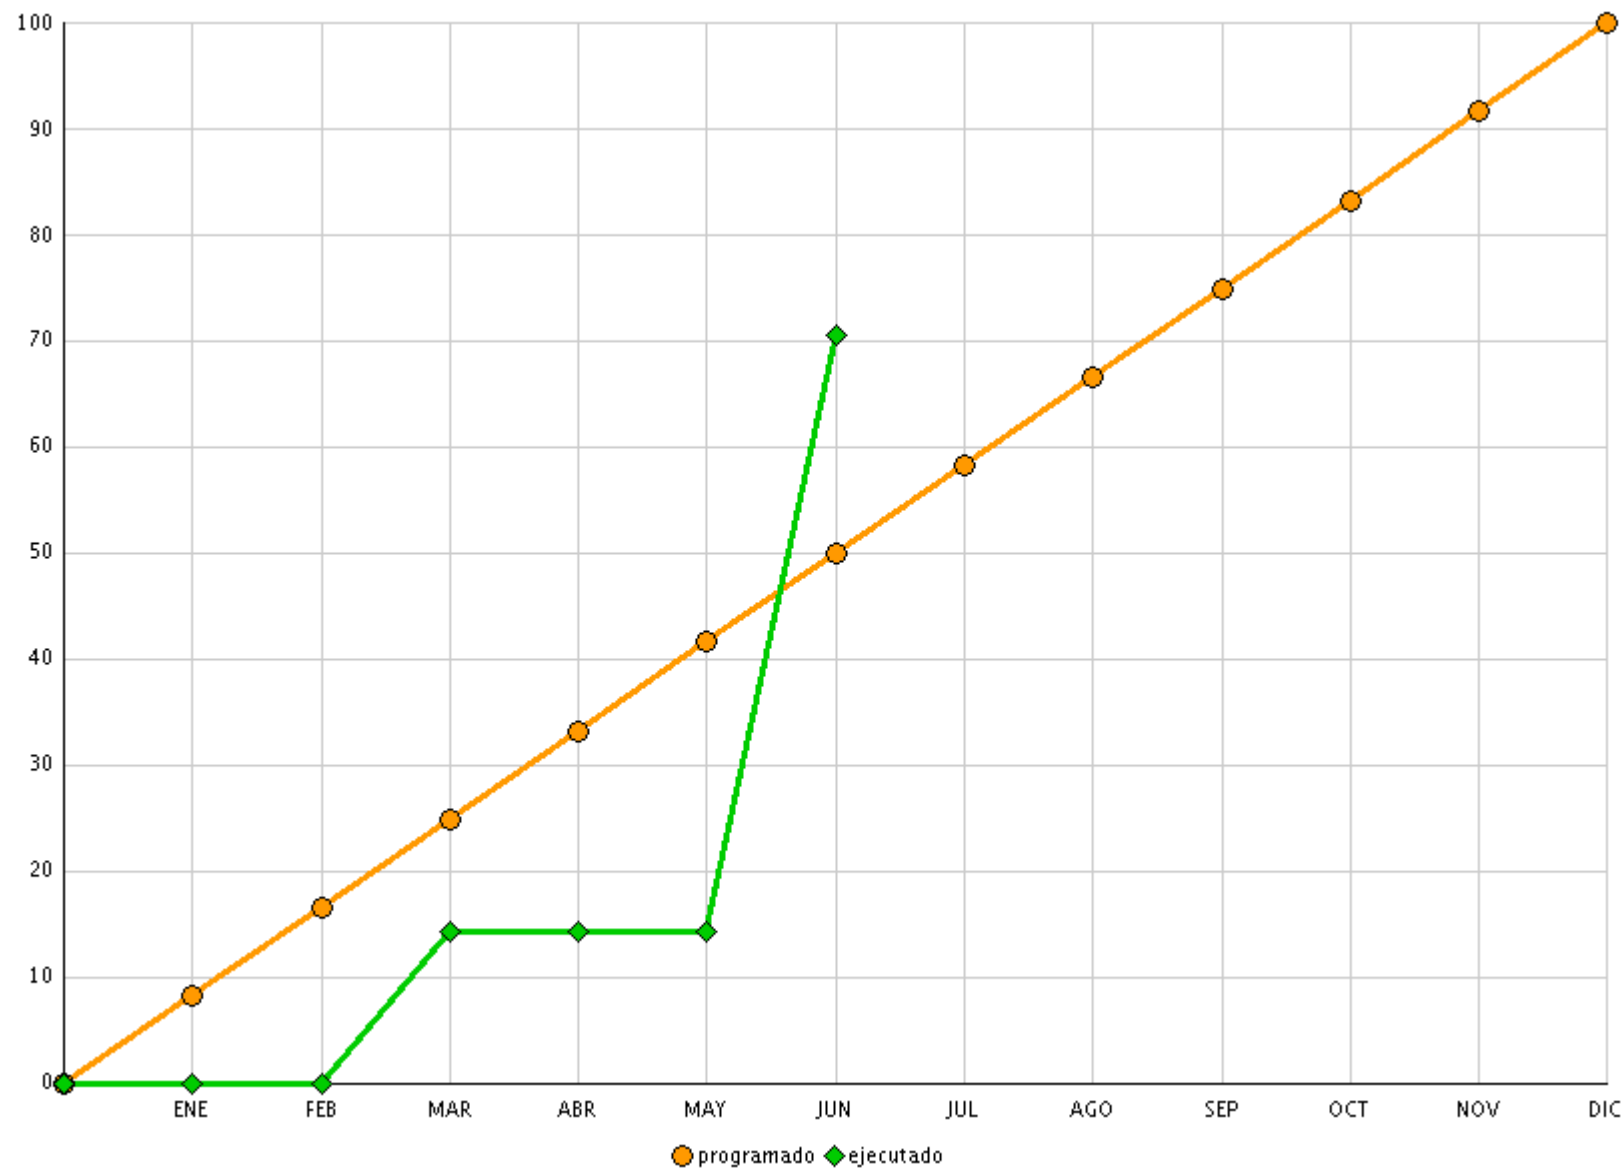


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.32	16.64	24.96	33.29	41.62	49.96	58.29	66.63	74.96	83.29	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	14.37	14.37	14.37	70.55						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

52 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

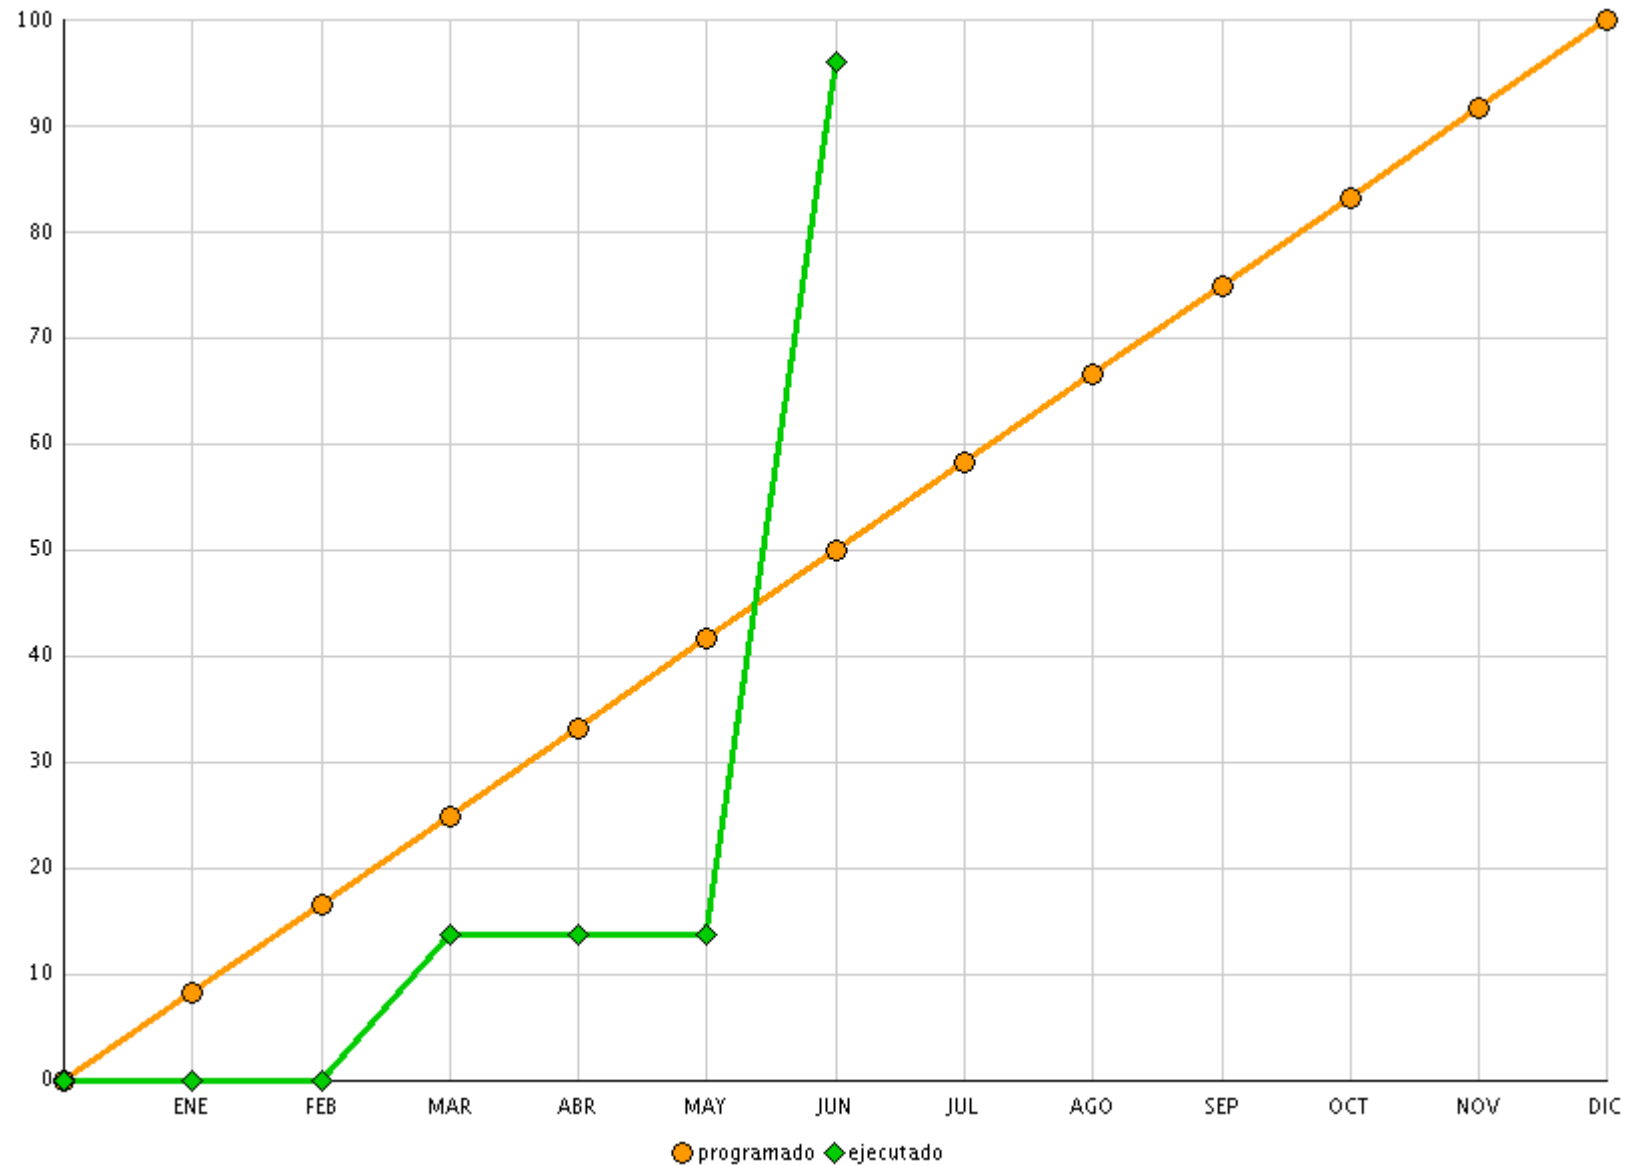


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.32	16.64	24.96	33.29	41.62	49.96	58.29	66.63	74.96	83.29	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	13.71	13.71	13.71	95.97						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

53 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

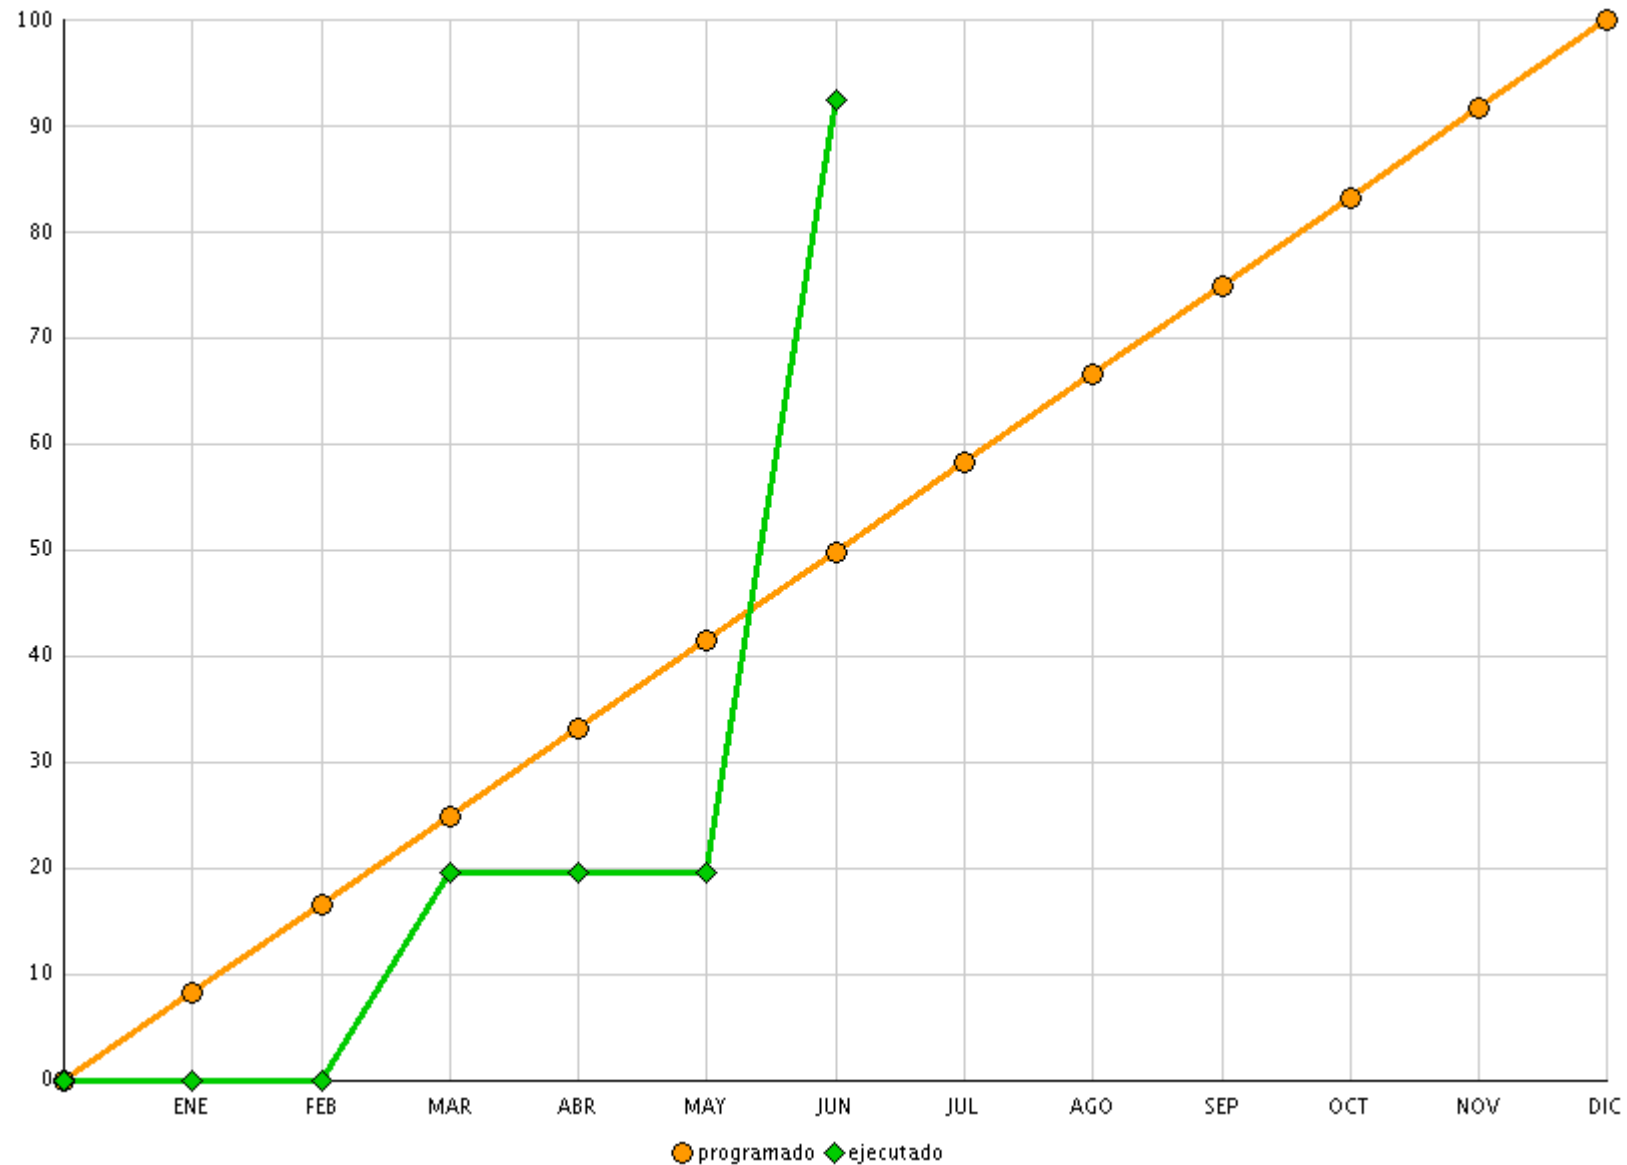


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.29	16.57	24.86	33.20	41.55	49.89	58.24	66.58	74.93	83.27	91.62	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	19.68	19.68	19.68	92.46						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

54 Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

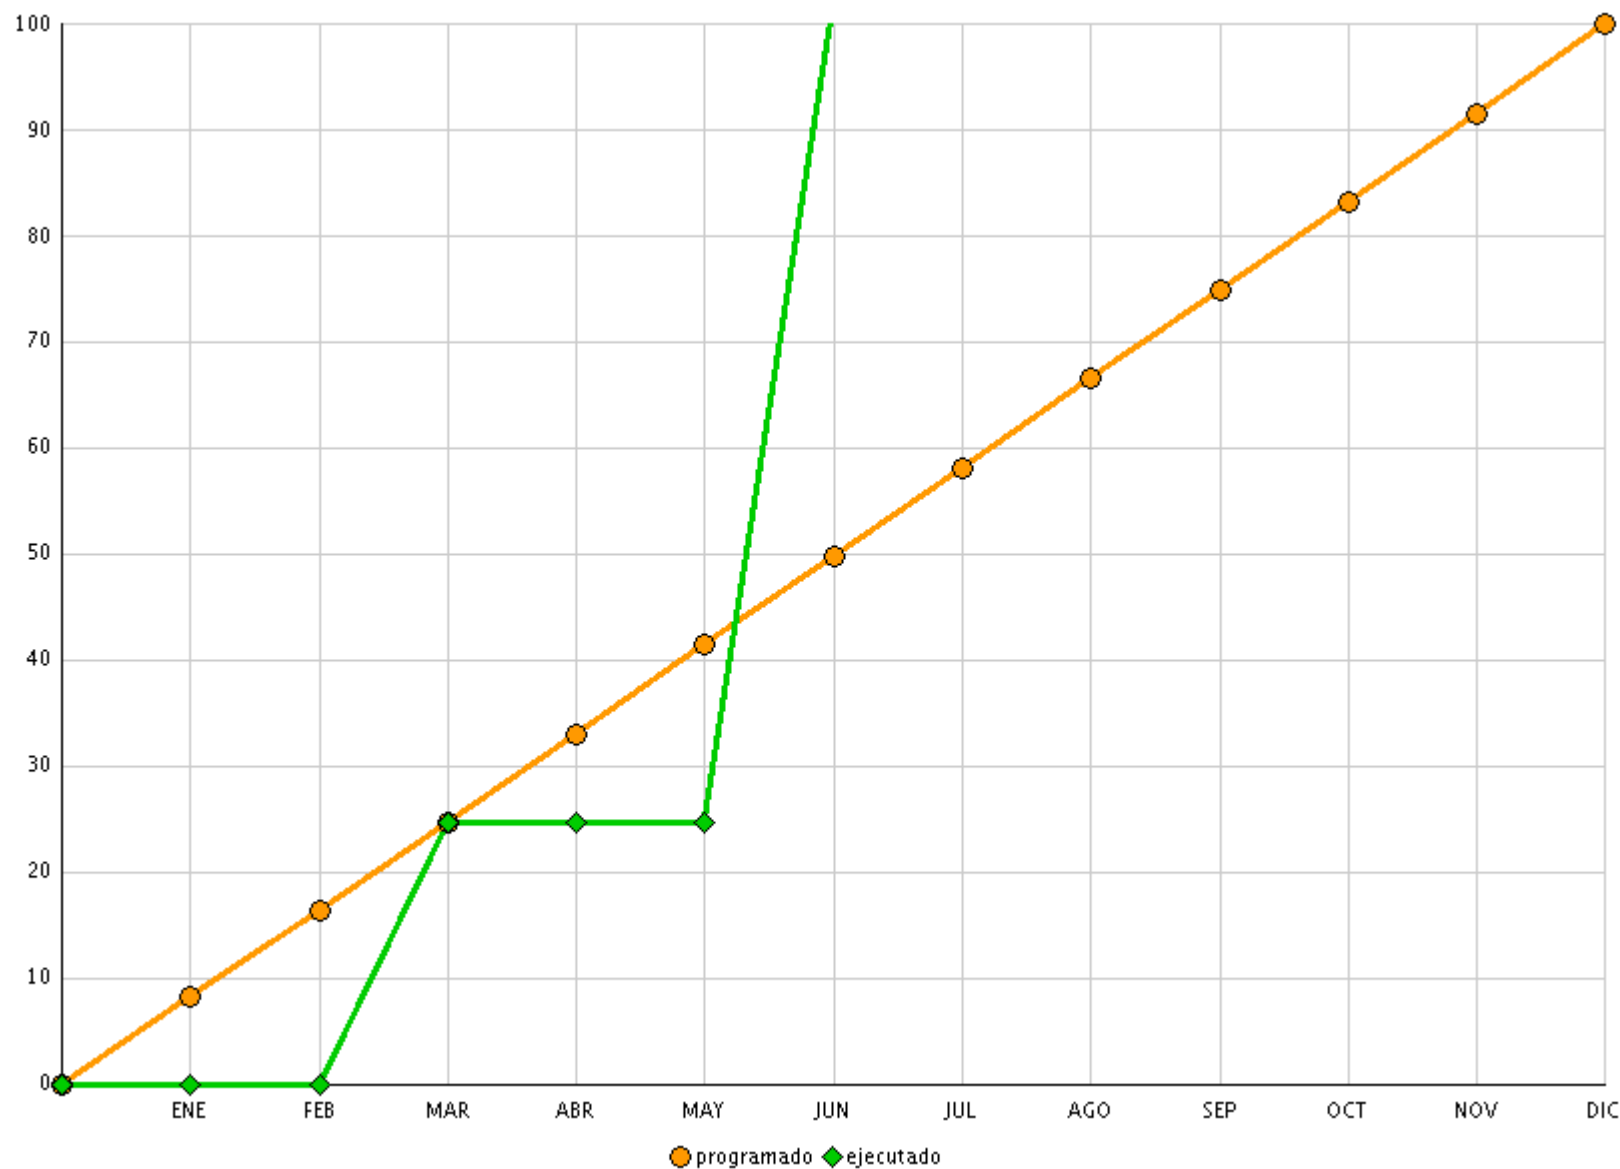


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.25	16.50	24.75	33.11	41.46	49.82	58.18	66.53	74.89	83.25	91.60	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	24.76	24.76	24.76	101.69						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

55 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

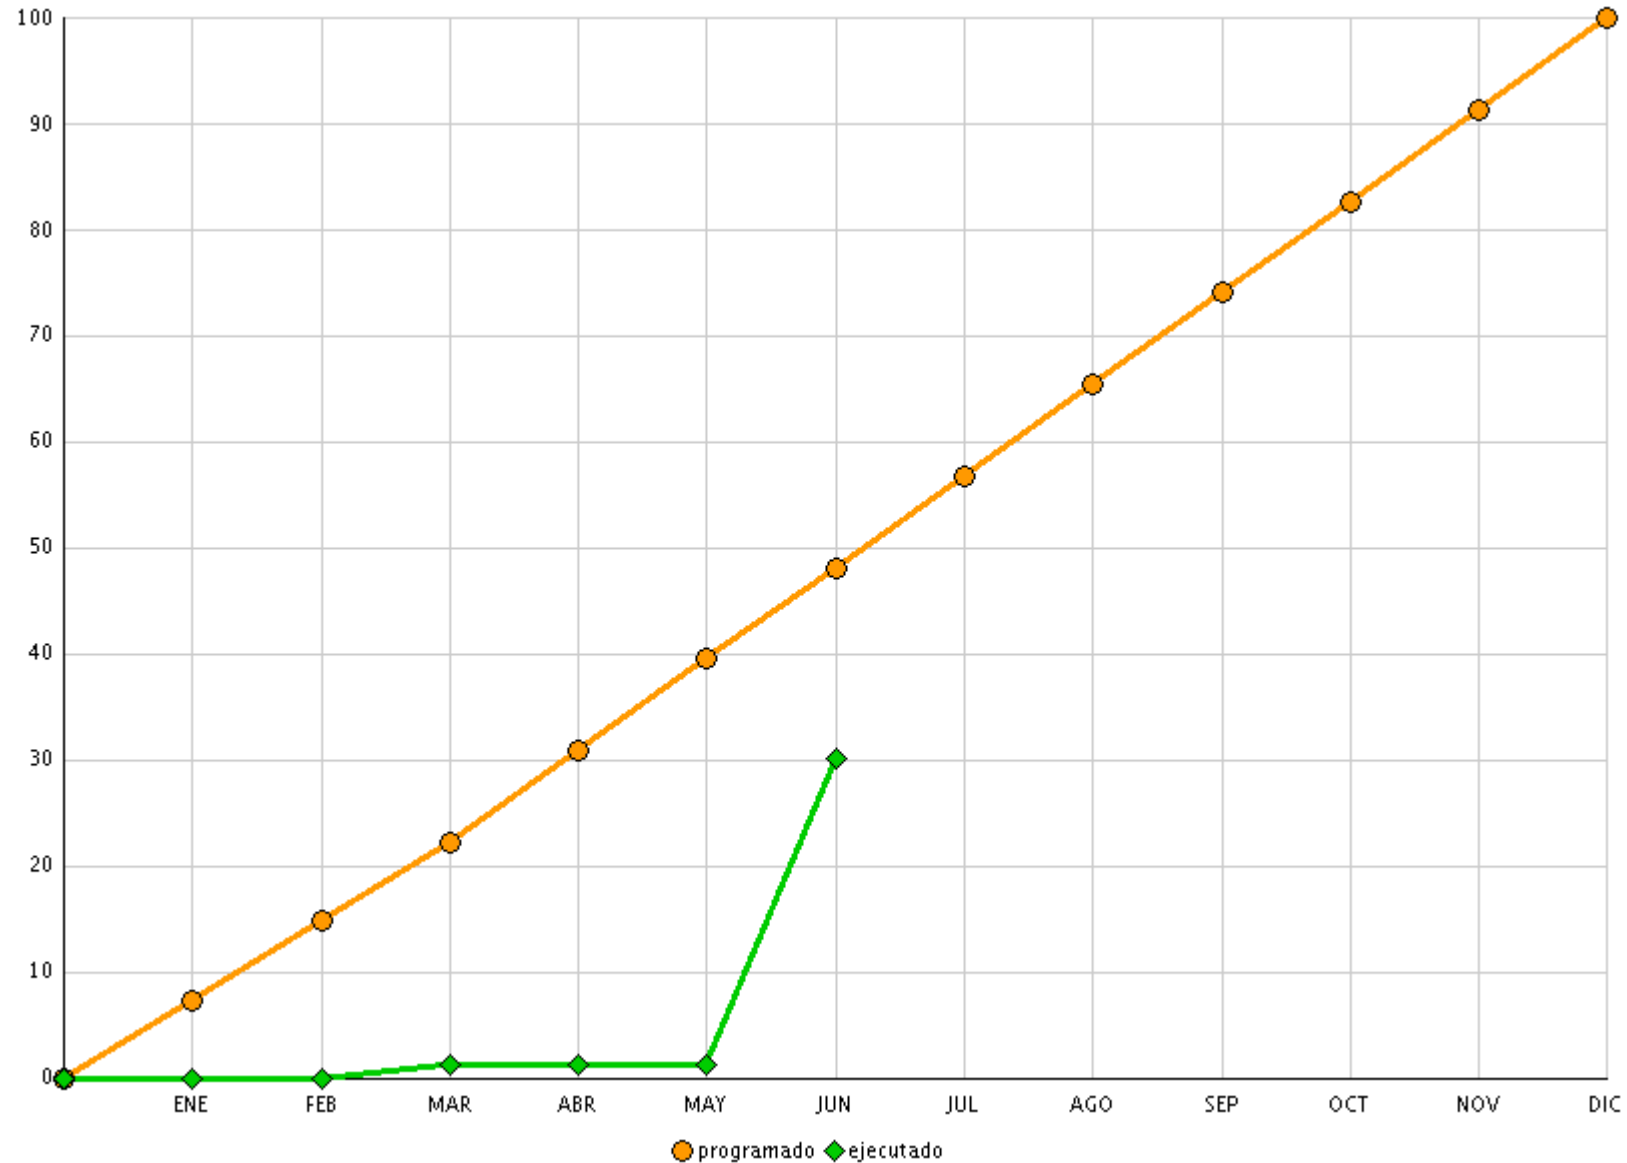


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.43	14.86	22.29	30.92	39.55	48.18	56.81	65.44	74.07	82.70	91.33	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	1.28	1.28	1.28	30.16						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

68 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

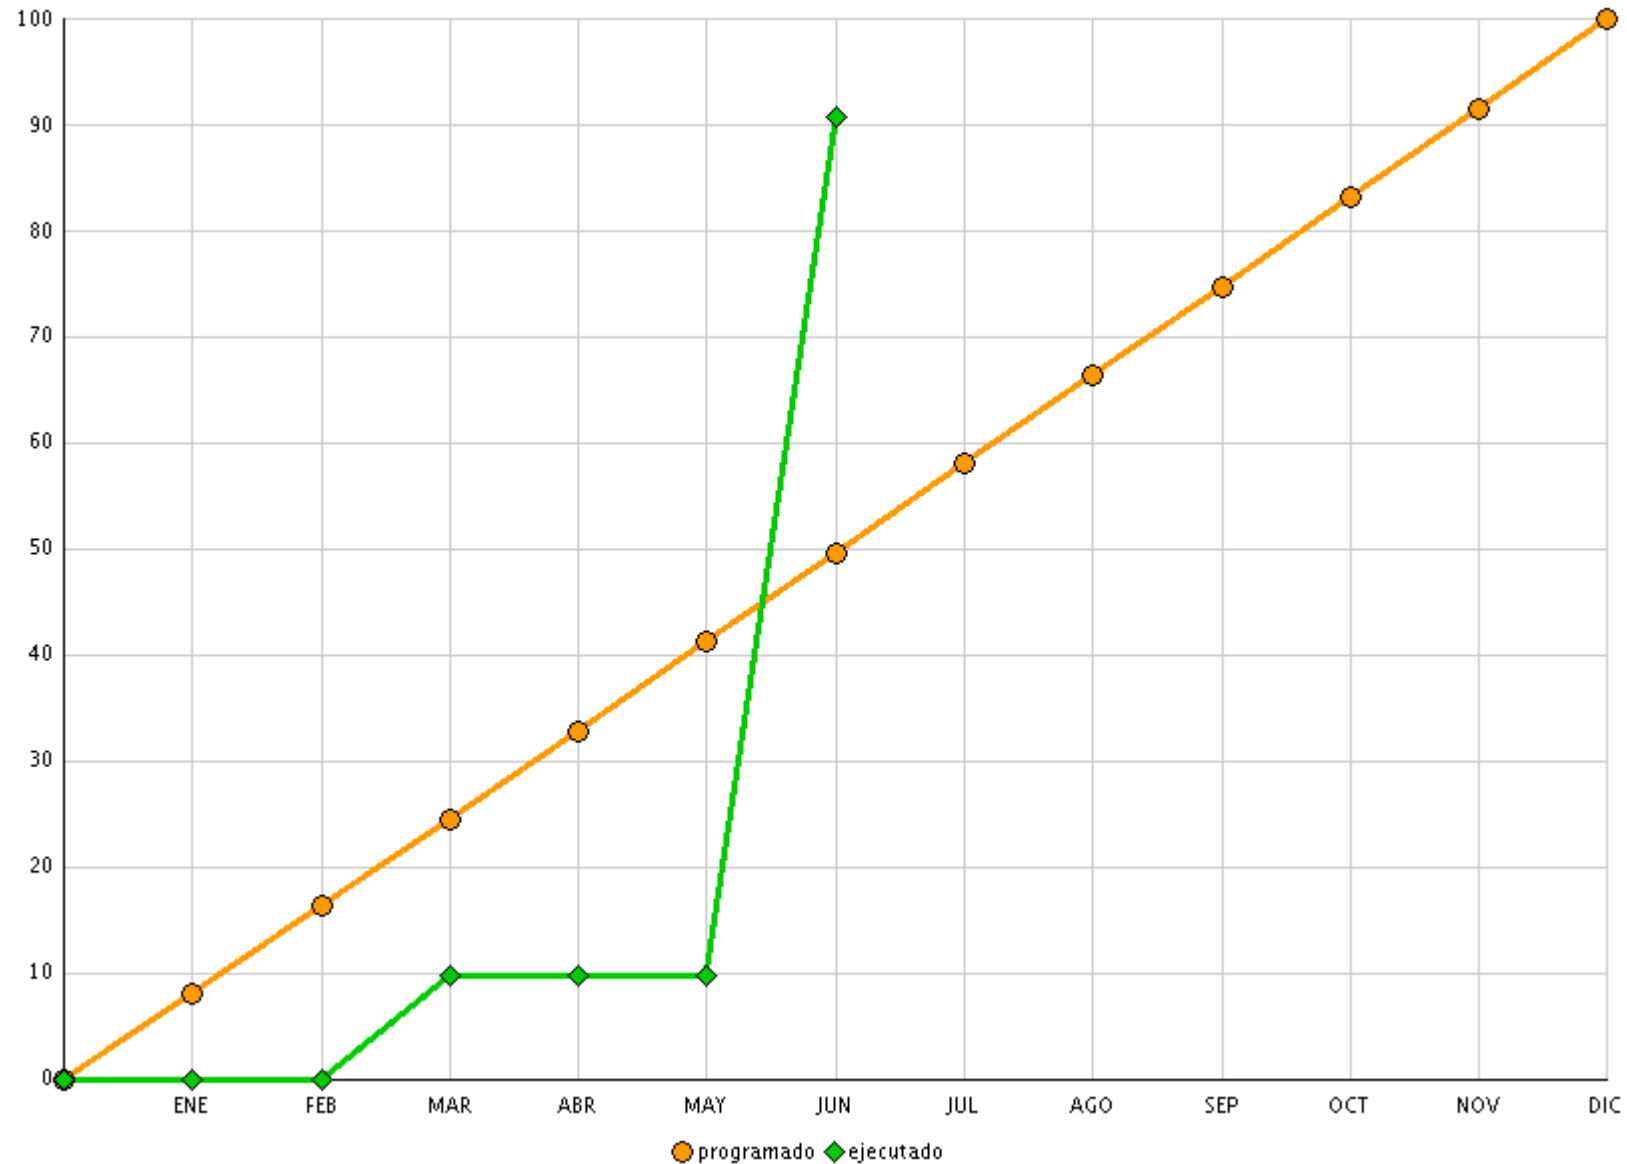


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.16	16.32	24.48	32.86	41.25	49.64	58.03	66.41	74.80	83.19	91.57	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	9.88	9.88	9.88	90.73						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

81 Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

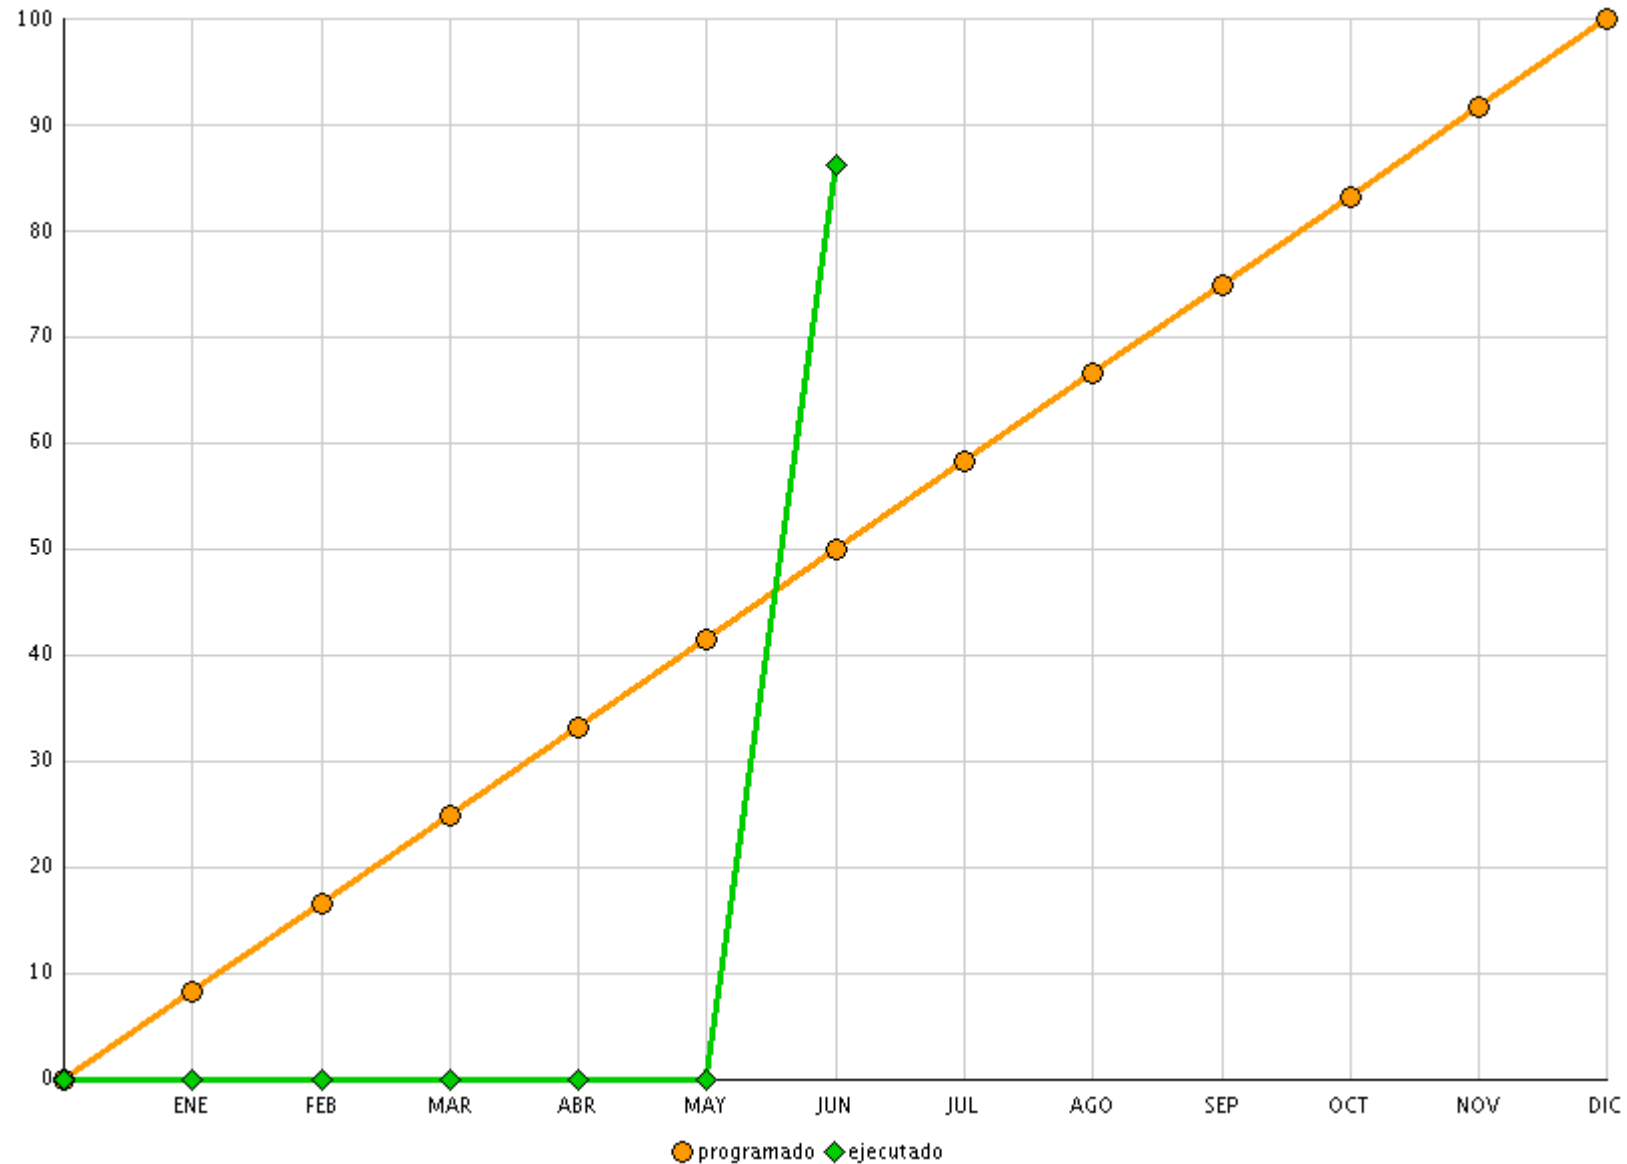


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.61	24.91	33.25	41.59	49.93	58.27	66.61	74.94	83.28	91.62	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.14						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

82 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

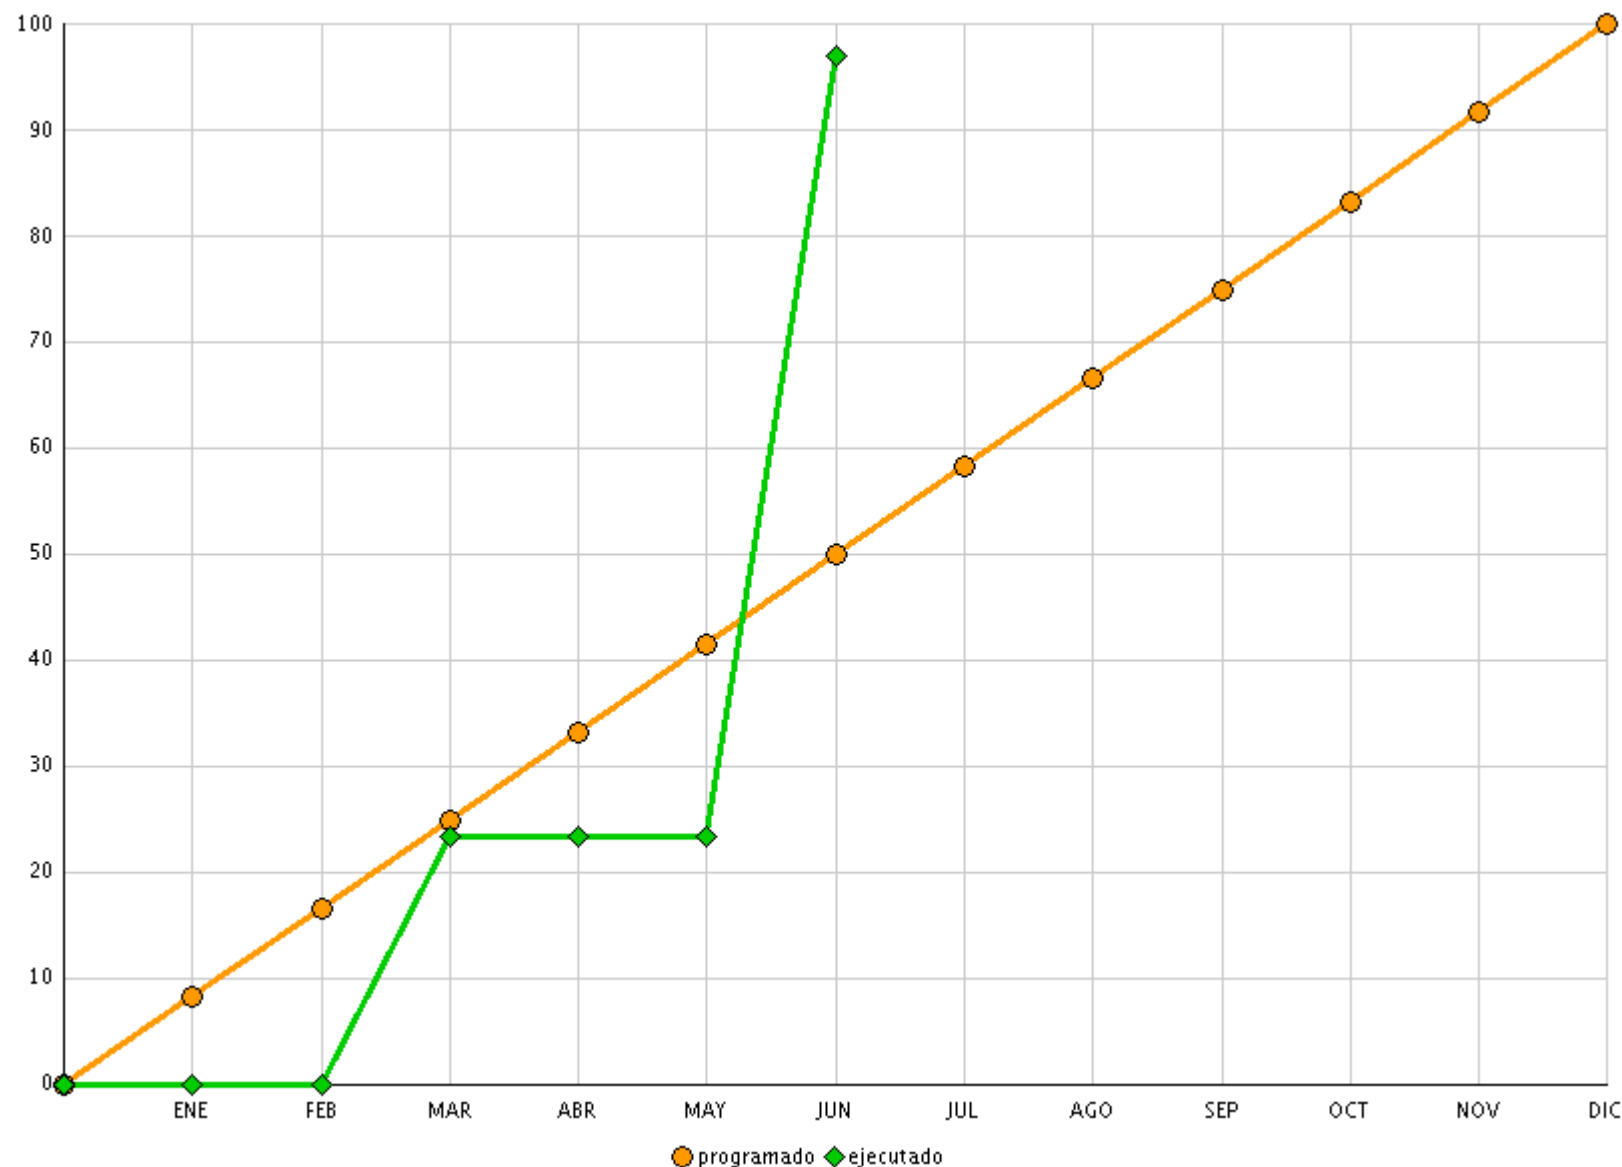


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.24	41.58	49.92	58.26	66.60	74.94	83.28	91.62	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	23.30	23.30	23.30	97.03						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

7334 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

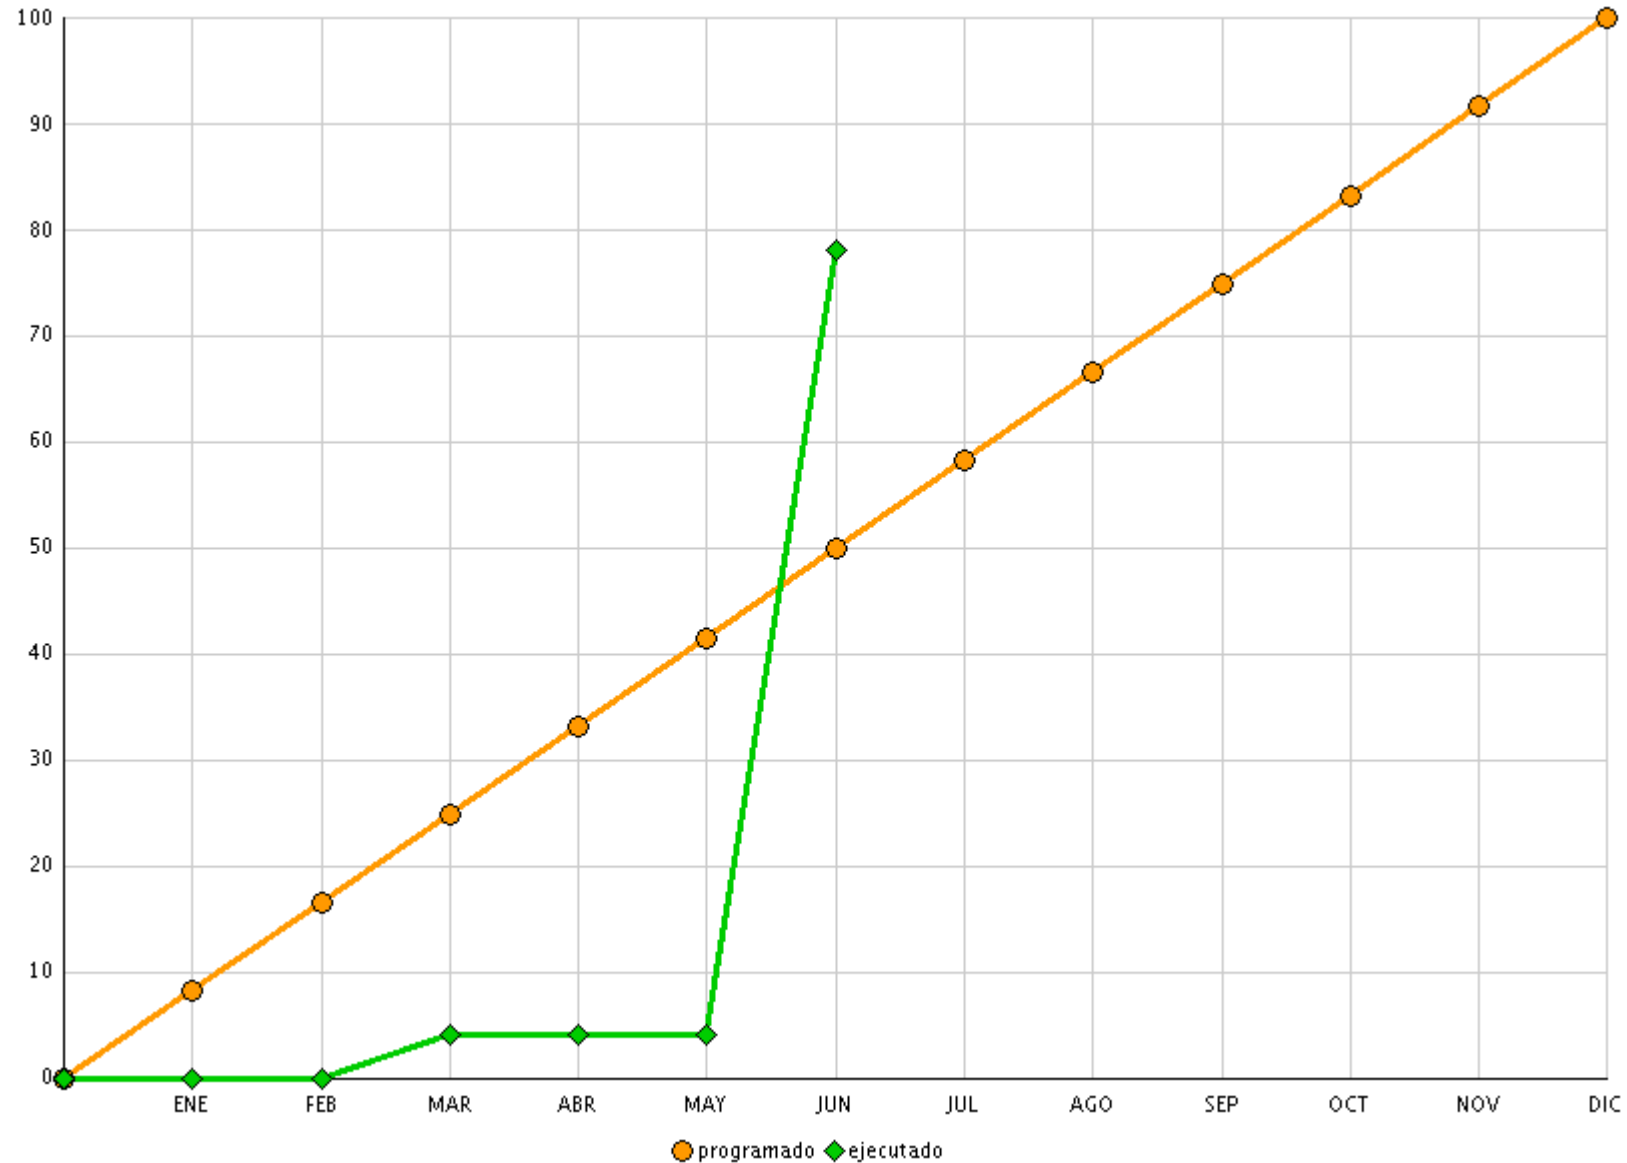


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.59	24.89	33.23	41.57	49.91	58.25	66.59	74.94	83.28	91.62	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	4.06	4.06	4.06	78.19						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

7338 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

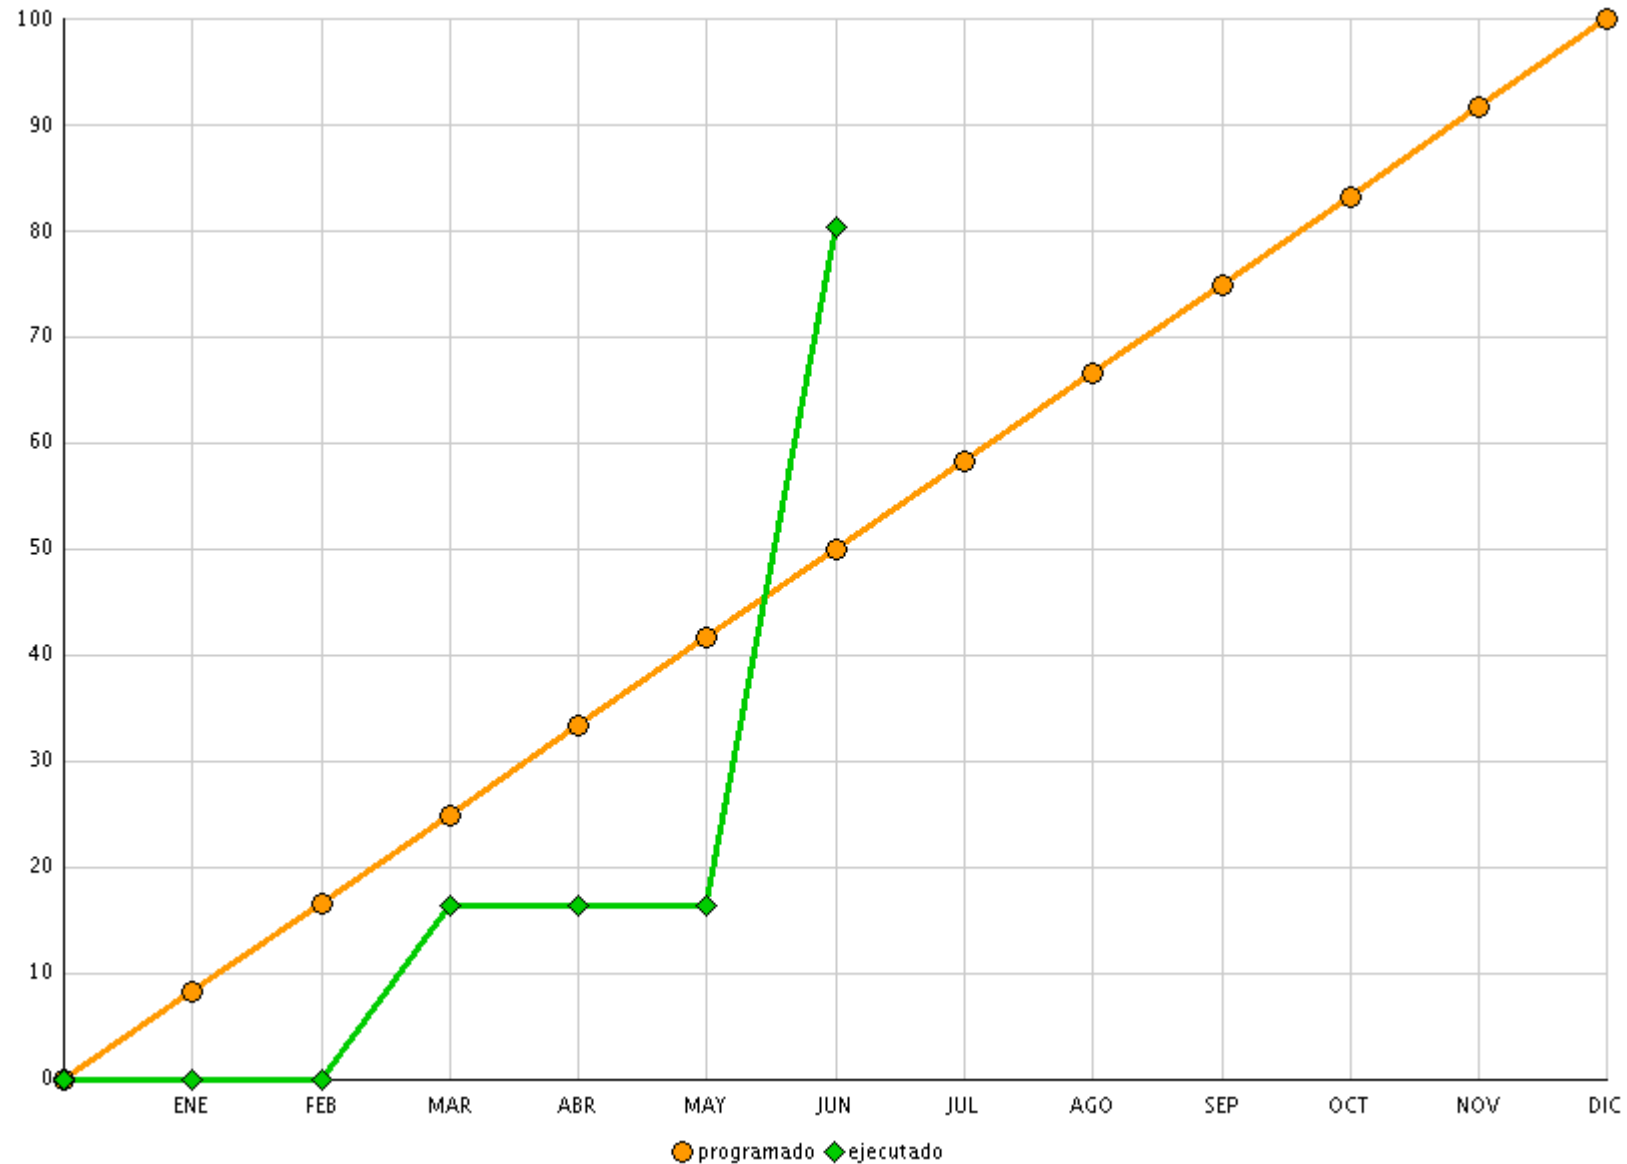


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.32	16.64	24.97	33.30	41.63	49.96	58.30	66.63	74.96	83.29	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	16.49	16.49	16.49	80.45						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

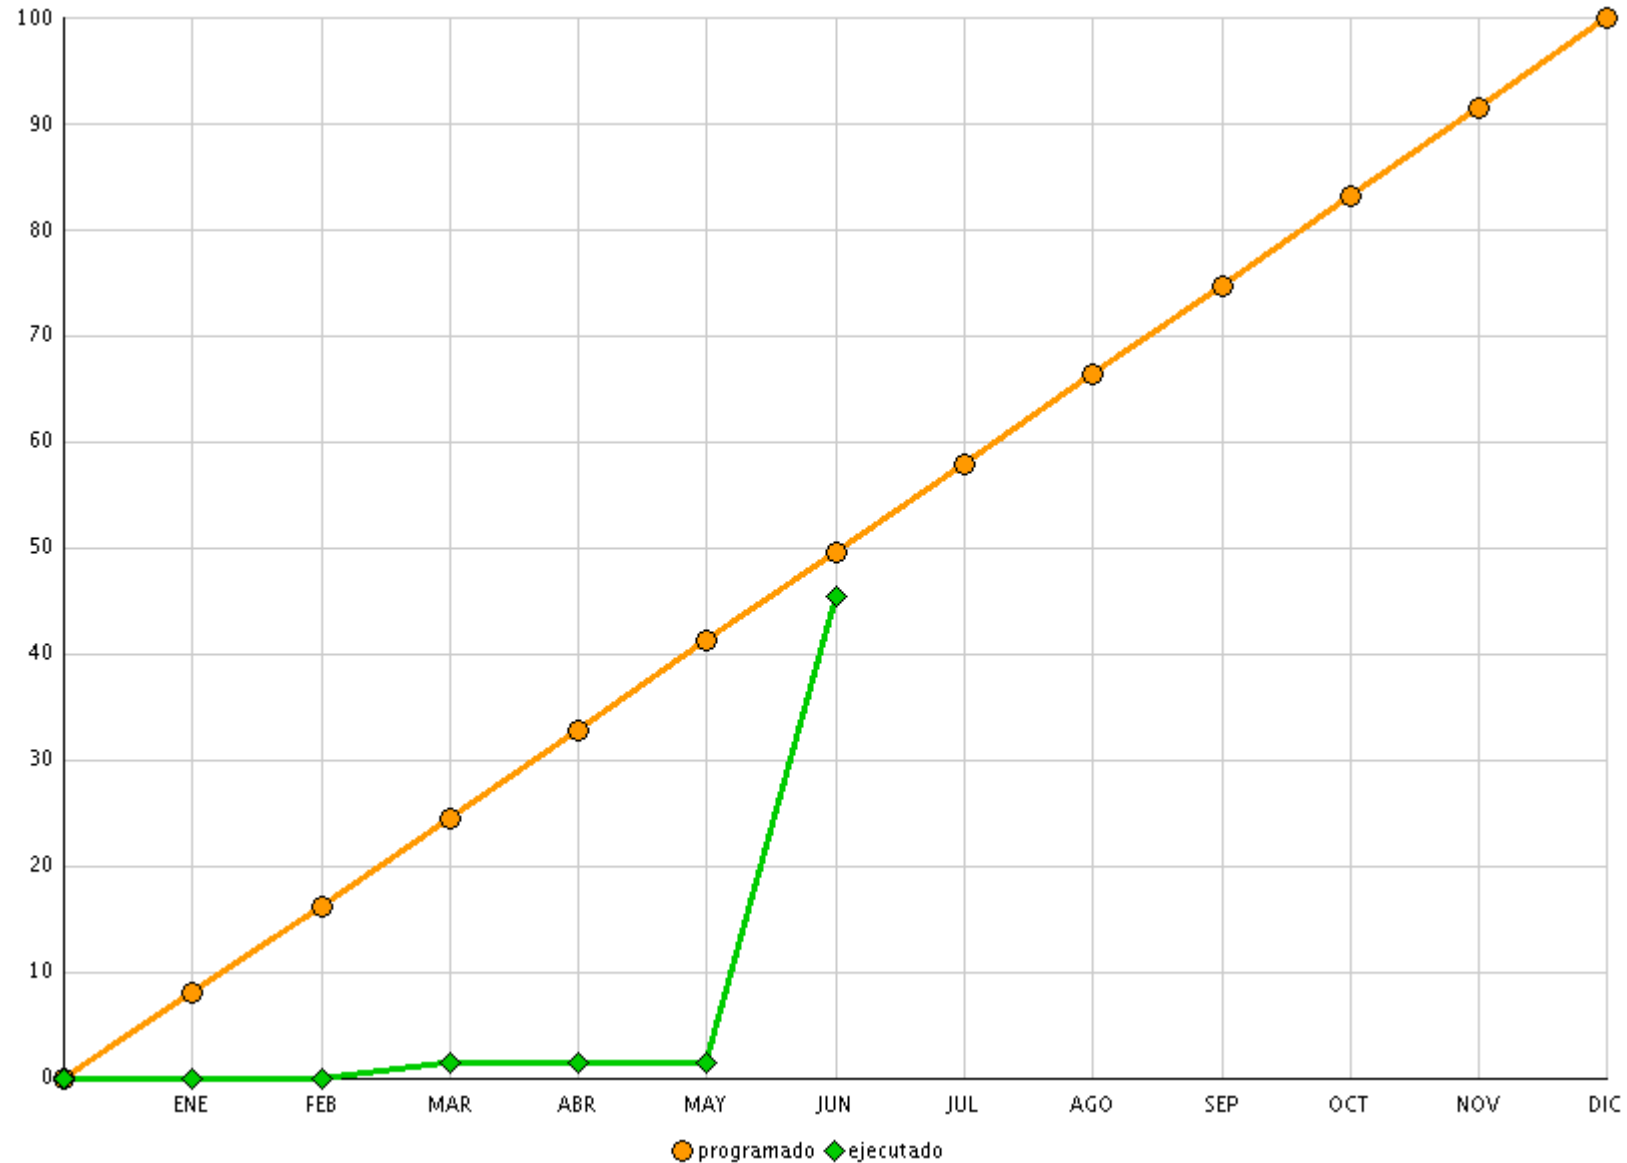

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.15	16.29	24.44	32.83	41.22	49.61	58.00	66.40	74.79	83.18	91.57	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	1.46	1.46	1.46	45.41						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

19 180 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				-\$271	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUCCION OBRA CIVIL	85.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	21.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	85.80	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	106.80	91.63
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑ	6.26	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	21.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.26	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	27.26	1.71
3.	GASTOS GENERALES	0.18	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.18	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.48	0.00
4.	INTERVENTORIAS	7.68	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	7.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	7.68	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	14.78	1.14
5.	SENTENCIAS JUDICIALES	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.08	14.29		14.29		14.29		14.29		14.29		14.26		100.00	0.08	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 94.48

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

20 153 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		-\$64		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	81.59	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	22.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	31.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	53.00	43.24
2. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	9.26	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	19.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	41.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	60.00	5.56
3. GASTOS GENERALES	0.03	8.33	0.00	8.33	17.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	17.00	0.01
4. INTERVENTORIAS	7.12	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	18.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	33.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	51.00	3.63
5. SERVIDUMBRES	1.92	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
6. SENTENCIAS JUDICIALE	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23	49.00	14.23		14.23		14.23		14.23		14.23		14.62		100.00	49.00	0.04
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		52.47

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

21 149 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		-\$614		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EST.ASE.CON. Y DISEÑ	20.56	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	20.56	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	45.56	9.37
2.	INTERVENTORIAS	8.61	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.61	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	33.61	2.89
3.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23	65.88	14.23		14.23		14.23		14.23		14.23		14.62		100.00	65.88	43.40
4.	GASTOS GENERALES	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23	0.00	14.23	0.00	14.23	0.68	14.23		14.23		14.23		14.23		0.19		0.20		100.00	0.68	0.00
5.	SERVIDUMBRES	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	1.78	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	1.78	0.03
6.	TERRENOS	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	2.49	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	2.49	0.06
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										55.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

22 178 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		-\$726		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	71.75	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	15.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	71.15	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	86.15	61.81
2. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	5.51	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	5.51	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	5.51	0.30
3. GASTOS GENERALES	0.08	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	10.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.08	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	10.08	0.01
4. INTERVENTORIAS	4.91	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	4.91	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	4.91	0.24
5. TERRENOS	16.32	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	16.32	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	41.32	6.74
6. REASENTAMIENTOS	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.16	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.16	0.00
7. SENTENCIAS JUDICIALE	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.59	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.59	0.01
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		69.12		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

50 157 Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES			Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	79.59	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	19.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	79.59	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	98.59	78.47			
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑ	1.15	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	10.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	1.15	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	11.15	0.13			
3.	GASTOS GENERALES	0.04	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	17.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.04	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	17.04	0.01			
4.	INTERVENTORIAS	6.89	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	19.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.85	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	25.85	1.78			
5.	MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	11.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	17.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	11.52	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	28.52	3.25			
6.	SERVIDUMBRES	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.74	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.74	0.01		
7.	SENTENCIAS JUDICIALE	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.10	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.10	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		83.64	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

51 127 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	72.73	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	15.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	72.73	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	87.73	63.81
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	2.29	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	2.29	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	6.29	0.14
3.	GASTOS GENERALES	1.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	11.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	11.00	0.11
4.	INTERVENTORIAS	8.48	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	13.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.48	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	21.48	1.82
5.	MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	15.37	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	14.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	16.38	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	30.38	4.67
6.	SENTENCIAS JUDICIALE	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.13	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.13	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										70.55

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

52 155 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL					\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	90.42	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	14.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	90.42	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	104.42	94.42
2. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	2.90	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	2.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	2.90	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	4.90	0.14
3. GASTOS GENERALES	0.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.00	0.02
4. INTERVENTORIAS	6.45	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	15.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.54	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	21.54	1.39
5. SENTENCIAS JUDICIALE	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.13	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.13	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 95.97

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

53 116 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES							Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor									
0		\$0				\$0.00					\$0.00
0		\$0				\$0.00					\$0.00
0		\$0				\$0.00					\$0.00
0		\$0				\$0.00					\$0.00
0		\$0				\$0.00					\$0.00
TOTAL			\$0 REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	89.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	20.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	80.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	100.33	89.62
2.	GASTOS GENERALES	0.01	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.01	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.01	0.00
3.	INTERVENTORIAS	10.09	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	18.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	10.09	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	28.09	2.83
4.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	0.04	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.04	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.04	0.00
5.	SENTENCIAS JUDICIALE	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.53	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.53	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 92.46

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

54 118 Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL					\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	87.28	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	87.28	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	112.28	98.00
2. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	4.03	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	4.03	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	29.03	1.17
3. INTERVENTORIAS	7.63	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	7.63	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	32.63	2.49
4. GASTOS GENERALES	0.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.10	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	25.10	0.03
5. SENTENCIAS JUDICIALE	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.15	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.15	0.00
6. SERVIDUMBRES	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.81	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.81	0.01
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		101.69		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

55 126 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES			Millones de pesos 2022		
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
	IPC	Valor			
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	10.45	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	2.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	10.45	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	12.45	1.30
2. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	16.75	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	2.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	16.75	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	18.75	3.14
3. GASTOS GENERALES	0.15	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	9.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.15	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	9.15	0.01
4. INTERVENTORIAS	3.46	8.33	0.00	8.37	0.00	8.33	7.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.46	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	10.46	0.36
5. MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	48.27	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	1.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	48.31	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.31	23.80
6. SOFTWARE Y HARDWARE	10.12	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	10.12	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	10.12	1.02
7. EDIFICACIONES	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	7.68	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	7.68	0.51
8. SOFTWARE Y HARDWARE	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.00	0.00
9. SENTENCIAS JUDICIALE	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 30.16

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

68 104 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	89.52	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	9.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	89.52	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	98.52	88.20
2.	INTERVENTORIAS	8.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	22.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.30	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	30.30	2.51
3.	GASTOS GENERALES	0.13	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.13	8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		8.33		100.00	0.13	0.00
4.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	1.14	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	1.14	0.01
5.	SENTENCIAS JUDICIALE	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.91	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.91	0.01

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 90.73

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

81 69 Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	92.55	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	92.56	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	92.56	85.66
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	0.81	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.81	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.81	0.01
3.	GASTOS GENERALES	0.13	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	19.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.13	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	19.13	0.02
4.	INTERVENTORIAS	6.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	1.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.20	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	7.20	0.45
5.	SENTENCIAS JUDICIALE	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.31	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.31	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 86.14

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

82 89 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL					\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	85.27	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	85.27	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	109.27	93.17
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	4.09	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	13.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	4.09	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	17.09	0.70
3.	GASTOS GENERALES	1.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	8.00	0.08
4.	INTERVENTORIAS	9.26	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	9.26	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	33.26	3.08
5.	SENTENCIAS JUDICIALE	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.38	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.38	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 97.03

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7334 174 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				-\$119	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	85.69	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	85.39	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	88.39	75.74
2. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	2.70	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	11.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	2.70	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	13.70	0.37
3. GASTOS GENERALES	0.04	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.04	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	8.04	0.00
4. INTERVENTORIAS	9.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	9.30	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	17.30	1.61
5. MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	1.32	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	1.32	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	25.32	0.33
6. SOFTWARE Y HARDWARE	0.53	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.53	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	25.53	0.14
7. SENTENCIAS JUDICIALE	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.35	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.35	0.00
8. TERRENOS	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.07	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.07	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		78.19		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7338 134 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				-\$53	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	78.53	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	19.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	78.54	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	97.54	76.60
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	11.14	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	11.15	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	14.15	1.58
3.	GASTOS GENERALES	0.03	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.03	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	25.03	0.01
4.	INTERVENTORIAS	10.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	12.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	10.20	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	22.20	2.26
5.	SENTENCIAS JUDICIALE	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.07	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.07	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										80.45

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7341 151 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES										Millones de pesos 2022				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		-\$147		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	11.32	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	11.32	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	11.32	1.28
2. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	17.61	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	5.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	17.61	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	22.61	3.98
3. GASTOS GENERALES	2.55	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	17.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	2.55	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	19.55	0.50
4. INTERVENTORIAS	3.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.60	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	7.60	0.27
5. SOFTWARE Y HARDWARE	0.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.01	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.01	0.00
6. TERRENOS	62.62	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	62.81	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	62.81	39.33
7. SENTENCIAS JUDICIALE	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	2.10	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	2.10	0.05
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.41		

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7501 Primera Línea de Metro de Bogotá

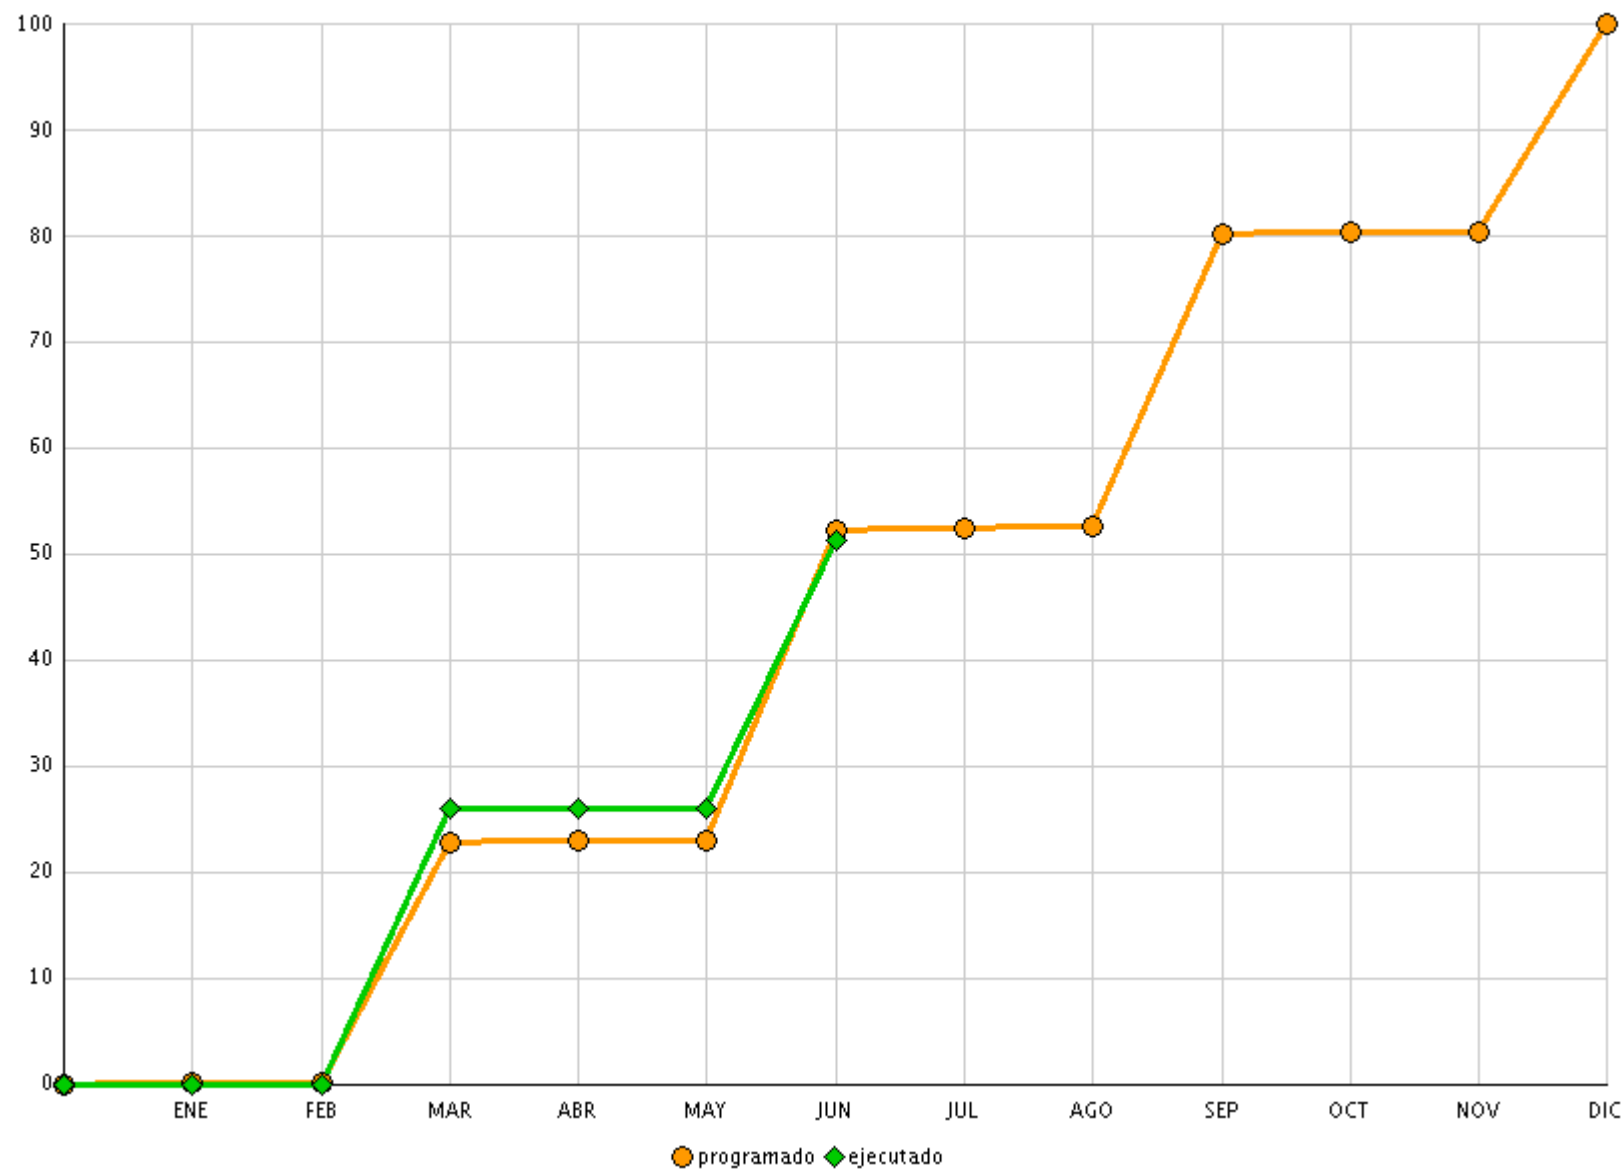


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.13	0.26	22.83	22.96	23.09	52.32	52.45	52.58	80.20	80.33	80.46	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.98	25.98	25.98	51.31						

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7518 Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI

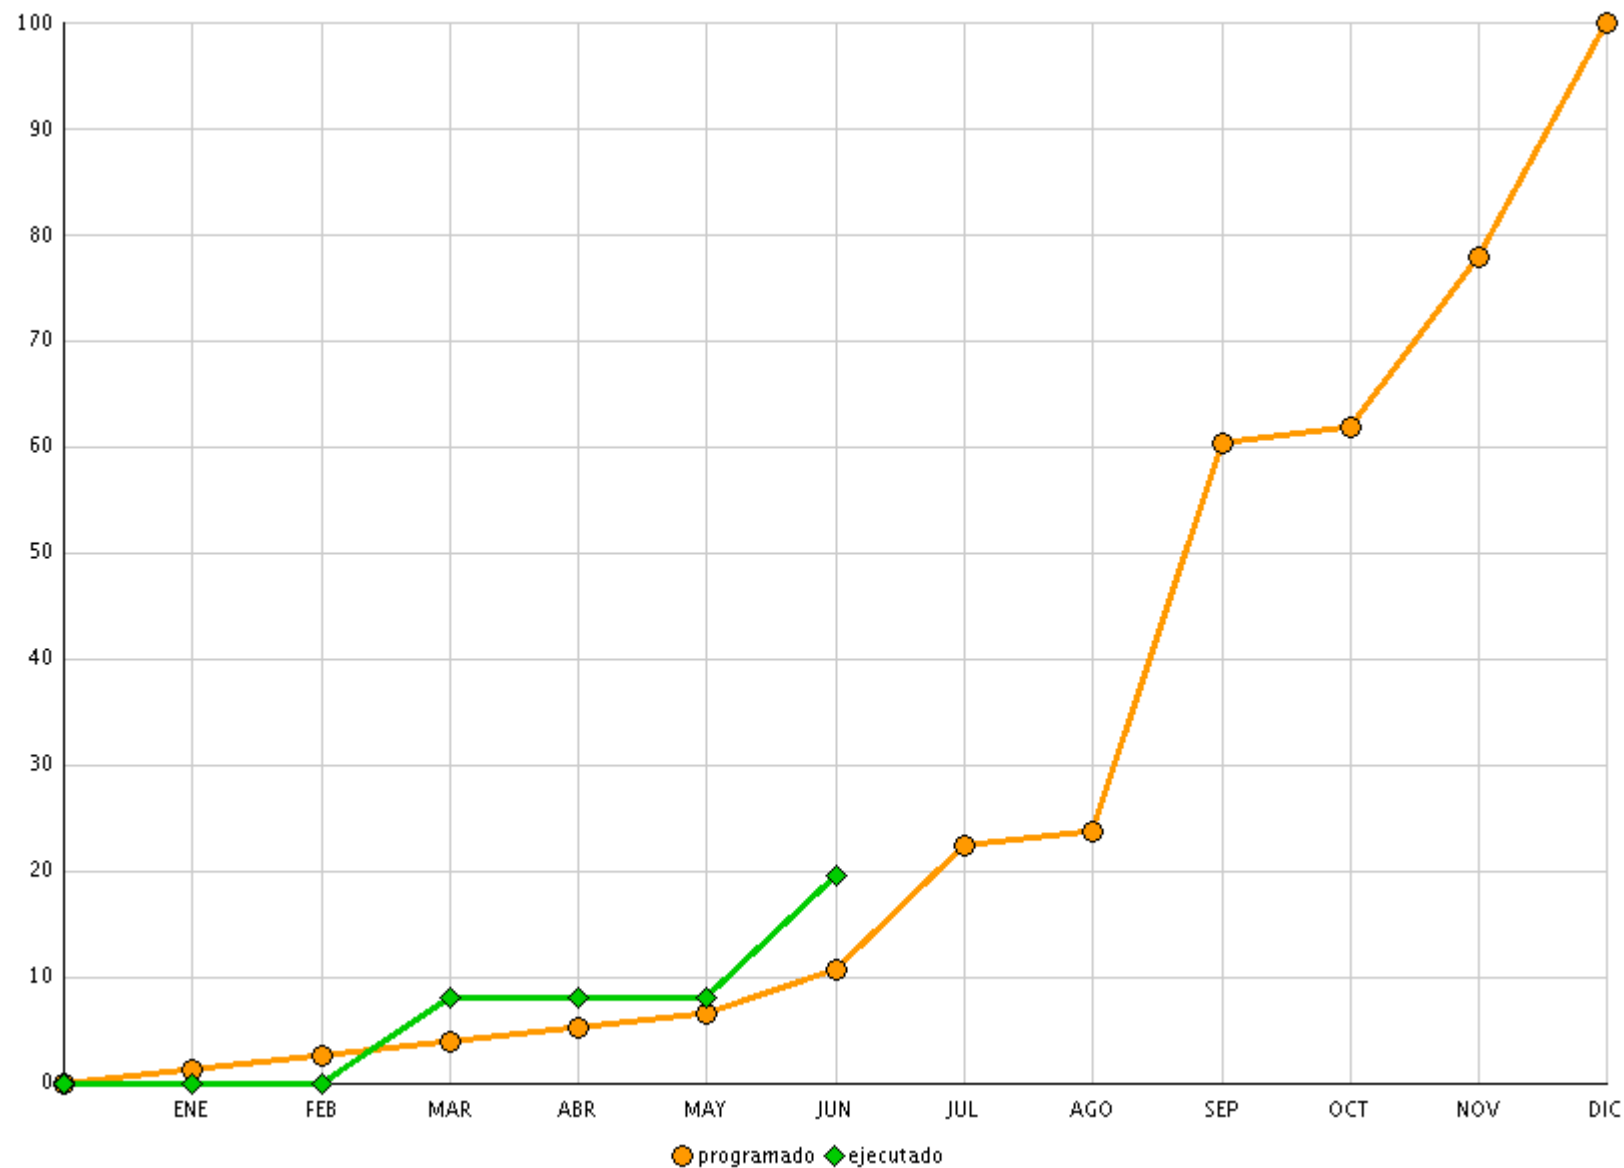


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.30	2.60	3.90	5.20	6.50	10.74	22.50	23.80	60.44	61.90	78.02	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	8.08	8.08	8.08	19.60						

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

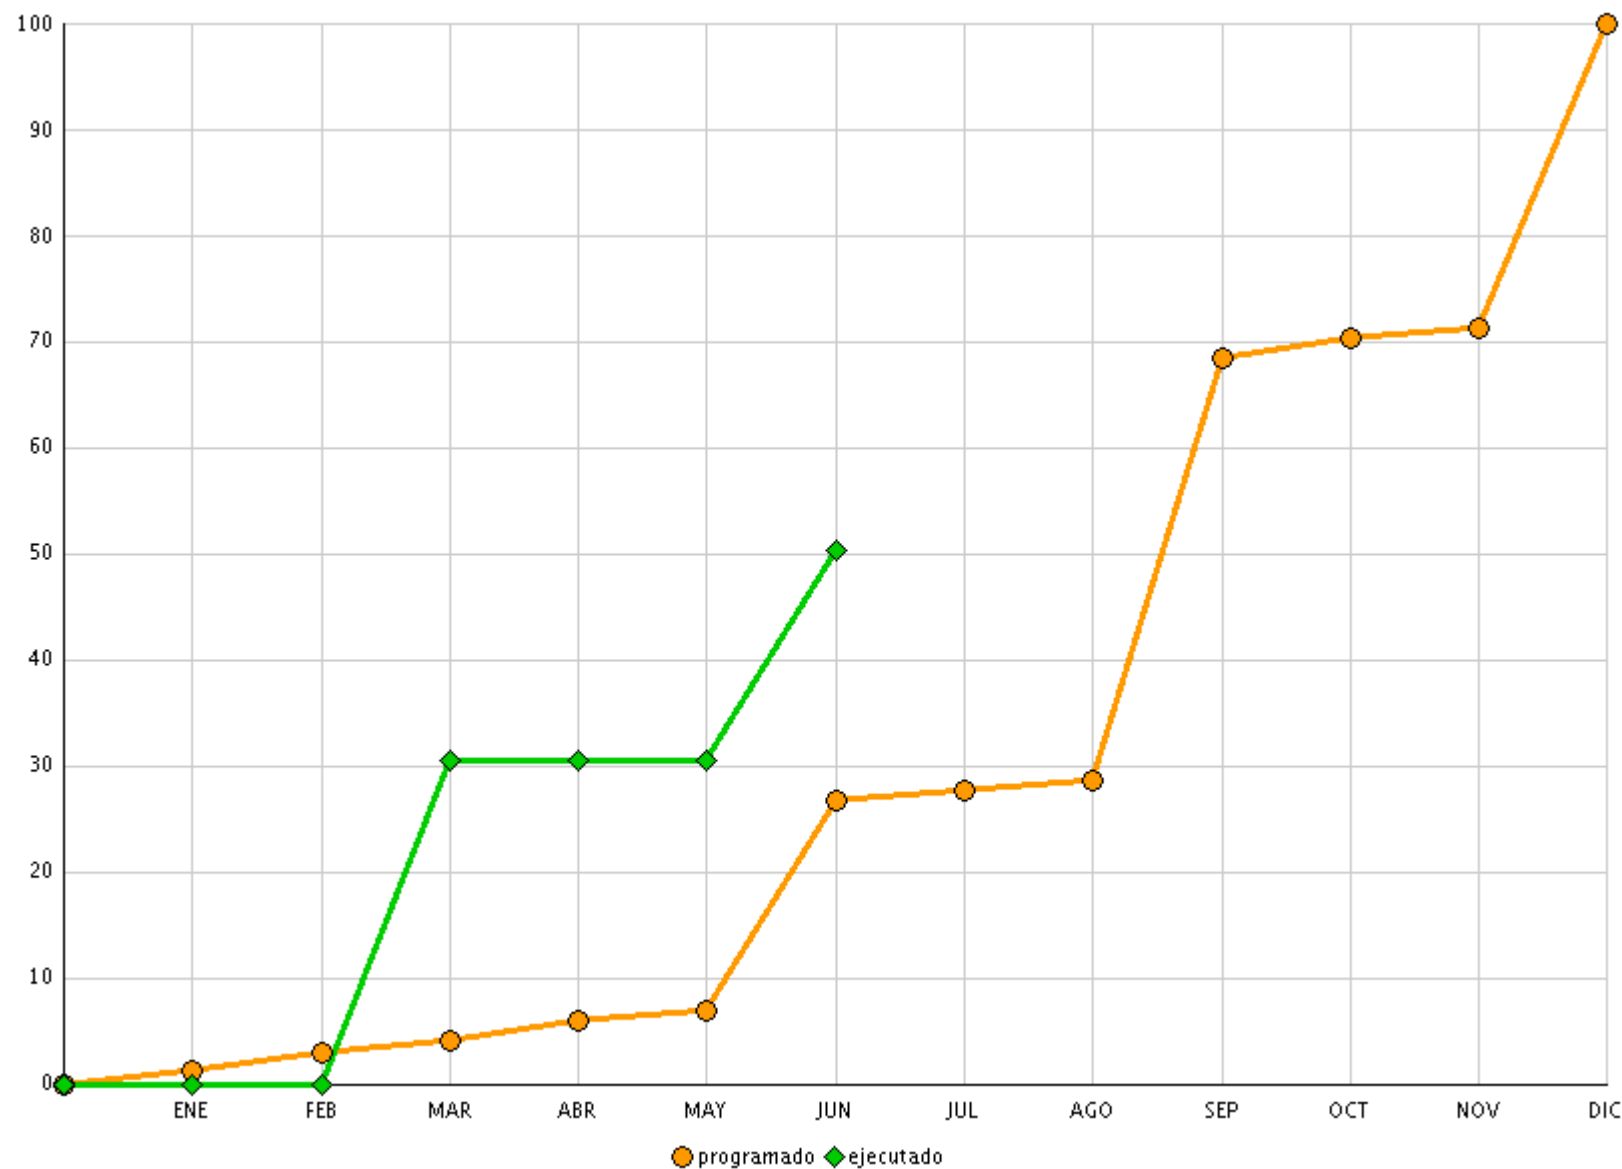


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.41	3.02	4.19	6.05	6.98	26.76	27.75	28.74	68.49	70.41	71.40	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	30.51	30.51	30.51	50.46						

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7520 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

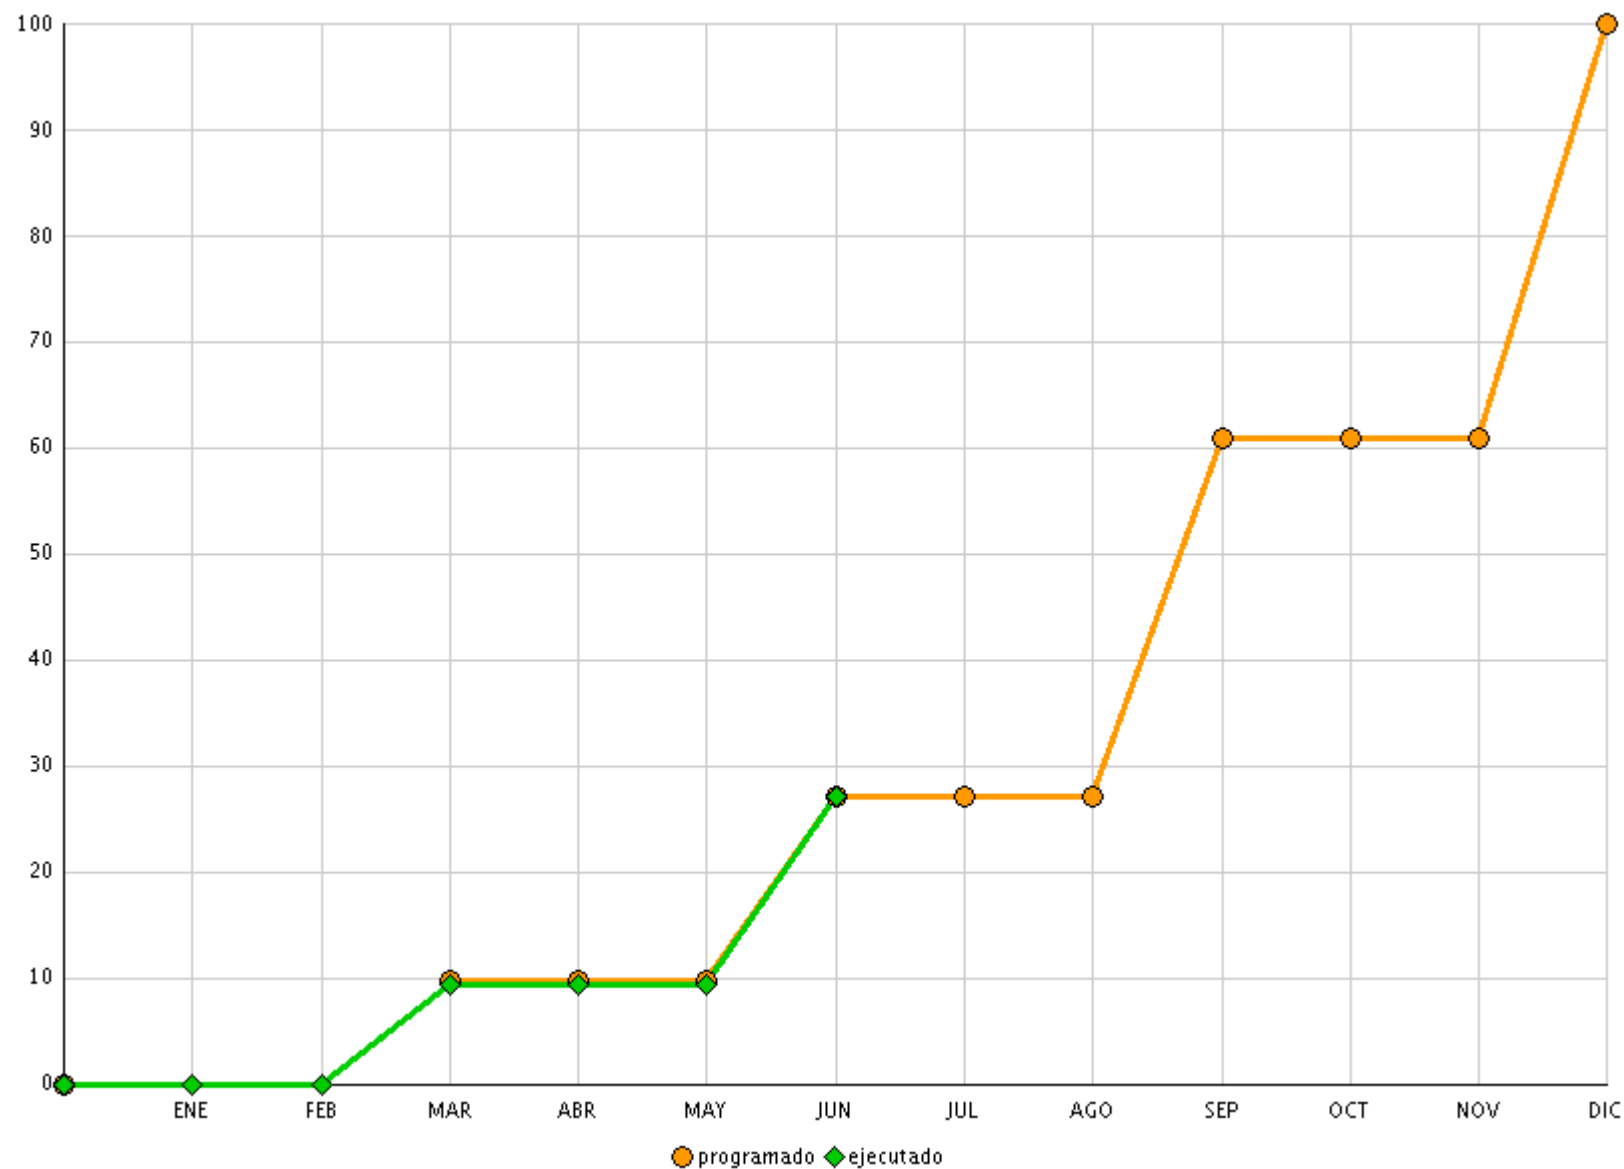


Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado			9.75	9.75	9.75	27.10	27.10	27.10	60.92	60.92	60.92	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	9.48	9.48	9.48	27.18						

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá

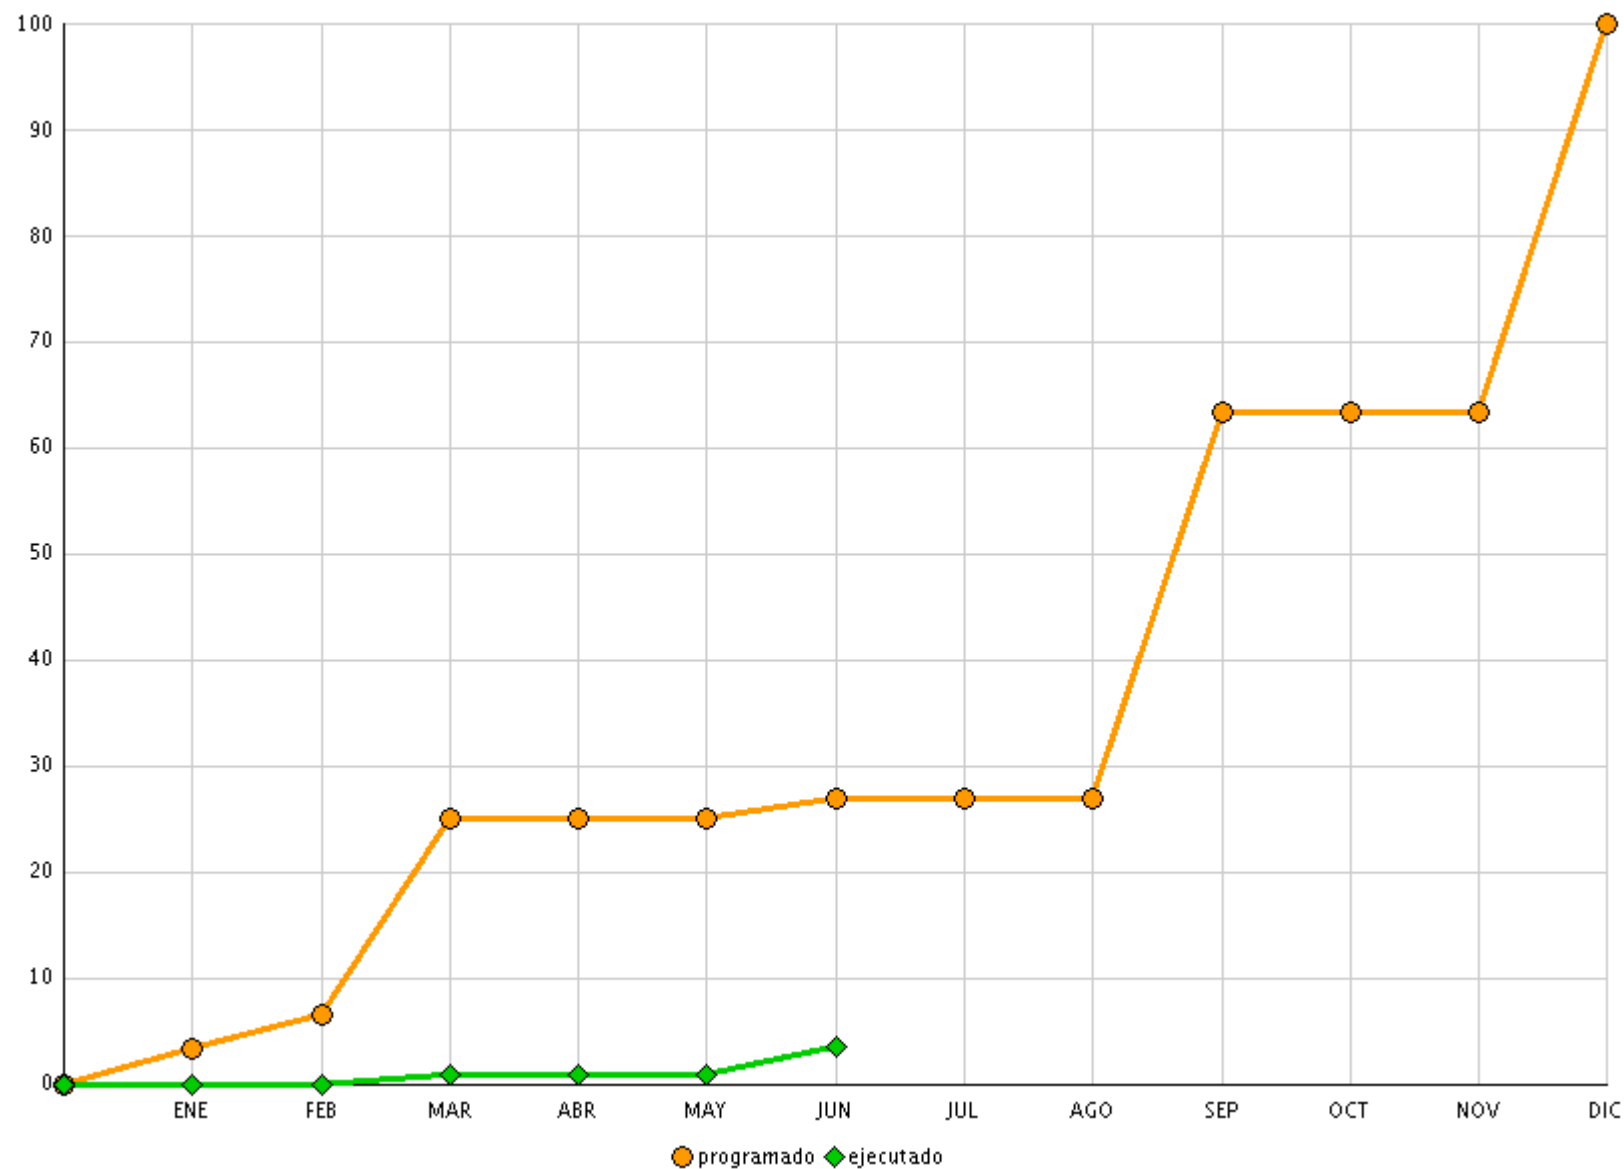

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.33	6.66	25.00	25.00	25.00	27.03	27.03	27.03	63.42	63.42	63.42	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.99	0.99	0.99	3.49						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
266 Empresa Metro de Bogotá S.A.
7501 101 Primera Línea de Metro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN INCLUYENDO LOS DISEÑOS DE DETALLE, OBRAS DE LA FASE PREVIA Y LA ADECUACIÓN DEL TERRENO DEL PATIO TALLER.	98.46		0.00		0.00	22.80	26.00		0.00		0.00	29.56	25.33					27.92							19.72		100.00	51.33	50.54
2.	IMPLEMENTAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS (PMO - ENCARGO FIDUCIARIO) EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN Y LOS CONTRATOS DE CRÉDITO CON LA BANCA MULTILATERAL.	1.54	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.35	25.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.35		100.00	50.00	0.77	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									51.31		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7518 14 Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	41.66		0.00		0.00		0.00		58.34		0.00		100.00	41.00	10.30
2. CONTAR CON UN SOFTWARE ESPECIALIZADO (ERP)	16.26	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	50.00	8.13
3. ADQUIRIR TECNOLOGÍA (LICENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00		0.00		60.00		0.00		0.00		35.00		100.00	2.00	1.17
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		19.60		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7519 55 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				-\$828	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	TRASLADAR LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS IDENTIFICADAS EN EL TRAZADO DE LA PLMB T1.	12.58	3.78	0.00	3.78	0.00	1.88	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99	17.14	0.00		0.00		31.43						37.14		100.00	31.43	3.95
2.	ENTREGAR AL CONCESIONARIO EL 100 % DE LOS PREDIOS DEL TRAZADO DE LA PLMB T1.	74.05		0.00	0.28	0.00		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72	19.00	0.00				47.00				0.00		31.00		100.00	54.00	39.99
3.	IMPLEMENTAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS (PMO - ENCARGO FIDUCIARIO) EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN Y LOS CONTRATOS DE CRÉDITO CON LA BANCA MULTILATERAL.	13.01	7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	21.43	14.30	0.00	7.14	0.00	7.14	28.57	7.14		7.14		7.14		14.30		7.14		7.14		100.00	50.00	6.51
4.	PROMOVER ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO PLMB T-1.	0.36	0.33	0.00	0.49	0.00	0.87	1.69	0.87	0.00	0.87	0.00	0.38	2.12	16.72		16.72		16.72		16.72		16.72		12.59		100.00	3.81	0.01
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.46

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7520 22 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE FACTIBILIDAD Y, LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA METRO . LINEA 2 PARA DEFINIR EL PROCESOD E SELECCIÓN.	76.00		0.00		0.00	11.29	11.00		0.00		0.00	12.61	13.00					26.87						49.23		100.00	24.00	18.24
2.	DESARROLLAR LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA DE LA EXTENSIÓN DE LA PLMB-TRAMO 1 HASTA EL SECTOR DE LA CLL 100, DE ACUERDO CON LAS DEFINICIONES ESTABLECIDAS EN EL CTO CONCESION 163	14.00		0.00		0.00	8.37	8.00		0.00		0.00	27.69	28.00					63.94								100.00	36.00	5.04
3.	REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN FASE 2 - LINEA 2 Y EXTENSIÓN CLL 100 -	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	38.89	39.00					44.44						16.67		100.00	39.00	3.90
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		27.18

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7521 16 Construcción de cultura Metro para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADA ACTIVA, IMPULSANDO PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATÉGICA DE CULTURA CIUDADANA.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51	0.00		0.00		45.51		0.00				27.98		100.00	2.50	0.75
2.	ARTICULAR LAS ACTIVIDADES ENTRE LAS DEPENDIAS DE LA EMB, INSTITUCIONES DISTRITALES Y NACIONALES PARA OFRECER UN MENSAJE UNIFICADO A LOS GRUPOS DE VALOR	40.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.99		0.00		0.00	1.75	2.41					22.02						51.24		100.00	3.40	1.36
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y MARCA DEL METRO DE BOGOTÁ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	3.61			0.00		46.41		0.00				25.64		100.00	4.60	1.38
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										3.49

501 - Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología

Proyecto de inversión

7913 Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C.

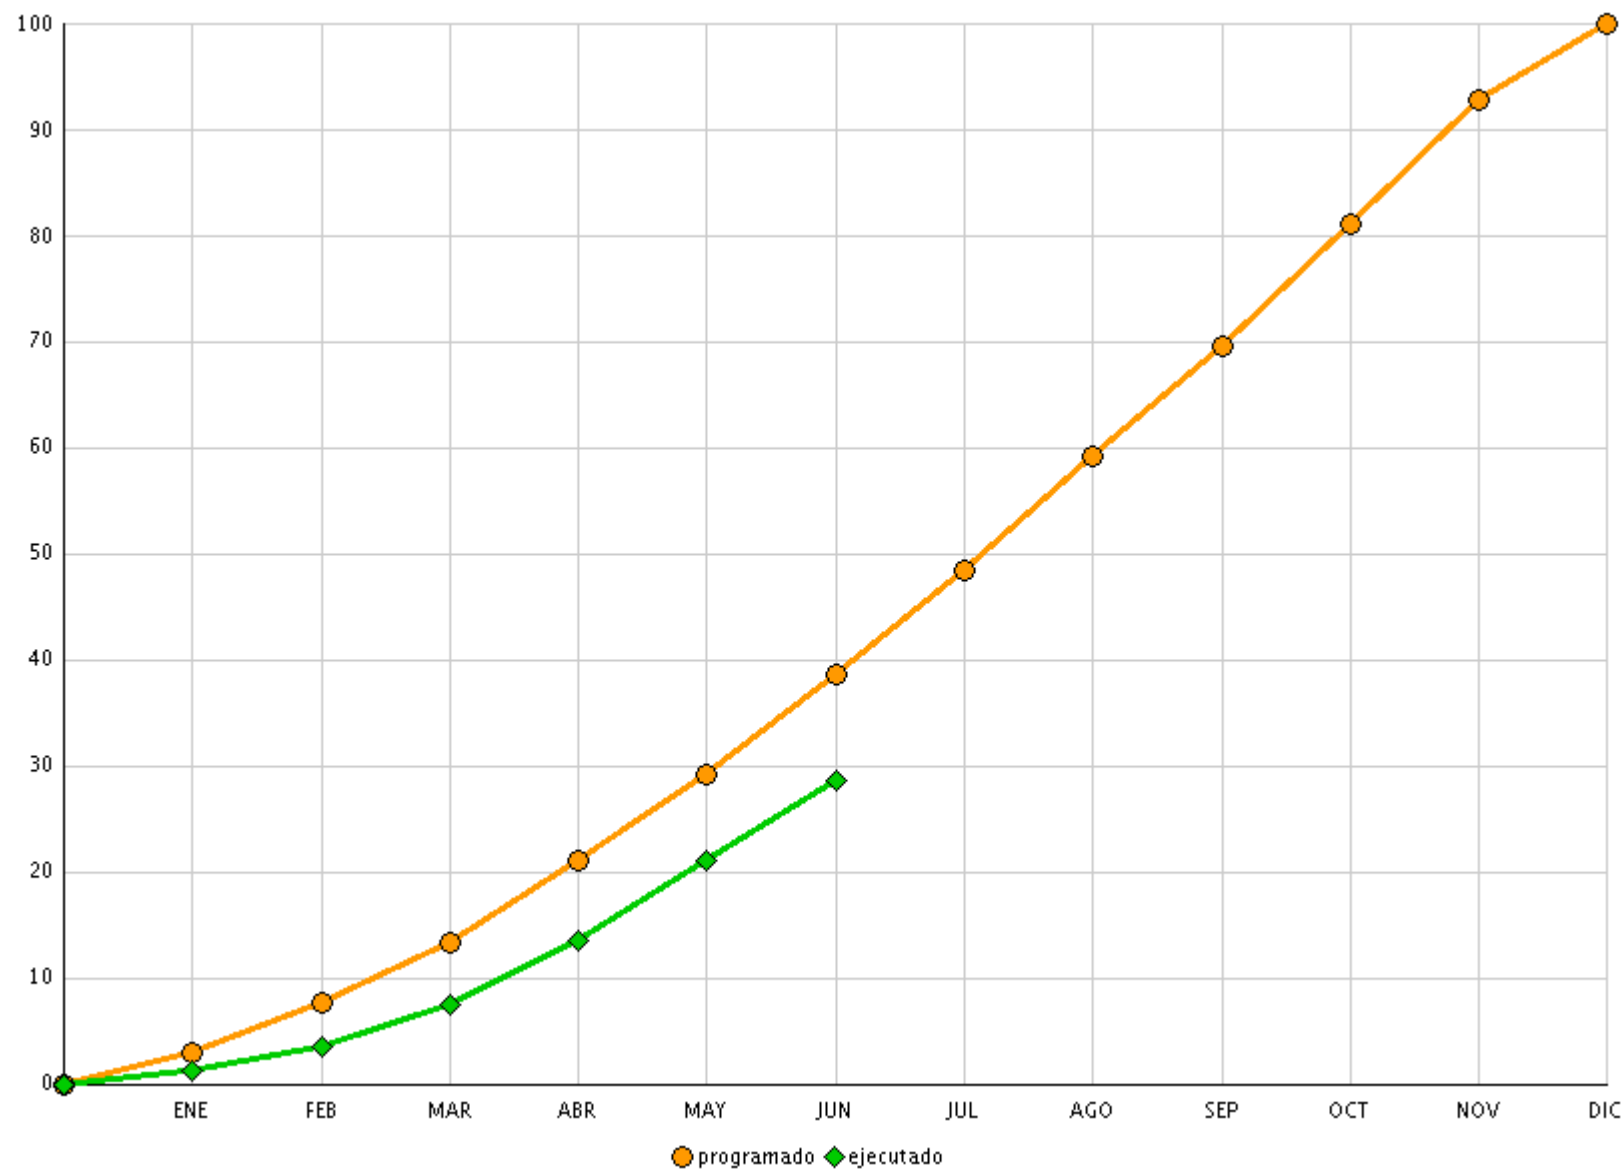

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.05	7.66	13.31	21.10	29.21	38.65	48.46	59.22	69.53	81.18	92.89	100.00
Ejecutado	1.39	3.58	7.49	13.53	21.18	28.71						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

501 Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología

7913 25 Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2022		
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
	IPC	Valor			
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2022

AVANCE A: 30/06/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN PRIORIZADA DE LA CIUDAD.	33.75	5.00	0.67	5.00	3.00	5.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	36.67	12.38
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI DE LOS Y LAS JÓVENES DE LA CIUDAD.	26.25	0.00	0.00	5.00	1.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	4.00	10.00	4.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		100.00	13.00	3.41
3. DESARROLLAR Y GESTIONAR ALIANZAS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LAS IETDH Y/O ENTIDADES CERTIFICADORAS PARA FINANCIAR LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	25.00	3.75
4. IMPLEMENTAR UN ESQUEMA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE SE EJECUTEN DESDE LA AGENCIA.	6.75	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	10.00	7.00	10.00	7.00	10.00	7.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	27.00	1.82
5. DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA CON EDUCACIÓN SUPERIOR.	4.50	5.00	5.00	15.00	4.00	15.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00		15.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	27.00	1.22
6. REALIZAR ACTIVIDADES DE DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DESCRITAS, DE FORMA QUE SE CONTRIBUYA A MEJORAR LA PERMANENCIA Y EL TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR RESPECTIVAMENTE	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	33.00	1.24
7. GENERAR INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ANALISIS TÉCNICOS Y CONCEPTUALES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN POSMEDIA.	1.50	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
8. REALIZAR MESAS DE TRABAJO Y ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN POSMEDIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS PLANES DE ACCIÓN	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		3.00		0.00		0.00		100.00	63.00	1.26
9. ELABORAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE EDUCACIÓN POSMEDIA PARA BOGOTA D.C.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	38.00	0.19
10. ELABORAR Y DESARROLLAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN POSMEDIA DE BOGOTÁ.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	20.00	0.20
11. GARANTIZAR LOS RECURSOS (HUMANOS, TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS) QUE SOPORTEN LAS DIFERENTES ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	2.50	25.00	25.00	10.00	10.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	70.00	1.75
12. IMPLEMENTAR LA FASE 1 PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITIRÁ HACER SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA AGENCIA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00		10.00		10.00		15.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 28.71
